INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA

INFORME MENSUAL No. 22
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA COOPERATIVA "COOTRAFLOR"

CONTRATO 1437 de 2024

PERIODO: FEBRERO DE 2026

MARZO DE 2026

1. INTRODUCCIÓN

Los contratos de las cooperativas están encaminados en realizar el mantenimiento rutinario enlas vías a cargo del Instituto Nacional de Vías, de acuerdo las actividades descritas continuación, atendiendo y dando cumplimiento a la logística de trabajos, logística de personal y logística de transporte.

El cumplimiento de nuestro mantenimiento rutinario es el conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente a lo largo de la vía, que tiene como finalidad principal la preservación de todos los elementos de la infraestructura vial con la mínima cantidad de alteraciones o de daños y, en lo posible, conservando las condiciones que tiene después de la construcción o mejoramiento.

Por lo anterior y teniendo en cuenta que se requiere garantizar el mantenimiento rutinario de algunas vías a cargo del Instituto Nacional de Vías, se adelanta el programa de Mantenimiento Rutinario con el fin de contribuir, mantener y aplicar el significado ya mencionado, preservando el patrimonio de la nación durante periodos continuos, evitando el periodo prematuro de las estructuras viales, ofreciendo una atención oportuna con tiempo de respuesta casi inmediata ante cualquier evento, buscando mantener los tiempo de desplazamiento para los cuales está diseñada la vía.

Partiendo de las obligaciones contractuales de la **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS LAS FLOREZ "COOTRAFLOR", Lote 1, Dirección Territorial Córdoba – INVIAS,** expuestas en el párrafo anterior, se realiza el presente Informe mensual, el cual corresponde al conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente a lo largo de la vía, comprendidas en el periodo del primero (1) y el veintiocho (28) de febrero de 2026.

2. OBJETIVOS

Realizar las actividades de Mantenimiento Rutinario de las Carreteras a cargo de la Dirección Territorial Córdoba – INVÍAS, coordinadas, inspeccionadas, revisadas, evaluadas, etc. bajo la responsabilidad del Administración Vial, Grupo 1.

3. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO DE LA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS LAS FLOREZ COOTRAFLOR"

El contrato 1437 de 2024 tiene como objeto el SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN LOS SECTORES 74CR02 SANTA LUCIA - MOÑITOS, PR0+0000 LAS CRUCES) - PR55+0000 9002 ARBOLETES - PUERTO REY, PR82+0000 -PR86+0858 7401 PUERTO REY - MONTERÍA, PR63+0340 - PR64+0000 (INCLUYE PUENTE GUSTAVO ROJAS PINILLA), LOTE 1.

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A CARGO DE LA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS LAS FLOREZ "COOTRAFLOR"

4.1 SECTORES A CARGO DE COOTRAFLOR.

La cooperativa COOTRAFLOR encargada del Mantenimiento Vial Rutinario, tiene a su cargo el siguiente sector:

→ ***COOTRAFLOR***

- Vía 74CR02 Santa Lucia - Moñitos PR0+0000 (Las Cruces) - PR55+0000
- Vía 9002 Arboletes - Puerto Rey PR82+0000 - PR86+0858
- Vía 7401 Puerto Rey - Montería, PR63+0340 - PR 64+0000 (Incluye Puente Gustavo Rojas Pinilla)

4.2 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DE LA COOPERATIVA COOTRAFLOR.

4.2.1 ACTIVIDADES GENERALES

La presente A.M.V., tiene a su cargo a la cooperativa "COOTRAFLOR", la cual se encarga de realizar las actividades de Mantenimiento Vial Rutinario en los sectores de las VIAS 74CR02 SANTA LUCIA MOÑITOS PR0+0000 (LAS CRUCES) - PR55+0000, 9002 ARBOLETES - PUERTO REY PR82+0000 - PR86+0858, 7401 PUERTO REY - MONTERIA, PR63+0340 - PR64+0000 (INCLUYE PUENTE GUSTAVO ROJAS PINILLA, a cargo de la Dirección Territorial Córdoba – INVÍAS. Las actividades con las cuales se evalúa la labor desempeñada por los mismos, son las siguientes:

425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m
	G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)	
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U
	LIMPIEZA DE PUENTES	
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U
545	LIMPIEZA MANUAL DEL LECHO DEL RÍO	m
547	LIMPIEZA MANUAL DE CURSOS DE AGUA	m
	I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS	
625	DESPEJE DE DERRUMBES	m3
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	U
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	U
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m
694	VIGILANCIA	Gl

4.2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO EVALUADO

A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas durante el mes de febrero de 2026 para dar cumplimiento a lo establecido en los pliegos de condiciones:

→ ***COOTRAFLOR (CONTRATO 1437 DE 2024)***

Las actividades desarrolladas por la cooperativa durante este periodo fueron las siguientes:

- ***VIA 74CR02 SANTA LUCIA – MOÑITOS.***

Semana 1: Lunes 2 – Domingo 8 de Febrero de 2026.

- Limpieza de cunetas desde el PR51+0050 hasta el PR51+0120, desde el PR31+0100 hasta el PR31+0180, desde el PR47+0200 hasta el PR47+0900 y desde el PR49+0300 hasta el PR49+0500, en donde se limpiaron 1130 metros lineales con 16 jornales de trabajo.
- Limpieza de obras de arte desde el PR30+0650 hasta el PR30+0660 y desde el PR46+0350 hasta el PR46+0360, en donde se limpiaron 2 obras con 4 jornales de trabajo.
- Poda, corte y/o retiro de árboles en el PR14+0450, en el PR48+0800, en el PR39+0100, en el PR49+0850 y en el PR48+0500, en donde se podaron y retiraron 10 árboles con 8 jornales de trabajo.
- Despeje de señales verticales en el PR17+0800, en donde se despejaron 2 señales con 2 jornales de trabajo.
- Limpieza y despeje de basuras en zona de carretera en el PR48+0500, con 4 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 2: Lunes 9 – Domingo 15 de Febrero de 2026.

- Limpieza de cunetas desde el PR51+0000 hasta el PR51+0400, desde el PR51+0800 hasta el PR51+0890, desde el PR50+0500 hasta el PR50+0560, desde el PR46+0500 hasta el PR46+0570, desde el PR48+0100 hasta el PR48+0190 y desde el PR47+0800 hasta el PR47+0840, en donde se limpiaron 1100 metros lineales con 24 jornales de trabajo.
- Limpieza de bermas desde el PR30+0750 hasta el PR30+0800, en donde se limpiaron 100 metros lineales con 4 jornales de trabajo.
- Limpieza de obra de arte desde el PR14+0400 hasta el PR14+0410, desde el PR30+0800 hasta el PR30+0810 y desde el PR47+0700 hasta el PR47+0710, en donde se limpiaron 3 obras con 6 jornales de trabajo.
- Limpieza de puente El Caimito en el PR51+0663, con 8 jornales de trabajo.
- Poda, corte y/o retiro de árboles en el PR51+0650, en el PR46+0500, en el PR47+0500, en

el PR12+0480 y en el PR47+0700, en donde se podaron y retiraron 8 árboles con 6 jornales de trabajo.
- Limpieza de descole en el PR14+0300, con 2 jornales de trabajo.
- Despeje de señales verticales en el PR47+0800, en donde se despejaron 2 señales con 2 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 3: Lunes 16 – Domingo 22 de Febrero de 2026.

- Limpieza de cunetas desde el PR46+0700 hasta el PR46+0820, desde el PR46+0900 hasta el PR46+0960, desde el PR31+0850 hasta el PR31+0900, desde el PR24+0800 hasta el PR24+0850 y desde el PR48+0980 hasta el PR49+0200, en donde se limpiaron 780 metros lineales con 20 jornales de trabajo.
- Limpieza de bermas desde el PR29+0700 hasta el PR29+0750 y desde el PR17+0200 hasta el PR17+0400, en donde se limpiaron 450 metros lineales con 8jornales de trabajo.
- Limpieza de obras de arte desde el PR48+0400 hasta el PR48+0500 y desde el PR16+0600 hasta el PR31+0600, en donde se limpiaron 7 obras con 7 jornales de trabajo.
- Bacheo en superficie en afirmado en el PR33+0800, con 3 jornales de trabajo.
- Limpieza de descole en el PR31+0200, con 2 jornales de trabajo.
- Limpieza de disipador de energía en el PR26+0450 y en el PR29+0700, con 2 jornales de trabajo.
- Aplomado de señal vertical en el PR7+0450, con 3 jornales de trabajo.
- Despeje de señal vertical en el PR49+0200, en donde se despejo una señal con 1 jornal de trabajo.
- Poda, corte y/o retiro de árboles en el PR48+0900, en donde se podo 1 árbol con 2 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 4: Lunes 23 – Sábado 28 de Febrero de 2026.

- Rocería y desmonte manual desde el PR31+0100 hasta el PR32+0000, en ambos lados de la vía con 10 jornales de trabajo.
- Limpieza de cunetas desde el PR49+0300 hasta el PR49+0600, desde el PR29+0700 hasta el PR29+0770 y desde el PR50+0050 hasta el PR50+0510, en donde se limpiaron 830 metros lineales con 12 jornales de trabajo.
- Limpieza de obras de arte desde el PR45+0600 hasta el PR26+0410, desde el PR26+0400 hasta el PR4+0110 y desde el PR4+0100 hasta el PR5+0150, en donde se limpiaron 5 obras con 8 jornales de trabajo.
- Limpieza de descole en el PR46+0600 y en el PR47+0200, con 2 jornales de trabajo.
- Limpieza de disipador de energía en el PR26+0400, con 2 jornales de trabajo.
- Poda, corte y/o retiro de árboles en el PR48+0600, en el PR40+0600 y en el PR51+0350, en donde se podaron 3 árboles con 2 jornales de trabajo.

- Vigilancia en los sectores a cargo.

➢ ***VIA 7401 PUERTO REY – MONTERIA.***

Semana 1: Lunes 2 – Domingo 8 de Febrero de 2026.

- Control de tráfico pesado con paleteros en el PR63+0450 - Puente Gustavo Rojas Pinilla, con 49 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 2: Lunes 9 – Domingo 15 de Febrero de 2026.

- Control de tráfico pesado con paleteros en el PR63+0450 - Puente Gustavo Rojas Pinilla, con 49 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 3: Lunes 16 – Domingo 22 de Febrero de 2026.

- Control de tráfico pesado con paleteros en el PR63+0450 - Puente Gustavo Rojas Pinilla, con 49 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 4: Lunes 23 – Sábado 28 de Febrero de 2026.

- Control de tráfico pesado con paleteros en el PR63+0450 - Puente Gustavo Rojas Pinilla, con 49 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

➢ ***VIA 9002 ARBOLETES - PUERTO REY.***

Semana 1: Lunes 2 – Domingo 8 de Febrero de 2026.

- Poda, corte y/o retiro de árboles en el PR83+0650, en donde se retiró un árbol con 3 jornales de trabajo.
- Limpieza de calzada en el PR83+0650, con 3 jornales de trabajo.
- Despeje de señal vertical en el PR82+0030, en donde se despejó una señal con 2 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 2: Lunes 9 – Domingo 15 de Febrero de 2026.

- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 3: Lunes 16 – Domingo 22 de Febrero de 2026.

- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 4: Lunes 23 – Sábado 28 de Febrero de 2026.

- Vigilancia en los sectores a cargo.

Las actividades programadas semanalmente por la A.M.V., para el período comprendido entre el primero (1) y el veintiocho (28) de febrero de 2026. fueron ejecutadas en su totalidad por la cooperativa.

4.3 PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La Seguridad y Salud en el trabajo tiene por objeto la prevención y limitación de riesgos, así como la protección contra accidentes, enfermedades profesionales y en general capaces de producir daños a las personas.
La cooperativa está cumpliendo con los elementos de protección personal que deben ser utilizados cada vez que se ejecute una actividad en el mantenimiento rutinario, lo que requiere y exige el Instituto nacional de Vías, las cuales son las siguientes:

- Botas de seguridad.
- Delantales para las guadañas.
- Canilleras.
- Caretas.
- Gafas.
- Tapa oídos.
- Guantes.

La sede de la cooperativa está ubicada en el corregimiento las Florez, en el PR35+0600, vía 74CR02, en donde puede consultar la documentación del contrato de la cooperativa y de los temas administrativos.

4.4 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL EN LA JORNADA DE TRABAJO.

Se cuenta con la señalización temporal en la jornada de trabajo acorde con lo exigido por INVIAS, para brindar protección tanto a los trabajadores como a los usuarios de la vía mientras se ejecutan las distintas actividades de mantenimiento rutinario.

Se dispone de la siguiente señalización temporal mientras se ejecutan dichas labores:

- 4 señales temporales.
- 4 conos
- 1 malla protectora siempre y cuando se trabaje con la actividad de rocería.

5. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE LA COOPERATIVA

COOPERATIVA	**COOTRAFLOR C.T.A.**
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN LOS SECTORES 74CR02 SANTA LUCIA - MOÑITOS, PR0+0000 LAS CRUCES) - PR55+0000 9002 ARBOLETES - PUERTO REY, PR82+0000 -PR86+0858 7401 PUERTO REY - MONTERÍA, PR63+0340 -PR64+0000 (INCLUYE PUENTE GUSTAVO ROJAS PINILLA), LOTE 1.
NÚMERO DEL CONTRATO	1437 de 2024.
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL	Hasta el 31 de julio de 2026.
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	17 de mayo de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	31 de julio de 2026
VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL	$2.760.457.438,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$2.760.457.438,00

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Una vez pasada la revista de la Interventoría correspondiente al presente informe, se resalta que la cooperativa en lo que respecta a sus labores de mantenimiento rutinario de la carretera cumplieron con los indicadores medidos por el Administrador Vial.

La cooperativa Cootraflor informó diariamente por medio del aplicativo WhatsApp publicando las evidencias (fotos) de las actividades desarrolladas durante el día.

En el transcurso del mes de febrero de 2026 se ejecutaron las actividades en varios sectores para cumplir con lo exigido por INVIAS en lo relacionado con el ornato y embellecimiento de la vía.

En este periodo se realizaron actividades complementarias. Todo esto con el fin de mantener un funcionamiento óptimo de la vía.

Se atendieron emergencias ocasionadas por la caída de árboles en varios sectores de la vía 74CR02 y en el PR83+0650 de la vía 9002, debido a las fuertes lluvias atípicas registrados durante este periodo.

La cooperativa estuvo disponible para atender y monitorear las emergencias ocasionadas por las fuertes lluvias e inundaciones presentadas durante este período.

Los trabajadores de mantenimiento rutinario asistieron a la capacitación programada por la AMV cuyo tema fue "Higiene postural e importancia del uso de los EPP".

ANEXOS

CUADRO RENDIMIENTOS MENSUALES

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS LAS FLOREZ - COOTRAFLOR C.T.A.
NIT. No. 800161679-2.
CONTRATO No. 1437 DE 2024

PERÍODO: 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

ACTIVIDAD ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

VÍAS 74CR02: SANTA LUCIA - MOÑITOS, 9002: ARBOLETES - PUERTO REY Y 7401: PUERTO REY - MONTERIA

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		ANCHO PROMEDIO		LONG	CANT (Ha)	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	KM				
PR31+0100	PR32+0000	4	4	0,90	0,72	10	0,07	VIA 74CR02

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE CUNETAS

VÍAS 74CR02: SANTA LUCIA - MOÑITOS, 9002: ARBOLETES - PUERTO REY Y 7401: PUERTO REY - MONTERIA

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO CUNETA		SECCIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
PR51+0050	PR51+0120	X		V	70	4	17,5	VIA 74CR02
PR31+0100	PR31+0180	X		V	160	4	40,0	VIA 74CR02
PR47+0200	PR47+0900	X		V	700	4	175,0	VIA 74CR02
PR49+0300	PR49+0500	X		V	200	4	50,0	VIA 74CR02
PR51+0000	PR51+0400	X		V	400	4	100,0	VIA 74CR02
PR51+0800	PR51+0890	X		V	180	4	45,0	VIA 74CR02
PR50+0500	PR50+0560	X		V	120	4	30,0	VIA 74CR02
PR46+0500	PR46+0570	X		V	140	4	35,0	VIA 74CR02
PR48+0100	PR48+0190	X		V	180	4	45,0	VIA 74CR02
PR47+0800	PR47+0840	X		V	80	4	20,0	VIA 74CR02
PR46+0700	PR46+0820	X		V	240	4	60,0	VIA 74CR02
PR46+0900	PR46+0960	X		V	120	4	30,0	VIA 74CR02
PR31+0850	PR31+0900	X		V	100	4	25,0	VIA 74CR02
PR24+0800	PR24+0850	X		V	100	4	25,0	VIA 74CR02
PR48+0980	PR49+0200	X		V	220	4	55,0	VIA 74CR02
PR49+0300	PR49+0600	X		V	300	4	75,0	VIA 74CR02
PR29+0700	PR29+0770	X		V	70	4	17,5	VIA 74CR02
PR50+0050	PR50+0510	X		V	460	4	115,0	VIA 74CR02

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE DEFENSAS METALICAS

VÍAS 74CR02: SANTA LUCIA - MOÑITOS, 9002: ARBOLETES - PUERTO REY Y 7401: PUERTO REY - MONTERIA

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		UBICACIÓN		CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER				

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE BERMAS

VÍAS 74CR02: SANTA LUCIA - MOÑITOS, 9002: ARBOLETES - PUERTO REY Y 7401: PUERTO REY - MONTERIA

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO DE BERMA		UBICACIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
PR30+0750	PR30+0800	X		I-D	100	4	25,0	VIA 74CR02
PR29+0700	PR29+0750	X		I-D	50	4	12,5	VIA 74CR02
PR17+0200	PR17+0400	X		I-D	400	4	100,0	VIA 74CR02

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS

VÍAS 74CR02: SANTA LUCIA - MOÑITOS, 9002: ARBOLETES - PUERTO REY Y 7401: PUERTO REY - MONTERIA

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		CANTIDAD	CANTIDAD (ML)		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	UND	ENCOLES	DESCOLES			
PR30+0650	PR30+0660	1	1	1	2	0,50	VIA 74CR02
PR46+0350	PR46+0360	1	1	1	2	0,50	VIA 74CR02
PR14+0400	PR14+0410	1	1	1	2	0,50	VIA 74CR02
PR30+0800	PR30+0810	1	1	1	2	0,50	VIA 74CR02
PR47+0700	PR47+0710	1	1	1	2	0,50	VIA 74CR02
PR48+0400	PR48+0500	2	2	2	3	0,67	VIA 74CR02
PR16+0600	PR31+0600	5	5	5	4	1,25	VIA 74CR02
PR45+0600	PR26+0410	1	1	1	2	0,50	VIA 74CR02
PR26+0400	PR4+0110	1	1	1	2	0,50	VIA 74CR02
PR4+0100	PR5+0150	3	3	3	4	0,75	VIA 74CR02

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS LAS FLOREZ - COOTRAFLOR C.T.A.
NIT. No. 800161679-2.
CONTRATO No. 1437 DE 2024

PERÍODO: 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

ACTIVIDAD RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

VIA 74CR02: SANTA LUCIA - MOÑITOS, 9002: ARBOLETES - PUERTO REY Y 7401: PUERTO REY - MONTERIA

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR	TIPO DE SUELO	VOLUMEN	ABSCISAS		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
			INICIAL	FINAL			
PR7+0500							

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

VÍAS 74CR02: SANTA LUCIA - MOÑITOS, 9002: ARBOLETES - PUERTO REY Y 7401: PUERTO REY - MONTERIA

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	NOMBRE	LONGITUD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
PR51+0663	PUENTE CAIMITO	12,7	8	1,59	VÍA 74CR02

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE SEÑALES

VÍAS 74CR02 SANTA LUCIA - MOÑITOS

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	UBICACIÓN		CANT	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
	DER	IZQ				


OTRAS ACTIVIDADES

- Se realizó la actividad de poda, corte y/o retiro de arboles en sectores varios de la vía 74CR02.
- Se realizó la actividad de corte y retiro de árbol en el PR83+0650 de la vía 9002.
-' Se realizó la actividad de despeje de señales verticales en sectores varios de la vía 74CR02 y en el PR83+0650 de la vía 9002.
- Se realizó la actividad de limpieza y despeje de basura en zona de carretera en el PR48+0500 de la vía 74CR02.
- Se realizó la actividad de limpieza de calzada en el PR83+0650 de la vía 9002.
- Se realizó la actividad de limpieza de descole en sectores varios de la vía 74CR02.
- Se realizó la actividad de bacheo en el PR33+0800 de la vía 74CR02.
- Se realizó la actividad de limpieza de disipador de energía en el PR26+0400, en el PR26+0450 y en el PR29+0700 de la vía 74CR02.
- Se realizó la actividad de aplomado de señal vertical en el PR7+0450 de la vía 74CR02.
RESUMEN

ID	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	UND	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	% EJECUCIÓN
1	ROCERIA Y DESMONTE MANUAL	Diaria	Ha	0,7	10,0	0,07	80%
2	LIMPIEZA DE CUNETAS	Diaria	ML	3840	72	53,33	90%
3	LIMPIEZA DE BERMAS	Diaria	ML	550	12	45,83	92%
4	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	Diaria	UND	17	25	0,68	95%
5	LIMPIEZA DE PUENTES	Quincenal	UND	1	8	0,13	95%
7	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ARBOLES	Diaria	UND	23	22	1	94%
9	CONTROL DE TRAFICO PESADO	Diaria	JORNAL	210	7	30	100%

OBSERVACIONES

- Durante el mes de marzo se deben incrementar los rendimientos para mejorar el indicador en la actividad de rocería.
- Se debe realizar donde se requiera el retiro manual de pequeños derrumbes de las cunetas en concreto y limpieza de bermas.
- Se debe continuar con la actividad de poda de ramas para despejar señales verticales y zona de carretera.
- En el mes de marzo se debe ejecutar la actividad de despeje y limpeza de zona de carretera como parte del ornato y embellecimiento de la vía.
- Se solicita verificar el estado de las obras de drenaje, puentes y pontones para programar la limpieza donde se requiera.
- Continuar priorizando la limpieza de bordes de calzada.



Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJOS ASOCIADOS DE LAS FLORES - COOTRAFLOR
ELIAS MANUEL VELASQUEZ LOPEZ
C.C. No. 15.030.359 de Lorica
Representante Legal



Nombre: COPEBA S.A.S
ANDREA DEL PILAR PEÑA SÁNCHEZ
C.C. No. 52.253.696 de Bogotá
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor - AMV G1

REGISTRO FOTOGRÁFICO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRAFLOR

ADMINISTRADOR VIAL:	COPEBA S.A.S	LOTE	1
CARRETERA:	74CR02: PUERTO REY - MOÑITOS - LORICA	SECTOR:	PUERTO REY - MOÑITOS - LORICA
FECHA:	02 - 08 DE FEBRERO DE 2026	PR´s:	VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

VÍA 74CR02; PUERTO REY - MOÑITOS - LORICA

DESCOLE DE AGUAS LLUVIA

VÍA 74CR02; PR33+0800

ANTES



DURANTE



RETIRO DE DERRUMBE

VÍA 74CR02; PR17+0680

ANTES



DESPUES



PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ARBOLES

VÍA 74CR02; PR14+0450

DURANTE



DESPUES



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRAFLOR

ADMINISTRADOR VIAL:	COPEBA S.A.S	LOTE	1
CARRETERA:	74CR02: PUERTO REY - MOÑITOS - LORICA	SECTOR:	PUERTO REY - MOÑITOS - LORICA
FECHA:	02 - 08 DE FEBRERO DE 2026	PR´s:	VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

VÍA 74CR02; PUERTO REY - MOÑITOS - LORICA

PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ARBOLES

VÍA 74CR02; PR47+0510

ANTES



DURANTE



PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ARBOLES

VÍA 74CR02; PR48+0500

ANTES



DESPUES



DESPEJE DE ZONA DE CARRETERA

VÍA 74CR02; PR49+0850

ANTES



DESPUES



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRAFLOR

ADMINISTRADOR VIAL:	COPEBA S.A.S	LOTE	1
CARRETERA:	74CR02: PUERTO REY - MOÑITOS - LORICA	SECTOR:	PUERTO REY - MOÑITOS - LORICA
FECHA:	02 - 08 DE FEBRERO DE 2026	PR´s:	VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

VÍA 74CR02; PUERTO REY - MOÑITOS - LORICA


PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ARBOLES

VÍA 74CR02; PR39+0100

ANTES



DESPUES

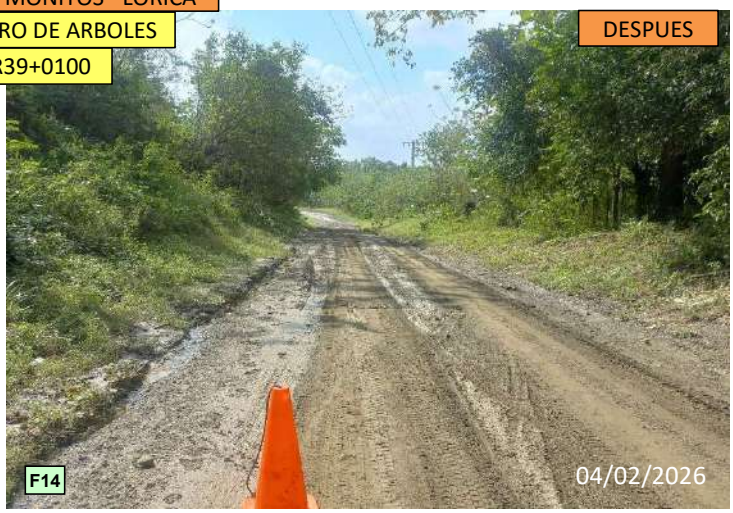

DESPEJE DE SEÑAL VERTICAL

VÍA 74CR02; PR16+0990

ANTES



DESPUES



DESPEJE DE SEÑAL VERTICAL

VÍA 74CR02; PR17+0080

ANTES



DESPUES



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRAFLOR

ADMINISTRADOR VIAL:	COPEBA S.A.S	LOTE	1
CARRETERA:	74CR02: PUERTO REY - MOÑITOS - LORICA	SECTOR:	PUERTO REY - MOÑITOS - LORICA
FECHA:	09 - 15 DE FEBRERO DE 2026	PR´s:	VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

VÍA 74CR02; PUERTO REY - MOÑITOS - LORICA

RETIRO DE VEGETACIÓN EN CAUCE DE PUENTE CAIMITO

VÍA 74CR02; PR51+0670

ANTES



DESPUES



LIMPIEZA DE CUNETA

VÍA 74CR02; PR51+0660

ANTES



DESPUES



LIMPIEZA DE CUNETA

VÍA 74CR02; PR50+0500

ANTES



DESPUES



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRAFLOR

ADMINISTRADOR VIAL:	**COPEBA S.A.S**	**LOTE**	**1**
CARRETERA:	**74CR02: PUERTO REY - MOÑITOS - LORICA**	**SECTOR:**	**PUERTO REY - MOÑITOS - LORICA**
FECHA:	**09 - 15 DE FEBRERO DE 2026**	**PR´s:**	**VARIOS**

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

VÍA 74CR02; PUERTO REY - MOÑITOS - LORICA

LIMPIEZA DE CALZADA

VÍA 74CR02; PR51+0665

ANTES



DESPUES



DESPEJE DE ZONA DE CARRETERA

VÍA 74CR02; PR47+0500

ANTES



DESPUES



DESCOLE

VÍA 74CR02; PR46+0500

ANTES



DESPUES



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRAFLOR

ADMINISTRADOR VIAL:	COPEBA S.A.S	LOTE	1
CARRETERA:	74CR02: PUERTO REY - MOÑITOS - LORICA	SECTOR:	PUERTO REY - MOÑITOS - LORICA
FECHA:	09 - 15 DE FEBRERO DE 2026	PR´s:	VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

VÍA 74CR02; PUERTO REY - MOÑITOS - LORICA


PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ARBOLES

VÍA 74CR02; PR46+0400

DURANTE



DESPUES

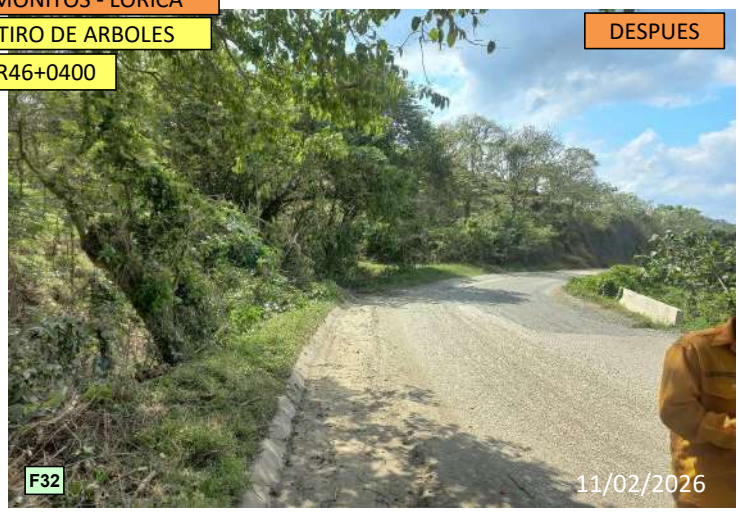

LIMPIEZA DE ZANJA DE CORONACIÓN

VÍA 74CR02; PR14+0300

ANTES



DESPUES



LIMPIEZA DE OBRA DE ARTE

VÍA 74CR02; PR30+0800

ANTES



DESPUES



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRAFLOR

ADMINISTRADOR VIAL:	COPEBA S.A.S	LOTE	1
CARRETERA:	74CR02: PUERTO REY - MOÑITOS - LORICA	SECTOR:	PUERTO REY - MOÑITOS - LORICA
FECHA:	09 - 15 DE FEBRERO DE 2026	PR´s:	VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

VÍA 74CR02; PUERTO REY - MOÑITOS - LORICA

LIMPIEZA DE CUNETA

VÍA 74CR02; PR30+0750

ANTES



DESPUES



PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ARBOLES

VÍA 74CR02; PR14+0400

ANTES



DESPUES



DESPEJE DE SEÑAL VERTICAL

VÍA 74CR02; PR47+0800

ANTES



DESPUES



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRAFLOR

ADMINISTRADOR VIAL:	COPEBA S.A.S	LOTE	1
CARRETERA:	74CR02: PUERTO REY - MOÑITOS - LORICA	SECTOR:	PUERTO REY - MOÑITOS - LORICA
FECHA:	09 - 15 DE FEBRERO DE 2026	PR´s:	VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

VÍA 74CR02; PUERTO REY - MOÑITOS - LORICA

LIMPIEZA DE CUNETA

VÍA 74CR02; PR48+0100

ANTES



DESPUES



PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ARBOLES

VÍA 74CR02; PR47+0700

ANTES



DESPUES



LIMPIEZA DE CUNETA

VÍA 74CR02; PR47+0800

ANTES



DESPUES



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRAFLOR

ADMINISTRADOR VIAL:	COPEBA S.A.S	LOTE	1
CARRETERA:	74CR02: PUERTO REY - MOÑITOS - LORICA	SECTOR:	PUERTO REY - MOÑITOS - LORICA
FECHA:	16 - 22 DE FEBRERO DE 2026	PR´s:	VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

VÍA 74CR02; PUERTO REY - MOÑITOS - LORICA

LIMPIEZA DE CUNETA

VÍA 74CR02; PR46+0900

ANTES



DESPUES



LIMPIEZA DE OBRA DE ARTE

VÍA 74CR02; PR25+0100

ANTES



DESPUES



LIMPIEZA DE OBRA DE ARTE

VÍA 74CR02; PR26+0000

ANTES



DESPUES



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRAFLOR

ADMINISTRADOR VIAL:	COPEBA S.A.S	LOTE	1
CARRETERA:	74CR02: PUERTO REY - MOÑITOS - LORICA	SECTOR:	PUERTO REY - MOÑITOS - LORICA
FECHA:	16 - 22 DE FEBRERO DE 2026	PR´s:	VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

VÍA 74CR02; PUERTO REY - MOÑITOS - LORICA

LIMPIEZA DE BERMA

VÍA 74CR02; PR29+0700

ANTES



DESPUES



LIMPIEZA DE CUNETA

VÍA 74CR02; PR24+0800

ANTES



DESPUES



LIMPIEZA DE OBRA DE ARTE

VÍA 74CR02; PR25+0050

ANTES



DESPUES



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRAFLOR

ADMINISTRADOR VIAL:	COPEBA S.A.S	LOTE	1
CARRETERA:	74CR02: PUERTO REY - MOÑITOS - LORICA	SECTOR:	PUERTO REY - MOÑITOS - LORICA
FECHA:	16 - 22 DE FEBRERO DE 2026	PR´s:	VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

VÍA 74CR02; PUERTO REY - MOÑITOS - LORICA

LIMPIEZA DE OBRA DE ARTE

VÍA 74CR02; PR26+0380

ANTES



DESPUES



LIMPIEZA DE BERMA

VÍA 74CR02; PR17+0200

ANTES



DESPUES



LIMPIEZA DE OBRA DE ARTE

VÍA 74CR02; PR16+0700

ANTES



DESPUES



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRAFLOR

ADMINISTRADOR VIAL:	COPEBA S.A.S	LOTE	1
CARRETERA:	74CR02: PUERTO REY - MOÑITOS - LORICA	SECTOR:	PUERTO REY - MOÑITOS - LORICA
FECHA:	16 - 22 DE FEBRERO DE 2026	PR´s:	VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

VÍA 74CR02; PUERTO REY - MOÑITOS - LORICA

APLOMADO DE SEÑAL VERTICAL

VÍA 74CR02; PR7+0450

ANTES



DESPUES



DESPEJE DE SEÑAL VERTICAL

VÍA 74CR02; PR49+0200

ANTES



DESPUES



LIMPIEZA DE CUNETA

VÍA 74CR02; PR49+0100

ANTES



DESPUES



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRAFLOR

ADMINISTRADOR VIAL:	COPEBA S.A.S	LOTE	1
CARRETERA:	74CR02: PUERTO REY - MOÑITOS - LORICA	SECTOR:	PUERTO REY - MOÑITOS - LORICA
FECHA:	23 - 28 DE FEBRERO DE 2026	PR´s:	VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

VÍA 74CR02; PUERTO REY - MOÑITOS - LORICA

ANTES

LIMPIEZA DE CUNETA

VÍA 74CR02; PR49+0300



DESPUES



ANTES

LIMPIEZA DE DISCIPADOR

VÍA 74CR02; PR26+0450



DESPUES



ANTES

LIMPIEZA DE OBRA DE ARTE

VÍA 74CR02; PR26+0400



DESPUES



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRAFLOR

ADMINISTRADOR VIAL:	COPEBA S.A.S	LOTE	1
CARRETERA:	74CR02: PUERTO REY - MOÑITOS - LORICA	SECTOR:	PUERTO REY - MOÑITOS - LORICA
FECHA:	23 - 28 DE FEBRERO DE 2026	PR´s:	VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

VÍA 74CR02; PUERTO REY - MOÑITOS - LORICA

ANTES

LIMPIEZA DE CUNETA

VÍA 74CR02; PR29+0700

DESPUES





ANTES

LIMPIEZA DE CUNETA

VÍA 74CR02; PR50+0100

DESPUES





DURANTE

CAPACITACIÓN COOPERATIVAS

HIGIENE POSTURAL E IMPORTANCIA DEL USO DE LOS EPP

DURANTE





INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRAFLOR

ADMINISTRADOR VIAL:	COPEBA S.A.S	LOTE	1
CARRETERA:	74CR02: PUERTO REY - MOÑITOS - LORICA	SECTOR:	PUERTO REY - MOÑITOS - LORICA
FECHA:	23 - 28 DE FEBRERO DE 2026	PR´s:	VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

VÍA 74CR02; PUERTO REY - MOÑITOS - LORICA

LIMPIEZA DE OBRA DE ARTE

VÍA 74CR02; PR31+0000

ANTES



DESPUES



ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

VÍA 74CR02; PR31+0100

ANTES



DESPUES



PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ARBOLES

VÍA 74CR02; PR48+0900

ANTES



DESPUES



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRAFLOR

ADMINISTRADOR VIAL:	COPEBA S.A.S		1
CARRETERA:	7401: PUERTO REY - MONTERIA	SECTOR:	PUERTO REY - MONTERIA
FECHA:	FEBRERO DE 2026	PR´s:	VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

VÍA 7401; PUERTO REY - MONTERIA

PRESENCIA DE PALETEROS - PUENTE ROJAS PINILLA

VÍA 7401; PR63+0450





PRESENCIA DE PALETEROS - PUENTE ROJAS PINILLA

VÍA 7401; PR63+0450



