Datos Notificación

Nombres/Apellidos: _____

No Identificación: _____

Fecha y Hora: _____

Nota: Los datos de este apartado solo serán diligenciados por la persona quien recibe este documento al momento de la notificación.

Bogotá, D.C.
583

Señor
JUAN SEBASTIÁN RIVERA REINO
Correo: jsriverar@secretariajuridica.gov.co
Bogotá D.C.

Asunto: Informe de cumplimiento de fallo

Referencia: Expediente 11001333400520190001900

Cordial saludo:

En atención a su solicitud relacionada con el cumplimiento del fallo de acción popular mencionado en el asunto, le informamos que se realizó la visita técnica el día 17 de febrero del 2026 al parque vecinal Supermanzana 1 con el código No 08-081 en la localidad de Kennedy, entre las calles 5 sur y 6 sur y las carreras 73 A Bis y 73 dando cumplimiento al numeral (i) del fallo. Personal técnico de esta dependencia observo lo siguiente:

1. Localización: Conforme a la cartografía oficial del distrito, el parque Kennedy Supermanzana 1, se localiza en la localidad de Kennedy, Unidad de Planeamiento Zonal UPL Kennedy, en el barrio Cervantes.



Fuente: Visor **Sistema Distrital de Parques y Escenarios - IDRD**

2. Gestiones adelantadas: en la visita técnica realizada por el personal técnico se evidencio dos tipos de sillas dentro del parque, banca sencilla o similar VI101-03 y banca rural o similar VI101-06. Se observo el deterioro de tres bancas tipo rural de madera, las cuales presentan fisuras y desprendimiento de material. Igualmente, se recorrieron los senderos peatonales internos con una extensión de 184 m2 y andenes con extensión de 414 m2, construidos en losa de concreto. Algunos segmentos de los senderos presentan superficies con desniveles, presencia de pasto y crecimiento de vegetación que invaden la

zona de circulación, lo cual afecta la accesibilidad y el tránsito peatonal. Asimismo, se observaron andenes externos con desgaste y fracturas que requieren intervención.
Adjunto al presente informe se el registro fotográfico de las zonas deterioradas, como soporte de las gestiones realizadas.

Tipo de bancas existentes en el parque



Imagen 1: banca sencilla o similar VI101-03



Imagen 2: banca rural o similar VI101-06

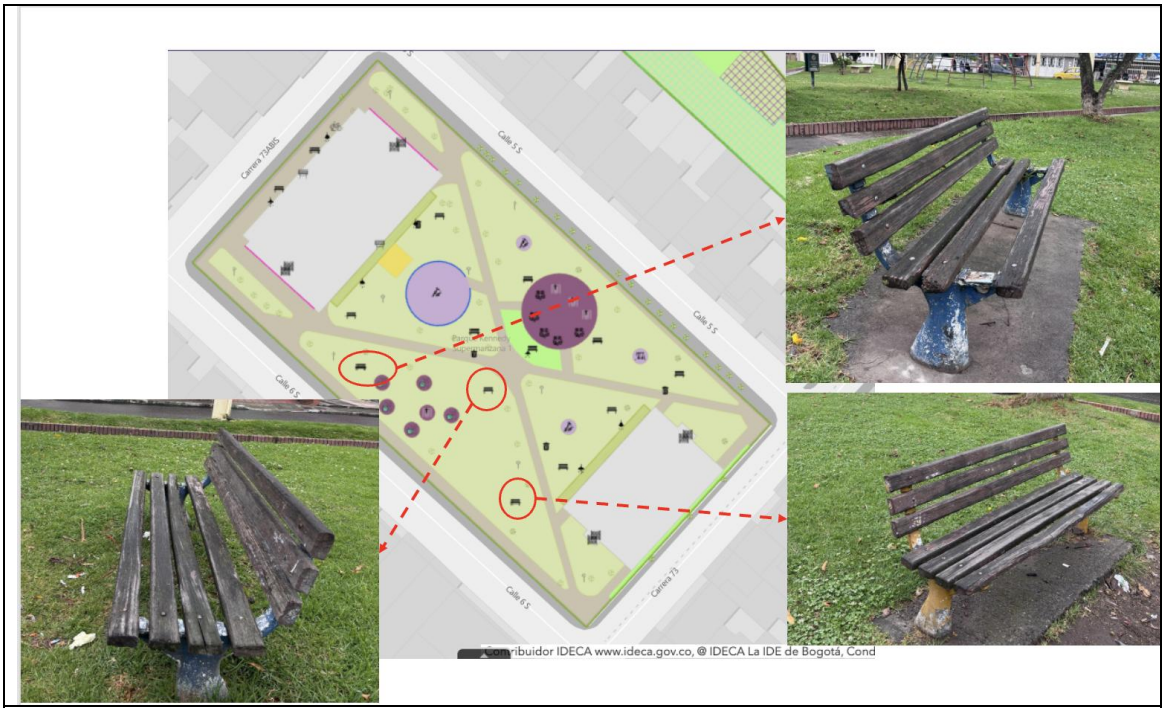
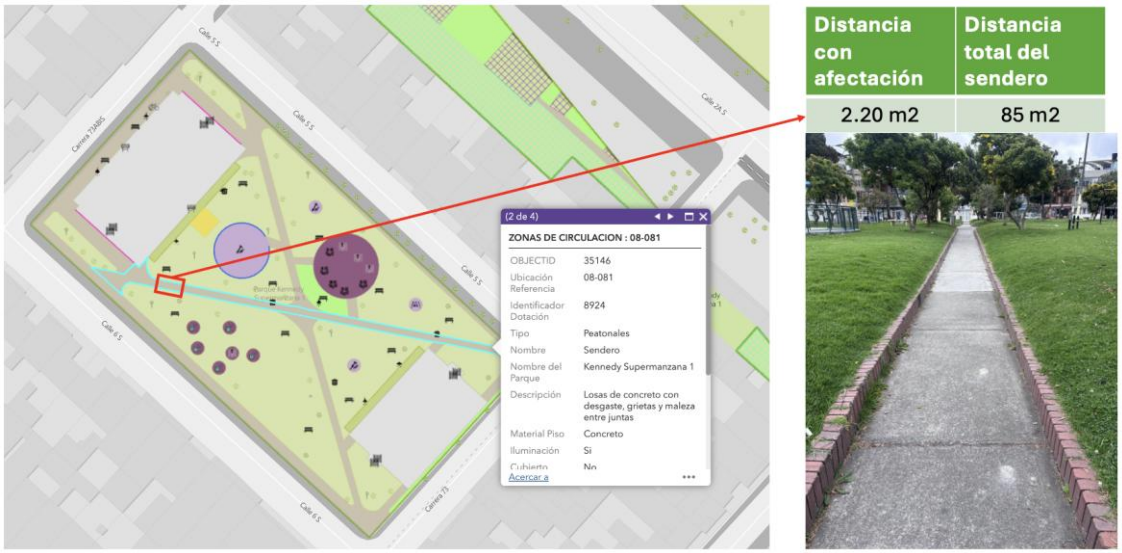
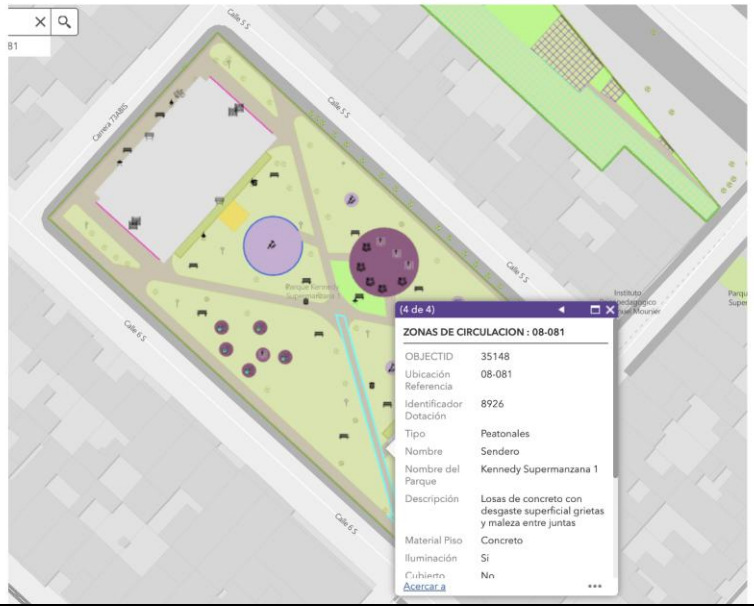


Imagen 3: Evidencia del estado de las tres bancas rural o similar VI101-06 y ubicación del mobiliario dentro del parque.



Distancia con afectación	Distancia total del sendero
2.20 m2	85 m2

Imagen 4. Evidencia del estado del sendero interno identificado en la imagen con afectación de crecimiento de maleza entre las losas de concreto.



Distancia con afectación	Distancia total del sendero
N/A	47m2

Imagen 5: el sendero interno identificado no presenta afectaciones.

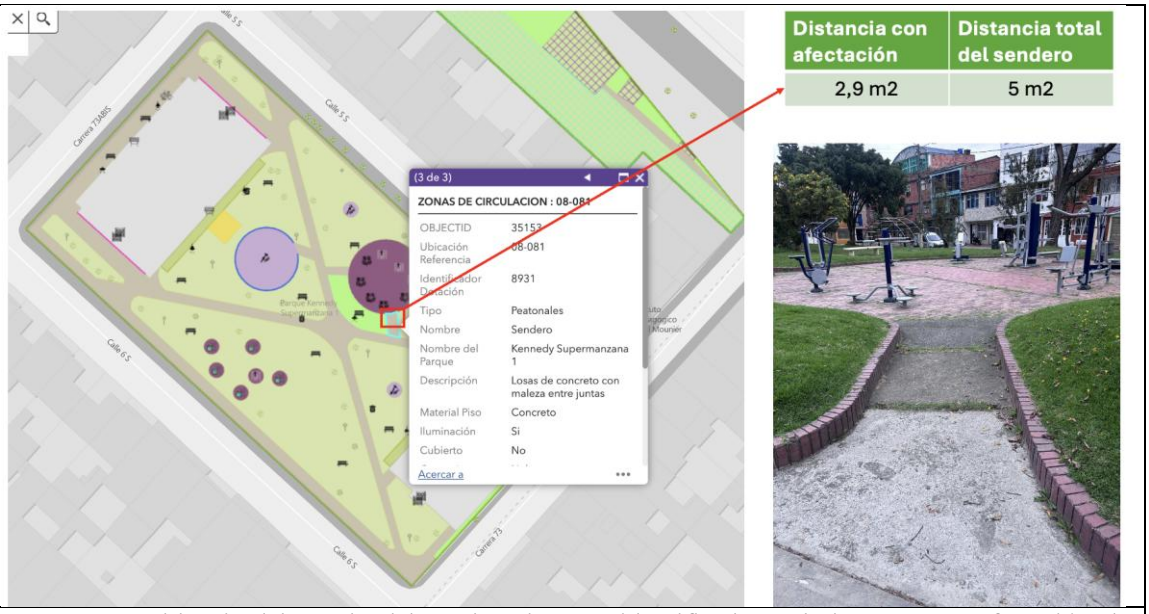


Imagen 6: Evidencia del estado del sendero interno identificado en la imagen con afectación de crecimiento de maleza entre las losas de concreto.

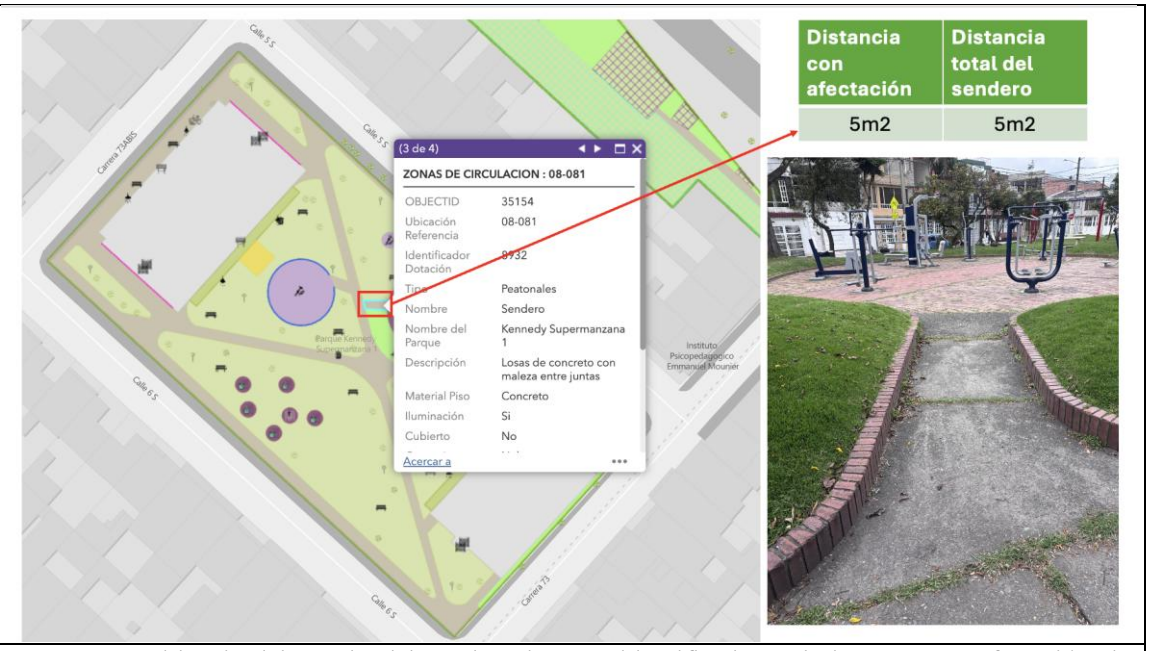


Imagen 7: Evidencia del estado del sendero interno identificado en la imagen con afectación de crecimiento de maleza entre las losas de concreto

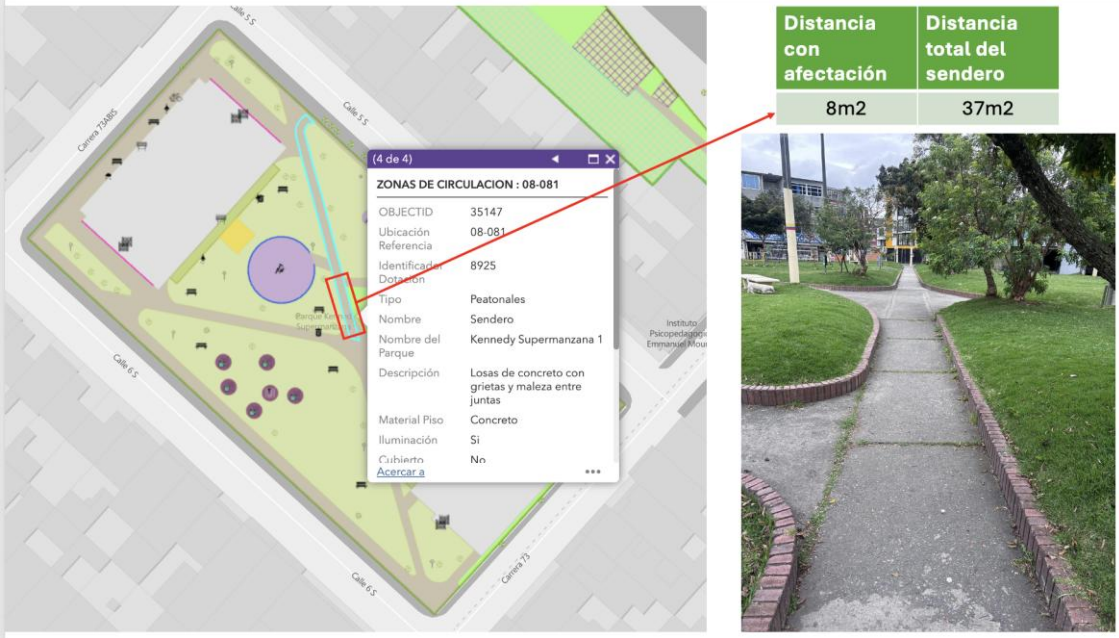
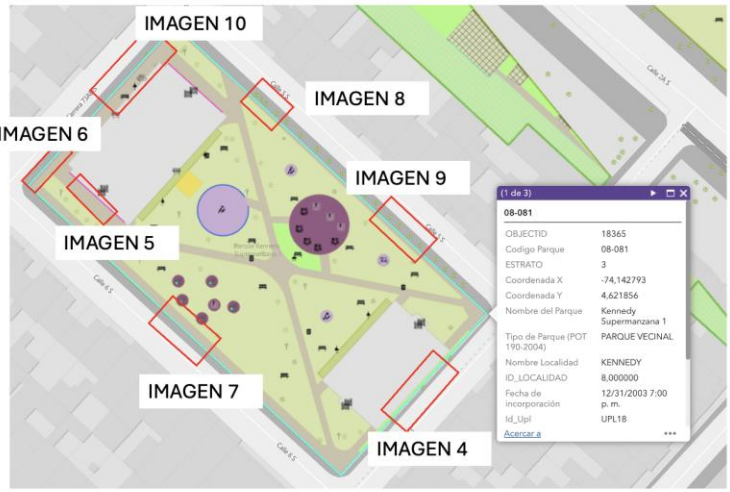


Imagen 8: : Evidencia del estado del sendero interno identificado en la imagen con afectación de crecimiento de maleza entre las losas de concreto.



TRAMO SENDERO EXTERNO CRA 73

Distancia con afectación	Distancia total del sendero
5,4m2	70 m2

TRAMO SENDERO EXTERNO CALLE 5 SUR

IMAGEN	Distancia con afectación	Distancia total del sendero
8	8,1 m2	
9	2,7 m2	
Total	10,8 m2	133 m2

TRAMO SENDERO EXTERNO CALLE 73a

IMAGEN	Distancia con afectación	Distancia total del sendero
10 y 6	73,5 m2	73,5 m2

TRAMO SENDERO EXTERNO CALLE 6 SUR

IMAGEN	Distancia con afectación	Distancia total del sendero
5	8,1 m2	
7	16 m2	
Total	24,1 m2	138 m2

Gráfico: Evidencia del estado de cada uno de los senderos externos identificados en la imagen con afectación de crecimiento de maleza entre las losas de concreto, fisuras y elevaciones

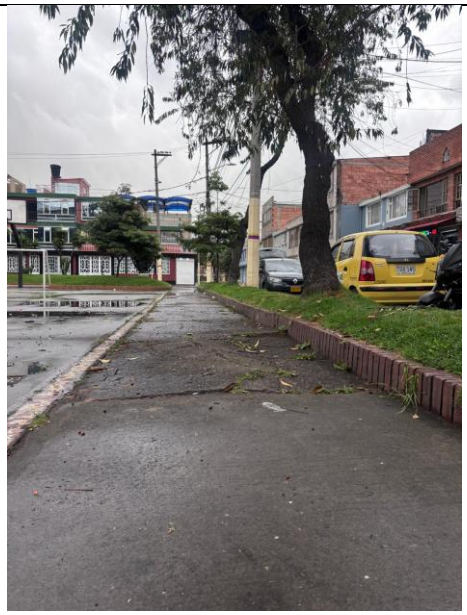
	
Imagen 4: Evidencia de referencia de desnivel losa	Imagen 5: Evidencia de referencia crecimiento de vegetación en sendero interior
	
Imagen 6: Evidencia de referencia estado de andenes externos	Imagen 7: Evidencia de referencia estado del sendero peatonales externo del parque



Imagen 8: Evidencia de desnivel de losa

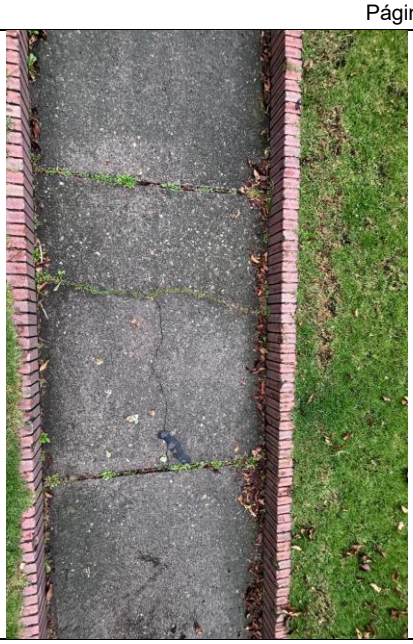


Imagen 9: Evidencia de fisura de losa



Imagen 10: Evidencia de referencia de fisura de las losas por el tramo de a KR 73A

	
Imagen 10: Evidencia de referencia del estado actual de los senderos	Imagen 11: Evidencia de referencia histórica del antiguo estado de los senderos Fuente: Viso del IDRD

Del análisis realizado se evidencia que, aunque los senderos internos del parque cuentan con una extensión de 184 metros, únicamente 18,1 m² presentan afectaciones por crecimiento de maleza dentro de las losas, lo que representa un deterioro puntual. En contraste, los senderos externos, con un área total de 414 m², muestran afectaciones más significativas, con 107 m² comprometidos por fisuras y presencia de maleza entre las juntas. Estas condiciones reflejan un desgaste progresivo de la infraestructura peatonal.

Con lo anterior, la Alcaldía Local de Kennedy da cumplimiento a lo dispuesto en el fallo y continuará informando oportunamente sobre el avance de las etapas siguientes.

Cordial saludo,

ARNULFO GARCÍA
Profesional Especializado Código 222 Grado 24
Gestión Policiva – Alcaldía Local de Kennedy
cdi.kennedy@gobiernobogota.gov.co

Proyectó: Angie Liliana Albarracín – Contratista
Revisó: Henry Arturo Caicedo Profesional Universitario - Grado 14
