ERNAN RAMOS VILLAMIL S.A.S. INGENIERIA CIVIL- ESTUDIOS DE SUELO.	**REGISTRO DE PERFORACIONES ENSAYO SPT I.N.V. E-111**	**SL-15** **VER 01** **FECHA DE ACTUALIZACION 01-08-2014**

PARA: **CONSORCIO DISEÑOS JUZGADOS**	**Sondeo Nº 1**	HOJA:	**1**
PROYECTO: **ADECUACIÓN DE LA SEDE DEL JUZGADO ESTRUCTURA DE UNA PLANTA**		DE:	**3**
CIUDAD: **MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD, SUCRE**	FECHA INICIO: **19/05/2017**		
DIRECCION: **CARRERA 13 No. 12-55B, CALLE EL COMERCIO**			

PROFUND. MTS.	U.S.C.	SIMBOLO	MATERIAL	MUESTRA NUMERO	MUESTRA TIPO
0,00mts					
0,10mts					
0,60mts	CL		Relleno en arcilla arenosa, color gris claro, baja plasticidad y consistencia blanda.	1	
2,00mts	SC		Arena arcilla de color rojizo, baja plasticidad y compacidad suelta.	2	
N.F					
4,00mts	SP-SC		Arena gruesa no plastica con particulas de arcilla, color gris claro y compacidad compacta.	3	

PENETRACIÓN GOLPES/30 CMS

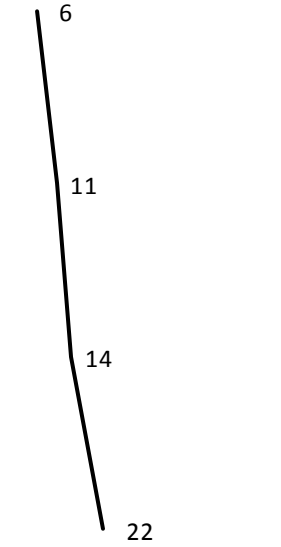

CONTENIDO DE HUMEDAD - W (%)

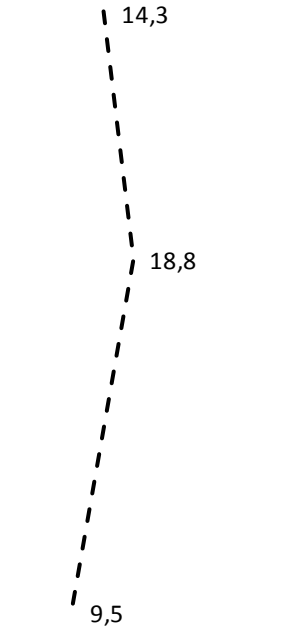

EQUIPO:		NIVEL DE AGUA	**OBSERVACIONES**
MARTILLO:	70 Kgs	NFA: **2,00 Mts**	
CAIDA:	0,75 mts		

ERNAN RAMOS VILLAMIL S.A.S.
INGENIERIA CIVIL- ESTUDIOS DE SUELO.

REGISTRO DE PERFORACIONES ENSAYO SPT I.N.V. E-111

SL-15
VER 01
FECHA DE ACTUALIZACION 01-08-2014

PARA: **CONSORCIO DISEÑOS JUZGADOS**

Sondeo Nº 2

HOJA: **2**
DE: **3**

PROYECTO: **ADECUACIÓN DE LA SEDE DEL JUZGADO ESTRUCTURA DE UNA PLANTA**

CIUDAD: **MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD, SUCRE**

FECHA INICIO: **19/05/2017**

DIRECCION: **CARRERA 13 No. 12-55B, CALLE EL COMERCIO**

PROFUND. MTS.	U.S.C.	SIMBOLO	MATERIAL	MUESTRA NUMERO	MUESTRA TIPO
0,00mts					
0,20mts					
0,60mts	SC-SM		Relleno en arena arcillo-limosa de color rojo, baja plasticidad y compacidad suelta.	1	
0,90mts	SC		Arena arcillosa color rojizo, baja plasticidad y compacta.	2	
2,00mts	SC		Arena arcillosa de color rojizo, baja plasticidad y compacidad compacta.	3	
N.F	SP-SC		Arena con particulas de arcilla, color amarillo, no plástica y compacidad compacta.	4	
4,50mts	CL		Arcilla arenosa de color amarillo con gris claro, mediana plasticidad y consistencia compacta.	5	
6,00mts					

PENETRACIÓN GOLPES/30 CMS

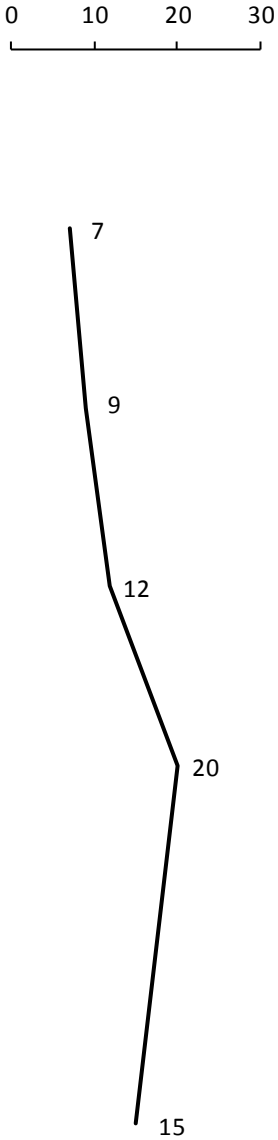

CONTENIDO DE HUMEDAD - W (%)

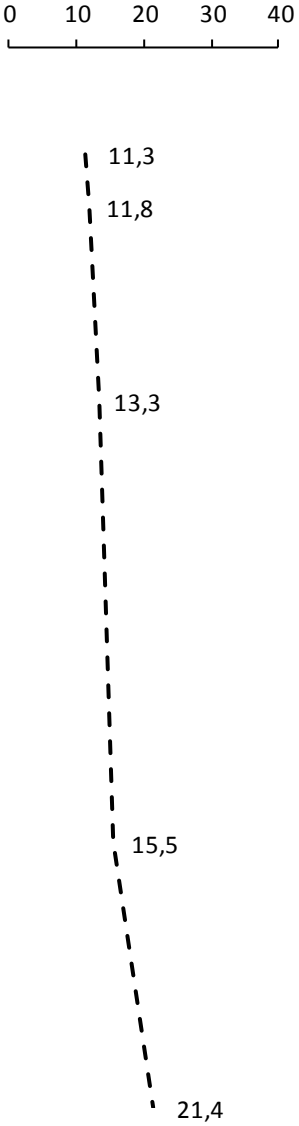

EQUIPO:
MARTILLO: 70 Kgs
CAIDA: 0,75 mts

NIVEL DE AGUA
NFA: **2,00 Mts**

OBSERVACIONES

ERNAN RAMOS VILLAMIL S.A.S. INGENIERIA CIVIL- ESTUDIOS DE SUELO.	**REGISTRO DE PERFORACIONES ENSAYO SPT I.N.V. E-111**	**SL-15** **VER 01** **FECHA DE ACTUALIZACION 01-08-2014**

PARA: **CONSORCIO DISEÑOS JUZGADOS**	**Sondeo Nº 3**	HOJA: **3**
PROYECTO: **ADECUACIÓN DE LA SEDE DEL JUZGADO ESTRUCTURA DE UNA PLANTA**		DE: **3**
CIUDAD: **MUNICIPIO LA VILLA DE SAN BENITO ABAD**	FECHA INICIO: **19/05/2017**	
DIRECCION: **CARRERA 13 No. 12-55B, CALLE EL COMERCIO**		

PROFUND. MTS.	U.S.C.	SIMBOLO	MATERIAL	MUESTRA NUMERO	MUESTRA TIPO
0,00mts					
0,10mts					
0,70mts	SC		Relleno en arena arcillosa de color gris claro, baja plasticidad y compacidad suelta.	1	
1,30mts	SC		Arena arcillosa de color gris claro, mediana plasticidad y compacidad suelta.	2	
2,00mts	SC		Arena arcillosa de color gris claro, media baja plasticidad y compacidad compacta.	3	
N.F 2,50mts					
4,50mts	SP-SC		Arena no pástica con particulas de arcilla, color gris claro y compacidad compacta.	4	
6,00mts	CL		Arcilla arenosa de color amarillo con gris claro, mediana plasticidad y consistencia compacta.	5	

PENETRACIÓN GOLPES/30 CMS

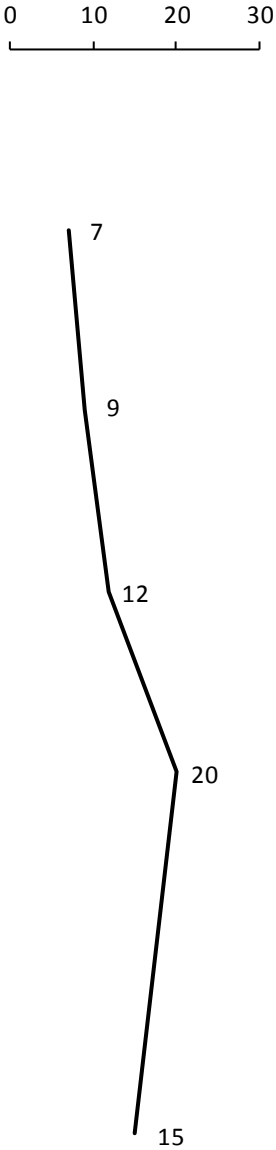

CONTENIDO DE HUMEDAD - W (%)

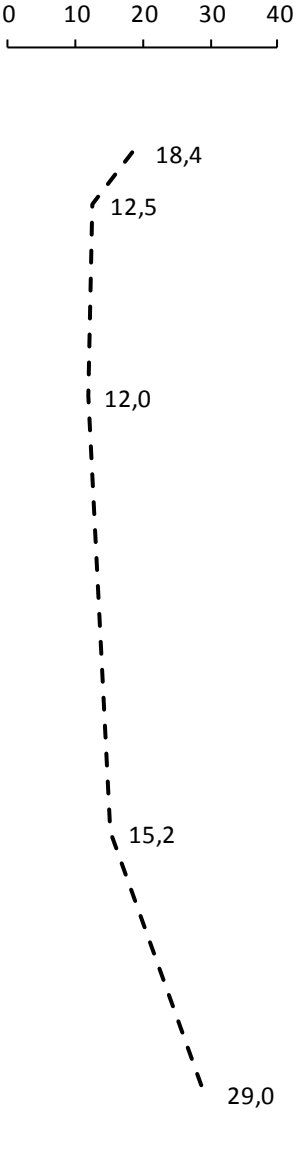

EQUIPO:		NIVEL DE AGUA	**OBSERVACIONES**
MARTILLO:	70 Kgs	NFA:	**2,00 Mts**
CAIDA:	0,75 mts		
