Construciviles Elite S.A.S.

DIAGNÓSTICO Y AUTORIZACIÓN DE SERVICIOS Y/O REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMATOR MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA- CONTRATO CD 552-2025

1. DATOS DEL VEHICULO O MOTOR

Descripción vehículo: TOYOTA PRADO
Placa: OJG-736
Fecha del mantenimiento: 29/12/2025

2. ESTADO GENERAL DEL VEHÍCULO

Con base en la inspección mecánica, eléctrico y estructural realizada, se identifican las siguientes necesidades de mantenimiento general

Ítem	Descripción del servicio y/o repuesto requerido	Justificación técnica
1	ALINEACIÓN, BALANCEO Y ROTACION	Se evidenció desgaste irregular en las llantas y leve vibración durante la marcha, indicando desalineación y desbalanceo, por lo que se recomienda realizar alineación, balanceo y rotación.
2	GRADUACION DE FRENO	Se detectó recorrido excesivo del pedal y frenado irregular, evidenciando desajuste en el sistema de frenos que requiere graduación para un funcionamiento adecuado.
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLES	Durante la revisión del sistema eléctrico se encontraron fusibles deteriorados y algunos circuitos sin funcionamiento adecuado, requiriendo su reemplazo.

1. SERVICIOS Y/O REPUESTOS REQUERIDOS

SECRETARIA	DESCRIPCION VEHICULO	PLACA	DESCRIPCION DEL SERVICIO O REPUESTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	TOTAL
SECRETARIA GENERAL	TOYOTA PRADO	OJG-736	ALINEACIÓN, BALANCEO Y ROTACION	1	$162.000	$30.780	$192.780
SECRETARIA GENERAL	TOYOTA PRADO	OJG-736	GRADUACION DE FRENO	1	$86.400	$16.416	$102.816

Construciviles Elite S.A.S.

SECRETARIA GENERAL	TOYOTA PRADO	OJG-736	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLES	1	$23.760	$4.514	$28.274

2. MANO DE OBRA NO CONTEMPLADA EN LA PROPUESTA ECONÓMICA

Una vez realizado el diagnóstico, adicional a los ítems relacionados anteriormente, SI NO X se *identificaron labores de mano de obra*, las cuales no se encuentran contempladas en la propuesta económica del contrato vigente. En caso afirmativo, a continuación, se detallan las labores

ESPECIFICACIONES MANO DE OBRA NO CONTEMPLADA EN LA PROPUESTA ECONÓMICA	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	TOTAL

3. CONCLUSIÓN

El vehículo presenta condiciones que requieren de los servicios y/o repuestos detallados anteriormente. Debido a lo anterior, se solicita la autorización y aprobación del supervisor para proceder con las acciones correctivas necesarias.

Firmas

Nombre y firma del Contratista

LUIS SANTIAGO GÓMEZ SABOYÁ
C.C. 79.785.101 de Bogotá
Representante Legal de CONSTRUCIVILES ELITE S.A.S.
Nit: 800.165.517-6

Firma del supervisor que autoriza:

Construciviles Elite S.A.S.

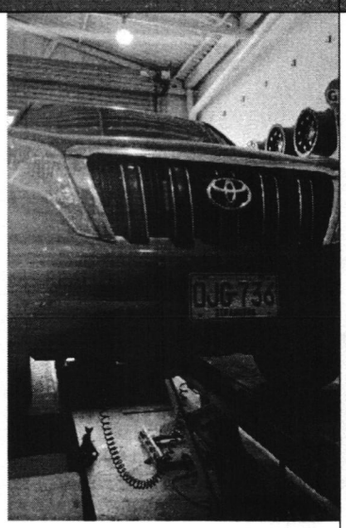
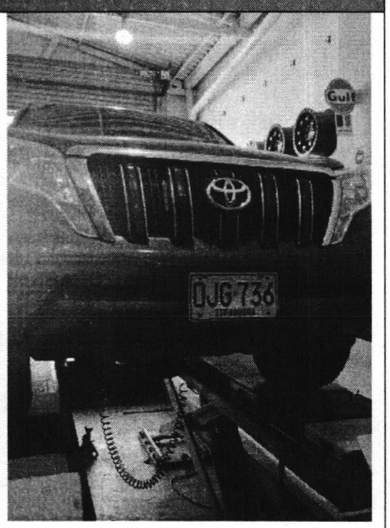
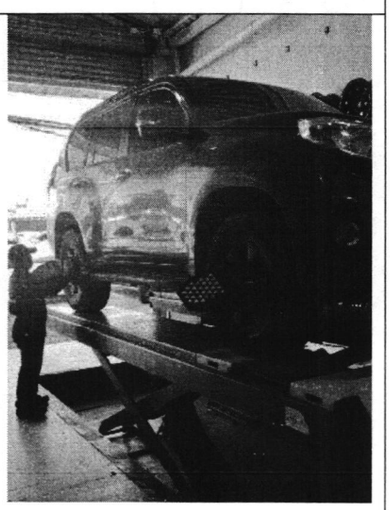
INFORME DE REPARACIONES REALIZADAS Y REPUESTOS SUMINISTRADOS

Vehículo o Moto: TOYOATA

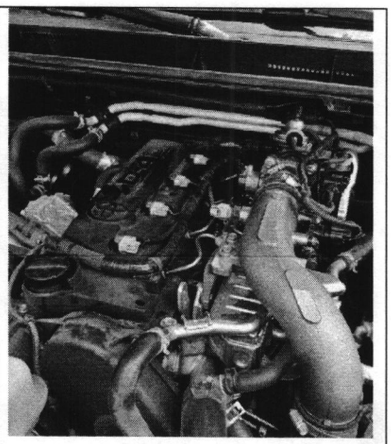
Placa: OJG-736

Fecha del mantenimiento: 29/12/2025

Justificación y registro fotográfico de los suministros y servicios realizados

Justificación técnica del servicio y/o repuesto	Descripción del servicio y/o repuesto suministrado	Registro fotográfico (estado inicial)	Registro fotográfico (estado final)
Se realizó el servicio de alineación, balanceo y rotación de llantas, corrigiendo los ángulos de dirección y eliminando vibraciones durante la marcha. El vehículo quedó operando con mayor estabilidad y desgaste uniforme de las llantas.	ALINEACIÓN, BALANCEO Y ROTACION		
Se efectuó la graduación del sistema de frenos, ajustando los componentes para lograr un frenado uniforme y seguro. El sistema quedó funcionando correctamente dentro de los parámetros normales.	GRADUACION DE FRENO		

Construciviles Elite S.A.S.

Se realizó el reemplazo de los fusibles defectuosos, restableciendo el correcto funcionamiento de los circuitos eléctricos del vehículo.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLES		

FIRMA DEL CONTRATISTA

LUIS SANTIAGO GÓMEZ SABOYÁ
C.C. 79.785.101 de Bogotá
Representante Legal de CONSTRUCIVILES ELITE S.A.S.
Nit:800.165.517-6

Construciviles Elite S.A.S.

DIAGNÓSTICO Y AUTORIZACIÓN DE SERVICIOS Y/O REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMATOR MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA- CONTRATO CD 552-2025

1. DATOS DEL VEHICULO O MOTOR

Descripción vehículo: MOTO
Placa: JKB
Fecha del mantenimiento: 29/12/2025

2. ESTADO GENERAL DEL VEHÍCULO

Con base en la inspección mecánica, eléctrico y estructural realizada, se identifican las siguientes necesidades de mantenimiento general

Ítem	Descripción del servicio y/o repuesto requerido	Justificación técnica
1	SERVICIO DE ALINEACIÓN, BALANCEO Y ROTACION	Se evidenció desgaste irregular en las llantas y leve vibración durante la marcha, indicando desalineación y desbalanceo, por lo que se recomienda realizar alineación, balanceo y rotación.

1. SERVICIOS Y/O REPUESTOS REQUERIDOS

SECRETARIA	DESCRIPCION VEHICULO	PLACA	DESCRIPCION DEL SERVICIO O REPUESTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	TOTAL
SECRETARIA GENERAL	MOTO	JKB	SERVICIO DE ALINEACIÓN, BALANCEO Y ROTACION	1	$70.000	$13.300	$83.300

2. MANO DE OBRA NO CONTEMPLADA EN LA PROPUESTA ECONÓMICA

Una vez realizado el diagnóstico, adicional a los ítems relacionados anteriormente, SI NO X se *identificaron labores de mano de obra*, las cuales no se encuentran contempladas en la propuesta económica del contrato vigente. En caso afirmativo, a continuación, se detallan las labores

ESPECIFICACIONES MANO DE	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	TOTAL

Construciviles Elite S.A.S.

OBRA NO CONTEMPLADA EN LA PROPUESTA ECONÓMICA

3. CONCLUSIÓN

El vehículo presenta condiciones que requieren de los servicios y/o repuestos detallados anteriormente. Debido a lo anterior, se solicita la autorización y aprobación del supervisor para proceder con las acciones correctivas necesarias.

Firmas

Nombre y firma del Contratista

LUIS SANTIAGO GÓMEZ SABOYÁ
C.C. 79.785.101 de Bogotá
Representante Legal de CONSTRUCIVILES ELITE S.A.S.
Nit: 800.165.517-6

Firma del supervisor que autoriza:

Construciviles Elite S.A.S.

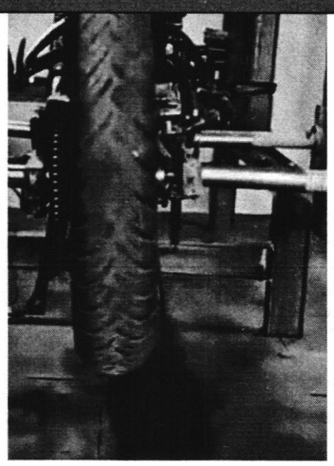
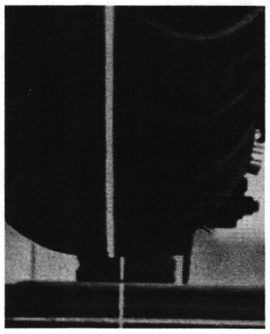
INFORME DE REPARACIONES REALIZADAS Y REPUESTOS SUMINISTRADOS

Vehículo o Moto: MOTO

Placa: JKB

Fecha del mantenimiento: 29/12/2025

Justificación y registro fotográfico de los suministros y servicios realizados

Justificación técnica del servicio y/o repuesto	Descripción del servicio y/o repuesto suministrado	Registro fotográfico (estado inicial)	Registro fotográfico (estado final)
Se realizó el servicio de alineación, balanceo y rotación de llantas, corrigiendo los ángulos de dirección y eliminando vibraciones durante la marcha. El vehículo quedó operando con mayor estabilidad y desgaste uniforme de las llantas.	ALINEACIÓN, BALANCEO Y ROTACION		

FIRMA DEL CONTRATISTA

LUIS SANTIAGO GÓMEZ SABOYÁ
C.C. 79.785.101 de Bogotá
Representante Legal de CONSTRUCIVILES ELITE S.A.S.
Nit:800.165.517-6

Construciviles Elite S.A.S.

DIAGNÓSTICO Y AUTORIZACIÓN DE SERVICIOS Y/O REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMATOR MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA- CONTRATO CD 552-2025

1. DATOS DEL VEHICULO O MOTOR

Descripción vehículo: BUSETA CHEVROLET NPR
Placa: OJG-535
Fecha del mantenimiento: 26/12/2025

2. ESTADO GENERAL DEL VEHÍCULO

Con base en la inspección mecánica, eléctrico y estructural realizada, se identifican las siguientes necesidades de mantenimiento general

Ítem	Descripción del servicio y/o repuesto requerido	Justificación técnica
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBILLOS LED EXPLORADORAS	Durante la inspección se evidenció bajo nivel de iluminación en las luces exploradoras debido al desgaste y falla de los bombillos existentes, afectando la visibilidad en condiciones de poca luz. Se recomienda el suministro e instalación de bombillos LED para mejorar la iluminación y la seguridad en la operación del vehículo.

1. SERVICIOS Y/O REPUESTOS REQUERIDOS

SECRETARIA	DESCRIPCION VEHICULO	PLACA	DESCRIPCION DEL SERVICIO O REPUESTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	TOTAL
SECRETARIA GENERAL	TOYOTA	OJG-609	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBILLOS LED EXPLORADORAS	1	$134.222	$25.502	$159.724

2. MANO DE OBRA NO CONTEMPLADA EN LA PROPUESTA ECONÓMICA

Una vez realizado el diagnóstico, adicional a los ítems relacionados anteriormente, SI NO X se *identificaron labores de mano de obra*, las cuales no se encuentran contempladas en la propuesta económica del contrato vigente. En caso afirmativo, a continuación, se detallan las labores

Construciviles Elite S.A.S.

ESPECIFICACIONES MANO DE OBRA NO CONTEMPLADA EN LA PROPUESTA ECONÓMICA	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	TOTAL

3. CONCLUSIÓN

El vehículo presenta condiciones que requieren de los servicios y/o repuestos detallados anteriormente. Debido a lo anterior, se solicita la autorización y aprobación del supervisor para proceder con las acciones correctivas necesarias.

Firmas

Nombre y firma del Contratista

LUIS SANTIAGO GÓMEZ SABOYÁ
C.C. 79.785.101 de Bogotá
Representante Legal de CONSTRUCIVILES ELITE S.A.S.
Nit: 800.165.517-6

Firma del supervisor que autoriza:

Construciviles Elite S.A.S.


INFORME DE REPARACIONES REALIZADAS Y REPUESTOS SUMINISTRADOS

Vehículo o Moto: BUSETA CHEVROLET NPR

Placa: OJG 535

Fecha del mantenimiento: 26/12/2025

Justificación y registro fotográfico de los suministros y servicios realizados

Justificación técnica del servicio y/o repuesto	Descripción del servicio y/o repuesto suministrado	Registro fotográfico (estado inicial)	Registro fotográfico (estado final)
Se realizó el suministro e instalación de bombillos LED en las luces exploradoras del bus, reemplazando los elementos deteriorados. Se verificó su correcto funcionamiento, mejorando la iluminación y garantizando adecuadas condiciones de visibilidad y seguridad durante la operación del vehículo.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBILLOS LED EXPLORADORAS		

FIRMA DEL CONTRATISTA

LUIS SANTIAGO GÓMEZ SABOYÁ
C.C. 79.785.101 de Bogotá
Representante Legal de CONSTRUCIVILES ELITE S.A.S.
Nit:800.165.517-6

Construciviles Elite S.A.S.

DIAGNÓSTICO Y AUTORIZACIÓN DE SERVICIOS Y/O REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMATOR MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA- CONTRATO CD 552-2025

1. DATOS DEL VEHICULO O MOTOR

Descripción vehículo: TOYOTA
Placa: OJG-609
Fecha del mantenimiento: 26/12/2025

2. ESTADO GENERAL DEL VEHÍCULO

Con base en la inspección mecánica, eléctrico y estructural realizada, se identifican las siguientes necesidades de mantenimiento general

Ítem	Descripción del servicio y/o repuesto requerido	Justificación técnica
1	GRADUACIÓN FRENO	**Se detectó recorrido excesivo del pedal y frenado irregular, evidenciando desajuste en el sistema de frenos que requiere graduación para un funcionamiento adecuado.**

1. SERVICIOS Y/O REPUESTOS REQUERIDOS

SECRETARIA	DESCRIPCION VEHICULO	PLACA	DESCRIPCION DEL SERVICIO O REPUESTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	TOTAL
SECRETARIA GENERAL	TOYOTA	OJG-609	GRADUACION DE FRENO	1	$70.000	$13.300	$83.300

2. MANO DE OBRA NO CONTEMPLADA EN LA PROPUESTA ECONÓMICA

Una vez realizado el diagnóstico, adicional a los ítems relacionados anteriormente, SI NO X se *identificaron labores de mano de obra*, las cuales no se encuentran contempladas en la propuesta económica del contrato vigente. En caso afirmativo, a continuación, se detallan las labores

ESPECIFICACIONES MANO DE	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	TOTAL

Construciviles Elite S.A.S.

OBRA NO CONTEMPLADA EN LA PROPUESTA ECONÓMICA					

3. CONCLUSIÓN

El vehículo presenta condiciones que requieren de los servicios y/o repuestos detallados anteriormente. Debido a lo anterior, se solicita la autorización y aprobación del supervisor para proceder con las acciones correctivas necesarias.

Firmas

Nombre y firma del Contratista

LUIS SANTIAGO GÓMEZ SABOYÁ
C.C. 79.785.101 de Bogotá
Representante Legal de CONSTRUCIVILES ELITE S.A.S.
Nit: 800.165.517-6

Firma del supervisor que autoriza:

Construciviles Elite S.A.S.

INFORME DE REPARACIONES REALIZADAS Y REPUESTOS SUMINISTRADOS

Vehículo o Moto: TOYOTA

Placa: OJG-609

Fecha del mantenimiento: 26/12/2025

Justificación y registro fotográfico de los suministros y servicios realizados

Justificación técnica del servicio y/o repuesto	Descripción del servicio y/o repuesto suministrado	Registro fotográfico (estado inicial)	Registro fotográfico (estado final)
Se efectuó la graduación del sistema de frenos, ajustando los componentes para lograr un frenado uniforme y seguro. El sistema quedó funcionando correctamente dentro de los parámetros normales.	GRADUACION DE FRENO		

FIRMA DEL CONTRATISTA

LUIS SANTIAGO GÓMEZ SABOYÁ
C.C. 79.785.101 de Bogotá
Representante Legal de CONSTRUCIVILES ELITE S.A.S.
Nit:800.165.517-6

Construciviles Elite S.A.S.

DIAGNÓSTICO Y AUTORIZACIÓN DE SERVICIOS Y/O REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMATOR MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA- CONTRATO CD 552-2025

1. DATOS DEL VEHICULO O MOTOR

Descripción vehículo: BUS CHEVROLET FRR
Placa: OJG-740
Fecha del mantenimiento: 26/12/2025

2. ESTADO GENERAL DEL VEHÍCULO

Con base en la inspección mecánica, eléctrico y estructural realizada, se identifican las siguientes necesidades de mantenimiento general

Ítem	Descripción del servicio y/o repuesto requerido	Justificación técnica
1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO Y MANTENIMIENTO ELÉCTRICO	Se evidenciaron fallas intermitentes en el sistema eléctrico general, incluyendo conexiones sulfatadas y cables deteriorados que afectaban el funcionamiento adecuado de los componentes eléctricos.
2	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAJA DE CAMBIOS PARCIAL	Se detectaron dificultades en el cambio de marchas y ruidos anormales durante la operación, evidenciando desgaste en algunos componentes internos de la caja que requerían intervención parcial.
3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PUERTAS DE ACCESO	Se observó dificultad en la apertura y cierre de las puertas de acceso debido a desgaste en mecanismos y desajustes en bisagras y sistemas de accionamiento..
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SONIDO	Se identificaron fallas en el sistema de sonido, incluyendo bajo funcionamiento de parlantes y conexiones defectuosas que afectaban la correcta emisión de audio.
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CHAPA Y/O CERRADURA	Se evidenció desgaste y mal funcionamiento en la chapa y cerradura, dificultando el cierre seguro y adecuado de los compartimientos y puertas del vehículo.

Construciviles Elite S.A.S.

	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE VIGIA	Se detectaron fallas en el sistema de vigía del vehículo, presentando lecturas inestables o ausencia de señal en algunos sensores, lo que afectaba el monitoreo adecuado de la operación.

1. SERVICIOS Y/O REPUESTOS REQUERIDOS

SECRETARIA	DESCRIPCION VEHICULO	PLACA	DESCRIPCION DEL SERVICIO O REPUESTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	TOTAL
SECRETARIA GENERAL	BUS CHEVROLET FRR	OJG-740	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO Y MANTENIMIENTO ELÉCTRICO	1	$518.400	$98.496	$616.896
SECRETARIA GENERAL	BUS CHEVROLET FRR	OJG-740	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAJA DE CAMBIOS PARCIAL	1	$5.022.000	$954.180	$5.976.180
SECRETARIA GENERAL	BUS CHEVROLET FRR	OJG-740	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PUERTAS DE ACCESO	1	$352.457	$66.967	$419.424
SECRETARIA GENERAL	BUS CHEVROLET FRR	OJG-740	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SONIDO	1	$216.000	$41.040	$257.040
SECRETARIA GENERAL	BUS CHEVROLET FRR	OJG-740	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CHAPA Y/O CERRADURA	1	$200.556	$38.106	$238.662
SECRETARIA GENERAL	BUS CHEVROLET FRR	OJG-740	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE VIGIA	1	$216.000	$41.040	$257.040

2. MANO DE OBRA NO CONTEMPLADA EN LA PROPUESTA ECONÓMICA

Una vez realizado el diagnóstico, adicional a los ítems relacionados anteriormente, SI NO X se *identificaron labores de mano de obra*, las cuales no se encuentran contempladas en la propuesta económica del contrato vigente. En caso afirmativo, a continuación, se detallan las labores

ESPECIFICACIONES MANO DE	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	TOTAL

Construciviles Elite S.A.S.

OBRA NO CONTEMPLADA EN LA PROPUESTA ECONÓMICA					

3. CONCLUSIÓN

El vehículo presenta condiciones que requieren de los servicios y/o repuestos detallados anteriormente. Debido a lo anterior, se solicita la autorización y aprobación del supervisor para proceder con las acciones correctivas necesarias.

Firmas

Nombre y firma del Contratista

LUIS SANTIAGO GÓMEZ SABOYÁ
C.C. 79.785.101 de Bogotá
Representante Legal de CONSTRUCIVILES ELITE S.A.S.
Nit: 800.165.517-6



Firma del supervisor que autoriza

Construciviles Elite S.A.S.






INFORME DE REPARACIONES REALIZADAS Y REPUESTOS SUMINISTRADOS

1. Vehículo o Moto: BUS CHEVROLET FRR
2. Placa: OJG-740
3. Fecha del mantenimiento: 26/12/2025

Justificación y registro fotográfico de los suministros y servicios realizados


Justificación técnica del servicio y/o repuesto	Descripción del servicio y/o repuesto suministrado	Registro fotográfico (estado inicial)	Registro fotográfico (estado final)
Se realizó revisión general del sistema eléctrico, efectuando reparación de conexiones, cambio de cables deteriorados y ajustes necesarios, dejando el sistema funcionando correctamente.	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO Y MANTENIMIENTO ELÉCTRICO		
Se efectuó mantenimiento parcial de la caja de cambios, realizando ajustes y correcciones en los componentes intervenidos, eliminando ruidos y mejorando el funcionamiento de las marchas.	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAJA DE CAMBIOS PARCIAL		

Carrera 5 No.9-26 Sur Edificio Sabana Park Torre 3 Oficina 215, Cajicá.
Cel: 317 369 2993 Fijo: 601 8051679
Correo: administrativo@construcivileselite.com

Se realizó ajuste y mantenimiento de los mecanismos de las puertas de acceso, corrigiendo desajustes y asegurando su apertura y cierre normal.	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PUERTAS DE ACCESO		
Se efectuó revisión y reparación de conexiones y componentes del sistema de sonido, verificando su correcto funcionamiento.	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SONIDO		
Se realizó mantenimiento y ajuste de la chapa y cerradura, garantizando un cierre seguro y adecuado.	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CHAPA Y/O CERRADURA		

Carrera 5 No.9-26 Sur Edificio Sabana Park Torre 3 Oficina 215, Cajicá.
Cel: 317 369 2993 Fijo: 601 8051679
Correo: administrativo@construcivileselite.com

Construciviles Elite S.A.S.

Se efectuó revisión y mantenimiento del sistema de vigía, dejando operativos los sensores y dispositivos de monitoreo del vehículo.	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE VIGIA		

FIRMA DEL CONTRATISTA

LUIS SANTIAGO GÓMEZ SABOYÁ
C.C. 79.785.101 de Bogotá
Representante Legal de CONSTRUCIVILES ELITE S.A.S.
Nit:800.165.517-6

Carrera 5 No.9-26 Sur Edificio Sabana Park Torre 3 Oficina 215, Cajicá.
Cel: 317 369 2993 Fijo: 601 8051679
Correo: administrativo@construciviles elite.com
