INFORME TECNICO

"DIAGNOSTICO"

PROYECTO:

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y PARQUES DE LOS BARRIOS EL BOSQUE, CENTRO, MORICHAL, CARICARE Y PARAISO I DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE

Secretaria de Infraestructura
VILLANUEVA - CASANARE
2025

CONTENIDO

1. GENERALIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE 6
1.1. LOCALIZACIÓN 6
1.2. LIMITES 7
1.3. EXTENSIÓN 7
1.4. GEOMORFOLOGÍA 7
1.5. CARACTERIZACIÓN CLIMATICA DE VILLANUEVA 7
1.6. POBLACIÓN 7
2. INFORMACIÓN GENERAL 8
2.1. PARQUE MORICHAL 8
2.2. PARQUE EL BOSQUE 9
2.3. PARQUE INFANTIL 9
3. INSPECCIÓN 10
3.1. PARQUE MORICHAL 10
3.2. PARQUE EL BOSQUE 20
3.3. PARQUE INFANTIL 31
3.4. PARQUE INFANTIL BOMBEROS 47
3.5. PARQUE INFANTIL CARI CARE 53

FIGURAS

Figura 1. Estado actual del gym biosaludable del parque Morichal 12
Figura 2. Estado actual del gym biosaludable del parque Morichal 13
Figura 3 Estado actual del gym biosaludable del parque Morichal. ..... **¡Error! Marcador no definido.**
Figura 4. Estado actual del gym biosaludable del parque Morichal ..... **¡Error! Marcador no definido.**
Figura 5. Estado actual del gym biosaludable del parque Morichal 14
Figura 6. Estado actual del gym biosaludable del parque Morichal 15
Figura 7. Estado actual del gym biosaludable del parque Morichal 15
Figura 8. Estado actual del gym biosaludable del parque Morichal 16
Figura 9 Estado actual del gym biosaludable del parque Morichal. 16
Figura 10.Estado actaul del parque Morichal 17
Figura 11. Estado actaul del parque Morichal 17
Figura 12. Estado actual del parque el Bosque 18
Figura 13. Estado actual del gym biosaludable del parque el Bosque 22
Figura 14. Estado actual del gym biosaludable del parque el Bosque 23
Figura 15.. Estado actual del gym biosaludable del parque el Bosque 23
Figura 16. Estado actual del parque el Bosque 24
Figura 17. Estado actual del gym biosaludable del parque el Bosque 24
Figura 18. Estado actual del gym biosaludable del parque el Bosque 25
Figura 19. Estado actual del gym biosaludable del parque el Bosque 25
Figura 20. Estado actual del gym biosaludable del parque el Bosque 26
Figura 21. Estado actual del gym biosaludable del parque el Bosque. **¡Error! Marcador no definido.**
Figura 22. Estado actual del gym biosaludable del parque el Bosque 27
Figura 23. Estado actual del gym biosaludable del parque el Bosque. **¡Error! Marcador no definido.**
Figura 24. Estado actual del gym biosaludable del parque el Bosque 28
Figura 25. Estado actual del gym biosaludable del parque el Bosque 28
Figura 26. Estado actual del gym biosaludable del parque Infantil 30
Figura 27. Estado actual del gym biosaludable del parque Infantil 33
Figura 28. Estado actual del gym biosaludable del parque Infanti 34
Figura 29. Estado actual del gym biosaludable del parque Infantli 34
Figura 30. Estado actual del gym biosaludable del parque Infantil 35
Figura 31. Estado actual del gym biosaludable del parque Infantil 35
Figura 32. Estado actual del gym biosaludable del parque Infantil 36
Figura 33. Estado actual del gym biosaludable del parque Infantil 36
Figura 34 Estado actual del parque infantil 37
Figura 35. Estado actual del parque infantil 37

Figura 36. Estado actual del parque infantil 38
Figura 37. Estado actual del parque infantil 38
Figura 38. Estado actual del parque infantil 39
Figura 39. Estado actual del parque infantil 39
Figura 40. Estado actual del parque infantil 40
Figura 41. Estado actual del parque infantil 41
Figura 42. Estado actual del parque infantil 42
Figura 43. Estado actual del parque infantil 43
Figura 44. Estado actual del parque infantil 44
Figura 45. Estado actual del parque infantil 45
Figura 46. Estado actual del parque infantil Bomberos 49
Figura 47. Estado actual del parque infantil Bomberos 49
Figura 48. Estado actual del parque infantil Bomberos 50
Figura 49. Estado actual del parque infantil Bomberos 50
Figura 50. Estado actual del parque infantil Bomberos 51
Figura 51. Estado actual del parque infantil Bomberos 51
Figura 52. Estado actual del parque infantil Bomberos 52
Figura 53. Estado actual del parque infantil Cari Care 55
Figura 54. Estado actual del parque infantil Cari Care 55
Figura 55. Estado actual del parque infantil Cari Care 56
Figura 56. Estado actual del parque infantil Cari Care 56
Figura 57. Estado actual del parque infantil Cari Care 57
Figura 58. Estado actual del parque infantil Cari Care 57
Figura 59. Estado actual del parque infantil Cari Care 58
Figura 60. Estado actual del parque infantil Cari Care 58
Figura 61. Estado actual del parque infantil Cari Care 59
Figura 62. Estado actual del parque infantil Cari Care 59

ILUSTRACIÓN

Ilustración 1. Mapa de localización del proyecto 6
Ilustración 2. Imagen Satelital Google Earth PARQUE MORICHAL 10
Ilustración 3. Imagen Satelital Google Earth PARQUE EL BOSQUE 20
Ilustración 4. Imagen Satelital Google Earth PARQUE INFANTIL 31
Ilustración 5. Imagen Satelital Google Earth PARQUE INFANTIL BOMBEROS 47
Ilustración 6. Imagen Satelital Google Earth PARQUE INFANTIL CARI CARE 53

1. GENERALIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE

1.1. LOCALIZACIÓN

El proyecto se localiza en todo el Municipio de Villanueva, se ubica en la parte sur del Departamento de Casanare en esa gran región de los llanos orientales en una ubicación geográfica dentro de las siguientes coordenadas a 4° 36' 40, 27 N Y 72 ° 55'33,89 0, el casco urbano del municipio se encuentra localizado sobre los 300 metros sobre el nivel del mar.

Su ubicación estratégica sobre la carretera Marginal del Llano, la que cruza el casco urbano, le proporciona una gran afluencia de turistas y viajeros, que se desplazan a Villavicencio y Santafé de Bogotá y viceversa, constituyéndose el municipio como centro turístico y vacacional, al igual que de intercambio de bienes y servicios. LÍMITES

Los límites del Municipio son:

- Por el Norte: Con el municipio de Sabanalarga y Monterey.
- Por el Sur: con el Municipio de Cabuyaro.
- Por el Oriente: con los municipios de Monterrey y Tauramena.
- Por el occidente: con los municipios de Barranca de Upía y Cabuyaro.

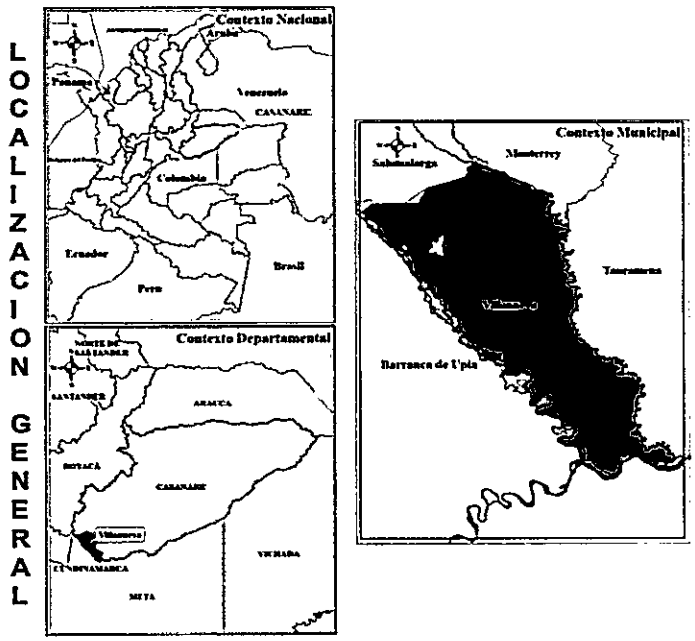


Ilustración 1. Mapa de localización del proyecto

1.2. LIMITES

El Municipio de Villanueva limita al norte con los municipios de Sabanalarga y Monterrey; al sur y occidente con el departamento del Meta, siendo los ríos Upía y Meta sus límites naturales; al oriente limita con los municipios de Monterrey y Tauramena, donde el río Túa es su límite natural.

1.3. EXTENSIÓN

El municipio ocupa una extensión territorial de 82.500 ha, de las cuales 375.6 ha corresponden al perímetro urbano y 82.124,4 ha al área rural.

1.4. GEOMORFOLOGÍA

Villanueva está situado en una zona de transición y comprende áreas de piedemonte, planicie y altillanura, con una variada morfología que genera diversidad de formas topográficas bien marcadas como lomas, terrazas, sabanas y valles, también presenta como resultado de la confluencia de diversos factores entre ellos tectónismo intenso, erosión marcada, escorrentía y litología.

1.5. CARACTERIZACIÓN CLIMATICA DE VILLANUEVA

Para el caso de nuestro Municipio, su precipitación promedio anual se encuentra en 2865.9 mm por año, una temperatura media anual en los alrededores del perímetro urbano de 26.3 °C obteniendo una mayor temperatura en los meses de enero, abril, siendo mayo, julio de temperatura media y los meses de agosto, diciembre en aumento constante, presenta una humedad relativa anual entre el 75% y 90% predominando el ambiente húmedo. Los meses más secos representan los valores más altos en el año mientras que los más bajos corresponden a los dos periodos húmedos.

Los datos de las variables climáticas analizadas se han obtenido de los registros de la estación 350951 Huerta la Grande perteneciente a Villanueva y en la estación 3510505 Guaicaramo de Barranca de Upía.

1.6. POBLACIÓN

Población urbana – rural

En el área Urbana según Base de datos Certificada de SISBEN de 2019, reside un 73% de la población lo que corresponde a 25.747 habitantes, el 17 % es decir 5.830 personas se encuentran ubicadas en el área rural dispersa y el 10% (3.692) residen en los centros poblados.

El porcentaje de hombres y mujeres en el área urbana es del 50%, teniendo diferencia entre Centro poblado y rural disperso donde se evidencia un 51% y 52% de hombres respectivamente.

2. INFORMACIÓN GENERAL

2.1. PARQUE MORICHAL

El Parque Morichal es un espacio de entretenimiento y recreación muy apreciado por los habitantes del municipio de Villanueva, Casanare. Está abierto a toda la comunidad y ofrece un ambiente natural ideal para el descanso, rodeado de árboles frondosos y vegetación, lo que lo convierte en un lugar perfecto para la relajación.

Este parque es frecuentado especialmente por adultos mayores y niños, quienes encuentran en él un espacio tranquilo para el esparcimiento y la conexión con la naturaleza.

La funcionalidad del Parque Morichal es de gran importancia para el municipio, por lo que es fundamental que sus instalaciones se mantengan en condiciones óptimas. Esto garantiza un entorno seguro y agradable para todos sus visitantes.

Actualmente, el parque Morichal cuenta con una placa en concreto sobre la cual se encuentran fijadas y ubicadas maquinas de gimnasio al aire libre, además de eso cuenta con andenes en concreto los cuales se construyeron en su momento para garantizar la movilidad al interior del mismo. Sin embargo, hoy en día se evidencia que este parque requiere de un mantenimiento con el objetivo de garantizar que sea un espacio idóneo y adecuado para el uso y disfrute de la comunidad en general. Dentro de las actividades de mantenimiento que se requieren están la demolición de la placa en concreto existente dado que presenta empozamientos dado que los niveles de la misma y el sardinel perimetral no permiten que las aguas lluvias tengan una adecuada evacuación, lo que dificulta que se haga uso de las maquinas de gimnasio existentes. No obstante, el mobiliario de maquinas de gimnasio existentes en su gran mayoría presentan daños estructurales, que imposibilitan que la comunidad pueda hacer uso de las mismas. Motivo por el cual, se requiere de realizar el retiro de todas las maquinas existentes y en su mayoría suministrar e instalarlas completamente nuevas, y una que otra maquina realizarle un mantenimiento que garantice su funcionalidad.

En cuanto a los senderos peatonales construidos en concreto, se evidencio que la totalidad de los metros de anden construidos ya no presentan ninguna funcionalidad por la cual fueron hechos dando que el nivel del terreno natural esta por encima del nivel del concreto lo que hace que la vegetación existente se encuentre por encima del mismo obstaculizando el transito de peatonal. De igual forma, las aguas lluvias generan empozamientos sobre la estructura en concreto, lo que motiva a que ser realice la demolición en su totalidad y se proyecte la construcción de nuevos andenes en los cuales se tenga en cuenta los niveles del terreno natural, garantizando la movilidad de las personas en general.

2.2 PARQUE EL BOSQUE

El parque el bosque es un lugar de esparcimiento y de recreación, profundamente valorado por los habitantes del barrio el bosque y del municipio de Villanueva – Casanare. Está abierto a la comunidad, ya que es un rincón natural y brinda un entorno sereno y acogedor, enmarcado por majestuosos árboles y abundante vegetación. su atmosfera tranquila lo convierte en un refugio ideal para el descanso, conectarse con la naturaleza y disfrutar de los momentos de paz y armonía.

El parque es mucho mas que solo un simple espacio verde; es un lugar vital para la comunidad, es un pulmón natural que embellece el entorno, mejora la calidad de aire y protege la biodiversidad local.

2.3 PARQUE INFANTIL

Nuestro Parque Infantil además de ser un punto de encuentro donde se fortalecen lazos sociales, se realizan actividades recreativas, culturales y deportivas y se promueve una vida saludable. Es accesible para toda la comunidad

El parque infantil es un espacio especialmente para el disfrute y desarrollo de los niños y niñas de la comunidad, donde los niños jueguen libremente y puedan desarrollar sus habilidades físicas y cognitivas a través de juegos y columpios ,toboganes , sube y baja y otros elementos recreativos .Además de ser un sitio de diversión , ya que el parque fomenta la convivencia familiar y de aprendizaje mediante el juego , convirtiéndose en un punto de encuentro donde la infancia se vive con alegría y libertad.

3. INSPECCIÓN

3.1. PARQUE MORICHAL

Ilustración 2. Imagen Satelital Google Earth PARQUE MORICHAL



El parque Morichal, ubicado en el municipio de Villanueva, Casanare, es un espacio esencial para el esparcimiento de los habitantes de Villanueva-cas, ya que buscan espacios al aire libre para poder disfrutar en diferentes áreas como espacios específicos para realizar deportes, zonas de lectura, zonas de descanso, juegos, realizar trabajo al aire libre y poder despejar la mente en estas áreas.

Aun así, este espacio no cuenta con la infraestructura adecuada para que los ciudadanos puedan disfrutar de un parque acogedor y cómodo, este espacio no encontramos senderos adecuados, ni espacios para realizar diferentes actividades de juegos, ya que por el tiempo encontramos deterioros en estas zonas.

Actualmente, las zonas que deberían tener estos espacios no se encuentran desarrolladas, ya que encontramos muchas limitaciones, ya que las sillas se encuentran en un gran deterioro, la cancha y las zonas verdes, incluyendo el parque biosaludable, ya que el agua y el pasar del tiempo lo tiene bastante deteriorado. También encontramos que las raíces de los arboles han crecido y levantaron el sendero, esto hace necesario de una restauración y adecuación adecuada de estas zonas con una buena distribución, incluyendo las zonas verdes con un diseño de paisajismo para que de este modo nuestros ciudadanos disfruten de estas zonas.

Las instalaciones de este centro están situadas sobre calle 16 #8-57, con coordenadas 4°36'52"N 72°55'30"W , la Secretaría de Obras Públicas realizó una visita técnica al lugar. A través de una inspección visual, se concluyó lo siguiente:

- Para garantizar un funcionamiento óptimo del espacio, es fundamental desarrollar una infraestructura integral que contemple la instalación de mobiliario urbano adecuado, áreas recreativas seguras para niños y zonas de esparcimiento para todas las edades. También se deben incorporar rutas específicas para bicicletas y corredores, complementadas con puntos de descanso estratégicos. Asimismo, es esencial implementar áreas de paisajismo que contribuyan a la conservación del entorno natural y mantengan la frescura y comodidad del lugar.
- Nivelar piso, ya que este espacio tiende a la acumulación de agua.

Figura 1. Estado actual del gym biosaludable



Figura 2. Estado actual del gym biosaludable


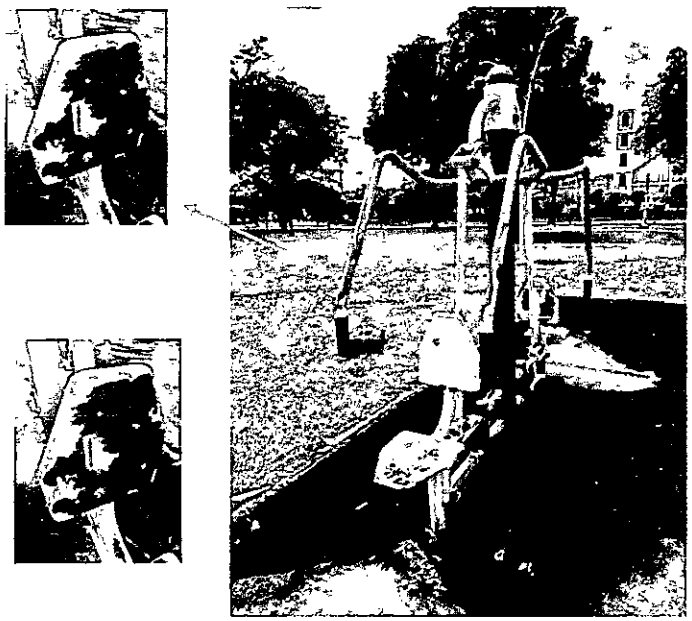


Figura 3. Estado actual del gym biosaludable

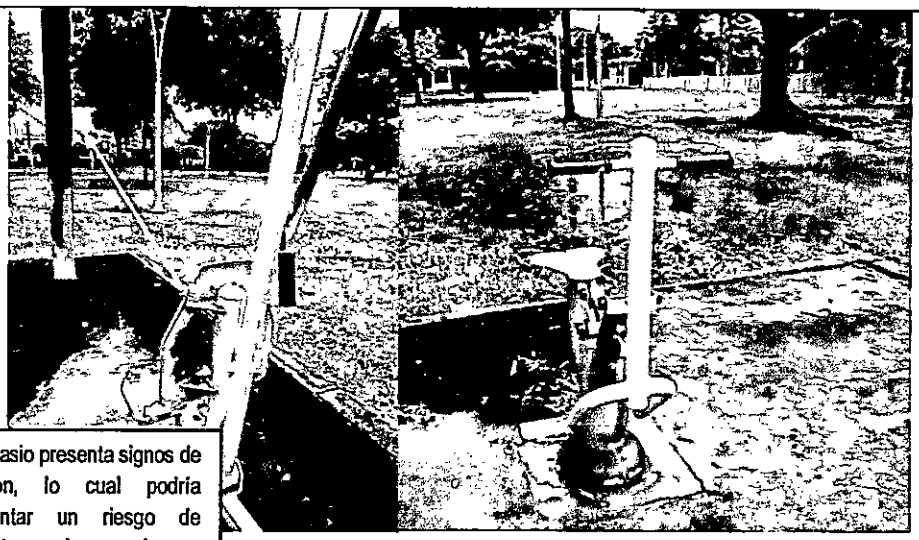

El gimnasio presenta signos de corrosión, lo cual podría representar un riesgo de accidente para los usuarios.

Figura 4. Estado actual del gym biosaludable


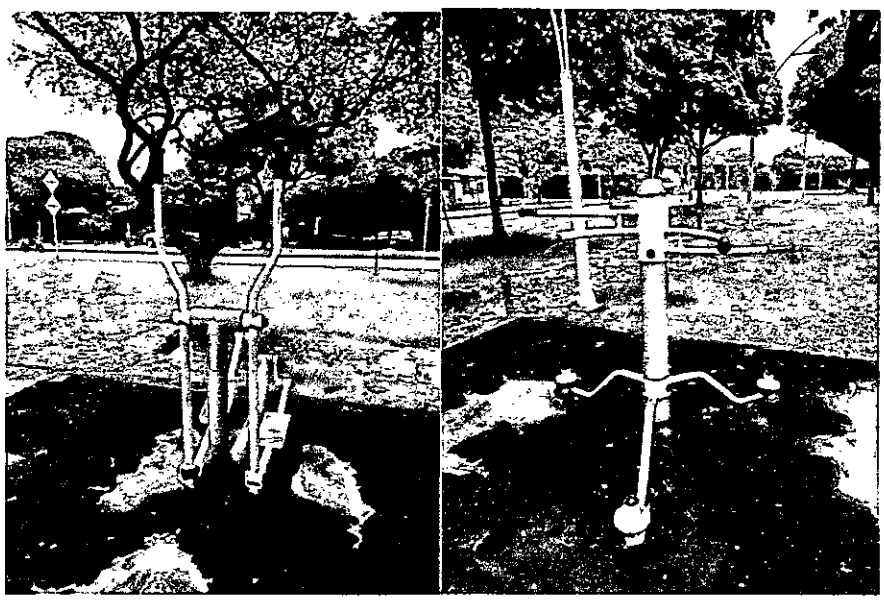


Figura 5. Estado actual del gym biosaludable



Deterioro del gym saludable, tiene varias fisuras y peladuras por el paso del tiempo y la exposición al agua.

Figura 6. Estado actual del gym biosaludable

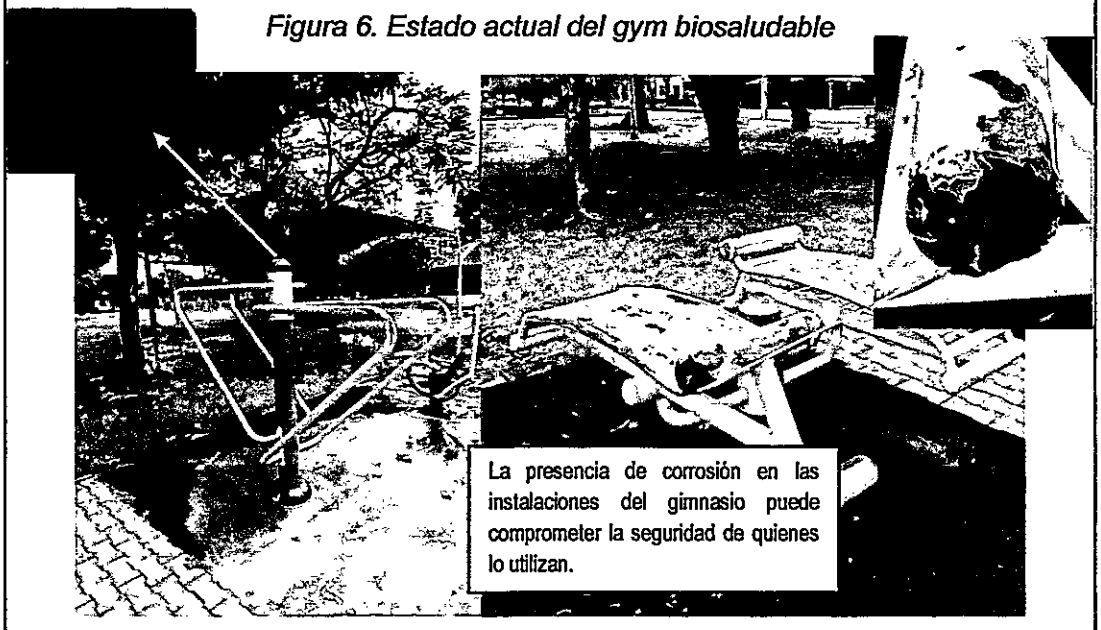

La presencia de corrosión en las instalaciones del gimnasio puede comprometer la seguridad de quienes lo utilizan.

Figura 7. Estado actual del gym biosaludable

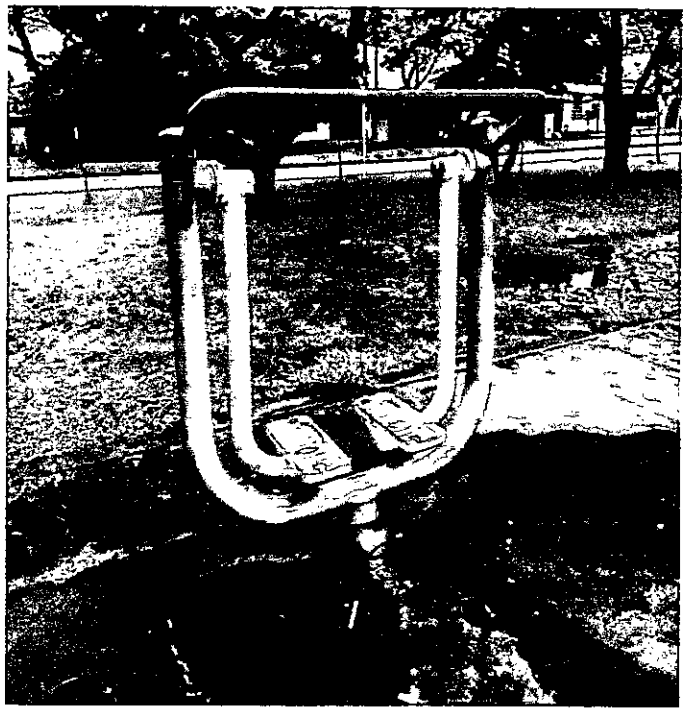


Figura 8. Estado actual del gym biosaludable

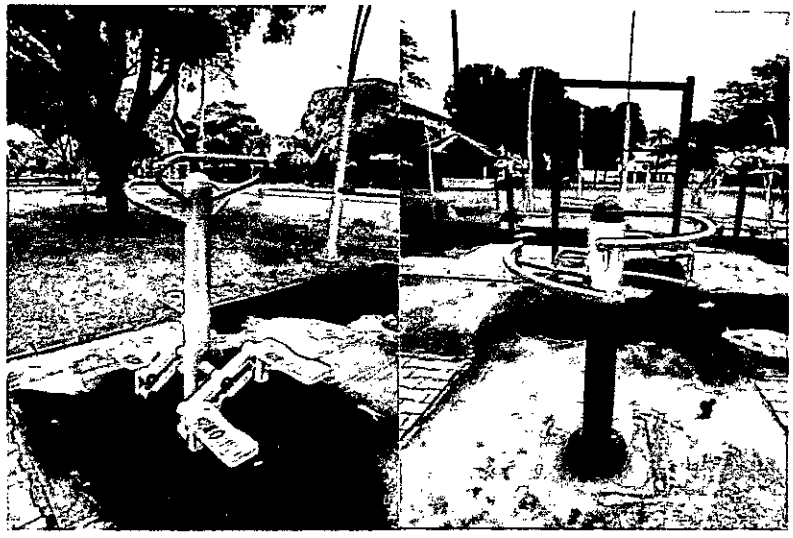


Figura 9. Estado actual del gym biosaludable



Las zonas duras conformadas por adoquines y placas de concreto presentan un notable deterioro, con superficies lisas y desniveladas, así como acumulación de agua estancada. Esta problemática se debe a que las placas se encuentran a un nivel inferior al del sardinel, lo que genera retención de humedad. En estas condiciones, cualquier material que se aplique sobre la placa no tendrá una adecuada adherencia, debido a la persistente humedad que impide su correcta fijación.

Figura 10. Estado actual del Parque Morichal

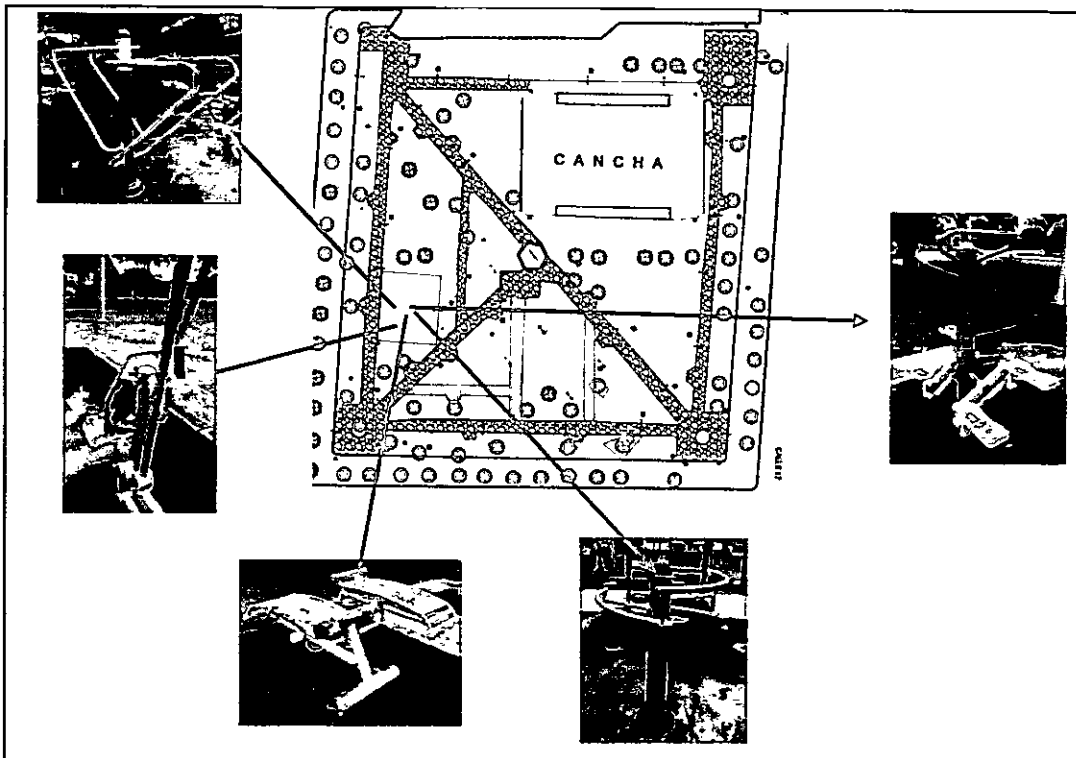


Figura 11. Estado actual del Parque Morichal



Figura 12. Estado actual del gym biosaludable





Se observa el área que requiere una intervención urgente para la instalación de un nuevo parque bio-saludable. El espacio actual presenta un notable deterioro debido al paso del tiempo, con estructuras oxidadas y partes desprendidas que representan un riesgo para la seguridad de los usuarios, especialmente niños y adultos mayores. Esta situación no solo limita el uso del parque, sino que también pone en peligro la integridad física de los habitantes de nuestra comunidad en Villanueva – Casanare. Por ello, se recomienda, realizar los cambios de las 9 máquinas actuales del gimnasio biosaludable e instalar figuras nuevas ya que ellas se encuentran en un gran deterioro. Con el fin de garantizar un entorno seguro, funcional y que fomente el bienestar físico y social de todos los residentes.


Además, es evidente la necesidad de instalar un parque infantil en este espacio, ya que actualmente los niños de la comunidad no cuentan con un área adecuada para el juego y la recreación. Un parque infantil con juegos lúdicos no solo ofrecería un lugar seguro y amplio para la diversión, sino que también contribuiría al desarrollo físico, emocional y social de los más pequeños. Disponer de este tipo de infraestructura es fundamental para fomentar hábitos saludables desde la infancia y fortalecer los lazos comunitarios en Villanueva – Casanare. En este espacio se encuentra una placa donde está montado el parque biosaludable. Se evidencia la placa con filtraciones y humedad, debido a su avanzado deterioro, por esta razón,

es necesario retirarla y construir una nueva con pendientes hacia los lados, ya que la actual no permite un adecuado desagüe y el agua se empoza cuando llueve.

El diseño de este proyecto busca ofrecer un espacio integral para el disfrute de toda la comunidad, mediante la incorporación de áreas paisajísticas que conecten armónicamente todos los elementos del parque. Se contempla una planificación que integre tanto el parque infantil como el parque bio-saludable, generando un recorrido fluido y cohesivo entre cada zona. Además, se propone la nivelación del terreno y la mejora de los pisos en las áreas verdes, con el fin de prevenir encharcamientos e inundaciones durante la temporada de lluvias. Esta intervención no solo embellecerá el entorno, sino que garantizará funcionalidad, accesibilidad y seguridad para todos los usuarios.

3.2 PARQUE EL BOSQUE

Ilustración 3. Imagen Satelital Google Earth PARQUE EL BOSQUE

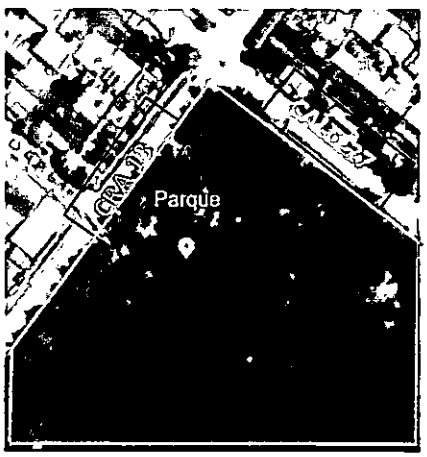

El parque el Bosque, Ubicado en el municipio de Villanueva – Casanare, es un papel clave que desempeña en la recreación y el bienestar de los habitantes del barrio y del municipio de Villanueva. La comunidad busca espacios frescos al aire libre que les permitan disfrutar de diversas actividades, como practicar deportes, leer, descansar, jugar, trabajar en un entorno natural y despejar la mente. Estas áreas son esenciales para mejorar la calidad de vida y fomentar el bienestar físico y mental de los habitantes.

Sin embargo, este espacio actualmente carece de la infraestructura adecuada para que los ciudadanos puedan disfrutar de un parque acogedor y funcional. No cuenta con senderos en buen estado, ni con áreas apropiadas para la recreación y el juego, ya que con el paso del tiempo ha provocado un notable deterioro en las zonas existentes, lo que limita su uso y disfrute por parte de la comunidad.

Actualmente, las áreas destinadas no se encuentran adecuadamente desarrolladas, pues existen múltiples limitaciones: no tienen mobiliario y el único existente se encuentra en gran deterioro, las zonas verdes, incluyendo el parque biosaludable ya que presenta un notable desgaste debido a la exposición del agua y el paso del tiempo. Es fundamental implementar un diseño paisajístico adecuado que recupere estos espacios y permita a los ciudadanos disfrutar de un entorno agradable, funcional y armonioso.

Las instalaciones de este parque están situadas sobre carera 13 con calle 27, con coordenadas 4°37'23"N 72°55'15"W. La Secretaría de Obras Públicas realizó una visita técnica al lugar. A través de una inspección visual, se concluyó lo siguiente:

- Es fundamental desarrollar una infraestructura integral que contemple la instalación de mobiliario urbano adecuado, áreas recreativas seguras para niños y zonas de esparcimiento accesibles para personas de todas las edades. Además, incorporarse rutas específicas para bicicletas y corredores, complementadas con puntos de descanso ubicados estratégicamente. Igualmente, es esencial incluir áreas de paisajismo que contribuyan a la conservación del entorno natural y favorezcan un ambiente fresco, cómodo y agradable para la comunidad.

Figura 13. Estado actual del parque el Bosque



Figura 14. Estado actual del parque biosaludable del Bosque

La máquina se encuentra actualmente fuera de operación debido a la falta de pintura protectora y el desgaste de los bujes, lo que compromete tanto su funcionalidad como su seguridad operativa. Es necesario realizar mantenimiento para garantizar su correcto funcionamiento, prevenir daños mayores y cumplir con los estándares de mantenimiento preventivo.

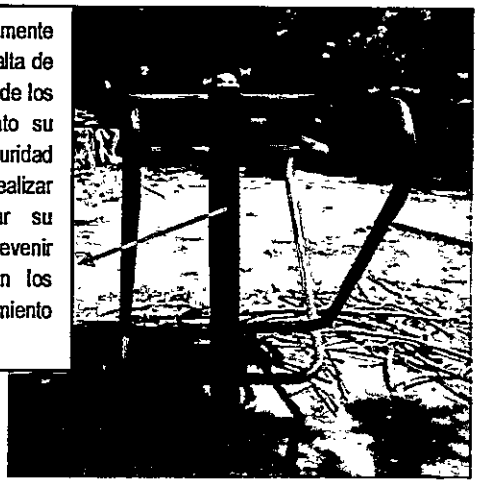


Figura 15. Estado actual del parque biosaludable del Bosque

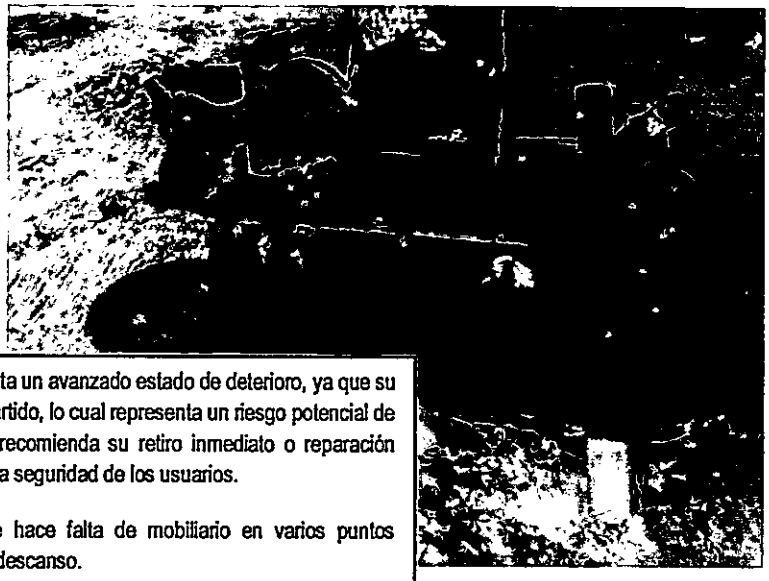


Figura 16. Estado actual del parque biosaludable del Bosque



La máquina presenta deficiencias de mantenimiento, específicamente por la falta de pintura protectora y la necesidad de cambio de bujes. Estas condiciones pueden afectar su rendimiento y durabilidad, por lo tanto, es recomendable realizar las correcciones necesarias para garantizar su correcto funcionamiento y prolongar su vida útil.

Figura 17. Estado actual del parque del Bosque



Esta silla presenta un avanzado estado de deterioro, ya que su espaldar está partido, lo cual representa un riesgo potencial de accidentes. Se recomienda su retiro inmediato o reparación para garantizar la seguridad de los usuarios.

En este parque hace falta de mobiliario en varios puntos estratégicos de descanso.

Figura 18. Estado actual del parque biosaludable del Bosque



La máquina presenta deficiencias de mantenimiento, específicamente por la falta de pintura protectora y la necesidad de cambio de bujes. Estas condiciones pueden afectar su rendimiento y durabilidad, por lo tanto, es recomendable realizar las correcciones necesarias para garantizar su correcto funcionamiento y prolongar su vida útil.

Figura 19. Estado actual del parque biosaludable del Bosque

La máquina presenta deficiencias de mantenimiento, particularmente por la ausencia de pintura protectora y la necesidad de reemplazar los bujes. Estas condiciones podrían comprometer su rendimiento y reducir su vida útil. Por ello, se recomienda realizar las correcciones correspondientes para asegurar su correcto funcionamiento y prolongar su durabilidad.

Asimismo, se detectó deterioro en las placas de los senderos, así como la falta de pintura, lo cual también requiere atención.


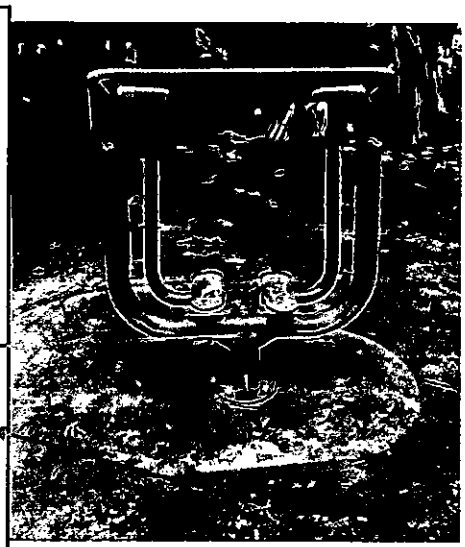


Figura 20. Estado actual del parque biosaludable del Bosque




El óxido en el gimnasio puede causar accidentes a los usuarios.


Figura 21. Estado actual de parque biosaludable del Bosque

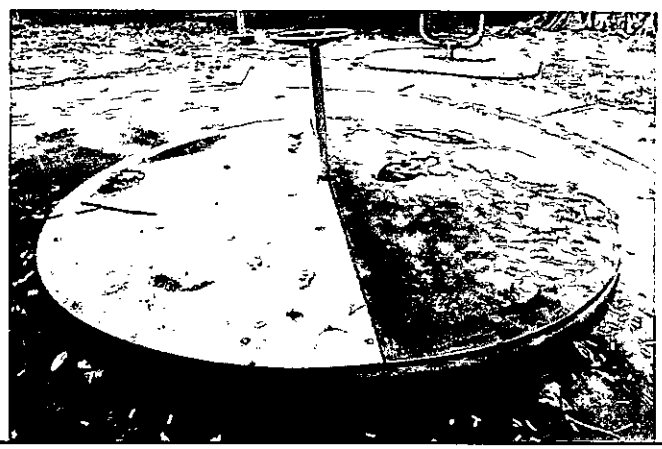

La rueda giratoria se encuentra en mal estado, ya que presenta hundimientos en ciertas zonas, lo que compromete su funcionamiento y seguridad. Por lo tanto, se recomienda que esta máquina se retire y reemplazarla por 2 máquinas nuevas del gimnasio biosaludable.

Figura 22. Estado actual del parque biosaludable del Bosque

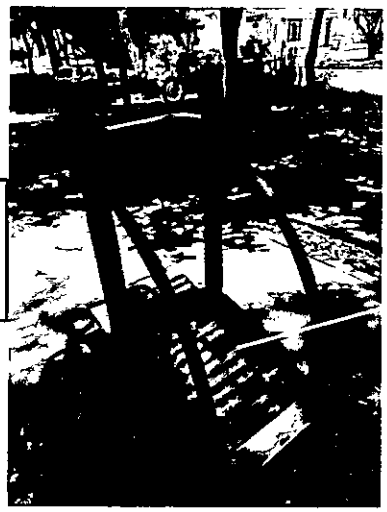

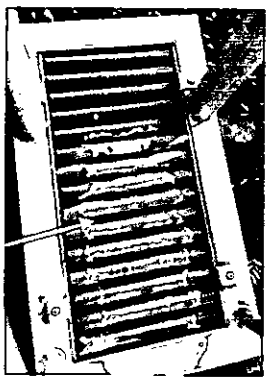

Las máquinas del parque biosaludable presentan peladuras y algunas carecen de bujes, lo que evidencia un estado de deterioro.

Figura 23. Estado actual del parque biosaludable del Bosque



La máquina se encuentra actualmente fuera de operación debido a la falta de pintura protectora y al desgaste de los bujes, lo que compromete tanto su funcionalidad como su seguridad operativa. Es necesario realizar mantenimiento para garantizar su correcto funcionamiento, prevenir daños mayores y cumplir con los estándares de mantenimiento preventivo.

Figura 24. Estado actual del parque infantil del Bosque

El tobogán del parque se encuentra en mal estado, ya que presenta fisuras en su estructura y el tubo de soporte muestra signos visibles de corrosión además hay elementos faltantes. Esta condición representa un riesgo potencial para los usuarios, especialmente para los niños, por lo que se recomienda su reparación o reemplazo inmediato para garantizar la seguridad y el adecuado funcionamiento del área recreativa.

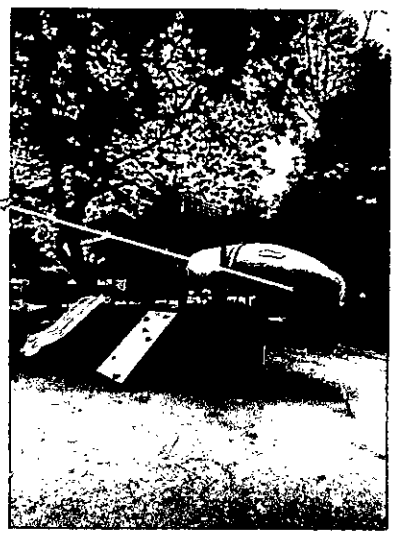


Figura 25. Estado actual del parque biosaludable del Bosque

La máquina presenta deficiencias de mantenimiento, específicamente por la falta de pintura protectora y la necesidad de cambio de bujes. Estas condiciones pueden afectar su rendimiento y durabilidad, por lo tanto, es recomendable realizar las correcciones necesarias para garantizar su correcto funcionamiento y prolongar su vida útil.



Se evidencia que estas áreas requieren una intervención inmediata, mediante la restauración y cambio de algunas máquinas ya que el estado actual del espacio evidencia un nivel avanzado de deterioro producto del paso del tiempo, con estructuras defectuosas y elementos sueltos que representan un serio riesgo para la seguridad de quienes frecuentan, en especial niños y adultos mayores. Esta problemática restringe el uso adecuado del parque, por esta razón se necesita una intervención con las adecuaciones necesarias que permitan transformar este lugar

en un entorno seguro, funcional y propicio para promover la salud, la recreación y la convivencia entre los residentes.


Asimismo, se hace necesario la renovación del parque infantil del barrio el bosque, así como la adecuación de los senderos de circulación que conectan de manera eficiente los distintos espacios del entorno. Esta intervención también se ve con la necesidad de la incorporación de áreas con paisajismo que aporten armonía visual y ambiental, a diferentes áreas del entorno incluyendo mobiliario urbano destinado al descanso y al esparcimiento de los visitantes. Estas mejoras contribuirán significativamente a la calidad de vida de la comunidad, promoviendo un uso inclusivo, seguro y agradable del espacio público.

- Para asegurar el buen funcionamiento del espacio, es necesario contar con una infraestructura completa que incluya mobiliario urbano adecuado, áreas recreativas seguras para niños y zonas de esparcimiento accesible para todas las edades. También es necesario incorporarse puntos de descanso ubicados estratégicamente, ya que es clave integrar zonas verdes que protejan el entorno natural y mejoran la frescura y comodidad del lugar.

- Es importante nivelar el piso, ya que la pendiente actual provoca acumulación de agua y dificultad del uso del espacio.


- Se requiere en este espacio el mantenimiento y adecuación de las máquinas del gimnasio al aire libre, incluyendo cambios de ajustes, ejes, camisas, balineras y rodamientos; también pintura electroestática (al horno), cambio de tapones empak, instalación de mecanismos antirrobo y tornillería; de igual manera el mantenimiento y adecuación del parque infantil del bosque subministrando instalación de tobogán, un túnel recto y 3 codos, pintura y tubería.

Figura 26. Estado actual del parque infantil del Bosque

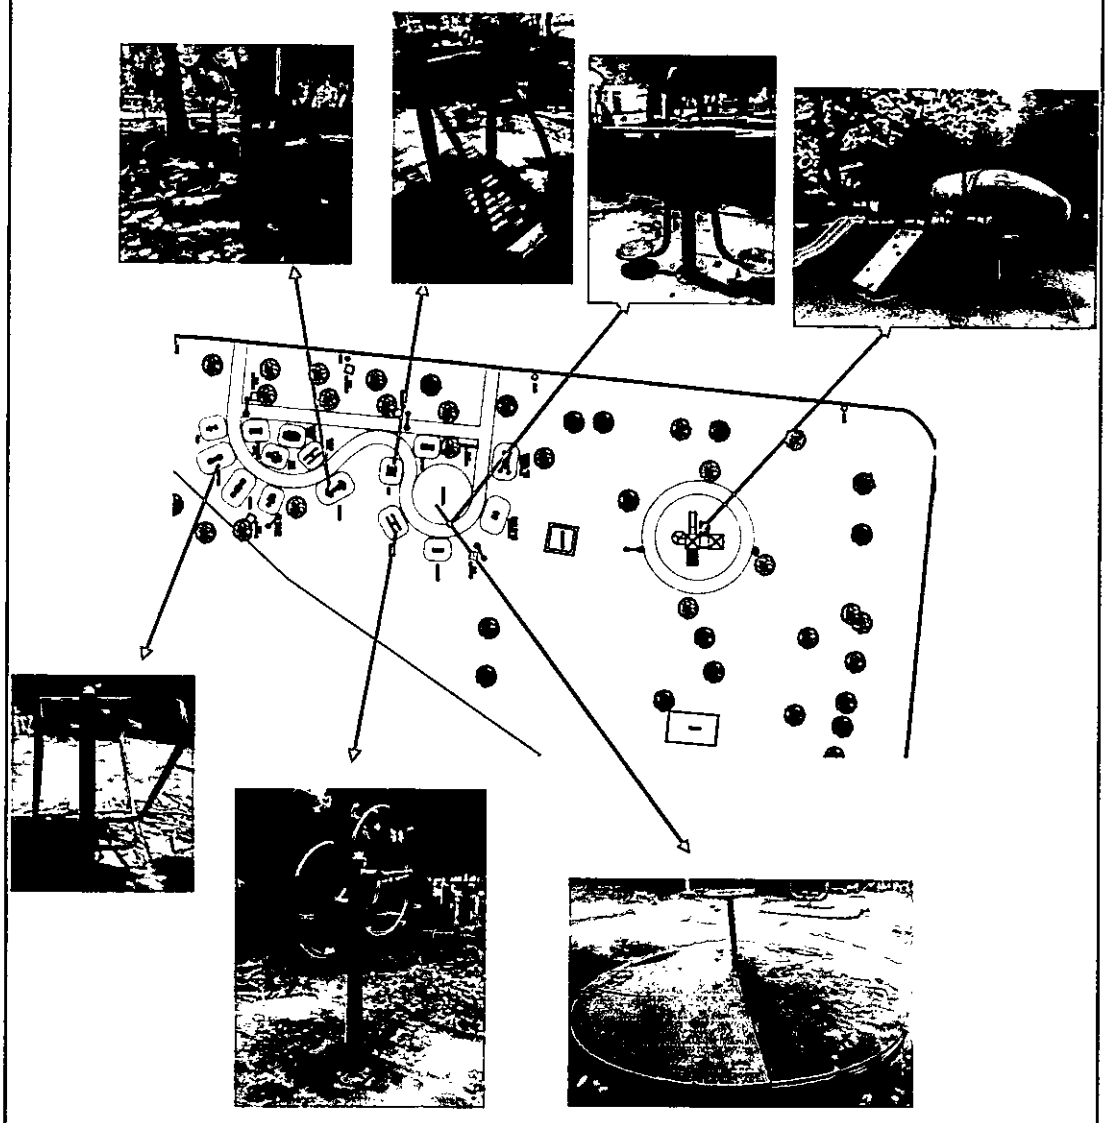

3.3 PARQUE INFANTIL

Ilustración 4. Imagen Satelital Google Earth PARQUE INFANTIL

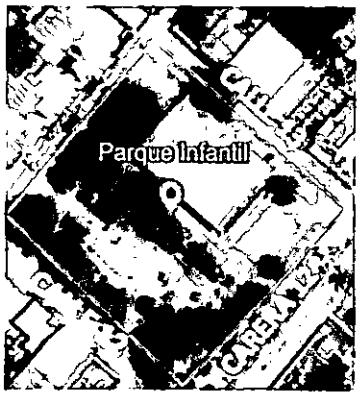

El parque infantil, ubicado en el municipio de Villanueva, Casanare tiene un espacio de gran relevancia para el bienestar y la integración social de la comunidad. Se trata del parque más frecuentado del municipio, dada su amplitud de zonas con distintas actividades recreativas, deportivas, culturas y educativas.

Cabe destacar que este espacio también cumple una función estratégica como centro de encuentro para la comunidad educativa. En él se reúnen todos los colegios del municipio para el desarrollo de actividades pedagógicas, culturales y recreativas. Asimismo, es el escenario principal para la realización de eventos que promueven la participación ciudadana, con el fortalecimiento del tejido comunitario de Villanueva.

Este parque es muy concurrido, pues los habitantes buscan la interacción con sus familias al aire libre para poder disfrutar las diferentes áreas del espacio, realizando deportes, juegos, realizar trabajos al aire libre y despejar la mente en estos espacios.

Desde el parque infantil se evidencia múltiples necesidades. Actualmente, las zonas que deberían estar adecuadamente desarrolladas presentan un notable deterioro, las sillas están en malas condiciones, las zonas verdes, incluyendo el parque biosaludable, que muestran desastres por el paso del tiempo y la exposición del agua. Por esta razón, se requiere de una intervención integral y una retribución adecuada de estos espacios que incluyan zonas verdes con paisajismo, permitiendo así que los ciudadanos disfruten de un entorno seguro, funcional y agradable.

Las instalaciones de este centro están situadas sobre carera 12 #121, 12-7 con coordenadas 4°36'49"N 72°55'42"W, la Secretaría de Obras Públicas realizó una visita técnica al lugar. A través de una inspección visual, se concluyó lo siguiente:

Figura 27. Ubicación del Estado actual del parque Infantil



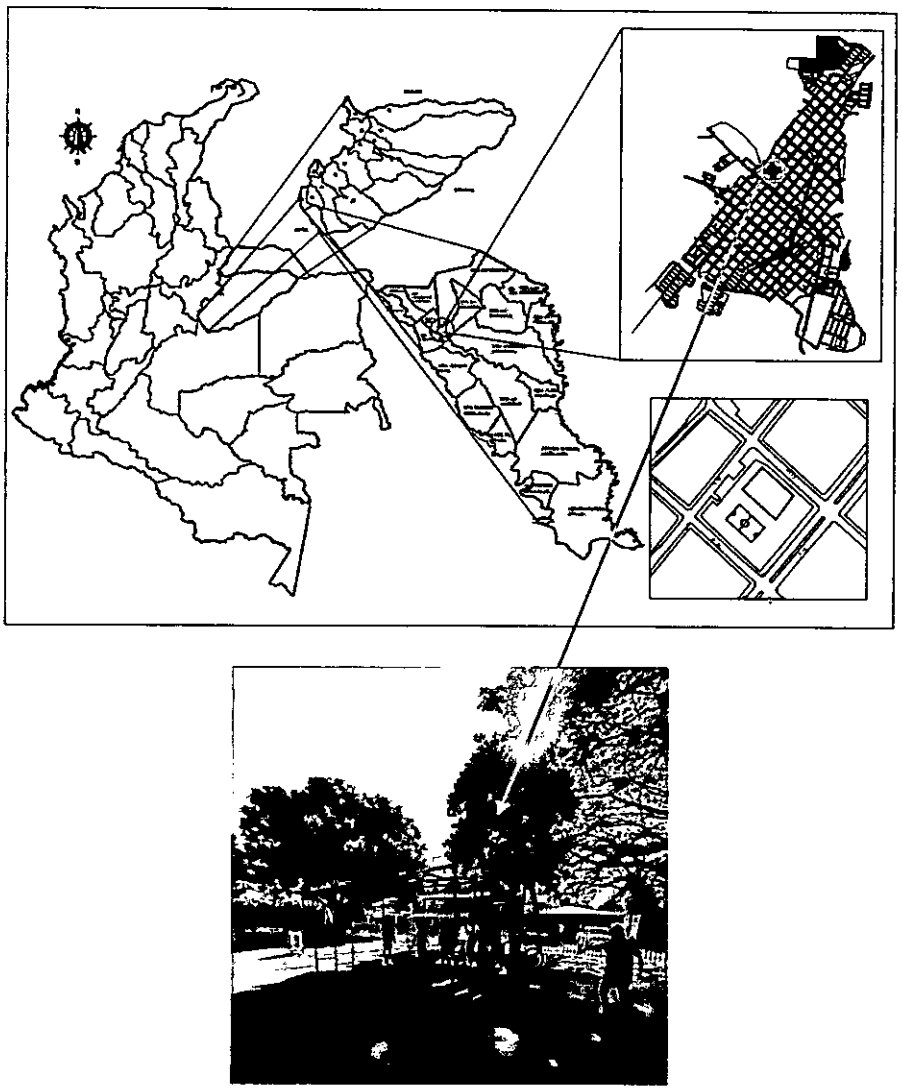


Figura 28. Estado actual del parque biosaludable del Parque Infantil

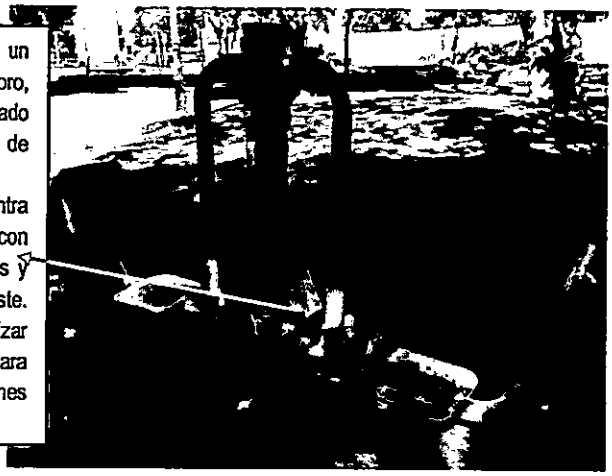

Esta máquina presenta un notable estado de deterioro, producto del prolongado tiempo de uso y la falta de mantenimiento.
Actualmente, se encuentra en malas condiciones, con varios acabados dañados y signos visibles de desgaste. Es recomendable realizar una evaluación técnica para determinar las acciones correctivas necesarias.

Figura 29. Estado actual del parque biosaludable del Parque Infantil

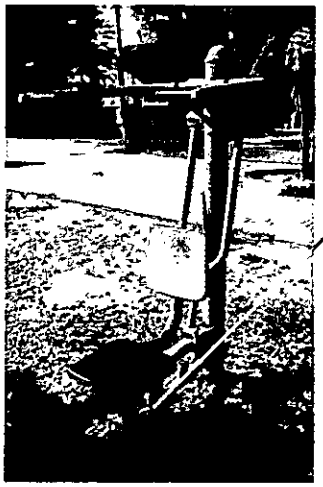


Este equipo muestra un evidente grado de desgaste debido al uso prolongado y la ausencia de mantenimiento adecuado. En la actualidad, se encuentra en condiciones deficientes, con varios acabados deteriorados y evidentes señales de uso. Se sugiere llevar a cabo una inspección técnica para identificar las reparaciones requeridas.

Figura 30. Estado actual del parque biosaludable del Parque Infantil



El equipo exhibe un estado deteriorado producto del uso prolongado y la ausencia de mantenimiento preventivo. En su estado actual, tiene acabados afectados y visibles indicios de desgaste.


Figura 31. Estado actual del parque biosaludable del Parque Infantil

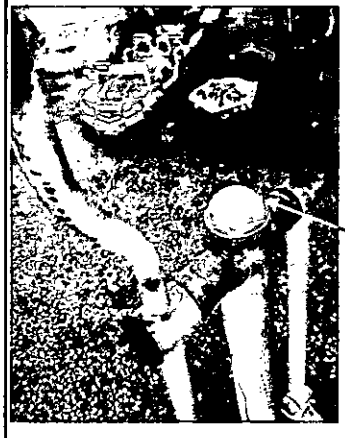



Las máquinas del parque biosaludable se encuentran en mal estado, ya que presentan corrosión, pérdida de pintura y la falta de varias piezas esenciales.

Figura 32. Estado actual del parque biosaludable del Parque Infantil

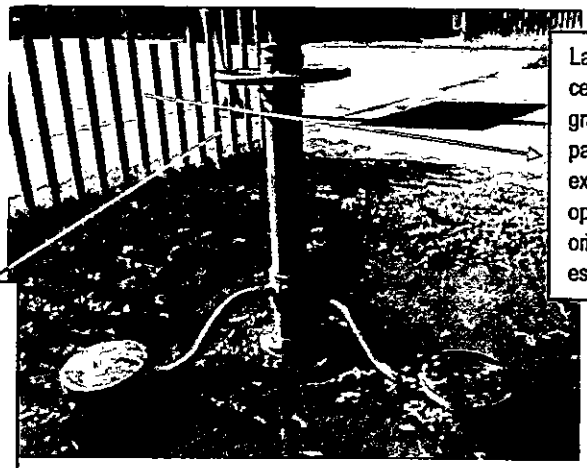

La pintura de los cerramientos muestra un alto grado de deterioro debido al paso del tiempo y la exposición al agua, lo que ha opacado los colores que originalmente daban vida al espacio.

El equipo presenta un deterioro evidente debido al uso prolongado y la falta de mantenimiento preventivo. Actualmente, muestra acabados dañados y signos visibles de desgaste.

Figura 33. Estado actual del parque biosaludable del Parque Infantil

El equipo presenta un deterioro evidente debido al uso prolongado y la falta de mantenimiento preventivo. Actualmente, muestra acabados dañados y signos visibles de desgaste.

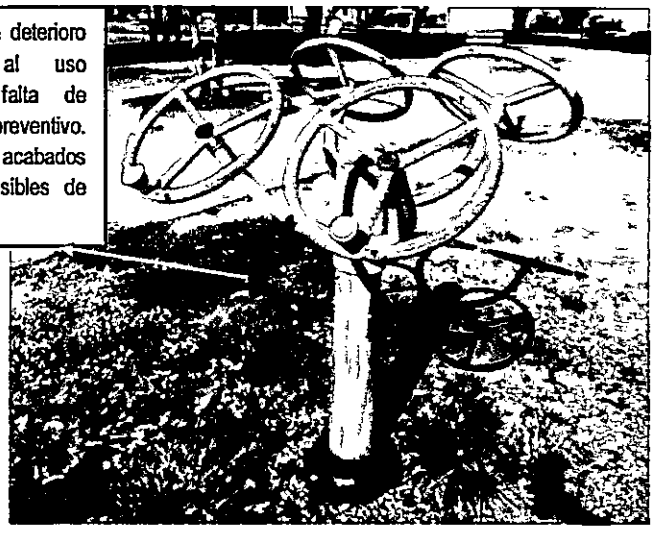


Figura 34. Estado actual del parque biosaludable del Parque Infantil

Las máquinas del parque biosaludable están en mal estado, con signos de corrosión, pérdida de pintura y ausencia de piezas esenciales. Además, es necesario construir una placa para evitar el estancamiento de agua, ya que esto impide que los niños puedan disfrutar y utilizar adecuadamente estas áreas de esparcimiento.


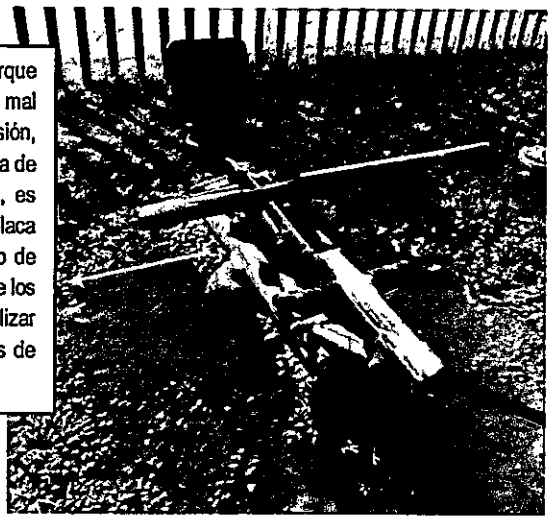


Figura 35. Estado actual del parque biosaludable del Parque Infantil

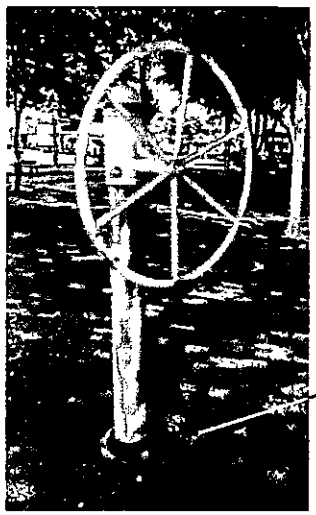

La máquina presenta deficiencias de mantenimiento, específicamente por la falta de pintura protectora y la necesidad de cambio de bujes. Estas condiciones pueden afectar su rendimiento y durabilidad, por lo tanto, es recomendable realizar las correcciones necesarias para garantizar su correcto funcionamiento y prolongar su vida útil.

Figura 36. Estado actual del parque biosaludable del Parque Infantil

La máquina presenta deficiencias de mantenimiento, específicamente por la falta de pintura protectora y la necesidad de cambio de bujes. Estas condiciones pueden afectar su rendimiento y durabilidad, por lo tanto, es recomendable realizar las correcciones necesarias para garantizar su correcto funcionamiento y prolongar su vida útil.



Figura 37. Estado actual del Parque Infantil

Esta silla presenta un avanzado estado de deterioro, ya que sus bordes están partidos, lo cual representa un riesgo potencial de accidentes. Se recomienda su retiro inmediato o reparación para garantizar la seguridad de los usuarios.

En este parque hace falta de mobiliario en varios puntos estratégicos de descanso.



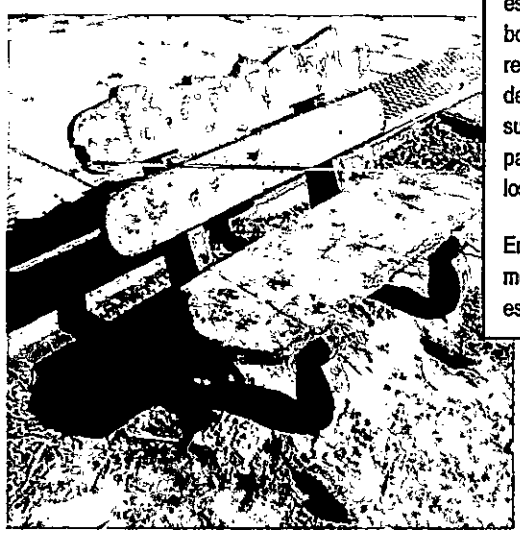


Figura 38. Estado actual del Parque Infantil

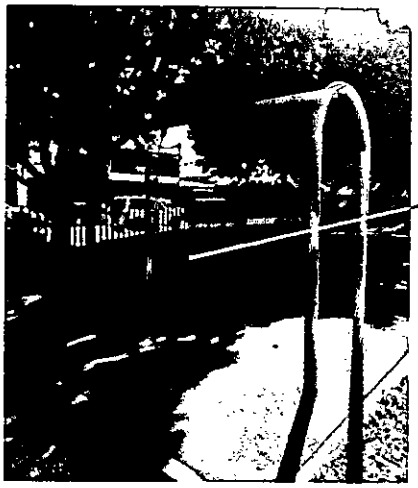

Esta estructura está sin sus columpios y necesita una pintura urgente, ya que ambos son parte fundamental de su funcionalidad, para el esparcimiento de los niños.

Figura 39. Estado actual del Parque Infantil

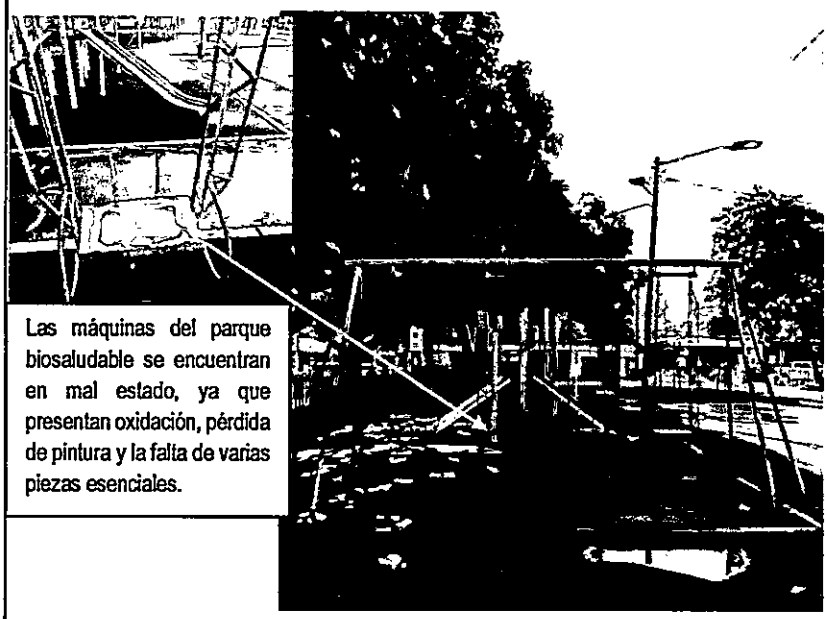

Las máquinas del parque biosaludable se encuentran en mal estado, ya que presentan oxidación, pérdida de pintura y la falta de varias piezas esenciales.

Figura 40. Estado actual del Parque Infantil



El parque se encuentra en mal estado y representa un peligro para los niños que lo frecuentan, ya que varios de sus juegos están oxidados y presentan un notable deterioro. Esta situación aumenta el riesgo de accidentes y lesiones, por lo que es necesario el mantenimiento del área para garantizar la seguridad de los menores.

Figura 41. Estado actual del Parque Infantil




El espacio presenta un notable deterioro: las máquinas están oxidadas, peladas y en algunos casos abiertas, lo que representa un peligro para la comunidad. Especialmente preocupante es la presencia de bordes filosos que podrían causar accidentes, sobre todo a los niños y niñas que frecuentan el lugar.

Figura 42. Estado actual del Parque Infantil



Figura 43. Estado actual del Parque Infantil

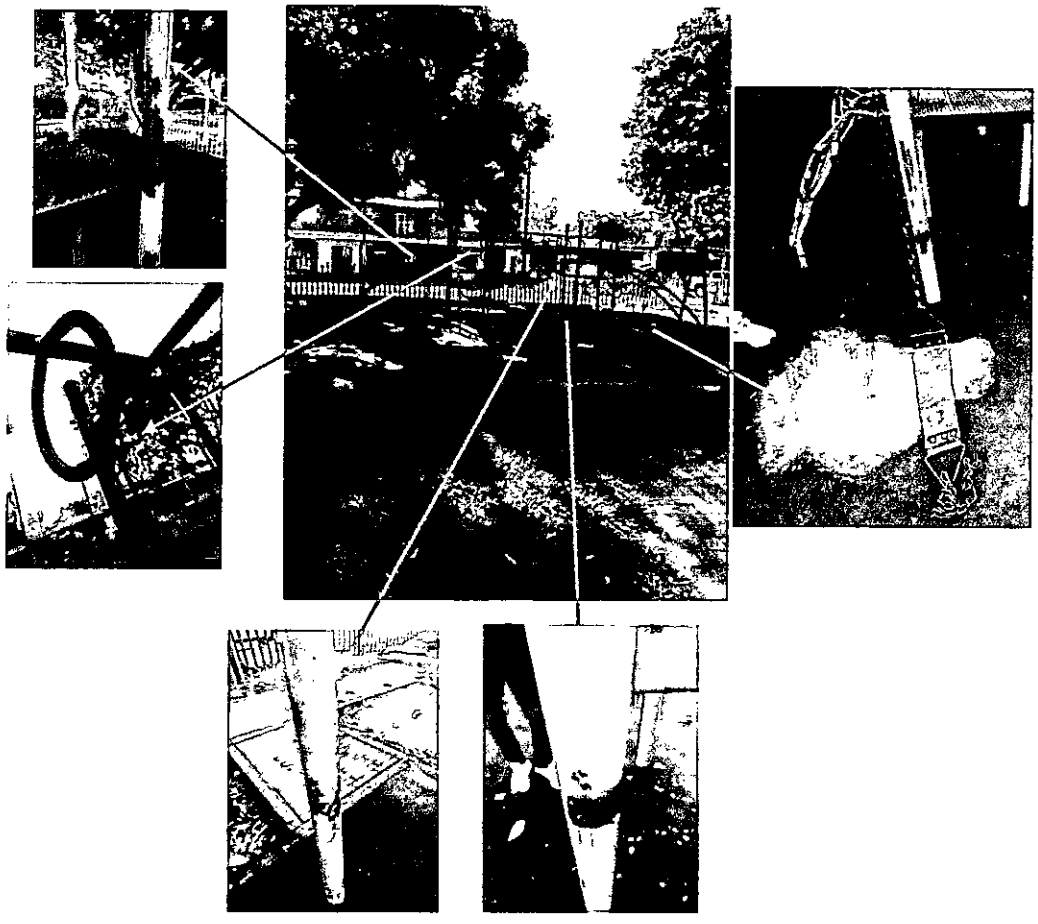

Este parque presenta un estado de deterioro considerable. Se observa corrosión constante en todos los tubos y estructuras metálicas. Además, el piso de EPDM está desgastado debido al paso del tiempo y la exposición continua a la lluvia, ya que el área no cuenta con un techo que lo proteja, lo que provoca daños por humedad. Por último, los columpios han desaparecido por completo, algunas laminas de metal se encuentran muy expuestas ya que esto puede causar alguna lesión algún niño.

Figura 44. Estado actual del Parque Infantil


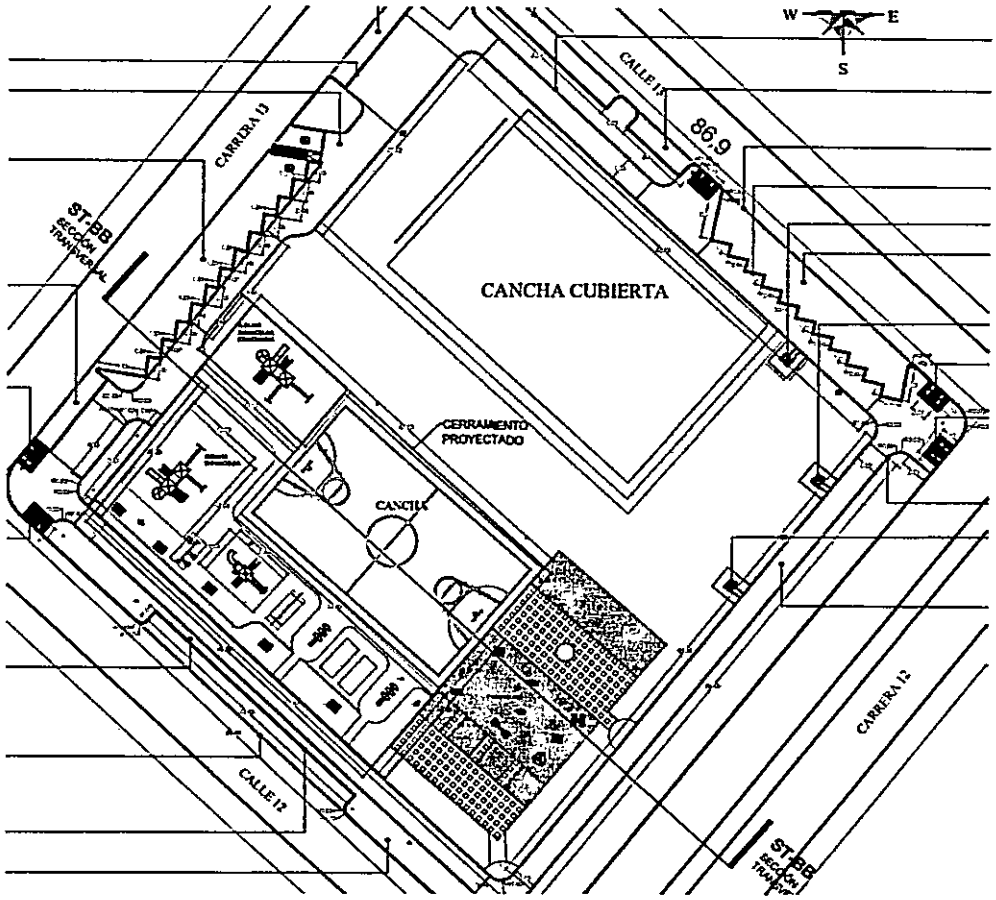


Figura 45. Estado actual del Parque Infantil

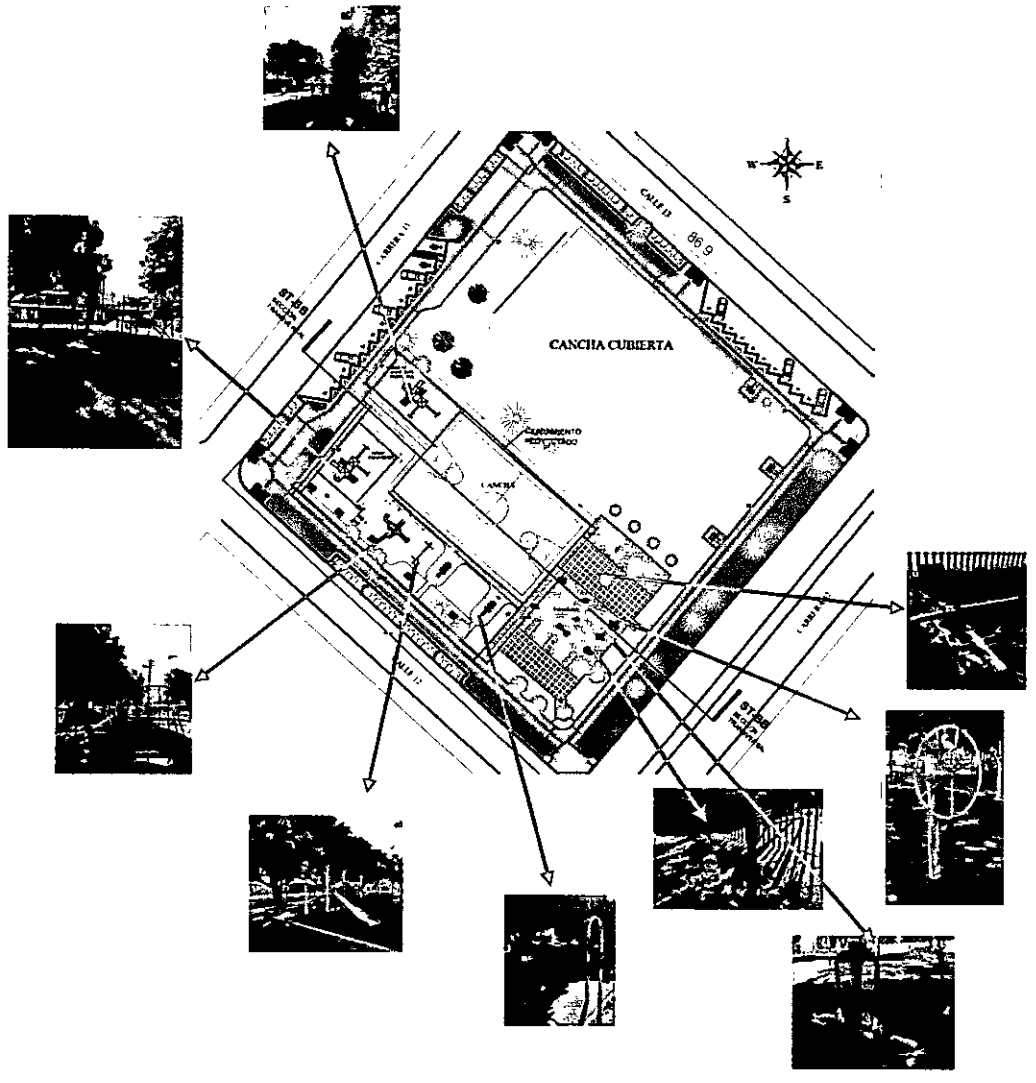

Las estructuras están desplazadas y algunos elementos se encuentran sueltos, lo que presenta un riesgo considerable para la seguridad de los usuarios, especialmente niños y adultos mayores. Se evidencia la necesidad de intervenir estas áreas para las instalaciones de un nuevo parque biosaludable, ya que el estado actual del espacio muestra un notable deterioro ocasionado por el paso del tiempo.


Esta situación limita el uso adecuado del parque, para transformar este espacio en un entorno seguro, funcional y adecuado para fomentar la salud y el esparcimiento,

incluyendo la convivencia entre la comunidad, así también se hace necesario la adecuación de los senderos que conectan con los diferentes puntos de los espacios. La intervención también contempla la incorporación de zonas con paisajismo que aporten armonía visual y ambiente al entorno, integrando diferentes espacios de las áreas intervenidas. Así mismo es necesario mobiliario urbano diseñado para el descanso y el esparcimiento de los visitantes, mejorando de manera iniciativa elevar la calidad de vida de la comunidad, fomentando un uso del espacio público que sea inclusivo, seguro y agradable para todos.

- Para garantizar el óptimo desempeño del espacio, es fundamental disponer de una infraestructura integral que incluya el mobiliario funcional, puntos de espacios recreativos y que sean seguros para los niños, algunas áreas de juegos que sea accesibles para todas las edades. Asimos, resulta esencial colocar lugares de maneras estratégicas, integrando zonas verdes que contribuyan a la preservación del entorno natural y favorecer un ambiente sano, fresco y confortable, para que toda la comunidad sea parte de estos espacios.
- En este espacio se requiere la construcción de una placa en el área destinada al parque biosaludable, debido a que actualmente se encuentra sobre el terreno natural.
  Esta condición provoca la acumulación de agua en varios puntos durante las lluvias, generando encharcamientos que dificultan o impiden el uso adecuado del espacio por parte de los usuarios, especialmente los niños. Por esta razón es necesario instalar nuevas máquinas, ya que, con el paso del tiempo y la acumulación del agua estancada, las actuales presentan un alto grado de corrosión y además de esto, tienen piezas faltantes; Estas maquinas son fundamentales, ya que forman parte de los espacios lúdicos y son importantes para la comunidad.
- También encontramos la necesidad del mantenimiento y adecuación de los parques infantiles como columpios, pintura, tubería, reemplazo de tubería oxidada, rodaderos y desmontaje de uno de los parques y reemplazarlo.

3.4 PARQUE PARAISO I "BOMBEROS"

Ilustración 4. Imagen Satelital Google Earth PARQUE INFANTIL BOMBEROS

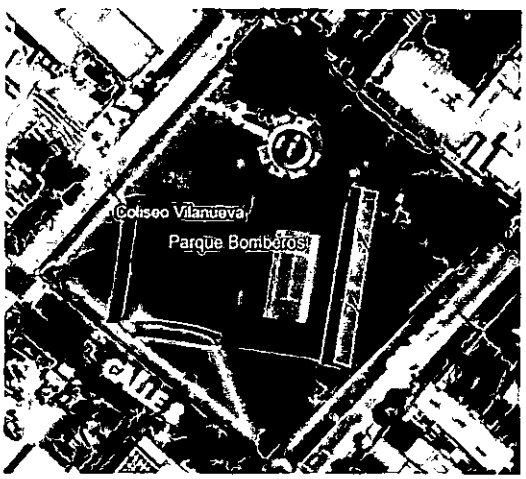

El Parque Paraíso I "Bomberos", en Villanueva, Casanare, es un espacio clave para el bienestar y la integración social. Es muy visitado en el municipio por sus amplias zonas destinadas a actividades recreativas, deportivas, culturales y educativas.


El Parque, constituye un espacio estratégico para el desarrollo de actividades pedagógicas, culturales, recreativas y deportivas. En este escenario convergen instituciones educativas del municipio para la ejecución de jornadas escolares complementarias, al igual que colectivos ciudadanos vinculados a la práctica del voleibol. Asimismo, el parque funciona como punto focal para eventos que promueven la participación ciudadana y fortalecen el tejido social del territorio.

Este parque vibra con la energía de quienes lo visitan. Familias enteras se dan cita aquí para reconectar, jugar, hacer deporte, trabajar bajo el cielo abierto o simplemente dejar que la mente respire entre árboles y senderos. Cada rincón invita a disfrutar y redescubrir el placer de estar al aire libre.

En este espacio se han identificado algunas necesidades, especialmente la falta de zonas de juego adecuadas para niños. Por ello, se considera necesaria la restauración del parque infantil temático de bomberos, ya que presenta deterioro por el paso del tiempo y carece de algunas piezas esenciales. Actualmente, el parque no se encuentra en condiciones óptimas, por lo que se recomienda llevar a cabo una adecuación integral del lugar. Esto incluye la recuperación de áreas verdes mediante la poda y roceria, la incorporación de elementos paisajísticos, la reposición de juegos faltantes y el retiro de aquellos que se encuentren en mal estado.


Las instalaciones de este centro están situadas sobre carera Cl. 8 #5-101 a 5-1 con coordenadas 4°36'21"N 72°55'34"W, la Secretaría de Obras Públicas realizó una visita técnica al lugar. A través de una inspección visual, se concluyó lo siguiente:

Figura 46. Estado actual del parque infantil del Parque de Bomberos

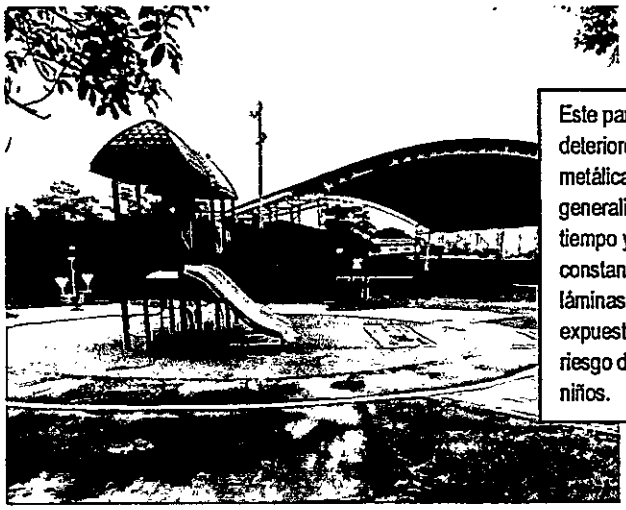

Este parque muestra un notable deterioro. Las estructuras metálicas presentan corrosión generalizada, por el paso del tiempo y la exposición constante a la lluvia. Algunas láminas de metal están expuestas, lo que representa un riesgo de lesiones para los niños.

Figura 47. Estado actual del parque infantil del Parque de Bomberos

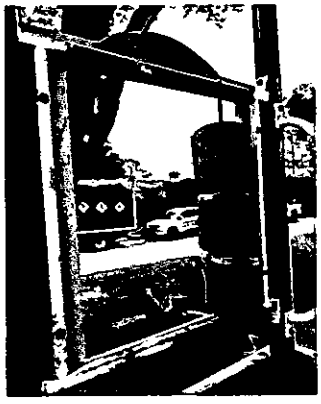

El espacio muestra un evidente estado de deterioro: El parque infantil de bomberos se encuentra, despintado y también podemos ver que muchas de las piezas del parque hacen falta.

Lo que representa un riesgo significativo para la comunidad. Resulta especialmente preocupante la presencia de bordes filosos, ya que podrían provocar accidentes, particularmente en niños y niñas que frecuentan el lugar.

Figura 48. Estado actual del parque infantil del Parque de Bomberos

El parque presenta un estado de deterioro avanzado, con estructuras metálicas corroídas y componentes de los juegos infantiles que evidencian desgaste significativo. Estas condiciones representan un riesgo potencial para la integridad física de los usuarios, en especial los niños. Se recomienda realizar una evaluación estructural detallada y ejecutar trabajos de mantenimiento correctivo y preventivo con el fin de restablecer las condiciones de seguridad y funcionalidad del área recreativa.



Figura 49. Estado actual del parque infantil del Parque de Bomberos



Figura 50. Estado actual del parque infantil del Parque de Bomberos

Se ha detectado la ausencia de algunas piezas de escalada, las cuales han sufrido desgaste progresivo y roturas como consecuencia del uso intensivo diario.

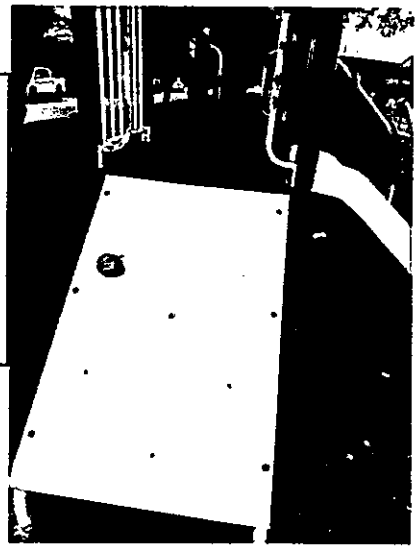


Figura 51. Estado actual del parque infantil del Parque de Bomberos




El parque infantil de bomberos, se encuentran en mal estado, ya que presentan oxidación, pérdida de pintura y la falta de varias piezas esenciales.

Figura 52. Estado actual del parque infantil del Parque de Bomberos



En este espacio es necesario, restaurar las piezas de tubería con raspado y pintura a alto grado de calor.

Las zonas verdes requieren de una roceria con el objetivo de evitar presencia de cualquier tipo de animal que pueda causar problemas a quienes transitan y hacen uso del mismo, asi como brindar espacios visualmente en optimas condiciones para su uso.

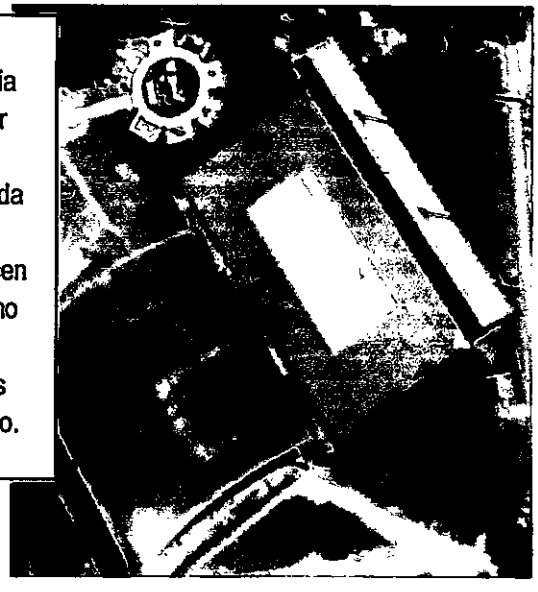

3.5 PARQUE INFANTIL CARI CARE

Ilustración 4. Imagen Satelital Google Earth PARQUE INFANTIL CARI CARE



El Parque Cari Care, en Villanueva, Casanare, es un espacio fundamental para los habitantes del barrio, ya que este promueve la interacción social. Este espacio es visitado por los habitantes del barrio y los barrios aledaños.

El Parque Cari Care, es un espacio fundamental para la comunidad ya que promueve la comunicación entre los vecinos y fortalece los lazos comunitarios. Es un lugar lleno de vida y energía, habitado diariamente por los niños, quienes le dan alegría y sentido a este espacio.

Sin embargo, con el paso del tiempo, hemos podido evidenciar diversas necesidades que requieren atención. Varias de las estructuras lúdicas se encuentran en avanzado estado de deterioro, actualmente el parque presenta malas condiciones: la pintura se ha desgastado casi por completo y no encontramos zonas verdes, que son esenciales para la vitalidad del espacio, ya que esto se ha visto afectado.

Por esta razón, es necesario intervenir este espacio para devolver su color, funcionalidad y alegría, y así continuar brindando un lugar seguro y atractivo para la comunidad, especialmente para los niños, ya que vivirán con energía quienes lo visitan, ya que cada rincón invita a descubrir el placer al aire libre.

En este espacio se han identificado algunas necesidades, especialmente la falta de zonas de juego adecuadas para niños. Por ello, se considera necesaria la restauración del parque infantil temático de Cari Care, ya que presenta deterioro por el paso del tiempo y carece de algunas piezas esenciales. Actualmente, el parque no se encuentra en condiciones óptimas, por lo que se recomienda llevar a cabo una

adecuación integral del lugar. Esto incluye la recuperación de áreas verdes, la incorporación de elementos paisajísticos, la reposición de juegos faltantes y el retiro de aquellos que se encuentren en mal estado.

A través de una inspección visual, se concluyó lo siguiente:

Figura 53. Estado actual del parque infantil del Parque de Cari Care

El parque infantil presenta desgaste en el mobiliario, corrosión y levantamiento de texturas



Figura 54. Estado actual del parque infantil del Parque de Cari Care

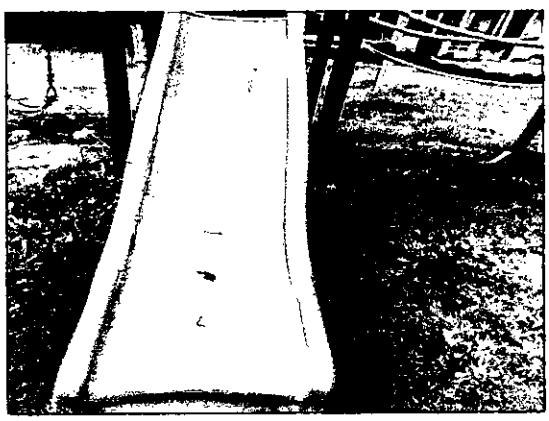


Figura 55. Estado actual del parque infantil del Parque de Cari Care

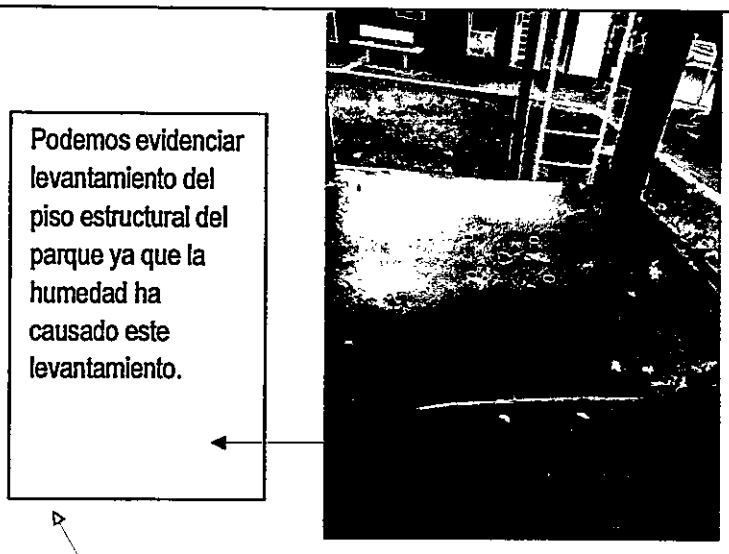


Figura 56. Estado actual del parque infantil del Parque de Cari Care



Figura 57. Estado actual del parque infantil del Parque de Cari Care

Podemos ver la falta de pintura protectora y mantenimiento.

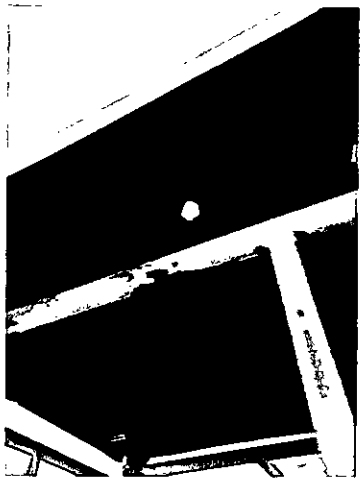


Figura 58. Estado actual del parque infantil del Parque de Cari Care

El resbaladero se encuentra en malas condiciones incluyendo el túnel ya que se evidencia que su color está desgastado.



Figura 59. Estado actual del parque infantil del Parque de Cari Care

Se encuentra deterioro en el color por el paso del tiempo ya que no se le ha realizado mantenimiento en un tiempo prolongado.



Figura 60. Estado actual del parque infantil del Parque de Cari Care

Podemos ver la corrosión y falta de pintura.

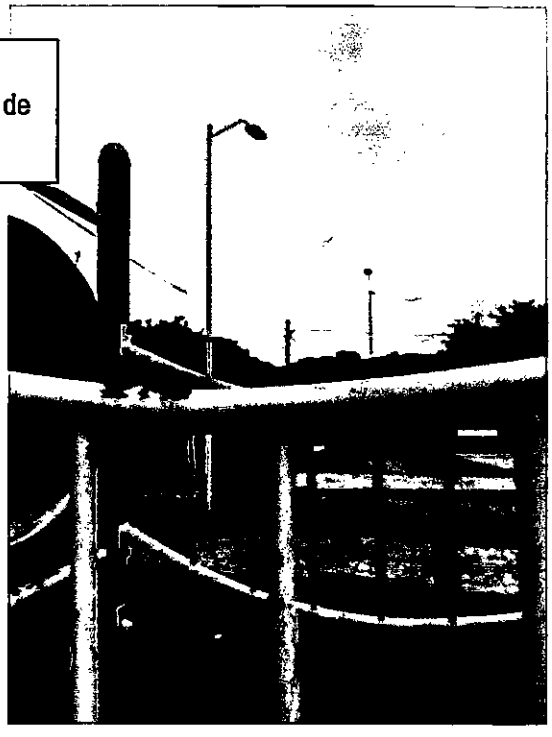


Figura 61. Estado actual del parque infantil del Parque de Cari Care

Este parque presenta un notable estado de deterioro por el prolongado tiempo de uso y la falta de mantenimiento, actualmente se encuentra en malas condiciones con varios signos de desgaste, por esto es recomendable realizar una evaluación técnica para determinar las opciones



Figura 62. Estado actual del parque infantil del Parque de Cari Care



3.6 PARQUE LINEAL VILLALUZ

Ilustración 5. Imagen Satelital Google Earth PARQUE INFANTIL Y ZONA VERDE



El parque lineal del barrio Villaluz en Villanueva, Casanare, es un espacio fundamental para los habitantes del barrio, ya que este promueve la interacción social entre los habitantes del barrio y los barrios aledaños.

El Parque, es un espacio fundamental para la comunidad ya que promueve la comunicación entre los vecinos y fortalece los lazos comunitarios, así como un lugar lleno de vida y energía, habitado diariamente por los niños, quienes le dan alegría y sentido a este espacio.

Sin embargo, con el paso del tiempo, hemos podido evidenciar diversas necesidades que requieren atención. Varias de las estructuras lúdicas se encuentran en avanzado estado de deterioro, actualmente el parque presenta malas condiciones: la pintura se ha desgastado casi por completo y las zonas verdes se encuentran en un nivel de altura que requieren de una poda y/o rocería con el objetivo de brindar espacios seguros y aptos, que son esenciales para la vitalidad del espacio, ya que esto se ha visto afectado.

Por esta razón, es necesario intervenir este espacio para devolver su color, funcionalidad y alegría, y así continuar brindando un lugar seguro y atractivo para la comunidad, especialmente para los niños, ya que vivirán con energía quienes lo visitan, ya que cada rincón invita a descubrir el placer al aire libre.

En este espacio se han identificado algunas necesidades, especialmente la falta de zonas de juego adecuadas para niños. Por ello, se considera necesaria la restauración del parque infantil temático.

LAMAR ANDREW LINDENMUTH NIÑO
Profesional de Apoyo
Secretaría de Infraestructura

Villanueva Casanare, 19 de enero de 2026

REFERENCIA: VC-SIP-009 DE 2026

ASUNTO: Solicitud cotización de productos y/o servicios.

La Alcaldía Municipal de Villanueva Casanare, a través de la Secretaría de Infraestructura, de conformidad con los principios de transparencia para la contratación, convoca públicamente a proporcionar la información mediante la presente solicitud de cotización, a todos los interesados, como parte del estudio de mercado del proceso No. VC-SIP-009 DE 2026.

Atendiendo el siguiente cuadro de especificaciones:

ITEM	DESCRIPCION/ ESPECIFICACION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA TOTAL	VALOR TOTAL
1	Mantenimiento y adecuación de máquinas gimnasio al aire libre incluye: cambio de ajustes (ejes, camisas, balineras y rodamientos), pintura electroestática (al horno), cambio de tapones en empak. Suministro e instalación de mecanismo antirrobo 4" (incluye tornillería).	UND	1			
2	Mantenimiento y adecuación de máquinas gimnasio al aire libre incluye: pintura electroestática (al horno), cambio de tapones empak, instalación de mecanismo antirrobo 4" (incluye tornillería)	UND	1			
3	Mantenimiento y adecuación de máquinas gimnasio al aire libre incluye: pintura electroestática (al horno) y cambio de tapones empak	UND	1			

De igual manera la empresa deberá contar con:

a) Disponibilidad para la entrega de información en el plazo pactado.
b) Garantizar la calidad del servicio y/o suministro.
c) Responder por la garantía cuando esta lo demande.

NOTA 1: En referencia al impuesto a las ventas, solo se deberá discriminar si es responsable del impuesto, de lo contrario esta casilla se debe diligenciar con cero.

NOTA 2: En la cotización que se presente a la entidad, deberá desglosar los costos directos e indirectos; de no desglosarse, se entenderá que estos están inmersos en el valor del bien o servicio.

En la cotización debe constar el NIT, Dirección, Teléfono y Correo Electrónico

NOTA 3: La cotización solicitada servirá de base para la elaboración del estudio de mercado, que permita definir el presupuesto oficial de la contratación y, por tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

La cotización de los productos y/o servicios deberá enviarse, al correo electrónico (obraspublicas@villanueva-casanare.gov.co) adjuntando los siguientes documentos: Cámara de Comercio, RUT, copia de la cedula de ciudadanía, compromiso integridad y anticorrupción; certificado de inhabilidades e incompatibilidades, prohibiciones y conflicto de intereses.

Agradecemos su valiosa colaboración

Atentamente,

CAMILO ALBERTO REINA URREGO
Secretario de Despacho
Secretaria de Infraestructura

Elaboró: MIGUEL ANGEL CAMARGO TARACHE
Profesional Universitario
Secretaria de Infraestructura

Villanueva Casanare, 19 de enero de 2026

REFERENCIA: VC-SIP-010 DE 2026

ASUNTO: Solicitud cotización de productos y/o servicios.

La Alcaldía Municipal de Villanueva Casanare, a través de la Secretaría de Infraestructura, de conformidad con los principios de transparencia para la contratación, convoca públicamente a proporcionar la información mediante la presente solicitud de cotización, a todos los interesados, como parte del estudio de mercado del proceso No. VC-SIP-010 DE 2026.

Atendiendo el siguiente cuadro de especificaciones:

ITEM	DESCRIPCION/ ESPECIFICACION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA TOTAL	VALOR TOTAL
1	Valla informativa (0.80mx1.0m cal.20) en impresión digital con estructura soporte (H: 1.80m). Suministro	UND	1			
2	Maquina gimnasio aire libre patín. Suministro	UND	1			
3	Maquina gimnasio aire libre bicicleta estática. Suministro	UND	1			
4	Maquina gimnasio aire libre columpio. Suministro	UND	1			
5	Maquina gimnasio aire libre doble surf. Suministro	UND	1			
6	Maquina gimnasio aire libre elíptica. Suministro	UND	1			
7	Maquina gimnasio aire libre pectoral sentado. Suministro.	UND	1			
8	Maquina gimnasio aire libre pony. Suministro	UND	1			
9	Maquina gimnasio aire libre Twister. Suministro	UND	1			
10	Maquina gimnasio aire libre camilla. Suministro	UND	1			
11	Maquina gimnasio aire libre remo. Suministro	UND	1			
12	Maquina gimnasio aire libre paralelas. Suministro	UND	1			
13	Maquina gimnasio aire libre volantes. Suministro.	UND	1			
14	Parque infantil en tubo galvanizado 3" Area=5.1x8.2 mts, con rodaderos: 1 doble y 1	UND	1			

	sencillo, 3 plataformas, 1 muro de escalar, 1 triki, 1 techo plastico castillo, 1 techo piramidal, tornilleria galv. y acabados en pintura electrostática. Suministro					
15	Tobogan plastico en 4 piezas, diametro = 65 cm. Suministro	UND	1			
16	Deslizadero doble en fibra de vidrio. longitud = 2.4 mts. Suministro	UND	1			
17	Deslizadero sencillo en fibra de vidrio. longitud = 2.4 mts. Suministro	UND	1			
18	Lonas y cadena para columpios, altura 1.4 mts. Suministro	UND	1			
19	Lonas y cadena para columpios, altura 1.1 mts. Suministro	UND	1			
20	Tubo tipo bomberos para parque infantil medidas 1 17x2.30 mts. Suministro	UND	1			
21	Domo tipo burbuja para parque infantil, diametro = 60 cm. Suministro	UND	1			
22	Piezas para escalador de parque infantil. Suministro	UND	1			
23	Triki para parque infantil. Suministro	UND	1			
24	Cupula en fibra de vidrio medida de 1.2x1.2 mts para parque infantil. Suministro	UND	1			

De igual manera la empresa deberá contar con:

a) Disponibilidad para la entrega de información en el plazo pactado.
b) Garantizar la calidad del servicio y/o suministro.
c) Responder por la garantía cuando esta lo demande.

NOTA 1: En referencia al impuesto a las ventas, solo se deberá discriminar si es responsable del impuesto, de lo contrario esta casilla se debe diligenciar con cero.

NOTA 2: En la cotización que se presente a la entidad, deberá desglosar los costos directos e indirectos; de no desglosarse, se entenderá que estos están inmersos en el valor del bien o servicio.

En la cotización debe constar el NIT, Dirección, Teléfono y Correo Electrónico

NOTA 3: La cotización solicitada servirá de base para la elaboración del estudio de mercado, que permita definir el presupuesto oficial de la contratación y, por tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

La cotización de los productos y/o servicios deberá enviarse, al correo electrónico (obraspublicas@villanueva-casanare.gov.co) adjuntando los siguientes documentos: Cámara de Comercio, RUT, copia de la cedula de ciudadanía, compromiso integridad y anticorrupción; certificado de inhabilidades e incompatibilidades, prohibiciones y conflicto de intereses.

Agradecemos su valiosa colaboración

Atentamente,

CAMILO ALBERTO REINA URREGO
Secretario de Despacho
Secretaría de Infraestructura

Elaboró: MIGUEL ANGEL CAMARGO TARACHE
Profesional Universitario
Secretaría de Infraestructura

LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA DEPARTAMENTO DE CASANARE

CERTIFICA:

Que, en cumplimiento de los principios de publicidad, transparencia y participación que rigen la contratación estatal, se publicó el evento de solicitudes de cotización identificados con los números VC-SIP-009 de 2026 y VC-SIP-010 de 2026, en el sitio web oficial de la Alcaldía Municipal de Villanueva Casanare (https://www.villanueva-casanare.gov.co/), el día diecinueve (19) de enero de 2026, otorgando un plazo de cuatro (4) días hábiles para la recepción de cotizaciones, contados a partir del día de la publicación de la solicitud, conforme a los lineamientos internos y a los procedimientos establecidos para la elaboración de estudios de mercado y la determinación del valor estimado de los contratos.

El documento correspondiente a la solicitud de cotización fue dispuesto para consulta pública a través de los siguientes enlaces institucionales: https://www.villanueva-casanare.gov.co/solicitud-de-cotizaciones/solicitud-cotizacion-de-productos-yo-servicios-vcsip009

https://www.villanueva-casanare.gov.co/solicitud-de-cotizaciones/solicitud-cotizacion-de-productos-yo-servicios-vcsip010

No obstante, una vez culminado el plazo establecido para la recepción de cotizaciones, correspondiente al periodo comprendido entre el veinte (20) y el veintitrés (23) de enero de 2026, no se recibió el número mínimo de cotizaciones requerido para la elaboración del estudio de mercado que permita determinar el presupuesto del proceso.

En atención a lo anterior, y de conformidad con el procedimiento de la circular interna No. 002 del 2 de septiembre de 2025 por medio de la cual se da aplicación al Decreto 1600 del 27 de diciembre de 2024 emitido por el gobierno nacional, para la elaboración de estudios de mercado y la determinación del valor estimado de los contratos, la Secretaría de Infraestructura deja constancia de la invitación realizada a los potenciales proveedores y de la ausencia de respuestas dentro del término señalado. En consecuencia, y con el fin de garantizar la debida planeación contractual, la entidad procede a solicitar cotizaciones de manera directa, a través de correo electrónico, como mecanismo alternativo para la estructuración de un estudio de mercado objetivo, verificable y transparente.

La presente certificación se expide a los veintisiete (27) días del mes de enero de 2026.

CAMILO ALBERTO REINA URREGO
Secretario de Infraestructura
Municipio de Villanueva Casanare

Proyectó: LAMAR ANDREW LINDENMUTH NIÑO
Profesional contratado CPSP 071 de 2026
