ACTA DE REUNION

Consecutivo Acta	FECHA	HORA INICIO	HORA FINAL	LUGAR
08	10 Mar/26	9:20am	9:50am	Edificio F25 piso 16 I86.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Informar plantas estan listas para entrega. (contratista).

RESPONSABLES DE LA REUNIÓN

NOMBRE	ROL EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD
Maria Fernanda Leal	Supervisor - Ing. Civil. (Contratante).

CONVOCADOS / ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	ASISTIO LIDER		DELEGO	
		SI	NO	SI	NO
Brayan Gutierrez	Director de ejecución.	x			
Claudia Santoo	Funcionaria Contratista.	x			
Maria Fernanda Leal	Supervisión	x			
Liliana Morales	Invitada entidad	x			
Maria Camila Rojas	" "	x			
Eduin Piaño	Contratante R.L. Entidad.	x			
Martin Trujillo.		x			
Nelson Sánchez C.	Interventoría - Ing. Obra.	x			

Powered by CamScanner

AGENDA

TEMA	JUSTIFICACIÓN	RESPONSABLE	TIEMPO ESTIMADO
Necesidad de entrega Plantas.	(estan en zona franca)	Supervisor	10 mins
Reinicio contrato	(posibilidad).		10 min.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Informa la supervisión que no es posible hacer la entrega de las plantas en las sedes, pues el contrato está suspendido, tal y como se respondió ayer por parte de la interventoría y de la supervisión por correo electrónico.

2. La consultoría de la entidad está realizando respuesta a las observaciones de la interventoría de la consultoría, para la entrega formal del estudio de suelos por parte de la entidad al contratista de plantas CON26-114-2025, para que este proceda con la elaboración del estudio de estructural de la placa y así, determinar el detalle de las obras civiles como se acordó en anteriores comités.

3. Mañana 9:00am hay comité entre la entidad y la consultoría, para definir cuando se tiene el producto final del estudio de suelos concertado y aprobado. Informará la

Powered by CamScanner


Supervisión el resultado de esa reunión, a las partes aquí intervenidas.

4. El contratista de plantas manifiesta que le está generando costos adicionales el hecho de mantener las plantas en zona franca, y necesita entregarlos en sitio o que el contratante disponga ó de un bodegaje.

5. Propone la entidad reiniciar contrato después de la conclusión de la reunión de mañana con la consultoría, para que el contratista pueda llevar a las redes las plantas eléctricas.

6. Manifiesta el contratista que las plantas ya las tiene en bodega en ciudad de Ibagué.

Powered by CamScanner

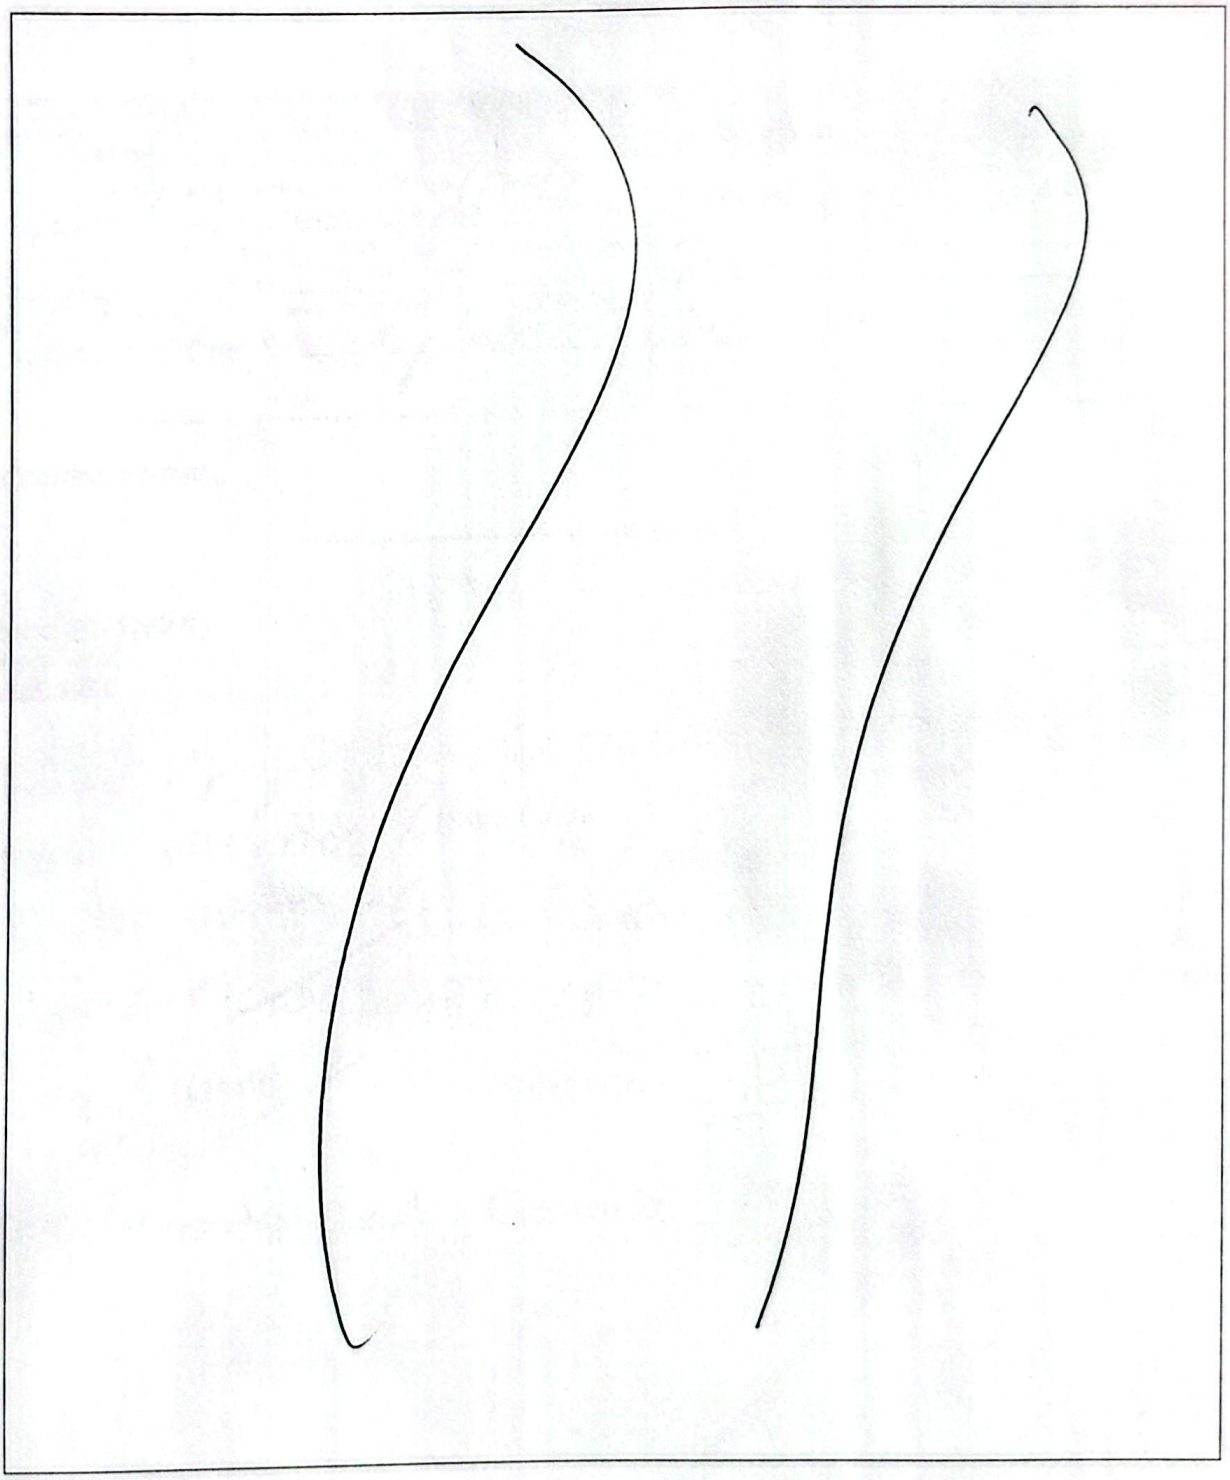

Powered by CamScanner

1.
2.
3.

COMPROMISOS			
N°	TEMA	RESPONSABLE	ENTREGA
1	Informar resultado revisión consultoría externa	Supervisor	Marzo 11/26 11:00 AM
2.	Informar fecha y condiciones reinicio	Supervisor	" "
3.	Posible entrega productos estudios de suelos	Supervisor	" "

En Constancia firman,

Anexos: SI(X) NO ()
Elaboró: ARE
Revisó: WES

1. Nelson Enrique Sánchez Cortes / Ingeniero Obra Interventoría
2. Brayan Gutierrez / Director obra /
3. Claudia Santin - Cont. Adms. apoy. GVR
4. Liliana Mordes Lugo / prof. universitario DSAJ Ibagué
5. Maria Camila Rojas Paternina
6. Maria Fernanda Leal Galeano

Powered by CamScanner
