HENRY ANTONIO GARZON AVILA

NIT 11436534 - 3
CL 14 4 A 10
3176698411
gestion.210210@gmail.com
Bogotá, D.C

Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764107016747 de 10/03/2026 al 10/09/2026
Habilita numeración de:
No. 78 al 500
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No Aplica - Otros

Cliente:	AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A. E.S.P NIT 900322539 - 4	**Factura electrónica de venta No.** FE83	
Dirección:	CR 2 X CLL 4 ESQ, Subachoque Cundinamarca	**Fecha de emisión:**	09/04/2026
Código cliente:	10	**Fecha de vencimiento:**	09/04/2026
Teléfono:	3162452024	**Plazo (Días):**	0
Dirección Despacho:		**Codigo de moneda:**	COP
Contacto:		**Tasa Cambio**	
Ciudad:	Subachoque	**Orden de compra**	
Departamento:	Cundinamarca	**Remisión**	
País:	Colombia	**Pedido**	
		Asesor	
		Aviso de Recibo	

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuento	Impuestos	Rte Fte	Total
1		PAGO ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 2 DEL CONTRATO. 002 DE 2025 CUYO OBJETO ES: OBJETO: ""OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, CUNDINAMARCA"	1.00	unidad	$ 137.329.560,00	$ 0,00			$ 137.329.560,00

Total de items: 1

Observaciones:

Son: CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA CON CERO

Subtotal:	$ 137.329.560,00

Forma de pago: Contado

Medio de pago: Transferencia Débito

Impuestos:	$ 0,00
Retenciones:	$ 0,00
Descuentos de la factura:	$ 0,00
Cargos de la factura:	$ 0,00
Anticipos:	$ 0,00
Total:	$ 137.329.560,00
Neto a pagar:	$ 137.329.560,00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 9fe201bd5b9f3dc9cc84c63f30df3a2aed5b9e01dfb89e284ee1100124cc4811383dfdf519b0b7146cbeb60cf7e563c9

P

2. CERTIFICACION BANCARIA

3. RUT

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14865189873

(415)7707212489984(8020) 000001486518987 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 4 3 6 5 3 4	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 4 3 6 5 3 4	1 9 8 8 1 2 2 9

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Facatativá 2 6 9

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
GARZON	AVILA	HENRY	ANTONIO

. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Facatativá 2 6 9

41. Dirección principal: CL 14 4A 10

42. Correo electrónico: INGENIEROHAGA@GMAIL.COM

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	8 4 2 4 5 7 5	3 1 0 8 7 3 6 6 9 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 0 3 0 4 2 8	4 2 2 0	2 0 0 3 0 4 2 8		4 1 1 2	4 3 3 0	2 1 4 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 2 2 4 8 5 2

- Impto. renta y compl. régimen ordinar
22- Obligado a cumplir deberes formales a
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2022 - 09 - 16 / 12 : 19: 27

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: GARZON AVILA HENRY ANTONIO
985. Cargo: CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

4. CEDULA R/L

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 11.436.534

GARZON AVILA

APELLIDOS

HENRY ANTONIO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 10-SEP-1970

FACATATIVA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.69 ESTATURA | B+ G.S. RH | M SEXO

29-DIC-1988 FACATATIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1507600-00184688-M-0011430534-20091010 0017014928A 1 25986255

5. ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 2

MUNICIPIO DE SUBACHOQUE	CONTRATO DE OBRA 002 DE 2025	OBJETO: "OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, CUNDINAMARCA"	
	ACTA DE RECIBO PARCIAL 2	VALOR DEL CONTRATO	$ 217.682.748
		VALOR ACTA No. 1	$ 56.792.816
	FECHA 10 DE MARZO 2026	VALOR PRESENTE ACTA	$ 137.329.560
		VALOR POR EJECUTAR	$ 23.560.372

CONDICIONES CONTRACTUALES						MAY/MEN	CONDICIONES MODIFICADAS		ACTA DE RECIBO PARCIAL 1		ACTA DE RECIBO PARCIAL 2		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL		CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL
1	RETIRO MANUAL, CARGUE Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL FILTRANTE	M3	9,50	$ 89.054,00	$ 846.013,00	0,40	9,5	$ 846.013,00	9,10	$ 810.391,40	0,00	$ -	9,10	$ 810.391,40
2	REFORZAMIENTO ESTRUCTURA METALICA FALSO PISO BASE DEL FILTRO	M2	7,28	$ 86.746,00	$ 631.510,88	-	7,28	$ 631.510,88	7,28	$ 631.510,88	0,00	$ -	7,28	$ 631.510,88
3	CAMBIO DE BOQUILLAS ROTULADAS MATERIAL PVC A TODO COSTO (INCLUYE DESMONTE DE LAS BOQUILLAS ANTIGUAS Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAS NUEVAS)	UN	324,00	$ 13.319,00	$ 4.315.356,00	-	324	$ 4.315.356,00	324,00	$ 4.315.356,00	0,00	$ -	324,00	$ 4.315.356,00
4	ESTABILIZACION MEMBRANA ESTRUCTURA PERFIL METALICO REFORZADO.	ML	7,28	$ 99.737,00	$ 726.085,36	-	7,28	$ 726.085,36	7,28	$ 726.085,36	0,00	$ -	7,28	$ 726.085,36
5	LAVADO Y RESANE DE MUROS FILTRO PARA INSTALACION DE MEMBRANA DE IMPERMEABILIZACION	M2	116,08	$ 28.790,00	$ 3.341.943,20	0,52	116,08	$ 3.341.943,20	115,56	$ 3.326.972,40	0,00	$ -	115,56	$ 3.326.972,40
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA PARA IMPERMEABILIZACIÓN PVC DE 1500 MICRAS (1,5MM), REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO O MALLA POLIESTER TERMOSELLADO	M2	116,08	$ 212.000,00	$ 24.608.960,00	0,52	116,08	$ 24.608.960,00	115,56	$ 24.498.720,00	0,00	$ -	115,56	$ 24.498.720,00
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE ARENA GRADADA PARA FILTROS DE POTABILIZACIÓN (TAMICES NO 10 HASTA NO 60)	M3	3,00	$ 878.890,00	$ 2.636.670,00	- 0,64	3	$ 2.636.670,00	3,64	$ 3.199.159,60	0,00	$ -	3,64	$ 3.199.159,60
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE GRAVA GRADADA PARA FILTROS DE POTABILIZACIÓN (TAMICES 1 1/2" HASTA NO 12)	M3	2,50	$ 878.890,00	$ 2.197.225,00	- 0,41	2,50	$ 2.197.225,00	2,91	$ 2.559.327,68	0,00	$ -	2,91	$ 2.559.327,68
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE CARBON TIPO ANTRACITA PARA FILTRO DE POTABILIZACIÓN	M3	4,00	$ 1.033.690,00	$ 4.134.760,00	1,45	4,00	$ 4.134.760,00	2,55	$ 2.633.842,12	0,00	$ -	2,55	$ 2.633.842,12
10	SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDOR BRIDADO DE 6"	UN	2,00	$ 3.035.505,00	$ 6.071.010,00	1,00	2	$ 6.071.010,00		$ -	1,00	$ 3.035.505,00	1,00	$ 3.035.505,00
11	SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO BRIDADO DE 6"	UN	2,00	$ 2.619.719,00	$ 5.239.438,00	1,00	2	$ 5.239.438,00		$ -	1,00	$ 2.619.719,00	1,00	$ 2.619.719,00
12	EMPAQUE NEOPRENO 6"	UN	8,00	$ 21.634,00	$ 173.072,00	4,00	8	$ 173.072,00		$ -	4,00	$ 86.536,00	4,00	$ 86.536,00
13	ADAPTADOR BRIDA X UNIVERSAL 6" HD	UN	8,00	$ 704.295,00	$ 5.634.360,00	4,00	8	$ 5.634.360,00		$ -	4,00	$ 2.817.180,00	4,00	$ 2.817.180,00
14	JUEGOS DE TORNILLOS PARA BRIDAS, PERNOS PARA CONECTAR BRIDAS, JUEGO DE TORNILLO CON TUERCA Y ARANDELA	UN	64,00	$ 32.257,00	$ 2.064.448,00	-	64	$ 2.064.448,00		$ -	64,00	$ 2.064.448,00	64,00	$ 2.064.448,00
15	ESCALERA TELESCÓPICA 3.2 M ALUMINIO PLEGABLE ANTIDESLIZANTE	UN	5,00	$ 910.293,00	$ 4.551.465,00	-	5	$ 4.551.465,00		$ -	5,00	$ 4.551.465,00	5,00	$ 4.551.465,00
16	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR CON SENSOR DE PH Y CLORO Y BOMBA DOSIFICADORA DE ESTABILIZADOR DE PH	UN	1,00	$ 17.877.125,00	$ 17.877.125,00	-	1	$ 17.877.125,00		$ -	1,00	$ 17.877.125,00	1,00	$ 17.877.125,00
17	TANQUE EN PRFV PARA UN VOLUMEN DE 25.000 LITROS	UN	1,00	45.220.906,00	45.220.906,00	-	0	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
18	REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS	M2	20,25	5.351,00	108.357,75	-	0	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
19	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	14,17	74.140,00	1.050.563,80	-	0	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
20	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	8,10	114.384,00	926.510,40	-	0	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
21	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	780,08	7.951,00	6.202.416,08	-	0	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
22	PLACA PISO 3500 PSI E=0,30 M	M2	20,25	225.250,00	4.561.312,50	-	0	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
23	CONSTRUCCIÓN DE ANCLAJE DE TUBERÍAS CON ATRAQUES EN CONCRETO 21 MPA (3000PSI) HECHO EN OBRA	M3	1,00	854.666,00	854.666,00	-	0	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
24	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES	ML	62,54	10.870,00	679.809,80	-	0	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
25	SEÑALIZACIÓN Y AISLAMIENTO DE ÁREAS DE TRABAJO, INCLUYE CINTA DE SEGURIDAD, POSTES TUBULARES, CONOS GUIA, SEÑALES PREVENTIVAS Y REGLAMENTARIAS	ML-MES	20,00	63.632,00	1.272.640,00	-	0	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
26	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	25,01	21.180,00	529.711,80	-	0	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
27	EXCAVACIÓN MANUAL EN ROCA H=0.0-2.0 M (SECO SIN EXPLOSIVOS)	M3	1,00	147.070,00	147.070,00	-	0	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
28	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3-KM	743,74	1.735,00	1.290.387,56	-	0	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
29	RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA"	M3	9,37	161.682,00	1.514.960,34	-	0	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
30	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	15,64	114.384,00	1.788.965,76	-	0	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
31	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	1,00	30.937,00	30.937,00	-	0	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
32	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERÍA POLIETILENO PE 100 - 160MM TERMOFUSIÓN	ML	62,54	198.954,00	12.442.583,16	-	0	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
ITEMS NO PREVISTOS														
NP1	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	ML		$ 31.443	$ -	0,00	36,0	$ 1.131.979,44		$ -	36,00	$ 1.131.948,00	36,00	$ 1.131.948,00
NP2	REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS	M2		$ 5.351	$ -	-13,60	36,00	$ 192.636,00		$ -	22,40	$ 119.862,40	22,40	$ 119.862,40
NP3	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRÁNTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3		$ 74.140	$ -	-9,03	25,74	$ 1.908.660,16		$ -	16,71	$ 1.238.879,40	16,71	$ 1.238.879,40
NP4	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3		$ 114.384	$ -	-14,97	24,12	$ 2.759.399,62		$ -	9,15	$ 1.046.613,60	9,15	$ 1.046.613,60
NP5	ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI	M3		$ 855.040	$ -	-1,43	7,74	$ 6.621.429,76		$ -	6,31	$ 5.395.302,40	6,31	$ 5.395.302,40
NP6	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG		$ 10.491	$ -	-47,89	74,88	$ 785.566,08		$ -	26,99	$ 283.152,09	26,99	$ 283.152,09
NP7	PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI	M2		$ 79.248	$ -	-13,60	36,00	$ 2.852.928,00		$ -	22,40	$ 1.775.155,20	22,40	$ 1.775.155,20
NP8	ALISTADO ENDURECIDO 1:3, E=0,04	M2		$ 58.947	$ -	-1,72	16,00	$ 943.152,00		$ -	14,28	$ 841.763,16	14,28	$ 841.763,16
NP9	SUMINISTRO E INTALACION EQUIPO DE BOMBEO 12HP 220V INDUSTRIAL	UNI		$ 24.630.045	$ -	0,00	1,00	$ 24.630.045,00		$ -	1,00	$ 24.630.045,00	1,00	$ 24.630.045,00
NP10	LIMPIEZA MANUAL DE CERRAMIENTO	M2		$ 6.850	$ -	0,00	424,40	$ 2.907.140,00		$ -	424,40	$ 2.907.140,00	424,40	$ 2.907.140,00
NP11	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2		$ 22.731	$ -	0,00	424,40	$ 9.647.036,40		$ -	424,40	$ 9.647.036,40	424,40	$ 9.647.036,40
NP12	MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M, DOS CARAS A LA VISTA	M2		$ 105.423	$ -	29,07	6,16	$ 649.405,68		$ -	35,23	$ 3.714.052,29	35,23	$ 3.714.052,29
NP13	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2		$ 28.818	$ -	1,21	38,98	$ 1.123.440,91		$ -	40,19	$ 1.158.195,42	40,19	$ 1.158.195,42
NP14	VIGUETAS Y COLUMNETAS INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML		$ 75.095	$ -	14,04	40,80	$ 3.063.876,00		$ -	54,84	$ 4.118.209,80	54,84	$ 4.118.209,80
NP15	ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO (TUBO ESTRUCTURAL ABIERTO 4"x2", 15 MM)	M2		$ 85.920	$ -	-12,00	27,32	$ 2.347.334,40		$ -	15,32	$ 1.316.294,40	15,32	$ 1.316.294,40
NP16	TEJA FIBROCEMENTO No. 4	M2		$ 55.217	$ -	-7,07	27,32	$ 1.508.526,44		$ -	20,25	$ 1.118.144,25	20,25	$ 1.118.144,25
NP17	MARCO PARA PUERTA EN LAMINA CAL 18 -0.8	UN		$ 229.458	$ -	0,00	2,00	$ 458.916,00		$ -	2,00	$ 458.916,00	2,00	$ 458.916,00
NP18	PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2		$ 310.262	$ -	0,28	3,20	$ 992.838,40		$ -	3,48	$ 1.079.711,76	3,48	$ 1.079.711,76
NP19	CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL	UN		$ 162.774	$ -	0,00	2,00	$ 325.548,00		$ -	2,00	$ 325.548,00	2,00	$ 325.548,00
NP20	VENTANA LÁMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO	M2		$ 192.956	$ -	0,21	1,50	$ 289.434,00		$ -	1,71	$ 329.954,76	1,71	$ 329.954,76
NP21	REJA BANCARIA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" INC. ANTICORROSIVO	M2		$ 222.587	$ -	-0,30	1,80	$ 400.656,60		$ -	1,50	$ 333.880,50	1,50	$ 333.880,50

	MUNICIPIO DE SUBACHOQUE	CONTRATO DE OBRA 002 DE 2025	OBJETO: "OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, CUNDINAMARCA"	
		ACTA DE RECIBO PARCIAL 2	VALOR DEL CONTRATO	$ 217.682.748
			VALOR ACTA No. 1	$ 56.792.816
		FECHA 10 DE MARZO 2026	VALOR PRESENTE ACTA	$ 137.329.560
			VALOR POR EJECUTAR	$ 23.560.372

CONDICIONES CONTRACTUALES						MAY/MEN	CONDICIONES MODIFICADAS		ACTA DE RECIBO PARCIAL 1		ACTA DE RECIBO PARCIAL 2		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL		CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL
NP22	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2		$ 11.600	$ -	7,65	38,98	$ 452.214,40		$ -	46,63	$ 540.908,00	46,63	$ 540.908,00
NP23	PINTURA EPÓXICA	M2		$ 21.218	$ -	34,07	15,78	$ 334.735,17		$ -	49,85	$ 1.057.717,30	49,85	$ 1.057.717,30
NP24	ACOMETIDA AÉREA 10 M. PVC	UN		$ 516.445	$ -	-2,00	2,00	$ 1.032.890,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP25	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO TUBERÍA PVC 3/4" , ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	UN		$ 123.531	$ -	-2,00	2,00	$ 247.062,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP26	PARCIAL TRIFÁSICA 3X10+1X12+12T TUEBRIA EMT DE 3/4"	ML		$ 79.042	$ -	-20,00	20,00	$ 1.580.840,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP27	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO TUBERÍA PVC 3/4" , ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	UN		$ 123.531	$ -	-2,00	2,00	$ 247.062,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAMPANA LED DE 150W	UN		$ 222.406	$ -	-2,00	2,00	$ 444.812,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP29	ANDEN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M	M2		$ 85.795	$ -	-19,80	24,00	$ 2.059.080,00		$ -	4,20	$ 360.339,00	4,20	$ 360.339,00
NP30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA BRIDADA DE 6"	UN		$ 2.682.697	$ -	0,00	1,00	$ 2.682.697,40		$ -	1,00	$ 2.682.697,40	1,00	$ 2.682.697,40
NP31	EMPAQUE NEOPRENO 6"	UN		$ 21.634	$ -	0,00	4,00	$ 86.536,00		$ -	4,00	$ 86.536,00	4,00	$ 86.536,00
NP32	ADAPTADOR BRIDA X UNIVERSAL 6" HD	UN		$ 704.295	$ -	-2,00	4,00	$ 2.817.180,00		$ -	2,00	$ 1.408.590,00	2,00	$ 1.408.590,00
NP33	JUEGOS DE TORNILLOS PARA BRIDAS, PERNOS PARA CONECTAR BRIDAS, JUEGO DE TORNILLO CON TUERCA Y ARANDELA	UN		$ 32.257	$ -	0,00	34,00	$ 1.096.738,00		$ -	34,00	$ 1.096.738,00	34,00	$ 1.096.738,00
COSTOS DIRECTOS					$ 163.671.239,39			$ 163.671.239,30		$ 42.701.365,44		$ 103.255.309		$ 145.956.673,97
ADMINISTRACION			27%	%	$ 44.191.234,64			$ 44.191.234,61		$ 11.529.368,67		$ 27.878.933		$ 39.408.301,97
IMPREVISTOS			1%	%	$ 1.636.712,39			$ 1.636.712,39		$ 427.013,65		$ 1.032.553		$ 1.459.566,74
UTILIDAD			5%	%	$ 8.183.561,97			$ 8.183.561,96		$ 2.135.068,27		$ 5.162.765		$ 7.297.833,70
COSTO TOTAL DE OBRA					**$ 217.682.748**			**$ 217.682.748**		**$ 56.792.816,04**		**$ 137.329.560**		**$ 194.122.376**

MARIA DEL PILAR HERNANDEZ GOMEZ
GERENTE GENERAL
EMPRESA DE AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A ESP

ANA GABRIELA RODRIGUEZ
DIRECTORA TECNICO Y OPERATIVO
AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A ESP

HENRY ANTONIO GARZON AVILA
CONTRATISTA

"OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, CUNDINAMARCA"

FECHA:	10 de marzo de 2026
CONTRATISTA:	HENRY ANTONIO GARZON AVILA
CONTRATANTE	AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A ESP
CONTRATO No:	002 DE 2025

MEMORIAS DE MEDICION

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
10	UNIDAD	SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDOR BRIDADO DE 6"

DESCRIPCION	UNIDAD	TOTAL
SE INSTALA MACROMEDIDOR BRIDADO A LA ENTRADA DE LA PLANTA	1,00	1,00
DE TRATAMIENTO DE PANTANO		
PASAN		1,00
		1,00

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES:

HENRY ANTONIO GARZON AVILA
CONTRATISTA

ANA GABRIELA RODRIGUEZ
DIRECTORA TECNICO Y OPERATIVO
AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A ESP

"OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, CUNDINAMARCA"

FECHA:	10 de marzo de 2026
CONTRATISTA:	HENRY ANTONIO GARZON AVILA
CONTRATANTE	AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A ESP
CONTRATO No:	002 DE 2025

MEMORIAS DE MEDICION

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
11	UNIDAD	SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO BRIDADO DE 6"

DESCRIPCION	UNIDAD	TOTAL
SE INSTALA FILTRO BRIDADO A LA ENTRADA Y SALIDA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE PANTANO	1,00	1,00
PASAN		1,00
		1,00

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES:

HENRY ANTONIO GARZON AVILA
CONTRATISTA

ANA GABRIELA RODRIGUEZ
DIRECTOR TECNICO Y OPERATIVO
AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A ESP

"OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, CUNDINAMARCA"

FECHA:	10 de marzo de 2026
CONTRATISTA:	HENRY ANTONIO GARZON AVILA
CONTRATANTE	AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A ESP
CONTRATO No:	002 DE 2025

MEMORIAS DE MEDICION

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
12	UNIDAD	EMPAQUE NEOPRENO 6"

DESCRIPCION	UNIDAD	TOTAL
SE INSTALAN EMPAQUE NEOPRENO 6"	4,00	4,00
PASAN		4,00
		4,00

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES:

HENRY ANTONIO GARZON AVILA
CONTRATISTA

ANA GABRIELA RODRIGUEZ
DIRECTOR TECNICO Y OPERATIVO
AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A ESP

"OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, CUNDINAMARCA"


FECHA:	10 de marzo de 2026
CONTRATISTA:	HENRY ANTONIO GARZON AVILA
CONTRATANTE	AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A ESP
CONTRATO No:	002 DE 2025

MEMORIAS DE MEDICION

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
13	UNIDAD	ADAPTADOR BRIDA X UNIVERSAL 6" HD

DESCRIPCION	UNIDAD	TOTAL
SE INSTALAN ADAPTADORES BRIDA X UNIVERSAL 6" HD	4,00	4,00
PASAN		4,00
		4,00

REGISTRO FOTOGRAFICO

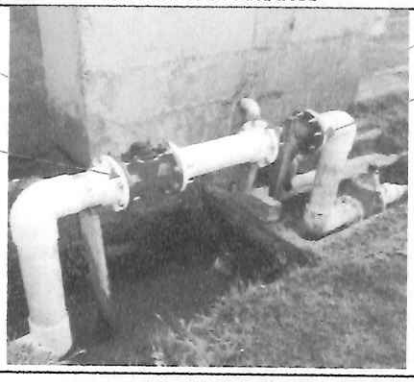

OBSERVACIONES:

HENRY ANTONIO GARZON AVILA
CONTRATISTA

ANA GABRIELA RODRIGUEZ
DIRECTOR TECNICO Y OPERATIVO
AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A ESP

"OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, CUNDINAMARCA"

FECHA:	10 de marzo de 2026
CONTRATISTA:	HENRY ANTONIO GARZON AVILA
CONTRATANTE	AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A ESP
CONTRATO No:	002 DE 2025

MEMORIAS DE MEDICION

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
14	UNIDAD	JUEGOS DE TORNILLOS PARA BRIDAS, PERNOS PARA CONECTAR BRIDAS, JUEGO DE TORNILLO CON TUERCA Y ARANDELA

DESCRIPCION	UNIDAD	TOTAL
JUEGOS DE TORNILLOS PARA BRIDAS, PERNOS PARA CONECTAR BRIDA	64,00	64,00
PASAN		64,00
		64,00

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES:

HENRY ANTONIO GARZON AVILA
CONTRATISTA

ANA GABRIELA RODRIGUEZ
DIRECTOR TECNICO Y OPERATIVO
AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A ESP

"OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, CUNDINAMARCA"


FECHA:	10 de marzo de 2026
CONTRATISTA:	HENRY ANTONIO GARZON AVILA
CONTRATANTE	AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A ESP
CONTRATO No:	002 DE 2025


MEMORIAS DE MEDICION

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
16	UNIDAD	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR CON SENSOR DE PH Y CLORO Y BOMBA DOSIFICADORA DE ESTABILIZADIOR DE PH

DESCRIPCION	UNIDAD	TOTAL
SE LLEVA A CABO RL SUMINISTRO Y LA INSTALACION DE MEDIDOR CON	1,00	1,00
SENSOR DE PH Y CLORO ADEMAS DE BOMBA DOSIFICADORA DE ESTABILIZACION		
DE PH		
PASAN		1,00
		1,00

REGISTRO FOTOGRAFICO

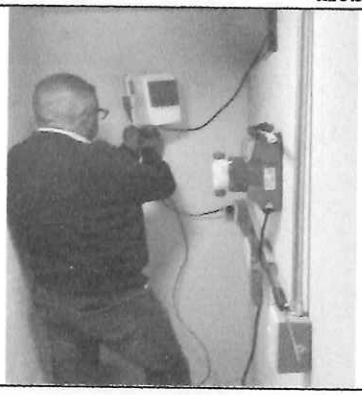

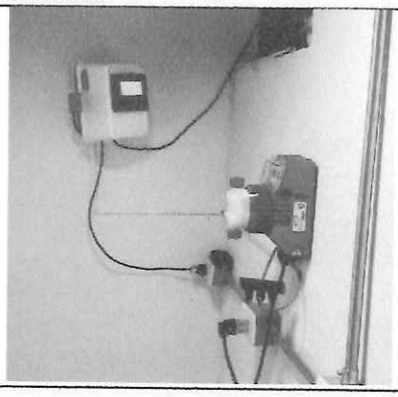

OBSERVACIONES:

HENRY ANTONIO GARZON AVILA
CONTRATISTA

ANA GABRIELA RODRIGUEZ
DIRECTOR TECNICO Y OPERATIVO
AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A ESP

"OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, CUNDINAMARCA"


FECHA:	16 de marzo de 2026
CONTRATISTA:	HENRY ANTONIO GARZON AVILA
CONTRATANTE	AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A ESP
CONTRATO No:	002 DE 2025

MEMORIAS DE MEDICION

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
NP1	ML	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M

DESCRIPCION	LONGITUD	TOTAL
SE INSTALA TELA VERDE PARA CERRAMIENTO DE OBRA PARA	36,00	36,00
CONSTRUCCION DE BODEGA		
PASAN		36,00
		36,00

REGISTRO FOTOGRAFICO

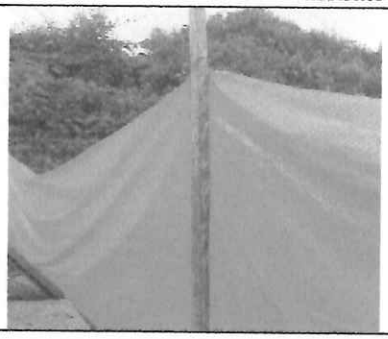



OBSERVACIONES:

HENRY ANTONIO GARZON AVILA
CONTRATISTA

ANA GABRIELA RODRIGUEZ
DIRECTOR TECNICO Y OPERATIVO
AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A ESP

OK

"OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, CUNDINAMARCA"


FECHA:	16 de marzo de 2026
CONTRATISTA:	HENRY ANTONIO GARZON AVILA
CONTRATANTE	AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A ESP
CONTRATO No:	002 DE 2025


MEMORIAS DE MEDICION

ITEM	UNIDAD		DESCRIPCION
NP2	M2		REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS

DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	TOTAL
REPLANTEO DE CIMIEMTOS PARA BODEGA	5	4,00	20,00
REPLANTEO DE CIMINETOS CUARTO PARA BOMBA DOSIFICADORA	2,4	1,00	2,40
PASAN			22,40
			22,40

REGISTRO FOTOGRAFICO

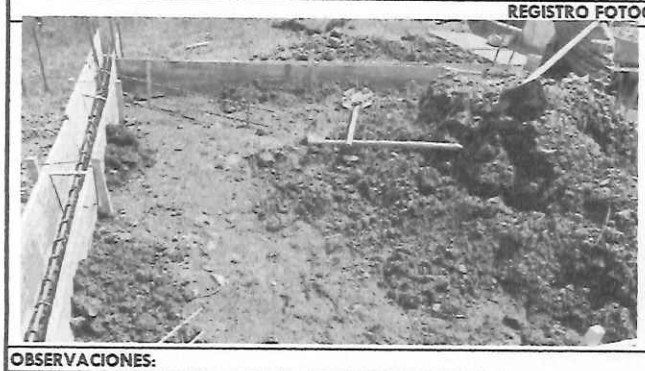

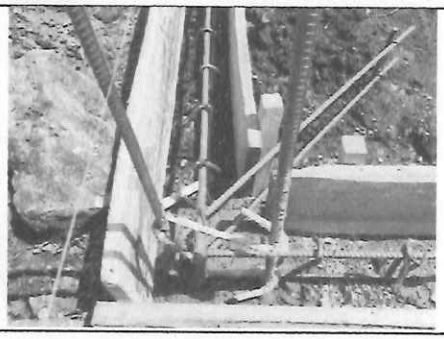

OBSERVACIONES:

HENRY ANTONIO GARZON AVILA
CONTRATISTA

ANA GABRIELA RODRIGUEZ
DIRECTOR TECNICO Y OPERATIVO
AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A ESP

OK

"OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, CUNDINAMARCA"

FECHA:	16 de marzo de 2026
CONTRATISTA:	HENRY ANTONIO GARZON AVILA
CONTRATANTE	AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A ESP
CONTRATO No:	002 DE 2025


MEMORIAS DE MEDICION

ITEM	UNIDAD			DESCRIPCION
NP3	M3			EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)

DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	TOTAL
EXCAVACION ZAPATAS	1,45	1,45	1,20	4,00	10,09
EXCAVACION VIGAS DE CIMENTACION	27,8	0,15	0,30		1,25
EXCAVACION AREA LIBRE DE VIGAS	3,7	3,7	0,30		4,11
EXCAVACION ANDEN	1	4,2	0,30		1,26
PASAN					16,71
					16,71

REGISTRO FOTOGRAFICO



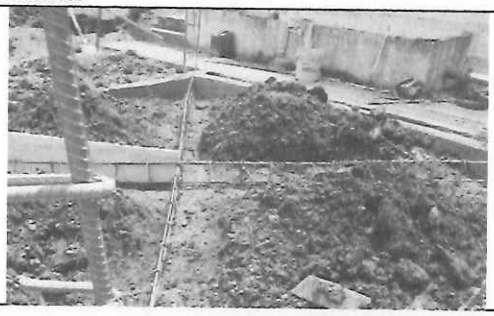

OBSERVACIONES:

HENRY ANTONIO GARZON AVILA
CONTRATISTA

ANA GABRIELA RODRIGUEZ
DIRECTOR TECNICO Y OPERATIVO
AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A ESP

OK

"OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, CUNDINAMARCA"


FECHA:	16 de marzo de 2026
CONTRATISTA:	HENRY ANTONIO GARZON AVILA
CONTRATANTE	AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A ESP
CONTRATO No:	002 DE 2025


MEMORIAS DE MEDICION

ITEM	UNIDAD			DESCRIPCION
NP4	M3			RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE

DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	TOTAL
RELLENO EN ZAPATAS	1,45	1,45	0,45	4,00	3,78
RELLENO AREA LIBRE DE VIGAS	3,7	3,7	0,30		4,11
RELLENO AREA PARA ANDEN	1	4,2	0,30		1,26
PASAN					9,15
					9,15

REGISTRO FOTOGRAFICO

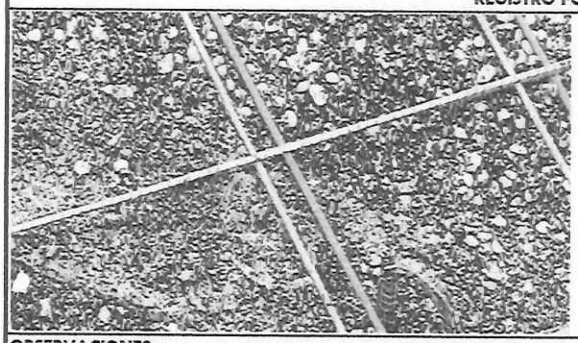

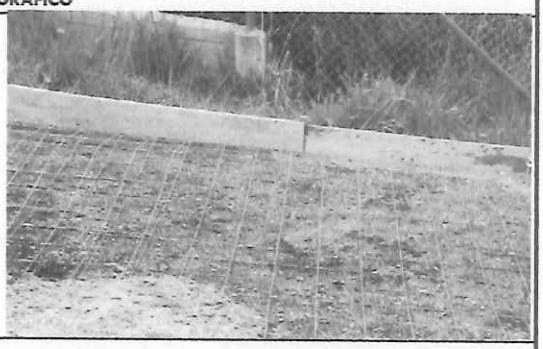

OBSERVACIONES:

HENRY ANTONIO GARZON AVILA
CONTRATISTA

ANA GABRIELA RODRIGUEZ
DIRECTOR TECNICO Y OPERATIVO
AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A ESP

OK


"OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, CUNDINAMARCA"


FECHA:	16 de marzo de 2026
CONTRATISTA:	HENRY ANTONIO GARZON AVILA
CONTRATANTE	AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A ESP
CONTRATO No:	002 DE 2025

MEMORIAS DE MEDICION

ITEM	UNIDAD			DESCRIPCION		
NP5	M3			ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI		
DESCRIPCION		**LARGO**	**ANCHO**	**PROFUNDIDAD**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
ZAPATAS EN CONCRETO PARA CIMENTACION DE BODEGA		1,45	1,45	0,75	4,00	6,31
PASAN						6,31
						6,31

REGISTRO FOTOGRAFICO

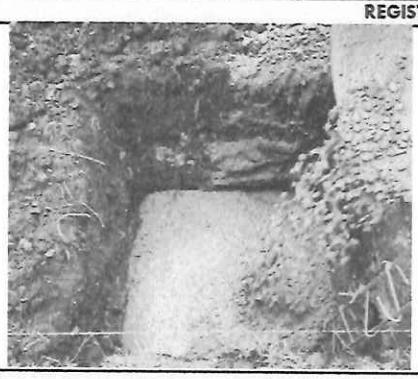

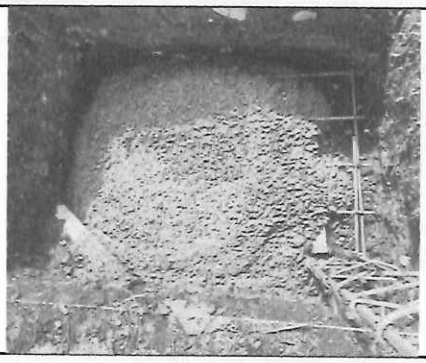

OBSERVACIONES:

HENRY ANTONIO GARZON AVILA
CONTRATISTA

ANA GABRIELA RODRIGUEZ
DIRECTOR TECNICO Y OPERATIVO
AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A ESP

OK

"OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, CUNDINAMARCA"

FECHA:	16 de marzo de 2026
CONTRATISTA:	HENRY ANTONIO GARZON AVILA
CONTRATANTE	AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A ESP
CONTRATO No:	002 DE 2025

MEMORIAS DE MEDICION

ITEM	UNIDAD			DESCRIPCION
NP6	KG			REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA

DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	PESO UNITARIO	TOTAL
REFUERZO EN MALLA PARA PLACA DE BODEGA	3,7	3,7	1,33	18,21
REFUERZO EN MALLA PLACA DE CUARTO PEQUEÑO	2,4	1	1,33	3,19
REFUERZO EN MALLA ANDEN	4,2	1	1,33	5,59
PASAN				26,99
				26,99

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES:

HENRY ANTONIO GARZON AVILA
CONTRATISTA

ANA GABRIELA RODRIGUEZ
DIRECTOR TECNICO Y OPERATIVO
AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A ESP

"OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, CUNDINAMARCA"


FECHA:	16 de marzo de 2026
CONTRATISTA:	HENRY ANTONIO GARZON AVILA
CONTRATANTE	AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A ESP
CONTRATO No:	002 DE 2025

MEMORIAS DE MEDICION

ITEM	UNIDAD	
NP7	M2	PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI

DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	TOTAL
SE FUNDE PLACA EN CONCRETO REFORZADO EN BODEGA Y ANDEN	5	4	20,00
SE FUNDE PLACA EN CONCRETO REFORZADO CUARTO PARA BOMBA	2,4	1	2,40
PASAN			22,40
			22,40

REGISTRO FOTOGRAFICO

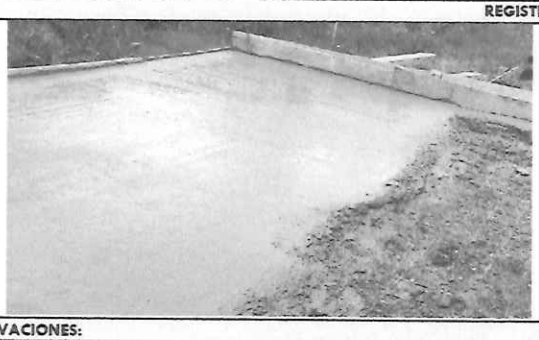



OBSERVACIONES:

HENRY ANTONIO GARZON AVILA
CONTRATISTA

ANA GABRIELA RODRIGUEZ
DIRECTOR TECNICO Y OPERATIVO
AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A ESP

OK

"OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, CUNDINAMARCA"

FECHA:	16 de marzo de 2026
CONTRATISTA:	HENRY ANTONIO GARZON AVILA
CONTRATANTE	AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A ESP
CONTRATO No:	002 DE 2025

MEMORIAS DE MEDICION

ITEM	UNIDAD		
NP8	M2	ALISTADO ENDURECIDO 1:3, E=0.04	

DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	TOTAL
SE CONSTRUYE ALISTADO EN PISO DE BODEGA	3,71	3,85	14,28
PASAN			14,28
			14,28

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES:

HENRY ANTONIO GARZON AVILA
CONTRATISTA

ANA GABRIELA RODRIGUEZ
DIRECTOR TECNICO Y OPERATIVO
AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A ESP

OK

"OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, CUNDINAMARCA"


FECHA:	16 de marzo de 2026
CONTRATISTA:	HENRY ANTONIO GARZON AVILA
CONTRATANTE	AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A ESP
CONTRATO No:	002 DE 2025

MEMORIAS DE MEDICION

ITEM	UNIDAD	
NP9	UNIDAD	SUMINISTRO E INTALACION EQUIPO DE BOMBEO 12HP 220V INDUSTRIAL

DESCRIPCION	UNIDAD	TOTAL
SE INSTALA EQUIPO DE BOMBEO DE 12HP 220 V INDUSTRIAL EN LA PLANTA DE PANTANO	1	1,00
PASAN		1,00
		1,00

REGISTRO FOTOGRAFICO

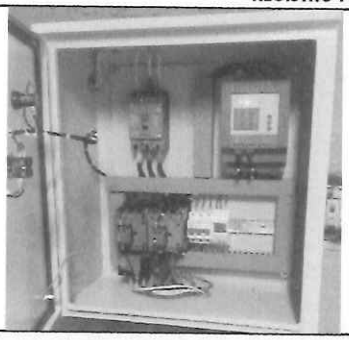



OBSERVACIONES:

HENRY ANTONIO GARZON AVILA
CONTRATISTA

ANA GABRIELA RODRIGUEZ
DIRECTOR TECNICO Y OPERATIVO
AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A ESP

Ok
Molestando. electrico

"OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, CUNDINAMARCA"


FECHA:	16 de marzo de 2026
CONTRATISTA:	HENRY ANTONIO GARZON AVILA
CONTRATANTE	AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A ESP
CONTRATO No:	002 DE 2025

MEMORIAS DE MEDICION

ITEM	UNIDAD				
NP 10	M2	LIMPIEZA MANUAL DE CERRAMIENTO			
DESCRIPCION		**LONGITUD**	**ALTURA**	**CARAS**	**TOTAL**
SE LLEVA A CABO LA LIMPIEZA MANUAL DEL CERRAMIENTO DE LA		106,1	2	2	424,40
PLANTA DE TRATAMIENTO DE PANTANO					
PASAN					424,40
					424,40

REGISTRO FOTOGRAFICO



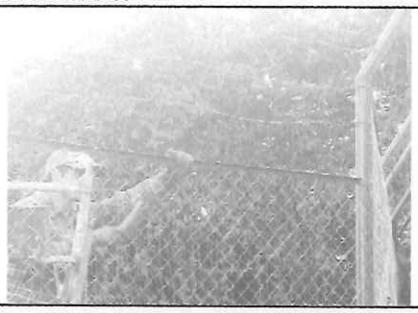

OBSERVACIONES:

HENRY ANTONIO GARZON AVILA
CONTRATISTA

ANA GABRIELA RODRIGUEZ
DIRECTOR TECNICO Y OPERATIVO
AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A ESP

OK

"OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, CUNDINAMARCA"

FECHA:	16 de marzo de 2026
CONTRATISTA:	HENRY ANTONIO GARZON AVILA
CONTRATANTE	AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A ESP
CONTRATO No:	002 DE 2025

MEMORIAS DE MEDICION

ITEM	UNIDAD	
NP 11	M2	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA

DESCRIPCION	LONGITUD	ALTURA	CARAS	TOTAL
SE PINTA CON ESMALTE EL CERRAMINETO DE LA PLANTA DE	106,1	2	2	424,40
TRATAMIENTO DE PANTANO EN SUSU DOS CARAS				
PASAN				424,40
				424,40

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES:

HENRY ANTONIO GARZON AVILA
CONTRATISTA

ANA GABRIELA RODRIGUEZ
DIRECTOR TECNICO Y OPERATIVO
AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A ESP

"OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, CUNDINAMARCA"

FECHA:	16 de marzo de 2026
CONTRATISTA:	HENRY ANTONIO GARZON AVILA
CONTRATANTE	AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A ESP
CONTRATO No:	002 DE 2025

MEMORIAS DE MEDICION

ITEM	UNIDAD	
NP 12	M2	MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M, DOS CARAS A LA VISTA

DESCRIPCION	LONGITUD	ALTURA	TOTAL
MURO EN LADRILLO REJILLA NORTE	3,76	2,04	7,67
MURO EN LADRILLO REJILLA ORIENTAL 1	3,5	1,97	6,90
SE DESCUENTA VENTANA	-1,5	1	-1,50
MURO EN LADRILLO REJILLA ORIENTAL 2	0,76	3,5	1,33
MURO EN LADRILLO REJILLA OCCIDENTAL 1	3,5	1,97	6,90
MURO EN LADRILLO REJILLA OCCIDENTAL 2	0,76	3,5	1,33
MURO EN LADRILLO REJILLA SUR 1	2,725	1,98	5,40
MURO EN LADRILLO REJILLA SUR 2	3,76	0,69	2,59
MURO EN LADRILLO REJILLA CUARTO PARA BOMBA	2,3	2,1	4,83
SE DESCUENTA VENTANA	-0,78	0,27	-0,21
PASAN			35,23
			35,23

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES:

HENRY ANTONIO GARZON AVILA
CONTRATISTA

ANA GABRIELA RODRIGUEZ
DIRECTOR TECNICO Y OPERATIVO
AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A ESP

"OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, CUNDINAMARCA"

FECHA:	16 de marzo de 2026
CONTRATISTA:	HENRY ANTONIO GARZON AVILA
CONTRATANTE	AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A ESP
CONTRATO No:	002 DE 2025

MEMORIAS DE MEDICION

ITEM	UNIDAD	
NP 13	M2	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM

DESCRIPCION	LONGITUD	ALTURA	TOTAL
PAÑETE MURO NORTE BODEGA	3,71	2,24	8,31
PAÑETE MURO ORIENTAL BODEGA	5,24	3,85	10,09
SE DESCUENTA VENTANA	-1,5	1	-1,50
PAÑETE MURO ORIENTAL BODEGA	5,24	3,85	10,09
PAÑETE MURO SUR BODEGA	3,71	2,84	10,54
DESCUENTA PUERTA	-0,985	1,98	-1,95
PAÑTE MURO CUARTO PEQUEÑO	2,3	2,1	4,83
DESCUENTA VENTANA	-0,78	0,27	-0,21
PASAN			40,19
			40,19

REGISTRO FOTOGRAFICO






OBSERVACIONES:

HENRY ANTONIO GARZON AVILA
CONTRATISTA

ANA GABRIELA RODRIGUEZ
DIRECTOR TECNICO Y OPERATIVO
AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A ESP

OK

"OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, CUNDINAMARCA"


FECHA:	16 de marzo de 2026
CONTRATISTA:	HENRY ANTONIO GARZON AVILA
CONTRATANTE	AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A ESP
CONTRATO No:	002 DE 2025

MEMORIAS DE MEDICION

ITEM	UNIDAD	
NP 14	ML	VIGUETAS Y COLUMNETAS INCLUYE ACERO DE REFUERZO

DESCRIPCION	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
VIGUETAS EN CIMENTACION	27,8		27,80
VIGUETAS DE CORONACION	14,52		14,52
COLUMMNETAS LARGAS	3,47	2	6,94
COLUMNETAS CORTAS	2,79	2	5,58
PASAN			54,84
			54,84

REGISTRO FOTOGRAFICO

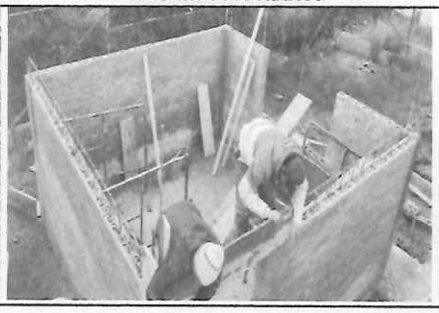
OBSERVACIONES:

HENRY ANTONIO GARZON AVILA
CONTRATISTA

ANA GABRIELA RODRIGUEZ
DIRECTOR TECNICO Y OPERATIVO
AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A ESP

"OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, CUNDINAMARCA"

FECHA:	16 de marzo de 2026
CONTRATISTA:	HENRY ANTONIO GARZON AVILA
CONTRATANTE	AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A ESP
CONTRATO No:	002 DE 2025


MEMORIAS DE MEDICION

ITEM	UNIDAD	
NP 15	M2	ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO (TUBO ESTRUCTURAL ABIERTO 4"x2", 15 MM)

DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	TOTAL
ESTRUCTURA METALICA PARA TEJA DE BODEGA	3,85	3,98	15,32
PASAN			15,32
			15,32

REGISTRO FOTOGRAFICO



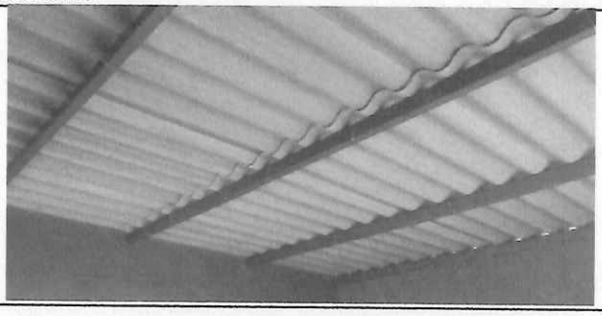

OBSERVACIONES:

HENRY ANTONIO GARZON AVILA
CONTRATISTA

ANA GABRIELA RODRIGUEZ
DIRECTOR TECNICO Y OPERATIVO
AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A ESP

OK

"OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, CUNDINAMARCA"


FECHA:	16 de marzo de 2026
CONTRATISTA:	HENRY ANTONIO GARZON AVILA
CONTRATANTE	AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A ESP
CONTRATO No:	002 DE 2025

MEMORIAS DE MEDICION

ITEM	UNIDAD	
NP 16	M2	TEJA FIBROCEMENTO No. 4

DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	TOTAL
ESTRUCTURA METALICA PARA TEJA DE BODEGA	4,5	4,5	20,25
PASAN			20,25
			20,25

REGISTRO FOTOGRAFICO

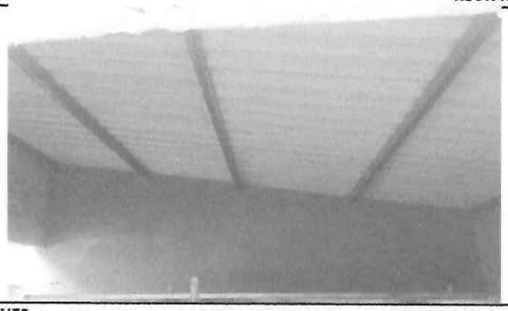



OBSERVACIONES:

HENRY ANTONIO GARZON AVILA
CONTRATISTA

ANA GABRIELA RODRIGUEZ
DIRECTOR TECNICO Y OPERATIVO
AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A ESP

"OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, CUNDINAMARCA"

FECHA:	16 de marzo de 2026
CONTRATISTA:	HENRY ANTONIO GARZON AVILA
CONTRATANTE	AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A ESP
CONTRATO No:	002 DE 2025


MEMORIAS DE MEDICION

ITEM	UNIDAD	
NP 17	UNIDAD	MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8

DESCRIPCION	UNIDAD	TOTAL
SE INSTALAN MARCOS PARA PUERTAS EN BODEGA Y CUARTO	2	2,00
PARA BOMBA DOSIFICADORA		
PASAN		2,00
		2,00

REGISTRO FOTOGRAFICO



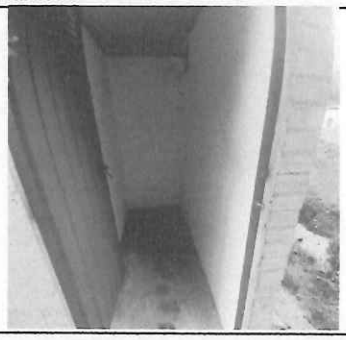

OBSERVACIONES:

HENRY ANTONIO GARZON AVILA
CONTRATISTA

ANA GABRIELA RODRIGUEZ
DIRECTOR TECNICO Y OPERATIVO
AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A ESP

OK

"OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, CUNDINAMARCA"

FECHA:	16 de marzo de 2026
CONTRATISTA:	HENRY ANTONIO GARZON AVILA
CONTRATANTE	AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A ESP
CONTRATO No:	002 DE 2025

MEMORIAS DE MEDICION

ITEM	UNIDAD	
NP 18	M2	PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO

DESCRIPCION	LONGITUD	ALTURA	TOTAL
SE INSTALAN PUERTA EN BODEGA	0,985	1,98	1,95
SE INSTALAN PUERTA EN CUARTO PARA BOMBA DOSIFICADORA	0,765	2	1,53
PASAN			3,48
			3,48

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES:

HENRY ANTONIO GARZON AVILA
CONTRATISTA

ANA GABRIELA RODRIGUEZ
DIRECTOR TECNICO Y OPERATIVO
AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A ESP

OK

"OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, CUNDINAMARCA"


FECHA:	16 de marzo de 2026
CONTRATISTA:	HENRY ANTONIO GARZON AVILA
CONTRATANTE	AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A ESP
CONTRATO No:	002 DE 2025

MEMORIAS DE MEDICION

ITEM	UNIDAD	
NP 19	UNIDAD	CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL

DESCRIPCION	CANTIDAD	TOTAL
SE INSTALAN CERRADURA EN PUERTA EN BODEGA	2	2,00
PASAN		2,00
		2,00

REGISTRO FOTOGRAFICO

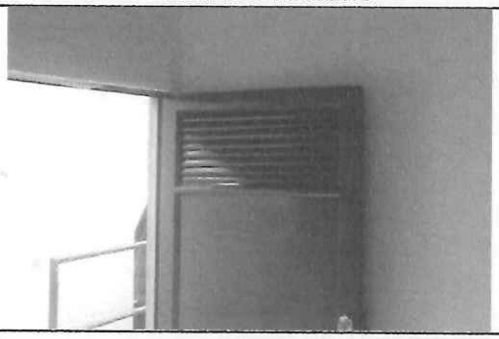

OBSERVACIONES:

HENRY ANTONIO GARZON AVILA
CONTRATISTA

ANA GABRIELA RODRIGUEZ
DIRECTOR TECNICO Y OPERATIVO
AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A ESP

OK

"OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, CUNDINAMARCA"

FECHA:	16 de marzo de 2026
CONTRATISTA:	HENRY ANTONIO GARZON AVILA
CONTRATANTE	AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A ESP
CONTRATO No:	002 DE 2025


MEMORIAS DE MEDICION

ITEM	UNIDAD	
NP 20	M2	VENTANA LÁMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO

DESCRIPCION	LONGITUD	ALTURA	TOTAL
SE INSTALA VENTANA EN BODEGA	1,5	1	1,50
SE INSTALA VENTANA EN CUARTO PARA BOMBA	0,78	0,27	0,21
PASAN			1,71
			1,71

REGISTRO FOTOGRAFICO



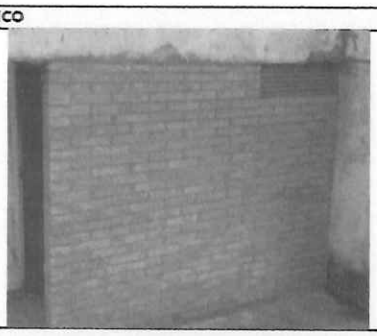

OBSERVACIONES:

HENRY ANTONIO GARZON AVILA
CONTRATISTA

ANA GABRIELA RODRIGUEZ
DIRECTOR TECNICO Y OPERATIVO
AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A ESP

OK

"OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, CUNDINAMARCA"

FECHA:	16 de marzo de 2026
CONTRATISTA:	HENRY ANTONIO GARZON AVILA
CONTRATANTE	AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A ESP
CONTRATO No:	002 DE 2025

MEMORIAS DE MEDICION

ITEM	UNIDAD	
NP 21	M2	REJA BANCARIA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" INC. ANTICORROSIVO

DESCRIPCION	LONGITUD	ALTURA	TOTAL
SE INSTALAN REJA BANCARIA EN VENTANA DE BODEGA	1,5	1	1,50
PASAN			1,50
			1,50

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES:

HENRY ANTONIO GARZON AVILA
CONTRATISTA

ANA GABRIELA RODRIGUEZ
DIRECTOR TECNICO Y OPERATIVO
AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A ESP

"OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, CUNDINAMARCA"


FECHA:	16 de marzo de 2026
CONTRATISTA:	HENRY ANTONIO GARZON AVILA
CONTRATANTE	AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A ESP
CONTRATO No:	002 DE 2025


MEMORIAS DE MEDICION

ITEM	UNIDAD	
NP 22	M2	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS

DESCRIPCION	LONGITUD	ALTURA	TOTAL
VINILO MURO NORTE BODEGA	3,71	2,24	8,31
VINILO MURO ORIENTAL BODEGA	5,24	3,85	10,09
SE DESCUENTA VENTANA	-1,5	1	-1,50
VINILO MURO ORIENTAL BODEGA	5,24	3,85	10,09
VINILO MURO SUR BODEGA	3,71	2,84	10,54
DESCUENTA PUERTA	-0,985	1,98	-1,95
VINILO MURO NORTE CUARTO PARA BOMBA DOSIFICADORA	0,765	2,1	1,61
VINILO MURO OCCIDENTAL CUARTO PARA BOMBA DOSIFICADORA	2,3	2,1	4,83
VINILO MURO ORIENTAL CUARTO PARA BOMBA DOSIFICADORA	2,3	2,1	4,83
DESCUENTA VENTANA	-0,78	0,27	-0,21
PASAN			46,63
			46,63

REGISTRO FOTOGRAFICO

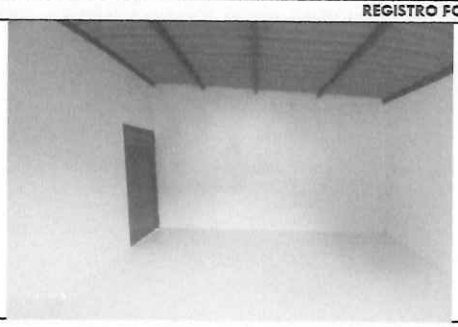

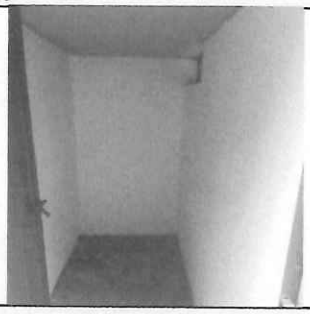

OBSERVACIONES:

HENRY ANTONIO GARZON AVILA
CONTRATISTA

ANA GABRIELA RODRIGUEZ
DIRECTOR TECNICO Y OPERATIVO
AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A ESP

OK

"OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, CUNDINAMARCA"


FECHA:	16 de marzo de 2026
CONTRATISTA:	HENRY ANTONIO GARZON AVILA
CONTRATANTE	AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A ESP
CONTRATO No:	002 DE 2025


MEMORIAS DE MEDICION

ITEM	UNIDAD	
NP 23	M2	PINTURA EPÓXICA

DESCRIPCION	LONGITUD	ALTURA	TOTAL
EPOXICA MURO NORTE BODEGA	3,71	2,24	8,31
EPOXICA MURO ORIENTAL BODEGA	5,24	3,85	10,09
SE DESCUENTA VENTANA	-1,5	1	-1,50
EPOXICA MURO ORIENTAL BODEGA	5,24	3,85	10,09
EPOXICA MURO SUR BODEGA	3,71	2,84	10,54
DESCUENTA PUERTA	-0,985	1,98	-1,95
EPOXICA EN PISO DE BODEGA	3,71	3,85	14,28
PASAN			49,85
			49,85

REGISTRO FOTOGRAFICO

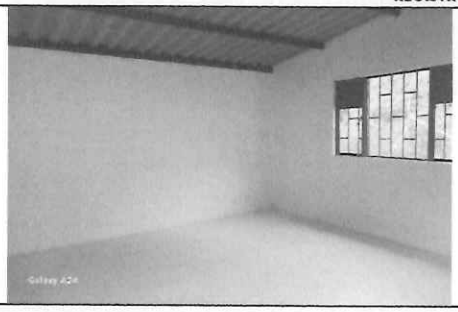

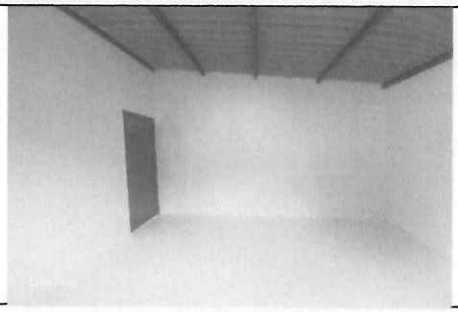

OBSERVACIONES:

HENRY ANTONIO GARZON AVILA
CONTRATISTA

ANA GABRIELA RODRIGUEZ
DIRECTOR TECNICO Y OPERATIVO
AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A ESP

OK

"OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, CUNDINAMARCA"

FECHA:	16 de marzo de 2026
CONTRATISTA:	HENRY ANTONIO GARZON AVILA
CONTRATANTE	AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A ESP
CONTRATO No:	002 DE 2025

MEMORIAS DE MEDICION

ITEM	UNIDAD		
NP 29	M2		ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M

DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	TOTAL
SE CONTRUYE ANDEN EN BODEGA	4,2	1	4,20
PASAN			4,20
			4,20

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES:

HENRY ANTONIO GARZON AVILA
CONTRATISTA

ANA GABRIELA RODRIGUEZ
DIRECTOR TECNICO Y OPERATIVO
AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A ESP

OK

"OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, CUNDINAMARCA"

FECHA:	16 de marzo de 2026
CONTRATISTA:	HENRY ANTONIO GARZON AVILA
CONTRATANTE	AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A ESP
CONTRATO No:	002 DE 2025

MEMORIAS DE MEDICION

ITEM	UNIDAD	
NP 30	UNIDAD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA BRIDADA DE 6"

DESCRIPCION	UNIDAD	TOTAL
SE INSTALA VALVULA BRIDADA DE 6" EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE PANTANO	1	1,00
PASAN		1,00
		1,00

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES:

HENRY ANTONIO GARZON AVILA
CONTRATISTA

ANA GABRIELA RODRIGUEZ
DIRECTOR TECNICO Y OPERATIVO
AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A ESP

Suministro

"OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, CUNDINAMARCA"

FECHA:	16 de marzo de 2026
CONTRATISTA:	HENRY ANTONIO GARZON AVILA
CONTRATANTE	AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A ESP
CONTRATO No:	002 DE 2025

MEMORIAS DE MEDICION

ITEM	UNIDAD	
NP 31	UNIDAD	EMPAQUE NEOPRENO 6"

DESCRIPCION	UNIDAD	TOTAL
SE INSTALA EMPAQUE NEOPRENO 6"	4	4,00
PASAN		4,00
		4,00

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES:

HENRY ANTONIO GARZON AVILA
CONTRATISTA

ANA GABRIELA RODRIGUEZ
DIRECTOR TECNICO Y OPERATIVO
AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A ESP

SUMINISTRO

"OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, CUNDINAMARCA"

FECHA:	16 de marzo de 2026
CONTRATISTA:	HENRY ANTONIO GARZON AVILA
CONTRATANTE	AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A ESP
CONTRATO No:	002 DE 2025

MEMORIAS DE MEDICION

ITEM	UNIDAD	
NP 32	UNIDAD	ADAPTADOR BRIDA X UNIVERSAL 6" HD

DESCRIPCION	UNIDAD	TOTAL
SE INSTALAN ADAPTADORES BRIDA X UNIVERSAL 6" HD	2	2,00
PASAN		2,00
		2,00

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES:

HENRY ANTONIO GARZON AVILA
CONTRATISTA

ANA GABRIELA RODRIGUEZ
DIRECTOR TECNICO Y OPERATIVO
AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A ESP

"OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, CUNDINAMARCA"

FECHA:	10 de marzo de 2026
CONTRATISTA:	HENRY ANTONIO GARZON AVILA
CONTRATANTE	AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A ESP
CONTRATO No:	002 DE 2025

MEMORIAS DE MEDICION

ITEM	UNIDAD	
NP 33	UNIDAD	JUEGOS DE TORNILLOS PARA BRIDAS, PERNOS PARA CONECTAR BRIDAS, JUEGO DE TORNILLO CON TUERCA Y ARANDELA

DESCRIPCION	UNIDAD	TOTAL
SE INSTALAN ADAPTADORES BRIDA X UNIVERSAL 6" HD	34	34,00
PASAN		34,00
		34,00

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES:

HENRY ANTONIO GARZON AVILA
CONTRATISTA

ANA GABRIELA RODRIGUEZ
DIRECTOR TECNICO Y OPERATIVO
AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A ESP

6. PLANILLA DE SEGURIDAD

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-02-02, 10:12:02 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1079162277

Periodo Cotización 202512 **Periodo Servicio** 202601

Cliente: NI900995492 SERVEMPRES SAS

PAGADA 2026-01-29

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SERVEMPRES SAS				
Documento	NI 900995492	**Dirección**	CR 52 #141 - 14		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3026026742		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	13
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	SAS SERVEMPRES	**Identificación**	CC 1026567325		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 79729995		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					SILVA JOSE ARNULFO	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VAT	SLE	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARL	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
X																	0	30	30	30		F	$ 1.423.500	25-14		16 %	$ 1.423.500	$ 227.600	$ 0	$ 0	EPS017		4 %	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	14-11	3	6.960 %	$ 1.423.500	$ 99.100	CCF26	4 %	$ 1.000	$ 100	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COMFACUNDI	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 227.600	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 99.100	$ 100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 384.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

46

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-02-02, 10:12:02 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1079162277

Periodo Cotización 202512 **Periodo Servicio** 202601

Cliente: NI900995492 SERVEMPRES SAS

PAGADA 2026-01-29

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SERVEMPRES SAS				
[illegible]mento	NI 900995492	Dirección	CR 52 #141 - 14		
[illegible] de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	3028026742		
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	SUCURSAL	Total Afiliados	13
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	SAS SERVEMPRES	Identificación	CC 1026567325		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1076620299		Residente		Exonerado	S	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00					CASTAÑEDA CHISCO DANIEL ALBEIRO	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																							Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VIP	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF			Código AFP	Código Trasl. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Trasl. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
														0	30	30	30	30		F	$ 1.423.500	220301		16 %	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	EPS003		4 %	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	14-11	5	0.522 %	$ 1.423.500	$ 99.100	CCF26	4 %	$ 1.000	$ 100	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	COMPENSAR EPS	ARL SURA	COMFACUNDI	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 99.100	$ 100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 384.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

47

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-02-02, 10:12:02 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1079162277

Periodo Cotización 202512 **Periodo Servicio** 202601

Cliente: NI900995492 SERVEMPRES SAS

PAGADA 2026-01-29

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SERVEMPRES SAS				
[illegible]mento	NI 900995492	**Dirección**	CR 52 #141 - 14		
[illegible] de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3028026742		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	13
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	SAS SERVEMPRES	**Identificación**	CC 1026567325		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1077033556						**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00	Residente		Exonerado	S	LEON BARRAGAN JUAN SEBASTIAN	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud						Riesgos				Caja				Parafiscales			
IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	FP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Trns. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Trns. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30		F	$ 1.423.500	200201		16 %	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	EPS017		4 %	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	14-11	5	6.960 %	$ 1.423.500	$ 99.100	CCF25	4 %	$ 1.000	$ 100	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COMFACUNDI	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 99.100	$ 100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 384.000

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-02-02, 10:12:02 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1079162277

Periodo Cotización 202512 **Periodo Servicio** 202601

Cliente: NI900995492 SERVEMPRES SAS

PAGADA 2026-01-29

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SERVEMPRES SAS				
D[illegible]mento	NI 900995492	**Dirección**	CR 52 #141 - 14		
T[illegible]e Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3028026742		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	13
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	SAS SERVEMPRES	**Identificación**	CC 1026567325		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 80393464						**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00	Residente		Exonerado	S	VELA GONZALEZ LUIS ENRIQUE	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																							Extranjero	Tipo Salario	Salario	Pensión						Salud						Riesgos				Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF			Código AFP	Código Trasl. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Trasl. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
														0	30	30	30		F	$ 1.423.500	25-14		16 %	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	EPS017		4 %	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	14-11	5	0.960 %	$ 1.423.500	$ 99.100	CCF25	4 %	$ 1.000	$ 100	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COMFACUNDI	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 99.100	$ 100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 384.000

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-02-02, 10:12:02 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1079162277

Periodo Cotización 202512 **Periodo Servicio** 202601

Cliente: NI900995492 SERVEMPRES SAS

PAGADA 2026-01-29

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SERVEMPRES SAS				
Documento	NI 900995492	Dirección	CR 52 #141 - 14		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	3026026742		
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	SUCURSAL	Total Afiliados	13
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	SAS SERVEMPRES	Identificación	CC 1026567325		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento			Residente		Exonerado		Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
CC 3152435										
Tipo Cotizante	01	00				S	PEREZ GAONA JOSE FRANCISCO	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARL	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
																0	30	30	30			F	$ 1.423.500	220301		16 %	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	EPS017		4 %	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	14-11	3	0.696 %	$ 1.423.500	$ 99.100	CCF25	4 %	$ 1.000	$ 100	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COMFACUNDI	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 99.100	$ 100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 384.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-02-02, 10:12:02 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1079162277

Periodo Cotización 202512 **Periodo Servicio** 202601

Cliente: NI900995492 SERVEMPRES SAS

PAGADA 2026-01-29

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SERVEMPRES SAS				
[illegible]mento	NI 900995492	**Dirección**	CR 52 #141 - 14		
[illegible] de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3028026742		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	13
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	SAS SERVEMPRES	**Identificación**	CC 1026567325		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1074188047		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					MORALES VILLALBA YESID ALEXANDER	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud						Riesgos				Caja				Parafiscales			
IGE	IRL	VSP	TDP	TAP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Dias AFP	Dias EPS	Dias ARP	Dias CCF			Codigo AFP	Codigo Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Codigo EPS	Codigo Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Codigo ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Codigo CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
X													0	30	30	30		F	$ 1.423.500	230301		16 %	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	EPS017		4 %	$ 1.423.500	$ 57.000	14-11	3	6.960 %	$ 1.423.500	$ 99.100	COF26	4 %	$ 1.000	$ 100	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COMFACUNDI	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 99.100	$ 100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 384.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-02-28, 08:01:43 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1079257012

Periodo Cotización 202601 **Periodo Servicio** 202602

Cliente: NI900995492 SERVEMPRES SAS

PAGADA 2026-02-27

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SERVEMPRES SAS				
Documento	NI 900995492	**Dirección**	CR 52 #141 - 14		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3028026742		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	10
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	SAS SERVEMPRES	**Identificación**	CC 1026567325		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1074188047		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					MORALES VILLALBA YESID ALEXANDER	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
IGE	IRT	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	IRL	VAC	LMA	AVP	VTY	DIA	SLE	IGE	LMA	VAC	SLN				Código AFP	Código Trasl. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Trasl. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30			F	$ 1.750.905	23030I		16 %	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	EPS017		4 %	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	14-11	5	6.960 %	$ 1.750.905	$ 121.900	CCF26	4 %	$ 1.000	$ 100	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COMFACUNDI	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 121.900	$ 100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 472.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-02-28, 08:01:43 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1079257012

Periodo Cotización 202601 **Periodo Servicio** 202602

Cliente: NI900995492 SERVEMPRES SAS

PAGADA 2026-02-27

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SERVEMPRES SAS				
Documento	NI 900995492	**Dirección**	CR 52 #141 - 14		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3028026742		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	10
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	SAS SERVEMPRES	**Identificación**	CC 1026567325		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 79729995		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					SILVA JOSE ARNULFO	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																						Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
IGE	LMA	VSP	SLN	IGE	LMA	VSP	SLN	IGE	LMA	VSP	SLN	VST	SLN	IGE	LMA	VSP	SLN	VST	SLN	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Trasl. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Trasl. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
																				0	30	30	30	30		F	$ 1.750.905	25-14		16 %	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	EPS017		4 %	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	14-11	5	6.960 %	$ 1.750.905	$ 121.900	CCF28	4 %	$ 1.000	$ 100	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COMFACUNDI	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 121.900	$ 100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 472.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-02-28, 08:01:43 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1079257012

Periodo Cotización 202601 **Periodo Servicio** 202602

Cliente: NI900995492 SERVEMPRES SAS

PAGADA 2026-02-27

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SERVEMPRES SAS				
N. DAento	NI 900995492	Dirección	CR 52 #141 - 14		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	3028026742		
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	SUCURSAL	Total Afiliados	10
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	SAS SERVEMPRES	Identificación	CC 1026567325		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1076620299		Residente		Exonerado	S	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00					CASTAÑEDA CHISCO DANIEL ALBEIRO	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud						Riesgos				Caja				Parafiscales			
IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	ERP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF			Código AFP	Código Trasl. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Trasl. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30			F	$ 1.750.905	230301		16 %	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	EPS030		4 %	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	14-11	5	6,960 %	$ 1.750.905	$ 121.900	CCF25	4 %	$ 10.000	$ 400	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	COMPENSAR EPS	ARL SURA	COMFACUNDI	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 121.900	$ 400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 472.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-02-28, 08:01:43 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1079257012

Periodo Cotización 202601 **Periodo Servicio** 202602

Cliente: NI900995492 SERVEMPRES SAS

PAGADA 2026-02-27

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SERVEMPRES SAS				
D[illegible]ento	NI 900995492	Dirección	CR 52 #141 - 14		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	3028026742		
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	SUCURSAL	Total Afiliados	10
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	SAS SERVEMPRES	Identificación	CC 1026567325		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 3152435		Residente		Exonerado	S	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00					PEREZ GAONA JOSE FRANCISCO	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																								Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Dias AFP	Dias EPS	Dias ARP	Dias CCF							Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
																0	30	30	30							230301		16 %	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	EPS017		4 %	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	14-11	5	6.960 %	$ 1.750.905	$ 121.800	CCF29	4 %	$ 1.000	$ 100	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COMFACUNDI	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 121.900	$ 100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 472.300

8. INFORME DE OBRA

INFORME DE ACTIVIDADES DE OBRA

CONTRATO 002 DE 2025

OBJETO: "CONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO DEL ALCANTARILLADO EN LA INSPECCION DE LA PRADERA Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE"

2026

CONTENIDO

- INTRODUCCION
- ESTADO CONTRACTUAL DEL CONTRATO 002 DE 2025
- ACTIVIDADES REALIZADAS DENTRO DEL CONTRATO 002 DE 2025
- ESTADO PORCENTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO 002 DE 2025
- REGISTRO FOTOGRAFICO

INTRODUCCION

En el siguiente informe se dan a conocer las actividades realizadas dentro del contrato 002 de 2025 cuyo objeto es: "OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, CUNDINAMARCA", con el cual se busca llevar a cabo la optimización del sistema de potabilización de agua en la planta de PANTANO del municipio de Subachoque y de esta manera garantizar la correcta operación de la misma con el fin de suministrar agua apta para el consumo humano para los usuarios que hacen parte de este acueducto.

Se llevaron a cabo actividades de construcción del área de bodega para el acopio de químicos para la potabilización del agua, se construyó cuarto para el sensor de PH y bomba dosificadora a suministrar y se llevó a cabo el suministro e instalación equipo de bombeo 12hp 220v industrial para poder llevar a cabo el proceso operativo necesario para el tratamiento del agua, entre otras actividades necesarias para la correcta operatividad de la planta de PANTANO.

ESTADO CONTRACTUAL DEL CONTRATO 002 DE 2025

Objeto: "OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, CUNDINAMARCA",

Acta de inicio: 27 de noviembre de 2025

Valor: $ 217.682.748

Supervisor: EMPRESA DE AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE

CONTRATISTA: HENRY ANTONIO GARZON AVILA

PRORROGAS: 2

PAGOS REALIZADOS: $ 56.792.816

ACTIVIDADES REALIZADAS DENTRO DEL CONTRATO 002 DE 2025

SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDOR BRIDADO DE 6"

Se llevó a cabo el suministro e instalación de macro medidor bridado de 6" a la entrada y salida de la planta de tratamiento de agua potable de PANTANO para poder obtener el caudal de entrada y de salida de agua de la misma.

SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO BRIDADO DE 6"

Se llevó a cabo el suministro e instalación de los filtros bridados para la protección de los macro medidores de 6" de entrada y salida para evitar que a los mismos puedan entrar material que afecten su funcionamiento.

EMPAQUE NEOPRENO 6"

Esta hizo la instalación de os empaques neoprenos para la estanqueidad contra agua, aceites y ácidos diluidos y ofrece un sellado para las bridas de 6".

ADAPTADOR BRIDA X UNIVERSAL 6" HD

Se hace la instalación de los adaptadores para bridas x universal de 6" para la correcta instalación de los macro medidores de entrada y salida con sus respectivos filtros de 6".

JUEGOS DE TORNILLOS PARA BRIDAS, PERNOS PARA CONECTAR BRIDAS, JUEGO DE TORNILLO CON TUERCA Y ARANDELA

Para poder llevar acabo la instalación de los macro medidores y filtros bridados de 6" se tuvo la necesidad de utilizar los respectivos accesorios como son tornillos, tuercas, pernos para la correcta instalación de los mismos.

ESCALERA TELESCÓPICA 3.2 M ALUMINIO PLEGABLE ANTIDESLIZANTE

Se hace el suministro de 5 escaleras telescópicas de 3,2 m en material de aluminio antideslizante para que los operarios tenga el acceso a los tanques de almacenamiento para llevar a cabo actividades de mantenimiento y demás necesidades operativas.

CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M

Esta actividad se llevó a cabo para acordonar el área a intervenir para la construcción de la bodega para el acopio de químicos necesarios para llevar a cabo la potabilización del agua por medio de los diferentes procesos en la planta de tratamiento del PANTANO.

REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS

Esta actividad se llevo a cabo para poder determinar el área a intervenir para la construcción de la bodega para los químicos y para la construcción del cuarto para el sensor de ph y la bomba dosificadora.

EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)

Esta actividad se llevo a cabo para la construcción del sistema de cimentación en zapatas, para la construcción de las vigas de cimentación y para la adecuación del terreno en general para el mejoramiento del mismo con material granular.

RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE

Después de llevar a cabo la construcción de la cimentación para la estructura de la bodega a construir, se llevaron a cabo los respectivos rellenos en recebo común y la compactación mecánica del mismo para garantizar la estabilidad de la construcción.

ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI

Para la cimentación de la estructura a construir para el acopio de los químicos, se utilizaron zapatas aisladas, las cuales son las encargadas de trasmitir las diferentes cargas de la estructura al suelo y garantizar la estabilidad de la construcción.

REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA

Para el refuerzo de la placa de contrapiso se utilizo malla electrosoldada, la cual es de vital importancia para brindar rigidez a la placa y evitar un posible fallo en la misma ya que esta aumenta la resistencia a tracción de la placa evitando posibles grietas.

PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI

Se llevo a cabo la construcción de la placa en concreto reforzado para la bodega en donde se almacenará los químicos necesarios para la operación de la planta de tratamiento, placa con un espesor de 0,10 m.

ALISTADO ENDURECIDO 1:3, E=0.04

Se hace el alistado de piso endurecido para la posterior aplicación de la pintura epoxica al piso y de esta manera tener un espacio adecuado para el acopio de químicos.

SUMINISTRO E INTALACION EQUIPO DE BOMBEO 12HP 220V INDUSTRIAL

Se hace el suministro e instalación de sistema de bombeo en 12 Hp para el tratamiento de agua que se realiza en planta de tratamiento, para su captación, tratamiento y posterior suministro a los usuarios que hacen parte de este acueducto.

LIMPIEZA MANUAL DE CERRAMIENTO

Se lleva a cabo la limpieza del cerramiento el cual presenta deterioro en su pintura y puede llegar a presentar corrosión por este problema, posteriormente se aplicará esmalte al cerramiento.

ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA

Se aplica esmalte en ambas caras del cerramiento, el cual este compuesto por malla eslabonada.

MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M, DOS CARAS A LA VISTA

Se construye mampostería con rejilla a la vista para la bodega y cuarto de bomba dosificadora, se usa este tipo de mampostería para poder darle continuidad a la arquitectura de los demás espacios de la planta de tratamiento.

PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM

Se pañetan los muros internos de la bodega y cuarto para bomba dosificadora, para posteriormente aplicar vinilo y pintura epoxica como acabado.

VIGUETAS Y COLUMNETAS INCLUYE ACERO DE REFUERZO

Se utilizan viguetas y columnetas para la parte estructural de la bodega, cumpliendo con las normas sismorresistente en cuanto a sus áreas mínimas y refuerzo.

ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO (TUBO ESTRUCTURAL ABIERTO 4"x2", 15 MM)

Se utiliza estructura metálica para el soporte y la instalación de la cubierta en teja de fibrocemento.

TEJA FIBROCEMENTO No. 4

Se utiliza teja en fibrocemento para la cubierta de la bodega donde se almacenará los químicos necesarios para el proceso de potabilización de la planta de tratamiento.

MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8

Se instalan marcos en lamina calibre 18 para empotar las puertas de la bodega para los químicos y el cuarto para la bomba dosificadora y el sensor de PH.

PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO

Se instalan las puertas en lamina calibre 18 de la bodega para los químicos y el cuarto para la bomba dosificadora y el sensor de PH.

CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL

Se instalan cerraduras para las puertas de la bodega de los químicos y el cuarto para la bomba dosificadora y el sensor de PH.

VENTANA LÁMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO

Se instala ventana en bodega y cuarto de bomba dosificadora para brindar ventilación a estos espacios.

REJA BANCARIA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" INC. ANTICORROSIVO

Se instala a reja bancaria en ventana de bodega para químicos para la seguridad de estos insumos de vital importancia para el tratamiento del agua.

VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS

Se aplica vinilo en muros de bodega y cuarto de bomba dosificadora para posteriormente aplicar la pintura epoxica como acabado final.

PINTURA EPÓXICA

Se aplica pintura epoxica en muros de bodega y cuarto de bomba dosificadora como acabado final.

ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M

Se construye anden en concreto reforzado en bodega para químicos para ayudar al desplazamiento de los mismos para su acopio.

ESTADO PORCENTUAL DE LAS OBRAS DEL CONTRATO 002 DE 2025

Actualmente se cuenta con un porcentaje de avance del **83,48%** de la ejecución total del contrato 002 DE 2025, en donde se llevaron a cabo las siguientes actividades:

REGISTRO FOTOGRAFICO

SUMINSITRO DE MACROMEDIDORES Y FILTROS







ESCALERAS TELESCOPICAS





VIGUETAS Y COLUMNETAS

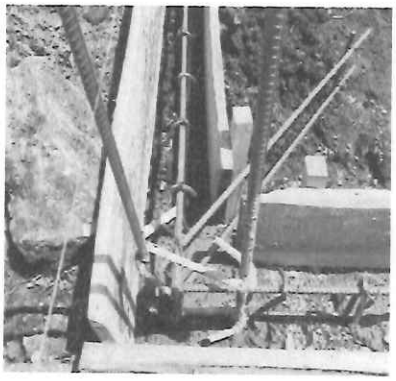

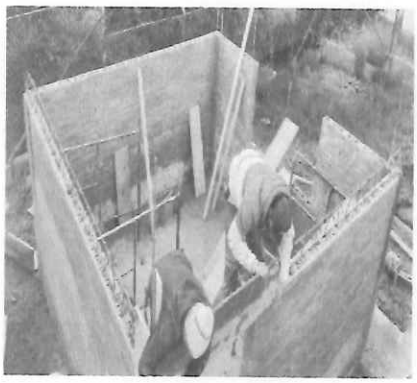


MAMPOSTERIA BODEGA Y CUARTO





SUMINISTRO E INTALACION EQUIPO DE BOMBEO 12HP 220V INDUSTRIAL



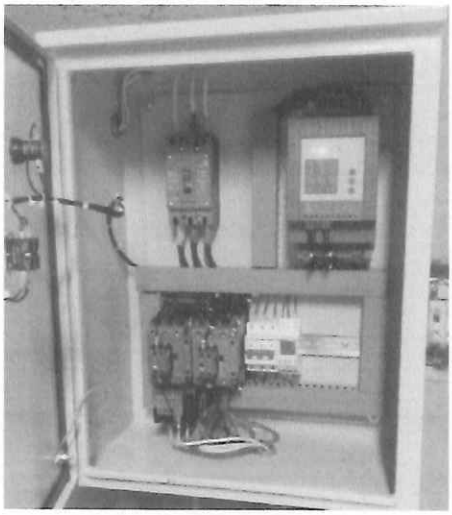

ESTRUTURA METALICA PARA CUBIERTA Y CUBIERTA EN TEJA DE FIBROEMENTO





PUERTAS EN LAMNA CALIBRE 18 PARA BODEGA Y CUARTO DE BOMBA





PINTURA EN CERAMIENTO





DANIEL CASTAÑEDA CHISCO

ING RESIDENTE DE OBRA

9. ACTA DE INICIO

AGUAS&ASEO DE SUBACHOQUE S.A.	ACTA DE INICIO	CONTRATO DE OBRA

ACTA INICIO
CONTRATO DE OBRA N 002 DE 2025

CONTRATANTE	AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A. E.S.P.
NOMBRE CONTRATISTA:	HENRY ANTONIO GARZÓN AVILA
NIT/CC CONTRATISTA:	C.C. No. 11.436.534 de Facatativá
OBJETO	"OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, CUNDINAMARCA".
VALOR	Doscientos diecisiete millones seiscientos ochenta y dos mil setecientos cuarenta y ocho pesos ($217,682.748)
PLAZO	El plazo de ejecución del contrato será de un (1) mes, contados a partir de la firma del acta de inicio correspondiente.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	27 de noviembre de 2025
FECHA DE INICIO	27 de noviembre de 2025
CDP	2025000216 del 18 de Noviembre de 2025
RP	2025000254 del 27 de Noviembre de 2025
ANTICIPO	NO APLICA
SUPERVICION	DIRECCIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA

En Subachoque, Cundinamarca, a los Veintisiete (27) de Noviembre de dos mil veinticinco (2025), se reunieron las siguientes personas: **JHOJAN ROYER REY PARDO**, en calidad de Supervisor y ***HENRY ANTONIO GARZÓN AVILA***, con C.C. No. 11.436.534 de Facatativá - Cundinamarca - Cundinamarca en su calidad de contratista con el fin de dejar constancia del inicio del contrato Obra N 002 de 2025.

VERIFICACIÓN DE REQUSITOS DE EJECUCIÓN

REQUISITOS	SÍ	NO	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL	X		
SEGURIDAD SOCIAL AL DÍA	X		
ACTIVACIÓN A ARL			X
APROBACIÓN DE GARANTÍAS	x		

No siendo otro el objeto de la presente, una vez leída, en constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

JHOJAN ROYER REY PARDO
Director Administrativo y financiero

HENRY ANTONIO GARZÓN AVILA
C.C. No. 11.436.534 de Facatativá
contratista

7. POLIZAS

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-45-101501168	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	11	2025	27	11	2025	00:00	27	12	2030	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	GARZON AVILA, HENRY ANTONIO		CC: 11.436.534
DIRECCIÓN: CALLE 14 NO. 4A-10	CIUDAD: FACATATIVA, CUNDINAMARCA		TELÉFONO: 8430828

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	EMPRESA AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A. E.S.P. Y ALCALDIA MUNICIPAL DE SUBACHOQUE		NIT: 900.322.539-4
DIRECCIÓN: CR 2 NRO. 3 - 20	CIUDAD: SUBACHOQUE, CUNDINAMARCA		TELÉFONO 3114726492

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-027A 30-06-2009, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL CUMPLIMIENTO, SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES Y ESTABILIDAD Y CONSERVACION DE LA OBRA EJECUTADA, DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 002 DE 2025, QUE TIENE POR OBJETO: OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, CUNDINAMARCA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO	27/11/2025	27/04/2026	$21,768,275.00
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	27/11/2025	27/12/2028	$10,884,138.00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	27/12/2025	27/12/2030	$65,304,825.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****740,559.00	$ ******20,000.00	$ *****144,506.00	$ **********905,066.00	$ *******97,957,238.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
DIANA CRISTINA VASQUEZ AGUDELO	143338	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

21-45-101501168

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101266555	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	11	2025	27	11	2025	00:00	27	12	2026	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
GARZON AVILA, HENRY ANTONIO	CC: 11.436.534

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 14 NO. 4A-10	FACATATIVA, CUNDINAMARCA	8430828

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
EMPRESA AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A. E.S.P. Y ALCALDIA MUNICIPAL DE SUBACHOQUE	NIT: 900.322.539-4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 2 NRO. 3 - 20	SUBACHOQUE, CUNDINAMARCA	3114726492

BENEFICIARIO: 900322539 - EMPRESA AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A. E.S.P. Y ALCALDIA MUNICIPAL DE SUBACHOQUE

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 002 DE 2025, QUE TIENE POR OBJETO: OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, CUNDINAMARCA.

ASEGURADO BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	15.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	27/11/2025	27/12/2026	$108,841,374.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****294,468.00	$ *******3,000.00	$ ******56,518.00	$ **********353,987.00	$ ******108,841,374.00	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
DIANA CRISTINA VASQUEZ AGUDELO	143338	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101266555

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

70

AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A.

PRORROGA No. 1 AL CONTRATO DE OBRA CO No. 002 DE 2025, SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA DE AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE SA ESP Y EL CONTRATISTA HENRY ANTONIO GARZÓN AVILA, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 11.436.534 DE FACATATIVÁ

Entre los suscritos, a saber; por una parte, **MARÍA DEL PILAR HERNÁNDEZ GÓMEZ**, identificada con la cédula de ciudadanía número 52'995.558 de Bogotá D.C., en su calidad de Gerente General de la **EMPRESA AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A. E.S.P.** con NIT. 900.322.539-4 y, de conformidad con el Acta de Junta Directiva No. 001 del 02 de Enero de 2024, donde se aprueba su nombramiento, y queda autorizada para celebrar Contratos según el numeral 7 del Artículo 51 de la Escritura Pública No. 624 de 2009, por una parte, quien en adelante se denominará **LA EMPRESA** y, por otra ***HENRY ANTONIO GARZÓN AVILA,*** identificado con cédula de ciudadanía No. 11.436.534 de Facatativá, quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado realizar la PRÓRROGA No. 001 al Contrato de Obra No. 002 de 2025, teniendo en cuenta lo siguiente:

1. Que, Aguas y Aseo de Subachoque SA ESP celebró el contrato de obra No. CO 002 de 2025 con ***HENRY ANTONIO GARZÓN AVILA,*** identificado con cédula de ciudadanía no. 11.436.534, cuyo objeto es: *"OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, CUNDINAMARCA"*, por valor de Doscientos diecisiete millones seiscientos ochenta y dos mil setecientos cuarenta y ocho pesos ($217,682.748), y por un tiempo de ejecución inicial de un (1) mes contado partir del acta de inicio.
2. Que se hizo la aprobación de las respectivas pólizas presentadas por el contratista, el día veintisiete (27) de Noviembre de 2025.
3. Que se suscribió el acta de inicio contractual el pasado veintisiete (27) de Noviembre de 2025.
4. Que, el contratista de obra solicitó a la supervisión una prórroga por el término de dos (2) meses, basándose en lo siguiente:
   "La presente solicitud se fundamenta principalmente en que, dentro de las actividades a desarrollar dentro del contrato del asunto en referencia, se encuentra el ítem de: Suministro e instalación de medidor con sensor de PH y cloro y bomba dosificadora de estabilización de PH. Este equipo es de vital importancia dentro del proceso de potabilización de la planta de tratamiento, y aunque ya fue comprado, el suministro del mismo no será posible dentro del tiempo contractualmente contemplado como nos indica el proveedor del mismo.
5. Que, luego de analizar la solicitud, el supervisor de obra otorgó aval respectivo.
6. Que, debido a lo antes expuesto, se hace necesario prorrogar el Contrato de Obra No. 002 de 2025, teniendo en cuenta las siguientes estipulaciones:

CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR al Contrato de Obra No. 002 de 2025 cuyo objeto consiste en: *"OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, CUNDINAMARCA"*, por un tiempo de dos (2) meses.

CLÁUSULA SEGUNDA: Teniendo en cuenta el tiempo prorrogado y el faltante por ejecutar, la nueva fecha para culminación del contrato es el próximo veintiséis (26) de febrero de 2026.

CLÁUSULA TERCERA: El contratista deberá actualizar las pólizas con base en el nuevo tiempo establecido para la culminación del contrato.

CLAUSULA CUARTA: Las demás cláusulas e ítems no modificados del contrato principal continúan vigentes.

En constancia se firma a los veinticinco (26) días del mes de diciembre de 2025.

Por la Empresa,

MARÍA DEL PILAR HERNÁNDEZ GÓMEZ
Gerente General
EMPRESA DE AGUAS Y ASEO DE
SUBACHOQUE S.A. E.S.P.

El Contratista

HENRY ANTONIO GARZÓN AVILA.
C.C. No. 11.436.534 DE FACATATIVÁ
Contratista

JHOJAN ROYER REY PARDO
Director Técnico – Operativo
Empresa Aguas y Aseo de Subachoque S.A. E.S.P

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101266555	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
30	12	2025	27	11	2025	00:00	27	02	2027	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	GARZON AVILA, HENRY ANTONIO		CC: 11.436.534
DIRECCIÓN: CALLE 14 NO. 4A-10	CIUDAD: FACATATIVA, CUNDINAMARCA	TELÉFONO:	8430828

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	EMPRESA AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A. E.S.P. Y ALCALDIA MUNICIPAL DE SUBACHOQUE		NIT: 900.322.539-4
DIRECCIÓN: CR 2 NRO. 3 - 20	CIUDAD: SUBACHOQUE, CUNDINAMARCA	TELÉFONO	3114726492

BENEFICIARIO: 900322539 - EMPRESA AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A. E.S.P. Y ALCALDIA MUNICIPAL DE SUBACHOQUE

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 002 DE 2025, QUE TIENE POR OBJETO: OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, CUNDINAMARCA.

ASEGURADO BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	15.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	27/11/2025	27/02/2027	$108,841,374.00	$108,841,374.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA LA VIGENCIA DE LA POLIZA SEGUN PRORROGA No. 1 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2025.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******46,220.00	$ *******3,000.00	$ *******9,351.00	$ **********58,572.00	$ ******108,841,374.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
DIANA CRISTINA VASQUEZ AGUDELO	143338	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101266555

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101266555	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
30	12	2025	27	11	2025	00:00	27	02	2027	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
GARZON AVILA, HENRY ANTONIO			CC: 11.436.534
DIRECCIÓN: CALLE 14 NO. 4A-10	**CIUDAD:** FACATATIVA, CUNDINAMARCA	**TELÉFONO:**	8430828

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
EMPRESA AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A. E.S.P. Y ALCALDIA MUNICIPAL DE SUBACHOQUE			NIT: 900.322.539-4
DIRECCIÓN: CR 2 NRO. 3 - 20	**CIUDAD:** SUBACHOQUE, CUNDINAMARCA	**TELÉFONO:**	3114726492

BENEFICIARIO: 900322539 - EMPRESA AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A. E.S.P. Y ALCALDIA MUNICIPAL DE SUBACHOQUE

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101266555

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-45-101501168	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
30	12	2025	27	11	2025	00:00	27	12	2030	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
GARZON AVILA, HENRY ANTONIO			CC: 11.436.534
DIRECCIÓN: CALLE 14 NO. 4A-10	**CIUDAD:** FACATATIVA, CUNDINAMARCA	**TELÉFONO:**	8430828

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
EMPRESA AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A. E.S.P. Y ALCALDIA MUNICIPAL DE SUBACHOQUE			NIT: 900.322.539-4
DIRECCIÓN: CR 2 NRO. 3 - 20	**CIUDAD:** SUBACHOQUE, CUNDINAMARCA	**TELÉFONO:**	3114726492

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-45-101501168

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-45-101501168	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
30	12	2025	27	11	2025	00:00	27	12	2030	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
GARZON AVILA, HENRY ANTONIO	CC: 11.436.534

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 14 NO. 4A-10	FACATATIVA, CUNDINAMARCA	8430828

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
EMPRESA AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A. E.S.P. Y ALCALDIA MUNICIPAL DE SUBACHOQUE	NIT: 900.322.539-4

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CR 2 NRO. 3 - 20	SUBACHOQUE, CUNDINAMARCA	3114726492

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-027A 30-06-2009, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL CUMPLIMIENTO, SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES Y ESTABILIDAD Y CONSERVACION DE LA OBRA EJECUTADA, DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 002 DE 2025, QUE TIENE POR OBJETO: OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, CUNDINAMARCA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO	27/11/2025	27/06/2026	$21,768,275.00	$21,768,275.00
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	27/11/2025	27/02/2029	$10,884,138.00	$10,884,138.00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	27/12/2025	27/12/2030	$65,304,825.00	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA LA VIGENCIA DE LA POLIZA SEGUN PRORROGA No. 1 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2025.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******11,275.00	$ *******4,000.00	$ *******2,902.00	$ **********18,178.00	$ *******97,957,238.00	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
DIANA CRISTINA VASQUEZ AGUDELO	143338	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

21-45-101501168

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A.

PRORROGA No. 2 AL CONTRATO DE OBRA CO No. 002 DE 2025, SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA DE AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE SA ESP Y EL CONTRATISTA HENRY ANTONIO GARZÓN AVILA, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 11.436.534 DE FACATATIVÁ

Entre los suscritos, a saber; por una parte, **MARÍA DEL PILAR HERNÁNDEZ GÓMEZ**, identificada con la cédula de ciudadanía número 52'995.558 de Bogotá D.C., en su calidad de Gerente General de la **EMPRESA AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A. E.S.P.** con NIT. 900.322.539-4 y, de conformidad con el Acta de Junta Directiva No. 001 del 02 de Enero de 2024, donde se aprueba su nombramiento, y queda autorizada para celebrar Contratos según el numeral 7 del Artículo 51 de la Escritura Pública No. 624 de 2009, por una parte, quien en adelante se denominará **LA EMPRESA** y, por otra ***HENRY ANTONIO GARZÓN AVILA,*** identificado con cédula de ciudadanía No. 11.436.534 de Facatativá, quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado realizar la PRÓRROGA No. 002 al Contrato de Obra No. 002 de 2025, teniendo en cuenta lo siguiente:

1. Que, Aguas y Aseo de Subachoque SA ESP celebró el contrato de obra No. CO 002 de 2025 con ***HENRY ANTONIO GARZÓN AVILA,*** identificado con cédula de ciudadanía no. 11.436.534, cuyo objeto es: "*OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, CUNDINAMARCA*", por valor de Doscientos diecisiete millones seiscientos ochenta y dos mil setecientos cuarenta y ocho pesos ($217,682.748), y por un tiempo de ejecución inicial de un (1) mes contado partir del acta de inicio.
2. Que se hizo la aprobación de las respectivas pólizas presentadas por el contratista, el día veintisiete (27) de Noviembre de 2025.
3. Que se suscribió el acta de inicio contractual el pasado veintisiete (27) de Noviembre de 2025.
4. Que, el contratista de obra solicitó a la supervisión una prórroga por el término de dos (2) meses, basándose en lo siguiente:
   "La presente solicitud se fundamenta principalmente en que, dentro de las actividades a desarrollar dentro del contrato del asunto en referencia, se encuentra el ítem de: Suministro e instalación de medidor con sensor de PH y cloro y bomba dosificadora de estabilización de PH. Este equipo es de vital importancia dentro del proceso de potabilización de la planta de tratamiento, y aunque ya fue comprado, el suministro del mismo no será posible dentro del tiempo contractualmente contemplado como nos indica el proveedor del mismo.
5. Que se prorrogó el contrato por el termino de dos (2) meses, la nueva fecha para culminación del contrato es el próximo veintiséis (26) de febrero de 2026.
6. Mediante Modificación y Prórroga del Convenio Interadministrativo No. 157 de 2025, suscrito entre el Municipio de Subachoque y la Empresa de Aguas y Aseo de Subachoque S.A. E.S.P., se aprobó la ampliación del plazo por tres (3) meses y la modificación de la cláusula segunda relacionada con especificaciones técnicas, con el fin de garantizar la adecuada ejecución del proyecto "Optimización del sistema de acueducto del municipio de Subachoque".
7. Que el contratista Henry Antonio Garzón Ávila, mediante comunicación radicada el 24 de febrero de 2026, solicitó formalmente la Prórroga No. 2 por un término de veinticinco (25) días calendario. El contratista expone que previamente fue tramitado el Modificatorio No. 1 para la inclusión de ítems no previstos, derivados de nuevas necesidades técnicas requeridas para garantizar la correcta operación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable del sector Pantano. Así mismo, manifiesta que las constantes lluvias presentadas en la zona

de intervención han generado retrasos en la ejecución de las actividades programadas, afectando el cronograma inicialmente establecido y haciendo insuficiente el plazo contractual vigente.

8. Que, debido a lo antes expuesto, se hace necesario prorrogar el Contrato de Obra No. 002 de 2025, teniendo en cuenta las siguientes estipulaciones:

CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR al Contrato de Obra No. 002 de 2025 cuyo objeto consiste en: "*OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, CUNDINAMARCA*", por un tiempo de VEINTICINCO (25) DÍAS más al plazo inicialmente pactado.

CLÁUSULA SEGUNDA: Teniendo en cuenta el tiempo prorrogado y el faltante por ejecutar, la nueva fecha para culminación del contrato es el próximo veintitrés (23) de marzo de 2026.

CLÁUSULA TERCERA: MODIFICAR los ítems según otro si del convenio 157 de 2025 entre la alcaldía de Subachoque y la empresa a guas y aseo de Subachoque, esto de la siguiente manera:

ACTIVIDADES ADICIONALES QUE RREMPLAZAN LA INTALACION DEL TANQUE					
ICCU 1,5	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	ML	56	$ 31.443,00	$ 1.131.979,44
ICCU 1,42	REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS	M2	36,00	$ 5.351,00	$ 192.636,00
ICCU 16,4	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	25,74	$ 74.140,00	$ 1.908.660,16
ICCU 16,8	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	24,12	$ 114.384,00	$ 2.759.399,62
ICCU 2,5	ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI	M3	7,74	$ 855.040,00	$ 6.621.429,76
ICCU 4,23	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	74,88	$ 10.491,00	$ 785.566,08
ICCU 13,13	PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI	M2	36,00	$ 79.248,00	$ 2.852.928,00
ICCU 13,1	ALISTADO ENDURECIDO 1:3, E=0.04	M2	16,00	$ 58.947,00	$ 943.152,00
APU 001	SUMINISTRO E INTALACION EQUIPO DE BOMBEO 10HP 220V INDUSTRIAL	UNI	1	$ 24.650.045,00	$ 24.650.045,00
APU 002	LIMPIEZA MANUAL DE CERRAMIENTO	M2	424,4	$ 6.850,00	$ 2.907.140,00
ICCU 18,9	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2	424,4	$ 22.731,00	$ 9.647.066,40
ICCU 5,43	MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M, DOS CARAS A LA VISTA	M2	6,16	$ 105.423,00	$ 649.405,68
ICCU 6.17	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2	38,98	$ 28.816,00	$ 1.123.440,91
APU 003	VIGUETAS Y COLUMNETAS INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	40,8	$ 75.095,00	$ 3.063.876,00
ICCU 7,32	ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO (TUBO ESTRUCTURAL ABIERTO 4"x2", 15 MM)	M2	27,32	$ 85.920,00	$ 2.347.334,40
ICCU 7,22	TEJA FIBROCEMENTO No. 4	M2	27,32	$ 55.217,00	$ 1.508.528,44
ICCU 10,4	MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 - 0.8	UN	2	$ 229.458,00	$ 458.916,00
ICCU 10,7	PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	3	$ 310.262,00	$ 992.838,40
ICCU 9.18	CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL	UN	2	$ 162.774,00	$ 325.548,00
ICCU 10,20	VENTANA LÁMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	2	$ 192.956,00	$ 289.434,00
ICCU 10,16	REJA BANCARIA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" INC. ANTICORROSIVO	M2	2	$ 222.587,00	$ 400.656,60

ICCU 18,23	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2	38,98	$ 11.600,00	$ 452.214,40
ICCU 18,25	PINTURA EPÓXICA	M2	15,78	$ 21.218,00	$ 334.735,17
ICCU 11,1	ACOMETIDA AÉREA 10 M. PVC	UN	2	$ 516.445,00	$ 1.032.890,00
APU 004	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO TUBERÍA PVC 3/4" . ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	UN	2	$ 123.531,00	$ 247.062,00
APU 005	PARCIAL TRIFASICA 3X10+1X12+12T TUEBRÍA EMT DE 3/4"	ML	20	$ 79.042,00	$ 1.580.840,00
APU 006	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO TUBERÍA PVC 3/4" . ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	UN	2	$ 123.531,00	$ 247.062,00
APU 007	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAMPANA LED DE 150W	UN	2	$ 222.406,00	$ 444.812,00
ICCU 5,4	ANDÈN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	24	$ 85.795,00	$ 2.059.080,00
APU 008	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA BRIDADA DE 6"	UN	1	$ 2.682.697,40	$ 2.682.697,40
CONTRACTUAL	EMPAQUE NEOPRENO 6"	UN	4,00	$ 21.634,00	$ 86.536,00
CONTRACTUAL	ADAPTADOR BRIDA X UNIVERSAL 6" HD	UN	4,00	$ 704.295,00	$ 2.817.180,00
CONTRACTUAL	JUEGOS DE TORNILLOS PARA BRIDAS, PERNOS PARA CONECTAR BRIDAS, JUEGO DE TORNILLO CON TUERCA Y ARANDELA	UN	34,00	$ 32.257,00	$ 1.096.738,00
COSTOS DIRECTOS					$ 163.671.239,30
ADMINISTRACIÓN	27%	%			$ 44.191.234,61
IMPREVISTOS	1%	%			$ 1.636.712,39
UTILIDAD	5%	%			$ 8.183.561,96
COSTO TOTAL DE OBRA					$ 217.682.748

CLAUSULA CUARTA: El contratista deberá actualizar las pólizas con base en el nuevo tiempo establecido para la culminación del contrato.

CLAUSULA QUINTA: Las demás cláusulas e ítems no modificados del contrato principal continúan vigentes.

En constancia se firma a los veintiséis (26) días del mes de febrero de 2026.

Por la Empresa,

El Contratista

AGUAS Y ASEO
DE SUBACHOQUE S.A.

MARIA DEL PILAR HERNÁNDEZ GÓMEZ
Gerente General
EMPRESA DE AGUAS Y ASEO DE
SUBACHOQUE S.A. E.S.P.

HENRY ANTONIO GARZÓN AVILA.
C.C. No. 11.436.534 DE FACATATIVÁ
Contratista

ING. ANA GABRIELA RODRÍGUEZ ROMERO
Director Técnico – Operativo
Empresa Aguas y Aseo de Subachoque S.A. E.S.P

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-45-101501168	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
02	03	2026	27	11	2025	00:00	27	12	2030	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
GARZON AVILA, HENRY ANTONIO			CC: 11.436.534
DIRECCIÓN: CALLE 14 NO. 4A-10	CIUDAD: FACATATIVA, CUNDINAMARCA		TELÉFONO: 8430828

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
EMPRESA AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A. E.S.P. Y ALCALDIA MUNICIPAL DE SUBACHOQUE			NIT: 900.322.539-4
DIRECCIÓN: CR 2 NRO. 3 - 20	CIUDAD: SUBACHOQUE, CUNDINAMARCA		TELÉFONO 3114726492
ADICIONAL:			

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-027A 30-06-2009, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL CUMPLIMIENTO, SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES Y ESTABILIDAD Y CONSERVACION DE LA OBRA EJECUTADA, DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 002 DE 2025, QUE TIENE POR OBJETO: OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, CUNDINAMARCA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO	27/11/2025	23/07/2026	$21,768,275.00	$21,768,275.00
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	27/11/2025	23/03/2029	$10,884,138.00	$10,884,138.00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		$65,304,825.00	$65,304,825.00

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA LA VIGENCIA DE LA POLIZA SEGUN PRORROGA No. 2.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *******8,000.00	$ *******4,000.00	$ *******2,280.00	$ **********14,280.00	$ *******97,957,238.00	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
DIANA CRISTINA VASQUEZ AGUDELO	143338	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

21-45-101501168

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

82

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-45-101501168	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
02	03	2026	27	11	2025	00:00	27	12	2030	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
GARZON AVILA, HENRY ANTONIO			CC: 11.436.534
DIRECCION: CALLE 14 NO. 4A-10	**CIUDAD:** FACATATIVA, CUNDINAMARCA	**TELEFONO:**	8430828

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
EMPRESA AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A. E.S.P. Y ALCALDIA MUNICIPAL DE SUBACHOQUE			NIT: 900.322.539-4
DIRECCIÓN: CR 2 NRO. 3 - 20	**CIUDAD:** SUBACHOQUE, CUNDINAMARCA	**TELÉFONO:**	3114726492

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-45-101501168

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AGUAS Y ASEO ESP
DE SUBACHOQUE S.A.

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 002 DE 2025	
Fecha en la que se rinde en informe	10 de abril de 2026
· INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO	
Contratista:	HENRY ANTONIO GARZON AVILA
NIT / C.C.	11.436.534 DE FACATATIVA
Supervisor	ANA GABRIELA RODRIGUEZ ROMERO
Cargo	Directora Técnica – Operativa
OBJETO:	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, CUNDINAMARCA.
VALOR TOTAL:	DOSCIENTOS DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS $ 217.682.748
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	2025000216 del 18 de noviembre de 2025
Registro Presupuestal	2025000254 del 27 de noviembre de 2025
PLAZO INICIAL:	El plazo de ejecución del contrato será de un (1) mes, contados a partir de la firma del acta de inicio correspondiente.
FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO	27 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO:	27/11/2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	26/12/2025
PRORROGA No.	1
TIEMPO DE PRORROGA No. 1:	Dos (2) meses
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	26/02/2026
TIEMPO DE PRORROGA No. 2:	Veinticinco (25) días
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	25/03/2026
TIEMPO DE PRORROGA No. 3	Un (01) mes
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	23/04/2026
ASEGURADORA	**Seguros del Estado**
No. Póliza	21-40-101266555
Predios Labores y operaciones	27/11/2025 al 27/02/2027
Póliza No.	21-45-101501168
Garantía de Cumplimiento	27/11/2025 hasta 23/07/2026
Salarios y prestaciones sociales	27/11/2025 hasta 23/03/2029
Estabilidad de la obra	Se ampara 5 años

- **DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:**

1. INTRODUCCIÓN:

Por medio del presente documento se procede a realizar la supervisión al CONTRATO DE OBRA 002 de 2025 en cumplimiento de las obligaciones contraídas con la firma del celebrado entre La Empresa AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE SA ESP y **HENRY ANTONIO GARZON AVILA**, identificado con cedula de ciudadanía No 11.436.534 de Facatativá Cund, del desarrollo del Contrato en mención.

2. ALCANCE:

Dando cumplimiento y a lo establecido en la ley 80 de 1993, la ley 1474 de 2011 y a las demás normas que modifiquen o adicionen; así como a las obligaciones pactadas en el contrato, se procede a rendir este informe.

El suscrito supervisor del Contrato de Obra **C00 002//2025** informa:

Que el contratista, **HENRY ANTONIO GARZON AVILA**, identificado con cedula de ciudadanía No 11.436.534 de Facatativá Cund, para dar cumplimiento al Contrato de Obra **C00-002//2025** y desarrollar el objeto el cual es OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, CUNDINAMARCA. Dentro de las actividades establecida por el contratista estas fueren desarrolladas de acuerdo a cada actividad y las plasmadas dentro de las obligaciones conforme a la factura No **FE83.**

3. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS:

Dentro de las actividades establecida por el contratista estas fueren desarrolladas de acuerdo a cada actividad y las plasmadas dentro de las obligaciones que se deben cumplir prestando a la Empresa

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA 2	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDADES	VALOR
1	RETIRO MANUAL, CARGUE Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL FILTRANTE	M3	9,50	$ 89.054,00	$ 846.013,00	0,00	$ -
2	REFORZAMIENTO ESTRUCTURA METALICA FALSO PISO BASE DEL FILTRO	M2	7,28	$ 86.746,00	$ 631.510,88	0,00	$ -
3	CAMBIO DE BOQUILLAS ROTULADAS MATERIAL PVC A TODO COSTO (INCLUYE DESMONTE DE LAS BOQUILLAS ANTIGUAS Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAS NUEVAS)	UN	324,00	$ 13.319,00	$ 4.315.356,00	0,00	$ -
4	ESTABILIZACION MEMBRANA ESTRUCTURA PERFIL METALICO REFORZADO.	ML	7,28	$ 99.737,00	$ 726.085,36	0,00	$ -
5	LAVADO Y RESANE DE MUROS FILTRO PARA INSTALACION DE MEMBRANA DE IMPERMEABILIZACION	M2	116,08	$ 28.790,00	$ 3.341.943,20	0,00	$ -
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA PARA IMPERMEABILIZACIÓN PVC DE 1500 MICRAS (1,5MM), REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO O MALLA POLIESTER, TERMOSELLADO	M2	116,08	$ 212.000,00	$ 24.608.960,00	0,00	$ -
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE ARENA GRADADA PARA FILTROS DE POTABILIZACIÓN (TAMICES NO 10 HASTA NO 60)	M3	3,00	$ 878.890,00	$ 2.636.670,00	0,00	$ -
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE GRAVA GRADADA PARA FILTROS DE POTABILIZACIÓN (TAMICES 1 1/2" HASTA NO 12)	M3	2,50	$ 878.890,00	$ 2.197.225,00	0,00	$ -
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE CARBON TIPO ANTRACITA PARA FILTRO DE POTABILIZACIÓN	M3	4,00	$ 1.033.690,00	$ 4.134.760,00	0,00	$ -
10	SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDOR BRIDADO DE 6"	UN	2,00	$ 3.035.505,00	$ 6.071.010,00	1,00	$ 3.035.505,00
11	SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO BRIDADO DE 6"	UN	2,00	$ 2.619.719,00	$ 5.239.438,00	1,00	$ 2.619.719,00
12	EMPAQUE NEOPRENO 6"	UN	8,00	$ 21.634,00	$ 173.072,00	4,00	$ 86.536,00
13	ADAPTADOR BRIDA X UNIVERSAL 6" HD	UN	8,00	$ 704.295,00	$ 5.634.360,00	4,00	$ 2.817.180,00

AGUAS Y ASEO E.S.P.
DE SUBACHOQUE S.A.

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA 2	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDADES	VALOR
14	JUEGOS DE TORNILLOS PARA BRIDAS, PERNOS PARA CONECTAR BRIDAS, JUEGO DE TORNILLO CON TUERCA Y ARANDELA	UN	64,00	$ 32.257,00	$ 2.064.448,00	64,00	$ 2.064.448,00
15	ESCALERA TELESCÓPICA 3.2 M ALUMINIO PLEGABLE ANTIDESLIZANTE	UN	5,00	$ 910.293,00	$ 4.551.465,00	5,00	$ 4.551.465,00
16	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR CON SENSOR DE PH Y CLORO Y BOMBA DOSIFICADORA DE ESTABILIZADIOR DE PH	UN	1,00	$ 17.877.125,00	$ 17.877.125,00	1,00	$ 17.877.125,00
17	TANQUE EN PRFV PARA UN VOLUMEN DE 25.000 LITROS	UN	1,00	-	-		$ -
18	REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS	M2	20,25	-	-		$ -
19	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	14,17	-	-		$ -
20	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	8,10	-	-		$ -
21	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	780,08	-	-		$ -
22	PLACA PISO 3500 PSI E=0.30 M	M2	20,25	-	-		$ -
23	CONSTRUCCIÓN DE ANCLAJE DE TUBERÍAS CON ATRAQUES EN CONCRETO 21 MPA (3000PSI) HECHO EN OBRA	M3	1,00	-	-		$ -
24	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES	ML	62,54	-	-		$ -
25	SEÑALIZACIÓN Y AISLAMIENTO DE ÁREAS DE TRABAJO, INCLUYE CINTA DE SEGURIDAD, POSTES TUBULARES, CONOS GUIA, SEÑALES PREVENTIVAS Y REGLAMENTARIAS	ML-MES	20,00	-	-		$ -
26	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	25,01	-	-		$ -
27	EXCAVACIÓN MANUAL EN ROCA H=0.0-2.0 M (SECO SIN EXPLOSIVOS)	M3	1,00	-	-		$ -
28	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3-KM	743,74	-	-		$ -
29	RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA"	M3	9,37	-	-		$ -
30	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	15,64	-	-		$ -
31	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	1,00	-	-		$ -
32	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERÍA POLIETILENO PE 100 - 160MM TERMOFUSIÓN	ML	62,54	-	-		$ -
ACTIVIDADES ADICIONALES QUE RREMPLAZAN LA INTALACION DEL TANQUE							
NP1	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	ML	36	$ 31.443,00	$ 1.131.979,44	36,00	$ 1.131.948,00
NP2	REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS	M2	36,00	$ 5.351,00	$ 192.636,00	22,40	$ 119.862,40
NP3	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	25,74	$ 74.140,00	$ 1.908.660,16	16,71	$ 1.238.879,40
NP4	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	24,12	$ 114.384,00	$ 2.759.399,62	9,15	$ 1.046.613,60
NP5	ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI	M3	7,74	$ 855.040,00	$ 6.621.429,76	6,31	$ 5.395.302,40
NP6	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	74,88	$ 10.491,00	$ 785.566,08	26,99	$ 283.152,09
NP7	PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI	M2	36,00	$ 79.248,00	$ 2.852.928,00	22,40	$ 1.775.155,20
NP8	ALISTADO ENDURECIDO 1:3, E=0.04	M2	16,00	$ 58.947,00	$ 943.152,00	14,28	$ 841.763,16
NP9	SUMINISTRO E INTALACION EQUIPO DE BOMBEO 12HP 220V INDUSTRIAL	UNI	1,00	$ 24.630.045,00	$ 24.630.045,00	1,00	$ 24.630.045,00
NP10	LIMPIEZA MANUAL DE CERRAMIENTO	M2	424,40	$ 6.850,00	$ 2.907.140,00	424,40	$ 2.907.140,00
NP11	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2	424,40	$ 22.731,00	$ 9.647.036,40	424,40	$ 9.647.036,40
NP12	MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M, DOS CARAS A LA VISTA	M2	6,16	$ 105.423,00	$ 649.405,68	35,23	$ 3.714.052,29
NP13	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2	38,98	$ 28.818,00	$ 1.123.440,91	40,19	$ 1.158.195,42

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA 2	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDADES	VALOR
NP14	VIGUETAS Y COLUMNETAS INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	40,80	$ 75.095,00	$ 3.063.876,00	54,84	$ 4.118.209,80
NP15	ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO (TUBO ESTRUCTURAL ABIERTO 4"x2", 15 MM)	M2	27,32	$ 85.920,00	$ 2.347.334,40	15,32	$ 1.316.294,40
NP16	TEJA FIBROCEMENTO No. 4	M2	27,32	$ 55.217,00	$ 1.508.528,44	20,25	$ 1.118.144,25
NP17	MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8	UN	2,00	$ 229.458,00	$ 458.916,00	2,00	$ 458.916,00
NP18	PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	3,20	$ 310.262,00	$ 992.838,40	3,48	$ 1.079.711,76
NP19	CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL	UN	2,00	$ 162.774,00	$ 325.548,00	2,00	$ 325.548,00
NP20	VENTANA LÁMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	1,50	$ 192.956,00	$ 289.434,00	1,71	$ 329.954,76
NP21	REJA BANCARIA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" INC. ANTICORROSIVO	M2	1,80	$ 222.587,00	$ 400.656,60	1,50	$ 333.880,50
NP22	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2	38,98	$ 11.600,00	$ 452.214,40	46,63	$ 540.908,00
NP23	PINTURA EPÓXICA	M2	15,78	$ 21.218,00	$ 334.735,17	49,85	$ 1.057.717,30
NP24	ACOMETIDA AÉREA 10 M. PVC	UN	2,00	$ 516.445,00	$ 1.032.890,00	0,00	$ -
NP25	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO TUBERÍA PVC 3/4" , ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	UN	2,00	$ 123.531,00	$ 247.062,00	0,00	$ -
NP26	PARCIAL TRIFÁSICA 3X10+1X12+12T TUEBRÍA EMT DE 3/4"	ML	20,00	$ 79.042,00	$ 1.580.840,00	0,00	$ -
NP27	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO TUBERÍA PVC 3/4" , ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	UN	2,00	$ 123.531,00	$ 247.062,00	0,00	$ -
NP28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAMPANA LED DE 150W	UN	2,00	$ 222.406,00	$ 444.812,00	0,00	$ -
NP29	ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	24,00	$ 85.795,00	$ 2.059.080,00	4,20	$ 360.339,00
NP30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA BRIDADA DE 6"	UN	1,00	$ 2.682.697,40	$ 2.682.697,40	1,00	$ 2.682.697,40
NP31	EMPAQUE NEOPRENO 6"	UN	4,00	$ 21.634,00	$ 86.536,00	4,00	$ 86.536,00
NP32	ADAPTADOR BRIDA X UNIVERSAL 6" HD	UN	4,00	$ 704.295,00	$ 2.817.180,00	2,00	$ 1.408.590,00
NP33	JUEGOS DE TORNILLOS PARA BRIDAS, PERNOS PARA CONECTAR BRIDAS, JUEGO DE TORNILLO CON TUERCA Y ARANDELA	UN	34,00	$ 32.257,00	$ 1.096.738,00	34,00	$ 1.096.738,00
COSTOS DIRECTOS					$ 163.671.239,30		$ 103.255.308,53
ADMINISTRACIÓN			27%	%	$ 44.191.234,61		$ 27.878.933,30
IMPREVISTOS			1%	%	$ 1.636.712,39		$ 1.032.553,09
UTILIDAD			5%	%	$ 8.183.561,96		$ 5.162.765,43
COSTO TOTAL DE OBRA					**$ 217.682.748**		**$ 137.329.560,34**

- **PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO**

NUMERO DE PAGO	VALOR
1	$ 56´792.816

4. PAGOS EFECTUADOS POR PARTE DEL CONTRATISTA PARAFISCALES COMO COTIZANTE

El contratista certifica encontrarse al día con las obligaciones al sistema de seguridad social integral de salud, riesgos profesionales, aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y Sena.

Certificación de pago de aportes sistema general de seguridad social parafiscales / Articulo 50 Ley 789 de 2002 expedido por el señor **HENRY ANTONIO GARZON AVILA**, identificado con cedula de ciudadanía No 11.436.534 de Facatativá Cund.

El contratista realiza de pago de obligaciones parafiscales conforme a las planillas adjuntas, que hacen parte del presente informe.

5. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del Contrato / Convenio		**$217.682.748**
Valor Adición		$ 0
Valor Ejecutado a la fecha	$194.122.376	
Saldo por ejecutar	$23.560.732	
Sumas iguales	**$217.682.748**	**$217.682.748**

6. VALOR CERTIFICADO PARA PAGO

La dirección técnica y operativa A.A.S.S.A E.S.P. viabiliza el pago para el Contrato de Obra **C00 001//2025** cuyo contratista es OLPG CIVIL SAS., Por un valor de **CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS ($137.329.560) MCTE**

Para constancia se suscribe en Subachoque Cundinamarca a los Diez (10) días del mes de Abril de 2026.

ANA GABRIELA RODRIGUEZ ROMERO
Directora Técnica - Operativa

	AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A. ESP	Código:
AGUAS ASEO DE SUBACHOQUE S.A.		Versión:
		Fecha Versión Formato:
	PROCESO FINANCIERO	Página: 1 de 1

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

Nit: 900322539-4

COM - 2026000073

lunes. 13 de abril de 2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE GARZON AVILA HENRY ANTONIO **CC o NIT** 11436534 **DV** 3

DIRECCION **TEL**

DESCRIPCION SEGUNDO PAGO AL CONTRATO 002 DE 2025 CUYO OBJETO ES LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE CUNDINAMARCA

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE GRAVABLE	%	DEBITOS	CREDITOS
24362704	Retención de ICA contratos de obra	137,329,560	0.7	00.00	961,000.00
24408502	Sobretasa Bomberil RETEICA	961,000	2	00.00	19,000.00
24072202	Estampilla Adulto Mayor	137,329,560	4	00.00	5,493,000.00
244040	Tasa Pro Deporte y Recreacion	137,329,560	1	00.00	1,373,000.00
24072203	Estampilla justicia para la familia	137,329,560	2	00.00	2,747,000.00
24072201	Estampilla Procultura	137,329,560	1.5	00.00	2,060,000.00
24402303	Contribucion 5% Contrato de Obra	137,329,560	5	00.00	6,866,000.00
243626	Contratos de construccion	137,329,560	2	00.00	2,747,000.00
29020124	CONVENIO CONV-CD-157-2025 OPTIMIZACION SISTEMA DE ACUEDUCTO			137,329,560.00	00.00
24010101	Bienes y servicios			00.00	115,063,560.00
	SUMAS IGUALES			**137,329,560.00**	**137,329,560.00**

Total Deducciones	22,266,000.00	Valor a Girar	115,063,560.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026000045	2026000033	2.3.2.3.2.01.01.001.03.08.02.1. 3.1.1.07	GASTOS DE INVERSION. FUENTE: 1.3.1.1.07-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	GERENCIA	137,329,560.00

TOTAL PRESUPUESTO	137,329,560.00

MARIA DEL PILAR HERNANDEZ GOMEZ
GERENTE

MARIA YOLIMA CASTELLANOS PULIDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Jgonzalez
Elaboró

Modificó

4593000534 18 convenio cd No 157

	AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A. ESP	Código: Versión:
AGUAS&ASEO DE SUBACHOQUE S.A.	PROCESO FINANCIERO	Fecha Versión Formato: Página: 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2026000080

Pendiente Respuesta

Nit: 900322539-4

martes, 14 de abril de 2026

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2026000073	14-abr.-26

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE GARZON AVILA HENRY ANTONIO **CC o NIT** 11436534 **DV** 3

DIRECCION **TELEFONO**

BANCO **CUENTA** **TIPO CUENTA** CTA AH

PAGADO A GARZON AVILA HENRY ANTONIO **VALOR PAGO** 115,063,560.00

TIPO PAGO TRANSFERENCIA

DESCRIPCION

SEGUNDO PAGO AL CONTRATO 002 DE 2025 CUYO OBJETO ES LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE CUNDINAMARCA FACTRA FE 83- 2026

SON CIENTO QUINCE MILLONES SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NIT	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
111006111	11436534	Cta Ah Davivienda 459300053418 Convenio CD No 157 de 2025 Optimizacion Sistema de Acueducto	00.00	115,063,560
24010101	11436534	Bienes y servicios	115,063,560.00	00
		SUMAS IGUALES	**115,063,560.00**	**115,063,560.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA 2026

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2026000045	2026000033	2.3.2.3.2.01.01.001.03.08.02. 1.3.1.1.07	GASTOS DE INVERSION. FUENTE: 1.3.1.1.07-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	137,329,560.00
TOTAL PRESUPUESTO				**137,329,560.00**

4. DEDUCCIONES PRACTICADAS EN ORDEN DE PAGO COM-2026000073

NOMBRE DEDUCCION	NOMBRE TERCERO	BASE	%	DEDUCIDO
Contratos de construccion	11436534 GARZON AVILA HENRY ANTONIO	137,329,560	2	2,747,000.00
Contribucion 5% Contrato de Obra	11436534 GARZON AVILA HENRY ANTONIO	137,329,560	5	6,866,000.00
Estampilla Procultura	11436534 GARZON AVILA HENRY ANTONIO	137,329,560	1.5	2,060,000.00
Estampilla justicia para la familia	11436534 GARZON AVILA HENRY ANTONIO	137,329,560	2	2,747,000.00
Tasa Pro Deporte y Recreacion	11436534 GARZON AVILA HENRY ANTONIO	137,329,560	1	1,373,000.00
Estampilla Adulto Mayor	11436534 GARZON AVILA HENRY ANTONIO	137,329,560	4	5,493,000.00
Sobretasa Bomberil RETEICA	11436534 GARZON AVILA HENRY ANTONIO	961,000	2	19,000.00
Retención de ICA contratos de obra	11436534 GARZON AVILA HENRY ANTONIO	137,329,560	0.7	961,000.00
	TOTAL DEDUCCIONES			**22,266,000.00**

Elaboró: Jgonzalez **Aprobo:**	**Modifico:** **Reviso:**	**Firma y Sello Beneficiario**
MARIA DEL PILAR HERNANDEZ GOMEZ **GERENTE**	**MARIA YOLIMA CASTELLANOS PULIDO** **DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**	**c.c ó Nit**

Cuenta Bancolombia 37262498999
