DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e2aa4534858438007e6eae9b5546a0eca127bad84b572783ca13a0beac3b7470daf98f72e464ee415adb3c89dd5f1790

Número de Factura: AAND-43
Fecha de Emisión: 19/05/2026
Fecha de Vencimiento: 31/05/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: AGUAS ANDAKI S.A E.S.P
Nombre Comercial: AGUAS ANDAKI S.A E.S.P
Nit del Emisor: 900252778
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-15
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 3600

País: Colombia
Departamento: Caquetá
Municipio / Ciudad: Belén De Los Andaquíes
Dirección: CR 3 5 48 BRR SANTA TERESA
Teléfono / Móvil: 3208151645
Correo: aguasandaki@yahoo.es

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ALCALDIA DE BELEN DE LOS ANDAQUIES
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800095734
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Caquetá
Municipio / Ciudad: Belén De Los Andaquíes
Dirección: CALLE 5 N 4 - 42
Teléfono / Móvil: 4316264
Correo: alcaldia@belendelosandaquies-caqueta.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	015	PAGO PARCIAL N01 DEL CONVENIO NO 098 2025 CON OBJETO AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS PARA REALIZAR MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN SECTORES CRITICOS DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE BELEN	NIU	1,00	$ 111.335.343,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 111.335.343,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
19/05/2026 17:22:20
Documento validado por la DIAN:
19/05/2026 17:22:21
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		111335343
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		111335343
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		111335343
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 111335343

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		111.335.343,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		111.335.343,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		111.335.343,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$111.335.343,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764101798364 Rango desde: 30 Rango hasta: 100 Vigencia: 2026-11-20

ALCALDÍA DE Belén DE LOS ANDAQUIES ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Aguas Andaki S.A.E.S.P. Nuestra agua... Nuestra Empresa

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 098-2025

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS PARA REALIZAR MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN SECTORES CRÍTICOS DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

ACTA PARCIAL No.1

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE : DEL 27 DE OCTUBRE DE 2025 AL 16 DE ABRIL DE 2026

CONTRATISTA	:	**AGUAS ANDAQUI S.A E.S.P**	VR. INICIAL DEL CONTRATO	:	$ 297,993,110	FECHA CONVENIO 098-2025:	20/10/2025
NIT Y/O C.C.	:	900.252.778-8	VR. ADICIONAL No.1	:	$ 144,654,006	FECHA DE INICIO:	27/10/2025
REP. LEGAL	:	INGRID ALEJANDRA CALDERON VILLEGAS	VR. TOTAL DEL CONTRATO	:	$ 442,647,116	FECHA DE TERMINACION INICIAL:	31/12/2025
NIT Y/O C.C.	:	1.117.487.679 de Florencia Caqueta	VR.ANTICIPO 50%	:	$ 221,323,558	FECHA DE SUSPENSION No.1:	31/12/2025
DIRECCIÓN	:	CARRERA 3 #5-45 Barrio Santa Teresa Belen de los Andaquies	VALOR ACTA PARCIAL NO 01	:		FECHA DE REINICIO No.1:	27/01/2026
TELÉFONO	:	3213005060	VALOR PRESENTE ACTA	:		FECHA DE OTRO SI No.1 (Prórroga):	27/01/2026
SUPERVISOR:	:	**JUAN MANUEL ESPINOSA FERLA**	AMORTIZACION PRESENTE ACTA	:		ADICION EN TIEMPO:	2 MESES
NIT Y/O C.C.	:	C.C. No.: 1.118.028.524 de El paujil Caqueta.	SALDO POR EJECUTAR	:	$ 442,647,116	FECHA DE OTRO SI No.3 (Prórroga):	27/03/2026
CARGO:		SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y ORDENAMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO	:	75.15%	ADICION EN TIEMPO:	3 MESES
			PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO	:	50.00%	FECHA DE TERMINACION SEGÚN OTRO SI No.3:	15/06/2026

En el municipio de BELEN DE LOS ANDAQUIES, a los 30 días del mes de abril del 2026, se reunieron **WILMAR BALLEN LOSADA**, como alcalde y representante legal del municipio de Belen de los Andaquies Caqueta, **INGRID ALEJANDRA CALDERON VILLEGAS** en representación de AGUAS ANDAKI S.A E.S.P y el secretario de planeacion municipal de Belen de los Andaquies, **JUAN MANUEL ESPINOSA FERLA** como supervisor y secretario de infraestructura y ordenamiento municipal, para dejar constancia por medio de la **ACTA PARCIAL No.1** del Convenio Interadministrativo No. 098-2025, según las condiciones que se detallan a continuación:

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						BALANCE DE MAYORES Y MENORES		OBRA EJECUTADA								
								ACTA PARCIAL No.1		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		SALDO POR EJECUTAR		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	CANT.	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT	VALOR ($)	CANT.	VALOR ($)	% EJEC
1	**PRELIMINARES**															
1.1	Demolicion manual de concretos existentes	M3	10.43	$200,084.00	$2,086,876.00	69.05	$ 13,815,800	69.05	$ 13,815,800	0.00	$ 0	69.05	$ 13,815,800	0.00	$ 0.00	100.00%
1.2	Corte de pavimento asfaltico con cortadora autopropulsada (incluye retiro)	ML	536.28	$6,821.00	$3,657,966.00	1,409.80	$ 9,616,246	712.80	$ 4,862,009	0.00	$ 0	712.80	$ 4,862,009	697.00	$ 4,754,237.00	50.56%
2	**MOVIMIENTOS DE TIERRA**															
2.1	Excavacion mecanica sin clasificar (incluye retiro)	M3	103.71	$45,673.00	$4,736,747.00	441.81	$ 20,178,788	370.43	$ 16,918,649	0.00	$ 0	370.43	$ 16,918,649	71.38	$ 3,260,138.74	83.84%
2.2	Relleno con material granular (incluye compactacion)	M3	56.69	$143,016.00	$8,107,577.00	173.38	$ 24,796,114	151.54	$ 21,672,645	0.00	$ 0	151.54	$ 21,672,645	21.84	$ 3,123,469.44	87.40%
2.3	Suministro de arena para base y atraque de tuberia	M3	0.45	$137,105.00	$61,697.00	1.38	$ 189,205	1.11	$ 152,187	0.00	$ 0	1.11	$ 152,187	0.27	$ 37,018.35	80.43%
2.4	Rellenos con material filtrante (incluye geotextil)	M3	1.12	$270,195.00	$302,618.00	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00	$ 0.00	0.00%
3	**SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS**															
3.1	Suministro e instalacion de tuberia corrugada Ø 12"	M3	56.19	$266,784.00	$14,990,592.96	46.00	$ 12,272,064	37.00	$ 9,871,008	0.00	$ 0	37.00	$ 9,871,008	9.00	$ 2,401,056.00	80.43%
3.2	Suministro e Instalacion de Dren Horizontal en tuberia PVC 4" perforada	ML	7.00	$115,928.00	$811,496.00	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00	$ 0.00	0.00%
4	**ESTRUCTURAS DE DRENAJE**															
4.1	Sumideros en concreto reforzado 3000PSI según diseño (incluye rejillas y acero) H< Ó = 1,1	UND	9.00	$ 4,039,052.00	$ 36,351,468	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00	$ 0.00	0.00%
4.2	Dilatadores en concreto 0,10*0,35 ml	ML	536.28	$ 96,963.00	$ 51,999,318	342.00	$ 33,161,346	122.00	$ 11,829,486	0.00	$ 0	122.00	$ 11,829,486	220.00	$ 21,331,860.00	35.67%
4.3	concretos para drenajes superficiales y manejo pluvial	M3	138.26	$ 767,533.00	$ 106,119,113	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00	$ 0.00	0.00%
4.4	concreto clase A (21 MPA) obras de drenaje	M3	0.00	$ 912,017.00	$ 0	207.50	$ 189,243,529	160.11	$ 146,023,042	0.00	$ 0	160.11	$ 146,023,042	47.39	$ 43,220,485.63	77.16%
4.5	Pañetes mortero 1:3 impermeabilizado E=2.5CM	m3	0.00	$ 552,020.00	$ 0	3.31	$ 1,827,189	1.01	$ 557,540	0.00	$ 0	1.01	$ 557,540	2.30	$ 1,269,646.00	30.51%
4.6	Acero de refuerzo 60000 PSI	ml	0.00	$ 10,226.00	$ 0	3,461.52	$ 35,397,504	2,952.19	$ 30,189,095	0.00	$ 30,189,095	2,952.19	$ 30,189,095	509.33	$ 5,208,408.58	85.29%
	COSTO DIRECTO TOTAL				**$ 229,225,469**		**$ 340,497,782**		**$ 255,891,462**		**$ 30,189,096**		**$ 255,891,462**		**$ 84,606,321**	
	ADMINISTRACION		27%	$ 61,890,877	27%	$ 91,934,401	27%	$ 69,090,695	27%	$ 8,151,056	27%	$ 69,090,695	27%	$ 22,843,707		
	IMPREVISTOS		3%	$ 6,876,764	3%	$ 10,214,933	3%	$ 7,676,744	3%	$ 905,673	3%	$ 7,676,744	3%	$ 2,538,190	75.15%	
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS		**AIU**	$ 68,767,641		$ 102,149,334		$ 76,767,439		$ 9,056,729		$ 76,767,439		$ 25,381,897		
VALOR TOTAL				**$ 297,993,110**		**$ 442,647,116**		**$ 332,658,901**		**$ 39,245,825**		**$ 332,658,901**		**$ 109,988,218**		

BALANCE PRESUPUESTAL

ITEM	DESCRIPCION	FECHA DE CORTE	VALOR FACTURADO	% A PAGAR	AMORTIZACION	SALDO POR AMORTIZAR	NETO A PAGAR	SALDO A PAGAR	% ACUMULADO
1	ACTA PARCIAL No.1	16/04/2026	$ 332,658,901.00	75.15%	$ 221,323,558.00	$ -	$ 111,335,343.00	$ 109,988,215.00	75.15%

VALOR NETO A PAGAR DEL ACTA DE CORTE No 1 : **TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVENCIENTOS UN PESOS M/CTE**

Nota: Los valores de las actividades descritas ejecutadas, son redondeadas al peso. Las memorias de cantidades de la presente acta se realizaron de acuerdo con lo ejecutado y con base a la visitas tecnicas realizadas y cambios sujetos a las necesidades descritas, y estas a su vez, son responsabilidad exclusiva del Contratista, interventor y supervisor.

V.B. SUPERVISOR

INGRID ALEJANDRA CALDERON VILLEGAS
1.117.487.679 de Florencia Caqueta
RL AGUAS ANDAKI S.A. E.S.P.
NIT 900.252.778-7

CONTRATISTA:

JUAN MANUEL ESPINOSA FERLA
C.C. No.: 1.118.028.524 de El paujil Caqueta.
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y ORDENAMIENTO

INTERVENTORIA:

WILMAR BALLEN LOSADA
ORDENADOR DEL GASTO
ALCALDE MUNICIPAL DE BELEN DE LOS ANDAQUIES

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No 01

CONTRATANTE	MUNICIPIO BELEN DE LOS ANDAQUIES	HOJA	1
CONTRATISTA	AGUAS ANDAKI S.A E.S.P		
		DE	1

FECHA	DD	30	MM	4	AA	2026	ACTA N°	1	ELABORÓ	ING. CARLOS FERNANDO TEJADA RAMIREZ

OBJETO DEL CONTRATO	"AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS PARA REALIZAR MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN SECTORES CRÍTICOS DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA"
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO°	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 098-2025

CAPÍTULO	ACTIVIDADES PRELIMINARES	ITEM	1.1	Demolicion manual de concretos existentes











UNID.	M3	SECTOR	MUNICIPIO BELEN DE LOS ANDAQUIES			
Localización	**Longitud (M)**	**Ancho (m)**	**Alto (m)**		**No Elem.**	**Medida Total**
CARRERA 5 ENTRE CALLE 5 A CALLE6						
RAMPA ACCESO TALLER	3.00	1.50	0.10		1	0.45
MUROS CUNETA EXISTENTE CONCEJO	30.2	0.1	0.2		1	0.60
PLACAS CUNETAS CONCEJO	30.2	0.1	0.1		1	0.30
MATERAS EXISTENTE	1.12	0.1	0.4		2	0.09
	1.06	0.1	0.4		1	0.04
	1.5	0.4	0.4		2	0.48
	1.85	0.1	0.4		2	0.15
CAJA SUMIDERO FRUBER	4.4	0.1	1		1	0.44
PLACA ISIMO	87.80	1.72	0.10		1.0	15.10
PLACA EXISTENTE LADO DERECHO	93.80	1.60	0.10		1.0	15.01
MUROS CUNETA LADO DERECHO FRUBER	32.00	0.15	0.60		2.0	5.76
Placa deteriorada cuneta	62.40	0.50	0.10		1.0	3.12
Muro lado Izquierdo	28.3	0.35	0.1		1	0.99
Placa muro izq	37.8	0.38	0.1		1	1.44
demolicion anden	6.25	1.13	0.1		1	0.71
desc- rampas-materas existentes	1.13	1.02	0.1		-8	-0.92
CALLE 5 ENTRE 5 Y CARRERA 7						
RAMPA 1 Izq	7.00	1.60	0.30		1.0	3.36
RAMPA 2 Izq	2.20	1.63	0.25		1.0	0.90
RAMPA 3 izq	1.62	0.70	0.20		1.0	0.23

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No 01

CONTRATANTE	MUNICIPIO BELEN DE LOS ANDAQUIES	**HOJA**	1
CONTRATISTA	AGUAS ANDAKI S.A E.S.P		
		DE	1

Nuestra agua... Nuestra Empresa

FECHA	**DD**	30	**MM**	4	**AA**	2026	**ACTA N°**	1	**ELABORÓ**	ING. CARLOS FERNANDO TEJADA RAMIREZ

OBJETO DEL CONTRATO	"AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS PARA REALIZAR MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN SECTORES CRÍTICOS DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA"
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO°	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 098-2025

CAPÍTULO	ACTIVIDADES PRELIMINARES	**ITEM**	1.1	Demolicion manual de concretos existentes	**UNID.**	M3	**SECTOR**	MUNICIPIO BELEN DE LOS ANDAQUIES			

Placas lado derecho	40.00	1.60	0.20		1.0	12.80
RAMPA DER HOTEL	1.10	0.64	0.10		1.0	0.07
caja esquina escuela izq	1.20	1.20	0.10		2.0	0.29
	0.80	1.20	0.10		2.0	0.19
cuneta existente	25.00	1.20	0.10		1.0	3.00
MATERA DERECHA	4.14	0.45	0.10		1.0	0.19
MATERAS EXISTENTE 1	5.38	0.50	0.20		2.0	1.08
MATERAS EXISTENTE 2	4.10	0.80	0.20		1.0	0.66
RAMPA 4 IZQ	1.50	1.00	0.10		1.0	0.15
RAMPA 5 IZQ	1.15	0.50	0.10		1.0	0.06
RAMPA 6 IZQ	1.56	1.13	0.10		1.0	0.18
RAMPA 7 IZQ	1.60	1.00	0.10		1.0	0.16
PISO IZQ	10.50	1.70	0.10		1.0	1.79
CARRERA 6 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 4						
LADO DER SUBIENDO						
Placa-Cuneta Izq	2.15	1.00	0.10		1.0	0.22
Subtotal						69.05
Vienen						
TOTAL						69.05

OBSERVACIONES:

Director de Obra:
Nombre: CARLOS FERNANDO TEJADA RAMIREZ
AGUAS ANDAKI S.A E.S.P
Contratista

Supervisor:
Nombre: JUAN MANUEL ESPINOSA FERLA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y ORDENAMIENTO
Supervisor

Representante Legal Contratista:
Nombre: INGRID ALEJANDRA CALDERON
AGUAS ANDAKI S.A E.S.P
Contratista

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No 01


CONTRATANTE	MUNICIPIO BELEN DE LOS ANDAQUIES	**HOJA**	1
CONTRATISTA	AGUAS ANDAKI S.A E.S.P		
		DE	1

FECHA	**DD**	30	**MM**	4	**AA**	2026	**ACTA N°**	1	**ELABORÓ**	AGUAS ANDAKI S.A E.S.P

OBJETO DEL CONTRATO	"AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS PARA REALIZAR MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN SECTORES CRÍTICOS DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA"
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO°	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 098-2025

CAPÍTULO	ACTIVIDADES PRELIMINARES	**ITEM**	1.2	Corte de pavimento aslfaltico con cortadora autopropulsada (incluye retiro)	**UNID.**	ML	**SECTOR**	MUNICIPIO BELEN DE LOS ANDAQUIES		



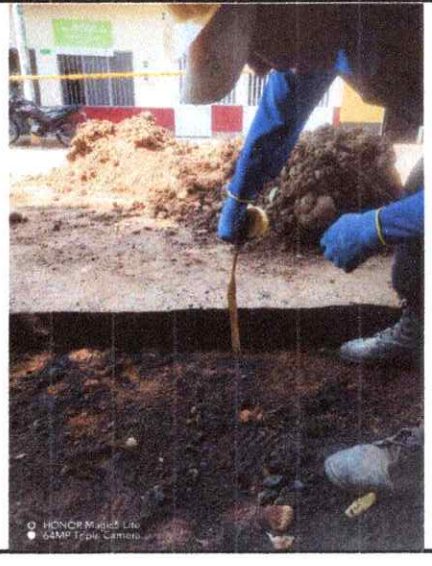

Localización	**Longitud (M)**	**Ancho (m)**	**Profun(m)**	**No Elem.**	**Medida Total**
CARRERA 5 ENTRE CALLE 5 A CALLE 7					
ENTRE CALLE 5-6	93.80			2.00	187.60
CALLE 5 ENTRE CALLE 5 A CALLE 7					
ENTRE CR5-6	103.40			2.00	206.80
ENTRE CR6-7	78.00			2.00	156.00
CARRERA 6 ENTRE CALLE 5 A CALLE 4					
ENTRE CR5-4	81.20			2.00	162.40
CARRERA 3 ENTRE CALLE 5 A CALLE 6					
ENTRE CR5-6	98.10			0.00	0.00
CARRERA 2 ENTRE CALLE 4 A CALLE 6					
ENTRE CR4-5	68.40			0.00	0.00
ENTRE CR5-6	89.00			0.00	0.00

OBSERVACIONES:

Subtotal	712.80
Vienen	
TOTAL	712.80

Director de Obra:
Nombre: CARLOS FERNANDO TEJADA RAMIREZ
AGUAS ANDAKI S.A E.S.P
Contratista

Supervisor:
Nombre: JUAN MANUEL ESPINOSA FERLA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y ORDENAMIENTO
Supervisor

Representante Legal Contratista:
Nombre: INGRID ALEJANDRA CALDERON
AGUAS ANDAKI S.A E.S.P
Contratista

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No 01

CONTRATANTE	MUNICIPIO BELEN DE LOS ANDAQUIES	**HOJA**	1
CONTRATISTA	AGUAS ANDAKI S.A E.S.P		
		DE	1

FECHA	**DD**	30	**MM**	4	**AA**	2026	**ACTA N°**	1	**ELABORÓ** AGUAS ANDAKI S.A E.S.P

OBJETO DEL CONTRATO	"AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS PARA REALIZAR MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN SECTORES CRÍTICOS DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA"
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO°	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 098-2025

CAPÍTULO	2 MOVIMIENTOS DE TIERRA	**ITEM**	2.1	Excavacion mecanica sin clasificar (incluye retiro)	**UNID.**	M3	**SECTOR** MUNICIPIO BELEN DE LOS ANDAQUIES











Localización	Longitud (M)	Ancho (m)	Espesor(m)	No Elem.	Medida Total
CARRERA 5 ENTRE CALLE 5 A CALLE 7					
Placa cuneta concejo	30.20	0.40	0.20	1.00	2.42
mejoramiento cunetas derecho	93.80	1.60	0.20	1.00	30.02
mejoramiento cunetas izq	93.80	1.72	0.20	1.00	32.27
Cuneta existen derecho demolido	62.40	0.60	0.20	1.00	7.49
caja colectora fruber	0.60	1.20	1.20	1.00	0.86
Caja colectora galeria	1.20	1.20	0.60	1.00	0.86
Dilatador	19.16	0.10	0.20	1.00	0.38
descuento	1.13	1.02	0.20	-8.00	-1.84
Cunetas tipo 3	**Longitud (M)**	**Seccion (m2)**		**No Elem.**	**Medida Total**
CALLE 5 ENTRE CALLE 5 A CALLE 7					
Costado izq	103.40	2.07	0.20	1.00	42.81
Costado der	96.00	2.10	0.20	1.00	40.32
Caja sumidero escuela	0.30	1.20	1.60	1.00	0.58
	1.50	1.20	0.60	1.00	1.08
Cuneta izq CR6-7	80.50	1.50	0.20	1.00	24.15
Cuneta Der CR6-7	30.00	2.20	0.20	1.00	13.20
Dilatador	53.00	0.10	0.15	1.00	0.80
BERMA DERECHA	53.00	1.80	0.10	1.00	9.54
Cunetas tipo 3	**Longitud (M)**	**Seccion (m2)**		**No Elem.**	**Medida Total**
CR6-7	80.50	0.12		1.00	9.58
CARRERA 6 ENTRE CALLE 5 A CALLE 4					
vivienda	81.20	2.17	0.20	1.00	81.20
Cunetas tipo 3	**Longitud (M)**	**Seccion (m2)**		**No Elem.**	**Medida Total**
costado izq.	81.20	0.12		1.00	9.66
CARRERA 3 ENTRE CALLE 5 A CALLE 6					


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No 01

CONTRATANTE	MUNICIPIO BELEN DE LOS ANDAQUIES	**HOJA**	1
CONTRATISTA	AGUAS ANDAKI S.A E.S.P	**DE**	1

FECHA	**DD**	30	**MM**	4	**AA**	2026	**ACTA N°**	1	**ELABORÓ**	AGUAS ANDAKI S.A E.S.P

OBJETO DEL CONTRATO	"AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS PARA REALIZAR MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN SECTORES CRÍTICOS DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA"
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO°	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 098-2025

CAPÍTULO	2 MOVIMIENTOS DE TIERRA	**ITEM**	2.1	Excavacion mecanica sin clasificar (incluye retiro)	**UNID.**	M3	**SECTOR**	MUNICIPIO BELEN DE LOS ANDAQUIES		

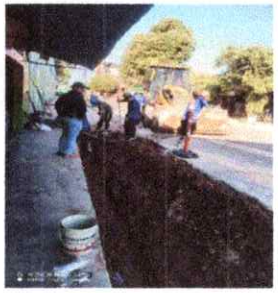





Dilatador costado izq	44.00	0.15	0.10	0.00	0.00
placa cuneta	20.00	1.70	0.20	0.00	0.00
placa cuneta empresa	20.00	1.90	0.20	0.00	0.00
Cunetas tipo 3	**Longitud (M)**	**Seccion (m2)**		**No Elem.**	**Medida Total**
costado der	35.00	0.12		0.00	0.00
costado der	12.00	0.12		0.00	0.00
CARRERA 2 ENTRE CALLE 4 A CALLE 6					
Cunetas tipo 3	**Longitud (M)**	**Seccion (m2)**		**No Elem.**	**Medida Total**
calle 4-5	70.00	0.12		0.00	0.00
calle 5-6	90.00	0.12		0.00	0.00
Localización	**Longitud (M)**	**Ancho (m)**	**Alto(m)**	**No Elem.**	**Medida Total**
TUB 12"	9.00	0.60	1.20	0.00	0.00
Caja Colectora	1.60	1.60	1.20	0.00	0.00
CALLE 6 ENTRE CALLE 1 A CALLE 2					
Localización	**Longitud (M)**	**Ancho (m)**	**Alto(m)**	**No Elem.**	**Medida Total**
Placa cuneta	83.20	0.70	0.30	2.00	34.94
Caja colectora	1.80	2.20	2.00	1.00	7.92
tuberia 12"	37.00	0.60	1.00	1.00	22.20
			Subtotal		370.43
			Vienen		
			TOTAL		370.43

OBSERVACIONES:

Director de Obra:
Nombre: CARLOS FERNANDO TEJADA RAMIREZ
AGUAS ANDAKI S.A E.S.P
Contratista

Supervisor:
Nombre: JUAN MANUEL ESPINOSA FERLA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y ORDENAMIENTO
Supervisor

Representante Legal Contratista:
Nombre: INGRID ALEJANDRA CALDERON
AGUAS ANDAKI S.A E.S.P
Contratista

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No 01

CONTRATANTE	MUNICIPIO BELEN DE LOS ANDAQUIES	**HOJA**	1
CONTRATISTA	AGUAS ANDAKI S.A E.S.P	**DE**	1

FECHA	**DD**	30	**MM**	4	**AA**	2026	**ACTA N°**	1	**ELABORÓ**	AGUAS ANDAKI S.A E.S.P

OBJETO DEL CONTRATO	"AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS PARA REALIZAR MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN SECTORES CRÍTICOS DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA"
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO°	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 098-2025

CAPÍTULO	2 MOVIMIENTOS DE TIERRA	**ITEM**	2.2	Relleno con material granular (incluye compactacion)








UNID.	M3	**SECTOR**	MUNICIPIO BELEN DE LOS ANDAQUIES		
Localización	**Longitud (M)**	**Ancho (m)**	**Espesor(m)**	**No Elem.**	**Medida Total**
CARRERA 5 ENTRE CALLE 5 A CALLE 7					
Placa cuneta concejo	30.20	0.40	0.10	1.00	1.21
mejoramiento cunetas derecho	93.80	1.60	0.10	1.00	15.01
mejoramiento cunetas izq	93.80	1.72	0.10	1.00	16.13
Cuneta existen derecho demolido	62.40	0.60	0.10	1.00	3.74
caja colectora fruber	0.10	1.20	1.20	1.00	0.14
Caja colectora galeria	1.20	1.20	0.10	1.00	0.14
descuento	1.13	1.02	0.20	-8.00	-1.84
CUNETA TIPO III CR 6 Y C7	93.00	0.60	0.10	0.00	0.00
CALLE 5 ENTRE CALLE 5 A CALLE 7					
Costado izq	103.40	2.07	0.10	1.00	21.40
Costado der	96.00	2.20	0.10	1.00	21.12
Caja sumidero escuela	0.10	1.20	1.60	1.00	0.19
	1.50	1.20	0.10	1.00	0.18
Cuneta izq CR6-7	78.00	1.90	0.10	1.00	14.82
Cuneta Der CR6-7	30.00	2.20	0.10	1.00	6.60
dilatador	53.00	0.10	0.10	1.00	0.53
CARRERA 6 ENTRE CALLE 5 A CALLE 4					
vivienda	81.20	2.17	0.20	1.00	35.24
CUNETA TIPO III DERECHA	81.20	0.60	0.10	1.00	4.87
CARRERA 3 ENTRE CALLE 5 A CALLE 6					
Dilatador costado izq	44.00	0.15	0.10	0.00	0.00
placa cuneta	20.00	1.70	0.10	0.00	0.00

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No 01

CONTRATANTE	MUNICIPIO BELEN DE LOS ANDAQUIES	HOJA	1
CONTRATISTA	AGUAS ANDAKI S.A E.S.P	DE	1

FECHA	DD	30	MM	4	AA	2026	ACTA N°	1	ELABORÓ	AGUAS ANDAKI S.A E.S.P

OBJETO DEL CONTRATO	"AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS PARA REALIZAR MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN SECTORES CRÍTICOS DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA"
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO°	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 098-2025

CAPÍTULO	2 MOVIMIENTOS DE TIERRA	ITEM	2.2	Relleno con material granular (incluye compactacion)	UNID.	M3	SECTOR	MUNICIPIO BELEN DE LOS ANDAQUIES		
					placa cuneta empresa	20.00	1.90	0.10	0.00	0.00
					CUNETA TIPO III DERECHA	47.00	0.60	0.10	0.00	0.00
					CALLE 6 ENTRE CALLE 1 A CALLE 2					
					Placa cuneta	83.20	0.70	0.10	2.00	11.65
					Caja colectroa	1.80	2.20	0.10	1.00	0.40
					Subtotal					151.54
					Vienen					
					TOTAL					151.54

OBSERVACIONES:

Director de Obra:
Nombre: CARLOS FERNANDO TEJADA RAMIREZ
AGUAS ANDAKI S.A E.S.P
Contratista

Supervisor:
Nombre: JUAN MANUEL ESPINOSA FERLA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y ORDENAMIENTO
Supervisor

Representante Legal Contratista:
Nombre: INGRID ALEJANDRA CALDERON
AGUAS ANDAKI S.A E.S.P
Contratista

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No 01

CONTRATANTE	MUNICIPIO BELEN DE LOS ANDAQUIES	**HOJA**	1
CONTRATISTA	AGUAS ANDAKI S.A E.S.P		
		DE	1

Nuestra agua.. Nuestra Empresa

FECHA	**DD**	30	**MM**	4	**AA**	2026	**ACTA N°**	1	**ELABORÓ**	AGUAS ANDAKI S.A E.S.P

OBJETO DEL CONTRATO	"AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS PARA REALIZAR MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN SECTORES CRÍTICOS DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA"
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO°	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 098-2025

CAPÍTULO	2 MOVIMIENTOS DE TIERRA	**ITEM**	2.3	Suministro de arena para base y atraque de tuberia	**UNID.**	M3	**SECTOR**	MUNICIPIO BELEN DE LOS ANDAQUIES





Localización	Longitud (M)	Ancho (m)	Espesor(m)	No Elem.	Medida Total
Calle 6 bomberos	37.00	0.60	0.05	1.0	1.11
Cr2 Tuberia 12"	9.00	0.60	0.05	0.0	0.00

OBSERVACIONES:

Subtotal	1.11
Vienen	
TOTAL	1.11

Director de Obra:
Nombre: CARLOS FERNANDO TEJADA RAMIREZ
AGUAS ANDAKI S.A E.S.P
Contratista

Supervisor:
Nombre: JUAN MANUEL ESPINOSA FERLA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y ORDENAMIENTO
Supervisor

Representante Legal Contratista:
Nombre: INGRID ALEJANDRA CALDERON
AGUAS ANDAKI S.A E.S.P
Contratista

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No 01

CONTRATANTE	MUNICIPIO BELEN DE LOS ANDAQUIES	**HOJA**	1
CONTRATISTA	AGUAS ANDAKI S.A E.S.P	**DE**	1

Nuestra agua... Nuestra Empresa

FECHA	**DD**	30	**MM**	4	**AA**	2026	**ACTA N°**	1	**ELABORÓ**	AGUAS ANDAKI S.A E.S.P

OBJETO DEL CONTRATO	"AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS PARA REALIZAR MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN SECTORES CRÍTICOS DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA"
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO°	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 098-2025

CAPÍTULO	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS	**ITEM**	3.1	Suministro e instalacion de tuberia corrugada Ø 12"







UNID.	ML	**SECTOR**	MUNICIPIO BELEN DE LOS ANDAQUIES		
Localización	**Longitud (M)**	**Ancho (m)**	**Espesor(m)**	**No Elem.**	**Medida Total**
Calle 6 bomberos	37.00			1.0	37.00
Carrera 2	9.00			0.0	0.00

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No 01


CONTRATANTE	MUNICIPIO BELEN DE LOS ANDAQUIES	HOJA	1
CONTRATISTA	AGUAS ANDAKI S.A E.S.P		
		DE	1


Nuestra agua... Nuestra Empresa.

FECHA	DD	30	MM	4	AA	2026	ACTA N°	1	ELABORÓ	AGUAS ANDAKI S.A E.S.P

OBJETO DEL CONTRATO	"AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS PARA REALIZAR MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN SECTORES CRÍTICOS DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA"
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO°	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 098-2025

CAPÍTULO	ESTRUCTURAS DE DRENAJE	ITEM	4.2	Dilatadores en concreto 0,10*0,35 ml	UNID.	ML	SECTOR	MUNICIPIO BELEN DE LOS ANDAQUIES

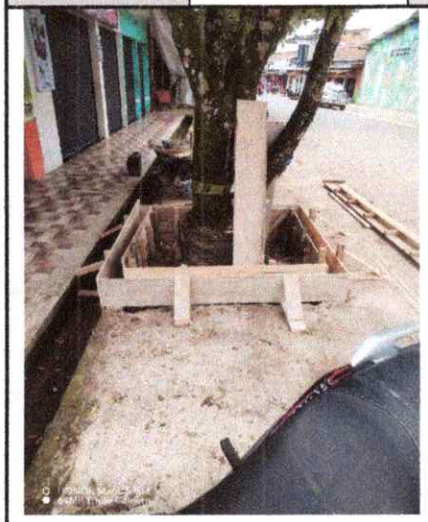

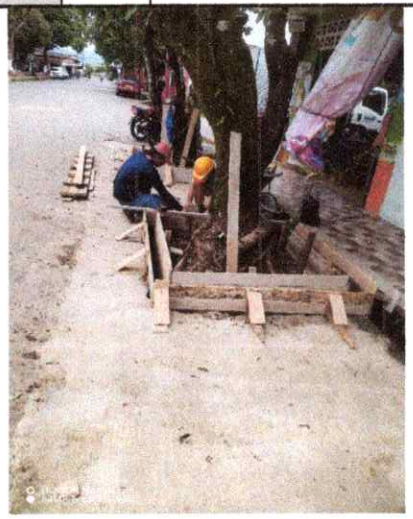

Localización	Longitud (M)	Ancho (m)	Altura(m)	Subtotal (m3)	No Elem.	Medida Total
CARRERA 5 ENTRE CALLE 5 - CALLE6						
costado izq	19.16				1.0	19.16
CARRERA 3 ENTRE CALLE 5 - CALLE6						
costado izq	44.00				0.0	0.00
CALLE 5 ENTRE CARRERA 5 A CR 7						
Costado derecho cr7	37.80				1.0	37.80
Materas	64.73				1.0	64.73
CARRERA 6 ENTRE CALLE 4 A CALLE 5						
MATERAS DER 2,30X2,60	9.80				0.0	0.00
MATERAS DER 1,40X1,20	5.20				0.0	0.00
CARRERA 2 ENTRE CALLE 4 A CALLE 5						
Costado derecho	55.00				0.0	0.00

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No 01


CONTRATANTE	MUNICIPIO BELEN DE LOS ANDAQUIES	HOJA	1
CONTRATISTA	AGUAS ANDAKI S.A E.S.P	DE	1

Nuestra agua... Nuestra Empresa.


FECHA	DD	30	MM	4	AA	2026	ACTA N°	1	ELABORÓ	AGUAS ANDAKI S.A E.S.P

OBJETO DEL CONTRATO	"AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS PARA REALIZAR MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN SECTORES CRÍTICOS DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA"
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO°	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 098-2025

CAPÍTULO	ESTRUCTURAS DE DRENAJE	ITEM	4.4	concreto clase A (21 MPA) obras de drenaje




SECCIÓN TIPO CUNETA EN CONCRETO
f'c = 3.000 PSI
ESPESOR = 0.10 m
TALUD = 2H : 1V



SECCION TIPO CUNETA EN CONCRETO
f'c = 3.000 PSI
ESPESOR = 0.10 m
PENDIENTE LONGITUDINAL = SEGUN RASANTE DE LA VIA


CUNETA EN CONCRETO




Cuneta triangular superficial en concreto **f'c = 21 MPa** (3000 psi)

- Ancho Superior: **0.60 m**
- Profundidad: **0.05 m**
- Taludes: **6 : 1**
- Espesor: **5 cm**
- Pendiente Longitudinal: **2%**


• Capacidad: **0.14 m³/s**



SECCION CAJA TIPO EN CONCRETO
f'c = 3.000 PSI
ESPESOR = 0.20 m



CORTE LONGITUDINAL CAJA TIPO EN CONCRETO
f'c = 3.000 PS
ESPESOR = 0.20 m



CORTE TRANSVERSAL CAJA TIPO EN CONCRETO
f'c = 3.000 PSI
ESPESOR = 0.20 m

UNID.	M3	SECTOR	MUNICIPIO BELEN DE LOS ANDAQUIES			
Sumideros	**Longitud (M)**	**Ancho (m)**	**Altura(m)**	**Vol 'm3**	**No Elem.**	**Medida Total**
SUMIDERO TIPO I CALLE 6	2.00	0.20	1.80	0.72	2.0	1.44
	1.40	0.20	1.80	0.50	2.0	1.01
	1.60	1.40	0.20	0.45	1.0	0.45
	1.80	1.80	0.10	0.32	1.0	0.32
SUMIDERO TIPO II CR 5 GALERIA	1.60	1.30	0.20	0.42	2.0	0.83
	1.20	1.30	0.20	0.31	2.0	0.62
	1.20	1.20	0.20	0.29	1.0	0.29
	1.40	1.60	0.10	0.22	1.0	0.22
SUMIDERO TIPO III CALLE 5 COLEGIO	1.90	1.80	0.20	0.68	2.0	1.37
	1.20	1.80	0.20	0.43	2.0	0.86
	1.50	1.20	0.20	0.36	1.0	0.36
	1.70	1.60	0.10	0.27	1.0	0.27
SUMIDERO TIPO IV CALLE 5 FRUVERT	2.00	1.40	0.20	0.56	2.0	1.12
	1.20	1.40	0.20	0.34	2.0	0.67
	1.20	1.60	0.20	0.38	1.0	0.38
	1.80	1.60	0.10	0.29	1.0	0.29

Cunetas	Longitud (M)	Ancho (m)	Altura(m)	m3	No Elem.	Medida Total
CARRERA 5 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 6						
LADO DEL CONCEJO	32	1.36	0.10	4.35	1.0	4.35
	17.6	1.68	0.10	2.96	1.0	2.96
	31.6	0.97	0.10	3.07	1.0	3.07
	14.20	0.93	0.10	1.32	1.0	1.32
LADO DEL ISIMO	14.65	2.13	0.10	3.12	1.0	3.12
	17.15	1.62	0.10	2.78	1.0	2.78
	33.90	1.71	0.10	5.80	1.0	5.80
	28.30	1.40	0.10	3.96	1.0	3.96
	6.65	1.42	0.10	0.94	1.0	0.94
MURO LADO CONCEJO	31.20	0.15	0.70	3.28	1.0	3.28
	14.20	0.15	0.70	1.49	2.0	2.98
PLACA CUNETA CAJON CONCEJO	62.40	0.60	0.10	3.74	1.0	3.74

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No 01


CONTRATANTE	MUNICIPIO BELEN DE LOS ANDAQUIES	HOJA	1
CONTRATISTA	AGUAS ANDAKI S.A E.S.P	DE	1

Nuestra agua... Nuestra Empresa.

FECHA	DD	30	MM	4	AA	2026	ACTA N°	1	ELABORÓ	AGUAS ANDAKI S.A E.S.P


OBJETO DEL CONTRATO	"AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS PARA REALIZAR MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN SECTORES CRÍTICOS DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA"
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO°	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 098-2025

CAPÍTULO	ESTRUCTURAS DE DRENAJE	ITEM	4.4	concreto clase A (21 MPA) obras de drenaje














UNID.	M3	SECTOR	MUNICIPIO BELEN DE LOS ANDAQUIES			
MURO LADO ISIMO	28.50	0.15	0.50	2.14	1.0	2.14
PLACA CUNETA CAJON CONCEJO	28.50	0.40	0.10	1.14	1.0	1.14
	9.50	0.38	0.10	0.36	1.0	0.36
RAMPA LADO CONCEJO	2.90	1.50	0.10	0.44	1.0	0.44
ANDEN LADO ISIMO	6.25	1.13	0.15	1.06	1.0	1.06
MATERAS, RAMPAS	1.13	1.02	0.10	0.12	-8.0	-0.92
CALLE 6 ENTRE CARRERA 1 Y CARRERA 2						
CALLE 6	82.3	0.5	0.1	4.12	2.0	8.23
BORDILLO	82.3	0.1	0.35	2.88	2.0	5.76
	82.3	0.1	0.27	2.22	2.0	2.22
CALLE 5 ENTRE CARRERA 5 Y CARRERA 6						
LADO IZQ	103.40	2.07	0.10	21.40	1.0	21.40
LADO DERECHO	96.00	2.10	0.10	20.16	1.0	20.16
RAMPA IZQ PADRE1	3.80	2.00	0.10	0.76	1.0	0.76
RAMPA IZQ PADRE1	2.50	2.00	0.10	0.50	2.0	1.00
MATERAS DILATADORES	1.20	1.40	0.10	0.17	-13.0	-2.18
CALLE 5 ENTRE CARRERA 6 Y CARRERA 7						
Cuneta Tipo III IZQ	80.50	0.60	0.10	4.83	1.0	4.83
Placa piso izq	80.50	1.50	0.10	12.08	1.0	12.08
Placa grada y berma derecha	55.30	1.80	0.10	9.95	1.0	9.95
Placa-Cuneta DER	25.20	2.20	0.10	5.54	1.0	5.54
RAMPA IZQ PROFE	1.56	1.13	0.10	0.18	1.0	0.18

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No 01


CONTRATANTE	MUNICIPIO BELEN DE LOS ANDAQUIES	HOJA	1
CONTRATISTA	AGUAS ANDAKI S.A E.S.P	DE	1


Nuestra agua... Nuestra Empresa


FECHA	DD	30	MM	4	AA	2026	ACTA N°	1	ELABORÓ	AGUAS ANDAKI S.A E.S.P

OBJETO DEL CONTRATO	"AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS PARA REALIZAR MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN SECTORES CRÍTICOS DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA"
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO°	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 098-2025

CAPÍTULO	ESTRUCTURAS DE DRENAJE	ITEM	4.4	concreto clase A (21 MPA) obras de drenaje	UNID.	M3	SECTOR	MUNICIPIO BELEN DE LOS ANDAQUIES			







RAMPA IZQ SRA ARBOL	1.05	1.00	0.10	0.11	1.0	0.11
RAMPA IZQ INDIO	1.15	0.50	0.10	0.06	1.0	0.06
RAMPA 1 IZQ TIGRE	1.60	1.00	0.10	0.16	1.0	0.16
CARRERA 6 ENTRE CALLE 4 Y CALLE 5						
LADO DER SUBIENDO						
Placa-Cuneta Izq	17.70	2.50	0.10	4.43	1.0	4.43
	16.50	2.50	0.10	4.13	1.0	4.13
	40.70	1.68	0.10	6.84	1.0	6.84
LADO IZQUIERDO						
	24.00	0.60	0.10	1.44	1.0	1.44

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL No 01

CONTRATANTE	MUNICIPIO BELEN DE LOS ANDAQUIES	**HOJA**	1
CONTRATISTA	AGUAS ANDAKI S.A E.S.P	**DE**	1

ALCALDÍA DE Belén DE LOS ANDAQUIES ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Aguas Andaki S.A E.S.P

Nuestra agua... Nuestra Empresa

FECHA	**DD**	30	**MM**	4	**AA**	2026	**ACTA N°**	1	**ELABORÓ**	AGUAS ANDAKI S.A E.S.P

OBJETO DEL CONTRATO	"AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS PARA REALIZAR MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN SECTORES CRÍTICOS DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA"
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO°	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 098-2025

CAPÍTULO	ESTRUCTURAS DE DRENAJE	**ITEM**	4,5	Pañetes mortero 1:3 impermeabilizado E=2.5CM





UNID.	M3	**SECTOR**	MUNICIPIO BELEN DE LOS ANDAQUIES		
Localización	**Longitud (M)**	**Ancho (m)**	**Espesor(m)**	**No Elem.**	**Medida Total**
Carrera 5	2.40	0.27	0.03	1.0	0.02
	29.50	0.43	0.03	1.0	0.31
	14.7	0.26	0.03	1.0	0.10
	5.5	0.19	0.03	1.0	0.03
	25.9	0.47	0.03	1.0	0.31
	28.3	0.35	0.03	1.0	0.25

Aguas Andaki S.A. E.S.P.

Nuestra agua... Nuestra Empresa.

Nit: 900.252.778-7

INFORME DE OBRA No.1

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.098-2025

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS PARA REALIZAR MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN SECTORES CRITICOS DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA.

MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES
ABRIL 2026

Belén De Los Andaquies – Caquetá
Carrera 3 no 5-48 Barrio Santa Teresa teléfono 3204756119
e-mail aguasandaki@yahoo.es

Contenido

INFORME DE OBRA 3
1.1 Introducción 3
1.2 Localización 5
1.3 Información Del Convenio 098-2025 6
1.4 Garantías Y Pólizas 8
2. INFORME TECNICO DE OBRA 10
2.1 CONDICIONES ACTUALIZADAS PROYECTADAS EN EJECUCION DE OBRAS 11
2.2 DESCRIPCION DE CADA ITEM EJECUTADO 12
3.0 INFORME ADMINISTRATIVO FINANCIERO 27
2.1 Contrataciones realizadas: 27
2.1.1 contratación de mano de Mano de obra: 27
2.1.2 Contratación de suministro de materiales de Ferretería: 28
2.1.3 Órdenes de pago 29
2.2 Análisis financiero 29
2.3 Soportes de aportes al régimen de seguridad social integral del personal relacionado 30
2.5 Relación de personal implementado en el periodo 30
2.6 Relación de equipo implementado en el periodo 30
2.7 Programado VS ejecutado 30
2.8 registro climático 32
2.9 bitácora 33
3. CALIDAD 33
3.1 Diseño de mezcla para concretos 33
3.2 Laboratorio de suelos y de concretos 33

INFORME DE OBRA

1.1 Introducción

En el marco del Convenio Interadministrativo No. 098-2025, cuyo objeto es "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para realizar el mejoramiento del sistema de alcantarillado pluvial en sectores críticos del área urbana del municipio de Belén de los Andaquíes, departamento del Caquetá", la empresa presenta el informe de obra correspondiente al periodo comprendido entre el 27 de octubre de 2025 y el 30 de abril de 2026.

El presente documento tiene como finalidad consolidar y proporcionar la información requerida por la administración municipal, detallando el avance de las actividades ejecutadas en cumplimiento del objeto contractual, de acuerdo con el cronograma de obra previamente aprobado.

La Administración Municipal de Belén de los Andaquíes y la Empresa de Servicios Públicos Aguas Andakí han adelantado el proyecto de mejoramiento de vías en el área urbana del municipio. Como complemento técnico indispensable para garantizar la durabilidad y funcionalidad de dichas intervenciones, se identificó la necesidad de implementar obras de drenaje pluvial, orientadas a optimizar el manejo de aguas lluvias, prolongar la vida útil de la infraestructura vial y mejorar las condiciones de habitabilidad y movilidad de la comunidad, así combinando una organización urbanística del sector y la funcionalidad de las redes existente.

El desarrollo del proyecto se fundamenta en la recolección, revisión y análisis de la información disponible, así como en la evaluación del comportamiento hidráulico del sistema de escorrentía superficial en los sectores intervenidos. Este análisis permitió determinar las condiciones actuales de operación del drenaje pluvial e identificar los tramos críticos objeto de intervención. Lo anterior permitió determinar las condiciones actuales de operación del drenaje pluvial, identificándose los siguientes tramos:

CARRERA 2 ENTRE CALLE 4 A CALLE 6
CARRERA 3 SUR ENTRE CALLE 5 A CALLE 6
CARRERA 5 ENTRE CALLE 5 A CALLE 7
CALLE 5 ENTRE CARRERA 5 A CARRERA 7
CARRERA 6 ENTRE CALLE 4 Y CALLE 5
CALLE 6 ENTRE CR 1 Y CR2

Tabla 1.1 – Descripción de tramos a intervenir

Posteriormente, la empresa de servicios Públicos AGUAS ANDAKI y la Alcaldía Municipal del Municipio Belén de los Andaquies, realizó un Convenio Interadministrativo con el fin de aunar esfuerzos para la ejecución de este proyecto considerando todas las exigencias técnicas, administrativas y financieras para realizar este tipo de convenio.

De acuerdo a las condiciones iniciales del proyecto, la meta física del mismo, consiste en el desarrollo de las siguientes actividades generalizadas, descritas en la tabla 1.1, donde se relacionan las actividades, cantidades y valores económicos, contractualmente acordados, como presupuesto inicial de obras:

N.º	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1 ACTIVIDADES PRELIMINARES					
1,1	Demolición manual de concretos existentes	M3	10,43	$200.084,00	$2.086.876,00
1,2	Corte de pavimento asfaltico con cortadora autopropulsada (incluye retiro)	M3	536,28	$6.821,00	$3.657.966,00
				Subtotal	**$5.744.842,00**
2 MOVIMIENTOS DE TIERRA					
2,1	Excavación mecánica sin clasificar (incluye retiro)	M3	103,71	$45.673,00	$4.736.747,00
2,2	Relleno con material granular (incluye compactación).	M3	56,69	$143.016,00	$8.107.577,00
2,3	Suministro de arena para base y atraque de tubería.	M3	0,45	$137.105,00	$61.697,00
2,4	Rellenos con material filtrante (incluye geotextil)	M3	1,12	$270.195,00	$302.618,00
				Subtotal	**$13.208.639,00**
3 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS					
3,1	Suministro e instalación de tubería corrugada Ø 12"	M3	56,19	$266.784,00	$14.990.593,00
3,2	Suministro e Instalación de Dren Horizontal en tubería PVC 4" perforada.	ML	7,00	$115.928,00	$811.496,00
				Subtotal	**$15.802.089,00**
4 ESTRUCTURAS DE DRENAJE					
4,1	Sumideros en concreto reforzado 3000PSI según diseño (incluye rejillas y acero) H< Ó = 1,1	UND	9,00	$4.039.052,00	$36.351.468,00

4,2	Dilatadores en concreto 0,10*0,35 ml	ML	536,28	$96.963,00	$51.999.318,00
4,3	concretos para drenajes superficiales y manejo pluvial	M3	138,26	$767.533,00	$106.119.113,00
				Subtotal	**$194.469.899,00**
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 229.225.469,00**
	ADMINISTRACION		A=	27%	$61.890.877,00
	IMPREVISTOS		I=	3%	$6.876.764,00
	COSTO INDIRECTO A.I. (30%)				**$68.767.641,00**
	VALOR TOTAL				**$ 297.993.110,00**

Tabla 1.2 – Descripción de meta física inicialmente proyectada de ejecución

De acuerdo a la supervisión ejercida por la administración y en entendimiento a los diseños entregados por la Empresa; acogiendo todas las recomendaciones de la supervisión, se ha realizado cumpliendo con la ejecución de las actividades como lo explican en las Especificaciones Técnicas.

Este informe presenta de forma simple y concisa el avance en la ejecución de las obras contenidas en este contrato.

1.2 Localización



Imagen N° 1. Municipio belén de los andaquies Caquetá, en el entorno
Fuente: Portal de internet GOOGLE EARTH

1.3 Información Del Convenio 098-2025

Clase de contrato:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
No. de convenio:	098-2025
Fecha de celebración:	20 de octubre de 2025
Contratista:	AGUAS ANDAKI S.A E.S.P
NIT o C.C:	900.252.778-7
Representante Legal:	INGRID ALEJANDRA CALDERON VILLEGAS
C.C	1.117.487.679 de Florencia
Objeto:	"AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS PARA REALIZAR MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN SECTORES CRITICOS DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA."
Plazo Inicial:	Hasta el 31 de diciembre del 2025.
Fecha de inicio	27 de octubre de 2025
Fecha de terminación Inicial	31 de diciembre de 2025
Fecha De Suspensión No.1:	31 de diciembre de 2025
Fecha De Reinicio No.1:	27 de enero de 2026
Fecha De Otro SÍ No.1 (Prórroga):	27 de enero de 2026
Tiempo de Adición Según Prórroga:	2 meses
Fecha De Otro Sí No.3 (Prórroga):	27 de marzo de 2026
Tiempo de Adición Según Prórroga:	3 meses
Fecha De Terminación Según Otro Si No.3:	25 de junio de 2026
Valor inicial:	TRESCIENTOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO DIEZ PESOS M/C($305,993,110.00). M/CTE

Adicional:	CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEIS PESOS M/CTE. ($144.654.006,00) M/CTE
Valor total:	CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO DIECISÉIS PESOS ($450.647.116,00) M/CTE.
Forma de pago:	Un primer desembolso por concepto de aporte anticipado equivalente al CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor total aportado por el municipio. Desembolsos parciales hasta completar el NOVENTA POR CIENTO (90%) del valor total de los aportes del municipio al cumplimiento de las obligaciones del convenio. El pago estará sujeto a la entrega del informe con sus respectivos soportes, factura o su documento equivalente, por parte de la empresa de servicios públicos, entrada y salida de almacén si a ello hubiera lugar y la certificación de cumplimiento del supervisor. Un último pago por valor del DIEZ POR CIENTO (10%) restante a la entrega final de las obras y suscripción del acta de liquidación del convenio. Los pagos se realizarán dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la radicación en hacienda. Para cada pago el contratista deberá acreditar el pago a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, durante el plazo de ejecución del contrato, cuando a ello haya lugar.
Supervisor:	JUAN MANUEL ESPINOSA FERLA

Tabla No 1.3 – Relación actos administrativos.

1.4 Garantías Y Pólizas

PÓLIZA INICIALES

GARANTIAS	NOMBRE DE ASEGURADORA	No POLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	COMPAÑÍA SEGUROS MUNDIAL	CHU-100060215	20/10/2025	30/06/2026	$30.599.311.00
PAGO ANTICIPADO			20/10/2025	05/05/2026	$148.996.555
PRESTACIONES SOCIALES			20/10/2025	31/12/2028	$15.299.655,50
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA			31/12/2025	31/12/2030	$ 61.198.622,00
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL	COMPAÑÍA SEGUROS MUNDIAL	CHU-100011357	20/10/2025	31/12/2025	$ 284.700.000,00

PÓLIZA ACTUALIZADA ACTA DE INICIO ANEXO 2

GARANTIAS	NOMBRE DE ASEGURADORA	No POLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	COMPAÑÍA SEGUROS MUNDIAL	CHU-100060215	27/10/2025	07/07/2026	$30.599.311.00
PAGO ANTICIPADO			27/10/2025	07/07/2026	$148.996.555
PRESTACIONES SOCIALES			27/10/2025	07/01/2029	$15.299.655,50
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA			07/01/2026	07/01/2031	$ 61.198.622,00
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL	COMPAÑÍA SEGUROS MUNDIAL	CHU-100011357	27/10/2025	07/01/2026	$ 284.700.000,00

PÓLIZA ACTUALIZADA SEGUN REINICIO No. 1 ANEXO 3

GARANTIAS	NOMBRE DE ASEGURADORA	No POLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	COMPAÑÍA SEGUROS MUNDIAL	CHU-100060215	31/12/2025	03/08/2026	$30.599.311.00
PAGO ANTICIPADO			31/12/2025	03/08/2026	$148.996.555
PRESTACIONES SOCIALES			31/12/2025	03/02/2029	$15.299.655,50

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA			3/02/2026	03/02/2031	$ 61.198.622,00
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL	COMPAÑÍA SEGUROS MUNDIAL	CHU-100011357	27/10/2025	03/02/2026	$ 284.700.000,00

PÓLIZA ACTUALIZADA SEGÚN ACTA OTRO SI No. 1 ANEXO 4

GARANTIAS	NOMBRE DE ASEGURADORA	No POLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	COMPAÑÍA SEGUROS MUNDIAL	CHU-100060215	27/01/2026	03/10/2026	$30.599.311.00
PAGO ANTICIPADO			27/01/2026	03/10/2026	$148.996.555
PRESTACIONES SOCIALES			27/01/2026	03/04/2029	$15.299.655,50
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA			03/04/2026	03/04/2031	$ 61.198.622,00
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL	COMPAÑÍA SEGUROS MUNDIAL	CHU-100011357	27/10/2025	03/04/2026	$ 284.700.000,00

PÓLIZA ACTUALIZADA SEGÚN ACTA OTRO SI No. 3 ANEXO 5

GARANTIAS	NOMBRE DE ASEGURADORA	No POLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	COMPAÑÍA SEGUROS MUNDIAL	CHU-100060215	27/03/2026	03/11/2026	$45.064.711,60
PAGO ANTICIPADO			27/03/2026	03/11/2026	$219.432.613,28
PRESTACIONES SOCIALES			27/03/2026	28/03/2029	$22.532.355,80
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA			28/05/2026	08/05/2031	$ 90.129.423,30
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL	COMPAÑÍA SEGUROS MUNDIAL	CHU-100011357	27/10/2025	03/04/2026	$ 450.647.116,00

Tabla No 1.4 – Relación Garantías según modificaciones.

2. INFORME TECNICO DE OBRA

En cumplimiento de las obligaciones derivadas del Convenio interadministrativo 098-2025, cuyo objeto corresponde a "*aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para realizar el mejoramiento del sistema de alcantarillado pluvial en sectores críticos del área urbana del municipio de Belén de los Andaquíes, departamento del Caquetá*", se presenta el informe de avance de obra correspondiente al periodo desde el 27 de octubre de 2025 al 31 de diciembre de 2025 y del 27 de enero del 2026 al 30 de marzo del 2026, en la cual desde la suscripción del acta de inicio del 27 de octubre de 2025 se iniciaron los procesos administrativos de solicitud de desembolso del pago anticipado, incorporación de los recursos a disponibilidades presupuestales de la empresa y la contratación respectiva para el desarrollo de las actividades de obra, contratos enmarcados dentro de conformidad de la suscripción dando por iniciado las actividades hasta el día 12 de diciembre de 2025 con la contratación de mano de obra a la empresa AMARA INGENEIRIA S.A.S y la contratación del suministro de materiales de ferretería a CAREN LOPEZ, y alquiler de equipos acorde a lo estipulado en las actividades a desarrollar.

Durante el desarrollo de las actividades constructivas, específicamente en las labores de demolición, excavación y corte del perfil vial en los sectores correspondientes a la Carrera 5 y Calle 5 del área urbana, se identificaron condiciones no previstas en la fase inicial del proyecto, tales como la presencia de estructuras hidráulicas existentes no registradas, deterioro estructural en canalizaciones y variaciones en las condiciones geométricas y de pendiente del terreno.

En atención a lo anterior, la empresa ejecutora AMARA S.A.S, en el marco de sus obligaciones contractuales, presentó ante AGUAS ANDAKI S.A. E.S.P y ante la administración municipal, durante el comité de obra realizado el día 16 de febrero de 2026, la solicitud de incorporación de ítems no previstos y el reconocimiento del balance de mayores y menores cantidades de obra, derivados principalmente del incremento en actividades relacionadas con la ejecución de concreto estructural, suministro e instalación de acero de refuerzo y aplicación de pañete impermeabilizado en mortero 1:3. Sobre las necesidades eventualmente planteadas desde la administración y la incursión de la comunidad sobre las problemáticas adyacentes a las intervenciones realizadas a la fecha.

Dicha solicitud fue aprobada por la entidad contratante, permitiendo la incorporación de las nuevas actividades y el ajuste de las cantidades de obra, con lo cual se

garantizó la continuidad técnica y adecuada ejecución del proyecto conforme a las condiciones reales identificadas en campo.

En consecuencia, se ha dado continuidad al desarrollo normal de las actividades constructivas en los siguientes tramos intervenidos: calle 6 entre carrera 1 y 2, carrera 5 entre calle 5 y 6, calle 5 entre carrera 5 y 7, carrera 2 entre calle 4 y calle 6 y carrera 6 entre calle 4 y 5, manteniendo el cumplimiento de las especificaciones técnicas, los lineamientos constructivos y los objetivos establecidos en el contrato.
El presente informe tiene como finalidad exponer el estado de ejecución de las actividades desarrolladas durante el periodo reportado, evidenciando el avance físico de la obra, el cumplimiento de las obligaciones contractuales, las condiciones técnicas de ejecución y las situaciones que han incidido en el desarrollo normal del proyecto.

2.1 CONDICIONES ACTUALIZADAS PROYECTADAS EN EJECUCION DE OBRAS

Según comité de obra No. 01 realizado el 13 de febrero del 2026 donde la empresa le solicita a la administración de belén de los andaquies la aprobación de ítems no previstos y/o balance de mayores cantidades de obra, en el marco de la ejecución del Convenio Interadministrativo No. 098-2025, argumentando la necesidad técnica identificada durante el desarrollo de las actividades constructivas de obras de drenaje necesarias para el buen funcionamiento del alcantarillado pluvial, la conducción de aguas superficiales y canalización a sectores de evacuación. En consecuencia, el comité técnico recomienda la revisión y viabilidad técnica de los nuevos ítems y sus respectivos Análisis de Precios Unitarios (APU) presentados por el contratista, con el fin de continuar con el trámite administrativo correspondiente para la modificación contractual que permitió mayorar el alcance físico inicial del proyecto.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COSTO UNITARIO APROBADO (No incluye AI)
INP.1	concreto clase A (21 MPA) obras de drenaje	M3	$ 912.017,00
INP.2	Pañetes mortero 1:3 impermeabilizado E=2.5CM	M2	$ 552.020,00
INP. 3	Acero de refuerzo 60000 PSI	KG	$ 10.226,00

Tabla 1 .5 – Nuevos ítems aprobados.

Luego de ser presentado todo lo solicitado y analizado por la supervisión fue aprobado la adición necesaria para el desarrollo total del proyecto.

V/R INICIAL CONTRATO	$ 297.993.110,00	**% ANTICIPO**	50,00%
V/R ADICIONES	$ 144.654.006,00	**$ ANTICIPO**	$ 148.996.555,00
VR CANTIDADES MAYORES	$ 359.337.561,00	**% FACTURADO**	0,00%
VR CANTIDADES MENORES	-$ 214.683.555,00	**VALOR FACTURADO**	$ 0,00
VR BALANCEADO CANT. MAYOR - CANTID MENOR	**$ 144.654.006,00**	**SALDO DEL CONTRATO**	$ 293.650.561,00
V/R ACTUAL CONTRATO	$ 442.647.116,00		

Tabla 1.6 – Relación de balance de mayores y menores.

2.2 descripción de cada ítem ejecutado

2.2.1 Demolición manual de concretos existentes

Esta actividad corresponde a la demolición manual de estructuras en concreto existentes ubicadas en las áreas de intervención del proyecto, la cual se ejecuta como fase previa a la construcción de las obras de drenaje pluvial, específicamente cunetas y demás elementos hidráulicos proyectados.

Durante la ejecución de esta actividad, se ha evidenciado la presencia de espesores variables de concreto, lo cual indica la inexistencia de uniformidad en las estructuras previamente construidas, requiriendo un manejo técnico diferenciado en cada frente de trabajo para garantizar una remoción adecuada sin afectar las áreas adyacentes. Las labores de demolición han comprendido principalmente la intervención de andenes, rampas y otras estructuras en concreto que invaden el espacio público, las cuales interfieren directamente con el trazado y desarrollo de las cunetas diseñadas dentro del proyecto. Estas estructuras, en muchos casos, no cumplen con alineamientos ni niveles definidos, afectando las condiciones hidráulicas necesarias para el correcto funcionamiento del sistema de drenaje pluvial.


La demolición se ha realizado de manera manual, empleando herramientas menores, con el fin de ejercer un mayor control sobre las áreas intervenidas, minimizar afectaciones a redes existentes no identificadas previamente y preservar la estabilidad de las zonas contiguas. Asimismo, se ha garantizado la disposición adecuada del material resultante conforme a las normas ambientales y técnicas aplicables. La actividad fue ejecutada en los siguientes tramos del área urbana intervenida:

TRAMO	CAPITULO	M3
CARRERA 5 ENTRE CL 5 Y CL 6	ACTIVIDADES PRELIMINARES	43.76
CALLE 5 ENTRE CR 5 Y CR 7	ACTIVIDADES PRELIMINARES	25.08
CARRERA 6 ENTRE CLL4 Y CLL5	ACTIVIDADES PRELIMINARES	0.22


Aguas Andaki S.A. E.S.P.

Nuestra agua... Nuestra Empresa.


Nit: 900.252.778-7

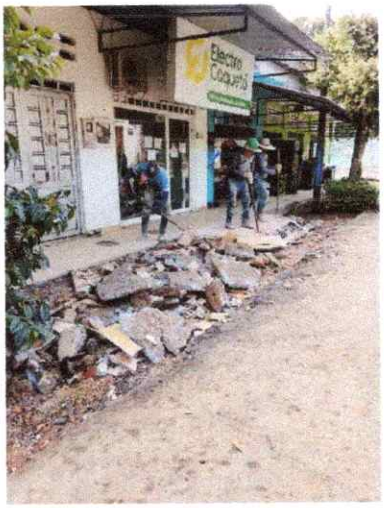



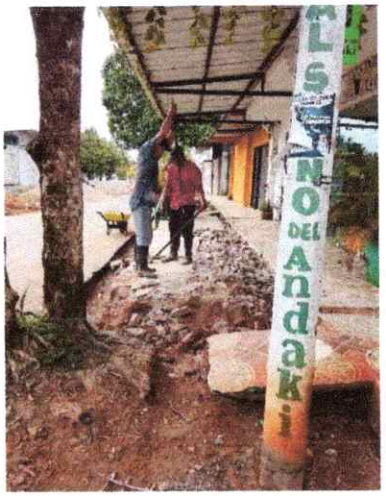



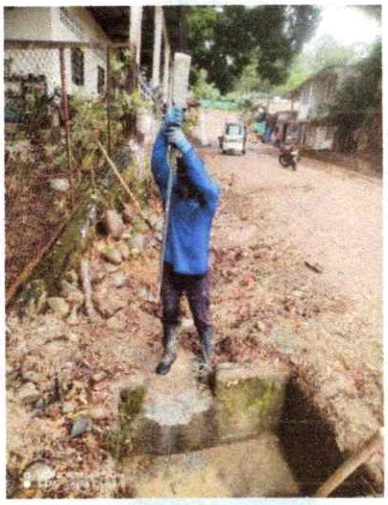







Belén De Los Andaquies – Caquetá
Carrera 3 no 5-48 Barrio Santa Teresa teléfono 3204756119
e-mail aguasandaki@yahoo.es

2.2.2 Corte de pavimento asfáltico con cortadora autopropulsada (incluye retiro).

Esta actividad corresponde al corte controlado del pavimento asfáltico existente en las zonas de intervención, como fase previa a las labores de demolición y excavación requeridas para la construcción de las cunetas y demás obras del sistema de drenaje pluvial.

El corte se ejecuta mediante cortadora de asfalto, garantizando precisión en los límites de intervención, bordes uniformes y adecuada alineación conforme a los diseños técnicos. Previamente se realiza la delimitación de las áreas a intervenir, asegurando correspondencia con los ejes y pendientes del proyecto.

Incluye el retiro del material asfáltico generado, el cual es cargado, transportado y dispuesto en sitios autorizados, manteniendo condiciones de orden, limpieza y cumplimiento ambiental en obra.

La actividad se ejecutó bajo condiciones de seguridad industrial y señalización preventiva, minimizando riesgos en los frentes de trabajo.
La ejecución se llevó a cabo en los siguientes tramos:

TRAMO	CAPITULO	ML
CARRERA 5 ENTRE CL 5 Y CL 7	ACTIVIDADES PRELIMINARES	187.60
CALLE 5 ENTRE CR 5 Y CR 7	ACTIVIDADES PRELIMINARES	362.80
CARRERA 6 ENTRE CL 4 Y CL 5	ACTIVIDADES PRELIMINARES	162.40







2.2.3 Excavación mecánica sin clasificar (incluye retiro).

Esta actividad corresponde a la excavación mecánica del material existente en las áreas de intervención, sin clasificación previa del tipo de suelo, ejecutada con el fin de conformar las secciones requeridas para la construcción de las cunetas y demás estructuras del sistema de drenaje pluvial.

La excavación se realiza mediante el uso de maquinaria amarilla, principalmente retroexcavadora, permitiendo alcanzar las profundidades, anchos y pendientes definidas en los diseños técnicos. Durante su ejecución, se han considerado las condiciones reales del terreno, incluyendo variaciones en la consistencia del suelo, presencia de material heterogéneo y posibles interferencias no identificadas previamente.

El proceso incluye el retiro del material producto de la excavación, el cual es cargado y transportado mediante volqueta hacia sitios autorizados o zonas definidas por la supervisión, garantizando el manejo adecuado del material y manteniendo condiciones de orden y limpieza en los frentes de trabajo.

Asimismo, se ha procurado mantener el control de niveles y alineamientos durante la excavación, con el fin de asegurar la correcta conformación de la subrasante sobre la cual se ejecutarán las estructuras proyectadas, evitando sobrexcavaciones o afectaciones a las áreas contiguas.

La actividad se ejecutó bajo condiciones de seguridad industrial, con señalización preventiva y control operativo de la maquinaria en los frentes de obra.

La ejecución de esta actividad se llevó a cabo en los siguientes tramos:

TRAMO	CAPITULO	M3
CARRERA 5 ENTRE CL 5 Y CL 6	MOVIMIENTOS DE TIERRA	72.45
CALLE 5 ENTRE CR 5 Y CR 7	MOVIMIENTOS DE TIERRA	142.05
CARRERA 6 ENTRE CL 4 Y CL 5	MOVIMIENTOS DE TIERRA	90.86
CALLE 6 ENTRE CR 1 Y CR 2	MOVIMIENTOS DE TIERRA	65.07


FIN DE
OBRA











2.2.4 Relleno con material granular (incluye compactación)
Se desarrollo en la colocación y compactación de material granular seleccionado en las áreas a intervenir, tales como cunetas y placas, garantizando condiciones adecuadas de estabilidad, drenaje y soporte.


El material se dispone en capas horizontales con un espesor promedio de 10 cm, lo que permite un adecuado control del proceso de compactación. Cada capa es ajustada en humedad y compactada con equipos mecánicos, asegurando el cumplimiento del grado de densidad requerido y evitando asentamientos futuros.

Finalmente, se verifican niveles, pendientes y cotas conforme a diseño, dejando la superficie en condiciones óptimas para la ejecución de las actividades posteriores.

La ejecución de esta actividad se llevó a cabo en los siguientes tramos:

TRAMO	CAPITULO	M3
CARRERA 5 ENTRE CL 5 Y CL 6	MOVIMIENTOS DE TIERRA	34.54
CALLE 5 ENTRE CR 5 Y CR 7	MOVIMIENTOS DE TIERRA	64.85
CARRERA 6 ENTRE CL 4 Y CL 5	MOVIMIENTOS DE TIERRA	40.11
CALLE 6 ENTRE CR 1 Y CR 2	MOVIMIENTOS DE TIERRA	12.04



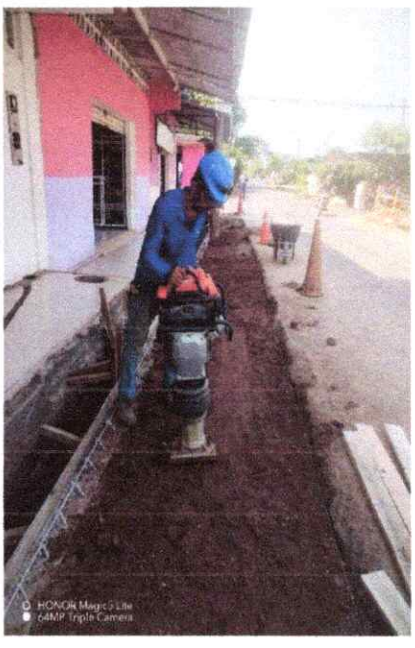







2.2.5 Suministro de arena para base y atraque de tubería.
Consiste en el suministro de arena para la conformación de la base y el atraque de tubería de 12", garantizando condiciones adecuadas de soporte, nivelación y protección.

Se utilizó material limpio, con características adecuadas que permiten una correcta distribución de cargas. La arena se dispuso en la base y laterales de la tubería, realizándose su compactación manual de forma controlada, asegurando el adecuado confinamiento y estabilidad conforme a las especificaciones técnicas. La ejecución de esta actividad se llevó a cabo en el siguiente tramo:

TRAMO	CAPITULO	M3
CALLE 6 ENTRE CR 1 Y CR 2	MOVIMIENTOS DE TIERRA	1.11





2.2.6 Suministro e instalación de tubería corrugada Ø 12"
Consiste en el suministro e instalación de tubería corrugada de 12" de diámetro para alcantarillado, utilizada para conectar las dos cajas existentes en la calle 6 entre carreras 1 y 2, permitiendo la conducción y recolección de aguas pluviales de este tramo vial.

La tubería cumple con las especificaciones técnicas requeridas y se instala sobre una base previamente conformada, verificando alineación, pendiente y niveles conforme a diseño.

Posteriormente, se realiza el atraque lateral con material adecuado, asegurando su confinamiento y evitando desplazamientos o deformaciones.

Finalmente, se verifica la correcta instalación, garantizando la continuidad del sistema y su adecuado funcionamiento hidráulico. La ejecución de esta actividad se llevó a cabo en el siguiente tramo:

TRAMO	CAPITULO	ML
CALLE 6 ENTRE CR 1 Y CR 2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA	37.00






2.2.7 Dilatadores en concreto 0,10*0,35 ml

Se realizo en la construcción de dilatadores en concreto con dimensiones de 0,10 m de espesor por 0,35 m de altura, implementados en áreas intervenidas, con el fin de controlar esfuerzos por retracción y variaciones térmicas.

Estos elementos se han dispuesto en materas de los árboles existentes en las vías, permitiendo la confinación del material y la integración con la infraestructura construida; igualmente, se emplean como elementos de contención lateral tipo borde o sardinel, que actúan como barrera para el control del escurrimiento superficial de aguas lluvias, evitando su ingreso hacia las viviendas colindantes.

La actividad incluye la localización, conformación y vaciado del concreto, garantizando alineación, continuidad y adecuado acabado, conforme a las especificaciones técnicas establecidas. La ejecución de esta actividad se llevó a cabo en los siguientes tramos:

TRAMO	CAPITULO	ML
CARRERA 5 ENTRE CL 5 Y CL 6	ESTRUCTURAS DE DRENAJE	19.16
CALLE 5 ENTRE CR 5 Y CR 7	ESTRUCTURAS DE DRENAJE	102.53

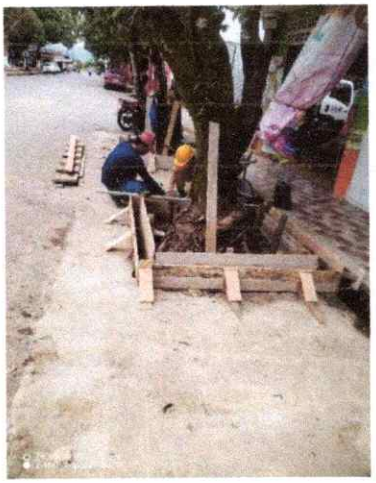








2.2.8 Concreto clase A (21 MPA) obras de drenaje.

Consiste en el suministro, preparación, transporte y colocación de concreto clase A con resistencia de 21 MPa, utilizado en las áreas intervenidas para la construcción de obras de drenaje como cunetas, cajas, sumideros, dilatadores y sardineles, entre otros elementos asociados al manejo de aguas lluvias.

El concreto empleado cumple con las especificaciones técnicas requeridas, garantizando resistencia, durabilidad y adecuado comportamiento en servicio. Su colocación se realiza en elementos previamente conformados, asegurando niveles, alineación y pendientes conforme a diseño.

La actividad incluye el vibrado, acabado y curado del concreto, garantizando la calidad de la obra, evitando fisuras y asegurando su adecuado desempeño estructural e hidráulico. La ejecución de esta actividad se llevó a cabo en los siguientes tramos:

TRAMO	CAPITULO	M3
CARRERA 5 ENTRE CL 5 Y CL 6	ESTRUCTURAS DE DRENAJE	46.93
CALLE 5 ENTRE CR 5 Y CR 7	ESTRUCTURAS DE DRENAJE	76.90
CALLE 6 ENTRE CR 1 Y CR 2	ESTRUCTURAS DE DRENAJE	19.45
CARRERA 6 ENTRE CL 4 Y CL 5	ESTRUCTURAS DE DRENAJE	16.83







Belén De Los Andaquies – Caquetá
Carrera 3 no 5-48 Barrio Santa Teresa teléfono 3204756119
e-mail aguasandaki@yahoo.es

2.2.9 Pañetes mortero 1:3 impermeabilizado E=2.5CM

Estaba actividad se desarrolló con la aplicación de pañete en mortero en proporción 1:3, con espesor de 2.5 cm, sobre superficies de las obras de drenaje en las áreas intervenidas, con el fin de proporcionar acabado uniforme, protección e impermeabilidad, sobre los sectores de andenes mejorando su presentación.

El mortero utilizado incorpora aditivo impermeabilizante y se aplica sobre superficies previamente limpias y humedecidas, garantizando adecuada adherencia. La colocación se realiza de manera uniforme, asegurando espesores, niveles y acabados conforme a las especificaciones técnicas.

Finalmente, se efectúa el curado del pañete, garantizando su durabilidad, evitando fisuración y asegurando la protección de las estructuras frente a la acción del agua. La ejecución de esta actividad se llevó a cabo en el siguiente tramo:

TRAMO	CAPITULO	M3
CARRERA 5 ENTRE CL 5 Y CL 6	ESTRUCTURAS DE DRENAJE	1.01






2.2.10 Acero de refuerzo 60000 PSI

Consiste en el suministro, corte, figurado y colocación de acero de refuerzo con resistencia de 60.000 PSI, así como la instalación de malla electrosoldada, utilizados en las áreas intervenidas para la construcción de cunetas, pozos, dilatadores y placa cunetas, garantizando el adecuado comportamiento estructural de los elementos.


El acero y la malla se disponen conforme a planos y especificaciones técnicas, asegurando recubrimientos, traslapos y correcta fijación, siendo unidos mediante amarres con alambre para garantizar su estabilidad durante el vaciado del concreto. Previo a esta actividad, se verifica su alineación y espaciamiento.

La actividad garantiza la resistencia, estabilidad y durabilidad de las estructuras, asegurando su adecuado desempeño frente a cargas y condiciones de servicio. La ejecución de esta actividad se llevó a cabo en los siguientes tramos:

TRAMO	CAPITULO	KG
CARRERA 5 ENTRE CL 5 Y CL 6	ESTRUCTURAS DE DRENAJE	1168.08
CALLE 5 ENTRE CR 5 Y CR 7	ESTRUCTURAS DE DRENAJE	862.35
CALLE 6 ENTRE CR 1 Y CR 2	ESTRUCTURAS DE DRENAJE	601.49
CARRERA 6 ENTRE CL4 Y CL5	ESTRUCTURAS DE DRENAJE	320.26



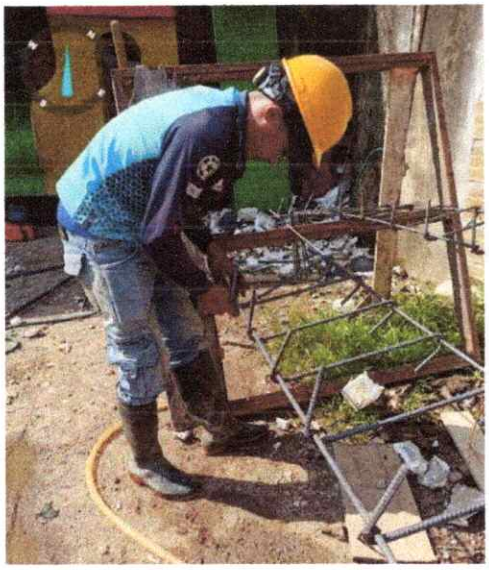


62° NE
Contrato CPS 004 AMARA SAS









3.0 INFORME ADMINISTRATIVO FINANCIERO

En cumplimiento de las obligaciones derivadas del Convenio interadministrativo 098-2025, cuyo objeto corresponde a "*aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para realizar el mejoramiento del sistema de alcantarillado pluvial en sectores críticos del área urbana del municipio de Belén de los Andaquíes*" Se realizo la siguiente contratación respectiva:

2.1 Contrataciones realizadas:

2.1.1 contratación de mano de Mano de obra:

Clase de contrato:	MANO DE OBRA
No. de contrato:	CPS-004
Fecha de celebración:	05 de DICIEMBRE de 2025
Contratista:	AMARA INGENIERIA S.A.S
NIT o C.C:	901541459-6
Representante Legal:	CARLOS FERNANDO TEJADA RAMIREZ
C.C	1.088.294.814 de Pereira.
Objeto:	" CONTRATO DE MANO DE OBRA CALIFICADA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 098-2025. CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS PARA REALIZAR MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN SECTORESCRÍTICOS DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA."
Plazo:	UN (01) MES APARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
Fecha de inicio	12 DE DICIEMBRE DE 2025
Fecha de terminación Inicial	31 DE DICIEMBRE DE 2025
Fecha De Suspensión No.1:	31 DE DICIEMBRE DE 2025
Fecha De Reinicio No.1:	27 DE ENERO DE 2026

Fecha De Otro Sí No.1 (Prórroga):	27 DE ENERO DE 2026
Tiempo de Adición Según Prórroga:	2 MESES
Fecha De Otro Sí No.3 (Prórroga):	27 DE MARZO DE 2026
Tiempo de Adición Según Prórroga:	3 MESES
Fecha De Terminación Según Otro Si No.3:	25 DE JUNIO DE 2026
Cuantía:	NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA MILCUATROCIENTOS CUARENTA YSEIS PESOS($ 98.180.446) M/CTE
Supervisor:	INGRID ALEJANDRA CALDERON

2.1.2 Contratación de suministro de materiales de Ferretería:

Clase de contrato:	Suministro
No. de contrato:	CS-003
Fecha de celebración:	05 de DICIEMBRE de 2025
Contratista:	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CASALUG
NIT o C.C:	1.039.088.795-8
Representante Legal:	CAREN LOPEZ RAMOS
C.C	1.039.088.795
Objeto:	" SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL MARCO DEL CONVENIO 098-2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BELEN Y AGUAS ANDAKI."
Plazo:	UN (01) MES APARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
Fecha de inicio	12 DE DICIEMBRE DE 2025
Fecha de terminación Inicial	31 DE DICIEMBRE DE 2025
Fecha De Suspensión No.1:	31 DE DICIEMBRE DE 2025
Fecha De Reinicio No.1:	27 DE ENERO DE 2026
Fecha De Otro Sí No.1 (Prórroga):	27 DE ENERO DE 2026

Tiempo de Adición Según Prórroga:	2 MESES
Fecha De Otro Sí No.3 (Prórroga):	27 DE MARZO DE 2026
Tiempo de Adición Según Prórroga:	3 MESES
Fecha De Terminación Según Otro Si No.3:	25 DE JUNIO DE 2026
Cuantía:	CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS ($ 142.139.746,00) MCTE.
Supervisor:	INGRID ALEJANDRA CALDERON

2.1.3 Órdenes de pago

Se realizaron las respectivas órdenes de pago de:

- Pago diseños de Mezclas a la empresa CPS INGENIERIA ESTUDIOS Y DISEÑOS S.A.S, factura CSP 320 Valor de $714.000.
- Orden de alquiler de equipos de Obra $ 6.650.000
- Anticipo contrato CPS-004 mano de obra con AMARA INGENERIA S.A. por el Valor de $ 49.090.223.
- Pago Suministro de materiales de ferretería al Contrato No. CPS-003 CASALUG por un valor de $ 127.706.990.

2.2 Análisis financiero

CONCEPTO	VALOR	VALOR	PORCENTAJE (%)
Valor aporte Municipio	$ 297.993.110		
Pago Anticipado inicial		$ 148.996.555	50.00%
ADICION OTRO SI No3	$ 144.654.006		
Pago anticipado Otro Si No.3		$ 72.327.003	50.00%
Sumas Iguales	**$ 442.647.116**	**$ 221.323.558**	**50.00%**

2.3 Soportes de aportes al régimen de seguridad social integral del personal relacionado

Son anexados los soportes de aportes al régimen de seguridad social integral, en ejecución del Convenio 098-2025.

2.5 Relación de personal implementado en el periodo

El personal que viene participando activamente en campo, en la ejecución del Convenio 098- 2025, corresponde a:

- Representante Legal;
- Ing. director
- Ing. residente.
- Profesional Siso
- Maestro de obra.
- Secretaria.
- Almacenista
- obreros

2.6 Relación de equipo implementado en el periodo


El equipo disponible y que viene siendo utilizado en la ejecución del Convenio 098-2025, corresponden equipos de obra menores y mayores disponibles, así:


- Retroexcavadora de llanta
- (1) Volqueta sencilla
- (2) Mezcladoras de concreto
- (1) Vibradores de concreto.
- (2) Planta eléctricas
- Herramienta de mano.

2.7 Programado VS ejecutado

En cumplimiento de las obligaciones derivadas del Convenio interadministrativo 098-2025, cuyo objeto corresponde a *"aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para realizar el mejoramiento del sistema de alcantarillado pluvial en*

sectores críticos del área urbana del municipio de Belén de los Andaquíes" se relaciona los avances obtenidos hasta la fecha:

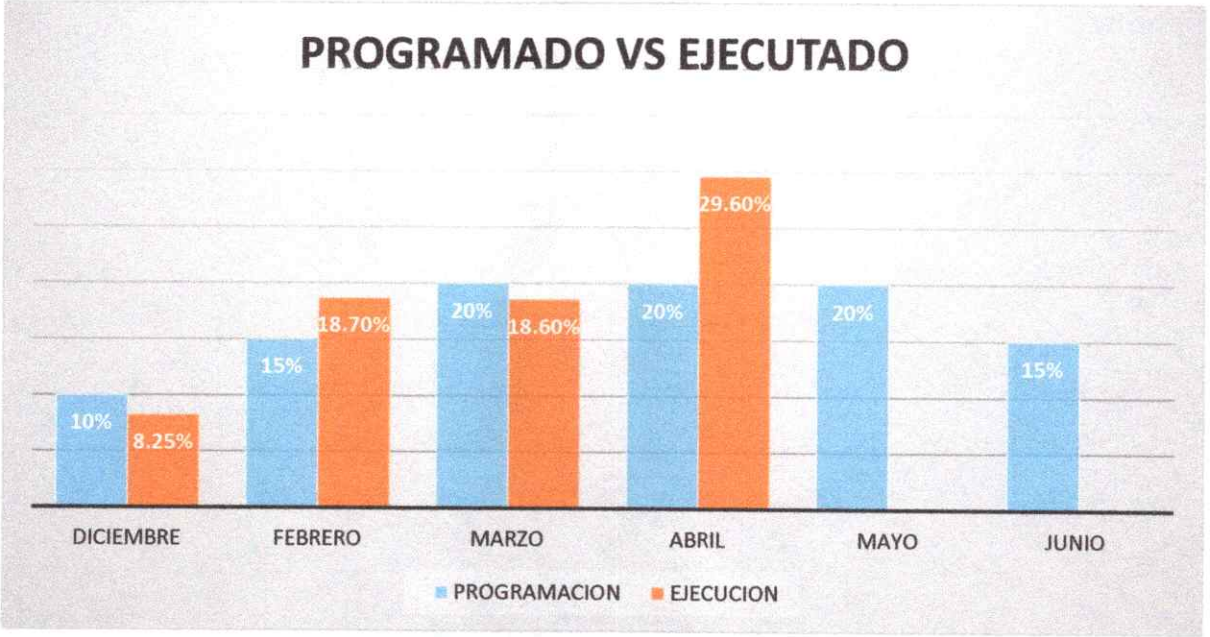


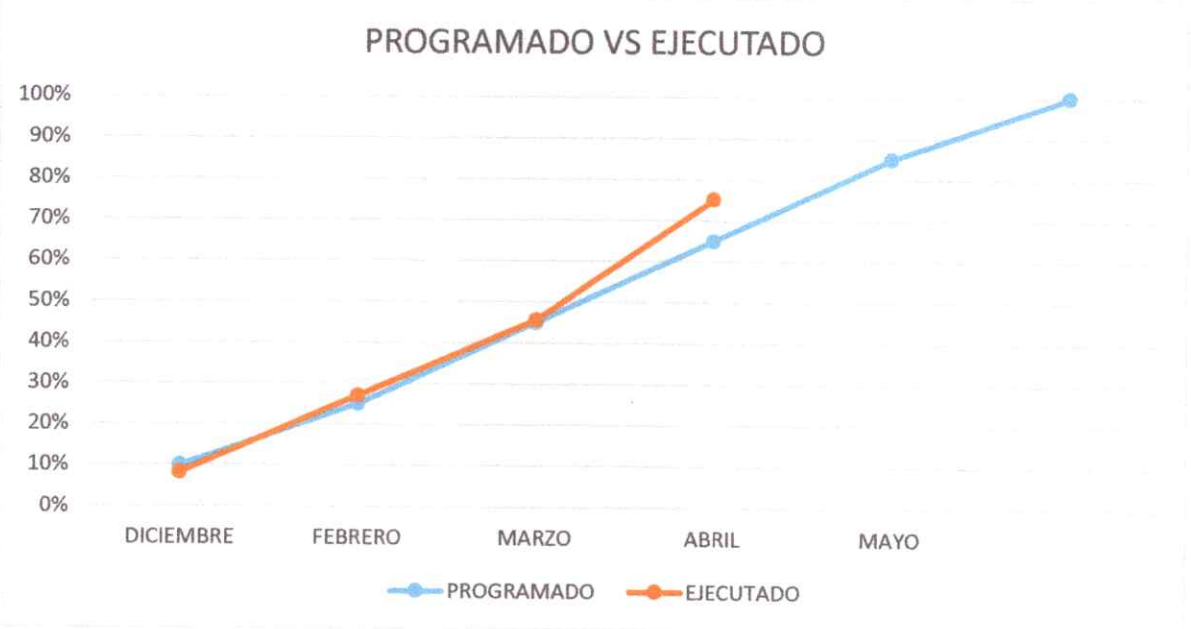


AVANCE DE OBRA EJECUTADO	PORCENTAJE (%)
INFORME PARCIAL No.1	75.15%
TOTAL AVANCE	75.15%

2.8 registro climático


Esta es una temporada el clima ha sido muy variante contando con fuertes oleadas invernal en la gran mayoria del desarrollo de las actividads con fuertes vientos y lluvias constante y días con altas temperaturas. Se anexa registro climático que corresponde al periodo mencionado desde diciembre de 2025 a abril de 2026.

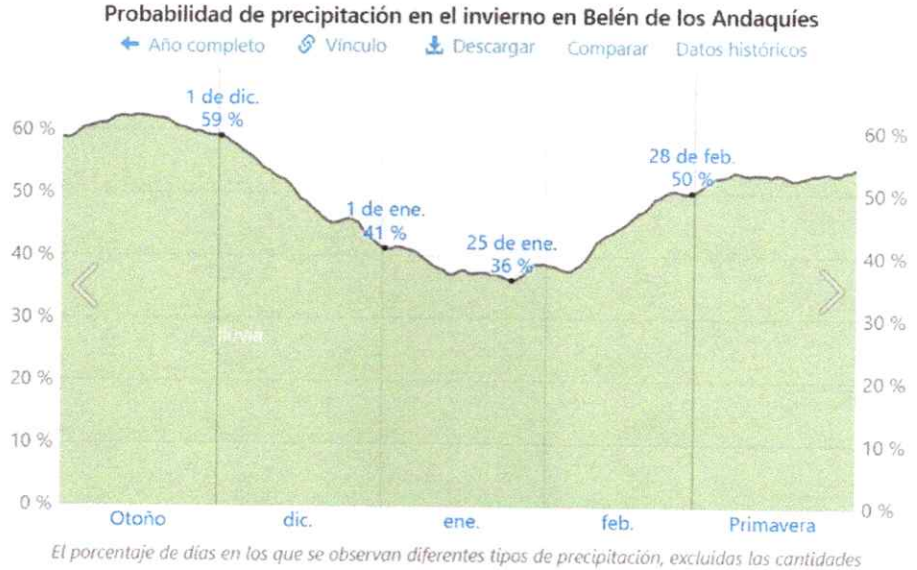

El porcentaje de días en los que se observan diferentes tipos de precipitación, excluidas las cantidades ínfimas: solo lluvia, solo nieve, mezcla (llovió y nevó el mismo día).

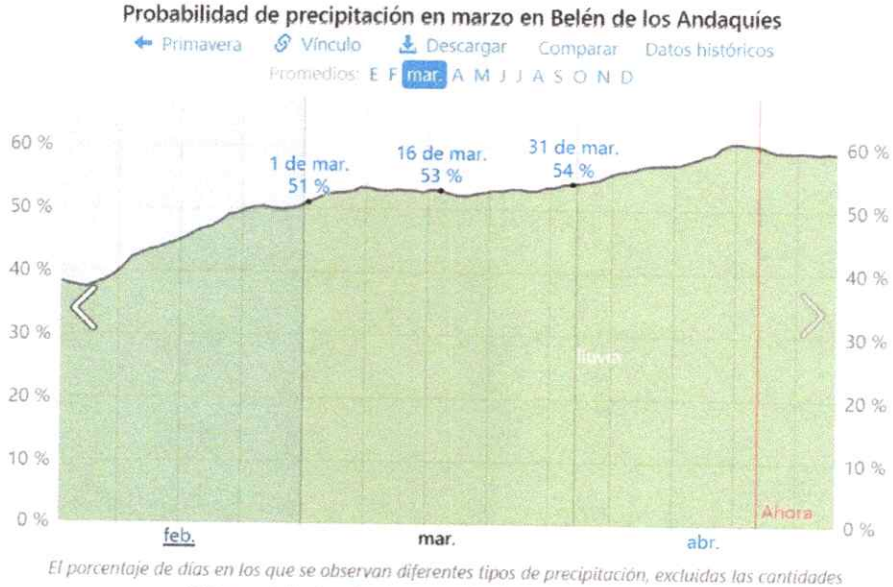

El porcentaje de días en los que se observan diferentes tipos de precipitación, excluidas las cantidades ínfimas: solo lluvia, solo nieve, mezcla (llovió y nevó el mismo día).

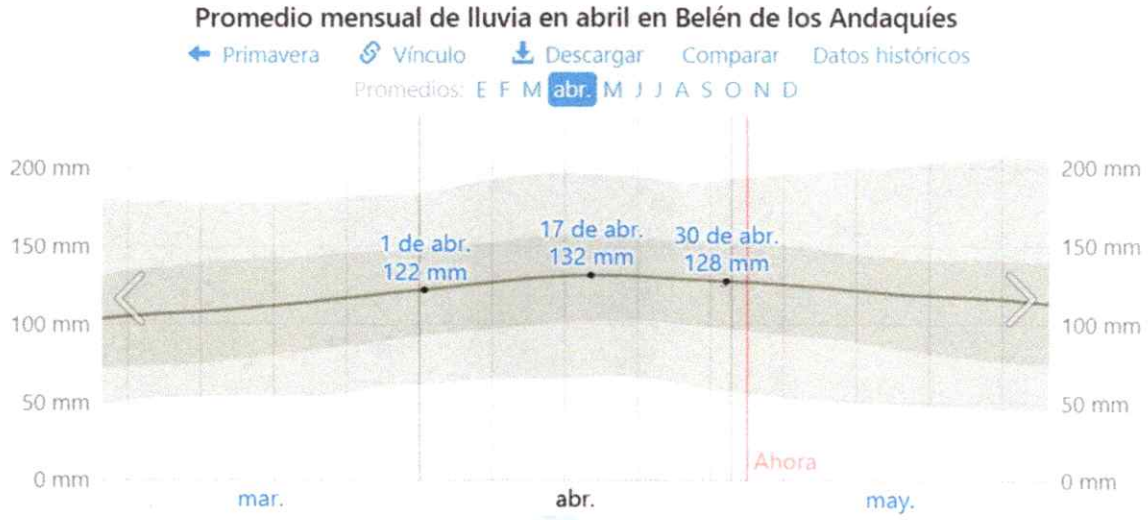

2.9 bitácora

En obra se encuentran la bitácora con la información de la obra que se aporta diariamente y la cual está firmada por los director, representante y residente de obra (Se anexa copia de las bitácoras del periodo del corte).

3. CALIDAD

3.1 Diseño de mezcla para concretos

Es presentado anexo, el diseño de mezcla para la fabricación de los concretos de resistencia prevista de 3.000 PSI

3.2 Laboratorio de suelos y de concretos

En la medida de avance de ejecución de obra física, fueron tomadas las muestras correspondientes, que permitan dar seguimiento y control de calidad de los productos, resistencia de concretos, entre otros.

Elaboró:

CARLOS FERNANDO TEJADA RAMIREZ
Director de Obra.

ICONTEC ES MIEMBRO DE

IQNET

icontec

ISO 9001

ICONTEC Certifica que el Sistema de Gestión de la organización:
ICONTEC certifies that the Organization's Management System of:

PVC GERFOR S.A.S

Autopista Medellín Kilómetro 2;600 metros entrada Vía Parcelas, Cota, Cundinamarca, Colombia
Véase las actividades cubiertas por el sistema de gestión para cada una de las sedes permanentes diferentes a la sede principal en el anexo

ha sido auditado y aprobado con respecto a los requisitos especificados en:
has been audited and approved based on the specified requirements of:

ISO 9001:2015

Este Certificado es aplicable al siguiente alcance:
This certificate is applicable to the following scope:

Desarrollo, fabricación y comercialización de: Tubería y accesorios de PVC, grifería plástica y metálica de uso doméstico. Fabricación y comercialización de: Tuberías y accesorios de CPVC, cubiertas en PVC y cemento solvente de PVC.

Development, manufacturing and commercialization of: PVC pipes and fittings, home use plastic and metallic plumbing supplies. Manufacturing and commercialization of: CPVC pipes and fittings, PVC covers and PVC solvent cement.

Esta aprobación está sujeta a que el sistema de gestión se mantenga de acuerdo con los requisitos especificados, lo cual será verificado por ICONTEC
This approval is subject to the maintenance of the management system according to the specified requirements, which will be verified by ICONTEC

Certificado: SC156-1
Certificate:

Fecha de Otorgamiento:	1998-12-16
Fecha de Vencimiento del Ciclo Previo:	2024-09-20
Fecha de Inicio del ciclo actual de certificación:	2024-09-21
Fecha de Vencimiento ciclo actual:	2027-09-20
Fecha de Auditoria de Recertificación:	2024-05-22
Fecha de Revisión:	2024-07-10

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo - CEO

icontec

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17021-1:2015
09-CSG-001

MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT IAF

Este certificado es propiedad de ICONTEC ubicado en la calle 26N°69-76 Edificio Elemento, torre 4 pisos 9 y 10 Bogotá D.C. Colombia

IQNET

Building trust together.

Certificate

ICONTEC has issued an IQNet recognized certificate that the **organization**

PVC GERFOR S.A.S

Autopista Medellín Kilómetro 2;600 metros entrada Vía Parcelas, Cota, Cundinamarca, Colombia
Véase las actividades cubiertas por el sistema de gestión para cada una de las sedes permanentes diferentes a la sede principal en el anexo
has implemented and maintains a

Quality Management System

for the following scope:

Desarrollo, fabricación y comercialización de: Tubería y accesorios de PVC, grifería plástica y metálica de uso doméstico. Fabricación y comercialización de: Tuberías y accesorios de CPVC, cubiertas en PVC y cemento solvente de PVC.

Development, manufacturing and commercialization of: PVC pipes and fittings, home use plastic and metallic plumbing supplies. Manufacturing and commercialization of: CPVC pipes and fittings, PVC covers and PVC solvent cement.

which fulfils the requirements of the following standard

ISO 9001:2015

Issued on: 2024-07-10
First Issued on: 1998-12-16
Expires on: 2027-09-20

Registration Number: CO - SC156-1

Alex Stoichitoiu
President of IQNET

Roberto Enrique Montoya Villa
CEO of ICONTEC

icontec

This attestation is directly linked to the IQNET Member's original certificate and shall not be used as a stand-alone document

IQNET Members*:
AENOR Spain **AFNOR Certification** France **APCER** Portugal **CCC** Cyprus **CISQ** Italy **CQC** China **CQM** China **CQS** Czech Republic **Cro Cert** Croatia **DQS Holding GmbH** Germany **EAGLE Certification Group** USA **FCAV** Brazil **FONDONORMA** Venezuela **ICONTEC** Colombia **ICS** Bosnia and Herzegovina **INTECO** Costa Rica **IRAM** Argentina **JQA** Japan **KFQ** Korea **LSQA** Uruguay **MIRTEC** Greece **MSZT** Hungary **Nemko AS** Norway **NSAI** Ireland **NYCE** México **PCBC** Poland **Quality Austria** Austria **SII** Israel **SIQ** Slovenia **SIRIM QAS International** Malaysia **SQS** Switzerland **SRAC** Romania **TSE** Türkiye **YUQS** Serbia

* The list of IQNET Members is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com

REPORTE DE ENSAYOS

DIACO S.A.
Carretera Central del Norte Km 27, Tuta, Colombia.
C.P - 150408 Tel/Fax: 7426350

N°: 10008131690462

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PEDIDO DEL CLIENTE	ESPECIFICACIÓN	PESO (Kg)
CYRGO FLORENCIA	9007764718/22	8000027118	11143320/000020	NTC 2289	18.000

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	COMPOSICION QUIMICA (%) Ensayo según método ASTM E415											
				C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
110000162	BAR COR NTC 2289 3/8'' 6m 1	1727165201	GR 60	0,28	0,91	0,010	0,028	0,21	0,27	0,11	0,08	0,03	0,004	0,004	0,45
110000162	BAR COR NTC 2289 3/8'' 6m 2	1727326201	GR 60	0,28	0,88	0,013	0,030	0,23	0,24	0,10	0,15	0,04	0,001	0,003	0,45
110000162	BAR COR NTC 2289 3/8'' 6m 3	1727328201	GR 60	0,27	0,87	0,017	0,014	0,18	0,30	0,09	0,24	0,04	0,002	0,003	0,45
110000162	BAR COR NTC 2289 3/8'' 6m 4	1727329501	GR 60	0,27	0,85	0,015	0,039	0,22	0,25	0,12	0,11	0,03	0,002	0,003	0,43
Rangos de referencia según norma				máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,550

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	PROPIEDADES MECÁNICAS Ensayo según método NTC3353						CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS				
				R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espaci	Altura	Separa	Ángulo	
110000162	BAR COR NTC 2289 3/8'' 6m	1727165201	3	458	610	1,33	17,8	0,560	OK	6,40	0,70	2,40	62	
110000162	BAR COR NTC 2289 3/8'' 6m	1727326201	3	471	620	1,32	15,7	0,542	OK	6,50	0,61	2,46	62	
110000162	BAR COR NTC 2289 3/8'' 6m	1727328201	3	471	625	1,33	16,6	0,545	OK	6,40	0,63	2,33	63	
110000162	BAR COR NTC 2289 3/8'' 6m	1727329501	3	470	595	1,27	17,2	0,548	OK	6,50	0,61	2,24	63	
Rangos de referencia según norma				420,0 - 540,0 MPa	mín 550,0 MPa	mín 1,250	mín 14,00%	mín 0,526 kg/m		máx 6,70 mm	mín 0,38 mm	máx 3,60 mm	mín 45,0 deg	

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

1= 1=29
2= 1=29
3= 1=29
4= ☑☑☑= 4470

RESPONSABLE DE CALIDAD

TUTA, 10.02.2026

PAOLA KATHERIN MATEUS

C.S.P. ESTUDIOS Y DISEÑOS S.A.S.	LABORATORIO DE CONCRETOS, SUELOS Y PAVIMENTOS Ensayos físicos, químicos y mecánicos de materiales	CODIGO	C.S.P. - ING. - 006
		VERSIÓN	01
		FECHA	8-nov.-2018
		PAGINA	1 DE 2

DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO ESTRUCTURAL
3000PSI

CLIENTE : Empresa de servicios publicos aguas andaqui S.A ESP de Belen de los andaquies — **PR INICIAL:** N/A — **ACTIVIDAD:** Concreto Estructural

PROYECTO: Optimizacion de alcantarillado de aguas lluvias en el municipio de Belen de los Andaquies — **PR FINAL:** N/A — **LOTE:** N/A

DESCRIPCIÓN: — **LADO:** N/A — **REGISTRO :** C001-0126

PROCEDENCIA : Triturado tamaño maximo 1", nominal 3/4" y Material mixto tamaño maximo 3/4" — **FECHA:** 10-dic.-25 — **RESIS. [psi]** 3000

MATERIALES

PARÁMETRO	Triturado	MIXTO
Modulo de Finura	-	4.7
Tamaño Maximo	1 "	3/4"
Tamaño Maximo nominal	3/4"	1/2"
Peso Especifico Aparente [t/m^3]	2.600	2.517
Masa Unitario Suelto [kg/m^3]	1529.2	1632.7
Forma y Textura	Angular y rugosa	Lisa y redondeada
Humedad [%]	1.29	0.99
Absorcion [%]	1.06	3.08

vv vvv v gvb

PROPORCION EN BALDES POR BULTO DE CEMENTO

Tipo de balde	Cemento	Triturado	Mixto
Balde de 8 litros	1 bulto	6.3 Baldes	10.6 Baldes
Balde de 10 litros	1 bulto	5 Baldes	8.5 Baldes
Balde de 20 litros	1 bulto	2.5 Baldes	4.2 Baldes

DISEÑO

PARÁMETRO	CANTIDAD
Slump [Pulgadas]	4
Seleccion del tamaño maximo del agregado [Pulgadas]	1 1/2"
a	1.00
Contenido de agua [l]	230
ADITIVO 1	NO APLICA
ADITIVO 2	NO APLICA
ESFUERZO PROMEDIO REQUERIDO A LA COMPRESION (psi)	4200
Resistencia de diseño especificada [psi]	3000
Relacion agua-cemento [A/C]	0.580
Calculo del contenido del cemento [kg/m^3]	396.55
ESTIMACION DE LAS PROPORCIONES DE AGREGADOS	
Método grafico propuesto por FULLER Y THOMPSON para materiales no controlados o mal gradados.	
Triturado	35%
Material mixto	65%
Cantidades material para 1m^3:	
Cemento	0.126
Agua	0.230
Aire	0.010
Volumen agregados =	0.634
Volumen agregado triturado =	0.222
Volumen agregado Mixto =	0.412

PESO SECO MATERIALES PARA 1m^3 DE CONCRETO

Material	Volumen (l)	Densidad (g/cm3)	Peso seco (kg)
Cemento	125.89	3.15	396.55
Agregado triturado	221.94	2.600	611.77
Mixto	412.17	2.517	1099.61
Agua	230.00	1.00	230.00
ADITIVO 1	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
ADITIVO 2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Aire	10.00		
Total	**1000.00**		**2337.93**

PROPORCION EN PESO		PESOS POR BULTO DE CEMENTO DE 50kg	
Cemento	1.00	Bulto de 50(kg)	1.00
Triturado	1.54	Ag. triturado(kg)	77.14
Mixto	2.77	Mixto (kg)	138.65
Agua	0.58	Agua (l)	29.00
ADITIVO 1	NO APLICA	ADITIVO 1	NO APLICA
ADITIVO 2	NO APLICA	ADITIVO 2	NO APLICA

PROPOR. EN VOLUMEN	
Cemento	1.00
Triturado	1.26
Mixto	2.12
ADITIVO 1	NO APLICA
ADITIVO 2	NO APLICA

NOTAS:

1. Para dosificación en campo pesar cantidad de agregados requeridos por bulto de cemento y dividivir en los valdes. Asi obtendran la proporcion en volumen.
2. El diseño se debera ajustar si se presentan cambios de agregados.
3. El diseño se realizó de acuerdo a muestra entregada por el contratista.
4. El cemento utilizado para el diseño es cemento ALION USO GENERAL.
5. El agregado grueso es de textura angular y rugosa de tamaño máximo 1" y material mixto de canto rodado tamaño maximo 1 /12"
6. El peso unitario sueloto del cemento es de 1250 [t/m3]
7. El asentamineto de diseño es de 3 1/2" +/-1/2"
8. El peso unitario del material mixto puede variar con la humedad natural, por lo cual se recomienda varificar masa unitaria antes de realizar la mezcla
9. Los testigos de este diseño se realizaron con 360 kg de cemento y este diseño se realizo con 396 kg de cemento, se esperan muestras por parte del cliente para verificar la resistencia.

OBSERVACIONES: Diseño exclusivo para concreto de 3000psi

Elaboró:	REALIZÓ: JUAN LOSADA Laboratorista Nombre/Firma	Revisó:	APROBÓ: JHONY ANDERSON MONTOYA V.B. Jefe de laboratorio Nombre/Firma

DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO ESTRUCTURAL
3000PSI


CLIENTE : Empresa de servicios publicos aguas andaqui S.A ESP de Belen de los andaquies | **PR INICIAL:** N/A | **ACTIVIDAD:** Concreto Estructural

PROYECTO: Optimizacion de alcantarillado de aguas lluvias en el municipio de Belen de los Andaquies | **PR FINAL:** N/A | **LOTE:** N/A

DESCRIPCIÓN: | **LADO:** N/A | **REGISTRO :** C001-0126

PROCEDENCIA : Triturado tamaño maximo 1", nominal 3/4" y Material mixto tamaño maximo 3/4" | **FECHA:** 10-dic.-2025 | **RESIS. [psi]** 3000


La cantidad de agregado grueso y fino para este diseño se determinara metodo grafico propuesto por FULLER Y THOMPSON para materiales no controlados o mal gradados.

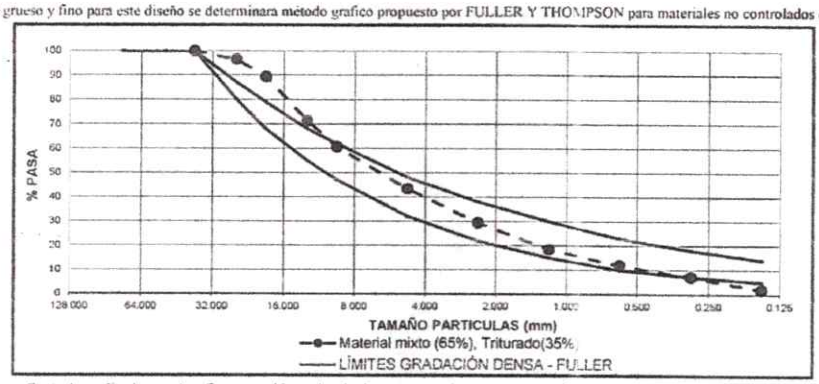

Segun lo analizado por el grafico se establecen las siguientes proporciones en peso para los agregados

Agregado triturado	**35%**
Agregado mixto	**65%**

TAMICES		Porcentaje que pasa para el tamaño máximo indicado en mm (pulg.)		Gradación obtenida para diseño de mezcla de concreto (35% Triturado, 65% Material mixto)
pulg	mm	Triturado	Material mixto	
3"	76.10	35.00	65.00	100.00
2"	50.80	35.00	65.00	100.00
1 1/2"	38.10	35.00	65.00	100.00
1"	25.40	35.00	61.61	100.00
3/4"	19.10	29.09	60.37	100.00
1/2"	12.70	14.37	57.02	100.00
3/8"	9.51	7.75	52.96	100.00
4.00	4.76	0.99	42.41	100.00
8.00	2.38	0.52	28.98	100.00
16.00	1.19	0.44	18.06	100.00
30.00	0.60	0.37	11.50	100.00
50.00	0.30	0.29	6.85	100.00
100.00	0.15	0.18	1.78	100.00

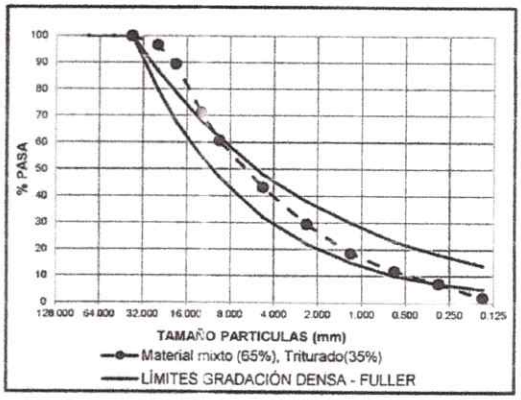

ENSAYO A LA COMPRESIÓN DE TESTIGOS DE DISEÑO

Muestra N°	Fecha toma	Fecha rotura	Edad dias	Lectura dial [kN]	Resistencia obtenida [Psi]	Resistencia esperada [Psi]	Asent. [pulg]	Diametro muestra [cm]	Altura muestra [cm]	Masa muestra [g]	Tipo de falla	% obtenido
1	12/01/26	13/01/26	1	36.1	**667**	3000	3 1/2"	10.0	20.5	3756	3	22.2
2	12/01/26	13/01/26		37.1	**659**	3000		10.2	20.5	3886	3	22.0
3	12/01/26	15/01/26	3	79.7	**1415**	3000		10.2	20.5	3896	6	47.2
4	12/01/26	15/01/26		85.7	**1521**	3000		10.2	20.5	3892	3	50.7
5	12/01/26	19/01/26	7	104.9	**1862**	3000		10.2	20.5	3948	3	62.1
6	12/01/26	19/01/26		94.8	**1683**	3000		10.2	20.5	3916	3	56.1



C.S.P.
ESTUDIOS Y DISEÑOS S.A.S.

LABORATORIO DE CONCRETOS, SUELOS Y PAVIMENTOS
Ensayos físicos, químicos y mecánicos de materiales

CODIGO	C.S.P. - ING. - 006
VERSIÓN	01
FECHA	8-nov.-2018
PAGINA	3 DE 3

DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO ESTRUCTURAL 3000PSI

CLIENTE : Empresa de servicios publicos aguas andaqui S.A ESP de Belen de los andaquies

PROYECTO: Optimizacion de alcantarillado de aguas lluvias en el municipio de Belen de los Andaquies

PROCEDENCIA : Triturado tamaño maximo 1" nominal 3/4" y Material mixto tamaño maximo 3/4"

PR INICIAL: N/A

PR FINAL: N/A

LADO: N/A

FECHA: 10-die.-2025


ACTIVIDAD: Concreto Estructural

LOTE: N/A

REGISTRO : C001-0126

RESIS. [psi] 3000


REGISTRO FOTOGRAFICO DE DISEÑO

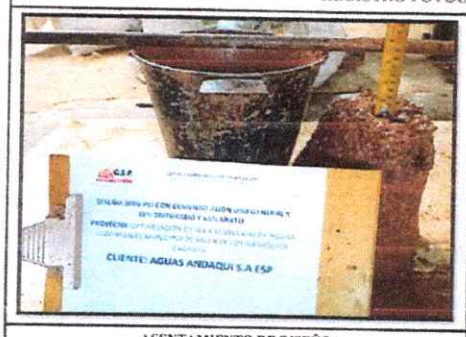


ASENTAMIENTO DE DISEÑO




MUESTRAS PARA ENSAYO A LA COMPRESIÓN

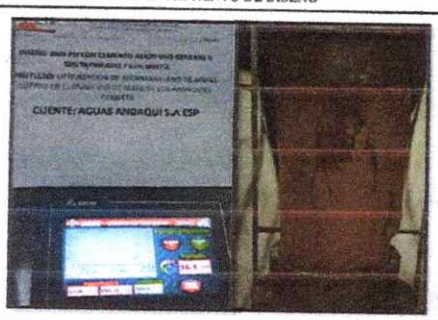

MUESTRAS PARA ENSAYO A LA COMPRESIÓN A 1 DIA

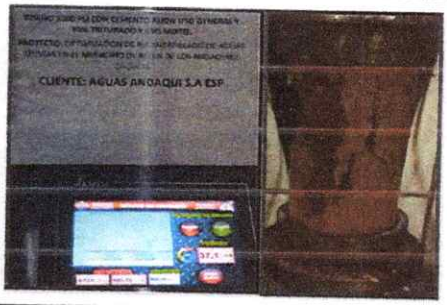

MUESTRAS PARA ENSAYO A LA COMPRESIÓN A 1 DIA

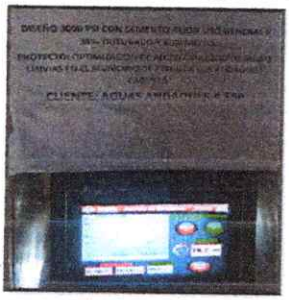

MUESTRAS PARA ENSAYO A LA COMPRESIÓN A 3 DIAS



MUESTRAS PARA ENSAYO A LA COMPRESIÓN A 7 DIAS

Elaboro:	REALIZÓ: JUAN PABLO LOSADA Laboratorista Nombre/Firma	Revisó:	APROBÓ: JHONY ANDERSON MONTOYA Ingeniero control de calidad: Nombre/Firma

Calle 21A N. 2B-35 - Los Alpes. Cel: 313 3687912 - 3142223090
e-mail:laboratorio.csp.ingenieria@gmail.com
Florencia - Caquetá

C.S.P. ESTUDIOS Y DISEÑOS S.A.S.

LABORATORIO DE CONCRETOS, SUELOS Y PAVIMENTOS
Ensayos físicos, químicos y mecánicos de materiales

CODIGO	C.S.P. - ING. - 007
VERSIÓN	01
FECHA	8-nov.-2018
PAGINA	1 DE 1

ANALISIS GRANULOMETRICO DE AGREGADOS GRUESOS Y FINOS I.N.V. E – 213 – 13
DETERMINACIÓN DEL LÍMITE LÍQUIDO DE LOS SUELOS I.N.V. E – 125 – 13
LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS I.N.V. E – 126 – 13

CLIENTE : Empresa de servicios publicos aguas andaquí S.A ESP de Belen de los andaquies
PR INICIAL: N/A
FECHA: 10-dic.-2025

PROYECTO: Optimizacion de alcantarillado de aguas lluvias en el municipio de Belen de los Andaquies
PR FINAL: N/A
LOTE: N/A


DESCRIPCION: Grava mal graduada y arena GP
LADO: N/A
REGISTRO : C001-01126

PROCEDENCIA : Grava triturada tamaño maximo 1"
TIPO GRADACIÓN: TM-25.4 mm (1")
ACTIVIDAD: Concreto Estructural

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE AGREGADOS GRUESOS Y FINOS I.N.V. E – 213 – 13

Peso seco antes de lavar [g.] 7158.0 — Peso seco después de lavar [g.] 7122.0

TAMIZ	PESO		PORCENTAJE			CURVA PROPUESTA POR FULLER Y THOMPSON TM-25.4 mm (1")	
PULGADA	mm	RETENIDO	RETE.	RET. ACO.	PASA		
3"	76.1	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
2"	50.8	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
1 1/2"	38.1	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
1"	25.4	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
3/4"	19.10	1208.00	16.88	16.88	83.12	85.00	90.00
1/2"	12.7	3012.00	42.08	58.96	41.04	68.00	78.00
3/8"	9.51	1354.00	18.92	77.87	22.13	58.00	71.00
4	4.76	1382.00	19.31	97.18	2.82	40.00	56.00
8	2.38	96.00	1.34	98.52	1.48	27.00	44.00
16	1.19	16.00	0.22	98.74	1.26	19.00	34.00
30	0.595	14.00	0.20	98.94	1.06	13.00	27.00
50	0.297	16.00	0.22	99.16	0.84	9.00	21.00
100	0.149	24.00	0.34	99.50	0.50	6.00	16.00
P/100	P/0.6	36.00	0.50	100.00	0.00		

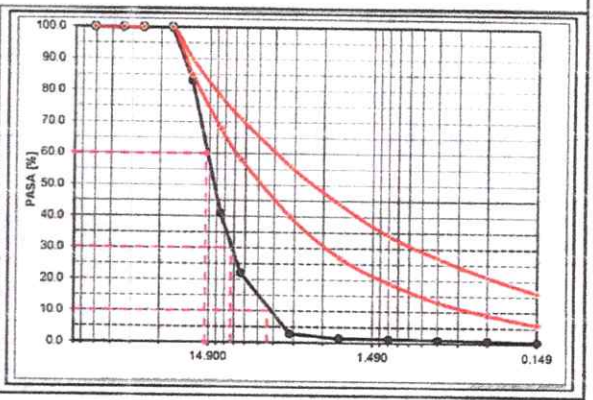

LIMITES DE CONSISTENCIA

ESPECIFICACION: ARTICULO 630 TABLA 630.1


Límite Líquido de los Suelos I.N.V E-125

ENSAYO	1	2	3
Nº Golpes	---	---	---
Tara Nº	---	---	---
Tara+Suelo Humedo [g.]	---	---	---
Tara + Suelo Seco [g.]	---	---	---
Peso Tara [g.]	---	---	---
Humedad [%]	NP	NP	NP

Límite Plástico e Indice Plastico de Suelos I.N.V.E-126

ESPECIFICACION: ARTICULO 630 TABLA 630.1

ENSAYO	1	2	HUMEDAD NATURAL
Tara Nº	---	---	234
Tara+Suelo Humedo [g.]	---	---	634.2
Tara + Suelo Seco [g.]	---	---	627
Peso Tara [g.]	---	---	70.53
Humedad [%]	NP	NP	1.29



RESULTADOS

H. Natural	1.3
Límite Líquido	NL
Límite Plástico	NP
Indice de Plas.	NP
Gravas	97.2
Arenas	2.3
Finos p. Nº100	0.50
Indice de Grupo	0
A.A.S.H.T.O.	A-1-a
U.S.C.S.	GP
Cu	2.39
Cc	1.15
D60	15.58
D30	10.84
D10	6.53

CANTIDAD DE MATERIAL FINO QUE PASA EL TAMIZ DE 75 µm (No.200) EN LOS AGREGADOS I.N.V. E – 214 – 13

$$A = \frac{B-C}{B} \times 100$$

Donde:
A= Porcentaje del material fino que pasa tamiz Nº200
B= Masa original de la muestra seca, [g.]
C= Masa de la muestra seca despues de lavado, [g.]

TARA	1.00	2.00
B	7158.00	4294.80
C	7136.00	4279.46
A	0.3%	0.4%
PROMEDIO	0.3%	
	CUMPLE	

OBSERVACIONES: ø

Juan Losada

C.S.P. ESTUDIOS Y DISEÑOS S.A.S.

REALIZÓ: JUAN LOSADA
Laboratorista Nombre/Firma

APROBÓ: JHONY ANDERSON MONTOYA
Jefe de laboratorio: Nombre/Firma

Calle 21A N. 28-35 - Los Alpes. Cel: 313 3687912 - 3142223090
e-mail:laboratorio.csp.ingenieria@gmail.com
Florencia - Caquetá

CODIGO	C.S.P. - ING. - 008
VERSIÓN	01
FECHA	8-nov.-2018
PAGINA	1 DE 1

LABORATORIO DE CONCRETOS, SUELOS Y PAVIMENTOS
Ensayos físicos, químicos y mecánicos de materiales

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE AGREGADOS GRUESOS Y FINOS I.N.V. E – 213 – 13
DETERMINACIÓN DEL LÍMITE LÍQUIDO DE LOS SUELOS I.N.V. E – 125 – 13
LÍMITE PLASTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS I.N.V. E – 126 – 13

CLIENTE : Empresa de servicios publicos aguas andaqui S.A ESP de Belen de los andaquies — **PR INICIAL:** N/A — **FECHA:** 10-dic.-2025

PROYECTO: Optimizacion de alcantarillado de aguas lluvias en el municipio de Belen de los Andaquies — **PR FINAL:** N/A — **LOTE:** N/A


DESCRIPCIÓN: Arena — **LADO:** N/A — **REGISTRO :** C001-0126-1

PROCEDENCIA : Material mixto tamaño maximo 1 1/2" — **TIPO GRADACIÓN:** TM-38.1 mm (1 1/2") — **ACTIVIDAD:** Concreto Estructural

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE AGREGADOS GRUESOS Y FINOS I.N.V. E – 213 – 13

Peso seco antes de lavar [g.]	9622.0	Peso seco después de lavar [g.]	9358.0

TAMIZ		PESO	PORCENTAJE			CURVA PROPUESTA POR FULLER Y THOMPSON TM-38.1 mm (1 1/2")	
PULGADA	mm	RETENIDO	RETE.	RET. ACO.	PASA		
3"	76.1	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
2"	50.8	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
1 1/2"	38.1	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
1 "	25.4	502.00	5.22	5.22	94.78	80.00	87.00
3/4"	19.10	184.00	1.91	7.13	92.87	68.00	79.00
1/2"	12.7	496.00	5.15	12.28	87.72	55.00	68.00
3/8"	9.51	600.00	6.24	18.52	81.48	47.00	62.00
4	4.76	1562.00	16.23	34.75	65.25	32.00	48.00
8	2.38	1988.00	20.66	55.41	44.59	22.00	38.00
16	1.19	1616.00	16.79	72.21	27.79	15.00	30.00
30	0.595	972.00	10.10	82.31	17.69	10.00	23.00
50	0.297	688.00	7.15	89.46	10.54	7.00	18.00
100	0.149	750.00	7.79	97.26	2.74	5.00	14.00
P/100	P/0.6	264.00	2.74	100.00	0.00		

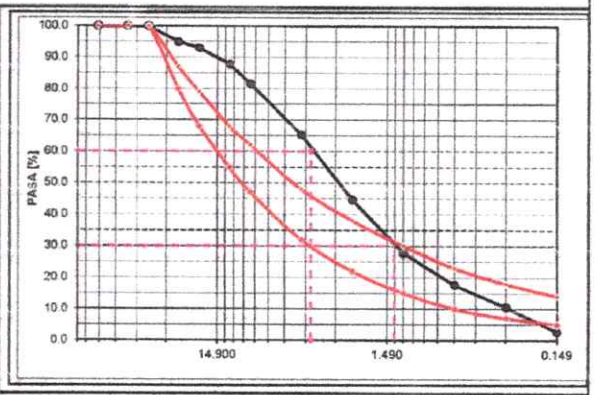

LIMITES DE CONSISTENCIA

ESPECIFICACION: ARTICULO 630 TABLA 630.1


Limite Liquido de los Suelos I.N.V E-125

ENSAYO	1	2	3
N° Golpes	---	---	---
Tara N°	---	---	---
Tara+Suelo Humedo [g.]	---	---	---
Tara + Suelo Seco [g.]	---	---	---
Peso Tara [g.]	---	---	---
Humedad [%]	NP	NP	NP

Limite Plástico e Indice Plastico de Suelos I.N.V.E-126

ESPECIFICACION: ARTICULO 630 TABLA 630.1

ENSAYO	1	2	HUMEDAD NATURAL
Tara N°	---	---	201
Tara+Suelo Humedo [g.]	---	---	12276
Tara + Suelo Seco [g.]	---	---	12164
Peso Tara [g.]	---	---	812.00
Humedad [%]	NP	NP	0.99

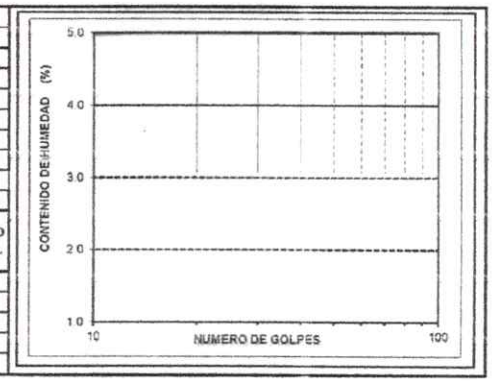

RESULTADOS	
H. Natural	1.0
Limite Liquido	0
Limite Plástico	0
Indice de Plas.	0
Gravas	34.8
Arenas	62.5
Finos p. N°100	2.7
Indice de Grupo	0
A.A.S.H.T.O.	A-1-b
U.S.C.S.	
Cu	0.00
Cc	0.00
D60	4.16
D30	1.35
D10	0.00

CANTIDAD DE MATERIAL FINO QUE PASA EL TAMIZ DE 75 µm (No.200) EN LOS AGREGADOS I.N.V. E – 214 – 13

$$A = \frac{B-C}{B} \times 100$$

Donde:
A= Porcentaje del material fino que pasa tamiz N°200
B= Masa original de la muestra seca. [g.]
C= Masa de la muestra seca despues de lavado. [g.]

TARA	1.00	2.00
B	9622.00	5773.20
C	9442.00	5662.37
A	1.9%	1.9%
PROMEDIO	1.9%	
	CUMPLE	

OBSERVACIONES: 0

Juan Losada

REALIZÓ: JUAN LOSADA
Laboratorista Nombre/Firma

APROBÓ: JHONY ANDERSON MONTOYA
Jefe de laboratorio. Nombre/Firma

Calle 21A N. 2B-35 - Los Alpes. Cel: 313 3687912 - 3142223090
e-mail:laboratorio.csp.ingenieria@gmail.com
Florencia - Caquetá

C.S.P. ESTUDIOS Y DISEÑOS S.A.S.	LABORATORIO DE CONCRETOS, SUELOS Y PAVIMENTOS Ensayos físicos, químicos y mecánicos de materiales	CODIGO	C.S.P. - ING. - 009
		VERSIÓN	01
		FECHA	8-nov.-2018
		PAGINA	1 DE 1

GRAVEDAD ESPECÍFICA Y ABSORCIÓN DE AGREGADOS FINOS I.N.V. E – 222 – 13
GRAVEDAD ESPECÍFICA Y ABSORCIÓN DE AGREGADOS GRUESOS I.N.V. E – 223 – 13

CLIENTE : Empresa de servicios publicos aguas andaquí S.A ESP de Belen de los andaquies

PROYECTO: Optimizacion de alcantarillado de aguas lluvias en el municipio de Belen de los Andaquies

DESCRIPCIÓN:

PROCEDENCIA : Grava triturada tamaño maximo 1"

PR INICIAL: N/A

PR FINAL: N/A

ACTIVIDAD: Concreto Estructural

LADO: N/A

LOTE: N/A

FECHA: 10-dic.-2025

REGISTRO : C001-0126

GRAVEDAD ESPECIFICA Y ABSORCION DE AGREGADO GRUESO			
MUESTRA	1	2	PROMEDIO
Peso en aire de muestra seca [g]	2912	2688	
Peso en aire de muestra SSS [g]	2940	2720	
Peso en agua de muestra SSS [g]	1838	1646	
Gravedad especifica aparente [Bulk]	2.642	2.503	2.573
Gravedad especifica aparente [SSS]	2.668	2.533	2.600
Gravedad especifica nominal [-]	2.711	2.580	2.646
Absorción [%]	0.95	1.18	1.06

GRAVEDAD ESPECIFICA Y ABSORCION DE AGREGADO FINO			
MUESTRA	1	2	PROMEDIO
Peso en aire de muestra seca [g]			
Peso del picnómetro lleno de agua [g]			
Peso del picnómetro lleno de agua + muestra [			
Peso de muestra SSS [g]			
Gravedad especifica aparente [Bulk]			
Gravedad especifica aparente [SSS]			
Gravedad especifica nominal [-]			
Absorción [%]			

RESULTADO PONDERADO	
Gravedad especifica aparente [Bulk]	2.573
Gravedad especifica aparente [SSS]	2.600
Gravedad especifica nominal [-]	2.646
Absorción [%]	1.064

Observaciones:

REALIZÓ: JUAN LOSADA	APROBÓ: JHONY ANDERSON MONTOYA
Laboratorista Nombre/Firma	Jefe de laboratorio: Nombre/Firma

Calle 21A N. 28-35 - Los Alpes. Cel: 313 3687912 - 3142223090
e-mail:laboratorio.csp.ingenieria@gmail.com
Florencia - Caquetá

C.S.P. ESTUDIOS Y DISEÑOS S.A.S.	LABORATORIO DE CONCRETOS, SUELOS Y PAVIMENTOS Ensayos fisicos, químicos y mecánicos de materiales	CODIGO	C.S.P. - ING. - 009
		VERSIÓN	01
		FECHA	8-nov -2018
		PAGINA	1 DE 1

GRAVEDAD ESPECÍFICA Y ABSORCIÓN DE AGREGADOS FINOS I.N.V. E – 222 – 13
GRAVEDAD ESPECIFICA Y ABSORCIÓN DE AGREGADOS GRUESOS I.N.V. E – 223 – 13

CLIENTE : Empresa de servicios publicos aguas andaqui S.A ESP de Belen de los andaquies — PR INICIAL: N/A

PROYECTO: Optimizacion de alcantarillado de aguas lluvias en el municipio de Belen de los Andaquies — PR FINAL: N/A — ACTIVIDAD: Concreto Estructural

DESCRIPCIÓN: — LADO: N/A — LOTE: N/A

PROCEDENCIA : Material mixto tamaño maximo 1 1/2" — FECHA: 10-dic.-2025 — REGISTRO : C001-0126-1

GRAVEDAD ESPECIFICA Y ABSORCION DE AGREGADO GRUESO			
MUESTRA	**1**	**2**	**PROMEDIO**
Peso en aire de muestra seca [g]	**1600**	1654	
Peso en aire de muestra SSS [g]	**1648**	1698	
Peso en agua de muestra SSS [g]	**978**	1014	
Gravedad especifica aparente [Bulk]	2.388	2.418	**2.403**
Gravedad especifica aparente [SSS]	2.460	2.482	**2.471**
Gravedad especifica nominal [-]	2.572	2.584	**2.578**
Absorción [%]	**2.91**	**2.59**	**2.75**

GRAVEDAD ESPECIFICA Y ABSORCION DE AGREGADO FINO			
MUESTRA	**1**	**2**	**PROMEDIO**
Peso en aire de muestra seca [g]	117.57	117.68	
Peso del picnómetro lleno de agua [g]	**365.5**	**365.5**	
Peso del picnometro lleno de agua + muestra [	**439.01**	**439.3**	
Peso de muestra SSS [g]	**121.34**	121.57	
Gravedad especifica aparente [Bulk]	2.458	2.463	**2.461**
Gravedad especifica aparente [SSS]	2.537	2.545	**2.541**
Gravedad especifica nominal [-]	2.668	2.682	**2.675**
Absorción [%]	**3.21**	**3.31**	**3.26**

RESULTADO PONDERADO	
Gravedad especifica aparente [Bulk]	**2.441**
Gravedad especifica aparente [SSS]	**2.517**
Gravedad especifica nominal [-]	**2.642**
Absorción [%]	**3.081**

Observaciones:

REALIZÓ: JUAN LOSADA	APROBÓ: JHONY ANDERSON MONTOYA
Laboratorista Nombre/Firma	Jefe de laboratorio: Nombre/Firma

Calle 21A N. 28-35 - Los Alpes. Cel: 313 3687912 - 3142223090
e-mail:laboratorio.csp.ingenieria@gmail.com
Florencia - Caquetá

C.S.P. ESTUDIOS Y DISEÑOS S.A.S.	**LABORATORIO DE CONCRETOS, SUELOS Y PAVIMENTOS** **Ensayos físicos, químicos y mecánicos de materiales**	CODIGO: C.S.P. - ING. - 010 VERSIÓN: 01 FECHA: 8-nov.-2018 PAGINA: 1 DE 1

DENSIDAD BULK (PESO UNITARIO) Y PORCENTAJE DE VACIOS DE LOS AGREGADOS EN ESTADO SUELTO Y COMPACTADO
I.N.V. E – 217 – 13

CLIENTE : Empresa de servicios publicos aguas andaqui S A ESP de Belen de los andaquies

PR INICIAL: N/A

PROYECTO: Optimizacion de alcantarillado de aguas lluvias en el municipio de Belen de los Andaquies

PR FINAL: N/A

ACTIVIDAD: Concreto Estructural

DESCRIPCIÓN:

LADO: N/A

LOTE: N/A

PROCEDENCIA : Grava triturada tamaño maximo 1"

FECHA: 10-dic.-2025

REGISTRO : C001-0126

MASA UNITARIA SUELTA					
Ensayo Numero	1	2	3	4	PROMEDIOS
Numero del molde	1	1	1	1	
Numero de capas	N/A	N/A	N/A	N/A	
Numero de chuzones por capas	N/A	N/A	N/A	N/A	
Masa del Molde [g]	1187.0	1187.0	1187.0	1187.0	
Volumen del Molde [cm3]	9241.0	9241.0	9241.0	9241.0	
Masa Muestra + Molde [g]	15334.0	15316.0	15318.0	15306.0	15318.5
Masa Muestra [g]	14147.0	14129.0	14131.0	14119.0	14131.5
Masa Unitaria [kg/m3]	1530.9	1528.9	1529.2	1527.9	1529.2

MASA UNITARIA COMPACTA					
Ensayo Numero	1	1	1	1	PROMEDIOS
Numero del molde	1187	1187	1187	1187	
Numero de capas	3	3	3	3	
Numero de chuzones por capas	25	25	25	25	
Masa del Molde [g]	1187.0	1187.0	1187.0	1187.0	
Volumen del Molde [cm3]	9241.0	9241.0	9241.0	9241.0	
Masa Muestra + Molde [g]	16826.0	16872.0	16920.0	16856.0	16868.5
Masa Muestra [g]	15639.0	15685.0	15733.0	15669.0	15681.5
Masa Unitaria [kg/m3]	1692.3	1697.3	1702.5	1695.6	1696.9

RESULTADOS	
Masa unitaria suelta [kg/m3]	1529.2
Masa unitaria compacta [kg/m3]	1696.9

Observaciones:

REALIZÓ: JUAN LOSADA Laboratorista Nombre/Firma	APROBÓ: JHONY ANDERSON MONTOYA Jefe de laboratorio: Nombre/Firma

Calle 21A N. 28-35 - Los Alpes. Cel: 313 3687912 - 3142223090
e-mail:laboratorio.csp.ingenieria@gmail.com
Florencia - Caquetá

C.S.P.
ESTUDIOS Y DISEÑOS S.A.S.

LABORATORIO DE CONCRETOS, SUELOS Y PAVIMENTOS
Ensayos físicos, químicos y mecánicos de materiales

CODIGO	C.S.P. - ING. - 010
VERSIÓN	01
FECHA	8-nov.-2018
PAGINA	1 DE 1

DENSIDAD BULK (PESO UNITARIO) Y PORCENTAJE DE VACIOS DE LOS AGREGADOS EN ESTADO SUELTO Y COMPACTADO
I.N.V. E – 217 – 13

CLIENTE : Empresa de servicios publicos aguas andaqui S.A ESP de Belen de los andaquies
PR INICIAL: N/A
PROYECTO: Optimizacion de alcantarillado de aguas lluvias en el municipio de Belen de los Andaquies
PR FINAL: N/A
ACTIVIDAD: Concreto Estructural
DESCRIPCIÓN:
LADO: N/A
LOTE: N/A
PROCEDENCIA : Material mixto tamaño maximo 1 1/2"
FECHA: 10-dic.-2025
REGISTRO : C001-0126-1

MASA UNITARIA SUELTA					
Ensayo Numero	**1**	**2**	**3**	**4**	**PROMEDIOS**
Numero del molde	1	1	1	1	
Numero de capas	N/A	N/A	N/A	N/A	
Numero de chuzones por capas	N/A	N/A	N/A	N/A	
Masa del Molde [g]	1187.0	1187.0	1187.0	1187.0	
Volumen del Molde [cm3]	9241.0	9241.0	9241.0	9241.0	
Masa Muestra + Molde [g]	16266.0	16292.0	16268.0	16274.0	16275.0
Masa Muestra [g]	15079.0	15105.0	15081.0	15087.0	15088.0
Masa Unitaria [kg/m3]	1631.7	1634.6	1632.0	1632.6	1632.7

MASA UNITARIA COMPACTA					
Ensayo Numero	1	1	1	1	**PROMEDIOS**
Numero del molde	1187	1187	1187	1187	
Numero de capas	3	3	3	3	
Numero de chuzones por capas	25	25	25	25	
Masa del Molde [g]	1187.0	1187.0	1187.0	1187.0	
Volumen del Molde [cm3]	9241.0	9241.0	9241.0	9241.0	
Masa Muestra + Molde [g]	18196.0	18104.0	18074.0	18094.0	18117.0
Masa Muestra [g]	17009.0	16917.0	16887.0	16907.0	16930.0
Masa Unitaria [kg/m3]	1840.6	1830.6	1827.4	1829.6	1832.1

RESULTADOS	
Masa unitaria suelta [kg/m3]	1632.7
Masa unitaria compacta [kg/m3]	1832.1

Observaciones:

Juan Losada

C.S.P.
ESTUDIOS Y DISEÑOS S.A.S.

REALIZÓ: JUAN LOSADA
Laboratorista Nombre/Firma

APROBÓ: JHONY ANDERSON MONTOYA
Jefe de laboratorio: Nombre/Firma

Calle 21A N. 28-35 - Los Alpes. Cel: 313 3687912 - 3142223090
e-mail:laboratorio.csp.ingenieria@gmail.com
Florencia - Caquetá

C.S.P.
ESTUDIOS Y DISEÑOS S.A.S.

LABORATORIO DE CONCRETOS, SUELOS Y PAVIMENTOS
Ensayos físicos, químicos y mecánicos de materiales

CODIGO	C.S.P. - ING. - 015
VERSIÓN	01
FECHA	8-nov.-2018
PAGINA	1 DE 1

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO INV E-410-13 - ASTM C 39/C 39M – 01


CLIENTE : Empresa de servicios publicos aguas andaqui S A ESP de Belen de los andaquies — **REG:** C001-0126

PROYECTO: Optimizacion de alcantarillado de aguas lluvias en el municipio de Belen de los Andaquies

Muestra Nº	Fecha toma	Fecha rotura	Edad dias	Localizacion en obra o PR	Descripción elemento	Lectura dial [kN]	Resistencia obtenida [Psi]	Resistencia esperada [Psi]	Asent. [pulg]	Diametro muestra [cm]	Altura muestra [cm]	Area [cm2]	Peso muestra [g]	Volumen [cm3]	Densidad [g/cm3]	Tipo de falla	% obtenido	Cumple Si/No	Observaciones
1	25/01/26	08-02-26	14	CUNETAS	CUNETAS	180.3	3330	3000	N/P	10.0	20.3	78.5	3730	1594.4	2.339	3	111	SI	N/P= NO PRESENTA
1	25/01/26	08-02-26	14			192.0	3546	3000		10.0	20.4	78.5	3776	1602.2	2.357	4	118		
1	25/01/26	22/02/26	28			207.5	3832	3000		10.0	20.1	78.5	3584	1578.7	2.270	3	128	SI	
1	25/01/26	22/02/26	28			223.5	3967	3000		10.2	20.3	81.7	3718	1658.8	2.241	4	132		

Observaciones: Las muestras fueron suministradas por el cliente.

I.N.V. E -410 FIGURA 410 - 3. ESQUEMAS DE PATRONES DE FALLA TIPICOS



REALIZÓ: JUAN PABLO LOSADA
Laboratorista Nombre Firma

C.S.P. ESTUDIOS Y DISEÑOS S.A.S.

APROBÓ. JHONY ANDERSON MONTOYA
Jefe de laboratorio Nombre Firma

Calle 21A N 2B-35 - Los Alpes. Cel: 313 3887912 - 3142223090
e-mail:laboratorio.csp.ingenieria@gmail.com
Florencia - Caqueta

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CE 1492646	0	LUIS BERNALDO GUILLEN RODRIGUEZ	I	0	SINARP - SINARP	ÚNICA	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
18-1	CLLE 23 43 #80 LA LIBERTAD		3114047869			GUILLENLUISBER@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-02	2026-02	36773262	I	2026-03-18	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	501.400	2.300	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36773262	2026-03-11	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CE 1492646	GUILLEN RODRIGUEZ LUIS BERNALDO	1.750.905																	0			30	30	0	0	COLPENSIONES-25-14	1.750.905	280.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	218.900	SIN CCF-SINCCP	0	0	0	0	0,00000	0	0	0	0	0	0	03	0	499.100	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CE 1492646	0	LUIS BERNALDO GUILLEN RODRIGUEZ	I	0	SINARP - SINARP	ÚNICA	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
18-1	CLLE 23 43 #80 LA LIBERTAD		3114047869			GUILLENLUISBER@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-02	2026-02	36773262	I	2026-03-18	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	501.400	2.300	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36773262	2026-03-11	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.750.905	1.750.905	0	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	280.200	0	1.300	0	281.500
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	280.200	0	1.300	0	281.500
EPS(Administradoras: 1)				1	218.900	0	1.000	0	219.900
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	218.900	0	1.000	0	219.900
Gran Total					499.100	0	2.300	0	501.400

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CE 1492646	0	LUIS BERNALDO GUILLEN RODRIGUEZ	I	0	POSITIVA - 14-23	UNICA	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
18-1	CLLE 23 4B 80 LA LIBERTAD		3114047869			GUILLENLUISBER@GMAIL.COM		N

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-03	2026-03	36855607	I	2026-04-16	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	542.600	800	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36855607	2026-04-14	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	INC	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total		
1	CE 1492646	GUILLEN RODRIGUEZ LUIS BERNALDO	1.750.905																	0			30	30	0	30	COLPENSIONES-25-14	1.750.905	280.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	218.900	SIN CCF-SINCCP	0	0	1.750.905	42.700	0,02436	0	0	0	0	0	59	0	541.800	N	3282901

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CE 1492646	0	LUIS BERNALDO GUILLEN RODRIGUEZ	I	0	POSITIVA - 14-23	UNICA	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
18-1	CLLE 23 4B 80 LA LIBERTAD		3114047869			GUILLENLUISBER@GMAIL.COM		N

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-03	2026-03	36855607	I	2026-04-16	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	542.600	800	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36855607	2026-04-14	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.750.905	1.750.905	1.750.905	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	280.200	0	400	0	280.600
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	280.200	0	400	0	280.600
EPS(Administradoras: 1)				1	218.900	0	300	0	219.200
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	218.900	0	300	0	219.200
ARP(Administradoras: 1)				1	42.700	0	100	0	42.800
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	42.700	0	100	0	42.800
Gran Total					541.800	0	800	0	542.600

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1117494758	0	NINI YOANA ARANGO HERNANDEZ	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
18-94	CR 4 N 21 29		0		ARANGOJOHANA294@GMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-02	2026-02	36652402	I	2026-03-18	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	398.700	1.400	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36652402	2026-03-13	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES												DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	INC	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1117494758	ARANGO HERNANDEZ NINI YOANA	1.750.905		X															0		22	22	0	22	PORVENIR-230301	1.283.997	205.500	0		ESSC ASMET SALUD-ESSC62	1.283.997	160.500	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.283.997	31.300	0,02436	0	0	0	0	0	0	59	0	397.300	N	3711002

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1117494758	0	NINI YOANA ARANGO HERNANDEZ	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
18-94	CR 4 N 21 29		0		ARANGOJOHANA294@GMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-02	2026-02	36652402	I	2026-03-18	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	398.700	1.400	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36652402	2026-03-13	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.283.997	1.283.997	1.283.997	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	205.500	0	700	0	206.200
PORVENIR	230301	800224808	8	1	205.500	0	700	0	206.200
EPS(Administradoras: 1)				1	160.500	0	600	0	161.100
ESSC ASMET SALUD	ESSC62	900935126	7	1	160.500	0	600	0	161.100
ARP(Administradoras: 1)				1	31.300	0	100	0	31.400
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	31.300	0	100	0	31.400
Gran Total					397.300	0	1.400	0	398.700

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1117494758	0	NINI YOANA ARANGO HERNANDEZ	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
18-94	CR 4 N 21 29		0		ARANGOJOHANA294@MGAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-03	2026-03	36790228	I	2026-04-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	542.300	500	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36790228	2026-04-16	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 1117494758	ARANGO HERNANDEZ NINI YOANA	1.750.905																0			30	30	0	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0		ESSC ASMET SALUD-ESSC62	1.750.905	218.900	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	42.700	0,02436	0	0	0	0	0	59	0	541.800	N	3711002

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1117494758	0	NINI YOANA ARANGO HERNANDEZ	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
18-94	CR 4 N 21 29		0		ARANGOJOHANA294@MGAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-03	2026-03	36790228	I	2026-04-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	542.300	500	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36790228	2026-04-16	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.750.905	1.750.905	1.750.905	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	280.200	0	200	0	280.400
PORVENIR	230301	800224808	8	1	280.200	0	200	0	280.400
EPS(Administradoras: 1)				1	218.900	0	200	0	219.100
ESSC ASMET SALUD	ESSC62	900935126	7	1	218.900	0	200	0	219.100
ARP(Administradoras: 1)				1	42.700	0	100	0	42.800
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	42.700	0	100	0	42.800
Gran Total					541.800	0	500	0	542.300

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CE 1492646	0	LUIS BERNALDO GUILLEN RODRIGUEZ	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
18-1	CLLE 23 4B 80 LA LIBERTAD		3114047869		GUILLENLUISBER@GMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-04	2026-04	37428168	I	2026-05-19	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	544.300	2.500	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	37428168	2026-05-13	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CE 1492646	GUILLEN RODRIGUEZ LUIS BERNALDO	1.750.905		X														0				30	30	0	30	COLPENSIONES-25-14	1.750.905	280.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	218.900	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	42.700	0,02436	0	0	0	0	0	59	0	541.800	N	3282961

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CE 1492646	0	LUIS BERNALDO GUILLEN RODRIGUEZ	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
18-1	CLLE 23 4B 80 LA LIBERTAD		3114047869		GUILLENLUISBER@GMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-04	2026-04	37428168	I	2026-05-19	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	544.300	2.500	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	37428168	2026-05-13	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.750.905	1.750.905	1.750.905	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	280.200	0	1.300	0	281.500
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	280.200	0	1.300	0	281.500
EPS(Administradoras: 1)				1	218.900	0	1.000	0	219.900
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	218.900	0	1.000	0	219.900
ARP(Administradoras: 1)				1	42.700	0	200	0	42.900
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	42.700	0	200	0	42.900
Gran Total					541.800	0	2.500	0	544.300

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1039088795	0	CAREN LOPEZ RAMOS	I	0	SINARP - SINARP	ÚNICA	8211	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
18-1	CLLE 23 4B #80 LA LIBERTAD		3114047869			KARENCITALOPEZ1988@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-12	2025-12	36306387	I	2026-02-20	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	261.100	4.100	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36306387	2026-01-26	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN						SALUD				CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1039088795	LOPEZ RAMOS CAREN	1.423.500		X	X														0			19	19	0	0	COLPENSION ES-25-14	901.550	144.300	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	901.550	112.700	SIN CCF-SINCCF	0	0	0	0	0,00000	0	0	0	0	0	03	0	257.000	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1039088795	0	CAREN LOPEZ RAMOS	I	0	SINARP - SINARP	ÚNICA	8211	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
18-1	CLLE 23 4B #80 LA LIBERTAD		3114047869			KARENCITALOPEZ1988@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-12	2025-12	36306387	I	2026-02-20	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	261.100	4.100	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36306387	2026-01-26	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
901.550	901.550	0	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	144.300	0	2.300	0	146.600
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	144.300	0	2.300	0	146.600
EPS(Administradoras: 1)				1	112.700	0	1.800	0	114.500
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	112.700	0	1.800	0	114.500
Gran Total					257.000	0	4.100	0	261.100

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1039088795	0	CAREN LOPEZ RAMOS	I	0	SINARP - SINARP	ÚNICA	8211	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
18-1	CLLE 23 4B #80 LA LIBERTAD		3114047869			KARENCITALOPEZ1988@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-01	2026-01	36447445	I	2026-02-20	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	50.000	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36447445	2026-02-23	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 1039088795	LOPEZ RAMOS CAREN	1.750.905		X															0			3	3	0	0	COLPENSIONES-25-14	175.091	28.100	0		NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	175.091	21.900	SIN CCF-SINCCF	0	0	0	0	0,00000	0	0	0	0	0	03	0	50.000	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1039088795	0	CAREN LOPEZ RAMOS	I	0	SINARP - SINARP	ÚNICA	8211	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
18-1	CLLE 23 4B #80 LA LIBERTAD		3114047869			KARENCITALOPEZ1988@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-01	2026-01	36447445	I	2026-02-20	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	50.000	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36447445	2026-02-23	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
175.091	175.091	0	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	28.100	0	0	0	28.100
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	28.100	0	0	0	28.100
EPS(Administradoras: 1)				1	21.900	0	0	0	21.900
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	21.900	0	0	0	21.900
Gran Total					50.000	0	0	0	50.000

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1039088795	0	CAREN LOPEZ RAMOS	I	0	SINARP - SINARP	ÚNICA	8211	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
18-1	CLLE 23 4B #80 LA LIBERTAD		3114047869			KARENCITALOPEZ1988@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-02	2026-02	36895396	I	2026-04-10	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	514.200	5.900	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36895396	2026-03-24	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total		
1	CC 1039088795	LOPEZ RAMOS CAREN	1.750.905																0				30	30	0	30	COLPENSIONES-25-14	1.750.905	280.200	0		NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.750.905	218.900	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	9.200	0,00522	0	0	0	0	0	57	0	508.300	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1039088795	0	CAREN LOPEZ RAMOS	I	0	SINARP - SINARP	ÚNICA	8211	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
18-1	CLLE 23 4B #80 LA LIBERTAD		3114047869			KARENCITALOPEZ1988@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-02	2026-02	36895396	I	2026-04-10	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	514.200	5.900	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36895396	2026-03-24	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.750.905	1.750.905	1.750.905	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	280.200	0	3.200	0	283.400
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	280.200	0	3.200	0	283.400
EPS(Administradoras: 1)				1	218.900	0	2.500	0	221.400
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	218.900	0	2.500	0	221.400
ARP(Administradoras: 1)				1	9.200	0	200	0	9.400
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	9.200	0	200	0	9.400
Gran Total					508.300	0	5.900	0	514.200

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1039088795	0	CAREN LOPEZ RAMOS	I	0	SINARP - SINARP	ÚNICA	8211	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
18-1	CLLE 23 48 #80 LA LIBERTAD		3114047869			KARENCITALOPEZ1988@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-03	2026-03	36895411	I	2026-03-31	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	508.300	0	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36895411	2026-04-24	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES													DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1039088795	LOPEZ RAMOS CAREN	1.750.905																	0			30	30	0	30	COLPENSION ES-25-14	1.750.905	280.200	0		NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.750.905	218.900	SIN CCF-SINCCP	0	0	1.750.905	9.200	0,00522	0	0	0	0	0	57	0	508.300	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1039088795	0	CAREN LOPEZ RAMOS	I	0	SINARP - SINARP	ÚNICA	8211	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
18-1	CLLE 23 48 #80 LA LIBERTAD		3114047869			KARENCITALOPEZ1988@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-03	2026-03	36895411	I	2026-03-31	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	508.300	0	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36895411	2026-04-24	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.750.905	1.750.905	1.750.905	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	280.200	0	0	0	280.200
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	280.200	0	0	0	280.200
EPS(Administradoras: 1)				1	218.900	0	0	0	218.900
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	218.900	0	0	0	218.900
ARP(Administradoras: 1)				1	9.200	0	0	0	9.200
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	9.200	0	0	0	9.200
Gran Total					508.300	0	0	0	508.300

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1039088795	0	CAREN LOPEZ RAMOS	I	0	SINARP - SINARP	UNICA	8211	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
18-1	CLLE 23 4B #80 LA LIBERTAD		3114047869			KARENCITALOPEZ1988@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-04	2026-04	36899893	I	2026-04-29	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	508.300	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36899893	2026-05-26	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN						SALUD				CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	PNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1039088795	LOPEZ RAMOS CAREN	1.750.905																	0			30	30	0	30	COLPENSIONES-25-14	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.750.905	218.900	SIN CCF-SINCCP	0	0	1.750.905	9.200	0,00522	0	0	0	0	0	57	0	508.300	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1039088795	0	CAREN LOPEZ RAMOS	I	0	SINARP - SINARP	UNICA	8211	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
18-1	CLLE 23 4B #80 LA LIBERTAD		3114047869			KARENCITALOPEZ1988@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-04	2026-04	36899893	I	2026-04-29	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	508.300	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36899893	2026-05-26	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.750.905	1.750.905	1.750.905	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	280.200	0	0	0	280.200
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	280.200	0	0	0	280.200
EPS(Administradoras: 1)				1	218.900	0	0	0	218.900
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	218.900	0	0	0	218.900
ARP(Administradoras: 1)				1	9.200	0	0	0	9.200
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	9.200	0	0	0	9.200
Gran Total					508.300	0	0	0	508.300

Bitacora de Obra

Contrato No. CPS-004 del 05 Diciembre 2025

Objeto Contractual: Contrato de Mano de Obra Calificada en el Marco del Convenio Interadministrativo No. 098-2025. Cuyo objeto es "Aunar Esfuerzos Tecnicos, Administrativos, Financieros para realizar Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Pluvial en Sectores Criticos del Area Urbana del Municipio de Belén de Los Andagoíes, Departamento del Caqueta.

Contratista: Amara Ingenieria S.A.S

Supervisión: Ingrid Alejandra Calderon Villegas
Gerente Aguas Andakí SA.ESP

Valor Inicial Contrato: $ 98.180.446

Fecha de Inicio: 12 de Diciembre de 2025
Plazo Inicial: 31 de Diciembre de 2025

Contratante: Empresa de Servicios Públicos
Aguas Andakí S.A.ES.P

Rep. Legal Amara Ingenieria SAS

Supervisión

Viernes, 12 de Diciembre de 2025

- Se realiza recorrido de todos los tramos a intervenir que son:
- Cr5 entre calle 5 a 7
- Cr3 entre calle 5 a 6
- Calle 5 entre Cr5 a 7
- Cr6 entre calle 4 a 5
- Calle 6 entre Cr1 y 2
- Cr2 entre calle 4 a 6

- Se recibe material de cemento, varillas 3/8", mallas electrosoldada 4mm, madera (tablas, cartones).
  - Cemento : 300 bultos
  - Varillas 3/8" : 200 und
  - Mallas Electrosoldad : 30 und
  - Alambre : 50kg
  - Puntilla : 1 arroba

Material para dar inicio a las actividades de obra.

Ing Carlos Tejada

Sabado, 13 de Diciembre de 2025

- Se recibe material de rio y triturado para la elaboración del concreto para la obra.

Ing. Carlos Tejada

Domingo, 14 de Diciembre de 2025

- No se labora día descanso

Ing Carlos Tejada

Lunes, 15 de Diciembre de 2025
- Sigue la recepción de material de río y triturado.
- Se realiza verificación con el maestro de obra en las primeras calles a intervenir calle 6 entre Cr 1 y 2 y Cr 5 entre calle 5 y 6, con el fin de organizar las actividades de Demolicion y Excavación.
- Se solicita el apoyo de Topografía para verificar niveles

Ing Carlos Tejada

Martes, 16 de Diciembre de 2025
- Se inicia trabajos de demolición en la Cr 5 entre calle 5 y 6.
- Se observa la mala condición de la berma existente en lado del Concejo en la misma Cr 5 y se procede a demoler el mismo.
- El material de escombro se retira inmediatamente para evitar obstrucción vehicular y peatonal.
- Se tomaron todas las previciones de seguridad en el trabajo y Señalización de Obra.

Ing Carlos Tejada

Miercoles, 17 de Diciembre de 2025
- Se continua con los trabajos de demolición y excavación en la Cr 5 entre Calle 5 y 6.
- Se realiza a su vez relleno y compactación de las áreas de cunetas ya demolidas y excavadas. se verifican niveles y una pendiente minima 2%.

Ing. Carlos Tejada

Jueves, 18 de Diciembre de 2025
- Se continuan las actividades de demolición y excavación en la Cr5.
- Se realiza una verificación de las condiciones de la Calle 6 entre Cr1 y 2, con el fin de iniciar proximamente los trabajos de cunetas en la misma.
- Se evidencia en la calle 6 la buena disposición de la comunidad en colaborar y apoyo en los trabajos, aportando información de los puntos y tuberias existentes en la vía.

Ing Carlos Tejada

Viernes, 19 de Diciembre de 2025
- En la Cr5 la comunidad Comercial por ser temporada Navideña no permite cerrar en su totalidad la vía, lo cual hace un poco incomodo y lento el trabajo de adecuación para hacer las cunetas y elementos de drenaje pluvial.
- Se logra colocar señalizaciones en áreas donde se esta interviniendo pero de manera parcial en la Cr5.

Ing Carlos Tejada

Sabado, 20 de Diciembre de 2025
- Se continua los trabajos de demolición, excavación y relleno en la Cr5.

Ing Carlos Tejada.

Domingo, 21 de Diciembre de 2025
- No se labora.

Ing Carlos Tejada

Lunes, 22 de Diciembre de 2025
- Continua con total normalidad las actividades en la Cr5.
- Se inicia los trabajos y actividades de excavación en la Calle 6 entre Cr 1 y 2.
- En el proceso de excavación nos encontramos con acometidas hidraulicas y tuberías sanitarias domiciliarias.

Ing Carlos Tejado

Martes, 23 de Diciembre de 2025
- Se continua con las actividades en obra en la Cr5 y Calle 6.
- Se procede hacer el bote de material de excavación con maquinaria retroexcavadora y volqueta en la Calle 6 y Cr5.

Ing Carlos Tejada

Miercoles, 24 de Diciembre de 2025
- No se laboró.

Ing Carlos Tejado

Jueves, 25 de Diciembre de 2025
- No se laboró dia festivo.

Ing Carlos Tejada.

Viernes, 26 de Diciembre de 2025
- Se inicia trabajos de vaciado de concreto en cunetas de la Cr5
- Se continua con las actividades de excavación y relleno para cunetas en la Calle 6.
- Con el apoyo del personal de Aguas Andakí se soluciona los inconvenientes de acometidas hidraulicas.

Ing Carlos Tejada

Sabado, 27 de Diciembre de 2025.
- Continua las actividades de relleno y compactación para cunetas en la Calle 6.
- Se continua con la actividad de vaciado de concreto en cunetas en la Cr5 de lado del concejo.

Ing Carlos Tejada

Domingo, 28 de Diciembre de 2025
- No se labora.

Ing Carlos Tejada

Lunes, 29 de Diciembre de 2025
- Continua con demolición en la Cr5 por el lado del Isimo y Vaciado de concreto en cunetas por el lado del concejo.
- Se inicia trabajo de encofrado y vaciado concreto en cunetas.

Ing Carlos Tejada

Martes, 30 de Diciembre de 2025
- Se realiza limpieza general y recolección de escombro en las dos vias que se esta interviniendo Cr5 y Calle 6.
- Se deja las vías intervenidas con sos respectivas señalización de obra, para evitar cualquier accidente.

Ing Carlos Tejada.

Miercoles, 31 de Diciembre de 2025
- Se inicia Suspension del contrato de mano de obra N° CPS 004, por consecuencia de la suspensión del convenio interadministrativo 098-2025 entre la empresa de servicios públicos Aguas Andaní S.A.ESP y el municipio de Belén de los Andaquies.

Ing Carlos Tejada.

Miercoles, 28 de Enero de 2026
- Se reinicia labores.
- Se continua las actividades de obra en la Cr5 y Calle 6.
- Se procede a continuar actividades de vaciado de concreto en cunetas de la Calle 6.
- Se continua demolición de rampas que invaden el espacio publico por donde esta trazado la cuneta, igualmente se continua con excavación en la Cr5.

Ing Carlos Tejada

Jueves, 29 de Enero de 2026
- Se continua actividades de obra con normalidad.
- En la calle 6 del lado izquierdo se continua el vaciado de cuneta y del lado derecho se termina el vaciado de cuneta y se inicia la excavación de caja sumidero y de 37 metros de zanja para tubería corrugada de 12" para conectar cajas y alcantarillado
- Lluvia en horas de la tarde se suspende actividades.

Ing Carlos Tejada.

Viernes, 30 de Enero de 2026
- Mañana despejada con algo de nubosidad.
- En la Cr5 del lado izquierdo del comercio del Isimo se termina todo el proceso de demolición y excavación y se procede a recojer los escombros
- En la Calle 6 se inicia el armado de acero de la caja y la instalación de tubería corrugada de 12".

Ing Carlos Tejada.

Sabado, 31 de Enero de 2026
- Lluvias fuertes todo el día no se laboro.

Ing Carlos Tejada

Domingo, 01 de Febrero de 2026
- Descanso, no se labora.

Ing Carlos Tejada

Lunes, 02 de Febrero de 2026.
- Se continua con el vaciado de concreto del lado derecho a la altura del fruvert de la Cr5, se termina la cuneta tipo cajon.
- Se termina instalación de formaleta en la caja de sumidero en la calle 6.
- Se organiza material para esta semana iniciar la calles.

Ing Carlos Tejada.

Martes, 03 de Febrero de 2026
- Del lado izquierdo de la Cr5, se realiza relleno y compactación para vaciado de cunetas.
- Se procede al vaciado de caja en la calle 6, con esta actividad se culmina lo contemplado en esta calle.
- Se abre otro frente de trabajo para el inicio de actividades de excavación y corte de raices en la calle 5 entre Cr5 y 6.
- Se realiza excavación de caja en la calle 5 por el lado del Colegio.

Ing Carlos Tejada

Miercoles, 04 de Febrero de 2026.
- Se procede el vaciado de cunetas del lado izquierdo de la Cr5 calle del isimo, Simultaneamente se hace el armado de acero de la caja del lado derecho del fruvert.
- Ademais se funden las dilatadores de la Cr5.
- Se continua con la excavación y encofrado de placa cuneta del lado izquierdo de la calle 5.

Ing Carlos Tejada

Jueves, 05 de Febrero de 2026
- Se inicia el vaciado de concreto en las placa cunetas del lado izquierdo de la Calle 5
- Se continua con el vaciado de cuneta del lado izquierdo del lado del isimo de la C.5.
- Se inicia actividad de encofrado de la caja de la C.5 del lado del frovert.

Ing Carlos Tejada

Viernes, 06 de Febrero de 2026
- Se continua con la fundición de placa cunetas del lado izquierdo de la calle 5.
- Se inicia la excavación de la caja del lado izquierdo de la C.5.
- Se recibe material de arena y triturado, y 180 bultos más de cemento.

Ing. Carlos Tejada.

Sabado, 07 de Febrero de 2026
- Se realiza la tala y desraizamiento de un árbol mediano que obstaculiza las cunetas del lado izquierdo de la Calle 5.
- Se funden 3 paños o placa cunetas del lado izquierdo de la calle 5.
-

Ing Carlos Tejada.

Domingo, 08 de Febrero de 2026
- Día de descanso, no se labora.

Ing Carlos Tejada

Lunes, 09 de Febrero de 2026
- Se inicia el armado del acero de la caja izquierda de la C15.
- Se continua actividades de relleno y compactación en la calles.

Ing Carlos Tejada

Martes, 10 de Febrero de 2026
- Dia soleado.
- Se realiza encofrado de placa cunetas de la C15 del lado izquierdo.
- Se continua con vaciado de concreto de placa cuneta de la calle 5.

Ing Carlos Tejada.

Miercoles, 11 de Febrero de 2026
- Dia soleado.
- Se hace vaciado de concreto en las placas cunetas del lado del isimo de la C15.
- Se continua con vaciado de concreto del lado izquierdo del colegio de la calle 5.

Ing Carlos Tejada.

Jueves, 12 de Febrero de 2026
- Dío Soleado
- Se hace el vaciado del solado de la caja del lado del frovert de la Crs.
- Se continua con la actividad de relleno, compactación y encofrado de cunetas en la Calles.

Ing Carlos Tejada

Viernes, 13 de Febrero de 2026
- Dia Nublado, lluvia fuerte en horas del medio dia.
- Se continua con vaciado de placas en cunetas de la calle 5.
- En horas de la tarde se procede a realizar tala de un arbol de pomo que obstaculiza el drenaje de aguas pluviales en la calle 5, donde se tiene previsto construir cuneta.
- Se realiza perfilación de caja del lado del isimo de la Crs que fue afectado por la lluvia.

Ing Carlos Tejada

Sabado, 14 de Febrero de 2026
- En horas de la mañana lluvias fuertes.
- Se logra hacer recolección y bote de escombros de la tala del arbol.

Ing Carlos Tejada

Domingo, 15 de Febrero de 2026
- Día de descanso, no se labora.

Ing Carlos Tejada

Lunes, 16 de Febrero de 2026
- En la mañana nublado y en hora de la tarde soleado.
- Por las fuertes lluvias amanecen las cajas llenas de agua se procede a drenarlas. y se continua con la excavación.
- Con la ayuda de maquinaria se procede a retirar escombro y tierra de desecho de excavación, ademas boto de raiz del arbol talado en la Calles.

Ing. Carlos Tejada

Martes, 17 de Febrero de 2026
- En horas de la mañana lluvias moderada.
- Nuevamente se procede a drenar agua de las cajas en construcción.
- Lluvia moderada en final de la tarde.

Ing. Carlos Tejada.

Miercoles, 18 de Febrero de 2026
- Dia soleado
- Se procede a armar acero y vaciado del Solado de la caja del lado del isimo, Crs.
- Se hace vaciado de caja del lado del fuvert de la Crs.
- Ademas se realiza vaciado de solado de la caja de la Calles.

Ing Carlos Tejada.

Jueves, 19 de Febrero de 2026.
- Día Nublado.
- Se ejecuta actividad de desencofrado de caja de lado del fruvert de la Cr5 y también la caja del isimo.
- Se realiza el proceso de encofrado de la caja de la calle 5.

Ing. Carlos Tejada.

Viernes, 20 de Febrero de 2026.
- Día Soleado.
- Se continua con la recolección y bote de material sobrante de excavación en la Cr5.
- Se continua con la actividad de vaciado de concreto en cunetas de la calle 5.
- Se procede a la instalación de tapas de concreto en la caja del lado del fruvert de la Cr5.

Ing. Carlos Tejada

Sabado, 21 de Febrero de 2026
- Día soleado
- Se procede a la instalación de tapa de la caja de la calle 6.
- Se continua con limpieza de escombros y tierra de excavación de la Cr5.
- Se termina el vaciado de cuneta tipo grada del lado del fruvert de la Cr5.

Ing. Carlos Tejada

Domingo, 22 de Febrero de 2026
- Dia de descanso, no se labora.

Ing. Carlos Tejada.

Lunes, 23 de Febrero de 2026
- Se inicia demolición de anden y excavación del lado derecho de la calle 5.
- Se realiza el vaciado de concreto de la caja de la calle 5.

Ing. Carlos Tejada.

Martes, 24 de Febrero de 2026
- Lluvia leve en horas de la mañana.
- Se continua demolición del lado derecho de la calle 5.
- Se desencofra la caja y se instala las tapas de caja de la calle 5.

Ing. Carlos Tejada

Miercoles, 25 de Febrero de 2026
- Llovizna en horas de la tarde.
- Se hace recolección y bote de material sobrante y escombro de excavación y demolición de la calle 5.
- Se planifica la contratación de más personal para proximamente iniciar la carrera 6.

Ing. Carlos Tejada

Jueves, 26 de Febrero de 2026
- Dia nublado por la mañana.
- Se continua trabajando sobre la calle 5 entre carrera 5 y 6, en demolición y excavación.
- Se raliza la actividad de encofrado y vaciado de dilataciones materas de los arboles del la izquierdo de la calle 5.

Ing. Carlos Tejada.

Viernes, 27 de Febrero de 2026
- Clima despejado.
- Se continua con el vaciado de placa contra del lado izquierdo de la calle 5 entre carrera 5 y 6.
- Ademas se terminan de construir las dilataciones del lado derecho del Colegio en la calls entre cr 5 y 6.

Ing. Carlos Tejada

Sabado, 28 de Febrero de 2026.
- Clima Nublado en horas de la mañana.
- Se inicia actividad de excavación y demolición del lado izquierdo de la calle 5 entre la carrera 6 y 7.

Ing. Carlos Tejada

Lunes, 02 de Marzo de 2026
- Se continua con la actividad de demolicion y excavación de la calles entre carrera 6 y 7 lado izquierdo.

Ing. Carlos Tejada.

Martes, 03 de Marzo de 2026.
- Clima despejado
- Se continua con trabajos de excavación del lado izquierdo de la calle 5 entre Cr 6 y 7.
- Se sigue con la actividad de vaciado de placa cuneta de la calle 5 entre Cr 5 y 6.
- Se realiza la recolección de escombros con maquina retroexcavador y volqueta.
- Se realiza la señalización correspondiente de obra, bajo la supervisión de la profesional en seguridad laboral.

Ing. Carlos Tejada.

Miercoles, 04 de Marzo de 2026.
- Clima despejado en la mañana y llovizna en horas de la tarde.
- Con el apoyo de la Alcaldía Municipal se procede a la tala de un arbol frutal (Pomo) que obstroia el drenaje fluvial del lado izquierdo y la empresa con el apoyo de Aguas Andaki se realizo el bote de ramas y troncos.

Ing. Carlos Tejada

Jueves, 05 de Marzo de 2026.
- Llovizna en horas de la mañana.
- Se continua con la recolección de escombros y troncos en la Calle 5.
- Se inicia excavación de cunetas tipo placa del lado derecho de la Calle 5 entre Cr 6 y Cr 7.

Ing Carlos Tejada

Viernes, 06 de Marzo de 2026
- Clima Nublado en horas de la mañana, lluvazos en la tar
- Se continua con las actividades de excavación, recolecció de escombros y ramas de arbol talado, en la Calle 5 entre Cr 6 y Cr 7.

Ing. Carlos Tejada

Sabado, 07 de Marzo de 2026
- Llovizna en horas de la mañana.
- Por motivo de lluvia en esta semana las actividades de vaciado de concreto se suspendieron, se estan adelantando actividades de excavacion, demolición y bote de material de desecho ó escombros.

Ing. Carlos Tejada

Lunes, 09 de Marzo de 2026
- Lluvias fuertes durante todo el día.
- No se pudo trabajar de manera continua, causado por las fuertes lluvias de hoy.

Ing. Carlos Tejada

Martes, 10 de Marzo de 2026
- Dia Soleado,
- Se continua con las actividades de perfilación de cunetas, nivelación, relleno y corte de asfalto de la Calle 5 entre Cr 5 y Cr 6, Cr 6 y Cr 7.
- La profesional SiSo realiza actividades de pausas activas

y Charlas de capacitación al personal de Obra.
- Aprovechando el buen clima se procede al bote de material de escombros.
- En horas de la tarde se deja la obra debidamente señalizada pare evitar cualquier incidente.

Ing. Carlos Tejada

Miercoles, 11 de Marzo de 2026
- Mañana con clima Noblado, en horas de la tarde lluvia fuerte.
- En horas de la mañana se hace simbrado para posterior iniciar el corte de asfalto del lado izquierdo de la calle 5 entre Cr6 y Cr7, asi como también en la parte de arriba de la calles entre Cr5 y Cr6 del lado derecho frente al fruvert.
- A partir de las 2:20pm inicia fuerte lluvia el resto de la tarde.

Ing. Carlos Tejada

Jueves, 12 de Marzo de 2026
- Mañana con clima despejado.
- Se continua con trabajo de demolición de asfalto y excavación del lado izquierdo de la calle 5 entre Cr6 y Cr7.

Ing Carlos Tejada

Viernes, 13 de Marzo de 2026
- Clima despejado soleado.
- Se continua con los trabajos de excavación en la calles entre Cr6 y Cr7 lado izquierdo, y se inicia demolición y escavación de asfalto de la parte de arriba lado derecho de la Calle 5 entre Cr5 y Cr6 al frente del fruvert
- A su vez se inicia trabajo de excavación del lado izquierdo

de la Carrera 6 entre Calles 4 y Calle 5.

Ing. Carlos Tejada.

Sabado, 14 de Marzo de 2026
- Clima despejado horas de la mañana.
- Se esta dejando todas las actividades de excavación y relleno de cunetas de la calle 5 ya lista con el fin que la proxima semana nos dediquemos a vaciar concreto.
- Se recibe suministro de madera, tiras y listones para formaletear cunetas.

Ing. Carlos Tejada.

Lunes, 15 de Marzo de 2026
- Clima Nublado horas de la mañana, despejado en la tarde.
- Se realiza la actividad de formaleta de placas cunetas de calle 5 lado derecho entre la Cr 5 y Cr 6.
- Tambien se procede a la instalación de malla electrosoldada en cunetas de la calle 5.

Ing. Carlos Tejada.

Martes, 16 de Marzo de 2026
- Clima Soleado.
- Se continua con las actividades de instalación de formaletas del lado derecho de la calle 5 entre Cr 5 y Cr 6.
-

Ing. Carlos Tejada.

Miercoles, 17 de Marzo de 2026
- Clima Despejado
- Se realiza demolición de anden que invade espacio público del lado derecho de la calle 5 especificamente al frente de Hotel
- Además se realiza recoleccion de escombros proveniento de la demolición.

Ing. Carlos Tejada

Jueves, 18 de Marzo de 2026
- Clima Despejado
- Se inicia vaciado de placas cunetas del lado derecho de la Calle 5 Cr 5 y Cr 6
- Además se funden 4 placas pendientes por Vaciar concreto del lado izquierdo de la calle 5 entre Cr 5 y Cr 6.

Ing. Carlos Tejada

Viernes, 19 de Marzo de 2026
- Clima Despejado
- Se suspende la actividad de vaciado de concreto por daño en las paletas y tolva de la mezcladora.
- Se continua con trabajos de instalación de formaletas en la calle 5 Cr 5 y Cr 6.
- Se continua con excavación y relleno de cunetas en la Carrera 6 entre Calle 4 y Calle 5.
- Se realiza demolición de parte de rampa de acceso a parqueadero de la Calle entre Cr 5 y Cr 6.

Ing. Carlos Tejada

Sabado, 21 de Marzo de 2026
- Clima Soleado
- Se ejecuta demolición de anden al frente de la oficina de electrocaqueta.

Ing. Carlos Tejada

Lunes, 23 de Marzo de 2026
- Día festivo no laborable

Ing. Carlos Tejada.

Martes, 24 de Marzo de 2026
- Clima Soleado y Despejado
- Se completa los trabajos de instalación de formaletas en el lado derecho especificamente a la altura de la oficina de energía hasta pasado el hotel.
- Se planea el día de mañana realizar la fundición de la placa cuneta.

Ing. Carlos Tejada

Miercoles, 25 de Marzo de 2026
- Clima Soleado.
- Se realiza la actividad de fundición de placas cunetas en la calle 5 entre Cr5 y Cr6 por el lado del hotel.
- Mañana se estima seguir con esta actividad.

Ing. Carlos Tejada.

Jueves, 26 de Marzo de 2026
- Clima Despejado.
- Se suspende la actividad de vaciado de Concreto por avería de la mezcladora.
- Se continua con trabajos de excavación en la Carrera 6 entre calle 4 y Calle 5, además Calle 5 entre Cr6 y Cr7.
- Queda arreglada la mezcladora, para mañana se continua con la actividad de vaciado ó fundición de concreto en placas cunetas del lado derecho de la Calle 5 entre Cr 5 y Cr 6.

Ing. Carlos Tejada.

Viernes, 27 de Marzo de 2026
- Clima Despejado y Soleado.
- Se continua con las actividades de vaciado de concreto y armado de formaleta, en la Calle 5 entre Cr 5 y Cr 7 del lado derecho.
- En la parte de abajo de la Calle 5 Cr6 y Cr7, se define el tipo de dilatador a construir y además se socializa a la comunidad el tipo de acabado que se dejara en la cuneta y el diseño del mismo.

Ing. Carlos Tejada

Sabado, 28 de Marzo de 2026
- Clima Despejado
- Se procede a realizar limpieza general de la obra con ayuda de retroexcavadora.
- Se deja la obra con la señalización necesaria.

Ing. Carlos Tejada

Lunes, 30 de Marzo de 2026
- Clima Soleado en la mañana.
- Se realiza tala y desraizamiento de arbol mediano de la Calles entre Cr5 y Cr6 al frente de la barberia, el cual obstruia el drenaje de agua pluvial.
- Se continua Vaciado de placa cuneta.

Ing Carlos Tejada

Martes, 31 de Marzo de 2026
- Clima Despejado
- Se continua con el vaciado de concreto en placa cuneta de la Calles del lado derecho Cr5 y Cr6.
- Se inicia la fundición de cunetas en la misma calle pero entre Cr6 y Cr7, se logra fundir al final de la tarde 4 placas

Ing Carlos Tejada

Miercoles, 01 de Abril de 2026.
- Clima Soleado.
- Se continua con vaciado de concreto en placas cunetas en la calls entre Cr6 y Cr7 lado derecho.
- Además por esa calle y mismo lado se va alistando con formaleta para posterior fundir.

Ing Carlos Tejada

Jueves, 02 de Abril de 2026
- Clima Soleado.
- Se solicita material de arena para la preparación de concreto.
- El proveedor manifiesta que mañana llega el material de río solicitado.
- Se vacia el concreto en placa cunetas de la calle 5 Cr6 y Cr7 del lado derecho.
- Al final de la tarde se agota el material de arena gruesa.

Ing. Carlos Tejada

Viernes, 03 de Abril de 2026.
- Clima Soleado.
- Se realizan trabajo de alistado de formaletas en cunetas.
- En espera del material solicitado (arena).

Ing. Carlos Tejada

Sabado, 04 de Abril de 2026
- Clima soleado
- En horas de la mañana se realiza limpieza general de la obra.
- En horas del medio dia empiezan a llegar 3 viajes de volquetas con material de arena. El proveedor manifiesta retraso en el despacho del material debido a la falta de transporte y disponibilidad del material por Semana Santa.

Ing Carlos Tejada

lunes, 06 de Abril de 2026.
- Clima Llovia Fuerte todo el día, no se pudo laborar.

Ing. Carlos Tejada.

Martes, 07 de Abril de 2026
- Clima: Lluvia fuerte desde horas de la mañana hasta las 4:00 pm.
- Se presento una emergencia con una beneficiaria por las fuertes lluvias, se inundo la vivienda, el personal en obra le presta la colaboración en la limpieza de cuneta, remoción de hojas en cajas de drenaje, con el fin de mitigar la circulación de agua pluvial en el sector.

Ing. Carlos Tejada

Miercoles, 08 de Abril de 2026
- Clima Soleado
- Se continua con las actividades de vaciado de concreto en la Calle 5 entre carrera 6 y Carrera 7. Se inicia la fundición del lado izquierdo con 4 placas y se continua del lado derecho con la misma actividad y se le suma el armado y encofrado del dilatador de concreto.

Ing. Carlos Tejada

Jueves, 09 de Abril de 2026
- Clima Soleado
- Se continua con la actividad de vaciado de concreto en placa cuneta, dilatador y cuneta en "V" de ambos lado de la calles.

Ing Carlos Tejada

Viernes. 10 de Abril de 2026
- Clima Despejado
- Se realiza trabajos de limpieza y vaciado de concreto del lado izquierdo de la calles entre Cr.6 y Cr.7, en placa y cunetas en "V".

Ing. Carlos Tejada

Lunes, 13 de Abril de 2026.
- Se realiza trabajos de recolección y bote de escombros proveniente de tala de arboles y demolición.
- Se espera el suministro de material arena.

Ing. Carlos Tejada

Martes, 14 de Abril de 2026
- Clima Soleado
- En horas de la mañana se reciben 5 volquetas de material arena de río.
- En horas de la tarde se continua con el vaciado de concreto en placas y cunetas en "V" de la Calles.

Ing. Carlos Tejada

Miercoles, 15 de Abril de 2026
- Clima Soleado.
- Se continua con fundición de cunetas en la calles del lado izquierdo entre Cr.6 y Cr.7.

Ing. Carlos Tejada

Jueves, 16 de Abril de 2026.
- Clima Soleado.
- Se ejecuta tala de arbol frutal de Pomo, que obstruia la construcción de la cuneta del lado izquierdo de la calle 5.
- Se alistan y encofran más espacios para placa y cuneta en "V", en la calles Cr 6 y Cr 7 lado izquierdo.

Ing Carlos Tejada

Viernes, 17 de Abril de 2026
- Clima Despejado
- Se continua con el encofrado de las cunetas tipo "V" al final de la calls del lado izquierdo.
- Se ejecuta demolición de rampa pequeña del lado izquierda

Ing. Carlos Tejada

Sabado, 18 de Abril de 2026.
- Aseo general de la obra y señalización, bote de escombros etc.

Ing. Carlos Tejada

Lunes, 20 de Abril de 2026
-Clima Soleado.
- Se realiza tala y desraizamiento de otro arbol de Pomo.
- Se ejecuta reparación y adecuación de dilatador del lado derecho de la vía.
- Se inicia ó continua el vaciado de cunetas tipo "V" del lado izquierdo de la calle 5.

Ing. Carlos Tejada

Martes, 21 de Abril de 2026
- Clima nublado en horas de la mañana, Despejado en la tarde.
- Se continua con el vaciado de la placa y cuneta tipo "V" del lado izquierdo de la calles entre Cr 6 y 7.

Ing. Carlos Tejada

Miercoles, 22 de Abril de 2026
- Clima: Lluvias moderadas durante todo el día.
- Se trabaja de manera itermitente por motivo de lluvia, solo actividades de alistamiento, no se puede hacer fundición.

Ing. Carlos Tejada

Jueves, 23 de Abril de 2026
- Clima lluvias fuertes durante horas de la mañana.
- Se hace trabajo de alistamiento de placa cunetas del lado izquierdo de la Cr 6 entre Cl 4 y 5.

Ing. Carlos Tejada

Viernes, 24 de Abril de 2026
- Clima Despejado Soleado.
- Se recibe 2 volquetas de material granular triturado.
- Se reanuda trabajos de vaciado de placa y cunetas de la calle 5.

Ing. Carlos Tejada

Sabado, 25 de Abril de 2026
- Clima Despejado.
- Se culmina trabajos de fundicion de concreto en placas y cunetas del lado izquierdo de la Calle 5 entre Cr 6 y 7.

Ing. Carlos Tejada

Lunes, 27 de Abril de 2026
- Clima Nublado. Lluvias fuertes en horas de la tarde.
- Se recibe material Cemento en horas de la mañana.
- En la mañana se logra fundir parte de las placas cunetas de la C16, pero se para la actividad por lluvia. Se procede a proteger lo que se fundio con cuacho plastico.

Ing. Carlos Tejada

Martes, 28 de Abril de 2026
- Clima Despejado.
- La mezcladora supre tres roturas en la tolva de mezclado, se para la actividade de vaciado.
- Se realiza actividad de alistamiento de placas cunetas (relleno, compactacion y encofrado) en la C16 entre C14 y 5.
- Al final de la tarde se termina de reparar la mezcladora

Ing. Carlos Tejada

Miercoles, 29 de Abril de 2026.
- Clima Soleado
- Se retoma trabajo de fundicion de placa cuneta del lado de la C16 entre C14 y 5.

Ing. Carlos Tejada

Jueves, 30 de Abril de 2026
- Clima Despejado
- Se recupera significativamente los trabajos de vaciado de concreto en las placas cunetas y cunetas en "V" de la Calle Carre6 entre Calle 4 y 5 del Lado izquierdo.

Ing. Carlos Tejada.

ORLANDA PAREDES DE MOLINA
CONTADORA PÚBLICA
T.P.34437-T
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

CONSTANCIA CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES A LOS SISTEMAS DE SALUD, PENSIONES, ARP Y OBLIGACIONES PARAFISCALES

Belén de los Andaquíes,13 de mayo de 2026

Yo, **ORLANDA PAREDES DE MOLINA**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 26.616.866 expedida en Florencia Caquetá, y con Tarjeta Profesional No. 34437-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisora Fiscal de la Empresa de Servicios Públicos AGUAS ANDAKI S.A. E.S.P. con NIT: 900.252.778-7, manifiesto bajo la gravedad del juramento: Que la Empresa ha cumplido a 30 de abril de 2026 y se encuentra a PAZ Y SALVO, con las obligaciones a los Sistemas de Salud, Pensiones, ARP señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Belén de los Andaquíes Caquetá, a los trece (13) días del mes de mayo de 2026.

ORLANDA PAREDES DE MOLINA
C.C. No. 26.616.866 de Florencia
Contador Público T.P 157511-T

Carrera 13 No. 9-84 Barrio Juan XXIII
Teléfono (068) 4364081 Celular 3203436749
E-mail: orlanda.paredes@yahoo.es
Florencia Caquetá

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900252778
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			AGUAS ANDAKI SA ESP
CIUDAD/MUNICIPIO:	BELEN DE LOS ANDAQUIES	DEPARTAMENTO:	CAQUETA
DIRECCIÓN:	CALLE 4 4-31	TELÉFONO:	4316334
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	MIXTA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Captación, tratamiento y distribución de agua.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**6018098873**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			13				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/05/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			278840776

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 1.373.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.300	$ 0	$ 1.373.800	$ 12.300	$ 1.386.100
230201	230201- PROTECCION	1	$ 705.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.400	$ 0	$ 705.200	$ 6.400	$ 711.600
230301	230301-PORVENIR	8	$ 2.714.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.300	$ 0	$ 2.714.600	$ 24.300	$ 2.738.900
SUBTOTALES:										**$ 4.793.600**	**$ 43.000**	**$ 4.836.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 449.800	$ 0	$ 4.100	$ 0	$ 449.800	$ 4.100	$ 0	$ 453.900
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	7		$ 0		$ 0		$ 0	$ 587.400	$ 0	$ 5.300	$ 0	$ 587.400	$ 5.300	$ 0	$ 592.700
ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 161.600	$ 0	$ 1.500	$ 0	$ 161.600	$ 1.500	$ 0	$ 163.100
SUBTOTALES:													**$ 1.198.800**	**$ 10.900**	**$ 0**	**$ 1.209.700**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	13		$ 0	$ 0		$ 0	$ 852.200	$ 852.200	$ 7.700	$ 0	$ 859.900
SUBTOTALES:									**$ 852.200**	**$ 7.700**	**$ 0**	**$ 859.900**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF13	CCF13-COMFACA	13	$ 1.198.800	$ 10.800	$ 1.209.600
SUBTOTALES:			**$ 1.198.800**	**$ 10.800**	**$ 1.209.600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES										
																												PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	PERSONA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1006607512	TIQUE GUZMAN BERSON DAVID	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI									01-30								230301-PORVENIR	30	$ 1.881.427	$ 301.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 301.100	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.881.427	$ 75.300	$ 0	$ 75.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.881.427		$ 45.900	30	$ 1.881.427	$CCF13-COMFACA	$ 75.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1007481548	BECERRA CASTAÑO CRISTIAN ESNEIDER	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI									01-30								230301-PORVENIR	30	$ 2.333.080	$ 373.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 373.300	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.333.080	$ 93.400	$ 0	$ 93.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 2.333.080		$ 56.900	30	$ 2.333.080	$CCF13-COMFACA	$ 93.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1078751990	QUEVEDO ROJAS JUNIOR STIVEN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI									01-30								230301-PORVENIR	30	$ 2.596.114	$ 415.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 415.400	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.596.114	$ 103.900	$ 0	$ 103.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 2.596.114		$ 63.300	30	$ 2.596.114	$CCF13-COMFACA	$ 103.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1115793764	HOYOS MUÑOZ KERLY JULIETH	DEPEND		$ 2.257.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.257.000	$ 361.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 361.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 2.257.000	$ 90.300	$ 0	$ 90.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 2.257.000		$ 11.800	30	$ 2.257.000	$CCF13-COMFACA	$ 90.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1115794598	SABI MANZANARES EDWIN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI									01-30								230301-PORVENIR	30	$ 1.891.375	$ 302.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 302.700	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.891.375	$ 75.700	$ 0	$ 75.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.891.375		$ 46.100	30	$ 1.891.375	$CCF13-COMFACA	$ 75.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1117487679	CALDERON VILLEGAS INDRID ALEJANDRA	DEPEND		$ 4.407.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 4.407.000	$ 705.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 705.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 4.407.000	$ 176.300	$ 0	$ 176.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 4.407.000		$ 308.800	30	$ 4.407.000	$CCF13-COMFACA	$ 176.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900252778
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			AGUAS ANDAKI SA ESP
CIUDAD/MUNICIPIO:	BELEN DE LOS ANDAQUIES	DEPARTAMENTO:	CAQUETA
DIRECCIÓN:	CALLE 4 4-31	TELÉFONO:	4316334
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	MIXTA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Captación, tratamiento y distribución de agua.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6018098873**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	13						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/05/04			NÚMERO AUTORIZACIÓN:			278540778

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																													PENSIÓN								SALUD							ARP				CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RESIDENTE TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
7	CC 1117544178	VELASQUEZ TAPIERO LILIANA PATRICIA	DEPEND		$ 1.794.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.794.000	$ 287.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 287.100	ESSC62-ASMET SALUD EPS	30	$ 1.794.000	$ 71.800	$ 0	$ 71.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.794.000		$ 9.400	30	$ 1.794.000	$CCF13-COMFACA	$ 71.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 17684142	MORENO LADINO OSCAR MAURICIO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI										01-30								230301-PORVENIR	30	$ 1.881.427	$ 301.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 301.100	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.881.427	$ 75.300	$ 0	$ 75.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.881.427		$ 45.900	30	$ 1.881.427	$CCF13-COMFACA	$ 75.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 17684962	BETANCOURTH PINEDA RUSELL	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI										01-30								230301-PORVENIR	30	$ 2.341.707	$ 374.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 374.700	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.341.707	$ 93.700	$ 0	$ 93.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.341.707		$ 57.100	30	$ 2.341.707	$CCF13-COMFACA	$ 93.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 17684714	ALAPE CHAGUALA ALBEIRO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI										01-30								25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.750.905		$ 42.700	30	$ 1.750.905	$CCF13-COMFACA	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 73141560	BLANCO PEREZ ISRAEL	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI										01-30								25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.695.200	$ 431.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 431.300	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 2.695.200	$ 107.900	$ 0	$ 107.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.695.200		$ 65.700	30	$ 2.695.200	$CCF13-COMFACA	$ 107.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 76311449	VALENCIA DIRANDO JESUS ANTONIO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI										01-30								25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.881.427	$ 301.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 301.100	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.881.427	$ 75.300	$ 0	$ 75.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.881.427		$ 45.900	30	$ 1.881.427	$CCF13-COMFACA	$ 75.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 80813852	CASTRO VARGAS GLOVIANDY	DEPEND		$ 2.140.000	FIJO			SI										01-30								230301-PORVENIR	30	$ 2.244.568	$ 359.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 359.200	ESSC62-ASMET SALUD EPS	30	$ 2.244.568	$ 89.800	$ 0	$ 89.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.244.568		$ 54.700	30	$ 2.244.568	$CCF13-COMFACA	$ 89.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 8.115.800

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900252778
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			AGUAS ANDAKI SA ESP
CIUDAD/MUNICIPIO:	BELEN DE LOS ANDAQUIES	DEPARTAMENTO:	CAQUETA
DIRECCIÓN:	CALLE 4 4-31	TELÉFONO:	4318334
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	MIXTA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Captación, tratamiento y distribución de agua;
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			6012049277	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	marzo	AÑO 2026
DIAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/03/17	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			148090241

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 705.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 705.200	$ 0	$ 705.200
25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 1.305.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.305.100	$ 0	$ 1.305.100
230301	230301-PORVENIR	8	$ 2.616.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.616.900	$ 0	$ 2.616.900
SUBTOTALES:										**$ 4.627.200**	**$ 0**	**$ 4.627.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 164.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 164.000	$ 0	$ 0	$ 164.000
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 432.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 432.600	$ 0	$ 0	$ 432.600
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	7		$ 0		$ 0		$ 0	$ 560.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 560.600	$ 0	$ 0	$ 560.600
SUBTOTALES:													**$ 1.157.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.157.200**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	13		$ 0	$ 0		$ 0	$ 824.800	$ 824.800	$ 0	$ 0	$ 824.800
SUBTOTALES:									**$ 824.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 824.800**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF13	CCF13-COMFACA	13	$ 1.157.200	$ 0	$ 1.157.200
SUBTOTALES:			**$ 1.157.200**	**$ 0**	**$ 1.157.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES						
																												PENSIÓN							SALUD							ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RESIDENTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1006807512	TIQUE GUZMAN GERSON DAVID	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905		$ 42.700	30	$ 1.750.905	$CCF13-COMFACA	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1007451548	BECERRA CASTAÑO CRISTIAN ESNEIDER	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI									01-30									230301-PORVENIR	30	$ 2.402.720	$ 384.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 384.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.402.720	$ 96.200	$ 0	$ 96.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 2.402.720		$ 58.600	30	$ 2.402.720	$CCF13-COMFACA	$ 96.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1078751990	QUEVEDO ROJAS JUNIOR BYRON	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI									01-30									230301-PORVENIR	30	$ 2.391.975	$ 382.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 382.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.391.975	$ 95.700	$ 0	$ 95.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 2.391.975		$ 58.300	30	$ 2.391.975	$CCF13-COMFACA	$ 95.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1115793784	HOYOS MUÑOZ KERLY JULIETH	DEPEND		$ 2.257.000	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.257.000	$ 361.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 361.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 2.257.000	$ 90.300	$ 0	$ 90.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 2.257.000		$ 11.800	30	$ 2.257.000	$CCF13-COMFACA	$ 90.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1115794598	BARI MANZANARES LOWIN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905		$ 42.700	30	$ 1.750.905	$CCF13-COMFACA	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1117487679	CALDERON VILLEGAS INGRID ALEJANDRA	DEPEND		$ 4.407.000	FIJO			SI																		230201-PROTECCION	30	$ 4.407.000	$ 705.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 705.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 4.407.000	$ 176.300	$ 0	$ 176.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 4.407.000		$ 306.800	30	$ 4.407.000	$CCF13-COMFACA	$ 176.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900252778
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			AGUAS ANDAKI SA ESP
CIUDAD/MUNICIPIO:	BELEN DE LOS ANDAQUIES	DEPARTAMENTO:	CAQUETA
DIRECCIÓN:	CALLE 4 4-31	TELÉFONO:	4316334
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	MIXTA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Captación, tratamiento y distribución de agua.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	6012649277			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES febrero	AÑO 2026		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES marzo AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/03/17			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	148090241

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES							
																													PENSIÓN								SALUD								ARP					CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
7	CC 1117544178	VELASQUEZ TAPIERO LILIANA PATRICIA	DEPEND		$ 1.899.575	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.899.575	$ 304.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 304.000	ESSC62-ASMET SALUD EPS	30	$ 1.899.575	$ 76.000	$ 0	$ 76.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.899.575		$ 10.000	30	$ 1.899.575	$CCF13-COMFACA	$ 76.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 17584142	MORENO LADINO OSCAR MAURICIO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905		$ 42.700	30	$ 1.750.905	$CCF13-COMFACA	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 17684562	BETANCOURTH PINEDA RUBEL	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI										01-30								230301-PORVENIR	30	$ 2.207.205	$ 353.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 353.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.207.205	$ 88.300	$ 0	$ 88.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 2.207.205		$ 53.800	30	$ 2.207.205	$CCF13-COMFACA	$ 88.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 17684714	ALAPE CHAGUALA ALBEIRO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905		$ 42.700	30	$ 1.750.905	$CCF13-COMFACA	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 73141560	BLANCO PEREZ ISRAEL	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI										01-30								25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.396.352	$ 383.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 383.500	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 2.396.352	$ 95.900	$ 0	$ 95.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 2.396.352		$ 58.400	30	$ 2.396.352	$CCF13-COMFACA	$ 95.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 79311448	VALENCIA OBANDO JUBUS ANTONIO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905		$ 42.700	30	$ 1.750.905	$CCF13-COMFACA	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 80813852	CASTRO VARGAS GEOVANDY	DEPEND		$ 2.140.000	FIJO			SI										01-30								230301-PORVENIR	30	$ 2.198.363	$ 351.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 351.800	ESSC62-ASMET SALUD EPS	30	$ 2.198.363	$ 88.000	$ 0	$ 88.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 2.198.363		$ 53.600	30	$ 2.198.363	$CCF13-COMFACA	$ 88.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 7.766.400

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900252778
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			AGUAS ANDAKI SA ESP
CIUDAD/MUNICIPIO:	BELEN DE LOS ANDAQUIES	DEPARTAMENTO:	CAQUETA
DIRECCIÓN:	CALLE 4 4-31	TELÉFONO:	4316334
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	8-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	MIXTA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Captación, tratamiento y distribución de agua.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**6007445997**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/02/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			60867223

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	8	$ 2.831.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.831.800	$ 0	$ 2.831.800
230201	230201- PROTECCION	1	$ 705.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 705.200	$ 0	$ 705.200
25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 1.337.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.337.600	$ 0	$ 1.337.600
SUBTOTALES:										**$ 4.874.600**	**$ 0**	**$ 4.874.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	7		$ 0		$ 0		$ 0	$ 617.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 617.900	$ 0	$ 0	$ 617.900
ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 158.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 158.400	$ 0	$ 0	$ 158.400
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 442.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 442.700	$ 0	$ 0	$ 442.700
SUBTOTALES:													**$ 1.219.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.219.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	13		$ 0	$ 0		$ 0	$ 864.600	$ 864.600	$ 0	$ 0	$ 864.600
SUBTOTALES:									**$ 864.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 864.600**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF13	CCF13-COMFACA	13	$ 1.219.000	$ 0	$ 1.219.000
SUBTOTALES:			**$ 1.219.000**	**$ 0**	**$ 1.219.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE											NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																											PENSIÓN							SALUD						ARP																
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																		CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	RESIDENTE	PERSONA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1006507512	TIQUE GUZMAN GILSON DAVID	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI									01-30									230301-PORVENIR	30	$ 1.931.169	$ 309.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 309.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.931.169	$ 77.300	$ 0	$ 77.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.931.169		$ 47.100	30	$ 1.931.169	CCF13-COMFACA	$ 77.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1007461548	BECERRA CASTAÑO CRISTIAN LEMLOELR	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI									01-30									230301-PORVENIR	30	$ 2.483.499	$ 397.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 397.400	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.483.499	$ 99.400	$ 0	$ 99.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 2.483.499		$ 60.500	30	$ 2.483.499	CCF13-COMFACA	$ 99.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1078751990	OLAVELDO ROJAS JUNIOR STIVEN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI									01-30									230301-PORVENIR	30	$ 2.702.364	$ 432.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 432.400	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.702.364	$ 108.100	$ 0	$ 108.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 2.702.364		$ 65.900	30	$ 2.702.364	CCF13-COMFACA	$ 108.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1115793764	HOYOS MUÑOZ KERLY JULETH	DEPEND		$ 2.257.000	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.257.000	$ 361.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 361.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 2.257.000	$ 90.300	$ 0	$ 90.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 2.257.000		$ 11.800	30	$ 2.257.000	CCF13-COMFACA	$ 90.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1115794598	SABI MANZANARES EDWIN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI									01-30									230301-PORVENIR	30	$ 2.399.137	$ 383.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 383.900	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.399.137	$ 96.000	$ 0	$ 96.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 2.399.137		$ 58.500	30	$ 2.399.137	CCF13-COMFACA	$ 96.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1117487679	CALDERON VILLEGAS INGRID ALEJANDRA	DEPEND		$ 4.407.000	FIJO			SI																		230201-PROTECCION	30	$ 4.407.000	$ 705.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 705.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 4.407.000	$ 176.300	$ 0	$ 176.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 4.407.000		$ 306.800	30	$ 4.407.000	CCF13-COMFACA	$ 176.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900252778
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			AGUAS ANDAKI SA ESP
CIUDAD/MUNICIPIO:	BELEN DE LOS ANDAQUIES	DEPARTAMENTO:	CAQUETA
DIRECCIÓN:	CALLE 4 4-31	TELÉFONO:	4316334
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	MIXTA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Captación, tratamiento y distribución de agua.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6007445997**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES enero AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES febrero	AÑO	2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/02/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			60867223

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900252778
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			AGUAS ANDAKI SA ESP
CIUDAD/MUNICIPIO:	BELEN DE LOS ANDAQUIES	DEPARTAMENTO:	CAQUETA
DIRECCIÓN:	CALLE 4 4-31	TELÉFONO:	4316334
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	MIXTA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Captación, tratamiento y distribución de agua.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**6004818611**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	enero	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			8				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/01/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			17443966

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 641.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.200	$ 0	$ 641.000	$ 3.200	$ 644.200
230301	230301-PORVENIR	9	$ 2.869.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.100	$ 0	$ 2.869.300	$ 14.100	$ 2.883.400
25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 1.133.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.800	$ 0	$ 1.133.800	$ 5.800	$ 1.139.400
SUBTOTALES:										**$ 4.644.100**	**$ 22.900**	**$ 4.667.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	8		$ 0		$ 0		$ 0	$ 617.200	$ 0	$ 3.100	$ 0	$ 617.200	$ 3.100	$ 0	$ 620.300
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 390.600	$ 0	$ 2.000	$ 0	$ 390.600	$ 2.000	$ 0	$ 392.600
ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 153.700	$ 0	$ 800	$ 0	$ 153.700	$ 800	$ 0	$ 154.500
SUBTOTALES:													**$ 1.161.500**	**$ 5.900**	**$ 0**	**$ 1.167.400**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	14		$ 0	$ 0		$ 0	$ 818.500	$ 818.500	$ 4.100	$ 0	$ 822.600
SUBTOTALES:									**$ 818.500**	**$ 4.100**	**$ 0**	**$ 822.600**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF13	CCF13-COMFACA	14	$ 1.161.500	$ 5.700	$ 1.167.200
SUBTOTALES:			**$ 1.161.500**	**$ 5.700**	**$ 1.167.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN							SALUD						ARP										CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	RETIRA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1006607512	TIQUE GUZMAN DIBSON DAVID	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI									01-30								230301-PORVENIR	30	$ 1.668.083	$ 266.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 266.900	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.668.083	$ 66.800	$ 0	$ 66.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.668.083		$ 40.700	30	$ 1.668.083	SCCF13-COMFACA	$ 66.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1007461546	BEDOYA CASTAÑO CRISTIAN LENEIDER	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI									01-30								230301-PORVENIR	30	$ 2.453.596	$ 392.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 392.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.453.596	$ 98.200	$ 0	$ 98.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.453.596		$ 59.800	30	$ 2.453.596	SCCF13-COMFACA	$ 98.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 10474459	RANGEL BERRIO JULIO CESAR	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI	30								01-30								230301-PORVENIR	30	$ 1.691.377	$ 270.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 270.700	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.691.377	$ 67.700	$ 0	$ 67.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.691.377		$ 41.300	30	$ 1.691.377	SCCF13-COMFACA	$ 67.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1076751990	QUEVEDO ROJAS JUNIOR STIVEN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI									01-30								230301-PORVENIR	30	$ 2.771.620	$ 443.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 443.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.771.620	$ 110.900	$ 0	$ 110.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.771.620		$ 67.600	30	$ 2.771.620	SCCF13-COMFACA	$ 110.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1115793764	HOYOS MUÑOZ KURLY JULIETH	DEPEND		$ 2.051.862	FIJO		SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.051.862	$ 328.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 328.300	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.051.862	$ 82.100	$ 0	$ 82.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.051.862		$ 10.800	30	$ 2.051.862	SCCF13-COMFACA	$ 82.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1115794588	BABI MANZANARE S EDWIN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI									01-30								230301-PORVENIR	30	$ 2.432.245	$ 389.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 389.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.432.245	$ 97.300	$ 0	$ 97.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.432.245		$ 59.300	30	$ 2.432.245	SCCF13-COMFACA	$ 97.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900252778
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			AGUAS ANDAKI SA ESP
CIUDAD/MUNICIPIO:	BELEN DE LOS ANDAQUIES	DEPARTAMENTO:	CAQUETA
DIRECCIÓN:	CALLE 4 4-31	TELÉFONO:	4316334
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	MIXTA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Captación, tratamiento y distribución de agua.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6004818611**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	8		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/01/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	17443968

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco Agrario de Colombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900252778
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			AGUAS ANDAKI SA ESP
CIUDAD/MUNICIPIO:	BELEN DE LOS ANDAQUIES	DEPARTAMENTO:	CAQUETA
DIRECCIÓN:	CALLE 4 4-31	TELÉFONO:	4316334
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	MIXTA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Captación, tratamiento y distribución de agua.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	6000533394	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre AÑO 2025
DIAS DE MORA:	8		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/12/26	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	2038475124

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 572.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.900	$ 0	$ 572.600	$ 2.900	$ 575.500
230301	230301-PORVENIR	9	$ 2.949.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900	$ 0	$ 2.949.000	$ 14.900	$ 2.963.900
25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 1.224.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.200	$ 0	$ 1.224.600	$ 6.200	$ 1.230.800
SUBTOTALES:										**$ 4.746.200**	**$ 24.000**	**$ 4.770.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	8		$ 0		$ 0		$ 0	$ 658.600	$ 0	$ 3.400	$ 0	$ 658.600	$ 3.400	$ 0	$ 662.000
ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 147.000	$ 0	$ 800	$ 0	$ 147.000	$ 800	$ 0	$ 147.800
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 381.400	$ 0	$ 2.000	$ 0	$ 381.400	$ 2.000	$ 0	$ 383.400
SUBTOTALES:													**$ 1.187.000**	**$ 6.200**	**$ 0**	**$ 1.193.200**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	14		$ 0	$ 0		$ 0	$ 814.700	$ 814.700	$ 4.100	$ 0	$ 818.800
SUBTOTALES:									**$ 814.700**	**$ 4.100**	**$ 0**	**$ 818.800**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF13	CCF13-COMFACA	14	$ 1.187.000	$ 6.000	$ 1.193.000
SUBTOTALES:			**$ 1.187.000**	**$ 6.000**	**$ 1.193.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE											NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																												PENSIÓN							SALUD							ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1006807512	TIQUE SUZMAN BERSON DAVID	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI									01-30									230301-PORVENIR	30	$ 1.737.964	$ 278.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 278.100	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.737.964	$ 69.600	$ 0	$ 69.600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.737.964		$ 42.400	30	$ 1.737.964	$CCF13-COMFACA	$ 69.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1007461546	BECERRA CASTAÑO CRISTIAN ESNEIDER	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI									01-30									230301-PORVENIR	30	$ 2.324.834	$ 372.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 372.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.324.834	$ 93.000	$ 0	$ 93.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.324.834		$ 56.700	30	$ 2.324.834	$CCF13-COMFACA	$ 93.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 10474459	RANGEL BERRIO JULIO CESAR	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI									01-30									230301-PORVENIR	30	$ 1.737.964	$ 278.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 278.100	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.737.964	$ 69.600	$ 0	$ 69.600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.737.964		$ 42.400	30	$ 1.737.964	$CCF13-COMFACA	$ 69.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1078751990	QUEVEDO ROJAS JUNIOR STIVEN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI									01-30									230301-PORVENIR	30	$ 2.971.879	$ 475.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 475.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.971.879	$ 118.900	$ 0	$ 118.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.971.879		$ 72.400	30	$ 2.971.879	$CCF13-COMFACA	$ 118.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1115793764	HOYOS MUNOZ KERLY JULIETH	DEPEND		$ 2.051.862	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.051.862	$ 328.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 328.300	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.051.862	$ 82.100	$ 0	$ 82.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.051.862		$ 10.800	30	$ 2.051.862	$CCF13-COMFACA	$ 82.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1115794588	BABI MANZANARES EDWIN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI									01-30									230301-PORVENIR	30	$ 2.835.353	$ 453.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 453.700	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.835.353	$ 113.500	$ 0	$ 113.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.835.353		$ 89.100	30	$ 2.835.353	$CCF13-COMFACA	$ 113.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900252778
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			AGUAS ANDAKI SA ESP
CIUDAD/MUNICIPIO:	BELEN DE LOS ANDAQUIES	DEPARTAMENTO:	CAQUETA
DIRECCIÓN:	CALLE 4 4-31	TELÉFONO:	4316334
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	MIXTA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Captación, tratamiento y distribución de agua.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	6000533394			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES diciembre	AÑO	2025
DIAS DE MORA:	8						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/12/26			NÚMERO AUTORIZACIÓN:			2038475124

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP					CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
7	CC 1117487679	CALDERON VILLEGAS INGRID ALEJANDRA	DEPEND		$ 3.578.546	FIJO			SI										01-30							230201-PROTECCION	30	$ 3.578.546	$ 572.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 572.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 3.578.546	$ 143.200	$ 0	$ 143.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 3.578.546		$ 249.100	30	$ 3.578.546	CCF13-COMFACA	$ 143.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1117544178	VELASQUEZ TAPIERO LILIANA PATRICIA	DEPEND		$ 1.631.988	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.631.988	$ 261.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 261.200	ESSC62-ASMET SALUD EPS	30	$ 1.631.988	$ 65.300	$ 0	$ 65.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.631.988		$ 8.600	30	$ 1.631.988	CCF13-COMFACA	$ 65.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 17684142	MORENO LADINO OSCAR MAURICIO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI										01-30							230301-PORVENIR	30	$ 1.609.849	$ 257.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 257.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.609.849	$ 64.400	$ 0	$ 64.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.609.849		$ 39.300	30	$ 1.609.849	CCF13-COMFACA	$ 64.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 17684562	BETANCOURTH PINILLA RUBEL	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI										01-30							230301-PORVENIR	30	$ 1.537.380	$ 246.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 246.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.537.380	$ 61.500	$ 0	$ 61.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.537.380		$ 37.500	30	$ 1.537.380	CCF13-COMFACA	$ 61.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 17684714	ALAPE CHAGUALA ALBEIRO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 34.700	30	$ 1.423.500	CCF13-COMFACA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 73141560	BLANCO PEREZ ISRAEL	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI										01-30							25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.290.865	$ 366.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 366.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.290.865	$ 91.700	$ 0	$ 91.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.290.865		$ 55.900	30	$ 2.290.865	CCF13-COMFACA	$ 91.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 76311449	VALENCIA DIANDO JESUS ANTONIO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI										01-30							25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.886.784	$ 301.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 301.900	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.886.784	$ 75.500	$ 0	$ 75.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.886.784		$ 46.000	30	$ 1.886.784	CCF13-COMFACA	$ 75.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 80813852	CASTRO VARGAS GEOVANDY	DEPEND		$ 1.945.800	FIJO			SI										01-30							230301-PORVENIR	30	$ 2.041.321	$ 326.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 326.700	ESSC62-ASMET SALUD EPS	30	$ 2.041.321	$ 81.700	$ 0	$ 81.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.041.321		$ 49.800	30	$ 2.041.321	CCF13-COMFACA	$ 81.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 7.975.200

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900252778
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			AGUAS ANDAKI SA ESP
CIUDAD/MUNICIPIO:	BELEN DE LOS ANDAQUIES	DEPARTAMENTO:	CAQUETA
DIRECCIÓN:	CALLE 4 4-31	TELÉFONO:	4316334
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	MIXTA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Captación, tratamiento y distribución de agua.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7993025113			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	noviembre	AÑO 2025
DIAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/06			NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1908737078

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 641.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 641.000	$ 0	$ 641.000
230301	230301-PORVENIR	9	$ 2.811.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.811.500	$ 0	$ 2.811.500
25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 1.115.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.115.100	$ 0	$ 1.115.100
SUBTOTALES:										**$ 4.567.600**	**$ 0**	**$ 4.567.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	7		$ 0		$ 0		$ 0	$ 553.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 553.800	$ 0	$ 0	$ 553.800
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 382.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 382.200	$ 0	$ 0	$ 382.200
ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 206.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 206.300	$ 0	$ 0	$ 206.300
SUBTOTALES:													**$ 1.142.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.142.300**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	14		$ 0	$ 0		$ 0	$ 806.800	$ 806.800	$ 0	$ 0	$ 806.800
SUBTOTALES:									**$ 806.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 806.800**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF13	CCF13-COMFACA	14	$ 1.142.300	$ 0	$ 1.142.300
SUBTOTALES:			**$ 1.142.300**	**$ 0**	**$ 1.142.300**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE											NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES							
																												PENSIÓN							SALUD						ARP							CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	DOM	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1006907812	TIQUE GUZMAN BERSON DAVID	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI									01-30									230301-PORVENIR	30	$ 1.516.675	$ 242.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 242.700	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.516.675	$ 60.700	$ 0	$ 60.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.516.675		$ 37.000	30	$ 1.516.675	CCF13-COMFACA	$ 60.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1007491546	BECERRA CASTAÑO CRISTIAN EINEIDER	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI									01-30									230301-PORVENIR	30	$ 2.669.387	$ 427.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 427.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.669.387	$ 106.800	$ 0	$ 106.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.669.387		$ 65.100	30	$ 2.669.387	CCF13-COMFACA	$ 106.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 10474459	MANGEL BERRIO JULIO CESAR	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI									01-30									230301-PORVENIR	30	$ 1.516.675	$ 242.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 242.700	ESSC62-ASMET SALUD EPS	30	$ 1.516.675	$ 60.700	$ 0	$ 60.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.516.675		$ 37.000	30	$ 1.516.675	CCF13-COMFACA	$ 60.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1078751990	QUEVEDO HOJAS JUNIOR STIVEN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI									01-30									230301-PORVENIR	30	$ 2.995.496	$ 479.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 479.300	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.995.496	$ 119.900	$ 0	$ 119.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.995.496		$ 73.000	30	$ 2.995.496	CCF13-COMFACA	$ 119.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1115793764	HOYOS MUÑOZ KERLY JULIETH	DEPEND		$ 2.051.862	FIJO		SI									01-30									25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.051.862	$ 328.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 328.300	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.051.862	$ 82.100	$ 0	$ 82.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 2.051.862		$ 10.800	30	$ 2.051.862	CCF13-COMFACA	$ 82.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1115794598	BABI MANZANARES EDWIN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI									01-30									230301-PORVENIR	30	$ 2.249.453	$ 360.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 360.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.249.453	$ 90.000	$ 0	$ 90.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.249.453		$ 54.800	30	$ 2.249.453	CCF13-COMFACA	$ 90.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900252778
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			AGUAS ANDAKI SA ESP
CIUDAD/MUNICIPIO:	BELEN DE LOS ANDAQUIES	DEPARTAMENTO:	CAQUETA
DIRECCIÓN:	CALLE 4 4-31	TELÉFONO:	4316334
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	MIXTA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Captación, tratamiento y distribución de agua.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7993025113			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES octubre	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre	AÑO	2025
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/06			NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1908737078

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900252778
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			AGUAS ANDAKI SA ESP
CIUDAD/MUNICIPIO:	BELEN DE LOS ANDAQUIES	DEPARTAMENTO:	CAQUETA
DIRECCIÓN:	CALLE 4 4-31	TELÉFONO:	4316334
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	MIXTA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Captación, tratamiento y distribución de agua.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA								
NÚMERO PLANILLA:			7991359898	TIPO DE PLANILLA:				E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO	2025
DÍAS DE MORA:			17					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/11/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:				1908749364

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230201- PROTECCION	1	$ 641.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.800	$ 0	$ 641.000	$ 6.800	$ 647.800
25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 1.083.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.200	$ 0	$ 1.083.300	$ 11.200	$ 1.074.500
230301	230301-PORVENIR	9	$ 2.819.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 29.600	$ 0	$ 2.819.600	$ 29.600	$ 2.849.200
SUBTOTALES:										**$ 4.523.900**	**$ 47.600**	**$ 4.571.500**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 369.300	$ 0	$ 3.900	$ 0	$ 369.300	$ 3.900	$ 0	$ 373.200
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	7		$ 0		$ 0		$ 0	$ 558.500	$ 0	$ 5.900	$ 0	$ 558.500	$ 5.900	$ 0	$ 564.400
ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 203.600	$ 0	$ 2.200	$ 0	$ 203.600	$ 2.200	$ 0	$ 205.800
SUBTOTALES:													**$ 1.131.400**	**$ 12.000**	**$ 0**	**$ 1.143.400**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	14		$ 0	$ 0		$ 0	$ 800.000	$ 800.000	$ 8.400	$ 0	$ 808.400
SUBTOTALES:									**$ 800.000**	**$ 8.400**	**$ 0**	**$ 808.400**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF13	CCF13-COMFACA	14	$ 1.131.400	$ 11.900	$ 1.143.300
SUBTOTALES:			**$ 1.131.400**	**$ 11.900**	**$ 1.143.300**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																												PARAFISCALES										
																										PENSIÓN								SALUD						ARP																														
																										FSP			APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL																																										
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO		TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1006687512	DIQUE GUZMAN GERSON DAVID	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 34.700	30	$ 1.423.500	$CCF13-COMFACA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1007451546	BECERRA CASTAÑO CRISTIAN EINEIDER	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI									01-30								230301-PORVENIR	30	$ 2.642.210	$ 422.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 422.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.642.210	$ 105.700	$ 0	$ 105.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.642.210		$ 84.400	30	$ 2.642.210	$CCF13-COMFACA	$ 105.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 10474488	RANGEL BERRIO JULIO CESAR	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	ESSC62-ASMET SALUD EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 34.700	30	$ 1.423.500	$CCF13-COMFACA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1078751990	QUEVEDO ROJAS JUNIOR STIVEN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI									01-30								230301-PORVENIR	30	$ 2.789.736	$ 446.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 446.400	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.789.736	$ 111.600	$ 0	$ 111.600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.789.736		$ 68.000	30	$ 2.789.736	$CCF13-COMFACA	$ 111.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1115793784	HOYOS MUÑOZ KERLY JULIETH	DEPEND		$ 2.051.862	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.051.862	$ 328.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 328.300	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.051.862	$ 82.100	$ 0	$ 82.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.051.862		$ 10.800	30	$ 2.051.862	$CCF13-COMFACA	$ 82.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1116794598	BARI MANZANARES EDWIN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI									01-30								230301-PORVENIR	30	$ 2.781.648	$ 445.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 445.100	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.781.648	$ 111.300	$ 0	$ 111.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.781.648		$ 67.800	30	$ 2.781.648	$CCF13-COMFACA	$ 111.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900252778
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			AGUAS ANDAKI SA ESP
CIUDAD/MUNICIPIO:	BELEN DE LOS ANDAQUIES	DEPARTAMENTO:	CAQUETA
DIRECCIÓN:	CALLE 4 4-31	TELÉFONO:	4316334
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	MIXTA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Captación, tratamiento y distribución de agua.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7991359898	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO 2025
DIAS DE MORA:	17		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	87749364

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES										
																													PENSIÓN								SALUD								ARP						CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
7	CC 1117487679	CALDERON VILLEGAS INDRID ALEJANDRA	DEPEND		$ 4.006.212	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 4.006.212	$ 641.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 641.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 4.006.212	$ 160.300	$ 0	$ 160.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 4.006.212		$ 278.900	30	$ 4.006.212	CCF13-COMFACA	$ 160.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1117544178	VELASQUEZ CAPIERO LILIANA PATRICIA	DEPEND		$ 1.631.988	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.631.988	$ 261.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 261.200	ESSC62-ASMET SALUD EPS	30	$ 1.631.988	$ 65.300	$ 0	$ 65.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.631.988		$ 8.600	30	$ 1.631.988	CCF13-COMFACA	$ 65.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 17684142	MORENO LADINO OSCAR MAURICIO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 34.700	30	$ 1.423.500	CCF13-COMFACA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 17684662	BETANCOURTH PINEDA RUBEL	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI										01-30							230301-PORVENIR	30	$ 1.472.351	$ 235.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 235.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.472.351	$ 58.900	$ 0	$ 58.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.472.351		$ 35.900	30	$ 1.472.351	CCF13-COMFACA	$ 58.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 17684714	ALAPE CHAGUALA ALMEIRO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 34.700	30	$ 1.423.500	CCF13-COMFACA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 73141560	BLANCO PEREZ ISRAEL	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI										01-15							25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.746.052	$ 279.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 279.400	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.746.052	$ 69.900	$ 0	$ 69.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.746.052		$ 42.600	30	$ 1.746.052	CCF13-COMFACA	$ 69.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 78311449	VALENCIA OBANDO JESUS ANTONIO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 34.700	30	$ 1.423.500	CCF13-COMFACA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 80813852	CASTRO VARGAS GEOVARDY	DEPEND		$ 1.945.800	FIJO			SI										01-30							230301-PORVENIR	30	$ 2.031.593	$ 325.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 325.100	ESSC62-ASMET SALUD EPS	30	$ 2.031.593	$ 81.300	$ 0	$ 81.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.031.593		$ 49.500	30	$ 2.031.593	CCF13-COMFACA	$ 81.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 7.616.600

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141199257340

(415)7707212489984(8020) 000014119925734 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 2 5 2 7 7 8	7	Impuestos y Aduanas de Florencia	2 8	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
AGUAS ANDAKI S.A E.S.P

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Caquetá 1 8	Belén de los Andaquies 0 9 4

41. Dirección principal
CR 3 5 48 BRR SANTA TERESA

42. Correo electrónico aguasandaki@yahoo.es

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 8 0 0 1	3 2 0 8 1 5 1 6 4 5	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código
3 6 0 0	2 0 0 8 0 9 0 2	4 2 2 0	2 0 1 5 0 5 0 6		

52. Número establecimientos
1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	7	1	4	1	6	4	2	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
42- Obligado a llevar contabilidad
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros																				Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código																						57. Modo			
																						58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2025-08-20 / 09:35:52AM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CALDERON VILLEGAS INGRID ALEJANDRA

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141199257340

(415)7707212489984(8020) 000014119925734 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 2 5 2 7 7 8	7	Impuestos y Aduanas de Florencia	2 8	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	1	63. Formas asociativas	3	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	
72. Número	0 0 5 9 6	
73. Fecha	2 0 0 8 0 9 2 2	
74. Número de notaría	1	
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 0 8 1 1 1 9	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 0 6 8 6 7 6	
78. Departamento	1 8	
79. Ciudad/Municipio	0 9 4	
Vigencia		
80. Desde	2 0 0 8 0 9 2 2	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	8 5 . 0 %
84. Nacional privado	1 5 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 3	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 6 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141199257340

(415)7707212489984(8020) 000014119925734 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 2 5 2 7 7 8	7	Impuestos y Aduanas de Florencia	2 8	

Representación

1

98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
REPRS LEGAL PRIN	1 8	2 0 2 5 0 5 1 6	

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 1 1 7 4 8 7 6 7 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CALDERON	VILLEGAS	INGRID	ALEJANDRA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141199257340

(415)7707212489984(8020) 000014119925734 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 2 5 2 7 7 8	7	Impuestos y Aduanas de Florencia	2 8	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 1 1 5 7 9 2 2 7 3		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
BALLEN	LOSADA	WILMAR	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 4 0 1 0 2	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141199257340

(415)7707212489984(8020) 000014119925734 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 2 5 2 7 7 8	7	Impuestos y Aduanas de Florencia	2 8	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	2 6 6 1 6 8 6 6	0	3 4 4 3 7 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
PAREDES	MOLINA	ORLANDA	

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento: 2 0 2 5 0 8 1 4

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	4 0 7 7 8 2 7 3	9	1 3 3 9 0 2 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
REYES	CABRERA	SANDRA	LILIANA

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento: 2 0 2 5 0 8 1 4

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento:

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 6 de 6 **Hoja 6**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141199257340

(415)7707212489984(8020) 000014119925734 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 2 5 2 7 7 8	7	Impuestos y Aduanas de Florencia	2 8	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Captación, tratamiento y distribución de agua 3 6 0 0	

162. Nombre del establecimiento: AGUAS ANDAKI S.A E.S.P.

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Caquetá 1 8	Belén de los Andaquies 0 9 4	

165. Dirección: CL 4 4 55 BRR CENTRO

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
0 0 0 6 8 6 7 7	2 0 0 8 1 1 1 9	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	
3 2 0 8 1 5 1 6 4 5		

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Aguas Andaki S.A. E.S.P.

Nuestra agua... Nuestra Empresa.

Nit: 900.252.778-7

Belén de los Andaquies, 20 de mayo de 2026

Señora:
Viviana Medina Loaiza
Secretaria de Hacienda
Municipio Belén de los Andaquies

Ref. autorización consignación cuenta bancaria

Yo INGRID ALEJANDRA CALDERON VILLEGAS, en calidad de representante legal de la empresa Aguas Andaki del municipio de Belén de los Andaquies, autorizo que se realice el pago por el concepto de pago parcial del convenio N°098-2025, que tiene como objeto "ANUAR ESFUERZOS TECNICOS ADINISTRATIVOS FINANCIEROS PARA REALIZAR MEJORAMIENTODEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN SECTORES CRITICOS DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE BELÉN DE LOS ANDAQUIES, DEPARTAMENTO DEL Caquetá" a la cuenta corriente del banco Agrario de Colombia con número 375100000807, por el valor de ciento once millones trescientos treinta y cinco mil trescientos cuarenta y tres pesos. (111.335.343).

Atentamente,

INGRID ALEJANDRA CALDERON VILLEGAS
GERENTE

Banco Agrario de Colombia
El Banco que hace crecer el campo

Nit : 800.037.800-8

CERTIFICACION

El Banco Agrario de Colombia, certifica que: AGUAS ANDAKI S.A E.S.P, identificado(a) con NIT JURIDICAS No. 9002527787, se encuentra vinculado(a) con nuestra entidad en el producto de: CTE - CUENTAS -CORRIENTES, número 3-751-00-00080-7, con una antigüedad de DIEZ (10) año(s).

Se expide en BELEN DE LOS ANDAQUIES, a los veinte (20) días del mes de mayo de 2026, con destino a: AL INTERESADO



DIRECTOR (A) OFICINA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900252778
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			AGUAS ANDAKI SA ESP
CIUDAD/MUNICIPIO:	BELEN DE LOS ANDAQUIES	DEPARTAMENTO:	CAQUETA
DIRECCIÓN:	CALLE 4 4-31	TELÉFONO:	4316334
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	MIXTA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Captación, tratamiento y distribución de agua.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**6019589951**		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/05/12		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		302082234	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	8	$ 2.748.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.748.700	$ 0	$ 2.748.700
25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 1.329.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.329.700	$ 0	$ 1.329.700
230201	230201- PROTECCION	1	$ 705.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 705.200	$ 0	$ 705.200
SUBTOTALES:										**$ 4.783.600**	**$ 0**	**$ 4.783.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 438.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 438.700	$ 0	$ 0	$ 438.700
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	7		$ 0		$ 0		$ 0	$ 592.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 592.900	$ 0	$ 0	$ 592.900
ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 164.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 164.600	$ 0	$ 0	$ 164.600
SUBTOTALES:													**$ 1.196.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.196.200**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	13		$ 0	$ 0		$ 0	$ 850.700	$ 850.700	$ 0	$ 0	$ 850.700
SUBTOTALES:									**$ 850.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 850.700**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF13	CCF13-COMFACA	13	$ 1.196.200	$ 0	$ 1.196.200
SUBTOTALES:			**$ 1.196.200**	**$ 0**	**$ 1.196.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP													
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1006507512	TIQUE GUZMAN GERSON DAVID	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI									01-30									230301-PORVENIR	30	$ 1.881.427	$ 301.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 301.100	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.881.427	$ 75.300	$ 0	$ 75.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.881.427		$ 45.900	30	$ 1.881.427	CCF13-COMFACA	$ 75.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1007451546	BECERRA CASTAÑO CRISTIAN ESNEIDER	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI									01-30									230301-PORVENIR	30	$ 2.629.540	$ 420.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 420.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.629.540	$ 105.200	$ 0	$ 105.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 2.629.540		$ 64.100	30	$ 2.629.540	CCF13-COMFACA	$ 105.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1078751990	QUEVEDO ROJAS JUNIOR STIVEN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI									01-30									230301-PORVENIR	30	$ 2.294.323	$ 367.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 367.100	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.294.323	$ 91.800	$ 0	$ 91.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 2.294.323		$ 55.900	30	$ 2.294.323	CCF13-COMFACA	$ 91.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1115793764	HOYOS MUÑOZ KERLY JULIETH	DEPEND		$ 2.257.000	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.257.000	$ 361.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 361.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 2.257.000	$ 90.300	$ 0	$ 90.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 2.257.000		$ 11.800	30	$ 2.257.000	CCF13-COMFACA	$ 90.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1115794598	SABI MANZANARES EDWIN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905		$ 42.700	30	$ 1.750.905	CCF13-COMFACA	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1117487679	CALDERON VILLEGAS INGRID ALEJANDRA	DEPEND		$ 4.407.000	FIJO			SI																		230201-PROTECCION	30	$ 4.407.000	$ 705.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 705.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 4.407.000	$ 176.300	$ 0	$ 176.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 4.407.000		$ 306.800	30	$ 4.407.000	CCF13-COMFACA	$ 176.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900252778
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			AGUAS ANDAKI SA ESP
CIUDAD/MUNICIPIO:	BELEN DE LOS ANDAQUIES	DEPARTAMENTO:	CAQUETA
DIRECCIÓN:	CALLE 4 4-31	TELÉFONO:	4316334
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	MIXTA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Captación, tratamiento y distribución de agua.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6019589951**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES abril AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/05/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	302082234

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP													
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
7	CC 1117544178	VELASQUEZ TAPIERO LILIANA PATRICIA	DEPEND		$ 1.794.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.794.000	$ 287.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 287.100	ESSC62-ASMET SALUD EPS	30	$ 1.794.000	$ 71.800	$ 0	$ 71.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.794.000		$ 9.400	30	$ 1.794.000	CCF13-COMFACA	$ 71.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 17684142	MORENO LADINO OSCAR MAURICIO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI									01-30								230301-PORVENIR	30	$ 1.881.427	$ 301.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 301.100	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.881.427	$ 75.300	$ 0	$ 75.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.881.427		$ 45.900	30	$ 1.881.427	CCF13-COMFACA	$ 75.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 17684562	BETANCOURTH PINEDA RUBIEL	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI									01-30								230301-PORVENIR	30	$ 2.625.434	$ 420.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 420.100	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.625.434	$ 105.100	$ 0	$ 105.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 2.625.434		$ 64.000	30	$ 2.625.434	CCF13-COMFACA	$ 105.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 17684714	ALAPE CHAGUALA ALBEIRO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905		$ 42.700	30	$ 1.750.905	CCF13-COMFACA	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 73141560	BLANCO PEREZ ISRAEL	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI									01-30								25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.419.432	$ 387.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 387.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 2.419.432	$ 96.800	$ 0	$ 96.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 2.419.432		$ 59.000	30	$ 2.419.432	CCF13-COMFACA	$ 96.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 76311449	VALENCIA OBANDO JESUS ANTONIO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI									01-30								25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.881.427	$ 301.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 301.100	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.881.427	$ 75.300	$ 0	$ 75.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.881.427		$ 45.900	30	$ 1.881.427	CCF13-COMFACA	$ 75.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 80813852	CASTRO VARGAS GEOVARDY	DEPEND		$ 2.140.000	FIJO			SI									01-30								230301-PORVENIR	30	$ 2.319.468	$ 371.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 371.200	ESSC62-ASMET SALUD EPS	30	$ 2.319.468	$ 92.800	$ 0	$ 92.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 2.319.468		$ 56.600	30	$ 2.319.468	CCF13-COMFACA	$ 92.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 8.026.700

Planilla Pagada


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 26.616.866
PAREDES De MOLINA
APELLIDOS
ORLANDA
NOMBRES
REPUBLICA DE COLOMBIA
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 05-OCT-1950
PUERTO BERRIO
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.58
ESTATURA
A+
G.S. RH
F
SEXO
05-OCT-1972 FLORENCIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
R-4400100-00174086-F-0026616866-20090830
0015560787A 1
9926614542



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

34437-T

ORLANDA
PAREDES DE MOLINA
C.C. 26.616.866
RESOLUCION INSCRIPCION 124-T FECHA 24-XI-92
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

Presidente



CARVAJAL S.A.

02/02/2005

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B0508B9525006F70

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ORLANDA PAREDES DE MOLINA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 26616866 de FLORENCIA (CAQUETA) Y Tarjeta Profesional No 34437-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

ORLANDA PAREDES DE MOLINA
CONTADORA PÚBLICA
T.P.34437-T
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

CONSTANCIA CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES A LOS SISTEMAS DE SALUD, PENSIONES, ARP Y OBLIGACIONES PARAFISCALES

Belén de los Andaquíes,13 de mayo de 2026

Yo**, ORLANDA PAREDES DE MOLINA**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 26.616.866 expedida en Florencia Caquetá, y con Tarjeta Profesional No. 34437-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisora Fiscal de la Empresa de Servicios Públicos AGUAS ANDAKI S.A. E.S.P. con NIT: 900.252.778-7, manifiesto bajo la gravedad del juramento: Que la Empresa ha cumplido a 30 de abril de 2026 y se encuentra a PAZ Y SALVO, con las obligaciones a los Sistemas de Salud, Pensiones, ARP señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Belén de los Andaquíes Caquetá, a los trece (13) días del mes de mayo de 2026.



ORLANDA PAREDES DE MOLINA
C.C. No. 26.616.866 de Florencia
Contador Público T.P 157511-T

Carrera 13 No. 9-84 Barrio Juan XXIII
Teléfono (068) 4364081 Celular 3203436749
E-mail: orlanda.paredes@yahoo.es
Florencia Caquetá
