MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	0
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	05	**PERIODO DE EJECUCIÓN**	28/12/2025 a 30/01/2026

CONTRATO DE OBRA No. 8127782 de 2025			**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 8146800**			
CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL SOLUCIONES 4 EN 1 S.A.S.	**OBJETO:** PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD Y SUS SEDES EN CUSTODIA	**CONTRATISTA**	CONSORCIO CONSULTORES OC	"REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD Y SUS SEDES EN CUSTODIA."	
DIRECTOR DE OBRA	JAVIER ANDRÉS LEÓN LÓPEZ		**DIRECTOR INTERVENTORIA**	LUIS ALFONSO CAGUA OSPINO		
RESIDENTE DE OBRA	HELVER ALEJANDRO SANABRIA RAMIREZ		**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**	FABIO JESÚS MEJÍA		
CAPITULO:	MANTENIMIENTO FACHADA-CUBIERTA		**SUBCAPITULO**	1.5	**FECHA:**	**30/01/2026**
ÍTEM	1.5.2	**DESCRIPCIÓN**	Mantenimiento de flanches incluye aplicación de washprimer. Incluye ajuste fijación yaplicación de silicona adecuadapara sellar en Flanche y muro.		**UNIDAD**	ML

No	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					CANTIDAD	TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN		
1	Sede en custodia "Camelia"	16					16	16,00
							TOTAL ACTIVIDAD	16,00
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	0,00
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	16,00

OBSERVACIONES

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA





ELABORÓ	APROBÓ	APROBÓ	APROBÓ
HELVER ALEJANDRO SANABRIA RAMIREZ	JAVIER ANDRÉS LEÓN LÓPEZ	FABIO JESUS MEJIA	LUIS ALFONSO CAGUA OSPINA
RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Escriba el texto aquí

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	0
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	05	PERIODO DE EJECUCIÓN	28/12/2025 a 30/01/2026

CONTRATO DE OBRA No. 8127782 de 2025			CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 8146800		
CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL SOLUCIONES 4 EN 1 S.A.S.	OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD Y SUS SEDES EN CUSTODIA	CONTRATISTA	CONSORCIO CONSULTORES OC	"REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD Y SUS SEDES EN CUSTODIA."
DIRECTOR DE OBRA	JAVIER ANDRÉS LEÓN LÓPEZ		DIRECTOR INTERVENTORIA	LUIS ALFONSO CAGUA OSPINO	
RESIDENTE DE OBRA	HELVER ALEJANDRO SANABRIA RAMIREZ		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	FABIO JESÚS MEJÍA	
CAPITULO:	MANTENIMIENTO FACHADA-CUBIERTA		SUBCAPITULO	1.5	FECHA: 30/01/2026
ÍTEM	1.5.4	DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación teja termoacústica, incluye todos los accesorios necesarios para su correcta instalación.			UNIDAD: M2

No	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					CANTIDAD	TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN		
1	SEDE EN CUSTODIA "LA CAMELIA"							206,52
							TOTAL ACTIVIDAD	206,52
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	0,00
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	206,52

OBSERVACIONES

ELABORÓ	APROBÓ	APROBÓ	APROBÓ
HELVER ALEJANDRO SANABRIA RAMIREZ	JAVIER ANDRÉS LEÓN LÓPEZ	FABIO JESUS MEJIA	LUIS ALFONSO CAGUA OSPINA
RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA





MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	0
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	05	PERIODO DE EJECUCIÓN	28/12/2025 a 30/01/2026

CONTRATO DE OBRA No. 8127782 de 2025			CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 8146800		
CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL SOLUCIONES 4 EN 1 S.A.S.	OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD Y SUS SEDES EN CUSTODIA	CONTRATISTA	CONSORCIO CONSULTORES OC	"REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD Y SUS SEDES EN CUSTODIA."
DIRECTOR DE OBRA	JAVIER ANDRÉS LEÓN LÓPEZ		DIRECTOR INTERVENTORIA	LUIS ALFONSO CAGUA OSPINO	
RESIDENTE DE OBRA	HELVER ALEJANDRO SANABRIA RAMIREZ		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	FABIO JESÚS MEJÍA	

CAPITULO:	MANTENIMIENTO FACHADA-CUBIERTA		SUBCAPITULO	1.5	FECHA:	30/01/2026
ÍTEM	1.5.7	DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación de puntos de anclaje fijos en acero Inoxidable 2 perforaciones con epoxico y varilla acero inoxidable 304 de 1/2 x 6".		UNIDAD	UND

No	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					CANTIDAD	TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN		
1	EDIFICIO ADMINISTRATIVO PISO 8						18	18,00
						TOTAL ACTIVIDAD		18,00
						ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR		0,00
						TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS		18,00

OBSERVACIONES: Se realiza entrega de informe de instalación de puntos de anclaje, con el respectivo soporte de pruebas a las platinas instaladas.

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA



ELABORÓ	APROBÓ	APROBÓ	APROBÓ
HELVER ALEJANDRO SANABRIA RAMIREZ	JAVIER ANDRÉS LEÓN LÓPEZ	FABIO JESUS MEJIA	LUIS ALFONSO CAGUA OSPINA
RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	0
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	05	PERIODO DE EJECUCIÓN	28/12/2025 a 30/01/2026

CONTRATO DE OBRA No. 8127782 de 2025			CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 8146800		
CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL SOLUCIONES 4 EN 1 S.A.S.	OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD Y SUS SEDES EN CUSTODIA	CONTRATISTA	CONSORCIO CONSULTORES OC	"REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD Y SUS SEDES EN CUSTODIA."
DIRECTOR DE OBRA	JAVIER ANDRÉS LEÓN LÓPEZ		DIRECTOR INTERVENTORIA	LUIS ALFONSO CAGUA OSPINO	
RESIDENTE DE OBRA	HELVER ALEJANDRO SANABRIA RAMIREZ		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	FABIO JESÚS MEJÍA	
CAPITULO:	MANTENIMIENTO FACHADA-CUBIERTA		SUBCAPITULO	1.5	FECHA: 30/01/2026
ÍTEM	1.5.8	DESCRIPCIÓN: Recertificación anual puntos de anclaje existentes en la entidad			UNIDAD: UND

No	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					CANTIDAD	TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN		
1	CUBIERTA EDIFICIO DUES						11	11,00
2	CUBIERTA EDIFICIO HEMOCENTRO PISO 5						9	9,00
							TOTAL ACTIVIDAD	20,00
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	0,00
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	20,00

OBSERVACIONES

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA





ELABORÓ	APROBÓ	APROBÓ	APROBÓ
HELVER ALEJANDRO SANABRIA RAMIREZ	JAVIER ANDRÉS LEÓN LÓPEZ	FABIO JESUS MEJIA	LUIS ALFONSO CAGUA OSPINA
RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	0
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	5	**PERIODO DE EJECUCIÓN**	28/15/2025 a 30/01/2026


CONTRATO DE OBRA No. 8127782 de 2025			**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 8146800**			
CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL SOLUCIONES 4 EN 1 S.A.S.	**OBJETO:** PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD Y SUS SEDES EN CUSTODIA	**CONTRATISTA**	CONSORCIO CONSULTORES OC	"REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD Y SUS SEDES EN CUSTODIA."	
DIRECTOR DE OBRA	JAVIER ANDRÉS LEÓN LÓPEZ		**DIRECTOR INTERVENTORIA**	LUIS ALFONSO CAGUA OSPINO		
RESIDENTE DE OBRA	HELVER ALEJANDRO SANABRIA RAMIREZ		**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**	FABIO JESÚS MEJÍA		
CAPITULO:	PRESUPUESTO B		**SUBCAPITULO**	1.7	**FECHA:**	**30/01/2026**
ÍTEM	1.7.24	**DESCRIPCIÓN** Servicio de mantenimiento preventivo para Banco de Condensadores			**UNIDAD**	UND

No	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					CANTIDAD	TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN		
1	Sótano 1 - edificio Administrativo						1	1,00
2								0,00
3								0,00
4								0,00
								0,00
							TOTAL ACTIVIDAD	**1,00**
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	**0,00**
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	**1,00**

OBSERVACIONES

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA




ELABORÓ	APROBÓ	APROBÓ	APROBÓ
HELVER ALEJANDRO SANABRIA RAMIREZ	**JAVIER ANDRÉS LEÓN LÓPEZ**	**FABIO JESUS MEJIA**	**LUIS ALFONSO CAGUA OSPINA**
RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	0
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	5	PERIODO DE EJECUCIÓN	28/15/2025 a 30/01/2026

CONTRATO DE OBRA No. 8127782 de 2025			CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 8146800		
CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL SOLUCIONES 4 EN 1 S.A.S.	OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD Y SUS SEDES EN CUSTODIA	CONTRATISTA	CONSORCIO CONSULTORES OC	"REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD Y SUS SEDES EN CUSTODIA."
DIRECTOR DE OBRA	JAVIER ANDRÉS LEÓN LÓPEZ		DIRECTOR INTERVENTORIA	LUIS ALFONSO CAGUA OSPINO	
RESIDENTE DE OBRA	HELVER ALEJANDRO SANABRIA RAMIREZ		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	FABIO JESÚS MEJÍA	
CAPITULO:	PRESUPUESTO B		SUBCAPITULO	1.7	FECHA: 30/01/2026
ÍTEM	1.7.25	DESCRIPCIÓN: Servicio de mantenimiento preventivo para Tablero General de distribución			UNIDAD: UND

No	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					CANTIDAD	TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN		
1	Sótano - Tablero general de distribución							1,00
2								0,00
3								0,00
4								0,00
								0,00
							TOTAL ACTIVIDAD	1,00
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	0,00
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	1,00

OBSERVACIONES

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA







ELABORÓ	APROBÓ	APROBÓ	APROBÓ
HELVER ALEJANDRO SANABRIA RAMIREZ	JAVIER ANDRÉS LEÓN LÓPEZ	FABIO JESUS MEJIA	LUIS ALFONSO CAGUA OSPINA
RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	0
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1


ACTA PARCIAL DE OBRA No.	5	**PERIODO DE EJECUCIÓN**	28/15/2025 a 30/01/2026


CONTRATO DE OBRA No. 8127782 de 2025			**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 8146800**		
CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL SOLUCIONES 4 EN 1 S.A.S.	**OBJETO:** PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD Y SUS SEDES EN CUSTODIA	**CONTRATISTA**	CONSORCIO CONSULTORES OC	"REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD Y SUS SEDES EN CUSTODIA."
DIRECTOR DE OBRA	JAVIER ANDRÉS LEÓN LÓPEZ		**DIRECTOR INTERVENTORIA**	LUIS ALFONSO CAGUA OSPINO	
RESIDENTE DE OBRA	HELVER ALEJANDRO SANABRIA RAMIREZ		**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**	FABIO JESÚS MEJÍA	
CAPITULO:	PRESUPUESTO B		**SUBCAPITULO**	1.7	**FECHA:** 30/01/2026
ÍTEM	1.7.26	**DESCRIPCIÓN** Servicio de mantenimiento preventivo para Tableros de alimentación Generales			**UNIDAD** UND

No	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					CANTIDAD	TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN		
1	Tablero general edificio Hemocentro						1	1,00
2	Tablero general emergencia ventilación						1	1,00
3	Tablero general alimentación UPS						1	1,00
4	Tablero general edificio Laboratorios						1	1,00
5	Tablero general sótano edificio Administrativo						1	1,00
6	Tablero general sótano CRUE - DUES						1	1,00
7	Tablero general edificio Administrativo						1	1,00
							TOTAL ACTIVIDAD	**7,00**
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	**0,00**
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	**7,00**

OBSERVACIONES

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

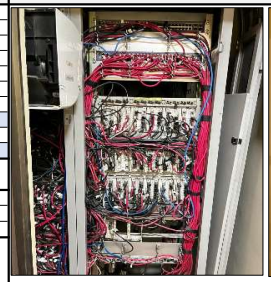

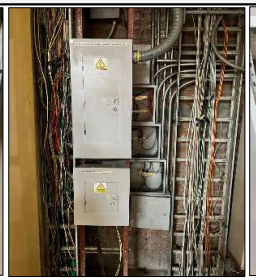



ELABORÓ	APROBÓ	APROBÓ	APROBÓ
HELVER ALEJANDRO SANABRIA RAMIREZ	**JAVIER ANDRÉS LEÓN LÓPEZ**	**FABIO JESUS MEJIA**	**LUIS ALFONSO CAGUA OSPINA**
RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	0
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	5	**PERIODO DE EJECUCIÓN**	28/15/2025 a 30/01/2026

CONTRATO DE OBRA No. 8127782 de 2025			**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 8146800**		
CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL SOLUCIONES 4 EN 1 S.A.S.	**OBJETO:** PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD Y SUS SEDES EN CUSTODIA	**CONTRATISTA**	CONSORCIO CONSULTORES OC	"REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD Y SUS SEDES EN CUSTODIA."
DIRECTOR DE OBRA	JAVIER ANDRÉS LEÓN LÓPEZ		**DIRECTOR INTERVENTORIA**	LUIS ALFONSO CAGUA OSPINO	
RESIDENTE DE OBRA	HELVER ALEJANDRO SANABRIA RAMIREZ		**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**	FABIO JESÚS MEJÍA	
CAPITULO:	PRESUPUESTO B		**SUBCAPITULO**	1.7	**FECHA:** 30/01/2026
ÍTEM	1.7.27	**DESCRIPCIÓN** Servicio de mantenimiento preventivo para Subtableros Regulados			**UNIDAD** UND


No	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					CANTIDAD	TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN		
1	Subtablero regulado Piso 3 - edf Admin						1	1,00
2	Subtablero regulado Piso 7 - edf Admin						1	1,00
3	Subtablero regulado Piso 6 - edf Admin						1	1,00
4	Subtablero regulado Piso 2 - edf Admin						1	1,00
5	Subtablero regulado Piso 5 - edf Admin						1	1,00
6	Subtablero regulado pisos 1 y 2 - Edf DUES						1	1,00
7	Subtablero regulado piso 3 - edificio Laboratorios						1	1,00
8	Subtablero regulado piso 1 y 2 - edificio Laboratorios						1	1,00
9	Subtablero regulado piso 4 - edificio Laboratorios						1	1,00
10	Subtablero regulado piso 1 - edificio administrativo						1	1,00
11	Subtablero regulado Sótano - edificio DUES						1	1,00
12	Subtablero regulado piso 4 - edf administrativo						1	1,00
13	Subtablero regulado Piso 2 - edf Admin						1	1,00
14	Subtablero regulado Piso 3 Oriental - edf Admin						1	1,00
15	Subtablero regulado Piso 3 Occidental - edf Admin						1	1,00
16	Subtablero regulado piso 1 Occ - edificio administrativo						1	1,00
17	Subtablero general regulado piso 3 - edificio Administrativo						1	1,00
18	Subtablero general regulado piso 4 oriental - edificio Administrativo						1	1,00
19	Subtablero general regulado piso 1 edf Hemocentro						1	1,00
20	Subtablero regulado L1 - edificio Hemocentro						1	1,00
21	Subtablero regulado DUES - CRUE - Sótano						1	1,00
22	Subtablero general regulado Piso 3 - edificio Hemocentro						1	1,00
23	Subtablero general regulado Piso 3 - edf administrativo						1	1,00
24	Subtablero general regulado Piso 4 - edificio Hemocentro						1	1,00
							TOTAL ACTIVIDAD	**24,00**
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	**0,00**
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	**24,00**

OBSERVACIONES

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA





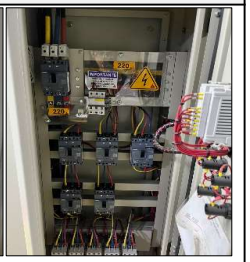

ELABORÓ	APROBÓ	APROBÓ	APROBÓ
HELVER ALEJANDRO SANABRIA RAMIREZ	**JAVIER ANDRÉS LEÓN LÓPEZ**	**FABIO JESUS MEJIA**	**LUIS ALFONSO CAGUA OSPINA**
RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	0
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	5	**PERIODO DE EJECUCIÓN**	28/15/2025 a 30/01/2026

CONTRATO DE OBRA No. 8127782 de 2025			**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 8146800**		
CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL SOLUCIONES 4 EN 1 S.A.S.	**OBJETO:** PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD Y SUS SEDES EN CUSTODIA	**CONTRATISTA**	CONSORCIO CONSULTORES OC	"REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD Y SUS SEDES EN CUSTODIA."
DIRECTOR DE OBRA	JAVIER ANDRÉS LEÓN LÓPEZ		**DIRECTOR INTERVENTORIA**	LUIS ALFONSO CAGUA OSPINO	
RESIDENTE DE OBRA	HELVER ALEJANDRO SANABRIA RAMIREZ		**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**	FABIO JESÚS MEJÍA	
CAPITULO:	PRESUPUESTO B		**SUBCAPITULO**	1.7	**FECHA:** 30/01/2026
ÍTEM	1.7.28	**DESCRIPCIÓN** Servicio de mantenimiento preventivo para Tablero Generales Edificios			**UNIDAD** UND

No	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					CANTIDAD	TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN		
1	Tablero general Piso 3 edificio Administrativo						1	1,00
2	Tablero general piso 7 edificio Administrativo						1	1,00
3	Tablero general piso 6 edificio Administrativo						1	1,00
4	Tablero general piso 5 edificio Administrativo						1	1,00
5	Tablero general piso 1 edificio Administrativo						1	1,00
6	Tablero general piso 4 edificio Administrativo						1	1,00
7	Tablero general piso 2 edificio Administrativo						1	1,00
8	Tablero general edf Hemocentro - piso 1						1	1,00
9	Tablero general edf Hemocentro - piso 2						1	1,00
10	Tablero general edificio Laboratorios Piso 2						1	1,00
11	Tablero general edificio Laboratorios Piso 3						1	1,00
12	Tablero general edificio DUES Piso 1 y 2						1	1,00
13	Tablero general edificio Laboratorios Piso 1 y 2						1	1,00
14	Tablero general edificio Laboratorios Piso 4						1	1,00
15	Tablero general edificio DUES Sótano Iluminación						1	1,00
16	Tablero general edificio Administrativo recepción						1	1,00
17	Tablero general esterilización						1	1,00
18	Tablero general Hemocentro Piso 1						1	1,00
19	Tablero general auxiliar edificio Administrativo Piso 2						1	1,00
20	Tablero general Piso 2 - edificio Laboratorios						1	1,00
21	Tablero general Piso 3 edificio Administrativo - TABG P3						1	1,00
22	Tablero general sótano - Almacen general						1	1,00
23	Tablero general - Sótano - Iluminación almacen						1	1,00
24	Tablero general - Sótano cuarto eléctrico						1	1,00
25	Tablero general - Sótano edificio Administrativo						1	1,00
26	Tablero general - Sótano edificio Administrativo TGD						1	1,00
27	Tablero general - Ventilación - Sótano edf administrativo						1	1,00
28	Tablero general - Punto de carga vehículos eléctricos						1	1,00
29	Tablero general - Alumbrado sótano - edificio Laboratorios						1	1,00
30	Tablero general de distribución cuartos técnicos						1	1,00
31	Tablero general piso 3 - edificio Hemocentro						1	1,00
32	Tablero general piso 1 - Sala de trabajo - Hemocentro						1	1,00
33	Tablero general Hemocentro Piso 4						1	1,00
34	Tablero general Hemocentro Piso 1						1	1,00

TOTAL ACTIVIDAD	**34,00**
ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	**0,00**
TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	**34,00**

OBSERVACIONES

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA







ELABORÓ	APROBÓ	APROBÓ	APROBÓ
HELVER ALEJANDRO SANABRIA RAMIREZ	**JAVIER ANDRÉS LEÓN LÓPEZ**	**FABIO JESUS MEJIA**	**LUIS ALFONSO CAGUA OSPINA**
RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	0
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	5	**PERIODO DE EJECUCIÓN**	28/15/2025 a 30/01/2026

CONTRATO DE OBRA No. 8127782 de 2025			**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 8146800**		
CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL SOLUCIONES 4 EN 1 S.A.S.	**OBJETO:** PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD Y SUS SEDES EN CUSTODIA	**CONTRATISTA**	CONSORCIO CONSULTORES OC	"REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD Y SUS SEDES EN CUSTODIA."
DIRECTOR DE OBRA	JAVIER ANDRÉS LEÓN LÓPEZ		**DIRECTOR INTERVENTORIA**	LUIS ALFONSO CAGUA OSPINO	
RESIDENTE DE OBRA	HELVER ALEJANDRO SANABRIA RAMIREZ		**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**	FABIO JESÚS MEJÍA	
CAPITULO:	PRESUPUESTO B		**SUBCAPITULO**	1.7	**FECHA:** 30/01/2026
ÍTEM	1.7.29	**DESCRIPCIÓN** Servicio de mantenimiento preventivo para Tablero 6,12, 18, 24, 30, 36, 38, 45 Tipo Pesado			**UNIDAD** UND

No	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					CANTIDAD	TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN		
1	Edificio Administrativo						42	42,00
2	Edificio hemocentro						10	10,00
3	Edificio Laboratorio						113	113,00
4	Edificio DUES						20	20,00
								0,00
							TOTAL ACTIVIDAD	**185,00**
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	**0,00**
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	**185,00**

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA





OBSERVACIONES

ELABORÓ	APROBÓ	APROBÓ	APROBÓ
HELVER ALEJANDRO SANABRIA RAMIREZ	**JAVIER ANDRÉS LEÓN LÓPEZ**	**FABIO JESUS MEJIA**	**LUIS ALFONSO CAGUA OSPINA**
RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	0
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	5	**PERIODO DE EJECUCIÓN**	28/15/2025 a 30/01/2026

CONTRATO DE OBRA No.	**8127782 de 2025**		**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.**	**8146800**	
CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL SOLUCIONES 4 EN 1 S.A.S.	**OBJETO:** PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD Y SUS SEDES EN CUSTODIA	**CONTRATISTA**	CONSORCIO CONSULTORES OC	"REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD Y SUS SEDES EN CUSTODIA."
DIRECTOR DE OBRA	JAVIER ANDRÉS LEÓN LÓPEZ		**DIRECTOR INTERVENTORIA**	LUIS ALFONSO CAGUA OSPINO	
RESIDENTE DE OBRA	HELVER ALEJANDRO SANABRIA RAMIREZ		**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**	FABIO JESÚS MEJÍA	
CAPITULO:	PRESUPUESTO B		**SUBCAPITULO**	1.7	**FECHA:** 30/01/2026
ÍTEM	1.7.31	**DESCRIPCIÓN** Servicio de mantenimiento preventivo para Apantallamiento Y medición de SPT			**UNIDAD** UND

No	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					CANTIDAD	TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN		
1	Puntos de apantallamiento y medición de tierras						75	75,00
2								0,00
3								0,00
4								0,00
								0,00
							TOTAL ACTIVIDAD	**75,00**
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	**0,00**
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	**75,00**

OBSERVACIONES

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA



ELABORÓ	APROBÓ	APROBÓ	APROBÓ
HELVER ALEJANDRO SANABRIA RAMIREZ	**JAVIER ANDRÉS LEÓN LÓPEZ**	**FABIO JESUS MEJIA**	**LUIS ALFONSO CAGUA OSPINA**
RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	0
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	5	**PERIODO DE EJECUCIÓN**	28/15/2025 a 30/01/2026

CONTRATO DE OBRA No. 8127782 de 2025			**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 8146800**		
CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL SOLUCIONES 4 EN 1 S.A.S.	**OBJETO:** PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD Y SUS SEDES EN CUSTODIA	**CONTRATISTA**	CONSORCIO CONSULTORES OC	"REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD Y SUS SEDES EN CUSTODIA."
DIRECTOR DE OBRA	JAVIER ANDRÉS LEÓN LÓPEZ		**DIRECTOR INTERVENTORIA**	LUIS ALFONSO CAGUA OSPINO	
RESIDENTE DE OBRA	HELVER ALEJANDRO SANABRIA RAMIREZ		**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**	FABIO JESÚS MEJÍA	
CAPITULO:	PRESUPUESTO B		**SUBCAPITULO**	1.7	**FECHA:** 30/01/2026
ÍTEM	1.7.33	**DESCRIPCIÓN** Servicios de analisis y medición de sistema de apantallamiento y tierras			**UNIDAD** UND

No	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					CANTIDAD	TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN		
1	Servicios de analisis y medición de apantallamiento de tierras						2	2,00
2								0,00
3								0,00
4								0,00
								0,00
							TOTAL ACTIVIDAD	**2,00**
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	**0,00**
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	**2,00**

OBSERVACIONES

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA



ELABORÓ	APROBÓ	APROBÓ	APROBÓ
HELVER ALEJANDRO SANABRIA RAMIREZ	**JAVIER ANDRÉS LEÓN LÓPEZ**	**FABIO JESUS MEJIA**	**LUIS ALFONSO CAGUA OSPINA**
RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	0
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	5	PERIODO DE EJECUCIÓN	28/15/2025 a 30/01/2026

CONTRATO DE OBRA No. 8127782 de 2025			CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 8146800		
CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL SOLUCIONES 4 EN 1 S.A.S.	OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD Y SUS SEDES EN CUSTODIA	CONTRATISTA	CONSORCIO CONSULTORES OC	"REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD Y SUS SEDES EN CUSTODIA."
DIRECTOR DE OBRA	JAVIER ANDRÉS LEÓN LÓPEZ		DIRECTOR INTERVENTORIA	LUIS ALFONSO CAGUA OSPINO	
RESIDENTE DE OBRA	HELVER ALEJANDRO SANABRIA RAMIREZ		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	FABIO JESÚS MEJÍA	

CAPITULO:	VIDRIOS-PELÍCULAS-ANGEO		SUBCAPITULO	1.10	FECHA:	30/01/2026
ÍTEM	1.10.3	DESCRIPCIÓN	Suministro e instalación vidrio incoloro Peldar o similar de 5 mm		UNIDAD	M2

No	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					CANTIDAD	TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN		
1	GARITAS PORTERIAS 3 Y 4	1,40	0,4					0,56
2		0,41	0,9					0,37
3		0,9	1,40					1,26
4		1,4	0,40					0,56
5		0,90	0,4					0,36
6		0,4	0,5					0,20
							TOTAL ACTIVIDAD	3,31
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	0,00
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	3,31

OBSERVACIONES

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA



ELABORÓ	APROBÓ	APROBÓ	APROBÓ
HELVER ALEJANDRO SANABRIA RAMIREZ	JAVIER ANDRÉS LEÓN LÓPEZ	FABIO JESUS MEJIA	LUIS ALFONSO CAGUA OSPINA
RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	0
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	5	PERIODO DE EJECUCIÓN	28/12/2025 a 30/01/2026

CONTRATO DE OBRA No. 8127782 de 2025			CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 8146800		
CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL SOLUCIONES 4 EN 1 S.A.S.	OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD Y SUS SEDES EN CUSTODIA	CONTRATISTA	CONSORCIO CONSULTORES OC	"REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD Y SUS SEDES EN CUSTODIA."
DIRECTOR DE OBRA	JAVIER ANDRÉS LEÓN LÓPEZ		DIRECTOR INTERVENTORIA	LUIS ALFONSO CAGUA OSPINO	
RESIDENTE DE OBRA	HELVER ALEJANDRO SANABRIA RAMIREZ		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	FABIO JESÚS MEJÍA	
CAPITULO:	VIDRIOS-PELÍCULAS-ANGEO		SUBCAPITULO	1.10	FECHA: 30/01/2026
ÍTEM	1.10.5	DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de Angeo metálico. Incluye suministro e instalación.			UNIDAD: M2

No	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					CANTIDAD	TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN		
1	EDIFICIO UVO - COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS PISO 1 - ÁREA DE LABORATORIOS	0,64	0,6					0,38
2		3,4	0,6					2,04
3		2,2	0,6					1,32
4		1,88	0,6					1,13
5		2,2	0,6					1,32
6		2,99	0,6					1,79
7		1,56	0,6					0,94
8		7,3	0,6					4,38
9		7,3	0,6					4,38
10		1,77	0,6					1,06
11		3,7	0,6					2,22
12		0,6	0,6					7,20
							TOTAL ACTIVIDAD	28,16
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	13,02
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	41,18

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA



OBSERVACIONES

ELABORÓ	APROBÓ	APROBÓ	APROBÓ
HELVER ALEJANDRO SANABRIA RAMIREZ	JAVIER ANDRÉS LEÓN LÓPEZ	FABIO JESUS MEJIA	LUIS ALFONSO CAGUA OSPINA
RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	0
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	5	PERIODO DE EJECUCIÓN	28/12/2025 a 30/01/2026

CONTRATO DE OBRA No. 8127782 de 2025			CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 8146800		
CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL SOLUCIONES 4 EN 1 S.A.S.	OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD Y SUS SEDES EN CUSTODIA	CONTRATISTA	CONSORCIO CONSULTORES OC	"REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD Y SUS SEDES EN CUSTODIA."
DIRECTOR DE OBRA	JAVIER ANDRÉS LEÓN LÓPEZ		DIRECTOR INTERVENTORIA	LUIS ALFONSO CAGUA OSPINO	
RESIDENTE DE OBRA	HELVER ALEJANDRO SANABRIA RAMIREZ		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	FABIO JESÚS MEJÍA	
CAPITULO:	VIDRIOS-PELÍCULAS-ANGEO		SUBCAPITULO	1.11	FECHA: 30/01/2026
ÍTEM	1.11.14	DESCRIPCIÓN: Suministro e instalacion de loseta en concreto ,60*,60			UNIDAD: UND

No	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					CANTIDAD	TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN		
1	Edificio administrativo piso 8 - cubierta						20	20,00
2	Edificio administrativo piso 3 - cubierta						12	12,00
3								
							TOTAL ACTIVIDAD	32,00
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	0,00
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	32,00

OBSERVACIONES

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA



ELABORÓ	APROBÓ	APROBÓ	APROBÓ
HELVER ALEJANDRO SANABRIA RAMIREZ	JAVIER ANDRÉS LEÓN LÓPEZ	FABIO JESUS MEJIA	LUIS ALFONSO CAGUA OSPINA
RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	0
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	5	PERIODO DE EJECUCIÓN	28/12/2025 a 30/01/2026

CONTRATO DE OBRA No. 8127782 de 2025			CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 8146800		
CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL SOLUCIONES 4 EN 1 S.A.S.	OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD Y SUS SEDES EN CUSTODIA	CONTRATISTA	CONSORCIO CONSULTORES OC	"REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD Y SUS SEDES EN CUSTODIA."
DIRECTOR DE OBRA	JAVIER ANDRÉS LEÓN LÓPEZ		DIRECTOR INTERVENTORIA	LUIS ALFONSO CAGUA OSPINO	
RESIDENTE DE OBRA	HELVER ALEJANDRO SANABRIA RAMIREZ		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	FABIO JESÚS MEJÍA	
CAPITULO:	ÍTEMS NO PREVISTOS		SUBCAPITULO	NP´s	FECHA: 30/01/2026
ÍTEM	NP - 01	DESCRIPCIÓN: Retiro y disposición final de tapete en área de contraloría			UNIDAD: M2

No	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					CANTIDAD	TOTAL
		PESO (Kg)	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN		
1	Salón 1 área de Contraloría		5,76	4,93			28,40	28,40
2	Salón 2 área de Contraloría		5,76	4,93			28,40	28,40
								0,00
								0,00
								56,79
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	0,00
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	56,79

OBSERVACIONES

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA



ELABORÓ	APROBÓ	APROBÓ	APROBÓ
HELVER ALEJANDRO SANABRIA RAMIREZ	JAVIER ANDRÉS LEÓN LÓPEZ	FABIO JESUS MEJIA	LUIS ALFONSO CAGUA OSPINA
RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	0
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	5	**PERIODO DE EJECUCIÓN**	28/12/2025 a 30/01/2026

CONTRATO DE OBRA No. 8127782 de 2025			**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 8146800**		
CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL SOLUCIONES 4 EN 1 S.A.S.	**OBJETO:** PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD Y SUS SEDES EN CUSTODIA	**CONTRATISTA**	CONSORCIO CONSULTORES OC	"REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD Y SUS SEDES EN CUSTODIA."
DIRECTOR DE OBRA	JAVIER ANDRÉS LEÓN LÓPEZ		**DIRECTOR INTERVENTORIA**	LUIS ALFONSO CAGUA OSPINO	
RESIDENTE DE OBRA	HELVER ALEJANDRO SANABRIA RAMIREZ		**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**	FABIO JESÚS MEJÍA	
CAPITULO:	ÍTEMS NO PREVISTOS		**SUBCAPITULO**	NP´s	**FECHA:** 30/01/2026
ÍTEM	NP - 02	**DESCRIPCIÓN** Suministro e instalación de aceite inmunizante e hidratante para madera Dos manos Tipo Teka o similar. Incluye los materiales necesarios para la preparación de superficie y su correcta aplicación. (para bancas)			**UNIDAD** UND

No	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					CANTIDAD	TOTAL
		PESO (Kg)	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN		
1	Piso 1 - Plazoleta edificio Administrativo						47,00	47,00
2	Piso 5 edificio Administrativo						17,00	17,00
3	Áreas comúnes						5,00	5,00
								69,00
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	**0,00**
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	**69,00**

OBSERVACIONES

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA



ELABORÓ	APROBÓ	APROBÓ	APROBÓ
HELVER ALEJANDRO SANABRIA RAMIREZ	**JAVIER ANDRÉS LEÓN LÓPEZ**	**FABIO JESUS MEJIA**	**LUIS ALFONSO CAGUA OSPINA**
RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	0
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	5	**PERIODO DE EJECUCIÓN**	28/12/2025 a 30/01/2026

CONTRATO DE OBRA No. 8127782 de 2025			**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 8146800**		
CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL SOLUCIONES 4 EN 1 S.A.S.	**OBJETO:** PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD Y SUS SEDES EN CUSTODIA	**CONTRATISTA**	CONSORCIO CONSULTORES OC	"REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD Y SUS SEDES EN CUSTODIA."
DIRECTOR DE OBRA	JAVIER ANDRÉS LEÓN LÓPEZ		**DIRECTOR INTERVENTORIA**	LUIS ALFONSO CAGUA OSPINO	
RESIDENTE DE OBRA	HELVER ALEJANDRO SANABRIA RAMIREZ		**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**	FABIO JESÚS MEJÍA	
CAPITULO:	ÍTEMS NO PREVISTOS		**SUBCAPITULO**	NP´s	**FECHA:** 30/01/2026
ÍTEM	NP - 03	**DESCRIPCIÓN**	Suministro e instalación de aceite inmunizante e hidratante para madera Dos manos Tipo Teka o similar. Incluye los materiales necesarios para la preparación de superficie y su correcta aplicación. (para sillas)		**UNIDAD** UND

No	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					CANTIDAD	TOTAL
		PESO (Kg)	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN		
1	Piso 1 - Plazoleta edificio Administrativo						31,00	31,00
2	Piso 3 edificio Administrativo						4,00	4,00
3	Piso 5 edificio Administrativo						56,00	56,00
4	Cancha - Carrera 33						2,00	1,00
								92,00
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	**0,00**
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	**92,00**

OBSERVACIONES

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA






ELABORÓ	APROBÓ	APROBÓ	APROBÓ
HELVER ALEJANDRO SANABRIA RAMIREZ	JAVIER ANDRÉS LEÓN LÓPEZ	FABIO JESUS MEJIA	LUIS ALFONSO CAGUA OSPINA
RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	0
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	5	PERIODO DE EJECUCIÓN	28/12/2025 a 30/01/2026

CONTRATO DE OBRA No. 8127782 de 2025			CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 8146800		
CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL SOLUCIONES 4 EN 1 S.A.S.	OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD Y SUS SEDES EN CUSTODIA	CONTRATISTA	CONSORCIO CONSULTORES OC	"REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD Y SUS SEDES EN CUSTODIA."
DIRECTOR DE OBRA	JAVIER ANDRÉS LEÓN LÓPEZ		DIRECTOR INTERVENTORIA	LUIS ALFONSO CAGUA OSPINO	
RESIDENTE DE OBRA	HELVER ALEJANDRO SANABRIA RAMIREZ		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	FABIO JESÚS MEJÍA	
CAPITULO:	ÍTEMS NO PREVISTOS		SUBCAPITULO	NP´s	FECHA: 30/01/2026
ÍTEM	NP - 04	DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de aceite inmunizante e hidratante para madera Dos manos Tipo Teka o similar. Incluye los materiales necesarios para la preparación de superficie y su correcta aplicación. (para mesas)			UNIDAD: UND

No	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					CANTIDAD	TOTAL
		PESO (Kg)	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN		
1	Piso 1 - Plazoleta edificio Administrativo						7,00	7,00
2	Piso 3 edificio Administrativo						1,00	1,00
3	Piso 5 edificio Administrativo						14,00	14,00
4	Cancha - Carrera 33						1,00	1,00
								23,00
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	0,00
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	23,00

OBSERVACIONES

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA



ELABORÓ	APROBÓ	APROBÓ	APROBÓ
HELVER ALEJANDRO SANABRIA RAMIREZ	JAVIER ANDRÉS LEÓN LÓPEZ	FABIO JESUS MEJIA	LUIS ALFONSO CAGUA OSPINA
RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	0
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	5	PERIODO DE EJECUCIÓN	28/12/2025 a 30/01/2026

CONTRATO DE OBRA No. 8127782 de 2025			CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 8146800		
CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL SOLUCIONES 4 EN 1 S.A.S.	OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD Y SUS SEDES EN CUSTODIA	CONTRATISTA	CONSORCIO CONSULTORES OC	"REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD Y SUS SEDES EN CUSTODIA."
DIRECTOR DE OBRA	JAVIER ANDRÉS LEÓN LÓPEZ		DIRECTOR INTERVENTORIA	LUIS ALFONSO CAGUA OSPINO	
RESIDENTE DE OBRA	HELVER ALEJANDRO SANABRIA RAMIREZ		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	FABIO JESÚS MEJÍA	
CAPITULO:	ÍTEMS NO PREVISTOS		SUBCAPITULO	NP´s	FECHA: 30/01/2026
ÍTEM	NP - 05	DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de perfil de transición en ingresos áreas 1 y 2 de contraloría.			UNIDAD: ML

No	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					CANTIDAD	TOTAL
		PESO (Kg)	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN		
1	Salón No. 01 de Contraloría		1,80				1,00	1,80
2	Salón No. 02 de Contraloría		1,80				1,00	1,80
								3,60
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	0,00
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	3,60

OBSERVACIONES

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA





ELABORÓ	APROBÓ	APROBÓ	APROBÓ
HELVER ALEJANDRO SANABRIA RAMIREZ	JAVIER ANDRÉS LEÓN LÓPEZ	FABIO JESUS MEJIA	LUIS ALFONSO CAGUA OSPINA
RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	0
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1


ACTA PARCIAL DE OBRA No.	5	PERIODO DE EJECUCIÓN	28/12/2025 a 30/01/2026

CONTRATO DE OBRA No. 8127782 de 2025			CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 8146800		
CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL SOLUCIONES 4 EN 1 S.A.S.	OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD Y SUS SEDES EN CUSTODIA	CONTRATISTA	CONSORCIO CONSULTORES OC	"REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD Y SUS SEDES EN CUSTODIA."
DIRECTOR DE OBRA	JAVIER ANDRÉS LEÓN LÓPEZ		DIRECTOR INTERVENTORIA	LUIS ALFONSO CAGUA OSPINO	
RESIDENTE DE OBRA	HELVER ALEJANDRO SANABRIA RAMIREZ		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	FABIO JESÚS MEJÍA	

CAPITULO:	ÍTEMS NO PREVISTOS	SUBCAPITULO	NP´s	FECHA:	30/01/2026
ÍTEM	NP - 06	DESCRIPCIÓN	Adecuación de fachada incluye lavado con SIKA LIMPIADOR RINSE donde exista presencia de hongos y reforzado con ácido nítrico solo en caso que sea necesario dependiendo patología, incluye reemboquillado en áreas donde se evidencie posible filtración por caida de boquilla con el uso de manlift.	UNIDAD	M2

No	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					CANTIDAD	TOTAL
		PESO (Kg)	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN		
1	Fachada interna edificio Laboratorios		4,86	18,76			1,00	91,17
			5,56	7,5			1,00	41,70
			1,5	5,56			1,00	8,34
			21,45	1,28			1,00	27,46
			0,76	11,5			4,00	34,96
			6	0,7			1,00	4,20
			6	0,6			1,00	3,60
			4,87	23,54			1,00	114,64
2	Fachada interna edificio Hemocentro		3,2	26			1	83,20
			4,6	2,3			1	10,58
			0,2	1,17			2	0,47
			5,9	4,99			1	29,44
			0,65	11,58			1	7,53
			2,9	4,99			1	14,47
			10,25	13,14			1	134,69
			5,28	18,77			1	99,11
			5,35	5,64			1	30,17
			4,83	0,63			5	15,21
3	Fachada externa Edificio Laboratorios - Parqueadero		8,1	7,62			1	61,72
			1,6	13,8			1	22,08
			5,3	17,85			1	94,61
			3,1	10,1			1	31,31
			4,38	2			2	17,52
			17,89	4,18			1	74,78
			3	0,16			12	5,76
			0,6	1,6			12	11,52
			1,48	28,56			1	42,27
			2,5	2,36			6	35,40
			3,2	14,4			1	46,08
			2,1	3,3			1	6,93
			4,5	12			1	54,00
			6,7	3,3			1	22,11
			5,8	3,3			1	19,14
			8,15	0,63			10	51,35
			2,87	2,07			14	83,17
			1,4	1,1			28	43,12
			11,19	1,18			5	66,02
4	Fachada externa Edificio Hemocentro ID-CBIS		4,62	1,55			1	7,16
			0,63	2,06			1	1,30
			12	1,28			1	15,36
			3,36	1,55			3	15,62
			4,17	2,06			3	25,77
			2	0,71			1	1,42
			1,22	4,62			1	5,64
			12	1,45			1	17,40
			0,62	2,1			1	1,30
			4,36	1,28			1	5,58
			6,25	7,85			1	49,06
			1,26	23,15			1	29,17
			3,2	4			1	12,80
			-2,28	2,2			1	-5,02
			0,63	14,95			1	9,42
			6,87	0,63			3	12,98
			4,25	1,14			5	24,23
			12,37	0,78			1	9,65
								1778,66
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	0,00
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	1778,66

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

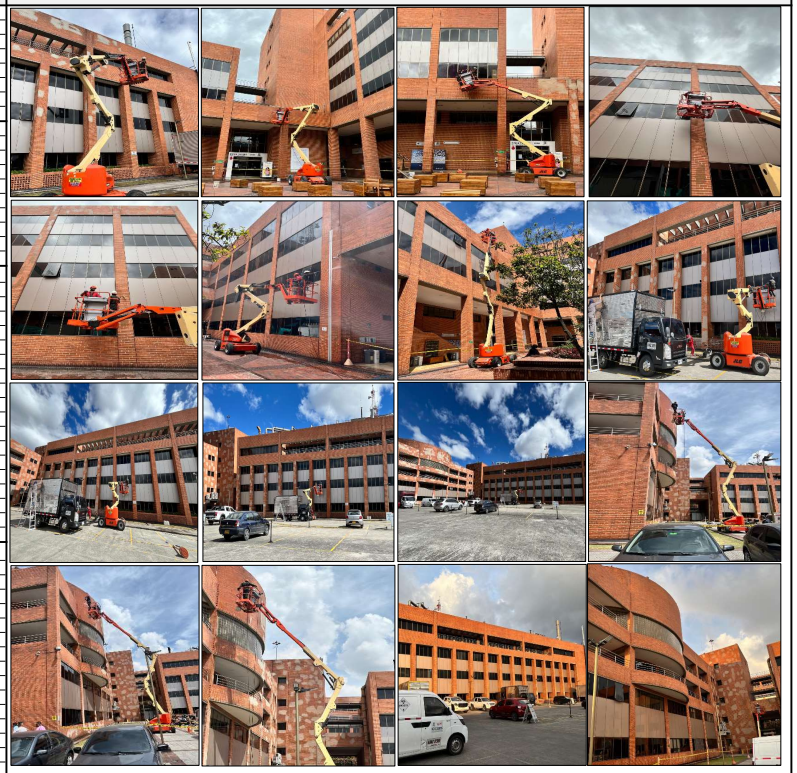

OBSERVACIONES

ELABORÓ	APROBÓ	APROBÓ	APROBÓ
HELVER ALEJANDRO SANABRIA RAMIREZ	JAVIER ANDRÉS LEÓN LÓPEZ	FABIO JESUS MEJIA	LUIS ALFONSO CAGUA OSPINA
RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	0
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	5	PERIODO DE EJECUCIÓN	28/12/2025 a 30/01/2026

CONTRATO DE OBRA No. 8127782 de 2025			CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 8146800		
CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL SOLUCIONES 4 EN 1 S.A.S.	OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD Y SUS SEDES EN CUSTODIA	CONTRATISTA	CONSORCIO CONSULTORES OC	"REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD Y SUS SEDES EN CUSTODIA."
DIRECTOR DE OBRA	JAVIER ANDRÉS LEÓN LÓPEZ		DIRECTOR INTERVENTORIA	LUIS ALFONSO CAGUA OSPINO	
RESIDENTE DE OBRA	HELVER ALEJANDRO SANABRIA RAMIREZ		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	FABIO JESÚS MEJÍA	
CAPITULO:	ÍTEMS NO PREVISTOS		SUBCAPITULO	NP´s	FECHA: 30/01/2026
ÍTEM	NP - 07	DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de esquinero plastico para pared			UNIDAD: ML

No	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					CANTIDAD	TOTAL
		PESO (Kg)	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN		
1	Recepción edificio DUES - CRUE Piso 1			2,4			2,00	4,80
2	Sótano edificio DUES - CRUE			2,4			4,00	9,60
								0,00
								0,00
							TOTAL ACTIVIDAD	14,40
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	0,00
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	14,40

OBSERVACIONES

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA



ELABORÓ	APROBÓ	APROBÓ	APROBÓ
HELVER ALEJANDRO SANABRIA RAMIREZ	JAVIER ANDRÉS LEÓN LÓPEZ	FABIO JESUS MEJIA	LUIS ALFONSO CAGUA OSPINA
RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	0
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	5	PERIODO DE EJECUCIÓN	28/12/2025 a 30/01/2026

CONTRATO DE OBRA No. 8127782 de 2025			CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 8146800		
CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL SOLUCIONES 4 EN 1 S.A.S.	OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD Y SUS SEDES EN CUSTODIA	CONTRATISTA	CONSORCIO CONSULTORES OC	"REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD Y SUS SEDES EN CUSTODIA."
DIRECTOR DE OBRA	JAVIER ANDRÉS LEÓN LÓPEZ		DIRECTOR INTERVENTORIA	LUIS ALFONSO CAGUA OSPINO	
RESIDENTE DE OBRA	HELVER ALEJANDRO SANABRIA RAMIREZ		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	FABIO JESÚS MEJÍA	
CAPITULO:	ÍTEMS NO PREVISTOS		SUBCAPITULO	NP´s	FECHA: 30/01/2026
ÍTEM	NP-08	DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de motores para puertas corredizas de acceso al predio denominado Complejo Hospitalario San Juan de Dios de la Secretaria Distrital de Salud (incluye: mantenimiento del riel, reforzamiento de las puertas y de la estructura soporte y todo los elementos necesarios para su funcionamiento), 220v/24v. Irreversible para puertas corredizas de cremallera de hasta 1000kg. Uso intensivo. Velocidad de la hoja 9m/min, con gestión de velocidad y posición con sistema D-TRACK. Desaceleración electrónica (amperio-stop), y/o similar.			UNIDAD: UND

No	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					CANTIDAD	TOTAL
		PESO (Kg)	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN		
1	Portería Calle 2a - CHSJD						2,00	2,00
2	Portería Linares Calle 1a - CHSJD						2,00	2,00
3	Portería Calle 1a No. 4 - CHSJD						2,00	2,00
								0,00
							TOTAL ACTIVIDAD	6,00
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	0,00
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	6,00

OBSERVACIONES

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA



ELABORÓ	APROBÓ	APROBÓ	APROBÓ
HELVER ALEJANDRO SANABRIA RAMIREZ	JAVIER ANDRÉS LEÓN LÓPEZ	FABIO JESUS MEJIA	LUIS ALFONSO CAGUA OSPINA
RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


CÓDIGO:	
VERSIÓN:	0
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	5	**PERIODO DE EJECUCIÓN**	28/12/2025 a 30/01/2026

CONTRATO DE OBRA No. 8127782 de 2025			**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 8146800**		
CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL SOLUCIONES 4 EN 1 S.A.S.	**OBJETO:** PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD Y SUS SEDES EN CUSTODIA	**CONTRATISTA**	CONSORCIO CONSULTORES OC	"REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD Y SUS SEDES EN CUSTODIA."
DIRECTOR DE OBRA	JAVIER ANDRÉS LEÓN LÓPEZ		**DIRECTOR INTERVENTORIA**	LUIS ALFONSO CAGUA OSPINO	
RESIDENTE DE OBRA	HELVER ALEJANDRO SANABRIA RAMIREZ		**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**	FABIO JESÚS MEJÍA	
CAPITULO:	ÍTEMS NO PREVISTOS		**SUBCAPITULO**	NP´s	**FECHA:** 30/01/2026
ÍTEM	NP-09	**DESCRIPCIÓN**	Instalación de Cerca eléctrica de SEIS (06) hilos que incluye: alambre galvanizado para alta tensión (6 líneas), aisladores para postes y esquinas, tensores y conectores, energizador eléctrico (220V), cable de alta tensión para conexión, placas de señalización, herrajes y soportes para fijación.		**UNIDAD** ML

No	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					CANTIDAD	TOTAL
		PESO (Kg)	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN		
1	Edificio Mantenimiento						5,3	5,30
							30	30,00
							18,26	18,26
							15,5	15,50
2	Muro colindante Casas Calle 2a						26,2	26,20
							3,8	3,80
							9,76	9,76
							14	14,00
							20,86	20,86
							23,65	23,65
							18,27	18,27
							9	9,00
3	Portería Calle 2						18,4	18,40
							31,58	31,58
							24,7	24,70
							25,13	25,13
							18,67	18,67
4	Salud mental						30,0	30,00
							30,0	30,00
							24,4	24,40
							4,0	4,00
							32,0	32,00
5	Cundifarma						4,69	4,69
6	Carrera 10						9,82	9,82
							6,71	6,71
							1,7	1,70
							16,1	16,10
							3,97	3,97
							1,45	1,45
							0,97	0,97
							0,95	0,95
							1,45	1,45
							7,08	7,08
							3,7	3,70
							7,08	7,08
							2,5	2,50
							10,15	10,15
							13,28	13,28
7	Hogar geriatrico						4	4,00
							6,45	6,45
							27,35	27,35
							20,5	20,50
							5,78	5,78
							33,9	33,90
							7,4	7,40
							27,89	27,89
							3,29	3,29
							14,6	14,60
							0,11	0,11
							30,5	30,50
							10,4	10,40
8	Avenida Caracas						21,33	21,33
							3,92	3,92
							2,1	2,10
							12,25	12,25
9	Cancha						30,5	30,50
							9,4	9,40
							30,5	30,50
							24,15	24,15
							30,5	30,50
							5,08	5,08
10	Carrera 1						38,76	38,76
							3,22	3,22
							TOTAL ACTIVIDAD	928,96
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	0,00
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	928,96

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA

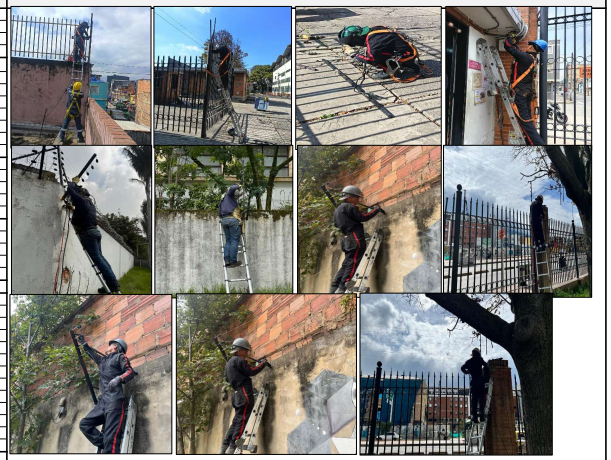

OBSERVACIONES

ELABORÓ	APROBÓ	APROBÓ	APROBÓ
HELVER ALEJANDRO SANABRIA RAMIREZ	JAVIER ANDRÉS LEÓN LÓPEZ	FABIO JESUS MEJIA	LUIS ALFONSO CAGUA OSPINA
RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	0
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	5	PERIODO DE EJECUCIÓN	28/12/2025 a 30/01/2026

CONTRATO DE OBRA No. 8127782 de 2025			CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 8146800		
CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL SOLUCIONES 4 EN 1 S.A.S.	OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD Y SUS SEDES EN CUSTODIA	CONTRATISTA	CONSORCIO CONSULTORES OC	"REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD Y SUS SEDES EN CUSTODIA."
DIRECTOR DE OBRA	JAVIER ANDRÉS LEÓN LÓPEZ		DIRECTOR INTERVENTORIA	LUIS ALFONSO CAGUA OSPINO	
RESIDENTE DE OBRA	HELVER ALEJANDRO SANABRIA RAMIREZ		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	FABIO JESÚS MEJÍA	
CAPITULO:	ÍTEMS NO PREVISTOS		SUBCAPITULO	NP´s	FECHA: 30/01/2026
ÍTEM	NP - 10	DESCRIPCIÓN: Desmonte de teja en asbesto cemento			UNIDAD: M2

No	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					CANTIDAD	TOTAL
		PESO (Kg)	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN		
1	Cubierta - sede en custodia "La Camelia"		5,9	1,07			27,00	170,45
			2,95	1,07			27,00	85,23
								0,00
								0,00
							TOTAL ACTIVIDAD	255,68
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	0,00
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	255,68

OBSERVACIONES

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA



ELABORÓ	APROBÓ	APROBÓ	APROBÓ
HELVER ALEJANDRO SANABRIA RAMIREZ	JAVIER ANDRÉS LEÓN LÓPEZ	FABIO JESUS MEJIA	LUIS ALFONSO CAGUA OSPINA
RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	0
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	5	**PERIODO DE EJECUCIÓN**	28/12/2025 a 30/01/2026

CONTRATO DE OBRA No. 8127782 de 2025			**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 8146800**		
CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL SOLUCIONES 4 EN 1 S.A.S.	**OBJETO:** PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD Y SUS SEDES EN CUSTODIA	**CONTRATISTA**	CONSORCIO CONSULTORES OC	"REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD Y SUS SEDES EN CUSTODIA."
DIRECTOR DE OBRA	JAVIER ANDRÉS LEÓN LÓPEZ		**DIRECTOR INTERVENTORIA**	LUIS ALFONSO CAGUA OSPINO	
RESIDENTE DE OBRA	HELVER ALEJANDRO SANABRIA RAMIREZ		**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**	FABIO JESÚS MEJÍA	
CAPITULO:	ÍTEMS NO PREVISTOS		**SUBCAPITULO**	NP´s	**FECHA:** 30/01/2026
ÍTEM	NP - 11	**DESCRIPCIÓN** Instalación de perfiles para cubierta con teja termoacústica			**UNIDAD** ML

No	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					CANTIDAD	TOTAL
		PESO (Kg)	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN		
1	Cubierta - sede en custodia "La Camelia"						229,30	229,30
								0,00
								0,00
								0,00
							TOTAL ACTIVIDAD	**229,30**
							ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR	**0,00**
							TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS	**229,30**

OBSERVACIONES

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA



ELABORÓ	APROBÓ	APROBÓ	APROBÓ
HELVER ALEJANDRO SANABRIA RAMIREZ	**JAVIER ANDRÉS LEÓN LÓPEZ**	**FABIO JESUS MEJIA**	**LUIS ALFONSO CAGUA OSPINA**
RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	0
FECHA DE APROBACIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	5	PERIODO DE EJECUCIÓN	28/12/2025 a 30/01/2026

CONTRATO DE OBRA No. 8127782 de 2025			CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 8146800		
CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL SOLUCIONES 4 EN 1 S.A.S.	**OBJETO:** PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD Y SUS SEDES EN CUSTODIA	CONTRATISTA	CONSORCIO CONSULTORES OC	"REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD Y SUS SEDES EN CUSTODIA."
DIRECTOR DE OBRA	JAVIER ANDRÉS LEÓN LÓPEZ		DIRECTOR INTERVENTORIA	LUIS ALFONSO CAGUA OSPINO	
RESIDENTE DE OBRA	HELVER ALEJANDRO SANABRIA RAMIREZ		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	FABIO JESÚS MEJÍA	
CAPITULO:	ÍTEMS NO PREVISTOS		SUBCAPITULO	NP´s	FECHA: 30/01/2026
ÍTEM	NP - 12	DESCRIPCIÓN: Retiro y disposición final de teja de asbesto cemento			UNIDAD: KG

No	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					CANTIDAD	TOTAL
		PESO (Kg)	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN		
1	Teja y tanque de almacenamiento - asbesto cemento, sede en custodia "La Camelia"						6000,00	6000,00
								0,00
								0,00
								0,00
						TOTAL ACTIVIDAD		6000,00
						ACUMULADAS EN EL ACTA ANTERIOR		0,00
						TOTAL CANTIDADES ACUMULADAS		6000,00

OBSERVACIONES

LOCALIZACIÓN / ESQUEMA



ELABORÓ	APROBÓ	APROBÓ	APROBÓ
HELVER ALEJANDRO SANABRIA RAMIREZ	JAVIER ANDRÉS LEÓN LÓPEZ	FABIO JESUS MEJIA	LUIS ALFONSO CAGUA OSPINA
RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
