1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	***DANERY PUPIALES ZAPATA***
Informe de Actividades Nº	*1*
Periodo	*07 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE*
Número del Contrato	*3994 de 2020*
Objeto:	***PRESTACIÒN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA MÁS ACCESO Y CALIDAD DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO BÁSICO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA***
Plazo	*TRES MESES Y VEINTICINCO DIAS (3 MESES Y 25 DIAS)*
Valor Total del Contrato	*NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE. ($ 9.675.333)*
Valor del Periodo del Informe	*DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS M/Cte $2.524.000*
Fecha de Inicio	*07/09/2020*
Fecha de Terminación	*31/12/2020*
Proyecto	*FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA*
Supervisor	*CARLOS ALBERTO VARGAS*
Dependencia	*SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTIÓN AMBIENTAL*

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
1. Realizar los trámites ambientales ante la Corporación Autónoma de Risaralda (CARDER) para los diferentes proyectos que adelanta la Secretaría de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental.	*1. Se realizó el día 15/09/2020 carta para Secretaria de Salud Pública y Seguridad Social, al acueducto Carbonera La Trinidad asunto: Resultados de análisis de calidad de agua para dar continuidad al anexo técnico II Radicado N°18992-2020.* *2. Se realizó el día 21/09/2020 asesoría al acueducto Carbonera La Trinidad Tema: Documento técnico sobre diagnóstico del acueducto, para tramite ambiental concesión de aguas superficiales.*	***SERIE:** informes* ***SUBSERIE:** informe técnico para la gestión integral del recurso hídrico* *1. Registro del día 15/09/2020 Carta Radicada N°18992-2020.* *2.Registro de control de llamada del día 21/09/2020*	

Tipo de meta	Cuantitativa											
	Cualitativa											
Descripción	Cantidad y/o porcentaje											
Meta	Número de actividades solicitadas / Número de actividades realizadas											
Tipo	Contrato:3994				Duración:3 y 25días				3 meses			
	Adición				Duración:				No aplica			
Mes	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
Avance									*2*			
Acumulado									*2*			
Cumplimiento del alcance al final del contrato												
NOTA ACLARATORIA DE LA META: Meta concertada con la supervisión,												

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
2. Brindar acompañamiento a través de visitas para la implementación de Buenas Prácticas Sanitarias (BPS) para la obtención del concepto sanitario favorable a los acueductos rurales.	*1. Se realizó monitoreo vía telefónica 2dias a la semana, del estado de funcionamiento de los acueductos rurales: (Caimalito I, Caimalito II, Carbonera Paso Nivel, Carbonera La Trinidad, K5, Alto Erazo I y III, y Alto Erazo II), Viva Cerritos, Pital de Combia, La Convención, Amoladora Baja, San Vicente de Betania, Llano Grande, y Guadualito del municipio de Pereira, con el propósito de verificar en coordinación con los representantes de dichos acueductos, la calidad del agua suministrada para consumo humano y la continuidad del servicio debido a la emergencia sanitaria generada por el (COVID – 19).* *2. Se realizó el día 11/09/2020 entrega de suministro de hipoclorito de calcio al 70% a los acueductos: Pérez Bajo, Pérez Alto, Santa Cruz de Barbas, Caracol Roció, Cantamonos,Yarumal ,Peñas Rojas, y Aquasat.*	***SERIE:*** *informes* ***SUBSERIE:*** *informe técnico para la gestión integral del recurso hídrico* *1. Registro de control de llamadas.* *Registro de Actas de suministro de cloro del día 11/09/2020*	

Tipo de meta	Cuantitativa											
	Cualitativa											
Descripción	Cantidad y/o porcentaje											
Meta	Número de actividades solicitadas / Número de actividades realizadas											
Tipo	Contrato:3994				Duración: 3 y 25 días				3meses			
	Adición				Duración:				No aplica			
Mes	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
Avance									*11*			
Acumulado									*11*			
Cumplimiento del alcance al final del contrato												
NOTA ACLARATORIA DE LA META: Meta concertada con la supervisión,												

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
2. Brindar acompañamiento a través de visitas para la implementación de Buenas Prácticas Sanitarias (BPS) para la obtención del concepto sanitario favorable a los acueductos rurales.	*3.Se realizó el día 17/09/2020 Visita técnica de (BPS) Buenas Practicas Sanitarias el al Acueducto La Florida y análisis de calidad de agua.* *4. Se realizó el día 01/10/2020 Visita técnica de (BPS) Buenas Practicas Sanitarias el al Acueducto San José y análisis de calidad de agua* *5. Se realizó el día 01/10/2020 Visita técnica de (BPS) Buenas Practicas Sanitarias el al Acueducto Manzano Alto (ASUSAMALTO) y análisis de calidad de agua*	***SERIE:*** *informes* ***SUBSERIE:*** *informe técnico para la gestión integral del recurso hídrico* *3. Registró Diario de labor del día 17/09/2020 N°119132 y análisis de calidad de agua.* *4. Registró Diario de labor del día 01/10/2020 N° 119134y análisis de calidad de agua.* *5. Registró Diario de labor del día 01/10/2020 N°119135 y análisis de calidad de agua.*	

Tipo de meta	Cuantitativa												
	Cualitativa												
Descripción	Cantidad y/o porcentaje												
Meta	Número de actividades solicitadas / Número de actividades realizadas												
Tipo	Contrato:3994				Duración: 3 y 25 días				3meses				
	Adición				Duración:				No aplica				
Mes	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	
Avance									*11*				
Acumulado									*11*				
Cumplimiento del alcance al final del contrato													
NOTA ACLARATORIA DE LA META: Meta concertada con la supervisión,													

<table>
<tr><th>OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO</th><th>ACTIVIDAD DESARROLLADA</th><th>REGISTRO</th><th>OBSERVACIONES</th></tr>
<tr>
<td>3.Realizar acompañamiento a las empresas prestadoras del servicio de agua potable para la elaboración e implementación de Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua</td>
<td>1. Se realizó el día 01/ 10/2020 radicado ante CARDER informe de actividades del PUEAA año 2019 del acueducto Pital de Combia.

2.Se realizó el día 1/10/2020 asesoría en la formulación del PUEAA al acueducto Manzano Alto(ASUSAMALTO)</td>
<td>SERIE: informes

SUBSERIE: informe técnico para la gestión integral del recurso hídrico

1. Registro fotográfico del día 01/10/2020 Radicado N°10878-2020 ante CARDER.

2. Registro fotográfico del día 01/10/2020.</td>
<td>
<table>
<tr><td rowspan="2">Tipo de meta</td><td colspan="10">Cuantitativa</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="10">Cualitativa</td><td></td></tr>
<tr><td>Descripción</td><td colspan="11">Cantidad y/o porcentaje</td></tr>
<tr><td>Meta</td><td colspan="11">Número de actividades solicitadas /
Número de actividades realizadas</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Tipo</td><td colspan="4">Contrato:3994</td><td colspan="4">Duración: 3 y 25 días</td><td colspan="3">3 meses</td></tr>
<tr><td colspan="4">Adición</td><td colspan="4">Duración:</td><td colspan="3">No aplica</td></tr>
<tr><td>Mes</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr>
<tr><td>Avance</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Acumulado</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="10">Cumplimiento del alcance al final del contrato</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="12">NOTA ACLARATORIA DE LA META: Meta concertada con la supervisión,</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><th>OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO</th><th>ACTIVIDAD DESARROLLADA</th><th>REGISTRO</th><th>OBSERVACIONES</th></tr>
<tr>
<td>4.Participar en el plan de formación y capacitación individual y/o grupal en el marco del fortalecimiento de los acueductos rurales en desarrollo del Programa Uso Eficiente y Ahorro del Agua PUEAA</td>
<td>1. Se realizó el día 22/09/2020 asesoría en las actividades del PUEAA al acueducto Cantamonos para presentar informe ante Autoridad Ambiental CARDER.

2. Se realizó el día 29/09/2020 llamada al representante legal del acueducto Pérez Bajo al señor Ramiro Cruz para darle asesoría sobre el oficio N°12496 que emito CARDER asunto: Seguimiento y control a la Resolución 1014 de 2017 solicitud informe PUEAA vigencia 2019 Exp 990.</td>
<td>SERIE: informes

SUBSERIE: informe técnico para la gestión integral del recurso hídrico

1. Registro de control de llamadas del día 22/09/2020.

2. Registro de Control de llamada del día 29/09/2020.</td>
<td>
<table>
<tr><td rowspan="2">Tipo de meta</td><td colspan="10">Cuantitativa</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="10">Cualitativa</td><td></td></tr>
<tr><td>Descripción</td><td colspan="11">Cantidad y/o porcentaje</td></tr>
<tr><td>Meta</td><td colspan="11">Número de actividades solicitadas /
Número de actividades realizadas</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Tipo</td><td colspan="4">Contrato:3994</td><td colspan="4">Duración:3 y 25 días</td><td colspan="3">3 meses</td></tr>
<tr><td colspan="4">Adición</td><td colspan="4">Duración:</td><td colspan="3">No aplica</td></tr>
<tr><td>Mes</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr>
<tr><td>Avance</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Acumulado</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="10">Cumplimiento del alcance al final del contrato</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="12">NOTA ACLARATORIA DE LA META: Meta concertada con la supervisión,</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><th>OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO</th><th>ACTIVIDAD DESARROLLADA</th><th>REGISTRO</th><th>OBSERVACIONES</th></tr>
<tr>
<td>5. Recolectar y tomar la información de campo para los estudios y diseños que se requieren en el mejoramiento de la infraestructura de los acueductos rurales.</td>
<td>1. Se realizó el día 10/09/2020 llamada telefónica al Ing Hidráulico Miguel Ángel Ríos Tema: Información de materiales para la construcción del instrumento de medición y regulación de caudal al acueducto Chocho canceles.

2. Se realizó el día 02/10/2020 asesoría en la Guía del Diagnóstico del suministro de agua para consumo humano y doméstico en la zona rural del municipio de Pereira al acueducto Carbonera Paso Nivel.
.</td>
<td>SERIE: informes

SUBSERIE: informe técnico para la gestión integral del recurso hídrico

1. Registro de control de llamada del día 10/09/2020.

2. Registro fotográfico del día 02/10/2020.</td>
<td>
<table>
<tr><td rowspan="2">Tipo de meta</td><td colspan="11">Cuantitativa</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="11">Cualitativa</td><td></td></tr>
<tr><td>Descripción</td><td colspan="12">Cantidad y/o porcentaje</td></tr>
<tr><td>Meta</td><td colspan="12">Número de actividades solicitadas /
Número de actividades realizadas</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Tipo</td><td colspan="4">Contrato:3994</td><td colspan="5">Duración: 3 y 25 días</td><td colspan="3">3meses</td></tr>
<tr><td colspan="4">Adición</td><td colspan="5">Duración:</td><td colspan="3">No aplica</td></tr>
<tr><td>Mes</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr>
<tr><td>Avance</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Acumulado</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="11">Cumplimiento del alcance al final del contrato</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="12">NOTA ACLARATORIA DE LA META: Meta concertada con la supervisión,</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><th>OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO</th><th>ACTIVIDAD DESARROLLADA</th><th>REGISTRO</th><th>OBSERVACIONES</th></tr>
<tr>
<td>6. Apoyar el cumplimento de lo establecido en el modelo integrado de planeación y gestión MIPG</td>
<td>1.Se entregaron los formatos debidos y diligenciados</td>
<td>
<u>ANEXO</u>

✓ Alcance 1. Registró de Carta radicada y de Control de llamada.
✓ Alcance 2.Registro de control de llamadas, Actas de suministró de cloro, y Diario de Labores N°119132,119134, 119135, y análisis de calidad de agua.
✓ Alcance 3.Registro fotográfico.
✓ Alcance 4.Registro de control de llamadas.
✓ Alcance 5.Registro de control de llamadas, fotográfico.
✓ Alcance 7. Registro de certificado SISAA.
✓ Alcance 8.Informe mensual y Informe de acueductos.
✓ Alcance 9.Registro fotográfico.

</td>
<td>
<table>
<tr><td rowspan="2">Tipo de meta</td><td colspan="10">Cuantitativa</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="10">Cualitativa</td><td></td></tr>
<tr><td>Descripción</td><td colspan="11">Cantidad y/o porcentaje</td></tr>
<tr><td>Meta</td><td colspan="11">Número de actividades solicitadas /
Número de actividades realizadas</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Tipo</td><td colspan="5">Contrato:3994</td><td colspan="4">Duración:3 y 25 días</td><td colspan="2">3 meses</td></tr>
<tr><td colspan="5">Adición</td><td colspan="4">Duración:</td><td colspan="2">No aplica</td></tr>
<tr><td>Mes</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr>
<tr><td>Avance</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>7</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Acumulado</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>7</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="10">Cumplimiento del alcance al final del contrato</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="12">NOTA ACLARATORIA DE LA META: Meta concertada con la supervisión,</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><th>OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO</th><th>ACTIVIDAD DESARROLLADA</th><th>REGISTRO</th><th>OBSERVACIONES</th></tr>
<tr>
<td>7. Ingresar la información que se produce en forma geográfica alfanumérica a la plataforma del SISAA, para mantener actualizado el sistema.</td>
<td>En este periodo se realizó el ingreso de 2 diarios de labores y 1 usuario no regular SISAA.</td>
<td><u>ANEXO.</u>

1. Registro de Certificado SISAA.</td>
<td>
<table>
<tr><td rowspan="2">Tipo de meta</td><td colspan="3">Cuantitativa</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">Cualitativa</td><td></td></tr>
<tr><td>Descripción</td><td colspan="4">Cantidad y/o porcentaje</td></tr>
<tr><td>Meta</td><td colspan="4">Número de actividades solicitadas /
Número de actividades realizadas</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Tipo</td><td>Contrato:3994</td><td>Duración:3 y 25 días</td><td>3meses</td></tr>
<tr><td>Adición</td><td>Duración:</td><td>No aplica</td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>Mes</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr>
<tr><td>Avance</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Acumulado</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>Cumplimiento del alcance al final del contrato</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">NOTA ACLARATORIA DE LA META: Meta concertada con la supervisión,</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
8.Rendir informes que sean solicitados relacionados con el objeto del contrato	*1. Se realizó el informe Mensual de Actividades.* *2. Se realizó el día 07/09/2020 informe de avances de acueductos en trámites ambiental asignados.* *3. Se realizó el día 17/09/2020 entrega de listado de requerimiento de materiales de los acueductos rurales del Municipio de Pereira.* *4. Se realizó el día15 /09/2020 entrega de informe de suministro de cloro.*	***ANEXO.*** *1.Informe de actividades N°1* *2. Registro informe de Acueductos del día 07/09/2020.* *.* *3. Registro de informe de requerimientos de materiales día 17/09/2020.* *4. Registro de informe de entrega de cloro del día 15/09/2020.*	

Tipo de meta	Cuantitativa											
	Cualitativa											
Descripción	Cantidad y/o porcentaje											
Meta	Número de actividades solicitadas / Número de actividades realizadas											
Tipo	Contrato:3994				Duración:3 y 25 días				3 meses			
	Adición				Duración:				No aplica			
Mes	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
Avance									*1*			
Acumulado									*1*			
Cumplimiento del alcance al final del contrato												
NOTA ACLARATORIA DE LA META: Meta concertada con la supervisión,												

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
9. Apoyar todas las actividades que fomenten el desarrollo rural.	*1. Se apoyó el día20/09/2020la Mercaton Campesina en el parque de la Rebeca.* *2. Se asistió el día 30/09/2020 foro virtual organizado por la Superservicios Encuentro Regional de Acueductos Rurales Eje Cafetero.*	***ANEXO.*** ***REGISTRO:*** *1. Registro fotográfico del día 20/09/ 2020* *.* *2. Registro fotográfico del día 30/09/2020.*	

Tipo de meta	Cuantitativa											
	Cualitativa											
Descripción	Cantidad y/o porcentaje											
Meta	Número de actividades solicitadas / Número de actividades realizadas											
Tipo	Contrato:3994				Duración:3 y 25 días				3 meses			
	Adición				Duración:				No aplica			
Mes	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
Avance									*2*			
Acumulado									*2*			
Cumplimiento del alcance al final del contrato												
NOTA ACLARATORIA DE LA META: Meta concertada con la supervisión,												

DANERY PUPIALES ZAPATA.
CC.66682003 DE ZARZAL

CARLOS VARGAS
C.C18514060. Pereira

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

ACTA DE SUMINISTRO Y CONTROL DE HIPOCLORITO DE CALCIO

Versión: 01 Fecha de Vigencia: Mayo 08 de 2017

Entre los suscritos Alcaldía de Pereira, representada por Sandra Granada Secretario(a) de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental, quien para efectos de la presente acta se denominará **EL MUNICIPIO** y Cesar Agusto Restrepo Identificado(a) con CC. 18603694, quien se denominará **EL REPRESENTANTE** del acueducto en condición de: Representante Legal ____ u otro X, se firma la presente Acta de Suministro y Control de Hipoclorito de Calcio, que será entregado al acueducto: Aguasat ubicado en la vereda: San Joaquin, corregimiento: Altagracia del Municipio de Pereira; con el objeto de apoyar el proceso de desinfección del agua para consumo humano que distribuye el acueducto.

SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DE AGUA CRUDA

PRODUCTO	CANTIDAD SUMINISTRADA	CANTIDAD RECOMENDADA A APLICAR
Hipoclorito de Calcio al 70-1.	2 Canecas	3 K. los Cada 4 días

COMPROMISOS DE LAS PARTES: A) El acueducto 1. Debe garantizar la preparación de la mezcla a usar, después de lograr disolución del producto granular hasta alcanzar su estado líquido. 2. El acueducto debe garantizar el proceso operativo para la adecuada y correcta utilización de los insumos suministrados. 3. El acueducto debe garantizar el uso adecuado del producto o insumo suministrado. 4. Se hace necesario que el acueducto tenga el personal idóneo y con los elementos de protección necesarios para realizar la disolución del producto entregado. 5. El acueducto debe garantizar que los equipos utilizados en la desinfección sean los adecuados y que estén en perfecto funcionamiento.

B) El Municipio a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental, debe: 1- Realizar el seguimiento y verificación del cumplimiento de lo pactado en la presente acta. 2. Estar en contacto con la Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social del municipio para verificar el control de la calidad del agua suministrada por el acueducto. 3. Realizar un monitoreo preventivo de la calidad del agua para verificar la eficiencia del procedimiento realizado por el acueducto.

Para constancia se firma en Pereira a los 11 días del mes de 09 del año 2020

Nombre técnico que entrega: Yaneny Rupiales Firma Beneficiario: Cesar Agusto

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

ACTA DE SUMINISTRO Y CONTROL DE HIPOCLORITO DE CALCIO

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 08 de 2017

Entre los suscritos Alcaldía de Pereira, representada por Sandra Granada Secretario(a) de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental, quien para efectos de la presente acta se denominará **EL MUNICIPIO** y Clara Cardona Montoya Identificado(a) con CC. 34051583, quien se denominará **EL REPRESENTANTE** del acueducto en condición de: Representante Legal X u otro _____, se firma la presente Acta de Suministro y Control de Hipoclorito de Calcio, que será entregado al acueducto: Peñas Rojas ubicado en la vereda: _____, corregimiento: Altagracia del Municipio de Pereira; con el objeto de apoyar el proceso de desinfección del agua para consumo humano que distribuye el acueducto.

SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DE AGUA CRUDA

PRODUCTO	CANTIDAD SUMINISTRADA	CANTIDAD RECOMENDADA A APLICAR
Hipoclorito de	1 Caneca	
Calcio al 70%.		600gr Cada 4 días

COMPROMISOS DE LAS PARTES: A) El acueducto 1. Debe garantizar la preparación de la mezcla a usar, después de lograr disolución del producto granular hasta alcanzar su estado líquido. 2. El acueducto debe garantizar el proceso operativo para la adecuada y correcta utilización de los insumos suministrados. 3. El acueducto debe garantizar el uso adecuado del producto o insumo suministrado. 4. Se hace necesario que el acueducto tenga el personal idóneo y con los elementos de protección necesarios para realizar la disolución del producto entregado. 5. El acueducto debe garantizar que los equipos utilizados en la desinfección sean los adecuados y que estén en perfecto funcionamiento.

B) El Municipio a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental, debe: 1- Realizar el seguimiento y verificación del cumplimiento de lo pactado en la presente acta. 2. Estar en contacto con la Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social del municipio para verificar el control de la calidad del agua suministrada por el acueducto. 3. Realizar un monitoreo preventivo de la calidad del agua para verificar la eficiencia del procedimiento realizado por el acueducto.

Para constancia se firma en Pereira a los 11 días del mes de 09 del año 2020

Nombre técnico que entrega: Danery Pupiales Firma Beneficiario: _____

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

ACTA DE SUMINISTRO Y CONTROL DE HIPOCLORITO DE CALCIO

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 08 de 2017

Entre los suscritos Alcaldía de Pereira, representada por Sandra Granada Secretario(a) de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental, quien para efectos de la presente acta se denominará **EL MUNICIPIO** y Jairo Carrillo Identificado(a) con CC. 10073442, quien se denominará **EL REPRESENTANTE** del acueducto en condición de: Representante Legal _____ u otro _____, se firma la presente Acta de Suministro y Control de Hipoclorito de Calcio, que será entregado al acueducto: Yarumal ubicado en la vereda: Yarumal, corregimiento: Arabia del Municipio de Pereira; con el objeto de apoyar el proceso de desinfección del agua para consumo humano que distribuye el acueducto.

SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DE AGUA CRUDA

PRODUCTO	CANTIDAD SUMINISTRADA	CANTIDAD RECOMENDADA A APLICAR
Hipoclorito de Calcio al 70%	2 Canecas	600 gramos Cada dia

COMPROMISOS DE LAS PARTES: A) El acueducto 1. Debe garantizar la preparación de la mezcla a usar, después de lograr disolución del producto granular hasta alcanzar su estado líquido. 2. El acueducto debe garantizar el proceso operativo para la adecuada y correcta utilización de los insumos suministrados. 3. El acueducto debe garantizar el uso adecuado del producto o insumo suministrado. 4. Se hace necesario que el acueducto tenga el personal idóneo y con los elementos de protección necesarios para realizar la disolución del producto entregado. 5. El acueducto debe garantizar que los equipos utilizados en la desinfección sean los adecuados y que estén en perfecto funcionamiento.

B) El Municipio a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental, debe: 1- Realizar el seguimiento y verificación del cumplimiento de lo pactado en la presente acta. 2. Estar en contacto con la Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social del municipio para verificar el control de la calidad del agua suministrada por el acueducto. 3. Realizar un monitoreo preventivo de la calidad del agua para verificar la eficiencia del procedimiento realizado por el acueducto.

Para constancia se firma en Pereira a los 11 días del mes de 09 del año 2020

Nombre técnico que entrega: Daner Tupiales T. Firma Beneficiario: _____

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

ACTA DE SUMINISTRO Y CONTROL DE HIPOCLORITO DE CALCIO

Versión: 01 Fecha de Vigencia: Mayo 08 de 2017

Entre los suscritos Alcaldía de Pereira, representada por Sandra Granada Secretario(a) de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental, quien para efectos de la presente acta se denominará **EL MUNICIPIO** y Cristo Antonio Cortes identificado(a) con CC. 4587133 quien se denominará **EL REPRESENTANTE** del acueducto en condición de: Representante Legal X u otro _____ se firma la presente Acta de Suministro y Control de Hipoclorito de Calcio, que será entregado al acueducto Cantamonos ubicado en la vereda: Cantamonos corregimiento Tribunas del Municipio de Pereira; con el objeto de apoyar el proceso de desinfección del agua para consumo humano que distribuye el acueducto.

SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DE AGUA CRUDA

PRODUCTO	CANTIDAD SUMINISTRADA	CANTIDAD RECOMENDADA A APLICAR
Hipoclorito de Calcio al 70%	2 Costales	4 Libras Disueltas

COMPROMISOS DE LAS PARTES: A) El acueducto 1. Debe garantizar la preparación de la mezcla a usar, después de lograr disolución del producto granular hasta alcanzar su estado líquido. 2. El acueducto debe garantizar el proceso operativo para la adecuada y correcta utilización de los insumos suministrados. 3. El acueducto debe garantizar el uso adecuado del producto o insumo suministrado. 4. Se hace necesario que el acueducto tenga el personal idóneo y con los elementos de protección necesarios para realizar la disolución del producto entregado. 5. El acueducto debe garantizar que los equipos utilizados en la desinfección sean los adecuados y que estén en perfecto funcionamiento.

B) El Municipio a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental, debe: 1- Realizar el seguimiento y verificación del cumplimiento de lo pactado en la presente acta. 2. Estar en contacto con la Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social del municipio para verificar el control de la calidad del agua suministrada por el acueducto. 3. Realizar un monitoreo preventivo de la calidad del agua para verificar la eficiencia del procedimiento realizado por el acueducto.

Para constancia se firma en Pereira a los 11 días del mes de 09 del año 2020

Nombre técnico que entrega Rocy Rojales Firma Beneficiario: _____

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad

ACTA DE SUMINISTRO Y CONTROL DE HIPOCLORITO DE CALCIO

Versión: 01 Fecha de Vigencia: Mayo 08 de 2017

Entre los suscritos Alcaldía de Pereira, representada por Sandra Granada Secretario(a) de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental, quien para efectos de la presente acta se denominará **EL MUNICIPIO** y Janeth Muñoz identificado(a) con CC. 42[illegible]83 quien se denominará **EL REPRESENTANTE** del acueducto en condición de: Representante Legal X u otro _____, se firma la presente Acta de Suministro y Control de Hipoclorito de Calcio, que será entregado al acueducto Corral Rico ubicado en la vereda: Corral, corregimiento Tribunas del Municipio de Pereira; con el objeto de apoyar el proceso de desinfección del agua para consumo humano que distribuye el acueducto.

SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DE AGUA CRUDA

PRODUCTO	CANTIDAD SUMINISTRADA	CANTIDAD RECOMENDADA A APLICAR
Hipoclorito de Calcio al 70%	2 Canecas	3 1/2 Cucharadas cada 3 días

COMPROMISOS DE LAS PARTES: A) El acueducto 1. Debe garantizar la preparación de la mezcla a usar, después de lograr disolución del producto granular hasta alcanzar su estado líquido. 2. El acueducto debe garantizar el proceso operativo para la adecuada y correcta utilización de los insumos suministrados. 3. El acueducto debe garantizar el uso adecuado del producto o insumo suministrado. 4. Se hace necesario que el acueducto tenga el personal idóneo y con los elementos de protección necesarios para realizar la disolución del producto entregado. 5. El acueducto debe garantizar que los equipos utilizados en la desinfección sean los adecuados y que estèn en perfecto funcionamiento.

B) El Municipio a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental, debe: 1- Realizar el seguimiento y verificación del cumplimiento de lo pactado en la presente acta. 2. Estar en contacto con la Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social del municipio para verificar el control de la calidad del agua suministrada por el acueducto. 3. Realizar un monitoreo preventivo de la calidad del agua para verificar la eficiencia del procedimiento realizado por el acueducto.

Para constancia se firma en Pereira a los 11 días del mes de 09 del año 2020

Nombre técnico que entrega Byron Rubiano Z. Firma Beneficiario: Janeth Muñoz

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

ACTA DE SUMINISTRO Y CONTROL DE HIPOCLORITO DE CALCIO

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 08 de 2017

Entre los suscritos Alcaldía de Pereira, representada por Sandra Granada Secretario(a) de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental, quien para efectos de la presente acta se denominará **EL MUNICIPIO** y Diego Hurtado Identificado(a) con CC. 10074137, quien se denominará **EL REPRESENTANTE** del acueducto en condición de: Representante Legal X u otro _____, se firma la presente Acta de Suministro y Control de Hipoclorito de Calcio, que será entregado al acueducto: Santa Cruz de Balsas ubicado en la vereda: _____, corregimiento: Tribunas del Municipio de Pereira; con el objeto de apoyar el proceso de desinfección del agua para consumo humano que distribuye el acueducto.

SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DE AGUA CRUDA

PRODUCTO	CANTIDAD SUMINISTRADA	CANTIDAD RECOMENDADA A APLICAR
Hipoclorito de	1 Caneca	
Calcio al		420 gramos Todos los días
70%.		

COMPROMISOS DE LAS PARTES: A) El acueducto 1. Debe garantizar la preparación de la mezcla a usar, después de lograr disolución del producto granular hasta alcanzar su estado líquido. 2. El acueducto debe garantizar el proceso operativo para la adecuada y correcta utilización de los insumos suministrados. 3. El acueducto debe garantizar el uso adecuado del producto o insumo suministrado. 4. Se hace necesario que el acueducto tenga el personal idóneo y con los elementos de protección necesarios para realizar la disolución del producto entregado. 5. El acueducto debe garantizar que los equipos utilizados en la desinfección sean los adecuados y que estén en perfecto funcionamiento.

B) El Municipio a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental, debe: 1- Realizar el seguimiento y verificación del cumplimiento de lo pactado en la presente acta. 2. Estar en contacto con la Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social del municipio para verificar el control de la calidad del agua suministrada por el acueducto. 3. Realizar un monitoreo preventivo de la calidad del agua para verificar la eficiencia del procedimiento realizado por el acueducto.

Para constancia se firma en Pereira a los 11 días del mes de 09 del año 2020

Nombre técnico que entrega: Ramey Ripiales T. Firma Beneficiario: _____

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

ACTA DE SUMINISTRO Y CONTROL DE HIPOCLORITO DE CALCIO

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 08 de 2017

Entre los suscritos Alcaldía de Pereira, representada por Sandra Granada Secretario(a) de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental, quien para efectos de la presente acta se denominará **EL MUNICIPIO** y Carlos Piedrahita Identificado(a) con CC. 10031950, quien se denominará **EL REPRESENTANTE** del acueducto en condición de: Representante Legal _____ u otro _____, se firma la presente Acta de Suministro y Control de Hipoclorito de Calcio, que será entregado al acueducto: Perez Alto ubicado en la vereda: Perez Alto, corregimiento: Arabia del Municipio de Pereira; con el objeto de apoyar el proceso de desinfección del agua para consumo humano que distribuye el acueducto.

SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DE AGUA CRUDA

PRODUCTO	CANTIDAD SUMINISTRADA	CANTIDAD RECOMENDADA A APLICAR
Hipoclorito de Calcio al 70%	2 Canecas	1250 gramos día de promedio

COMPROMISOS DE LAS PARTES: A) El acueducto 1. Debe garantizar la preparación de la mezcla a usar, después de lograr disolución del producto granular hasta alcanzar su estado líquido. 2. El acueducto debe garantizar el proceso operativo para la adecuada y correcta utilización de los insumos suministrados. 3. El acueducto debe garantizar el uso adecuado del producto o insumo suministrado. 4. Se hace necesario que el acueducto tenga el personal idóneo y con los elementos de protección necesarios para realizar la disolución del producto entregado. 5. El acueducto debe garantizar que los equipos utilizados en la desinfección sean los adecuados y que estén en perfecto funcionamiento.

B) El Municipio a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental, debe: 1- Realizar el seguimiento y verificación del cumplimiento de lo pactado en la presente acta. 2. Estar en contacto con la Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social del municipio para verificar el control de la calidad del agua suministrada por el acueducto. 3. Realizar un monitoreo preventivo de la calidad del agua para verificar la eficiencia del procedimiento realizado por el acueducto.

Para constancia se firma en Pereira a los 11 días del mes de 09 del año 2020

Nombre técnico que entrega: Yamery Rupiales T. Firma Beneficiario: _____

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

ACTA DE SUMINISTRO Y CONTROL DE HIPOCLORITO DE CALCIO

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 08 de 2017

Entre los suscritos Alcaldía de Pereira, representada por Sandra Granada Secretario(a) de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental, quien para efectos de la presente acta se denominará **EL MUNICIPIO** y Jose Ramiro Cruz Vanegas Identificado(a) con CC. 10129991, quien se denominará **EL REPRESENTANTE** del acueducto en condición de: Representante Legal X u otro _____, se firma la presente Acta de Suministro y Control de Hipoclorito de Calcio, que será entregado al acueducto: Perez Bajo ubicado en la vereda: Perez Bajo, corregimiento: Arabia del Municipio de Pereira; con el objeto de apoyar el proceso de desinfección del agua para consumo humano que distribuye el acueducto.

SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DE AGUA CRUDA

PRODUCTO	CANTIDAD SUMINISTRADA	CANTIDAD RECOMENDADA A APLICAR
Hipoclorito	1 Caneca	2 1/2 Kilos Cada 5 dias

COMPROMISOS DE LAS PARTES: A) El acueducto 1. Debe garantizar la preparación de la mezcla a usar, después de lograr disolución del producto granular hasta alcanzar su estado líquido. 2. El acueducto debe garantizar el proceso operativo para la adecuada y correcta utilización de los insumos suministrados. 3. El acueducto debe garantizar el uso adecuado del producto o insumo suministrado. 4. Se hace necesario que el acueducto tenga el personal idóneo y con los elementos de protección necesarios para realizar la disolución del producto entregado. 5. El acueducto debe garantizar que los equipos utilizados en la desinfección sean los adecuados y que estén en perfecto funcionamiento.

B) El Municipio a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental, debe: 1- Realizar el seguimiento y verificación del cumplimiento de lo pactado en la presente acta. 2. Estar en contacto con la Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social del municipio para verificar el control de la calidad del agua suministrada por el acueducto. 3. Realizar un monitoreo preventivo de la calidad del agua para verificar la eficiencia del procedimiento realizado por el acueducto.

Para constancia se firma en Pereira a los 11 días del mes de 09 del año 2020

Nombre técnico que entrega: Ronery Rupidestapia Firma Beneficiario: Jose Ramiro Cruz V.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LOS ACUEDUCTO

PERIODO: 9 DE JUNIO HASTA EL 28 DE JULIO.

Contrato: 719

- *Se realizó visita técnica a la representante legal de La Asociación de Usuarios del Acueducto El Chocho Canceles, Tema: Obligaciones de la Concesión y Ocupación de cauce emitidas en la Resolución 1197 del 2019 y socialización al concepto técnico N° 429 emitido por CARDER para dar respuesta a comunicado por Procuraduría Ambiental.(Informe técnico)*

- *. Se realizó el proceso de radicación ante CARDER Tema: Diseños y Planos del Instrumento de medición y regulación del caudal. Para el Acueducto del Chocho Canceles. Radicado ante CARDER N°R5602- 2020.*

- *Se realizó proceso de radicado ante CARDER carpeta de actividades del PUEAA del acueducto Alto Erazo I y III. Radicado N°4848-2020.*

- *Se realizó apoyo en asesoría en las actividades del PUEAA al acueducto Cantamonos en conjunto con la practicante del SENA María Puerta y el técnico Alexander Santa para la elaboración de talleres virtuales con los alumnos del colegio José Antonio Galán*

- *Se realizó asesoría en la Guía del Diagnóstico del suministro de agua para consumo humano y doméstico en la zona rural del municipio de Pereira al acueducto Carbonera Paso Nivel.*

- *Se realizó asesoría en la Guía del Diagnóstico del suministro de agua para consumo humano y doméstico en la zona rural del municipio de Pereira al acueducto Cantamonos*

- *Se realizó apoyo en asesoría en Tramite Ambiental Prorroga en Concesión de aguas y Ocupación de cauce en el acueducto Pérez Bajo, ubicado en el corregimiento de Arabia vereda Pérez Bajo.*

- *Se realizó apoyo en asesoría en Tramite Ambiental Concesión de aguas y Ocupación de cauce en el acueducto Carbonera La trinidad ubicado en el corregimiento de Caimalito vereda La carbonera.*

- *Se realizó monitoreo vía telefónica los Lunes y Jueves del estado de funcionamiento de los acueductos rurales: (Caimalito I, Caimalito II, Carbonera Paso Nivel, Carbonera La Trinidad, K5, Alto Erazo I y III, y Alto Erazo II) del municipio de Pereira, con el propósito de verificar en coordinación con los representantes de dichos acueductos, la calidad del agua suministrada para consumo humano y la continuidad del servicio debido a la emergencia sanitaria generada por el (COVID – 19).*

- *Se realizó apoyo en asesoría en la implementación de las actividades del PUEAA año 2019 al acueducto Pérez Bajo*

- *Se realizó apoyo en asesoría en las actividades del PUEAA al acueducto Pital de Combia en conjunto con el técnico Alexander Santa para la elaboración de talleres virtuales con los alumnos del Colegio del Pital de Combia Alta.*

- *Se realizó Socialización documento diagnóstico del Acueducto Alto Erazo 1 y 3 con el Profesional Eduardo Arias para revisión y la incorporación de la metodología de cambio climático.*

ALCALDIA DE PEREIRA
Radicación No: 18992-2020
Fecha: 15/09/2020-10:51:31
Recibido por: LINA MARCELA BLANDON VARGAS
Destino: 0900 Secretaría de Salud Pública y Seguridad Soda
Anexos:

PEREIRA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.

Doctora:
Ana Yolima Sánchez Gutiérrez
Secretaria de Salud Pública y Seguridad Social
Calle 19 No 10-06

ASUNTO: RESULTADOS DE ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA PARA DAR CONTINUIDAD AL ANEXO TECNICO II

Cordial saludo

Yo María Deisy Román con Cedula: 4098818 en función de representante legal de la Asociación de Usuarios del acueducto Carbonera la Trinidad, dando cumplimiento a los requisitos solicitados por la Secretaria de Salud Pública y Seguridad Social en el documento Anexo técnico I; anexo los análisis de calidad de agua, para dar cumplimiento y continuidad al anexo técnico II (Mapa de Riesgo).

Atentamente

María Deisy Román
Representante Legal
Asociación de Usuarios del Acueducto Carbonera La Trinidad
CC: 4098818
Celular:3148820130

Escaneado con CamScanner

ALCALDIA DE PEREIRA

CERTIFICADO DE INGRESO DE INFORMACIÓN AL SISAA

Versión: 02 Fecha de Vigencia: Sept. 24 de 2018

SISTEMA DE INFORMACIÓN
REGISTRO DE VISITAS

El (la) señor (a): **DANERY PUPIALES ZAPATA**, con documento de identidad No. **66682003** ha realizado las siguientes actividades de actualización del sistema de información de la Secretaría de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental para el año 2020.

PERIODO	BPA	AES	ASISTENCIA TÉCNICA GENERAL	TOTAL INGRESADOS
07/09/2020 - 06/10/2020	0	0	2	2

OTRAS ACTIVIDADES

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Listado de asistencia a capacitaciones:	0	Personas registradas:	
Entregas de insumos registrados:	0	Usuarios no regulares:	1
Monitoreos Trips aprobados:	0	Listas BPA aprobadas:	0
Monitoreos Trips ingresados:	0	Listas BPA ingresadas:	0
Monitoreos Sigatoka registrados:	0	Plan inocuidad ingresadas:	0
Actualización y fotointerpretación:	0	Plan inocuidad aprobadas:	0
Usuarios ganadería ceba:	0	Reg. Productividad:	0
Usuarios ganadería leche:	0	Solicitudes atendidas / pendientes:	0 / 0
Reg. Ventas asociaciones:	0	S.T.A.R:	0
		Monitoreos broca:	0



05/10/2020
Verificado sistema de información

Sistema Integrado de Gestión

ALCALDIA DE PEREIRA

DIARIO DE LABORES Nº 119135

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Versión: 01 — Fecha de Vigencia: Mayo 08 de 2017

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR

Nombres: Milciades
Apellidos: Monsalve - Hinestrosa
Cedula: 10112157 Edad: 56
Tel Fijo: ____ Celular: 3136347774

ULTIMO GRADO APROBADO

Primaria		Secundaria	
Tecnico		Universitario	
Ninguno		No Informa	

GRUPO POBLACIONAL

Desp		MCH		Discap	
Indig		Migr		Otro	
Afrod		VictVio			

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Fecha Visita: DIA | MES | 2020
Corregimiento: La Florida
Vereda: Mantano Alto
Nombre de finca: Acueducto Mantano
Ficha Catastral: ____
Cod. SISAA: ____ Cod. SICA: ____

N	4 °	49 '	42.86 "
W	75 °	36 '	21.65 "

ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL

Asesoría		Sostenimiento		AES	
Comercialización		Establecimiento		Estatus Sanitario	
Cosecha		Costos de producción		BPA	
Planificación		Sistematizacion		Plan Manejo Admin.	
				Otras. ¿Cuáles?	

APOYO Y ASESORÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL

Diseño		Reforestación		Verificación	
Manejo de residuos solidos		Revisión		Manejo de Aguas	
Manejo de suelos		Saneamiento Básico		Otras. ¿Cuáles?	
Mantenimiento		Seguimiento			

ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA

		CULTIVO 1	CULTIVO 2	CULTIVO 3	CULTIVO 4	CULTIVO 5
NOMBRE DE CULTIVO						
VARIEDAD						
AREA (has)						
# PLANTAS						
PRODUCCION AÑO ANTERIOR (kg/ha)						
RENDIMIENTO (Ton/ha)						
LABORES AGRONOMICAS	INSTALACIÓN CULTIVO					
	MANEJO FITOSANITARIO					
	MANEJO NUTRICIONAL					
	MANEJO CULTURAL					
	MANEJO COSECHA Y POSTCOSECHA					
	MANEJO DE ARVENSES					
	LABORES DE SEGUIMIENTO					
	OTRAS LABORES ¿CUALES?					

ACTIVIDAD PECUARIA

		PECUARIO 1	PECUARIO 2	PECUARIO 3	PECUARIO 4
NOMBRE DE PECUARIO					
AREA (mts2)					
# ANIMALES					
PRACTICAS AGROPECUARIAS	ALIMENTACIÓN				
	BIENESTAR ANIMAL				
	BIOSEGURIDAD				
	IMPL. DE BUENAS PRACTICAS				
	MANEJO				
	MEDIO AMBIENTE				
	PASTOS Y FORRAJES				
	PLAN DE VACUNACIÓN				
	PLAN SANITARIO				
	REPRODUCCIÓN				
	ASESORIA TECNICA				
	OTRAS LABORES ¿CUÁLES?				

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

→ Se realizo visita tecnica al acueducto (ASUSAMAITO) Asociacion de Usuarios del Sistema de Agua sector El Mantano Alto con el objetivo de realizar seguimiento y apoyo a la calidad de agua.
Se Recomienda.

→ Realizar el seguimiento a la calidad del agua para garantizar una agua apto para Consumo Humano

→ El fontanero debe Utilizar los implementos de seguridad y la junta administrativo debe suministrarselos (careta con filtro, Gafas reglamentarios, guantes largos y delantal.

→ El fontanero debe portar un uniforme que lo identifique como miembro de la Junta administrativa.

→ Se deja por parte de la (SDRGA) una carpeta con los respectivos formatos y se socializo cada uno.

PRÓXIMA VISITA: DIA / MES / AÑO /

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO — 3135374[illegible]

Desp=Desplazado
Indig=Indígena
Afrod=Afrodescendiente
Migr=Migrante
VictVio=Victima violencia
Discap=Discapacitado

ALCALDIA DE PEREIRA

DIARIO DE LABORES Nº 119132

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 08 de 2017

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR

Nombres: Cristian Fernando
Apellidos: Ramos
Cedula: 9862447 Edad:
Tel Fijo: Celular: 3103905295

ULTIMO GRADO APROBADO

Primaria ☐ Secundaria ☐
Tecnico ☐ Universitario ☐
Ninguno ☐ No Informa ☐

GRUPO POBLACIONAL

Desp ☐ MCH ☐ Discap ☐
Indig ☐ Migr ☐ Otro ☐
Afrod ☐ VictVio ☐

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Fecha Visita: 17 / 09 / 2020
Corregimiento: La Florida
Vereda: La Florida
Nombre de finca: Asociacion de Acueducto La Florida
Ficha Catastral:
Cod. SISAA: 90040 Cod. SICA:
N: 4° 45' 27.83"
W: 75° 36' 40.51"

ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL

Asesoría	☐	Sostenimiento	☐	AES	☐
Comercialización	☐	Establecimiento	☐	Estatus Sanitario	☐
Cosecha	☐	Costos de producción	☐	BPA	☐
Planificación	☐	Sistematizacion	☐	Plan Manejo Admin.	☐
				Otras. ¿Cuáles?	

APOYO Y ASESORÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL

Diseño	☐	Reforestación	☐	Verificación	☐
Manejo de residuos solidos	☐	Revisión	☐	Manejo de Aguas	☐
Manejo de suelos	☐	Saneamiento Básico	☐	Otras. ¿Cuáles?	☐
Mantenimiento	☐	Seguimiento	☐		

ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA

	CULTIVO 1	CULTIVO 2	CULTIVO 3	CULTIVO 4	CULTIVO 5
NOMBRE DE CULTIVO					
VARIEDAD					
AREA (Has)					
# PLANTAS					
PRODUCCION AÑO ANTERIOR (kg/ha)					
RENDIMIENTO (Ton/ha)					
LABORES AGRONOMICAS: INSTALACION CULTIVO					
MANEJO FITOSANITARIO					
MANEJO NUTRICIONAL					
MANEJO CULTURAL					
MANEJO COSECHA Y POSTCOSECHA					
MANEJO DE ARVENSES					
LABORES DE SEGUIMIENTO					
OTRAS LABORES ¿CUALES?					

ACTIVIDAD PECUARIA

	PECUARIO 1	PECUARIO 2	PECUARIO 3	PECUARIO 4
NOMBRE DE PECUARIO				
AREA (mts2)				
# ANIMALES				
PECUARIOS: ALIMENTACION				
BIENESTAR ANIMAL				
BIOSEGURIDAD				
IMPL. DE BUENAS PRACTICAS				
MANEJO				
MEDIO AMBIENTE				
PASTOS Y FORRAJES				
PLAN DE VACUNACION				
PLAN SANITARIO				
REPRODUCCION				
ASESORIA TECNICA				
OTRAS LABORES ¿CUALES?				

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

Se realizó visita técnica al acueducto La Florida con el objetivo de realizar seguimiento en el proceso de desinfección; Se realizo el analisis con el equipo PRQ00 y Se tomaron los rangos bajo la resolución 2115/2007. se tomo la muestra en la red intermedia donde el rangyo del cloro fue de 0.79 donde nos da un resultado satisfactorio.

Se Recomienda:

-> Utilizar los Implementos de Seguridad (careta con filtro, Gafas reglamentarias, delantal y Guantes.

-> los fontaneros deben portar Uniformes que lo identifiquen como miembros del acueducto puede ser: (una Camiseta con el apoyo del acueducto o un chaleco que los identifiquen.

-> Que los operarios (fontaneros) manejen ambos tanto la planta de potabilizacion como la PTAR para en caso que se presente algun inconveniente.

PRÓXIMA VISITA: DIA 1 MES 1 AÑO 6

Yoir Alvin López Arroyo
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

Raney Pupiales Zapata
NOMBRE Y FIRMA DEL TECNICO
3137574162

Desp=Desplazado
Indig=Indigena
Afrod=Afrodescendiente
MCH=Mujer cabeza de hogar
Migr=Migrante
VictVio=Victima violencia
Discap=Discapacitado

Sistema Integrado de Gestión

ALCALDIA DE PEREIRA

DIARIO DE LABORES Nº 119134

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 08 de 2017

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR

Nombres: Gildardo leon
Apellidos: Velasquez
Cedula: 10109327 Edad:
Tel Fijo: Celular: 3003109501

ULTIMO GRADO APROBADO

Primaria		Secundaria	
Tecnico		Universitario	
Ninguno		No Informa	

GRUPO POBLACIONAL

Desp		MCH		Discap	
Indig		Migr		Otro	
Afrod		VictVio			

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Fecha Visita: 01 / 10 / 2020
Corregimiento: La Florida
Vereda: San Jose
Nombre de finca: Acueducto San José
Ficha Catastral:
Cod. SISAA: 90046 Cod. SICA:
N: 4 ° 47 ' 19.85 "
W: 75 ° 38 ' 43.53 "

ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL

Asesoria		Sostenimiento		AES	
Comercialización		Establecimiento		Estatus Sanitario	
Cosecha		Costos de producción		BPA	
Planificación		Sistematizacion		Plan Manejo Admin.	
				Otras. ¿Cuáles?	

APOYO Y ASESORÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL

Diseño		Reforestación		Verificación	
Manejo de residuos solidos		Revisión		Manejo de Aguas	
Manejo de suelos		Saneamiento Básico		Otras. ¿Cuáles?	
Mantenimiento		Seguimiento			

ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA

	CULTIVO 1	CULTIVO 2	CULTIVO 3	CULTIVO 4	CULTIVO 5
NOMBRE DE CULTIVO					
VARIEDAD					
AREA (Has)					
# PLANTAS					
PRODUCCION AÑO ANTERIOR (kg/ha)					
RENDIMIENTO (Ton/ha)					
LABORES BIOCRESAS: INSTALACION CULTIVO					
LABORES BIOCRESAS: MANEJO FITOSANITARIO					
LABORES BIOCRESAS: MANEJO NUTRICIONAL					
LABORES BIOCRESAS: MANEJO CULTURAL					
LABORES BIOCRESAS: MANEJO COSECHA Y POSTCOSECHA					
LABORES BIOCRESAS: MANEJO DE ARVENSES					
LABORES BIOCRESAS: LABORES DE SEGUIMIENTO					
LABORES BIOCRESAS: OTRAS LABORES ¿CUALES?					

ACTIVIDAD PECUARIA

	PECUARIO 1	PECUARIO 2	PECUARIO 3	PECUARIO 4
NOMBRE DE PECUARIO				
AREA (mts2)				
# ANIMALES				
PBAS: ALIMENTACIÓN				
PBAS: BIENESTAR ANIMAL				
PBAS: BIOSEGURIDAD				
PBAS: IMPL. DE BUENAS PRACTICAS				
PBAS: MANEJO				
PBAS: MEDIO AMBIENTE				
PBAS: PASTOS Y FORRAJES				
PBAS: PLAN DE VACUNACIÓN				
PBAS: PLAN SANITARIO				
PBAS: REPRODUCCIÓN				
PBAS: ASESORIA TECNICA				
PBAS: OTRAS LABORES ¿CUÁLES?				

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

→ Se realizo visita técnica Ambiental de (BPS) Buenas Practicas Sanitarias, al acueducto San Jose y analisis de calidad de agua con el equipo PR900 donde los resultados fueron satisfactorios.

Se Recomienda:

→ Realizar Seguimiento de la calidad de agua para garantizar el proceso de desinfección a la comunidad.

→ El funtanero debe utilizar los implementos de Seguridad las gafas reglumentarios, la careta con filtro, guantes largos y un delantal; y portar un uniforme que lo identifique como miembro del del acueducto (Chaleco, con logo o una camiseta.)

→ Por parte de la SDRGA: Se Suministro una carpeta con sus respectivos formatos.

PRÓXIMA VISITA: DIA 1 MES 1 AÑO

Gildardo León Velasquez Ospina
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA
cc) 10.109327.

Danery Lupiales Zapata
NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO

Desp=Desplazado
Indig=Indígena
Afrod=Afrodescendiente
Migr=Migrante
VictVio=Victima violencia
Discap=Discapacitado

ALCALDIA DE PEREIRA

CONTROL DE CALIDAD AGUA

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 08 de 2017

DATOS DEL PRESTADOR DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO			
Razón social	Acueducto Manzano Alto	Nit.	901129477
Representante Legal	Milsiades Monsalve	C.C.	10112157
Dirección	Finca el Porvenir	Tel./Cel.	3136347979
Municipio/Departamento	Pereira / Risaralda	Email	
Lugar toma de muestra	Finca El Porvenir	Fecha	01-10-2020

CARACTERÍSTICA DE LA MUESTRA			
DESCRIPCIÓN PUNTO DE TOMA	**TIPO DE MUESTRA**	**FECHA TOMA DE MUESTRA**	**HORA TOMA DE MUESTRA**
Intradomiciliaria	sinDesinfección	01-10-2020	2:15 pm

RESULTADOS			
PARÁMETRO	**VALORES ACEPTABLES** Resolución 2115/2007	**UNIDADES**	**RESULTADO**
pH	>=6,5 - <=9,0	Unidades	7.47
Cloro residual	>=0,3 – <=2,0	mg/L Cl_2	N.A
Turbiedad	<= 2	UNT	3
Hierro total	<= 0,3	mg/L Fe	0.13
Sulfatos	<= 250	mg/l SO_4^{2-}	0
Nitritos	<= 0,1	mg/L NO_2^-	N.A
Nitratos	<= 10	mg/L NO_3^-	0.7
Conductividad	<= 1.000	µsiemens/Cm	479
Sólidos en suspensión		mg/L TSS	7

OBSERVACIONES

- La Secretaría de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental NO EMITE OPINIONES NI DECLARACIONES con el cumplimiento o no cumplimiento de los requisitos y/o especificaciones.
- Los resultados contenidos en el presente reporte se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos.
- La Secretaría de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de la información aquí contenida y de las muestras analizadas.
- Los ensayos fueron realizados en las instalaciones del prestador del servicio de acueducto, bajo sus condiciones ambientales.
- Este resultado hace referencia única y exclusivamente a las muestras analizadas.
- El equipo con el cual se realiza los análisis fisicoquímicos del agua es el DR 900.

NOMBRE Milsiades Monsalve.
FIRMA Milsiades Monsalve.
QUIEN ATIENDE LA VISITA

NOMBRE Yaneny Pupiales Zapata
FIRMA Yaneny Pupiales Zapata.
TÉCNICO QUE REALIZÓ EL ANÁLISIS

ALCALDIA DE PEREIRA

CONTROL DE CALIDAD AGUA

Versión: 01 Fecha de Vigencia: Mayo 08 de 2017

DATOS DEL PRESTADOR DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO			
Razón social	Acueducto La Florida	Nit.	
Representante Legal	Cristian Fernando Ramos	C.C.	9962447
Dirección	La Florida	Tel./Cel.	3103905095
Municipio/Departamento	Pereira Risaralda	Email	
Lugar toma de muestra	Red intermedia Punto de M.	Fecha :	17/09/2020

CARACTERÍSTICA DE LA MUESTRA			
DESCRIPCIÓN PUNTO DE TOMA	**TIPO DE MUESTRA**	**FECHA TOMA DE MUESTRA**	**HORA TOMA DE MUESTRA**
Punto de Muestreo R. Intermedia	Desinfección	17/09/2020	9:30 am

RESULTADOS			
PARÁMETRO	**VALORES ACEPTABLES** Resolución 2115/2007	**UNIDADES**	**RESULTADO**
pH	>=6,5 - <=9,0	Unidades	7.54
Cloro residual	>=0,3 – <=2,0	mg/L Cl_2	0.79
Turbiedad	<= 2	UNT	17
Hierro total	<= 0,3	mg/L Fe	1.59
Sulfatos	<= 250	mg/l SO_4^{2-}	4
Nitritos	<= 0,1	mg/L NO_2^-	N.A
Nitratos	<= 10	mg/L NO_3^-	3.1
Conductividad	<= 1.000	µsiemens/Cm	1577
Sólidos en suspensión		mg/L TSS	N.A

OBSERVACIONES

- La Secretaría de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental NO EMITE OPINIONES NI DECLARACIONES con el cumplimiento o no cumplimiento de los requisitos y/o especificaciones.
- Los resultados contenidos en el presente reporte se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos.
- La Secretaría de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de la información aquí contenida y de las muestras analizadas.
- Los ensayos fueron realizados en las instalaciones del prestador del servicio de acueducto, bajo sus condiciones ambientales.
- Este resultado hace referencia única y exclusivamente a las muestras analizadas.
- El equipo con el cual se realiza los análisis fisicoquímicos del agua es el DR 900.

NOMBRE Juan Martin Lopez Cardona

FIRMA Juan Martin Lopez Cardona

QUIEN ATIENDE LA VISITA

NOMBRE Yaneri Pupiales Zapata

FIRMA Yaneri Pupiales Zapata

TÉCNICO QUE REALIZÓ EL ANÁLISIS

ALCALDIA DE PEREIRA

CONTROL DE CALIDAD AGUA

Versión: 01 Fecha de Vigencia: Mayo 08 de 2017

DATOS DEL PRESTADOR DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO			
Razón social	Acueducto San José	Nit:	
Representante Legal	Gildardo León Velasquez	C.C.	10109327
Dirección:	Casa los Teones	Tel./Cel.	3003109501
Municipio/Departamento	Pereira / Risaralda	Email:	
Lugar toma de muestra	Intradomiciliaria Casa los Teones	Fecha:	01-10-2020

CARACTERÍSTICA DE LA MUESTRA			
DESCRIPCIÓN PUNTO DE TOMA	TIPO DE MUESTRA	FECHA TOMA DE MUESTRA	HORA TOMA DE MUESTRA
Punto final Intradomiciliaria	Desinfección	01-10-2020	9:30 am

RESULTADOS			
PARÁMETRO	VALORES ACEPTABLES Resolución 2115/2007	UNIDADES	RESULTADO
pH	>=6,5 - <=9,0	Unidades	7.34
Cloro residual	>=0,3 - <=2,0	mg/L Cl_2	0.21
Turbiedad	<= 2	UNT	0
Hierro total	<= 0,3	mg/L Fe	0.40
Sulfatos	<= 250	mg/l SO_4^{2-}	6
Nitritos	<= 0,1	mg/L NO_2^-	N.A
Nitratos	<= 10	mg/L NO_3^-	0.7
Conductividad	<= 1.000	µsiemens/Cm	245
Sólidos en suspensión		mg/L TSS	16

OBSERVACIONES

- La Secretaría de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental NO EMITE OPINIONES NI DECLARACIONES con el cumplimiento o no cumplimiento de los requisitos y/o especificaciones.
- Los resultados contenidos en el presente reporte se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos.
- La Secretaría de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de la información aquí contenida y de las muestras analizadas.
- Los ensayos fueron realizados en las instalaciones del prestador del servicio de acueducto, bajo sus condiciones ambientales.
- Este resultado hace referencia única y exclusivamente a las muestras analizadas.
- El equipo con el cual se realiza los análisis fisicoquímicos del agua es el DR 900.

NOMBRE Gildardo Leon Velasquez NOMBRE Ranery Pupiales Zapata

FIRMA Gildardo Leon Velasquez FIRMA Ranery Pupiales Zapata.

QUIEN ATIENDE LA VISITA 10.109327 TÉCNICO QUE REALIZÓ EL ANÁLISIS

LINEA TELEFONICA Nº: *3137574162*	**FUNCIONARIO RESPONSABLE: *Danery Pupiales Zapata***

HORA	FECHA	NUMERO	PERSONA A LA QUE LLAMA	ENTIDAD	RESPONSABLE DE LA LLAMADA
9:15am	*10/09/2020*	*3196184857*	*Miguel Ángel Ríos*	*Particular*	*Danery Pupiales Zapata*
8am-6pm	*17/09/2020*	*3214401639 3146130837 3205385041 3138509728 3104109523 3193138401 3146855816 3166807330*	*Diomedes López Walter Flórez Antonio Quirama. Luz Stella Quinceno Ángel María López Silvio Ramírez Ríos Robinson Carmona Edilberto Pulgarín Giraldo*	*Acueductos: Pérez Bajo, Amoladora Alta, Viva Cerritos, Alto Erazo 1, 2 y 3 , Pital de Combia, La Convención, Amoladora Baja, San Vicente de Betania, Llano Grande, Guadualito.*	*Danery Pupiales Zapata*
10:30am	*21/09/2020*		*María Deisy Román*	*Acueducto Carbonera la Trinidad.*	*Danery Pupiales Zapata*
8am-6pm	*21/09/2020*	*3214401639 3146130837 3205385041 3138509728 3104109523 3193138401 3146855816 3166807330*	*Diomedes López Walter Flórez Antonio Quirama. Luz Stella Quinceno Ángel María López Silvio Ramírez Ríos Robinson Carmona Edilberto Pulgarín Giraldo*	*Acueductos: Pérez Bajo, Amoladora Alta, Viva Cerritos, Alto Erazo 1, 2 y 3 , Pital de Combia, La Convención, Amoladora Baja, San Vicente de Betania, Llano Grande, Guadualito*	*Danery Pupiales Zapata*

8am-6pm	*22/09/2020*	*3226601832*	*Orbilio Guevara Ladino*	*Acueducto Cantamonos*	*Danery Pupiales Zapata*
8am-6pm	29/09/2020	*3214401639 3146130837 3205385041 3138509728 3104109523 3193138401 3146855816 3166807330*	*Acueductos: Pérez Bajo, Amoladora Alta, Viva Cerritos, Alto Erazo 1, 2 y 3 , Pital de Combia, La Convención, Amoladora Baja, San Vicente de Betania, Llano Grande, Guadualito*	*Acueductos: Pérez Bajo, Amoladora Alta, Viva Cerritos, Alto Erazo 1, 2 y 3 , Pital de Combia, La Convención, Amoladora Baja, San Vicente de Betania, Llano Grande, Guadualito*	*Danery Pupiales Zapata*
2 pm	*29/09/2020*	*3128880542*	*Ramiro CRUZ*	*Acueducto Pérez Bajo*	*Danery Pupiales Zapata*

LINEA TELEFONICA Nº: *3137574162*	**FUNCIONARIO RESPONSABLE: *Danery Pupiales Zapata***

HORA	FECHA	NUMERO	PERSONA A LA QUE LLAMA	ENTIDAD	RESPONSABLE DE LA LLAMADA
9:15am	*10/09/2020*	*3196184857*	*Miguel Ángel Ríos*	*Particular*	*Danery Pupiales Zapata*
8am-6pm	*17/09/2020*	*3214401639 3146130837 3205385041 3138509728 3104109523 3193138401 3146855816 3166807330*	*Diomedes López Walter Flórez Antonio Quirama. Luz Stella Quinceno Ángel María López Silvio Ramírez Ríos Robinson Carmona Edilberto Pulgarín Giraldo*	*Acueductos: Pérez Bajo, Amoladora Alta, Viva Cerritos, Alto Erazo 1, 2 y 3 , Pital de Combia, La Convención, Amoladora Baja, San Vicente de Betania, Llano Grande, Guadualito.*	*Danery Pupiales Zapata*
10:30am	*21/09/2020*		*María Deisy Román*	*Acueducto Carbonera la Trinidad.*	*Danery Pupiales Zapata*
8am-6pm	*21/09/2020*	*3214401639 3146130837 3205385041 3138509728 3104109523 3193138401 3146855816 3166807330*	*Diomedes López Walter Flórez Antonio Quirama. Luz Stella Quinceno Ángel María López Silvio Ramírez Ríos Robinson Carmona Edilberto Pulgarín Giraldo*	*Acueductos: Pérez Bajo, Amoladora Alta, Viva Cerritos, Alto Erazo 1, 2 y 3 , Pital de Combia, La Convención, Amoladora Baja, San Vicente de Betania, Llano Grande, Guadualito*	*Danery Pupiales Zapata*

8am-6pm	*22/09/2020*	*3226601832*	*Orbillo Guevara Ladino*	*Acueducto Cantamonos*	*Danery Pupiales Zapata*
8am-6pm	29/09/2020	*3214401639 3146130837 3205385041 3138509728 3104109523 3193138401 3146855816 3166807330*	*Acueductos: Pérez Bajo, Amoladora Alta, Viva Cerritos, Alto Erazo 1, 2 y 3 , Pital de Combia, La Convención, Amoladora Baja, San Vicente de Betania, Llano Grande, Guadualito*	*Acueductos: Pérez Bajo, Amoladora Alta, Viva Cerritos, Alto Erazo 1, 2 y 3 , Pital de Combia, La Convención, Amoladora Baja, San Vicente de Betania, Llano Grande, Guadualito*	*Danery Pupiales Zapata*
2 pm	*29/09/2020*	*3128880542*	*Ramiro CRUZ*	*Acueducto Pérez Bajo*	*Danery Pupiales Zapata*

LINEA TELEFONICA Nº: *3137574162*	**FUNCIONARIO RESPONSABLE: *Danery Pupiales Zapata***

HORA	FECHA	NUMERO	PERSONA A LA QUE LLAMA	ENTIDAD	RESPONSABLE DE LA LLAMADA
9:15am	*10/09/2020*	*3196184857*	*Miguel Ángel Ríos*	*Particular*	*Danery Pupiales Zapata*
8am-6pm	*17/09/2020*	*3214401639 3146130837 3205385041 3138509728 3104109523 3193138401 3146855816 3166807330*	*Diomedes López Walter Flórez Antonio Quirama. Luz Stella Quinceno Ángel María López Silvio Ramírez Ríos Robinson Carmona Edilberto Pulgarín Giraldo*	*Acueductos: Pérez Bajo, Amoladora Alta, Viva Cerritos, Alto Erazo 1, 2 y 3 , Pital de Combia, La Convención, Amoladora Baja, San Vicente de Betania, Llano Grande, Guadualito.*	*Danery Pupiales Zapata*
10:30am	*21/09/2020*		*María Deisy Román*	*Acueducto Carbonera la Trinidad.*	*Danery Pupiales Zapata*
8am-6pm	*21/09/2020*	*3214401639 3146130837 3205385041 3138509728 3104109523 3193138401 3146855816 3166807330*	*Diomedes López Walter Flórez Antonio Quirama. Luz Stella Quinceno Ángel María López Silvio Ramírez Ríos Robinson Carmona Edilberto Pulgarín Giraldo*	*Acueductos: Pérez Bajo, Amoladora Alta, Viva Cerritos, Alto Erazo 1, 2 y 3 , Pital de Combia, La Convención, Amoladora Baja, San Vicente de Betania, Llano Grande, Guadualito*	*Danery Pupiales Zapata*

8am-6pm	*22/09/2020*	*3226601832*	*Orbilio Guevara Ladino*	*Acueducto Cantamonos*	*Danery Pupiales Zapata*
8am-6pm	29/09/2020	*3214401639 3146130837 3205385041 3138509728 3104109523 3193138401 3146855816 3166807330*	*Acueductos: Pérez Bajo, Amoladora Alta, Viva Cerritos, Alto Erazo 1, 2 y 3 , Pital de Combia, La Convención, Amoladora Baja, San Vicente de Betania, Llano Grande, Guadualito*	*Acueductos: Pérez Bajo, Amoladora Alta, Viva Cerritos, Alto Erazo 1, 2 y 3 , Pital de Combia, La Convención, Amoladora Baja, San Vicente de Betania, Llano Grande, Guadualito*	*Danery Pupiales Zapata*
2 pm	*29/09/2020*	*3128880542*	*Ramiro CRUZ*	*Acueducto Pérez Bajo*	*Danery Pupiales Zapata*

LINEA TELEFONICA Nº: *3137574162*	**FUNCIONARIO RESPONSABLE: *Danery Pupiales Zapata***

HORA	FECHA	NUMERO	PERSONA A LA QUE LLAMA	ENTIDAD	RESPONSABLE DE LA LLAMADA
9:15am	*10/09/2020*	*3196184857*	*Miguel Ángel Ríos*	*Particular*	*Danery Pupiales Zapata*
8am-6pm	*17/09/2020*	*3214401639 3146130837 3205385041 3138509728 3104109523 3193138401 3146855816 3166807330*	*Diomedes López Walter Flórez Antonio Quirama. Luz Stella Quinceno Ángel María López Silvio Ramírez Ríos Robinson Carmona Edilberto Pulgarín Giraldo*	*Acueductos: Pérez Bajo, Amoladora Alta, Viva Cerritos, Alto Erazo 1, 2 y 3 , Pital de Combia, La Convención, Amoladora Baja, San Vicente de Betania, Llano Grande, Guadualito.*	*Danery Pupiales Zapata*
10:30am	*21/09/2020*		*María Deisy Román*	*Acueducto Carbonera la Trinidad.*	*Danery Pupiales Zapata*
8am-6pm	*21/09/2020*	*3214401639 3146130837 3205385041 3138509728 3104109523 3193138401 3146855816 3166807330*	*Diomedes López Walter Flórez Antonio Quirama. Luz Stella Quinceno Ángel María López Silvio Ramírez Ríos Robinson Carmona Edilberto Pulgarín Giraldo*	*Acueductos: Pérez Bajo, Amoladora Alta, Viva Cerritos, Alto Erazo 1, 2 y 3 , Pital de Combia, La Convención, Amoladora Baja, San Vicente de Betania, Llano Grande, Guadualito*	*Danery Pupiales Zapata*

8am-6pm	*22/09/2020*	*3226601832*	*Orbilio Guevara Ladino*	*Acueducto Cantamonos*	*Danery Pupiales Zapata*
8am-6pm	29/09/2020	*3214401639 3146130837 3205385041 3138509728 3104109523 3193138401 3146855816 3166807330*	*Acueductos: Pérez Bajo, Amoladora Alta, Viva Cerritos, Alto Erazo 1, 2 y 3 , Pital de Combia, La Convención, Amoladora Baja, San Vicente de Betania, Llano Grande, Guadualito*	*Acueductos: Pérez Bajo, Amoladora Alta, Viva Cerritos, Alto Erazo 1, 2 y 3 , Pital de Combia, La Convención, Amoladora Baja, San Vicente de Betania, Llano Grande, Guadualito*	*Danery Pupiales Zapata*
2 pm	*29/09/2020*	*3128880542*	*Ramiro CRUZ*	*Acueducto Pérez Bajo*	*Danery Pupiales Zapata*

INFORME SUMINISTRO DE CLORO A LOS ACUEDUCTOS RURALES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.

La Secretaria de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental apoya al fortalecimiento de 52 acueductos del Municipio de Pereira; dentro de esos apoyos, se realiza el suministro de entrega de Hipoclorito de Calcio al 70% para contribuir con el proceso de desinfección que realizan las empresas prestadoras del servicio, para garantizar a la población agua acta para el consumo humano; así evita riesgos a la afectación de la salud humana (enfermedades de origen hídrico) por consumo de agua cruda y permitir el mejoramiento de la calidad de agua.

Para realizar y garantizar el seguimiento a los acueductos la Administración Municipal adquirió dos equipos de Marca HACH el DR900 y un Ph estos equipos permiten un rápido y fácil acceso a los métodos de análisis más utilizados en los laboratorios de calidad de agua,. Estos análisis que se realizan son fisicoquímicos, y están reglamentados bajo la Resolución 2115 del 2017.

Este seguimiento se ve afectado por falta de un vehículo permanente o destinado un día a la semana para poder transportar los equipos y realizar los análisis fisicoquimos a los acueductos; esto nos ayuda a garantizar el proceso de desinfección y contribuye con el concepto sanitario IRCA (Índice de Riegos a la Calidad de Agua) la cual es otorgado por Secretaria de Salud Pública y Seguridad Social.

Continuar con el proceso de certificación en competencias laborales a los fontaneros otorgada por el SENA.


CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 3994 **RESPONSABLE:** Danery Pupiales Zapata

FECHA: 02/10/2020 **CORREG Y/O COMUNA:** Caimalito

VEREDA Y/O BARRIO: Carbonera Paso Nivel **FINCA Y/O LUGAR:** Acueducto Carbonera Paso Nivel

ACTIVIDAD:

Recolectar y tomar la información de campo para los estudios y diseños que se requieren en el mejoramiento de la infraestructura de los acueductos rurales.

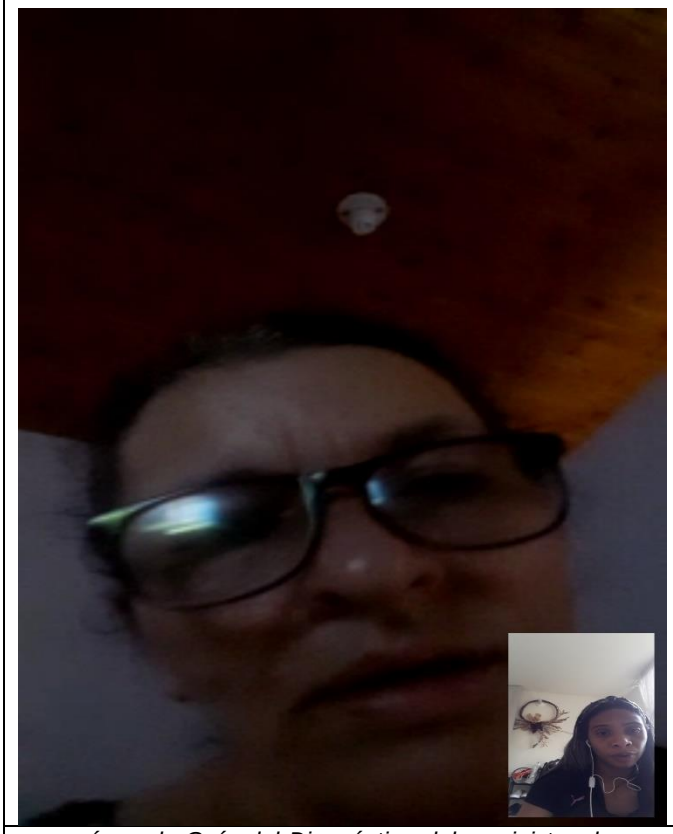

asesoría en la Guía del Diagnóstico del suministro de agua para consumo humano y doméstico en la zona rural del municipio de Pereira al acueducto Carbonera Paso Nivel

FIRMA

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 3994

RESPONSABLE: Danery Pupiales Zapata

FECHA: 11/09/2020


CORREG Y/O COMUNA: Café

VEREDA Y/O BARRIO: Mirador de Llano Grande

FINCA Y/O LUGAR: Parque Industrial

ACTIVIDAD:

Apoyar todas las actividades que fomenten el desarrollo rural

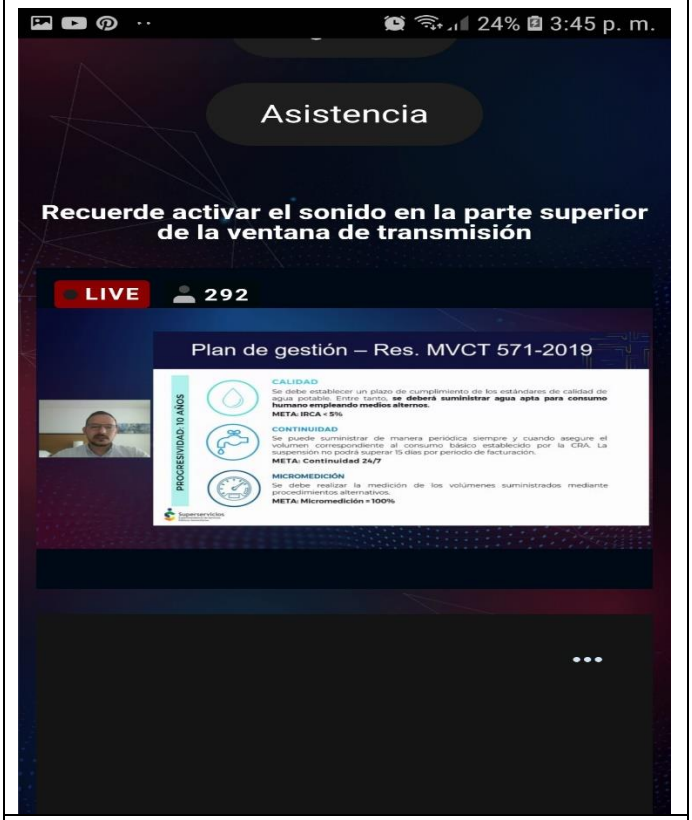

Asistencia al foro virtual organizado por la Superservicios Encuentro Regional de Acueductos Rurales.

FIRMA

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 3994 **RESPONSABLE:** Danery Pupiales Zapata

FECHA: 01/10/2020 **CORREG Y/O COMUNA:** La Florida

VEREDA Y/O BARRIO: Manzano Alto **FINCA Y/O LUGAR:** Acueducto Manzano Alto.

ACTIVIDAD:
Realizar acompañamiento a las empresas prestadoras del servicio de agua potable para la elaboración e implementación de Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua PUEAA.



Asesoria en la formulacion del PUEAA aceuducto Manzano Alto.

FIRMA

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 3994

RESPONSABLE: Danery Pupiales Zapata

FECHA: 20/09/2020

CORREG Y/O COMUNA: Universidad

VEREDA Y/O BARRIO: Popular modelo

FINCA Y/O LUGAR: Parque la Julia

ACTIVIDAD:
Apoyar todas las actividades que fomenten el desarrollo rural



Apoyo en la Mercaton Campesina


FIRMA

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 3994 **RESPONSABLE:** Danery Pupiales Zapata

FECHA: 01/10/2020 **CORREG Y/O COMUNA:** Combia

VEREDA Y/O BARRIO: Pital **FINCA Y/O LUGAR:** Acueducto Pital

ACTIVIDAD:
Realizar acompañamiento a las empresas prestadoras del servicio de agua potable para la elaboración e implementación de Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua

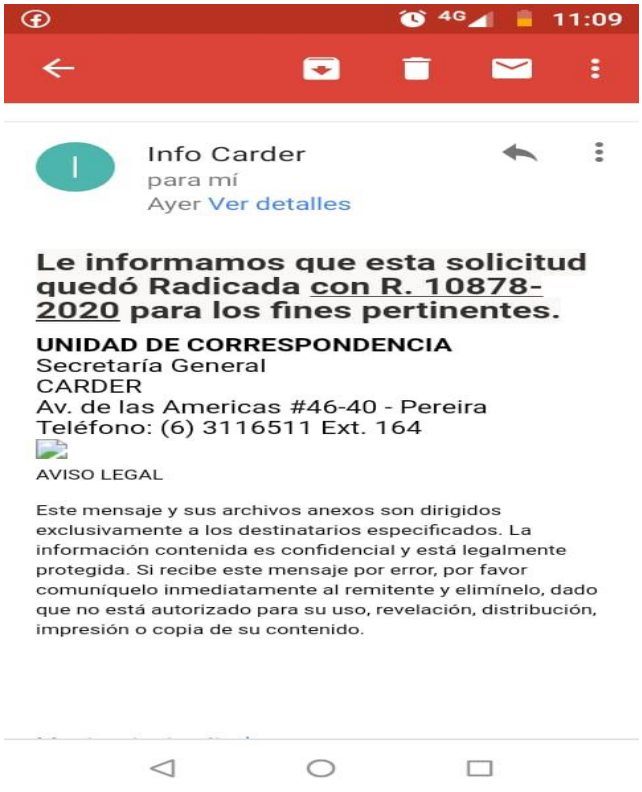

Radicado de las Actividades del PUEAA año 2019 ante CARDER. Del acueducto Pital de Combia.

FIRMA

REQUERIMIENTOS DE LOS ACUEDUCTOS COMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

ACUEDUCTO	REQUERIMIENTO	JUSTIFICACION
CARACOL ROCIO	Macromedidor, Micromedidores (15)	
CANTAMONOS	Macromedidor	
YARUMAL		
SANTA CRUZ DE BARBAS		
PEREZ ALTO		
PEREZ BAJO	Micromedidores (15)	
SAN LUIS		
LA CONVENCION		
MARACAIBO		
LA RENTA		
BELLA VISTA		
SAN VICENTE DE BETANIA	Socavación de la bocatoma y deterioro del desarenador.	
SAN VICENTE DE PENJAMO		
PRIMAVERA LA CONVENCION	Micromedidores (15)	
GUADUALITO	Instrumento de medición y control (llaves de aforo)	
ALTO ERAZO 1 Y 3	Macromedidor	
ALTO ERAZO 2	Micromedidores.(50)	
PITAL DE COMBIA	Macromedidor	
PITAL ALTO		
AMOLADORA ALTA		
AMOLADORA BAJA EL EDEN	Socavación de bocatoma	
ACUACOMBIA		
VISTA HERMOSA	Micromedidores	
MUNDO NUEVO		
COROZAL LAS DELICIAS	Micromedidores	
EL RINCON		
LA BELLA		

LA COLONIA	No tiene desarenador,Micromedidores	Pendiente por enviar listado de materiales
CHOCHO CANCELES	Instrumento de medición y control para realizar aforo. Pendiente los materiales	Requerimiento de CARDER y Procuraduría Ambiental (urgente)
SAN JOSE	Micromedidores	
REPRESA CHARCO HONDO	Micromedidores (69)	El acueducto dentro de su programa PUEAA para los 5 años debe instalar 345 micromedidores disdribuido por cada año 69.
LA FLORIDA		
PLAN MANZAO 1	Micromedidores	
PLAN MANZANO 2		
LA BANANERA		
CARBONERA PASO NIVEL	Micromedidores (48) Reparación de la bocatama	El acueducto en el año 2017 sufrió deterioro de la bocatoma debido a una creciente y afecto gran parte de la infraestructura
CARBONERA LA TRINIDAD	Deterioro del Desarenador	Pendiente por enviar listado de materiales
CAIMALITO 1	Puntos de Muestreo	
CARBONERA K5	Caseta de Cloración	
CAIMALITO 2	Válvulas de PVC 4” y 4” uniones a presión	Este requerimiento se solicitó en reportes pasados ya que en época de aislamiento el acueducto no tenía donde adquirir estos materiales.
AQUASAT TINAJAS		
SAN CARLOS		
PEÑAS ROJAS	Micromedidores (15)	
LA HONDA	Micromedidores, (24) Cerramiento Malla galvanizada o eslabonada medidas 14mt x7mt	En visita técnica realizada al acueducto el año pasado se recomendó el cerramiento de la infraestructura del

		acueducto; ya que el dueño de la finca donde se encuentra ubicado el acueducto posee ganado generando un riesgo para el proceso de desinfección
GUAYABO LA HONDA	Micromedidores (120) Reparación Puntos de muestreo: 100 adobes, 2 metros de en chupes, 2 bultos de cemento y dos puestas pequeñas metálicas	Los puntos de muestreo en visita realizada por secretaria salud , dan un concepto técnico que dichos puntos no están diseñados bajo la norma. Resolución 0811 /2008
