
	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORESES	**Código**	
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	**Versión**	
		Vigencia	**10/10/2024**


CONTRATO No.	**CTO 153-SG-2025**
OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL – LOTE 5**
CONTRATISTA	**CUBINGECOL INGENIERIA YCUBIERTAS SAS**
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	**CONSTRUCTORA GILLI SAS**
FRENTE DE OBRA	**SEDE REGIONAL MEDICINA LEGAL - LOTE 5 - PEREIRA, RISARALDA**
ÍTEM Nº **1.1**	UND: M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	Demolición de pañete y terminado de muro en sitios afectados por humedad VER ANEXO TÉCNICO
CORTE Nº: 01	FECHA : 24/03/2026

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA







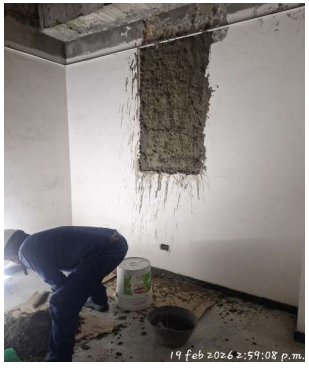

UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
Muro #1,1	5,03		1,50			7,55
Muro #1,2	0,56		1,50			0,84
Muro #1,3	0,33		1,50			0,50
Muro #2	6,45		1,09			7,03
Muro #3	7,49		1,09			8,16
Muro #4,1	1,91		1,50			2,87
Muro #4,2	1,36		0,92			1,25
Muro #4,3	1,52		1,52			2,31
Muro humdad cuarto de Evidencias	0,50		1,60			0,80
					CANTIDAD CONTRACTUAL	**59,00**
					CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA - ACTAS ANTERIORES	**0,00**
					CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACTA PARCIAL No. 1	**31,30**
					CANTIDAD ACOMULADA EJECUTADA	**0,00**
					POR EJECUTAR	**27,70**

Elaboró::

Juan Felipe gonzalez P.
Firma

Residente de Obra
Firma y Posfirma :ING. Juan Felipe Gonzalez Pacheco

VoBo:


Interventor del contrato: ING Maria Paula Rivera
Firma y Posfirma:


	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORESES	Código	
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	
		Vigencia	10/10/2024


CONTRATO No.	CTO 153-SG-2025
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL – LOTE 5
CONTRATISTA	CUBINGECOL INGENIERIA YCUBIERTAS SAS
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	CONSTRUCTORA GILLI SAS
FRENTE DE OBRA	SEDE REGIONAL MEDICINA LEGAL - LOTE 5 - PEREIRA, RISARALDA

ÍTEM Nº	1.1	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	Demolición de pañete y terminado de muro en sitios afectados por humedad VER ANEXO TÉCNICO		
CORTE Nº:	01	FECHA :	24/03/2026

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

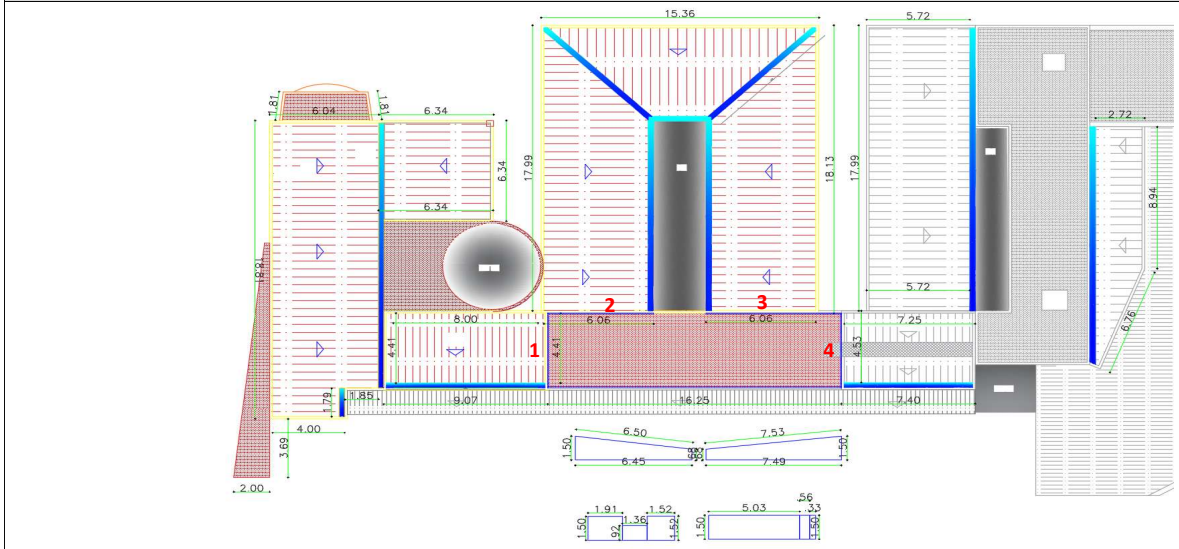

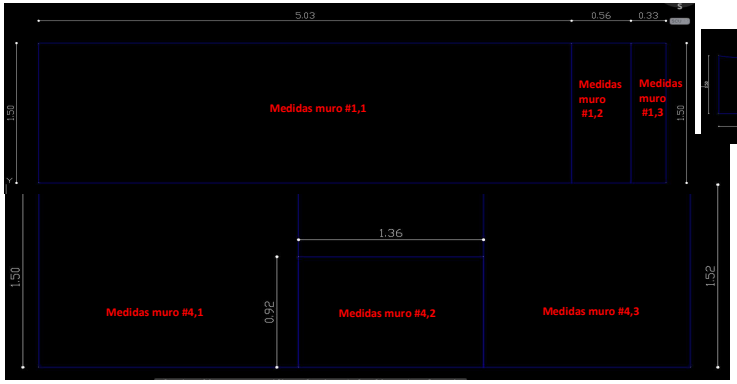





Elaboró::	VoBo:
Juan Felipe Gonzalez P. Firma	
Residente de Obra	Interventor del contrato: ING Maria Paula Rivera
Firma y Posfirma :ING. Juan Felipe Gonzalez Pacheco	Firma y Posfirma:

	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORESES	Código	
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	
		Vigencia	10/10/2024

CONTRATO No.	**CTO 153-SG-2025**
OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL – LOTE 5**
CONTRATISTA	**CUBINGECOL INGENIERIA YCUBIERTAS SAS**
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	**CONSTRUCTORA GILLI SAS**
FRENTE DE OBRA	**SEDE REGIONAL MEDICINA LEGAL - LOTE 5 - PEREIRA, RISARALDA**
ÍTEM Nº **1.2**	UND: M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM Desmonte de cielorraso en superboard, fibra mineral, VER ANEXO TÉCNICO	
CORTE Nº: 01	FECHA : 24/03/2026

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





UBICACIÓN	DIMENSIONES Ancho	Longitud	Altura	MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
ARCHIVO #44	2,98	4,37			1	13,01
SECRETARIA ESTUPEFACIENTES #47	2,89	2,10			1	6,07
CIRCULACION ESTUPEFACIENTES #48	10,95	3,22			1	35,21
INSTRUMENTAL #49	9,04	4,34			1	39,21
LAB. ESTUPEFACIENTES #50	6,15	4,27			1	26,24
NEVERAS ESTUPEFACIENTES (INCLUYE PASILLO) #51	2,45	4,20			1	10,30
BALANZA #52	2,96	1,85			1	5,49
EVIDENCIAS #53	2,56	3,12			1	7,99
BAÑOS TOXICOLOGIA #54	2,45	3,09			1	7,58
NEVERAS TOXICOLOGIA #55	2,45	3,14			1	7,70
NEVERAS TOXICOLOGIA #56	2,94	3,10			1	9,10
LAB TOXICOLOGIA #57	12,19	4,34			1	52,89
CANTIDAD CONTRACTUAL						**376,00**
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA - ACTAS ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACTA PARCIAL No. 1						**220,79**
CANTIDAD ACOMULADA EJECUTADA						**0,00**
POR EJECUTAR						**155,21**

Elaboró::

Juan Felipe Gonzalez P.
Firma

Residente de Obra
Firma y Posfirma :ING. Juan Felipe Gonzalez Pacheco


VoBo:

Interventor del contrato: ING Maria Paula Rivera
Firma y Posfirma:

	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORESES	Código	
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	
		Vigencia	10/10/2024

CONTRATO No.	CTO 153-SG-2025			
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL – LOTE 5			
CONTRATISTA	CUBINGECOL INGENIERIA YCUBIERTAS SAS			
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	CONSTRUCTORA GILLI SAS			
FRENTE DE OBRA	SEDE REGIONAL MEDICINA LEGAL - LOTE 5 - PEREIRA, RISARALDA			
ÍTEM Nº	1.2		UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	Desmonte de cielorraso en superboard, fibra mineral, VER ANEXO TECNICO			
CORTE Nº:	01		FECHA :	24/03/2026

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

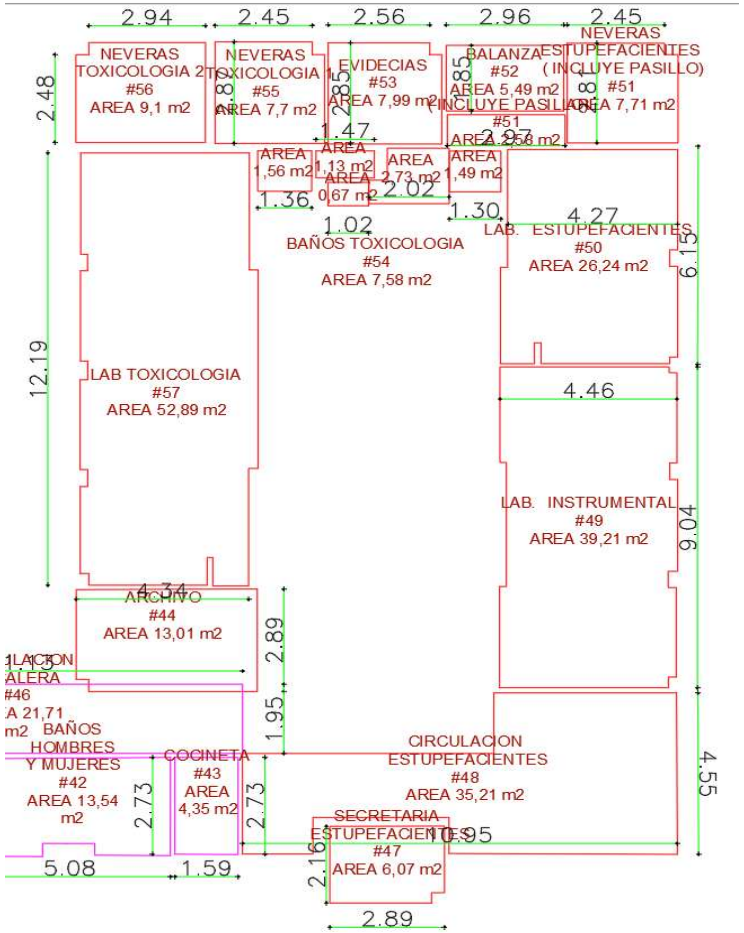

Elaboró::

Juan Felipe Gonzalez P.
Firma

Residente de Obra
Firma y Posfirma :ING. Juan Felipe Gonzalez Pacheco


VoBo:


Interventor del contrato: ING Maria Paula Rivera
Firma y Posfirma:


	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORESES	Código	
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	
		Vigencia	10/10/2024


CONTRATO No.	**CTO 153-SG-2025**
OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL – LOTE 5**
CONTRATISTA	**CUBINGECOL INGENIERIA YCUBIERTAS SAS**
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	**CONSTRUCTORA GILLI SAS**
FRENTE DE OBRA	**SEDE REGIONAL MEDICINA LEGAL - LOTE 5 - PEREIRA, RISARALDA**
ÍTEM Nº **1.3**	UND: M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM Desmonte de cubierta en teja de fibrocemento VER ANEXO TÉCNICO	
CORTE Nº: 01	FECHA : 24/03/2026

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

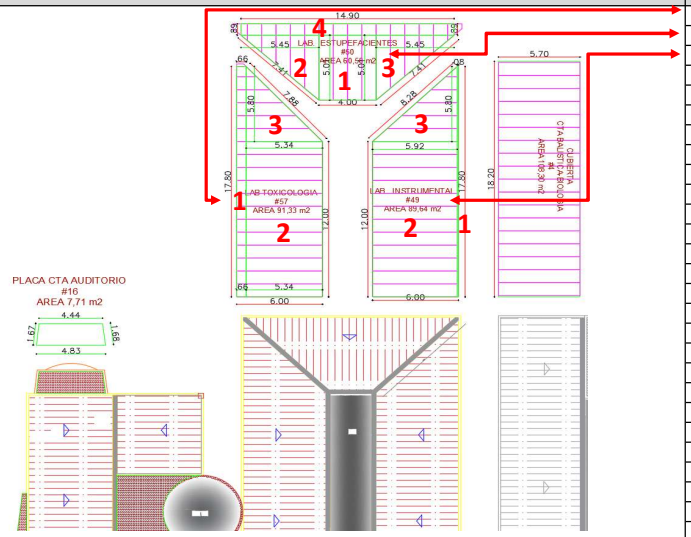







UBICACIÓN	DIMENSIONES Ancho	Longitud	Altura	MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
LABORATORIO TOXICOLOGIA #1	0,66	17,80				11,75
LABORATORIO TOXICOLOGIA #2	5,34	12,00				64,08
LABORATORIO TOXICOLOGIA #3	5,80	5,34				15,49
LABORATORIO ESTUPEFACIENTES #1	4,00	5,01				20,04
LABORATORIO ESTUPEFACIENTES #2	5,45	5,01				13,65
LABORATORIO ESTUPEFACIENTES #3	5,45	5,01				13,65
LABORATORIO ESTUPEFACIENTES #4	0,89	14,90				13,26
LABORATORIO INSTRUMENTAL #1	0,08	17,80				1,42
LABORATORIO INSTRUMENTAL #2	12,00	5,92				71,04
LABORATORIO INSTRUMENTAL #3	5,92	5,80				17,17
				CANTIDAD CONTRACTUAL		437,00
				CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA - ACTAS ANTERIORES		0,00
				CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACTA PARCIAL No. 1		241,55
				CANTIDAD ACOMULADA EJECUTADA		0,00
				POR EJECUTAR		195,45

Elaboró::

Juan Felipe Gonzalez P.
Firma

Residente de Obra
Firma y Posfirma :ING. Juan Felipe Gonzalez Pacheco

VoBo:


Interventor del contrato: ING Maria Paula Rivera
Firma y Posfirma:

	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORESES	**Código**	
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	**Versión**	
		Vigencia	**10/10/2024**

CONTRATO No.	**CTO 153-SG-2025**
OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL – LOTE 5**
CONTRATISTA	**CUBINGECOL INGENIERIA YCUBIERTAS SAS**
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	**CONSTRUCTORA GILLI SAS**
FRENTE DE OBRA	**SEDE REGIONAL MEDICINA LEGAL - LOTE 5 - PEREIRA, RISARALDA**

ÍTEM Nº	**1.4**	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	Desmonte y limpieza de láminas de cielorraso VER ANEXO TECNICO		
CORTE Nº:	01	FECHA :	24/03/2026

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

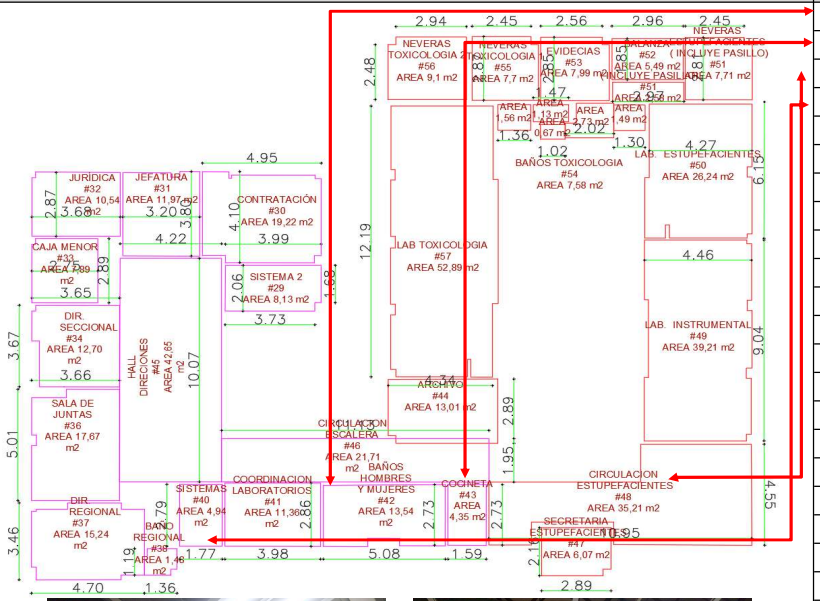







UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
BAÑOS HOMBRES Y MUJERES	5,08	2,73			1,00	13,54
COCINETA	1,59	2,73			1,00	4,35
CIRCULACION ESTUPEFACIENTES	10,95	4,55			1,00	35,21
SISTEMAS	1,77	2,79			1,00	4,94

	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORESES	**Código**	
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	**Versión**	
		Vigencia	**10/10/2024**

CONTRATO No.	**CTO 153-SG-2025**
OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL – LOTE 5**
CONTRATISTA	**CUBINGECOL INGENIERIA YCUBIERTAS SAS**
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	**CONSTRUCTORA GILLI SAS**
FRENTE DE OBRA	**SEDE REGIONAL MEDICINA LEGAL - LOTE 5 - PEREIRA, RISARALDA**
ÍTEM Nº **1.6**	UND: M
DESCRIPCIÓN ÍTEM	Desmonte de canales metálicas VER ANEXO TÉCNICO
CORTE Nº: 01	FECHA : 24/03/2026

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

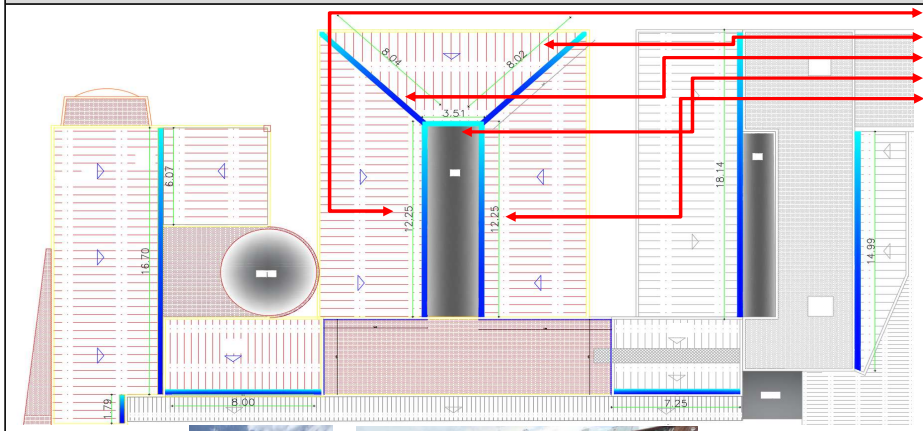





UBICACIÓN	DIMENSIONES Ancho	Longitud	Altura	MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
LABORATORIO TOXICOLOGIA		12,25			1,00	12,25
LABORATORIO ESTUPEFACIENTES		8,04			1,00	8,04
LABORATORIO ESTUPEFACIENTES		8,02			1,00	8,02
LABORATORIO ESTUPEFACIENTES		3,51			1,00	3,51
LABORATORIO INSTRUMENTAL		12,25			1,00	12,25
				CANTIDAD CONTRACTUAL		**81,00**
				CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA - ACTAS ANTERIORES		**0,00**
				CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACTA PARCIAL No. 1		**44,07**
				CANTIDAD ACOMULADA EJECUTADA		**0,00**
				POR EJECUTAR		**36,93**

Elaboró::

Juan Felipe Gonzalez P.
Firma

Residente de Obra
Firma y Posfirma :ING. Juan Felipe Gonzalez Pacheco

VoBo:

Interventor del contrato: ING Maria Paula Rivera
Firma y Posfirma:


	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORESES	Código	
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	
		Vigencia	10/10/2024

CONTRATO No.	CTO 153-SG-2025
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL – LOTE 5
CONTRATISTA	CUBINGECOL INGENIERIA YCUBIERTAS SAS
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	CONSTRUCTORA GILLI SAS
FRENTE DE OBRA	SEDE REGIONAL MEDICINA LEGAL - LOTE 5 - PEREIRA, RISARALDA
ÍTEM Nº 2.1	UND: KG
DESCRIPCIÓN ÍTEM Suministro e instalación de acero VER ANEXO TECNICO	
CORTE Nº: 01	FECHA : 24/03/2026

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





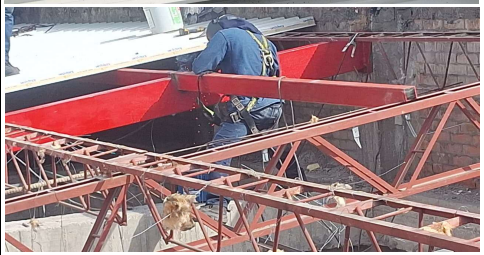









UBICACIÓN	DIMENSIONES Ancho	DIMENSIONES Longitud	DIMENSIONES Altura	PESO (KG)	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
LAB TOXICOLOGIA CORREA #1 60X120 MM 3MM		16,39		8,28	1,00	135,71
LAB TOXICOLOGIA CORREA #2 60X120 MM 3MM		13,98		8,28	1,00	115,75
LAB TOXICOLOGIA VIGA #1 100X250 MM 3MM		5,82		16,40	1,00	95,45
LAB TOXICOLOGIA VIGA #2 100X250 MM 3MM		5,82		16,40	1,00	95,45
LAB ESTUPEFACIENTES CORREA #1 60X120 MM 3MM		11,64		8,28	1,00	96,38
LAB ESTUPEFACIENTES CORREA #2 60X120 MM 3MM		6,67		8,28	1,00	55,23
LAB ESTUPEFACIENTES VIGA #1 100X250 MM 3MM		5,80		16,40	1,00	95,12
LAB ESTUPEFACIENTES VIGA #2 100X250 MM 3MM		5,80		16,40	1,00	95,12
LAB INSTRUMENTAL CORREA #1 60X120 MM 3MM		16,39		8,28	1,00	135,71
LAB INSTRUMENTAL CORREA #2 60X120 MM 3MM		13,98		8,28	1,00	115,75
LAB INSTRUMENTAL VIGA #1 100X250 MM 3MM		5,82		16,40	1,00	95,45
LAB INSTRUMENTAL VIGA #2 100X250 MM 3MM		5,82		16,40	1,00	95,45
PLATINA 300x300x5/8"	0,30	1,08	0,30	124,55	12,00	134,51
PLATAFORMA 2VIGAPTE100x100-3.0mm		3,00		9,20		27,60
PLATAFORMA 2VIGAPTE100x100-3.0mm		11,60		9,20		106,72
PLATAFORMA 2VIGAPTE100x100-3.0mm		3,15		9,20		28,96
PLATAFORMA 2VIGAPTE40x40-2.0mm		5,40		2,31		12,47
PLATAFORMA 2VIGAPTE40x40-2.0mm		4,49		2,31		10,37
PLATAFORMA 2PIEDEAMIGOPTE100x100-3.0mm		4,20		9,20		38,64
PLATAFORMA 2PLATINA200x200x1/2"	0,20	0,24	0,20	99,70	6,00	23,93
PLATAFORMA 2 MALLA EXPANDIDA IMT-100 V11 HR 1/4"		6,20		21,00		130,20
PLATAFORMA 2BARANDASØ1 1/2"-CALIBRE 12(2.5mm)		3,68		2,82		10,38
PLATAFORMA 2BARANDASØ1 1/2"-CALIBRE 12(2.5mm)		11,28		2,82		31,81
PLATAFORMA 2BARANDASØ2"-CALIBRE 12(2.5mm)		10,44		3,55		37,01
PLATAFORMA 2BARANDASØ2"-CALIBRE 12(2.5mm)		6,16		3,55		21,84
PLATAFORMA 2BARANDASØ2"-CALIBRE 12(2.5mm)		2,06		3,55		7,30
PLATAFORMA 2BARANDASØ1 1/2"-CALIBRE 12(2.5mm)		6,00		2,82		16,92
PLATAFORMA 2BARANDASØ3/4"-CALIBRE 18(1.9mm)		1,75		1,16		2,03
3 % SOLDADURA						56,02

CANTIDAD CONTRACTUAL	**5156,35**
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA - ACTAS ANTERIORES	**0,00**
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACTA PARCIAL No. 1	**1923,28**
CANTIDAD ACOMULADA EJECUTADA	**0,00**
POR EJECUTAR	**3233,08**

Elaboró::

Juan Felipe Gonzalez P.
Firma

Residente de Obra
Firma y Posfirma :ING. Juan Felipe Gonzalez Pacheco


VoBo:

Interventor del contrato: ING Maria Paula Rivera
Firma y Posfirma:

	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORESES	Código	
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	
		Vigencia	10/10/2024

CONTRATO No.	CTO 153-SG-2025		
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL – LOTE 5		
CONTRATISTA	CUBINGECOL INGENIERIA YCUBIERTAS SAS		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	CONSTRUCTORA GILLI SAS		
FRENTE DE OBRA	SEDE REGIONAL MEDICINA LEGAL - LOTE 5 - PEREIRA, RISARALDA		
ÍTEM Nº	2.1	UND:	KG
DESCRIPCIÓN ÍTEM	Suministro e instalación de acero VER ANEXO TECNICO		
CORTE Nº:	01	FECHA :	24/03/2026

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

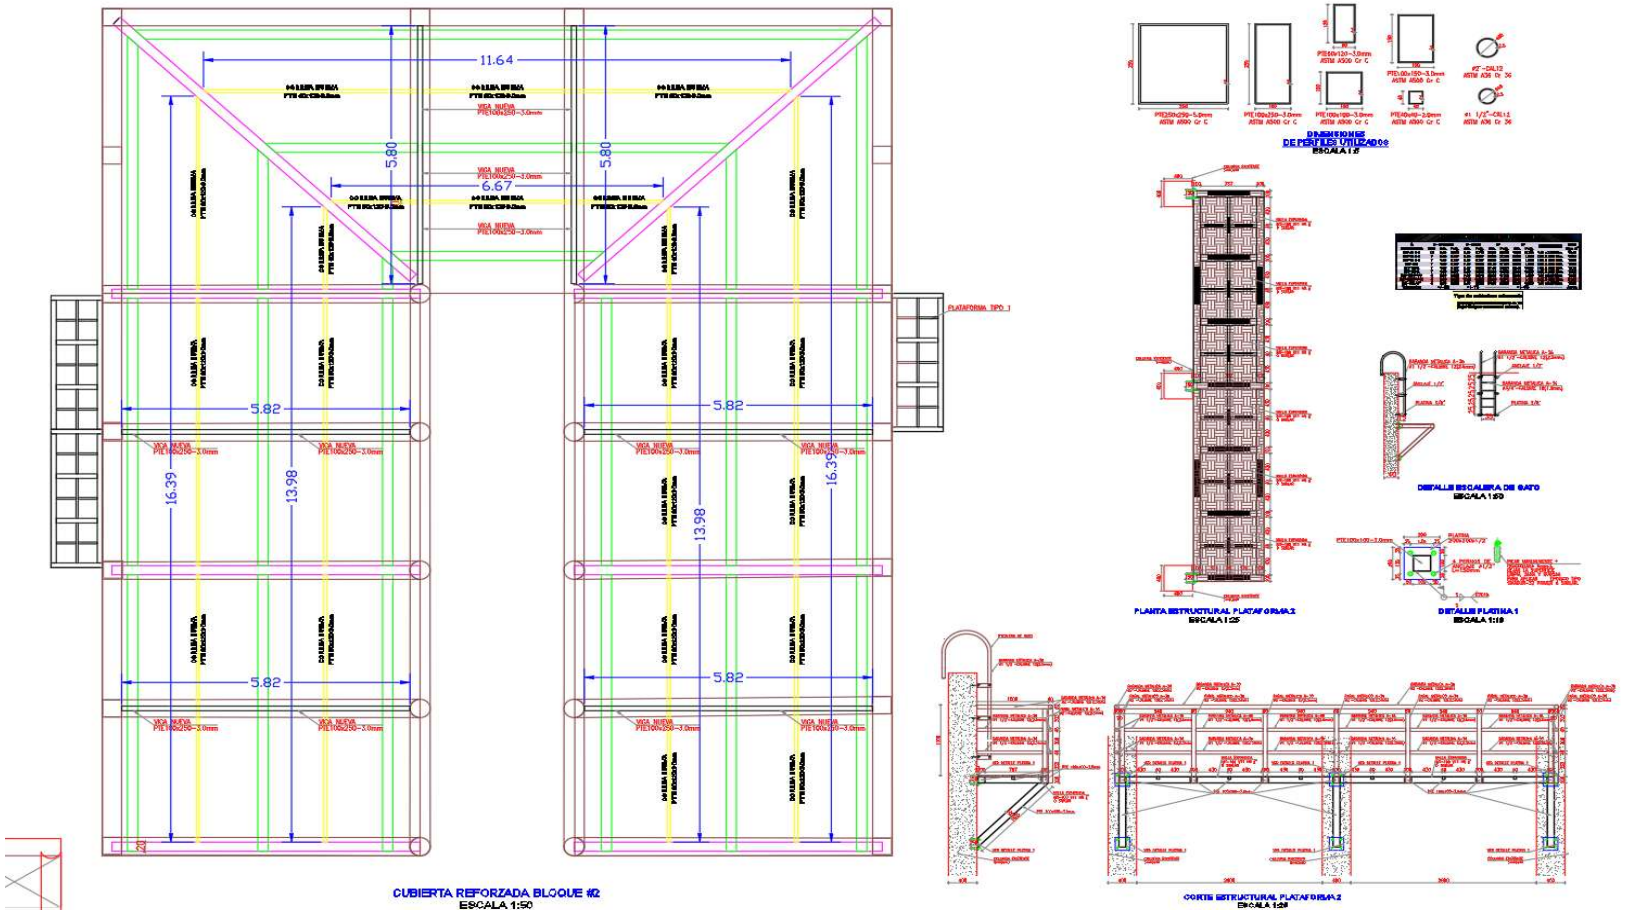


Elaboró::

Juan Felipe Gonzalez P.
Firma


Residente de Obra
Firma y Posfirma :ING. Juan Felipe Gonzalez Pacheco


VoBo:

Interventor del contrato: ING Maria Paula Rivera
Firma y Posfirma:

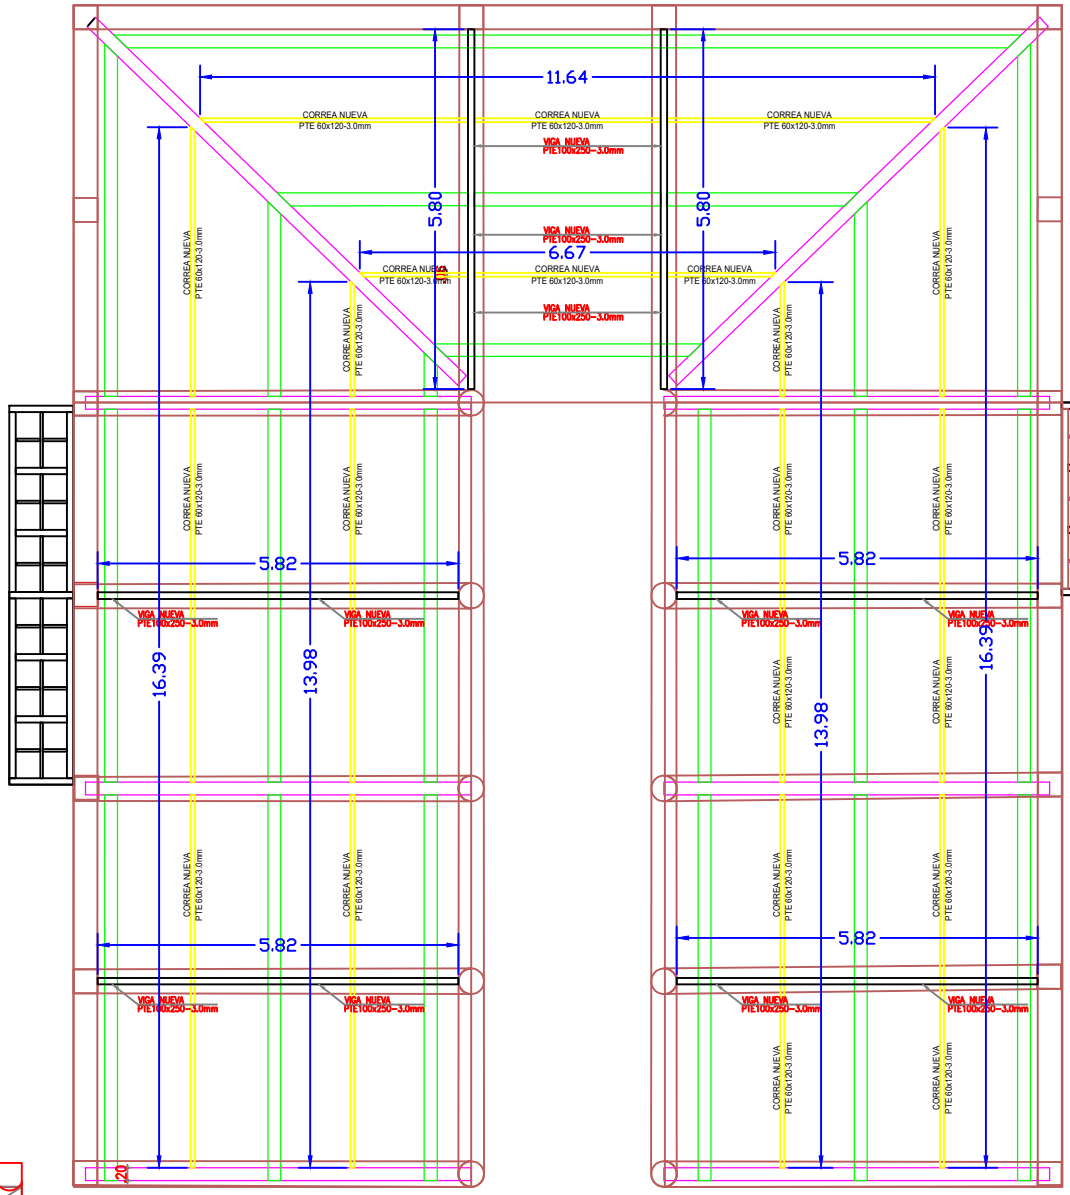


CUBIERTA REFORZADA BLOQUE #2
ESCALA 1:50







DIMENSIONES
DE PERFILES UTILIZADOS
ESCALA 1:5




PLANTA ESTRUCTURAL PLATAFORMA 2
ESCALA 1:25






DETALLE ESCALERA DE GATO
ESCALA 1:50



DETALLE PLATINA 1
ESCALA 1:10

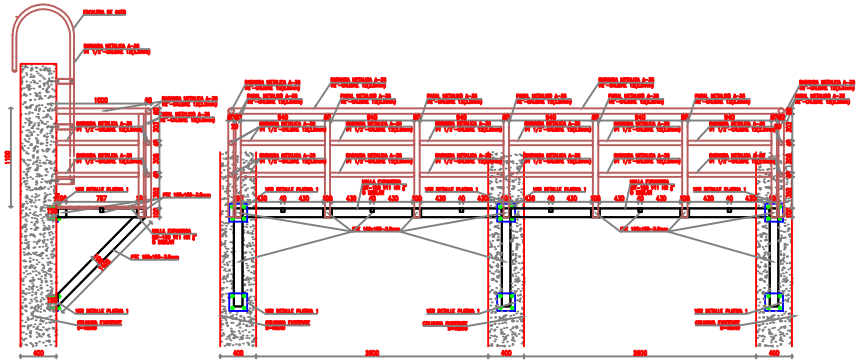


CORTE ESTRUCTURAL PLATAFORMA 2
ESCALA 1:25


INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES ESTABLECIMIENTO PÚBLICO ADSCRITO A LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	REGIONAL OCCIDENTE PEREIRA	PREDIOS :	Vo. Bo. REPRESENTANTE LEGAL DR. JORGE ARTURO JIMÉNEZ PÁJARO DIRECTOR GENERAL (E)	DISEÑADOR ESTRUCTURAL: ING. DIEGO ALEJANDRO FORERO V INGENIERA CIVIL ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS MP 091037-05393355 CND	ELABORÓ: ING. CAMILA ANDREA BARRERA INGENIERA GNGEI I.N.M.L.C.F.	OBSERVACIONES:	CONTENIDO: PLANTA CUBIERTA – EXISTENTE	ESCALA: INDICADA FECHA: MARZO 2026	ARCHIVO DWG: PLANO:


	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORESES	Código	
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	
		Vigencia	10/10/2024

CONTRATO No.	**CTO 153-SG-2025**
OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL – LOTE 5**
CONTRATISTA	**CUBINGECOL INGENIERIA YCUBIERTAS SAS**
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	**CONSTRUCTORA GILLI SAS**
FRENTE DE OBRA	**SEDE REGIONAL MEDICINA LEGAL - LOTE 5 - PEREIRA, RISARALDA**
ÍTEM Nº **3.1**	UND: M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM Suministro e instalación de cubierta VER ANEXO TÉCNICO	
CORTE Nº: 01	FECHA : 24/03/2026


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

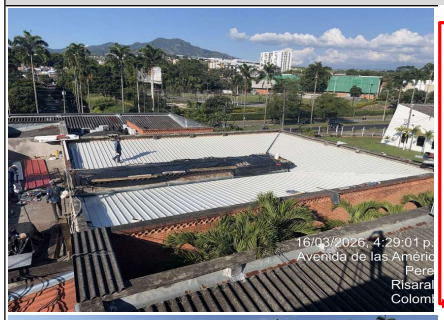










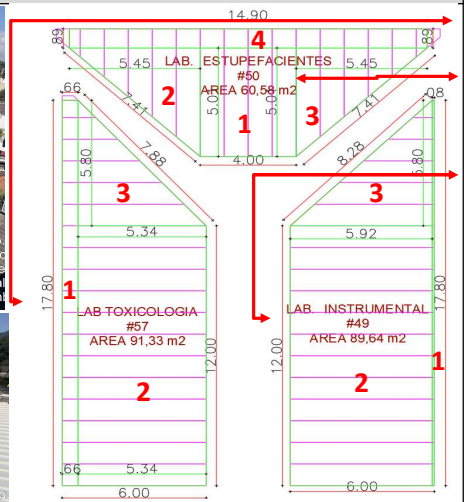

UBICACIÓN	DIMENSIONES Ancho	Longitud	Altura	MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
LABORATORIO TOXICOLOGIA #1	0,66	17,80				11,75
LABORATORIO TOXICOLOGIA #2	5,34	12,00				64,08
LABORATORIO TOXICOLOGIA #3	5,80	5,34				15,49
LABORATORIO ESTUPEFACIENTES #1	4,00	5,01				20,04
LABORATORIO ESTUPEFACIENTES #2	5,45	5,01				13,65
LABORATORIO ESTUPEFACIENTES #3	5,45	5,01				13,65
LABORATORIO ESTUPEFACIENTES #4	0,89	14,90				13,26
LABORATORIO INSTRUMENTAL #1	0,08	17,80				1,42
LABORATORIO INSTRUMENTAL #2	12,00	5,92				71,04
LABORATORIO INSTRUMENTAL #3	5,92	5,80				17,17
				CANTIDAD CONTRACTUAL		**437,00**
				CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA - ACTAS ANTERIORES		**0,00**
				CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACTA PARCIAL No. 1		**241,55**
				CANTIDAD ACOMULADA EJECUTADA		**0,00**
				POR EJECUTAR		**195,45**

Elaboró::

Juan Felipe Gonzalez P.
Firma

Residente de Obra
Firma y Posfirma :ING. Juan Felipe Gonzalez Pacheco

VoBo:


Interventor del contrato: ING Maria Paula Rivera
Firma y Posfirma:

	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORESES	Código	
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	
		Vigencia	10/10/2024

CONTRATO No.	**CTO 153-SG-2025**
OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL – LOTE 5**
CONTRATISTA	**CUBINGECOL INGENIERIA YCUBIERTAS SAS**
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	**CONSTRUCTORA GILLI SAS**
FRENTE DE OBRA	**SEDE REGIONAL MEDICINA LEGAL - LOTE 5 - PEREIRA, RISARALDA**
ÍTEM Nº **3.2**	UND: UND
DESCRIPCIÓN ÍTEM	Suministro e instalacion Kit de fijación Cubierta VER ANEXO TÉCNICO
CORTE Nº: 01	FECHA : 24/03/2026

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



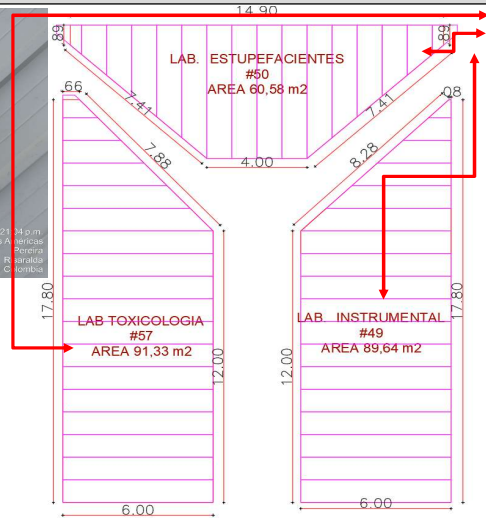

UBICACIÓN	DIMENSIONES Ancho	Longitud	Altura	MEDIDA PARCIAL	Nº TORNILLOS X M2	MEDIDA TOTAL
LABORATORIO TOXICOLOGIA	15,22	6,00			1,80	164,00
LABORATORIO ESTUPEFACIENTES	10,27	5,90			1,80	109,00
LABORATORIO INSTRUMENTAL	14,94	6,00			1,80	161,00
				CANTIDAD CONTRACTUAL		**600,00**
				CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA - ACTAS ANTERIORES		**0,00**
				CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACTA PARCIAL No. 1		**434,00**
				CANTIDAD ACOMULADA EJECUTADA		**434,00**
				POR EJECUTAR		**166,00**

Elaboró::

Juan Felipe Gonzalez P.
Firma

Residente de Obra
Firma y Posfirma :ING. Juan Felipe Gonzalez Pacheco


VoBo:

Interventor del contrato: ING Maria Paula Rivera
Firma y Posfirma:

	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORESES	**Código**	
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	**Versión**	
		Vigencia	**10/10/2024**

CONTRATO No.	**CTO 153-SG-2025**
OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL – LOTE 5**
CONTRATISTA	**CUBINGECOL INGENIERIA YCUBIERTAS SAS**
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	**CONSTRUCTORA GILLI SAS**
FRENTE DE OBRA	**SEDE REGIONAL MEDICINA LEGAL - LOTE 5 - PEREIRA, RISARALDA**
ÍTEM Nº **3.3**	UND: M
DESCRIPCIÓN ÍTEM Suministro e instalación de Accesorios Acero pre pintado, Calibre 24 color Gris RAL 9006 Desarrollo maximo 210mm. Remate Frontal	VER ANEXO TÉCNICO
CORTE Nº: 01	FECHA : 24/03/2026

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

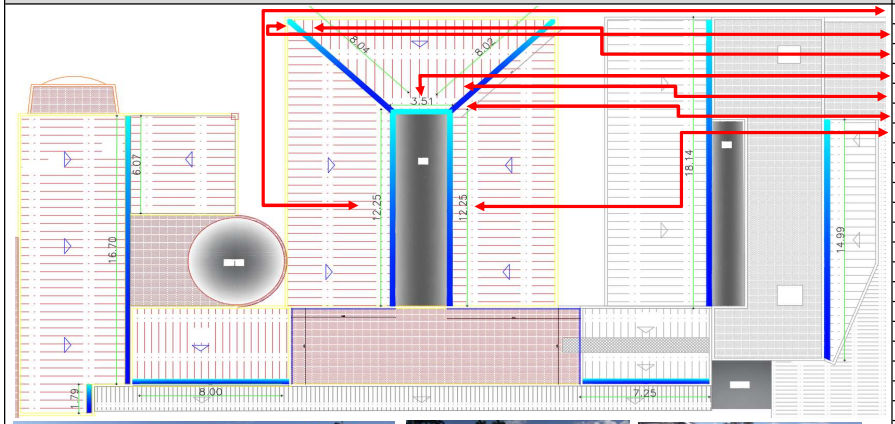







UBICACIÓN	DIMENSIONES Ancho	Longitud	Altura	MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
LABORATORIO TOXICOLOGIA		12,25			1,00	12,25
LABORATORIO ESTUPEFACIENTES IZQUIERDO		8,04			1,00	8,04
LABORATORIO ESTUPEFACIENTES DERECHO		8,04			1,00	8,04
LABORATORIO ESTUPEFACIENTES		3,51			1,00	3,51
LABORATORIO ESTUPEFACIENTES IZQUIERDO		8,02			1,00	8,02
LABORATORIO ESTUPEFACIENTES DERECHO		8,02			1,00	8,02
LABORATORIO INSTRUMENTAL		12,25			1,00	12,25

CANTIDAD CONTRACTUAL	**78,00**
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA - ACTAS ANTERIORES	**0,00**
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACTA PARCIAL No. 1	**60,13**
CANTIDAD ACOMULADA EJECUTADA	**0,00**
POR EJECUTAR	**17,87**

Elaboró::

Juan Felipe Gonzalez P.
Firma

Residente de Obra
Firma y Posfirma :ING. Juan Felipe Gonzalez Pacheco

VoBo:


Interventor del contrato: ING Maria Paula Rivera
Firma y Posfirma:

	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORESES	**Código**	
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	**Versión**	
		Vigencia	**10/10/2024**

CONTRATO No.	**CTO 153-SG-2025**
OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL – LOTE 5**
CONTRATISTA	**CUBINGECOL INGENIERIA YCUBIERTAS SAS**
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	**CONSTRUCTORA GILLI SAS**
FRENTE DE OBRA	**SEDE REGIONAL MEDICINA LEGAL - LOTE 5 - PEREIRA, RISARALDA**

ÍTEM Nº	**3.4**	UND:	M
DESCRIPCIÓN ÍTEM	Suministro e instalación de Accesorios Acero pre pintado, Calibre 24 color Gris RAL 9006 Desarrollo maximo 600mm. Remate lateral		VER ANEXO TECNICO
CORTE Nº:	01	FECHA :	24/03/2026

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

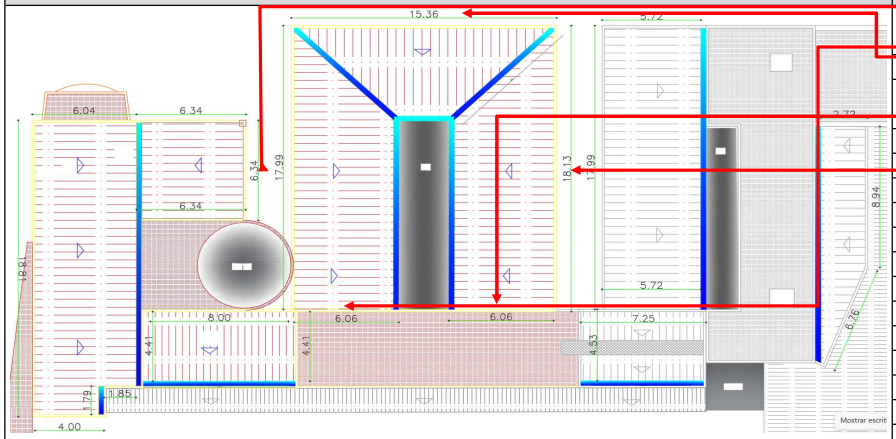





UBICACIÓN	DIMENSIONES Ancho	Longitud	Altura	MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
LABORATORIO TOXICOLOGIA		17,99			1,00	17,99
		6,06			1,00	6,06
LABORATORIO ESTUPEFACIENTES		15,36			1,00	15,36
LABORATORIO INSTRUMENTAL		18,13			1,00	18,13
		6,06			1,00	6,06

CANTIDAD CONTRACTUAL	**146,00**
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA - ACTAS ANTERIORES	**0,00**
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACTA PARCIAL No. 1	**63,60**
CANTIDAD ACOMULADA EJECUTADA	**63,60**
POR EJECUTAR	**82,40**

Elaboró::

Juan Felipe Gonzalez P.
Firma

Residente de Obra
Firma y Posfirma :ING. Juan Felipe Gonzalez Pacheco


VoBo:

Interventor del contrato: ING Maria Paula Rivera
Firma y Posfirma:

	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORESES	**Código**	
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	**Versión**	
		Vigencia	**10/10/2024**

CONTRATO No.	**CTO 153-SG-2025**
OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL – LOTE 5**
CONTRATISTA	**CUBINGECOL INGENIERIA YCUBIERTAS SAS**
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	**CONSTRUCTORA GILLI SAS**
FRENTE DE OBRA	**SEDE REGIONAL MEDICINA LEGAL - LOTE 5 - PEREIRA, RISARALDA**
ÍTEM Nº **3.5**	UND: M
DESCRIPCIÓN ÍTEM	Suministro e instalacion de canales en lámina galvanizada VER ANEXO TÉCNICO
CORTE Nº: 01	FECHA : 24/03/2026

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

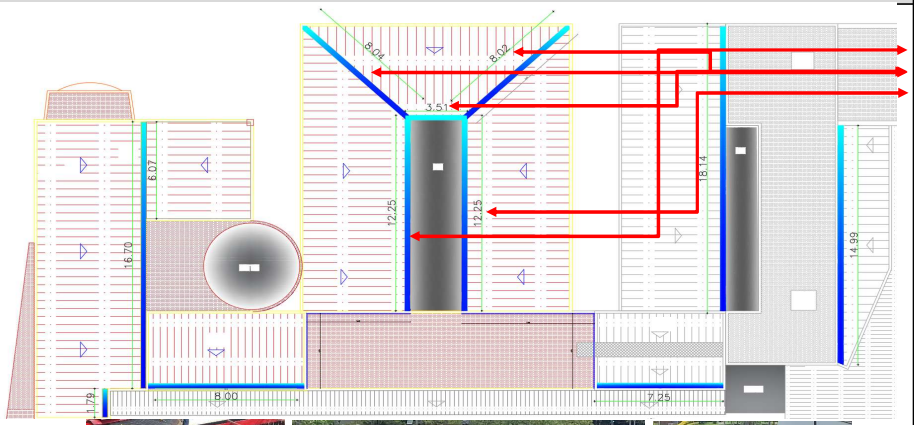







UBICACIÓN	DIMENSIONES Ancho	Longitud	Altura	MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
LABORATORIO TOXICOLOGIA		12,25			1,00	12,25
LABORATORIO ESTUPEFACIENTES		8,04			1,00	8,04
		8,02			1,00	8,02
		3,51			1,00	3,51
LABORATORIO INSTRUMENTAL		12,25			1,00	12,25
CANTIDAD CONTRACTUAL						**81,00**
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA - ACTAS ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACTA PARCIAL No. 1						**44,07**
CANTIDAD ACOMULADA EJECUTADA						**0,00**
POR EJECUTAR						**36,93**

Elaboró::

Juan Felipe Gonzalez P.
Firma

Residente de Obra
Firma y Posfirma :ING. Juan Felipe Gonzalez Pacheco

VoBo:


Interventor del contrato: ING Maria Paula Rivera
Firma y Posfirma:

	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORESES	**Código**	
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	**Versión**	
		Vigencia	**10/10/2024**


CONTRATO No.	**CTO 153-SG-2025**
OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL – LOTE 5**
CONTRATISTA	**CUBINGECOL INGENIERIA YCUBIERTAS SAS**
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	**CONSTRUCTORA GILLI SAS**
FRENTE DE OBRA	**SEDE REGIONAL MEDICINA LEGAL - LOTE 5 - PEREIRA, RISARALDA**

ÍTEM Nº	**7.1**	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	Pañete liso impermeabilizado 1:3, VER ANEXO TÉCNICO		
CORTE Nº:	01	FECHA :	24/03/2026

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

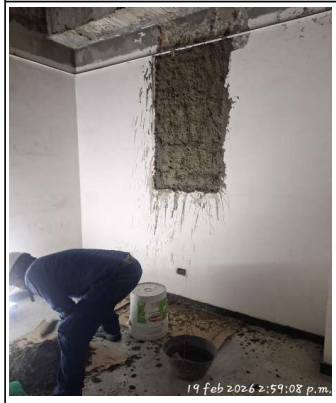



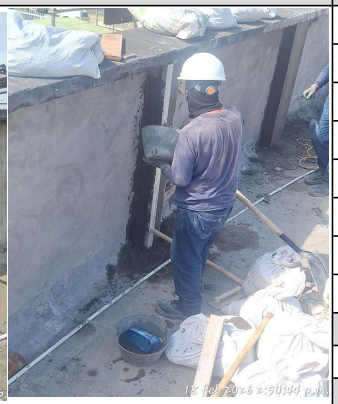

UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
Muro #1,1	5,03		1,50			7,55
Muro #1,2	0,56		1,50			0,84
Muro #1,3	0,33		1,50			0,50
Muro #4,1	1,91		1,50			2,87
Muro #4,2	1,36		0,92			1,25
Muro #4,3	1,52		1,52			2,31
Muro #5	16,25		1,50			24,38
Muro humdad cuarto de Evidencias	0,50		1,60			0,80
					CANTIDAD CONTRACTUAL	**59,00**
					CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA - ACTAS ANTERIORES	**0,00**
					CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACTA PARCIAL No. 1	**40,48**
					CANTIDAD ACOMULADA EJECUTADA	**0,00**
					POR EJECUTAR	**18,52**

Elaboró::

Juan Felipe Gonzalez P.
Firma

Residente de Obra
Firma y Posfirma :ING. Juan Felipe Gonzalez Pacheco

VoBo:


Interventor del contrato: ING Maria Paula Rivera
Firma y Posfirma:


	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORESES	Código	
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	
		Vigencia	10/10/2024


CONTRATO No.	CTO 153-SG-2025
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL – LOTE 5
CONTRATISTA	CUBINGECOL INGENIERIA YCUBIERTAS SAS
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	CONSTRUCTORA GILLI SAS
FRENTE DE OBRA	SEDE REGIONAL MEDICINA LEGAL - LOTE 5 - PEREIRA, RISARALDA

ÍTEM Nº	7.1	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	Pañete liso impermeabilizado 1:3, VER ANEXO TECNICO		
CORTE Nº:	01	FECHA :	24/03/2026

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

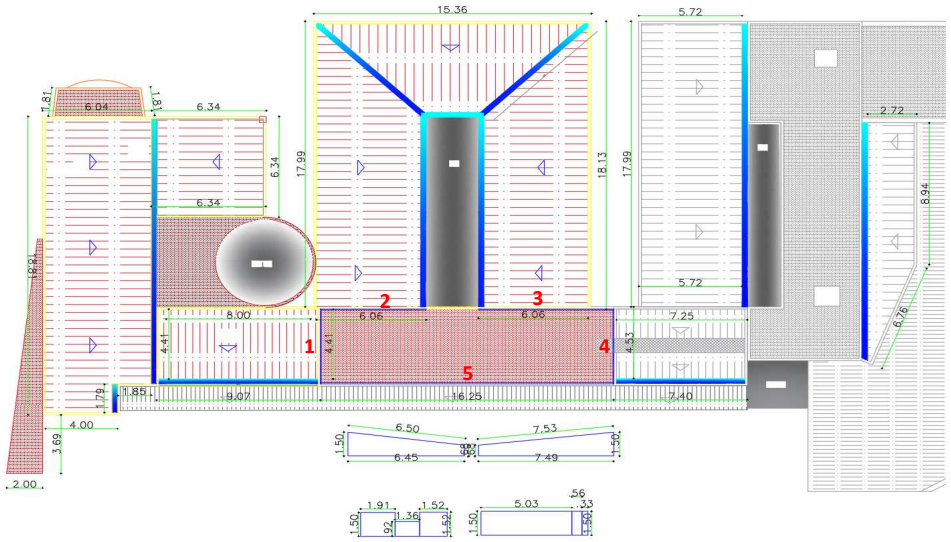

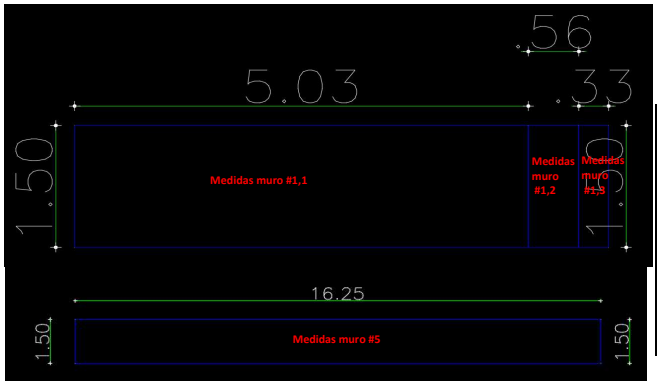

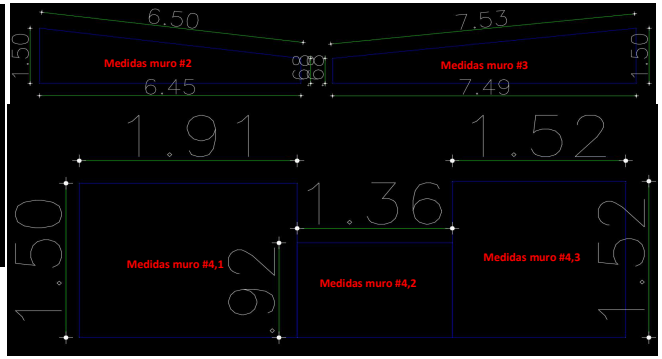



Elaboró::

Juan Felipe Gonzalez P.
Firma

Residente de Obra
Firma y Posfirma :ING. Juan Felipe Gonzalez Pacheco

VoBo:

Interventor del contrato: ING Maria Paula Rivera
Firma y Posfirma:

	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORESES	Código	
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	
		Vigencia	10/10/2024

CONTRATO No.	CTO 153-SG-2025
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL – LOTE 5
CONTRATISTA	CUBINGECOL INGENIERIA YCUBIERTAS SAS
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	CONSTRUCTORA GILLI SAS
FRENTE DE OBRA	SEDE REGIONAL MEDICINA LEGAL - LOTE 5 - PEREIRA, RISARALDA
ÍTEM Nº 9.1	UND: UND
DESCRIPCIÓN ÍTEM	Suministro e instalación de anclaje epóxico 3/4" VER ANEXO TECNICO
CORTE Nº: 01	FECHA : 24/03/2026

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES PLATINA			CANTIDADAD DE PLATINAS	N° DE PERNOS X PLATINA	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	**BLOQUE #2 -** LAB TOXICOLOGIA VIGA #1 100X250 MM 3MM	0,30	0,30		1,00	4,00	4,00
		0,30	0,30		1,00	4,00	4,00
	BLOQUE #2 - LAB TOXICOLOGIA VIGA #2 100X250 MM 3MM	0,30	0,30		1,00	4,00	4,00
		0,30	0,30		1,00	4,00	4,00
	BLOQUE #2 - LAB ESTUPEFACIENTES VIGA #1 100X250 MM 3MM	0,30	0,30		1,00	4,00	4,00
		0,30	0,30		1,00	4,00	4,00
	**BLOQUE #2 -** LAB ESTUPEFACIENTES VIGA #2 100X250 MM 3MM	0,30	0,30		1,00	4,00	4,00
		0,30	0,30		1,00	4,00	4,00
	BLOQUE #2 - LAB INSTRUMENTAL VIGA #1 100X250 MM 3MM	0,30	0,30		1,00	4,00	4,00
		0,30	0,30		1,00	4,00	4,00
	BLOQUE #2 - LAB INSTRUMENTAL VIGA #2 100X250 MM 3MM	0,30	0,30		1,00	4,00	4,00
		0,30	0,30		1,00	4,00	4,00
						CANTIDAD CONTRACTUAL	**140,00**
						CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA - ACTAS ANTERIORES	**0,00**
						CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACTA PARCIAL No. 1	**48,00**
						CANTIDAD ACOMULADA EJECUTADA	**0,00**
						POR EJECUTAR	**92,00**

Elaboró::

Juan Felipe Gonzalez P. Firma

Residente de Obra
Firma y Posfirma :ING. Juan Felipe Gonzalez Pacheco


VoBo:

Interventor del contrato: ING Maria Paula Rivera
Firma y Posfirma:

	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORESES	Código	
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	
		Vigencia	10/10/2024

CONTRATO No.		CTO 153-SG-2025	
OBJETO DEL CONTRATO		REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL – LOTE 5	
CONTRATISTA		CUBINGECOL INGENIERIA YCUBIERTAS SAS	
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR		CONSTRUCTORA GILLI SAS	
FRENTE DE OBRA		SEDE REGIONAL MEDICINA LEGAL - LOTE 5 - PEREIRA, RISARALDA	
ÍTEM Nº	9.1	UND:	UND
DESCRIPCIÓN ÍTEM	Suministro e instalación de anclaje epóxico 3/4" VER ANEXO TECNICO		
CORTE Nº:	01	FECHA :	24/03/2026

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

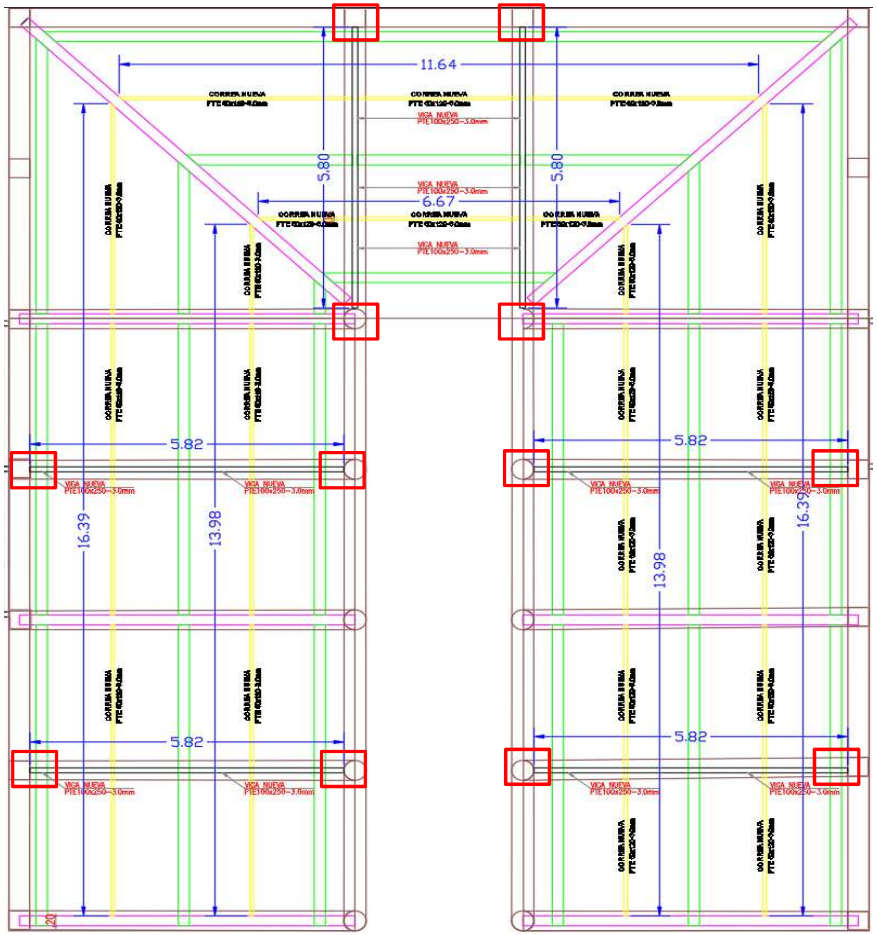

Elaboró::

Juan Felipe Gonzalez P.
Firma

Residente de Obra
Firma y Posfirma :ING. Juan Felipe Gonzalez Pacheco


VoBo:

Interventor del contrato: ING Maria Paula Rivera
Firma y Posfirma:

	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORESES	Código	
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	
		Vigencia	10/10/2024

CONTRATO No.	**CTO 153-SG-2025**
OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL – LOTE 5**
CONTRATISTA	**CUBINGECOL INGENIERIA YCUBIERTAS SAS**
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	**CONSTRUCTORA GILLI SAS**
FRENTE DE OBRA	**SEDE REGIONAL MEDICINA LEGAL - LOTE 5 - PEREIRA, RISARALDA**

ÍTEM Nº	**11.1.1**	UND:	UND
DESCRIPCIÓN ÍTEM	Desconexion y retiro de tablero y cableado, VER ANEXO TÉCNICO		
CORTE Nº:	01	FECHA :	24/03/2026

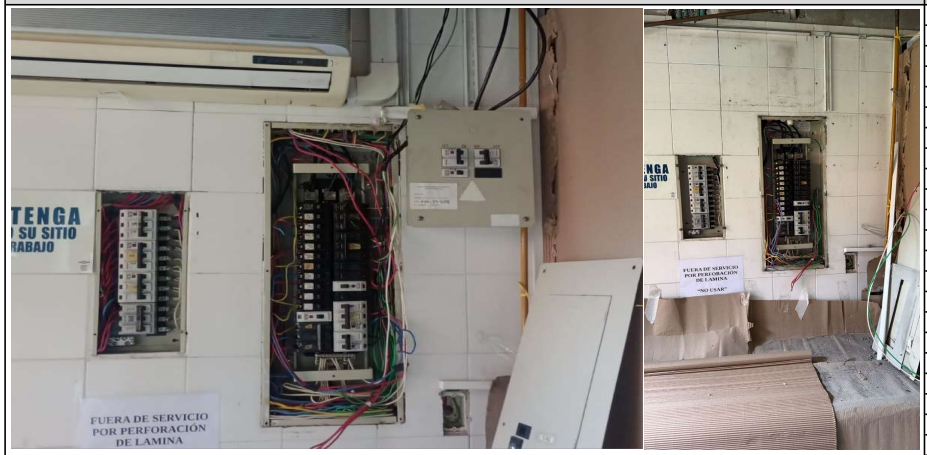PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	LABORATORIO TOXICOLOGIA					1,00	1,00

CANTIDAD CONTRACTUAL	**1,00**
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA - ACTAS ANTERIORES	**0,00**
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACTA PARCIAL No. 1	**1,00**
CANTIDAD ACOMULADA EJECUTADA	**0,00**
POR EJECUTAR	**0,00**

Elaboró::

Juan Felipe Gonzalez P.
Firma

Residente de Obra
Firma y Posfirma :ING. Juan Felipe Gonzalez Pacheco

VoBo:


Interventor del contrato: ING Maria Paula Rivera
Firma y Posfirma:

	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORESES	Código	
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	
		Vigencia	10/10/2024

CONTRATO No.	**CTO 153-SG-2025**
OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL – LOTE 5**
CONTRATISTA	**CUBINGECOL INGENIERIA YCUBIERTAS SAS**
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	**CONSTRUCTORA GILLI SAS**
FRENTE DE OBRA	**SEDE REGIONAL MEDICINA LEGAL - LOTE 5 - PEREIRA, RISARALDA**

ÍTEM Nº	**11.4.12**	UND:	UND
DESCRIPCIÓN ÍTEM	Traslado y reinstalación de cabina con su tablero de control y base VER ANEXO TÉCNICO		
CORTE Nº:	01	FECHA :	24/03/2026

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

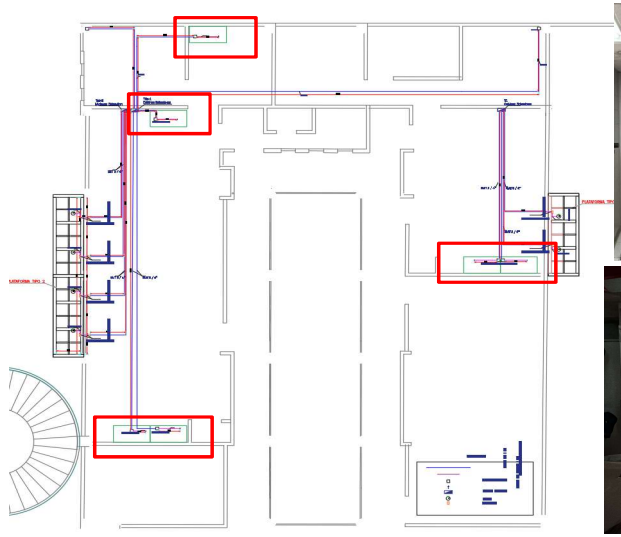













UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
CABINAS - LAB TOXICOLOGIA					3,00	3,00
CABINAS - NEVERAS TOXICOLOGIA 2					1,00	1,00
CABINAS - LAB. ESTUPEFACIENTES					2,00	2,00
					CANTIDAD CONTRACTUAL	**6,00**
					CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA - ACTAS ANTERIORES	**0,00**
					CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACTA PARCIAL No. 1	**6,00**
					CANTIDAD ACOMULADA EJECUTADA	**0,00**
					POR EJECUTAR	**0,00**

Elaboró::

Juan Felipe Gonzalez P.
Firma

Residente de Obra
Firma y Posfirma :ING. Juan Felipe Gonzalez Pacheco


VoBo:

Interventor del contrato: ING Maria Paula Rivera
Firma y Posfirma:

	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORESES	**Código**	
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	**Versión**	
		Vigencia	**10/10/2024**

CONTRATO No.	**CTO 153-SG-2025**
OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL – LOTE 5**
CONTRATISTA	**CUBINGECOL INGENIERIA YCUBIERTAS SAS**
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	**CONSTRUCTORA GILLI SAS**
FRENTE DE OBRA	**SEDE REGIONAL MEDICINA LEGAL - LOTE 5 - PEREIRA, RISARALDA**
ÍTEM Nº **11.5.6**	UND: UND
DESCRIPCIÓN ÍTEM	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida para iluminación; VER ANEXO TECNICO
CORTE Nº: 01	FECHA : 24/03/2026

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

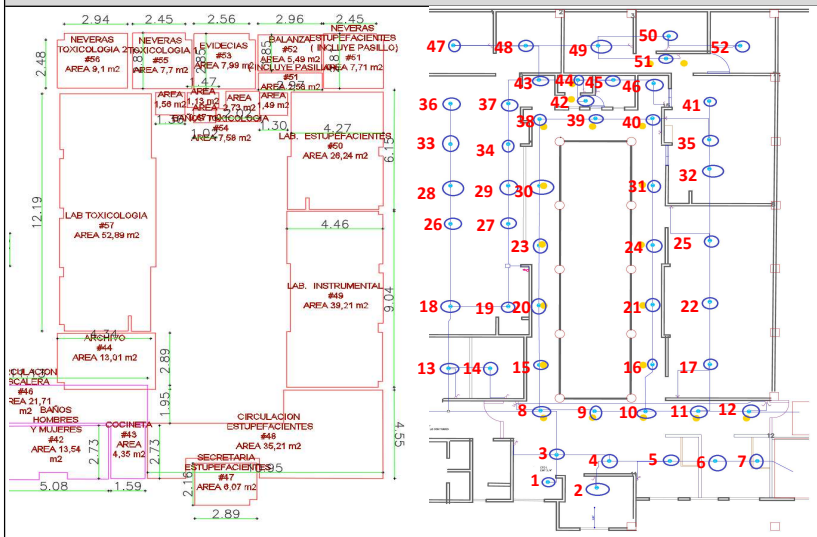



UBICACIÓN	DIMENSIONES Ancho	DIMENSIONES Longitud	DIMENSIONES Altura	MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
ARCHIVO					2,00	2,00
SECRETARIA ESTUPEFACIENTES					1,00	1,00
CIRCULACION ESTUPEFACIENTES					11,00	11,00
INSTRUMENTAL					3,00	3,00
LAB. ESTUPEFACIENTES					3,00	3,00
NEVERAS ESTUPEFACIENTES (INCLUYE PASILLO)					2,00	2,00
BALANZA					1,00	1,00
EVIDENCIAS					1,00	1,00
BAÑOS TOXICOLOGIA					5,00	5,00
NEVERAS TOXICOLOGIA 1					1,00	1,00
NEVERAS TOXICOLOGIA 2					1,00	1,00
LAB TOXICOLOGIA					10,00	10,00
CIRCULACION ESTUPEFACIENTES - TOXICOLOGIA					11,00	11,00
				CANTIDAD CONTRACTUAL		**100,00**

CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA - ACTAS ANTERIORES	**0,00**
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACTA PARCIAL No. 1	**52,00**
CANTIDAD ACOMULADA EJECUTADA	**0,00**
POR EJECUTAR	**48,00**

Elaboró::

Juan Felipe Gonzalez P.
Firma

Residente de Obra
Firma y Posfirma :ING. Juan Felipe Gonzalez Pacheco

VoBo:


Interventor del contrato: ING Maria Paula Rivera
Firma y Posfirma:


	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORESES	Código	
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	
		Vigencia	10/10/2024

CONTRATO No.	**CTO 153-SG-2025**
OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL – LOTE 5**
CONTRATISTA	**CUBINGECOL INGENIERIA YCUBIERTAS SAS**
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	**CONSTRUCTORA GILLI SAS**
FRENTE DE OBRA	**SEDE REGIONAL MEDICINA LEGAL - LOTE 5 - PEREIRA, RISARALDA**
ÍTEM Nº	**11.6.2** — UND: M
DESCRIPCIÓN ÍTEM	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tuberia conduit EMT de 3/4" VER ANEXO TÉCNICO
CORTE Nº:	01 — FECHA : 24/03/2026

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



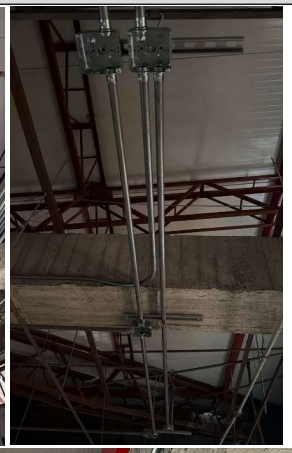

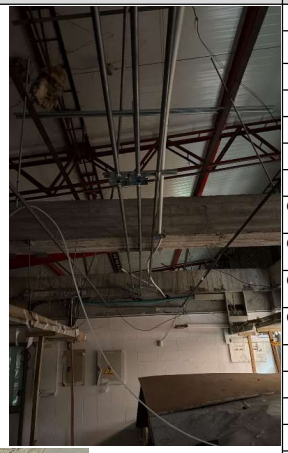



UBICACIÓN	DIMENSIONES Ancho	Longitud	Altura	MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
CIRCULACION ESTUPEFACIENTES		8,54			1,00	8,54
LAB INSTRUMENTAL Y LAB. ESTUPEFACIENTES		14,38			1,00	14,38
BAÑOS TOXICOLIGIA		4,68			1,00	4,68
LAB TOXICOLOGIA		9,36			1,00	9,36
LAB TOXICOLOGIA		9,30			1,00	9,30
LAB TOXICOLOGIA		2,28			1,00	2,28
LAB TOXICOLOGIA		0,74			1,00	0,74
CORREDOR CIRCULACION ESTUPEFACIENTES - TOXICOLOGIA		13,48			1,00	13,48
CORREDOR CIRCULACION ESTUPEFACIENTES - TOXICOLOGIA		11,82			1,00	11,82
CORREDOR CIRCULACION ESTUPEFACIENTES - TOXICOLOGIA		9,56			1,00	9,56
CORREDOR CIRCULACION ESTUPEFACIENTES - TOXICOLOGIA		0,86			1,00	0,86

CANTIDAD CONTRACTUAL	**85,00**
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA - ACTAS ANTERIORES	**0,00**
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA ACTA PARCIAL No. 1	**85,00**
CANTIDAD ACOMULADA EJECUTADA	**0,00**
POR EJECUTAR	**0,00**

Elaboró::

Juan Felipe Gonzalez P.
Firma

Residente de Obra
Firma y Posfirma :ING. Juan Felipe Gonzalez Pacheco


VoBo:

Interventor del contrato: ING Maria Paula Rivera
Firma y Posfirma:

	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORESES	**Código**	
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	**Versión**	
		Vigencia	**10/10/2024**

CONTRATO No.	**CTO 153-SG-2025**		
OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL – LOTE 5**		
CONTRATISTA	**CUBINGECOL INGENIERIA YCUBIERTAS SAS**		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	**CONSTRUCTORA GILLI SAS**		
FRENTE DE OBRA	**SEDE REGIONAL MEDICINA LEGAL - LOTE 5 - PEREIRA, RISARALDA**		
ÍTEM Nº	**11.6.2**	UND:	M
DESCRIPCIÓN ÍTEM	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tuberia conduit EMT de 3/4" VER ANEXO TÉCNICO		
CORTE Nº:	01	FECHA :	24/03/2026

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

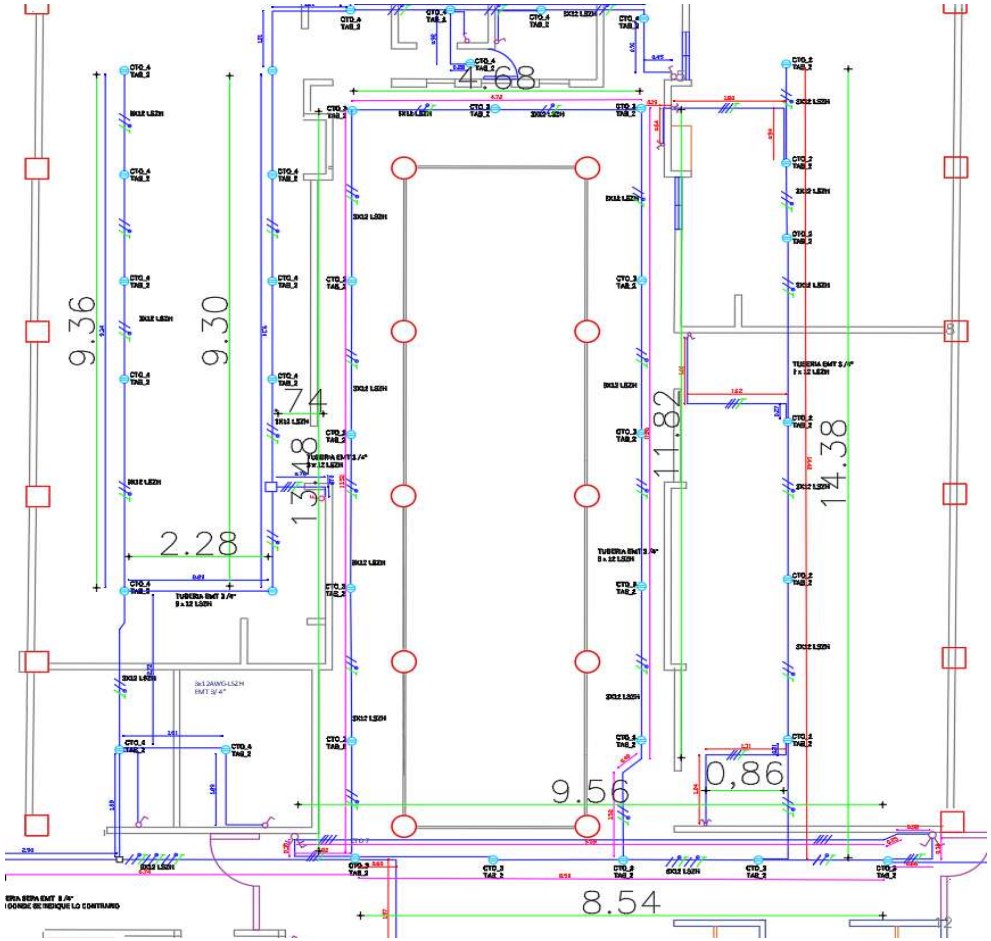

Elaboró::

Residente de Obra
Firma y Posfirma :ING. Juan Felipe Gonzalez Pacheco

VoBo:


Interventor del contrato: ING Maria Paula Rivera
Firma y Posfirma:

	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORESES	**Código**	
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	**Versión**	
		Vigencia	**10/10/2024**

CONTRATO No.	**CTO 153-SG-2025**
OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL – LOTE 5**
CONTRATISTA	**CUBINGECOL INGENIERIA YCUBIERTAS SAS**
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	**CONSTRUCTORA GILLI SAS**
FRENTE DE OBRA	**SEDE REGIONAL MEDICINA LEGAL - LOTE 5 - PEREIRA, RISARALDA**

ÍTEM Nº	**11.6.6**	UND:	UND
DESCRIPCIÓN ÍTEM	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de conduleta LR o LL VER ANEXO TÉCNICO		
CORTE Nº:	01	FECHA :	24/03/2026

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

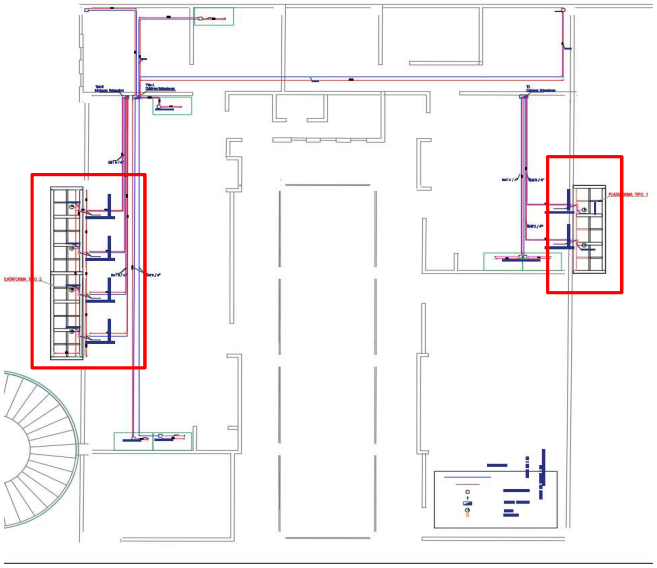






UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
LAB TOXICOLOGIA					4,00	4,00
LAB. ESTUPEFACIENTES					2,00	2,00


	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORESES	**Código**	
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	**Versión**	
		Vigencia	**10/10/2024**


CONTRATO No.	**CTO 153-SG-2025**
OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL – LOTE 5**
CONTRATISTA	**CUBINGECOL INGENIERIA YCUBIERTAS SAS**
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	**CONSTRUCTORA GILLI SAS**
FRENTE DE OBRA	**SEDE REGIONAL MEDICINA LEGAL - LOTE 5 - PEREIRA, RISARALDA**

ÍTEM Nº	**11.7.7**	UND:	M
DESCRIPCIÓN ÍTEM	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tuberia conduit EMT de 3/4" VER ANEXO TÉCNICO		
CORTE Nº:	01	FECHA :	24/03/2026

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

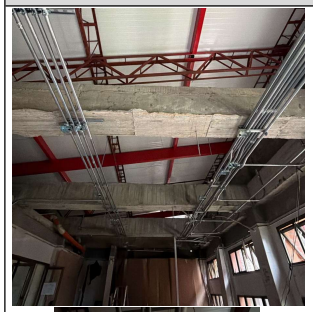



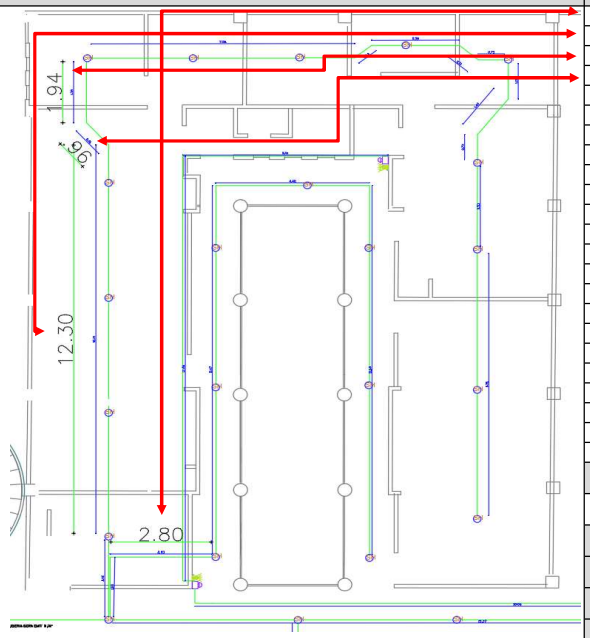

UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
ARCHIVO		2,80			1,00	2,80
LAB TOXICOLOGIA		12,30			1,00	12,30
LAB TOXICOLOGIA		1,94			1,00	1,94
LAB TOXICOLOGIA		0,96			1,00	0,96
