ACTA No. 20260519			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Seguimiento de la ejecución del objeto contractual del contrato No. CO1.PCCNTR.8718690 DE 2025			
CIUDAD Y FECHA:	**Ibagué, 19 de mayo de 2026**	**HORA INICIO:** 10:00	**HORA FIN:** 11:00
LUGAR Y/O ENLACE:	**Nave 2 primer piso**	**DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:** **Regional Tolima / Centro de Industria y Construcción**	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: 1. Avance de actividades del contrato No. CO1.PCCNTR.8718690 DE 2025			
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: 1. Evidenciar el avance de la ejecución del objeto del contrato del contrato No. CO1.PCCNTR.8718690 DE 2025			
DESARROLLO DE LA REUNIÓN			

1. Avance de actividades del contrato No. CO1.PCCNTR.8718690 DE 2025

Se reúnen en el ambiente de formación de la nave 2 del primer piso el contratista **Oscar Vargas Aguja** y el supervisor del contrato, **Arnulfo Rodríguez**, con el fin de establecer el avance de las actividades del contrato, de la siguiente manera:

Los equipos relacionados en el contrato, destinados al ensamble y ensayo de paneles solares, han sido suministrados en su totalidad. Actualmente, se encuentran en las instalaciones del SENA y han sido energizados para su verificación por parte del personal del Consorcio SENA–IAP, de acuerdo con el cronograma de actividades establecido


UNSPSC – Decreto 1082 de 2015 (o norma vigente)						
ÍTEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	DENOMINACION (Clase o producto)	ESPECIFICACION TECNICA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
1	C - Maquinaria, herramientas, equipo industrial y vehiculos	23153204	Robots de soldadura	Máquina de soldadura automática para celdas solares. Modelo: SS1500	1	Unidad
2	C - Maquinaria, herramientas, equipo industrial y vehiculos	23153203	Robots de sellado adhesivo	Laminador automático para panel solar serie OTCY-2615	1	Unidad
3	C - Maquinaria, herramientas, equipo industrial y vehiculos	23153100	Componentes y accesorios de maquinaria industrial	Maquina automática cortadora laser de celdas solares Modelo: OLS-20A.	1	Unidad
4	D - Componentes y suministros	41111917	Probadores digitales	Probador de celdas solares 12BB (OTCT-A)	1	Unidad
5	D - Componentes y suministros	41111917	Probadores digitales	Probador de paneles solares Modelo: OTMT-A	1	Unidad
6	D - Componentes y suministros	41111917	Probadores digitales	Probador de defectos EL semiautomático para panel solar. Modelo: OEL-S2400	1	Unidad
7	C - Maquinaria, herramientas, equipo industrial y vehiculos	23153100	Componentes y accesorios de maquinaria industrial	Máquina enmarcadora de paneles solares semiautomática (OZK-A).	1	Unidad
8	C - Maquinaria, herramientas, equipo industrial y vehiculos	23153100	Componentes y accesorios de maquinaria industrial	Estacion de soldadura para celdas solares (3 puestos de trabajo)	1	Unidad

9	C - Maquinaria, herramientas, equipo industrial y vehiculos	23153100	Componentes y accesorios de maquinaria industrial	Estacion Lay Up material aluminio	1	Unidad
10	C - Maquinaria, herramientas, equipo industrial y vehiculos	23153100	Componentes y accesorios de maquinaria industrial	Cortadora manual EVA/TPT	1	Unidad
11	C - Maquinaria, herramientas, equipo industrial y vehiculos	24112007	Estante para el manejo de material	Transportador (estante) modulos vidrio/solar	2	Unidad
12	C - Maquinaria, herramientas, equipo industrial y vehiculos	24112007	Estante para el manejo de material	Transportador (estante) de material de produccion	2	Unidad
13	C - Maquinaria, herramientas, equipo industrial y vehiculos	24112007	Estante para el manejo de material	Transportador de celdas solares	2	Unidad

Actividad	Fecha inicial	Fecha final
Producción / fabricación de maquinas y equipos.	1-ene-26	14-feb-26
Proceso logístico despacho y transporte desde China a Colombia (desde puerto de Wuhan a puerto de Buenaventura Colombia).	15-feb-26	31-mar-26
Nacionalización de Mercancía.	1-abr-26	15-abr-26
Transporte de mercancias desede puerto de Buenaventura al Centro de Industria y la Construccion - CIC.	16-abr-26	20-abr-26
Descarge y puesta en sitio según plano disctibución en planta del sitio asignado por CIC.	21-abr-26	25-abr-26
Montaje de sistema de red electrica de alimentacion de maquinas y equipos.	26-abr-26	30-abr-26
Montaje sistema red neumatica y conexion maquina y equipos.	1-may-26	10-may-26
Encendido de maquinas y equipos .	11-may-26	15-may-26
Puesta a punto de maquinas y equipos.	16-may-26	20-may-26

De acuerdo con el cronograma de actividades presentado por el Consorcio SENA–IAP, las actividades ejecutadas se encuentran acordes con la programación establecida. A la fecha, los equipos ya se encuentran debidamente energizados y se están realizando los respectivos

ajustes, pruebas y calibraciones. A continuación, se adjuntan las evidencias fotográficas correspondientes

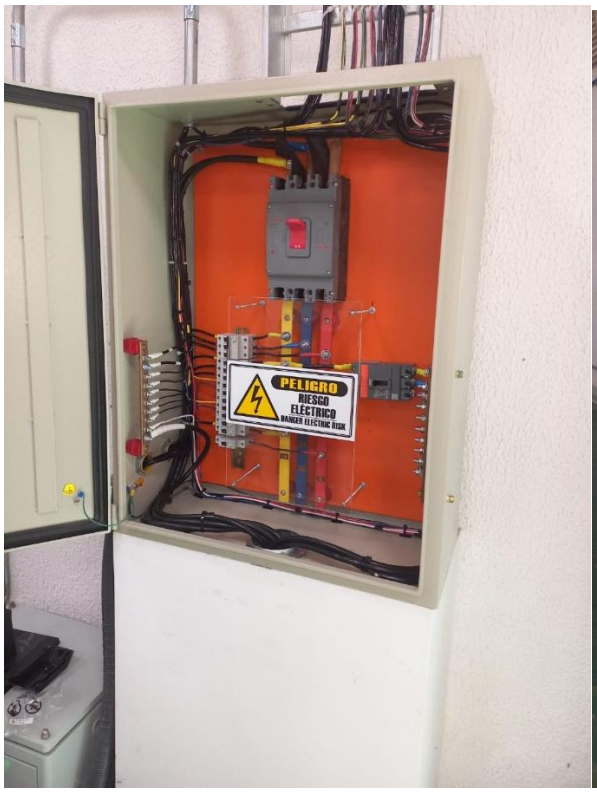








ooitech


ooitech


ooitech


ooitech


ooitech









Adicionalmente, se resalta la necesidad de disponer de un sistema de aire comprimido para el adecuado funcionamiento de los equipos, dado que, de no contar con este recurso, no es posible desarrollar las actividades programadas en el cronograma.

CONCLUSIONES

Las actividades del contrato No. CO1.PCCNTR.8718690 DE 2025 se han desarrollado cumpliendo las obligaciones del contratista y en los tiempos establecidos hasta la fecha de esta acta. No se han presentado novedades que impidan o afecten el buen desarrollo del objeto contractual.

Puntualizando la información, se tiene:

- Los equipos han sido entregados, instalados y energizados conforme al cronograma.

• Se evidencia avance en las actividades de pruebas y calibración. • Se identifica la necesidad de garantizar el suministro de aire comprimido para la correcta operación de los equipos.			
ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS			
ACTIVIDAD /DECISIÓN	**FECHA**	**RESPONSABLE**	**FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL**
Ejercer las funciones de supervisión de acuerdo con Manual de supervisión e interventoría adoptado por el SENA	Vigencia del contrato No. CO1.PCCNTR.8718690 DE 2025	Arnulfo Rodríguez Gongora	
Ejecutar el objeto contractual cumpliendo las condiciones establecidas en el contrato No. CO1.PCCNTR.8718690 DE 2025, en los plazos correspondientes	Vigencia del contrato No. CO1.PCCNTR.8718690 DE 2025	Oscar Vargas Aguja	VARGAS AGUJA OSCAR FERNEY Firmado digitalmente por VARGAS AGUJA OSCAR FERNEY Fecha: 2026.05.22 14:41:07 -05'00'

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES				
NOMBRE	**DEPENDENCIA / EMPRESA**	**APRUEBA (SI/NO)**	**OBSERVACIÓN**	**FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL**

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ANEXOS
