INFORME
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

PERIODO DEL INFORME:
12 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 11 DE FEBRERO DE 2026

CONTRATO DE OBRA
Nº. 320.11.053-2025

OBJETO
OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS AEROPUERTO, TRIUNFO, ENCANTO, HORQUETON Y CARACOLI DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE.

CONTRATISTA
CONSORCIO MACRO

SUPERVISOR
OSCAR HERNANDO FRANCO MEJÍA
GERENCIA

VILLANUEVA, CASANARE
28 DE MAYO DE 2026

INTRODUCCION

La ESPAVI S.A E.S.P contrato con el CONSORCIO MACRO las labores asociadas con el la optimización y mantenimiento del sistema de acueducto de las veredas aeropuerto, triunfo, encanto, horqueton y caracoli , para desarrollar las actividades enmarcadas dentro del contrato No. 320.11.053.2025 que tiene como objeto "OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS AEROPUERTO, TRIUNFO, ENCANTO, HORQUETON Y CARACOLI DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE." con Acta de inicio firmado a los doce (12) días del mes de diciembre del año 2025.

El presente corresponde al informe de supervisión final, en donde se relacionan todas las actividades realizadas en el periodo de tiempo comprendido del 12 de diciembre de 2025 al 11 de mayo de 2026 por parte del contratista en cumplimiento del alcance contractual del contrato del Contrato No. 320.11.053-2025.

INFORME DE SUPERVISIÓN

1. INFORMACION GENERAL

INFORMACION DEL CONTRATO

CONTRATO No.	320.11.053-2025
OBJETO	OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS AEROPUERTO, TRIUNFO, ENCANTO, HORQUETON Y CARACOLI DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE.
CONTRATANTE	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A E.S.P
CONTRATISTA	CONSORCIO MACRO
NIT.	902.013.398-4
REPRESENTANTE LEGAL	LAURA CAMILA MONDRAGÓN MARTÍNEZ
FECHA DE INICIO	12-12-2025
FECHA DE TERMINACION	11-03-2026
PLAZO DE EJECUCION INICIAL	TRES (03) MESES
PLAZO DE ADICIONAL EN TIEMPO 1	UN (01) MES
PLAZO DE ADICIONAL EN TIEMPO 2	UN (01) MES
VALOR INICIAL	$ 729.130.856,00
VALOR ANTICIPO	0,00
VALOR ADICIONAL	$ 229.083.450,00
VALOR FINAL	$ 958.214.306,00
FORMA DE PAGO	La Empresa de Servicios Públicos de Villanueva ESPAVI S.A. E.S.P., cancelara el valor del contrato al contratista de la siguiente manera: a) Pagos parciales de acuerdo al avance de la obra: se efectuara tomando como base el avance de las obras cuyo valor a definir es el resultado de multiplicar el valor de la obra a la fecha a liquidar, liquidadas por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste previa presentación de la factura o cuenta de cobro, debidamente aprobada por la supervisión y elaborada de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas y a los precios unitarios pactados para la ejecución del contrato. El primer pago parcial se realizará al cumplimiento de un 30% de avance de ejecución de obra, previa presentación del informe parcial en

	medio físico y magnético de acuerdo con los lineamientos establecidos por ESPAVI para presentación de informes de obra y anexando soportes de pago de aportes a seguridad social y para fiscales, así como pago de nómina y paz y salvo con el personal utilizado en el periodo a reportar y demás soportes que se consideren relevantes. La suma total de los pagos parciales no podrá exceder el ochenta por ciento (80%) del valor total del contrato. b) Pago final a la liquidación del contrato: correspondiente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, y será desembolsado previa aprobación de la supervisión de obra, para lo cual se requerirá que el contratista cumpla con los siguientes requisitos: informe final en medio físico y magnéticos con los soportes de pago, pago de aportes a seguridad social y para fiscales así como pago de nómina y paz y salvo con el personal utilizado en durante la ejecución del contrato, actualización de la garantía única, entrega de memorias de cantidades, planos, manual de operaciones, fichas técnicas de equipos, garantías de equipos, paz y salvo de proveedores, informe de imprevistos, aprobación y vigencia contractual y pos contractual de las pólizas y demás soportes que se consideren relevantes. El contratista deberá presentar para el trámite de sus cuentas la factura de venta en original y copia, la cual debe cumplir como mínimo, los requisitos establecidos en el artículo 617 del estatuto tributario. Todos los documentos de pago deberán ser avalados por el Supervisor designado el cual será contratado por la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA ESPAVI S.A. E.S.P.

2. INFORME ADMINISTRATIVO

2.1 POLIZAS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Para la ejecución del contrato de obra No. 320.11.053-2025, CONSORCIO MACRO cuenta con todas sus pólizas vigentes expedidas por la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA., las cuales generan las garantías a la ejecución del proyecto.

(ANEXO 0)									
Ítem	No. Póliza	Amparo	Valor	Desde			Hasta		
				D	M	A	D	M	A
1		Cumplimiento	$ 72,913,085,60	05	12	2025	10	09	2026

2	625-47-994000004539	Salarios y prestaciones sociales	$ 72,913,085,60	05	12	2025	10	03	2029
3		Estabilidad y calidad de la obra	$ 145,826,171,20						
4		Calidad del servicio	$ 109,369,628,40	05	12	2025	10	03	2027
5		Calidad del bien	$ 109,369,628,40	05	12	2025	10	03	2027
1	625-74-994000001701	Predios, labores y operaciones	$284,700,000,00	05	12	2025	10	03	2026
2		Contratistas y subcontratistas	$284,700,000,00	05	12	2025	10	03	2026
3		Productos trabajados y operaciones terminadas	$284,700,000,00	05	12	2025	10	03	2026
4		Bienes bajo cuidado o tenencia y control	$284,700,000,00	05	12	2025	10	03	2026
5		RCE Patronal	$284,700,000,00	05	12	2025	10	03	2026
6		Vehiculos propios y no propios	$284,700,000,00	05	12	2025	10	03	2026
7		Contaminación	$284,700,000,00	05	12	2025	10	03	2026
8		Gastos médicos	$284,700,000,00	05	12	2025	10	03	2026
9		Responsabilidad civil cruzada	$284,700,000,00	05	12	2025	10	03	2026

(ANEXO 1)									
Ítem	No. Póliza	Amparo	Valor	Desde			Hasta		
				D	M	A	D	M	A

1	625-47-994000004539	Cumplimiento	$ 95,821,430.60	05	12	2025	10	09	2026
2		Salarios y prestaciones sociales	$ 95,821,430.60	05	12	2025	10	03	2029
3		Estabilidad y calidad de la obra	$ 191,642,861.20						
4		Calidad del servicio	$ 143,732,145.90	05	12	2025	10	03	2027
5		Calidad del bien	$ 143,732,145.90	05	12	2025	10	03	2027
1	625-74-994000001701	Predios, labores y operaciones	$350,181,000.00	05	12	2025	10	03	2026
2		Contratistas y subcontratistas	$350,181,000.00	05	12	2025	10	03	2026
3		Productos trabajados y operaciones terminadas	$350,181,000.00	05	12	2025	10	03	2026
4		Bienes bajo cuidado o tenencia y control	$350,181,000.00	05	12	2025	10	03	2026
5		RCE Patronal	$350,181,000.00	05	12	2025	10	03	2026
6		Vehiculos propios y no propios	$350,181,000.00	05	12	2025	10	03	2026
7		Contaminación	$350,181,000.00	05	12	2025	10	03	2026
8		Gastos médicos	$350,181,000.00	05	12	2025	10	03	2026
9		Responsabilidad civil cruzada	$350,181,000.00	05	12	2025	10	03	2026

(ANEXO 2)

Ítem	No. Póliza	Amparo	Valor	Desde			Hasta		
				D	M	A	D	M	A
1	625-47-994000004539	Cumplimiento	$ 95,821,430,60	05	12	2025	10	10	2026
2		Salarios y prestaciones sociales	$ 95,821,430,60	05	12	2025	10	04	2029
3		Estabilidad y calidad de la obra	$ 191,642,861,20						
4		Calidad del servicio	$ 143,732,145,90	05	12	2025	10	04	2027
5		Calidad del bien	$ 143,732,145,90	05	12	2025	10	04	2027
1	625-74-994000001701	Predios, labores y operaciones	$ 350,181,000,00	10	03	2026	10	04	2026
2		Contratistas y subcontratistas	$ 350,181,000,00	10	03	2026	10	04	2026
3		Productos trabajados y operaciones terminadas	$ 350,181,000,00	10	03	2026	10	04	2026
4		Bienes bajo cuidado o tenencia y control	$ 350,181,000,00	10	03	2026	10	04	2026
5		RCE Patronal	$ 350,181,000,00	10	03	2026	10	04	2026
6		Vehículos propios y no propios	$ 350,181,000,00	10	03	2026	10	04	2026
7		Contaminación	$ 350,181,000,00	10	03	2026	10	04	2026
8		Gastos médicos	$ 350,181,000,00	10	03	2026	10	04	2026
9		Responsabilidad civil cruzada	$ 350,181,000,00	10	03	2026	10	04	2026

(ANEXO 3)

Ítem	No. Póliza	Amparo	Valor	Desde			Hasta		
				D	M	A	D	M	A
1		Cumplimiento	$ 95,821,430,60	05	12	2025	10	11	2026

No.	Planilla No.	Nombres	C.c.	Cargo	AFP	EPS	ARL
1	9497129876	Laura Camila Mondragón Martinez	1.118.196.404	R/L	PORVENIR	ALIANSALUD	POSITIVA
11	9497129876	Edgar Fernando Cubides	1.118.203.780	Ayudante de obra	PORVENIR	NUEVA EPS	POSITIVA
12	9497129876	José Santiago Galán Riapira	1.129.244.334	Ayudante de obra	PORVENIR	NUEVA EPS	POSITIVA
13	9497129876	Brandon Esteban Castiblanco Sandoval	1.129.244.141	Ayudante de obra	PORVENIR	NUEVA EPS	POSITIVA
14	9497129876	Carlos Andrés Garcia Amaya	1.124.990.933	Ayudante de obra	PORVENIR	NUEVA EPS	POSITIVA
15	9497129876	Juan Guillermo Caro Vega	1.129.244.201	Ayudante de obra	PORVENIR	SALUD TOTAL	POSITIVA
16	9497129876	Nicolas Medina Montaña	1.118.535.282	Ayudante de obra	PORVENIR	NUEVA EPS	POSITIVA

MES ENERO 2026 – FEBRERO 2026

No.	Planilla No.	Nombres	C.c.	Cargo	AFP	EPS	ARL
1	9499237929	Laura Camila Mondragón Martinez	1.118.196.404	R/L	PORVENIR	ALIANSALUD	POSITIVA
2	9499237929	Juan Ramon Bulla Neira	7.061.622	Residente de Obra	PORVENIR	NUEVA EPS	POSITIVA
3	9499237929	Carlos Eduardo Amaya Aguirre	1.118.197.251	Profesional SISO	PORVENIR	NUEVA EPS	POSITIVA
4	9499237929	Ronaldo Antonio Uyaban	7.361.738	Oficial de Obra	PORVENIR	SANITAS	POSITIVA
5	9499237929	Borda Bohorquez Miguel Ángel	1.050.605.322	Ayudante de obra	PORVENIR	CAPRESOCA	POSITIVA
6	9499237929	Cesar Augusto Escobar Páez	1.006.534.792	Ayudante de obra	PORVENIR	SANITAS	POSITIVA

2	625-47-994000004539	Salarios y prestaciones sociales	$ 95,821,430,60	05	12	2025	10	05	2029
3		Estabilidad y calidad de la obra	$ 191,642,861,20						
4		Calidad del servicio	$ 143,732,145,90	05	12	2025	10	05	2027
5		Calidad del bien	$ 143,732,145,90	05	12	2025	10	05	2027
1	625-74-994000001701	Predios, labores y operaciones	$ 350,181,000,00	10	04	2026	10	05	2026
2		Contratistas y subcontratistas	$ 350,181,000,00	10	04	2026	10	05	2026
3		Productos trabajados y operaciones terminadas	$ 350,181,000,00	10	04	2026	10	05	2026
4		Bienes bajo cuidado o tenencia y control	$ 350,181,000,00	10	04	2026	10	05	2026
5		RCE Patronal	$ 350,181,000,00	10	04	2026	10	05	2026
6		Vehiculos propios y no propios	$ 350,181,000,00	10	04	2026	10	05	2026
7		Contaminación	$ 350,181,000,00	10	04	2026	10	05	2026
8		Gastos médicos	$ 350,181,000,00	10	04	2026	10	05	2026
9		Responsabilidad civil cruzada	$ 350,181,000,00	10	04	2026	10	05	2026

2.2 SOPORTES DE PAGO AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

El consorcio Macro identificado con Nit. 902.013.398-4 realizó los siguientes Pagos al sistema integral de seguridad social y al sistema general de riesgos laborales con los siguientes números de planilla, anexo al presente se adjunta el certificado de pago de los trabajadores.

PERSONAL AFILIADO

MES DICIEMBRE 2025 – ENERO 2026

No.	Planilla No.	Nombres	C.c.	Cargo	AFP	EPS	ARL
1	9497129876	Laura Camila Mondragón Martinez	1.118.196.404	R/L	PORVENIR	ALIANSALUD	POSITIVA
2	9497129876	Juan Ramon Bulla Neira	7.061.622	Residente de Obra	PORVENIR	NUEVA EPS	POSITIVA
3	9497129876	Carlos Eduardo Amaya Aguirre	1.118.197.251	Profesional SISO	PORVENIR	NUEVA EPS	POSITIVA
4	9497129876	Ronaldo Antonio Uyaban	7.361.738	Oficial de Obra	PORVENIR	SANITAS	POSITIVA
5	9497129876	Eliecer Smith Cepeda Rodriguez	1.057.462.567	Ayudante de obra	PORVENIR	NUEVA EPS	POSITIVA
6	9497129876	Cesar Augusto Escobar Páez	1.006.534.792	Ayudante de obra	PORVENIR	SANITAS	POSITIVA
7	9497129876	Daniel Santiago Uyaban Vaneges	1.006.533.965	Ayudante de obra	PORVENIR	SANITAS	POSITIVA
8	9497129876	José Alexander Salamanca Bulla	1.129.244.182	Ayudante de obra	PORVENIR	NUEVA EPS	POSITIVA
9	9497129876	Diego Alejandro Bautista Jiménez	1.118.168.856	Ayudante de obra	PORVENIR	NUEVA EPS	POSITIVA
10	9497129876	Kevin Sebastián Montenegro	1.049.794.255	Ayudante de obra	PORVENIR	NUEVA EPS	POSITIVA

No.	Planilla No.	Nombres	C.c.	Cargo	AFP	EPS	ARL
1	9499237929	Laura Camila Mondragón Martínez	1.118.196.404	R/L	PORVENIR	ALIANSALUD	POSITIVA
7	9499237929	Daniel Santiago Uyaban Vanegas	1.006.533.965	Ayudante de obra	PORVENIR	SANITAS	POSITIVA
8	9499237929	Edgar Fernando Cubides	1.118.203.780	Ayudante de obra	PORVENIR	NUEVA EPS	POSITIVA
9	9499237929	José Santiago Galán Riapira	1.129.244.334	Ayudante de obra	PORVENIR	NUEVA EPS	POSITIVA
10	9499237929	Juan Guillermo Caro Vega	1.129.244.201	Ayudante de obra	PORVENIR	SALUD TOTAL	POSITIVA

MES FEBRERO 2026 – MARZO 2026

No.	Planilla No.	Nombres	C.c.	Cargo	AFP	EPS	ARL
1	9501251034	Laura Camila Mondragón Martínez	1.118.196.404	R/L	PORVENIR	ALIANSALUD	POSITIVA
2	9501251034	Juan Ramon Bulla Neira	7.061.622	Residente de Obra	PORVENIR	NUEVA EPS	POSITIVA
3	9501251034	Carlos Eduardo Amaya Aguirre	1.118.197.251	Profesional SISO	PORVENIR	NUEVA EPS	POSITIVA
4	9501251034	Ronaldo Antonio Uyaban	7.361.738	Oficial de Obra	PORVENIR	SANITAS	POSITIVA
7	9501251034	Daniel Santiago Uyaban Vanegas	1.006.533.965	Ayudante de obra	PORVENIR	SANITAS	POSITIVA
8	9501251034	Edgar Fernando Cubides	1.118.203.780	Ayudante de obra	PORVENIR	NUEVA EPS	POSITIVA
10	9501251034	Juan Guillermo Caro Vega	1.129.244.201	Ayudante de obra	PORVENIR	SALUD TOTAL	POSITIVA

MES MARZO 2026 – ABRIL 2026

No.	Planilla No.	Nombres	C.c.	Cargo	AFP	EPS	ARL
1	9504688444	Laura Camila Mondragón Martinez	1.118.196.404	R/L	PORVENIR	ALIANSALUD	POSITIVA
2	9504688444	Juan Ramon Bulla Neira	7.061.622	Residente de Obra	PORVENIR	NUEVA EPS	POSITIVA
3	9504688444	Carlos Eduardo Amaya Aguirre	1.118.197.251	Profesional SISO	PORVENIR	NUEVA EPS	POSITIVA
4	9504688444	Ronaldo Antonio Uyaban	7.361.738	Oficial de Obra	PORVENIR	SANITAS	POSITIVA
7	9504688444	Daniel Santiago Uyaban Vanegas	1.006.533.965	Ayudante de obra	PORVENIR	SANITAS	POSITIVA

MES ABRIL 2026 – MAYO 2026

PLANILLA ABRIL 2026 - MAYO 2026							
No.	Planilla No.	Nombres	C.c.	Cargo	AFP	EPS	ARL
1	9504688359	Laura Camila Mondragón Martinez	1.118.196.404	R/L	PORVENIR	ALIANSALUD	POSITIVA
2	9504688359	Juan Ramon Bulla Neira	7.061.622	Residente de Obra	PORVENIR	NUEVA EPS	POSITIVA
3	9504688359	Carlos Eduardo Amaya Aguirre	1.118.197.251	Profesional SISO	PORVENIR	NUEVA EPS	POSITIVA
7	9504688359	Daniel Santiago Uyaban Vanegas	1.006.533.965	Ayudante de obra	PORVENIR	SANITAS	POSITIVA

INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Por parte de la presente supervisión se verifico en todo momento que El Consorcio Macro realizará las actividades cumpliendo los lineamientos en cuanto a términos de seguridad se refiere, verificando que se cumpliera con las buenas prácticas de seguridad y salud en el trabajo, garantizando asi, la seguridad de los trabajadores, peatones y vehiculos. De igual

manera se verifico que el personal estuviera dotado con el adecuado equipo de protección personal, el cual se menciona a continuación.

- ✓ Casco de seguridad
- ✓ Gafas de protección ocular
- ✓ Guantes de seguridad
- ✓ Zapatos o botas de protección para obra civil
- ✓ Ropa de trabajo (camisa manga larga y pantalón de jean)

2.4 CORRESPONDENCIA (ENVIADA Y RECIBIDA)

Durante la ejecución del contrato de obra, no se envió ni recibió correspondencia entre el contratista y la presente supervisión, todas las comunicaciones se realizaron de manera verbal y mediante llamadas telefónicas.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

FECHA	ENTIDAD Y/O PERSONA QUE RADICA EL OFICIO Y/O SOLICITUD	MEDIO DE RECIBO (Correo Electrónico o medio físico)	DESCRIPCIÓN	No. DE OFICIO DE ENVIO
-	-	-	-	-

CORRESPONDENCIA ENVIADA

OFICIO No.	FECHA	ENTIDAD Y/ PERSONA A QUIEN VA DIRIGIDO EL OFICIO	SOLICITUD	PETICIÓN	QUEJA	RECLAMO	SUGERENCIAS	DESCRIPCIÓN	MEDIO DE ENVIO (Correo Electrónico o medio físico)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. DESARROLLO DEL INFORME DE ACTIVIDADES

3.1 INFORME DE ACTIVIDADES

En el marco del contrato No 320.11.053-2025, a continuación, se presenta el resumen de actividades realizadas por parte del contratista durante el periodo comprendido desde el 12

de diciembre de 2025 al 11 de mayo de 2026. Para tal efecto, se relacionan las actividades adelantadas.

ITEM	1.01
ACTIVIDAD	Replanteo y localización para arquitectura, sobre terreno.
DESCRIPCION	Durante la supervisión de la actividad se verificó la ejecución de la localización y replanteo para la construcción del cuarto de tableros y la bodega proyectados en el área de dosificación y tratamiento del agua, previo al almacenamiento en el tanque superficial. Se constató en campo la definición de ejes, niveles y áreas de intervención conforme a lo establecido en los diseños y especificaciones técnicas del proyecto, como parte de las actividades preliminares requeridas para el desarrollo de la obra.

ITEM	1.02
ACTIVIDAD	Relleno con material sub base triturado tamaño máximo 2", compactado para áreas pequeñas de cimentación con transporte.
DESCRIPCION	Durante la supervisión de la actividad se verificó la instalación de material de subbase para el mejoramiento del área de fundación correspondiente al cuarto de tableros y la bodega del área de dosificación para tratamiento de agua. Se constató la colocación del material en dos capas de 25 cm de espesor cada una, de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas para la conformación y mejoramiento de la superficie de fundación previa al desarrollo de las actividades constructivas proyectadas.

ITEM	1.03
ACTIVIDAD	Concreto para solado resistencia 175 kg/cm2 - 2500 psi.
DESCRIPCION	Durante la supervisión de la actividad se verificó la instalación de concreto de limpieza en el área de fundación, así como la ejecución de la placa flotante en concreto reforzado de 3.500 psi correspondiente al cuarto de tableros y la bodega del área de dosificación. Se constató el desarrollo de la actividad conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto y de acuerdo con el proceso constructivo programado para la cimentación de la estructura.

ITEM	1.04
ACTIVIDAD	Acero de refuerzo Grado 60.

DESCRIPCION	Durante la supervisión de la actividad se verificó la instalación, corte, figurado y amarre del acero de refuerzo grado 60 destinado a la placa flotante del cuarto de tableros y la bodega del área de dosificación. Se constató la disposición del refuerzo mediante acero de ½" con separación de 20 cm en ambos sentidos, conformando doble parrilla y garantizando el recubrimiento exigido de acuerdo con la normatividad y las especificaciones técnicas establecidas para el proyecto.
ITEM	1.05
ACTIVIDAD	Concreto de 3500 Psi para placa flotante
DESCRIPCION	Durante la supervisión de la actividad se verificó la construcción de la placa flotante en concreto con resistencia de 3.500 psi, correspondiente a la cimentación del cuarto de tableros y la bodega del área de dosificación. Se constató la ejecución de la actividad conforme a las especificaciones técnicas definidas en el proyecto, garantizando las condiciones requeridas para el soporte y estabilidad de la estructura proyectada.
ITEM	1.06
ACTIVIDAD	Columna en concreto de resistencia 3500 psi
DESCRIPCION	Durante la supervisión de la actividad se verificó la construcción de 10,60 metros lineales de columnas en concreto con resistencia de 3.500 psi, reforzadas con acero grado 60, destinadas al confinamiento de los muros del cuarto de tableros y la bodega del área de dosificación. Se constató la ejecución de la actividad conforme a las especificaciones técnicas y estructurales establecidas en el proyecto, garantizando el adecuado soporte y confinamiento de la mampostería proyectada.
ITEM	1.07
ACTIVIDAD	Viga aérea concreto 3500 Psi (0.25 x 0.25 m, h= 0-3 m)
DESCRIPCION	Durante la supervisión de la actividad se verificó la construcción de 14,00 metros lineales de viga aérea en concreto con resistencia de 3.500 psi, reforzada con acero grado 60, destinada al confinamiento de los muros del cuarto de tableros y la bodega del área de dosificación. Se constató la ejecución de la actividad de conformidad con las especificaciones técnicas y estructurales establecidas en el

proyecto, garantizando la estabilidad y el adecuado confinamiento de la estructura proyectada.

ITEM	1.08
ACTIVIDAD	Andenes en concreto de resistencia 3000 Psi, espesor 0.10 m
DESCRIPCION	Durante la supervisión de la actividad se verificó la construcción del andén perimetral correspondiente a la bodega y al cuarto de tableros. Se constató que la ejecución de esta actividad se desarrolló conforme a las medidas establecidas en la memoria de cantidades y de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en el ítem contractual, garantizando su adecuada integración con las áreas proyectadas.

ITEM	1.09
ACTIVIDAD	Muro en ladrillo prensado macizo 0.12 m fachada
DESCRIPCION	Durante la supervisión de la actividad se verificó la construcción de 20,34 m² de muro en ladrillo prensado para el cerramiento del cuarto de tableros y la bodega del área de dosificación. Se constató la ejecución de la mampostería de conformidad con las dimensiones y especificaciones técnicas establecidas en el proyecto, garantizando el adecuado cerramiento y estabilidad de las áreas proyectadas.

ITEM	1.10
ACTIVIDAD	Teja en fibrocemento No. 8. Suministro e instalación
DESCRIPCION	Durante la supervisión de la actividad se verificó la construcción de la cubierta en teja de fibrocemento correspondiente a la bodega ubicada en el área de dosificación. Se constató que la ejecución de esta actividad se desarrolló de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto, garantizando la adecuada instalación y protección de la estructura proyectada.

ITEM	1.11
ACTIVIDAD	Teja tipo máster 1000 cal 26 pintada
DESCRIPCION	Durante la supervisión de la actividad se verificó la construcción de la cubierta en teja Máster 1000 correspondiente al cuarto de tableros ubicado en el área de dosificación. Se constató que la ejecución de esta actividad se realizó conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto, garantizando su adecuada instalación y

	las condiciones requeridas para la protección y funcionamiento de la estructura proyectada.
ITEM	1.12
ACTIVIDAD	Correa metálica en perfil estructural rectangular 80 x 40 x 3 mm, con anticorrosivo, esmalte e instalación.
DESCRIPCION	Durante la supervisión de la actividad se verificó la instalación de la estructura de soporte para las cubiertas de la bodega y del cuarto de tableros ubicados en el área de dosificación. Se constató que la ejecución de esta actividad se desarrolló conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el contrato, garantizando las condiciones requeridas para el adecuado soporte y estabilidad de las cubiertas proyectadas.
ITEM	1.13
ACTIVIDAD	Puerta en lámina cold rolled calibre 18 pintada con anticorrosivo, esmalte epoxico, incluye marco. Suministro e instal.
DESCRIPCION	Durante la supervisión de la actividad se verificó la instalación de las puertas en lámina correspondientes a la bodega y al cuarto de tableros. Se constató que su fabricación e instalación se ejecutaron de conformidad con las especificaciones técnicas y los materiales ofertados establecidos en el ítem contractual, garantizando su adecuada funcionalidad y ajuste con las estructuras proyectadas.
ITEM	1.14
ACTIVIDAD	Ventana tipo persiana fija en lámina cold rolled cal. 18 instalada
DESCRIPCION	Durante la supervisión de la actividad se verificó la instalación de ventanas tipo persiana en lámina correspondientes a la bodega y al cuarto de tableros. Se constató que su fabricación e instalación se ejecutaron conforme a las especificaciones técnicas y a los materiales ofertados establecidos en el ítem contractual, garantizando su adecuado funcionamiento, ventilación y ajuste con las estructuras proyectadas.
ITEM	1.15
ACTIVIDAD	Malla eslabonada Cal. 10. con angulo agarre superior e inferior, con anticorrosivo-esmalte
DESCRIPCION	Durante la supervisión de la actividad se verificó la instalación de ventanas en malla eslabonada correspondientes al cuarto de

tableros. Se constató que su fabricación e instalación se ejecutaron de conformidad con las especificaciones técnicas y los materiales ofertados establecidos en el ítem contractual, garantizando su adecuado ajuste, ventilación y protección del área proyectada.

ITEM	1.16
ACTIVIDAD	Sistema de dosificación de cloro y soda caustica (Incluye bombas, tanques y tablero de control)
DESCRIPCION	Durante la supervisión de la actividad se verificó el suministro e instalación del sistema de dosificación para cloro y soda cáustica. Se constató que la ejecución de esta actividad se desarrolló de conformidad con las especificaciones técnicas y los requerimientos establecidos en el ítem contractual, garantizando su adecuada instalación y funcionamiento dentro del sistema proyectado para el tratamiento de agua.

ITEM	1.19
ACTIVIDAD	Suministro e instalación salida de iluminación en tubería IMC 1/2" 110V, en cable de cu 3X12/F/N/T
DESCRIPCION	Durante la supervisión de la actividad se verificó la instalación de cuatro salidas para iluminación en los cuartos de bodega, tablero y tanques de dosificación. Se constató que la ejecución de esta actividad se realizó de conformidad con lo estipulado en el ítem contractual y las especificaciones técnicas del proyecto, garantizando la adecuada disposición de los puntos eléctricos requeridos para el funcionamiento de las áreas intervenidas.

ITEM	1.20
ACTIVIDAD	Suministro e instalación lampara led hermética 20W IP65-2-G
DESCRIPCION	Durante la supervisión de la actividad se verificó la instalación de lámparas LED herméticas en los cuartos de bodega, tablero y tanques de dosificación. Se constató que la ejecución de esta actividad se realizó de conformidad con lo estipulado en el ítem contractual y con las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto, garantizando su adecuada instalación y el correcto funcionamiento del sistema de iluminación en las áreas intervenidas.

ITEM	1.21

ACTIVIDAD	Suministro e instalación lampara led emergencia R3 2x1W Sylvania o similar
DESCRIPCION	Durante la supervisión de la actividad se verificó el suministro e instalación de lámparas LED de emergencia, de acuerdo con lo exigido en el ítem contractual. Se constató que la ejecución de esta actividad se desarrolló conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el contrato, garantizando su adecuada instalación y funcionamiento en las áreas proyectadas.
ITEM	1.22
ACTIVIDAD	Suministro e instalación salida de toma monofásica con polo a tierra en tuberia IMC 1/2" 110V, en cable de cu 3X12/F/N/T
DESCRIPCION	Durante la supervisión de la actividad se verificó la instalación de tomas monofásicas en los cuartos de bodega, tablero y tanques de dosificación. Se constató que la ejecución de esta actividad se realizó conforme a lo estipulado en el ítem contractual y a las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto, garantizando la adecuada disposición de los puntos eléctricos requeridos para el funcionamiento de las áreas intervenidas.
ITEM	2.1
ACTIVIDAD	Desmonte, mantenimiento, y montaje de válvulas de Ø8" - Ø12"
DESCRIPCION	Se realizo el desmonte, mantenimiento y montaje de válvulas de salida del tanque superficial y también se corrigió entradas de agua por nivel freático a las cajas de las válvulas
ITEM	2.2
ACTIVIDAD	Mantenimiento de estación limitadora de caudal 140 mm x 1.5"
DESCRIPCION	Durante la supervisión de la actividad se verificó la ejecución de labores de limpieza y mantenimiento de los accesorios correspondientes a la estación limitadora. De igual manera, se constató la limpieza general y el retiro de material y escombros que se encontraban al interior de la caja, garantizando condiciones adecuadas para la operación, acceso y mantenimiento de los elementos instalados.
ITEM	2.3
ACTIVIDAD	Mantenimiento de estación limitadora de caudal 160 mm x 3"

DESCRIPCION	Durante la supervisión de la actividad se verificó la ejecución de labores de limpieza y mantenimiento de los accesorios correspondientes a la estación limitadora. De igual manera, se constató la limpieza general y el retiro de material y escombros que se encontraban al interior de la caja, garantizando condiciones adecuadas para la operación, acceso y mantenimiento de los elementos instalados.
ITEM	2.4
ACTIVIDAD	Mantenimiento de estación limitadora de caudal 200 mm x 6"
DESCRIPCION	Durante la supervisión de la actividad se verificó la ejecución de labores de limpieza y mantenimiento de los accesorios correspondientes a la estación limitadora. De igual manera, se constató la limpieza general y el retiro de material y escombros que se encontraban al interior de la caja, garantizando condiciones adecuadas para la operación, acceso y mantenimiento de los elementos instalados.
ITEM	2.5
ACTIVIDAD	Mantenimiento de estación limitadora de caudal de 6" x 6"
DESCRIPCION	Durante la supervisión de la actividad se verificó la ejecución de labores de limpieza y mantenimiento de los accesorios correspondientes a la estación limitadora. De igual manera, se constató la limpieza general y el retiro de material y escombros que se encontraban al interior de la caja, garantizando condiciones adecuadas para la operación, acceso y mantenimiento de los elementos instalados.
ITEM	2.6
ACTIVIDAD	Mantenimiento de estación limitadora de caudal de 8" x 4"
DESCRIPCION	Durante la supervisión de la actividad se verificó la ejecución de labores de limpieza y mantenimiento de los accesorios correspondientes a la estación limitadora. De igual manera, se constató la limpieza general y el retiro de material y escombros que se encontraban al interior de la caja, garantizando condiciones adecuadas para la operación, acceso y mantenimiento de los elementos instalados.
ITEM	2.7

ACTIVIDAD	Mantenimiento de estación reductora de caudal 160 mm x 2"
DESCRIPCION	Durante la supervisión de la actividad se verificó la ejecución de labores de limpieza y mantenimiento de los accesorios correspondientes a la estación limitadora. De igual manera, se constató la limpieza general y el retiro de material y escombros que se encontraban al interior de la caja, garantizando condiciones adecuadas para la operación, acceso y mantenimiento de los elementos instalados.
ITEM	2.8
ACTIVIDAD	Mantenimiento de estación reductora de caudal 200 mm x 4"
DESCRIPCION	Durante la supervisión de la actividad se verificó la ejecución de labores de limpieza y mantenimiento de los accesorios correspondientes a la estación limitadora. De igual manera, se constató la limpieza general y el retiro de material y escombros que se encontraban al interior de la caja, garantizando condiciones adecuadas para la operación, acceso y mantenimiento de los elementos instalados.
ITEM	2.9
ACTIVIDAD	Mantenimiento de estación reductora de presión 140 mm x 1.5"
DESCRIPCION	Durante la supervisión de la actividad se verificó la ejecución de labores de limpieza y mantenimiento de los accesorios correspondientes a la estación limitadora. De igual manera, se constató la limpieza general y el retiro de material y escombros que se encontraban al interior de la caja, garantizando condiciones adecuadas para la operación, acceso y mantenimiento de los elementos instalados.
ITEM	2.10
ACTIVIDAD	Mantenimiento de estación reductora de presión 160 mm x 1.5"
DESCRIPCION	Durante la supervisión de la actividad se verificó la ejecución de labores de limpieza y mantenimiento de los accesorios correspondientes a la estación limitadora. De igual manera, se constató la limpieza general y el retiro de material y escombros que se encontraban al interior de la caja, garantizando condiciones adecuadas para la operación, acceso y mantenimiento de los elementos instalados.

ITEM	2.11
ACTIVIDAD	Válvula de mariposa en HD Ø 10" wafer con disco en acero inoxidable con actuador tipo volante. Suministro e Instal."
DESCRIPCION	Durante la supervisión de la actividad se verificó el desmonte de las válvulas existentes y la instalación de dos válvulas nuevas en HD de diámetro 10", tipo mariposa, destinadas al sistema de retrolavado de los filtros 1 y 2 en la planta de tratamiento de agua potable (PTAP). Se constató que la ejecución de esta actividad se desarrolló de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto, garantizando el adecuado funcionamiento y operatividad del sistema de retrolavado.
ITEM	2.12
ACTIVIDAD	Unión tipo Dresser Ø= 12" en H.D. Suministro e instal.
DESCRIPCION	Durante la supervisión de la actividad se verificó el desmonte del accesorio existente y la instalación de una unión tipo Dresser de 12" en la tubería de entrada a los filtros 3 y 4 de la planta de tratamiento de agua potable (PTAP). Se constató que la ejecución de esta actividad se realizó conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto, garantizando el adecuado acople y funcionamiento del sistema hidráulico en el tramo intervenido.
ITEM	3.01
ACTIVIDAD	Nivelación de cajas de válvulas para red de acueducto (4.80 m x 1.40 m) h = 1.00 m
DESCRIPCION	La supervisión del contrato verificó la ejecución de la nivelación de la caja de inspección correspondiente a la red de válvulas del macroacueducto, ubicada sobre la vía que conduce desde la escuela El Encanto hacia la vereda El Aeropuerto, en el sector La Palmera. Durante la actividad, la supervisión constató que la estructura fue realzada aproximadamente un (1) metro en todo su perímetro, medida adoptada para prevenir la colmatación de la caja por efecto del arrastre de material producto de las aguas de escorrentía. Así mismo, se verificó que la nivelación y adecuación de la caja se ejecutaron en concordancia con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato y conforme a las condiciones previstas para su correcta operación y protección.

ITEM	3.02
ACTIVIDAD	Nivelación de cajas de válvulas para red de acueducto (4.80 m x 1.40 m) h = 0.40 m
DESCRIPCION	La supervisión del contrato verificó la nivelación de siete (7) cajas de inspección correspondientes a la red de válvulas del macroacueducto, ubicadas en los sectores La Cauchera, La Aguacatera, Marginal de la Selva frente a Atamaica, Refocosta, entrada a Bello Amanecer y dos (2) cajas localizadas sobre la vía al Aeropuerto, frente al sector La Palmera, en la vía que conduce desde la escuela El Encanto hacia la vereda El Aeropuerto. Durante la ejecución de la actividad, la supervisión constató que las cajas fueron realzadas en un promedio aproximado de cuarenta (40) centímetros en todo su perímetro, como medida preventiva para evitar su colmatación por el arrastre de material producto de las aguas de escorrentía. Así mismo, se verificó que los trabajos de nivelación y adecuación de las estructuras se realizaron en cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el contrato y de las condiciones requeridas para su adecuada protección y funcionamiento.

ITEM	3.03
ACTIVIDAD	Tapa en lámina alfajor 1/8" con contramarco en angulo de 1 1/2"x3/16" con agarradera, anticorrosivo y pintura e instalada.
DESCRIPCION	Durante la supervisión de la actividad se verificó la construcción e instalación de tapas en lámina alfajor de 1/8" para las calas de válvulas ubicadas en diferentes puntos del sistema. Se constató que la ejecución de esta actividad se desarrolló conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto, garantizando la adecuada protección, seguridad y acceso para operación y mantenimiento de las estructuras intervenidas. Las cajas de válvulas intervenidas corresponden a las siguientes ubicaciones: caja de válvula Encanto–Palmera, caja de válvula La Cauchera, caja de válvula Aguacatera, caja de válvula Atamaica, caja No. 1 de válvula Palmar–Aeropuerto, caja No. 2 de válvula Palmar–Aeropuerto, caja de válvula frente a Refocosta, caja de válvula

	entrada Bello Amanecer, caja de válvula barrio La Floresta, caja de válvula Aeropuerto–San Antonio, caja de válvula vía al Encanto, caja de válvula detrás del peaje y caja de válvulas ubicada al interior de la planta del Macro.
ITEM	N.P 3.04
ACTIVIDAD	Nivelación de cajas de válvulas para red de acueducto (1 a 2m x 1.40 m) h=0.40 m
DESCRIPCION	Durante la supervisión de la actividad se verificó la nivelación de cuatro cajas de inspección correspondientes a la red de válvulas del macroacueducto, ubicadas en el barrio La Floresta, vía Aeropuerto–San Antonio, sector Escuela El Encanto y detrás del peaje. Se constató el realce perimetral de las estructuras en una altura promedio de 40 cm, con el fin de prevenir la colmatación ocasionada por el arrastre de material proveniente de las aguas de escorrentía. La ejecución de esta actividad se desarrolló de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato, garantizando la adecuada protección y operatividad de las cajas intervenidas.
ITEM	4.01
ACTIVIDAD	Limpieza y lavado mecánico de cubiertas tipo metálicas, fibrocemento, pvc, policarbonato
DESCRIPCION	La supervisión del contrato verificó la ejecución de las actividades de limpieza y lavado mecánico de las cubiertas de las casetas y de la cubierta del tanque holandés, realizadas mediante el uso de hidrolavadoras, agua y jabón industrial. Durante la inspección, se constató que los trabajos permitieron la adecuada remoción de suciedad, residuos y contaminantes superficiales, dejando las superficies en condiciones óptimas para garantizar la correcta adherencia del recubrimiento posterior con pintura. Así mismo, la supervisión evidenció que la actividad se desarrolló conforme a los procedimientos establecidos y a las especificaciones técnicas definidas en el contrato.
ITEM	4.02

ACTIVIDAD	Limpieza y lavado mecánico de perfiles metálicos tipo: correa, cercha, angulo, alto 80 - 250 mm y ancho 40 -200 mm La supervisión del contrato verificó la ejecución de las actividades de limpieza y lavado mecánico de la perfilería metálica —correas, cerchas y ángulos— correspondiente a las estructuras de soporte de las cubiertas de las casetas y del tanque holandés.
DESCRIPCION	Durante la inspección, se constató que para el desarrollo de la actividad se emplearon hidrolavadoras, agua y jabón industrial, logrando la adecuada remoción de suciedad, residuos y agentes contaminantes presentes en las superficies metálicas. Asi mismo, la supervisión evidenció que las superficies intervenidas quedaron en condiciones apropiadas para garantizar la correcta adherencia del recubrimiento posterior con pintura, de conformidad con los procedimientos y especificaciones técnicas establecidas en el contrato.
ITEM	4.03
ACTIVIDAD	Limpieza y lavado mecánico de perfiles metálicos tipo: correa, cercha, angulo, alto 250 - 1000 mm y ancho 150 - 250 mm La supervisión del contrato realizó seguimiento y control a las labores de limpieza y lavado mecánico de la perfilería metálica (correas, cerchas y ángulos) que conforman las estructuras de soporte de las cubiertas de las casetas y del tanque holandés.
DESCRIPCION	En el desarrollo de la actividad, la supervisión constató el uso de hidrolavadoras, agua y jabón industrial, verificando la efectiva remoción de suciedad, residuos y contaminantes adheridos a las superficies metálicas. Como resultado de la intervención, se evidenció que la perfileria quedó debidamente preparada, garantizando condiciones adecuadas para la correcta adherencia del recubrimiento posterior con pintura, en cumplimiento de las especificaciones técnicas contractuales.
ITEM	4.04
ACTIVIDAD	Pintura exterior koraza para cubierta 3 manos

	La supervisión del contrato verificó la instalación del recubrimiento con pintura tipo Koraza en la superficie exterior de las cubiertas de las casetas correspondientes al generador de energia, dosificación, cuarto de bombas y laboratorio.
DESCRIPCION	Durante el seguimiento a la actividad, la supervisión constató la aplicación de tres (3) manos de pintura, verificando su correcta distribución y cubrimiento uniforme sobre las superficies intervenidas. Asi mismo, se evidenció que la ejecución de los trabajos se realizó conforme a las especificaciones técnicas del contrato, garantizando la adecuada protección y durabilidad del recubrimiento aplicado.
ITEM	4.05
ACTIVIDAD	Pintura interior vinilo bajo cubierta 3 manos La supervisión del contrato verificó la ejecución del recubrimiento con pintura tipo Koraza en la superficie interior de las cubiertas de las casetas correspondientes al generador de energia, dosificación, cuarto de bombas y laboratorio.
DESCRIPCION	Durante el seguimiento de la actividad, la supervisión constató la aplicación de tres (3) manos de pintura, verificando la adecuada cobertura, adherencia y uniformidad del recubrimiento sobre las superficies intervenidas. Asi mismo, se evidenció que los trabajos se realizaron en cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el contrato, garantizando la protección y acabado requeridos.
ITEM	4.6
ACTIVIDAD	Pintura epóxica para estructura metálica existente tipo: correas, cerchas, laminas y ángulos, alto 80 - 250 mm y ancho 40 - 200 mm, 3 manos.
DESCRIPCION	Se realizó visita de supervisión a la actividad de aplicación de recubrimiento con pintura epóxica en las correas metálicas de las cubiertas del cuarto eléctrico, caseta de bombas centrífugas y tableros de control, caseta de laboratorio, caseta de dosificación y caseta del tanque superficial tipo holandés.

	Durante la verificación en campo se evidenció la ejecución de la actividad conforme a las especificaciones técnicas contractuales, sin observarse a simple vista inconsistencias en la aplicación.
ITEM	4.7
ACTIVIDAD	Pintura epóxica para estructura metálica existente tipo: correas, cerchas, laminas y ángulos, alto 250 - 1000 mm y ancho 150 - 250 mm, 3 manos.
DESCRIPCION	Se realizó visita de supervisión a la actividad de aplicación de recubrimiento con pintura epóxica en las cerchas y columnas de la estructura de soporte de la cubierta de la caseta y la pasarela del tanque superficial tipo holandés. Durante la verificación en campo se evidenció la ejecución de la actividad conforme a las especificaciones técnicas contractuales, observándose uniformidad en el acabado y cobertura del elemento estructural.
ITEM	4.08
ACTIVIDAD	Limpieza y lavado de mamposteria a la vista con ácido nitrico e hidrosolve
DESCRIPCION	La supervisión del contrato verificó la ejecución de las actividades de lavado de la mampostería a la vista en los muros de las casetas y en el muro de cerramiento, realizadas mediante la aplicación de ácido nítrico e Hidrosolve, complementadas con el uso de hidrolavadora. Durante la inspección, la supervisión constató que el procedimiento permitió la adecuada remoción de suciedad, eflorescencias e impurezas presentes en las superficies, dejándolas en condiciones óptimas para garantizar la correcta adherencia del recubrimiento a instalar posteriormente. Así mismo, se evidenció que la actividad se desarrolló conforme a los procedimientos técnicos y a las especificaciones establecidas en el contrato.
ITEM	4.09
ACTIVIDAD	Limpieza y lavado de pisos en concreto, cerámica, granito, arcilla, mármol, piedra, con ácido muriático
DESCRIPCION	Durante la supervisión de la actividad se verificó la ejecución de labores de limpieza y lavado de los pisos en concreto

	correspondientes a las casetas y al tanque holandés, con el fin de retirar suciedad y material adherido presente en las superficies. Se constató que esta actividad se desarrolló como preparación previa para la aplicación del recubrimiento con pintura, conforme al procedimiento establecido y a las especificaciones técnicas del proyecto.
ITEM	4.10
ACTIVIDAD	Pintura epóxica 3 manos sobre ventanas y puerta en lámina (incluye anticorrosivo)
DESCRIPCION	Durante la supervisión de la actividad se verificó la instalación del recubrimiento con pintura epóxica sobre la carpintería metálica, incluyendo puertas, ventanas y persianas del cuarto eléctrico, la caseta de bombas centrífugas y tableros de control, la caseta de laboratorio y la caseta de dosificación. Se constató que la ejecución de esta actividad se desarrolló conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el contrato, garantizando la adecuada protección de los elementos metálicos intervenidos y el acabado requerido para su conservación y funcionamiento.
ITEM	4.11
ACTIVIDAD	Pintura epóxica sobre metal o concreto (3 manos)
DESCRIPCION	Durante la supervisión de la actividad se verificó la instalación del recubrimiento con pintura epóxica sobre los pisos de concreto del cuarto eléctrico, la caseta de bombas centrífugas y tableros de control, la caseta de laboratorio, la caseta de dosificación y el tanque superficial holandés. Se constató que la ejecución de esta actividad se desarrolló de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato, garantizando el adecuado acabado y la protección de las superficies intervenidas para su conservación y funcionamiento.
ITEM	4.12
ACTIVIDAD	**Pintura para muros a la vista con aditivo antihumedad y barniz transparente ladrillo fachada dos manos**
DESCRIPCION	La supervisión del contrato verificó la instalación del recubrimiento con pintura en los muros de las casetas y en el muro de cerramiento.

	Durante el seguimiento a la actividad, la supervisión constató la aplicación de tres (3) capas de pintura, verificando su adecuada cobertura y uniformidad, con el propósito de brindar protección a los muros frente a la humedad. Así mismo, se evidenció que los trabajos se ejecutaron conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el contrato, garantizando el acabado y la durabilidad del recubrimiento aplicado.
ITEM	4.13
ACTIVIDAD	**Pintura esmalte epóxica base solvente sobre malla de cerramiento y tuberia**
DESCRIPCION	La supervisión del contrato verificó la ejecución del recubrimiento con pintura epóxica aplicado sobre la malla de cerramiento y la tubería asociada. Previamente a la aplicación del recubrimiento, la supervisión constató la realización de las labores de limpieza y retiro de suciedad y contaminantes presentes en las superficies, con el fin de garantizar la adecuada adherencia de la pintura sobre la malla eslabonada y los elementos intervenidos. Así mismo, se evidenció que la actividad se desarrolló conforme a los procedimientos y especificaciones técnicas establecidas en el contrato, asegurando la protección y durabilidad del recubrimiento aplicado.
ITEM	4.14
ACTIVIDAD	Escalera en Tubo estructural redondo Ø=2" e= 2.5 mm y acero ASTM - A36 para acceso a pasarela perimetral de tanque holandés (Incluye: suministro - fabricación - pintura - montaje)
DESCRIPCION	Durante la supervisión de la actividad se verificó el suministro, fabricación, pintura y montaje de la escalera construida en tubo estructural redondo de Ø=2" con espesor de 2,5 mm en acero ASTM A-36, destinada al acceso a la pasarela perimetral del tanque holandés. Se constató que la ejecución de esta actividad se desarrolló de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato, garantizando las condiciones requeridas de acceso, estabilidad y funcionamiento de la estructura instalada.

ITEM	N.P 4.15
ACTIVIDAD	Pintura epoxico 3 manos sobre cara interior de cubierta
DESCRIPCION	Durante la supervisión de la actividad se verificó la aplicación de recubrimiento con pintura epóxica a tres manos en la parte inferior de la cubierta del tanque superficial. Se constató que, previo a la aplicación del recubrimiento, se realizaron labores de lavado y limpieza de la superficie con el fin de retirar manchas y garantizar las condiciones adecuadas de adherencia de la pintura, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato.
ITEM	5.1
ACTIVIDAD	**Limpieza y desmanchado en fachadas a gran altura de concreto, mortero, arcilla, piedra con ácido nítrico e hidrosolve** Se realizó la supervisión de la actividad correspondiente a la limpieza y desmanchado de fachadas a gran altura, así como al lavado mecánico de columnas, vigas, muros y placas de los tanques elevados.
DESCRIPCION	Durante la ejecución se verificó el uso de camión grúa con canasta dieléctrica e hidrolavadoras, empleando agua y jabón industrial para la remoción de suciedad y contaminantes superficiales, con el fin de garantizar condiciones adecuadas de adherencia para la posterior aplicación del recubrimiento con pintura. La actividad se desarrolló conforme al procedimiento previsto.
ITEM	5.2
ACTIVIDAD	**Pintura exterior acrílica tipo koraza o similar sobre muros 3 manos, a grandes alturas (andamio colgante)** Se realizó la supervisión de la actividad correspondiente a la aplicación de recubrimiento con pintura acrílica tipo Koraza, a tres (3) manos, en columnas, vigas, muros y placas de los tanques elevados.
DESCRIPCION	Durante la ejecución se verificó el uso de camión grúa con canasta para el acceso a las zonas en altura, evidenciándose la aplicación del sistema de pintura conforme a las especificaciones técnicas contractuales, en cuanto a número de manos y cobertura del elemento estructural.
ITEM	6.2

ACTIVIDAD	**Lavado y desinfección de tanques aéreos capacidad 190 m3 c/u. (Incluye preparación y drenaje para trabajo en condiciones seguras, vaciado, limpieza inicial, desinfección, enjuague final y verificación, registro y documentación del proceso)** Se realizó la supervisión de la actividad correspondiente al lavado y desinfección de los tanques elevados destinados a la distribución.
DESCRIPCION	Durante la ejecución se verificó el desarrollo de las etapas de preparación, drenaje y vaciado parcial para garantizar condiciones seguras de trabajo, así como la limpieza inicial, proceso de desinfección, enjuague final y verificación. Se evidenció el registro y documentación del procedimiento, en concordancia con las especificaciones técnicas contractuales.
ITEM	6.3
ACTIVIDAD	**Lavado y desinfección de cajas de paso. (Incluye preparación para trabajo en condiciones seguras, vaciado, limpieza inicial, desinfección, enjuague final y verificación, registro y documentación del proceso)**
DESCRIPCION	Durante la ejecución se verificó el desarrollo de las actividades de preparación y vaciado para garantizar condiciones seguras, así como la limpieza inicial, proceso de desinfección, enjuague final y verificación. Se evidenció el registro y documentación del procedimiento conforme a las especificaciones técnicas contractuales.
ITEM	6.4
ACTIVIDAD	**Fumigación para control de insectos voladores y rastreros en áreas externas** Se realizó la supervisión de la actividad correspondiente a la fumigación para el control de insectos voladores y rastreros en las áreas externas.
DESCRIPCION	Durante la ejecución se verificó el desarrollo de la actividad conforme al procedimiento establecido. Se deja constancia de que el contratista anexó el informe técnico en el cual se detalla el proceso realizado.
ITEM	7.01

ACTIVIDAD	Luminaria Led Tipo Reflector Jeta Pro 400w Unv 48000lm 6500K Luz Dia Iluminación Decorativa P29743-36 I2-250825 (Incluye suministro e instalación)
DESCRIPCION	Durante la supervisión de la actividad se verificó el suministro e instalación de cuatro reflectores destinados a la iluminación de las instalaciones de la planta del macroacueducto. Se constató que los equipos instalados corresponden a las especificaciones técnicas establecidas en el ítem contractual, garantizando la adecuada iluminación de las áreas intervenidas y su correcto funcionamiento dentro de la infraestructura de la planta.
ITEM	8.1
ACTIVIDAD	**Extracción de tubería de producción a.c. s/c Ø=6", bomba sumergible 75 hp, motor tipo lapicero y cableado**
DESCRIPCION	Se realizó la supervisión de la actividad correspondiente a la extracción de la tubería de producción en asbesto cemento (A.C.) Ø=6", así como de la electrobomba y el motor sumergible de 75 HP tipo lapicero, con el fin de ejecutar mantenimiento preventivo a los pozos profundos. Durante la ejecución se verificó el desarrollo de las maniobras de retiro conforme al procedimiento previsto, garantizando condiciones adecuadas de seguridad y control de los elementos desmontados.
ITEM	8.2
ACTIVIDAD	**Mantenimiento preventivo de pozo profundos abastecedores del macroacueducto municipal, revisión de elementos, aplicación de químico desincrustante, lavado con inyección de aire a presión.**
DESCRIPCION	Se realizó la supervisión de la actividad correspondiente al mantenimiento preventivo de los pozos profundos No. 1 y No. 2, localizados en el macroacueducto. Durante la ejecución se verificó la aplicación de químico desinfectante y desincrustante para el lavado del pozo, así como el lavado mediante inyección de aire a presión, conforme al procedimiento establecido. Igualmente, se constató la instalación del equipo de producción una vez finalizadas las labores de mantenimiento.

La actividad se desarrolló en concordancia con las especificaciones técnicas contractuales.

ITEM	8.3
ACTIVIDAD	**Bomba sumergible tipo lapicero marca STS Acero modular fundición, impulsores y eje en acero inoxidable, 2 Etapas, con caudal de 56 Lts a 81MCA 6" descarga, sin cheque, Suministro e instalación.**
DESCRIPCION	Se realizó la supervisión de la actividad correspondiente al suministro e instalación de bomba sumergible tipo lapicero, marca Franklin Electric STS, en acero modular de fundición, con impulsores y eje en acero inoxidable, de dos (2) etapas, con caudal de 56 L/s a 81 m.c.a., descarga de 6" sin válvula de cheque, instalada en el Pozo No. 01. Durante la ejecución se verificó que las características técnicas del equipo suministrado e instalado corresponden a lo establecido en las especificaciones técnicas contractuales, así como su adecuada disposición e instalación en el sistema.

ITEM	8.4
ACTIVIDAD	**Motor sumergible Tipo Lapicero pozo profundo 75 HP, 460 Voltios, 60HZ, 3500 RPM, suministro e instalación.**
DESCRIPCION	Se realizó la supervisión de la actividad correspondiente al suministro e instalación de motor sumergible tipo lapicero para pozo profundo, con potencia de 75 HP, 460 V, 60 Hz y 3.500 rpm, instalado en el Pozo No. 01. Durante la ejecución se verificó que las características técnicas del equipo corresponden a lo establecido en las especificaciones técnicas contractuales, así como su adecuada instalación y acople con el sistema de bombeo.

ITEM	8.5
ACTIVIDAD	**Bomba sumergible tipo lapicero Acero Inox laminar Modelo SSI 3 Etapas, con caudal de 53 Lts a 81 MCA 6" descarga, incluye cheque, Suministro e instalación.**
DESCRIPCION	Se realizó la supervisión de la actividad correspondiente al suministro e instalación de bomba sumergible tipo lapicero en acero inoxidable laminar, modelo SSI, de tres (3) etapas, con caudal de 53 L/s a 81 m.c.a., descarga de 6", incluyendo válvula de cheque, instalada en el Pozo No. 02.

Durante la ejecución se verificó que las especificaciones técnicas del equipo suministrado e instalado corresponden a lo establecido contractualmente, así como su correcta instalación en el sistema de bombeo.

ITEM 8.6

ACTIVIDAD **Motor sumergible Tipo Lapicero pozo profundo 75 HP, 460 Voltios, 60HZ, 3500 RPM, suministro e instalación.**

Se realizó la supervisión de la actividad correspondiente al suministro e instalación de motor sumergible tipo lapicero para pozo profundo, con potencia de 75 HP, 460 V, 60 Hz y 3.500 rpm, instalado en el Pozo No. 01.

DESCRIPCION

Durante la ejecución se verificó que las características técnicas del equipo corresponden a lo establecido en las especificaciones técnicas contractuales, así como su adecuada instalación y acople con el sistema de bombeo.

ITEM 8.7

ACTIVIDAD **Instalación de tubería de producción a.c. s/c Ø=6, bomba sumergible 75hp, motor tipo lapicero y cableado**

Se realizó la supervisión de la actividad correspondiente a la instalación de la tubería de producción y el cableado eléctrico requeridos para la puesta en funcionamiento de las nuevas bombas y motores sumergibles.

DESCRIPCION

Durante la ejecución se verificó que la instalación se efectuó conforme a las especificaciones y recomendaciones técnicas contractuales, garantizando la adecuada disposición de los elementos y su integración al sistema de bombeo. La actividad queda sujeta a seguimiento por parte de la supervisión.

ITEM 8.08

ACTIVIDAD Sistema de dosificación de cloro a vacio, para ser instalado en la válvula de 3/4" del cilindro de 68 kg de cloro o sobre el distribuidor múltiple, con todos sus accesorios estándar e incluyendo lo siguiente: * Unidad de control manual para regular la dosificación de cloro con rotámetro integrado y con sus respectivos racores de 3/8" para conectar las mangueras de inyección y desfogue (venteo) * Un (01) eyector de 3/4"dediametro de garganta fija, con sus respectivas boquillas. * Diez empaques de plomo. * Un (1) tapón de malla protectora para manguera de venteo. *Siete (7) metros de manguera en polietileno de 3/4" para línea de cloro y desfogue o venteo. * Una

DESCRIPCION	(19 llave universal y un (1) frasco de 100 ml de amoniaco para detectar fugas de cloro. *Un (1) filtro de entrada VRA-5010. *manual de operación y mantenimiento. capacidad. 0 a 100 libras/dia (2 kg/h). Referencia AI471C (Incluye instalación) Durante la supervisión de la actividad se verificó el suministro e instalación del sistema de dosificación para cloro gaseoso en la planta de tratamiento de agua potable (PTAP). Se constató que la ejecución de esta actividad se desarrolló de conformidad con las recomendaciones y especificaciones técnicas establecidas en el ítem contractual, garantizando la adecuada instalación y funcionamiento del sistema dentro del proceso de tratamiento de agua.

3.2 CERTIFICACIONES DE CALIDAD Y OTRAS

A lo largo del desarrollo del contrato se ha llevado a cabo las revisiones pertinentes verificando que las actividades acompañadas se realicen de la mejor manera, las cuales se reflejan en un mejor servicio a la comunidad, al momento de realizar las actividades se verifico que cumpliera con los estándares de calidad requeridos y se realizaran los procedimientos de manera adecuada y segura.

3.3 CLIMA Y SITUACIÓN DEL SITIO DE TRABAJO

Durante la ejecución de la obra se presentó clima favorable la mayor parte del tiempo, sin embargo, se registraron fuertes lluvias puntuales que ocasionaron imprevistos al contratista.

3.4 INCONVENIENES PRESENTADOS

Durante la ejecución de los trabajos no se han presentado inconvenientes que comprometieran la integridad de los trabajadores o de las actividades proyectadas.

4. INFORME FINANCIERO

CONDICIONES CONTRACTUALES						CANTIDADES EJECUTADAS	
ITEM	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANTIDAD	VR. UNIT	VR. TOTAL	CANTID	VALOR
1	CUARTO DE TABLEROS Y BODEGA PARA DOSIFICACION						
1,1	Replanteo y localización para arquitectura, sobre terreno	m2	39,10	$10.121,00	$395.731,10	39,10	$395.731,10
1,2	Relleno con material sub base triturada tamaño máximo 2", compactado para áreas pequeñas de cimentación con transporte	m3	19,55	$110.807,00	$2.166.276,85	19,55	$2.166.276,85
1,3	Concreto para solado resistencia 175 kg/cm2 - 2500 psi	m2	17,50	$29.624,00	$518.420,00	17,50	$518.420,00
1,4	Acero de refuerzo Grado 60	kg	624,26	$7.295,00	$4.553.976,70	624,26	$4.553.976,70
1,5	Concreto de 3500 Psi para placa flotante	m2	17,50	$162.799,00	$2.848.982,50	17,50	$2.848.982,50
1,6	Columna en concreto de resistencia 3500 psi	m	10,60	$156.382,00	$1.657.649,20	10,60	$1.657.649,20
1,7	Viga aérea concreto 3500 Psi (0.25 x 0.25 m, h= 0-3 m)	m	14,00	$143.376,00	$2.007.264,00	14,00	$2.007.264,00
1,8	Andenes en concreto de resistencia 3000 Psi, espesor 0.10 m	m2	20,10	$81.250,00	$1.633.125,00	20,10	$1.633.125,00
1,9	Muro en ladrillo prensado macizo 0.12 m fachada	m2	23,34	$126.915,00	$2.962.196,10	23,34	$2.962.196,10

1,1	Teja en fibrocemento No. 8. Suministro e instalación	m2	20,47	$56.214,00	$1.150.700,58	20,47	$1.150.700,58
1,11	Teja tipo master 1000 cal 26 pintada	m2	12,00	$57.992,00	$695.904,00	12,00	$695.904,00
1,12	Correa metálica en perfil estructural rectangular 80 x 40 x 3 mm, con anticorrosivo, esmalte e instalación.	m	31,20	$68.466,00	$2.136.139,20	31,20	$2.136.139,20
1,13	Puerta en lamina cold rolled calibre 18 pintada con anticorrosivo, esmalte epoxico, incluye marco. Suministro e instal.	m2	4,25	$763.383,00	$3.244.377,75	4,25	$3.244.377,75
1,14	Ventana tipo persiana fija en lamina cold rolled cal. 18 instalada	m2	6,02	$253.425,00	$1.525.618,50	6,02	$1.525.618,50
1,15	Malla eslabonada Cal. 10. con angulo agarre superior e inferior, con anticorrosivo-esmalte	m2	3,01	$169.677,00	$510.727,77	3,01	$510.727,77
1,16	Sistema de dosificación de cloro y soda caustica (Incluye bombas, tanques y tablero de control)	und	2,00	$13.261.094,00	$26.522.188,00	2,00	$26.522.188,00
1,17	Suministro e instalación tablero de protección TCBDF, según unifilar	und	0,00	$9.247.264,00	$0,00	0,00	$0,00
1,18	Suministro e instalación acometida en cable de cu (3XN8FX1X8N+1X10T) desde TSA a TCBDF en 1 PVC 1"	m	0,00	$90.381,00	$0,00	0,00	$0,00

1,19	Suministro e instalación salida de iluminación en tubería IMC 1/2" 110V, en cable de cu 3X12/F/N/T	und	4,00	$309.264,00	$1.237.056,00	4,00	$1.237.056,00
1,2	Suministro e instalación lampara led hermética 20W IP65-2-G	und	2,00	$316.799,00	$633.598,00	2,00	$633.598,00
1,21	Suministro e instalación lampara led emergencia R3 2x1W Sylvania o similar	und	2,00	$218.874,00	$437.748,00	2,00	$437.748,00
1,22	Suministro e instalación salida de toma monofásica con polo a tierra en tubería IMC 1/2" 110V, en cable de cu 3X12/F/N/T	und	6,00	$294.432,00	$1.766.592,00	6,00	$1.766.592,00
2	**REPARACION DE FUGAS**						
2,1	Desmonte, mantenimiento, y montaje de válvulas de Ø8" - Ø12"	und	2,00	$1.053.038,00	$2.106.076,00	2,00	$2.106.076,00
2,2	Mantenimiento de estación limitadora de caudal 140 mm x 1.5"	und	1,00	$516.209,00	$516.209,00	1,00	$516.209,00
2,3	Mantenimiento de estación limitadora de caudal 160 mm x 3"	und	1,00	$650.058,00	$650.058,00	1,00	$650.058,00
2,4	Mantenimiento de estación limitadora de caudal 200 mm x 6"	und	1,00	$849.792,00	$849.792,00	1,00	$849.792,00
2,5	Mantenimiento de estación limitadora de caudal de 6" x 6"	und	1,00	$975.924,00	$975.924,00	1,00	$975.924,00
2,6	Mantenimiento de estación limitadora de caudal de 8" x 4"	und	1,00	$1.038.990,00	$1.038.990,00	1,00	$1.038.990,00

2,7	Mantenimiento de estación reductora de caudal 160 mm x 2"	und	1,00	$642.920,00	$642.920,00	1,00	$642.920,00
2,8	Mantenimiento de estación reductora de caudal 200 mm x 4"	und	2,00	$720.850,00	$1.441.700,00	2,00	$1.441.700,00
2,9	Mantenimiento de estación reductora de presión 140 mm x 1.5"	und	1,00	$516.685,00	$516.685,00	1,00	$516.685,00
2,1	Mantenimiento de estación reductora de presión 160 mm x 1.5"	und	1,00	$581.156,00	$581.156,00	1,00	$581.156,00
2,11	Válvula de mariposa en HD Ø 10" wafer con disco en acero inoxidable con actuador tipo volante. Suministro e Instal."	und	2,00	$3.028.158,00	$6.056.316,00	2,00	$6.056.316,00
2,12	Unión tipo Dresser Ø= 12" en H.D. Suministro e instal.	und	1,00	$1.096.985,00	$1.096.985,00	1,00	$1.096.985,00
3	NIVELACION CAJAS DE INSPECCION						
3,1	Nivelación de cajas de válvulas para red de acueducto (4.80 m x 1.40 m) h = 1.00 m	und	1,00	$5.307.163,00	$5.307.163,00	1,00	$5.307.163,00
3,2	Nivelación de cajas de válvulas para red de acueducto (4.80 m x 1.40 m) h = 0.40 m	und	7,00	$3.221.156,00	$22.548.092,00	7,00	$22.548.092,00
3,3	Tapa en lamina alfajor 1/8" con contramarco en angulo de 1 1/2"x3/16" con agarradera, anticorrosivo y pintura e instalada.	m2	93,22	$892.587,00	$83.206.960,14	93,22	$83.206.960,14
N.P. 3.04	Nivelación de cajas de válvulas para red de acueducto (1 a 2 m x 1.40 m) h = 0.40 m	und	4,00	$1.867.796,00	$7.471.184,00	4,00	$7.471.184,00
4	RELLENOS Y BASES						

4,1	Limpieza y lavado mecánico de cubiertas tipo metálicas, fibrocemento, pvc, policarbonato	m2	1530,69	$16.247,00	$ 24.869.120,43	1530,69	$24.869.120,43
4,2	Limpieza y lavado mecánico de perfiles metálicos tipo: correa, cercha, angulo, alto 80 - 250 mm y ancho 40 -200 mm	m	499,40	$18.901,00	$ 9.439.159,40	499,40	$9.439.159,40
4,3	Limpieza y lavado mecánico de perfiles metálicos tipo: correa, cercha, angulo, alto 250 - 1000 mm y ancho 150 - 250 mm	m	321,05	$27.554,00	$ 8.846.211,70	321,05	$8.846.211,70
4,4	Pintura exterior koraza para cubierta 3 manos	m2	658,88	$38.706,00	$ 25.502.609,28	658,88	$25.502.609,28
4,5	Pintura interior vinilo bajo cubierta 3 manos	m2	106,88	$28.184,00	$ 3.012.305,92	106,88	$3.012.305,92
4,6	Pintura epóxica para estructura metálica existente tipo: correas, cerchas, laminas y ángulos, alto 80 - 250 mm y ancho 40 - 200 mm, 3 manos.	m	499,40	$28.148,00	$ 14.057.111,20	499,40	$14.057.111,20
4,7	Pintura epóxica para estructura metálica existente tipo: correas, cerchas, laminas y ángulos, alto 250 - 1000 mm y ancho 150 - 250 mm, 3 manos.	m	321,05	$62.961,00	$ 20.213.629,05	321,05	$20.213.629,05
4,8	Limpieza y lavado de mampostería a la vista con acido nítrico e hidrosolve	m2	867,51	$11.696,00	$ 10.146.396,96	867,51	$10.146.396,96
4,9	Limpieza y lavado de pisos en concreto, cerámica, granito, arcilla, mármol, piedra, con ácido muriático	m2	277,28	$8.715,00	$ 2.416.495,20	277,28	$2.416.495,20

4,1	Pintura epóxica 3 manos sobre ventanas y puerta en lámina (incluye anticorrosivo)	m2	72,58	$33.253,00	$ 2.413.502,74	72,58	$2.413.502,74
4,11	Pintura epóxica sobre metal o concreto (3 manos)	m2	490,20	$51.665,00	$ 25.326.183,00	490,20	$25.326.183,00
4,12	Pintura para muros a la vista con aditivo antihumedad y barniz transparente ladrillo fachada dos manos	m2	867,51	$55.616,00	$ 48.247.436,16	867,51	$48.247.436,16
4,13	Pintura esmalte epóxica base solvente sobre malla de cerramiento y tubería	m2	849,60	$34.267,00	$ 29.113.243,20	849,60	$29.113.243,20
4,14	Escalera en Tubo estructural redondo Ø=2" e= 2.5 mm y acero ASTM - A36 para acceso a pasarela perimetral de tanque holandés (Incluye: suministro - fabricación - pintura - montaje)	und	1,00	$5.630.260,00	$ 5.630.260,00	1,00	$5.630.260,00
INP 4.15	Pintura epóxica 3 manos sobre cara interior de cubierta	m2	552,00	$27.987,00	$ 15.448.824,00	552,00	$15.448.824,00
5	MANTENIMIENTO Y PINTURA TANQUES ELEVADOS						
5,1	Limpieza y desmanchado en fachadas a gran altura de concreto, mortero, arcilla, piedra con acido nitrico e hidrosolve	m2	1605,44	$19.417,00	$ 31.172.828,48	1605,44	$31.172.828,48

5,2	Pintura exterior acrílica tipo koraza o similar sobre muros 3 manos, a grandes alturas (andamio colgante)	m2	1605,44	$29.871,00	$ 47.956.098,24	1605,44	$47.956.098,24
6	LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES - CERTIFICADO						
6,1	Lavado y desinfección de tanque Holandés capacidad 1000 m3 mediante equipo especializado (Incluye preparación y drenaje para trabajo en condiciones seguras, vaciado, limpieza inicial, Desinfección, enjuague final y verificación, registro y documentación del proceso)	m2	0,00	$46.300,00	$ 0,00	0,00	$0,00
6,2	Lavado y desinfección de tanques aéreos capacidad 190 m3 c/u. (Incluye preparación y drenaje para trabajo en condiciones seguras, vaciado, limpieza inicial, Desinfección, enjuague final y verificación, registro y documentación del proceso)	m2	389,52	$29.800,00	$ 11.607.696,00	389,52	$11.607.696,00
6,3	Lavado y desinfección de cajas de paso. (Incluye preparación para trabajo en condiciones seguras, vaciado, limpieza inicial, Desinfección, enjuague final y verificación, registro y documentación del proceso)	m2	61,63	$19.500,00	$ 1.201.707,00	61,63	$1.201.707,00
6,4	Fumigación para control de insectos voladores y rastreros en áreas externas	und	1,00	$3.600.000,00	$ 3.600.000,00	1,00	$3.600.000,00

7	ILUMINACION						
7,1	Luminaria Led Tipo Reflector Jeta Pro 400w Unv 48000lm 6500K Luz Dia Iluminación Decorativa P29743-36 I2-250825 (Incluye suministro e instalación)	und	4,00	$1.047.823,00	$ 4.191.292,00	4,00	$4.191.292,00
8	NO PREVISTOS						
N.P. 8,01	Extracción de tubería de producción a.c. s/c Ø=6", bomba sumergible 75 hp, motor tipo lapicero y cableado	m	172,00	$78.942,00	$ 13.578.024,00	172,00	$13.578.024,00
N.P. 8,02	Mantenimiento preventivo de pozo profundos abastecedores del macroacueducto municipal, revisión de elementos, aplicación de químico desincrustante, lavado con inyección de aire a presión.	und	2,00	$3.499.767,00	$ 6.999.534,00	2,00	$6.999.534,00
N.P. 8,03	Bomba sumergible tipo lapicero marca STS Acero modular fundición, impulsores y eje en acero inoxidable, 2 Etapas, con caudal de 56 Lts a 81MCA 6" descarga, sin cheque, Suministro e instalación.	und	1,00	$20.887.207,00	$ 20.887.207,00	1,00	$20.887.207,00
N.P. 8,04	Motor sumergible Tipo Lapicero pozo profundo 75 HP, 460 Voltios, 60HZ, 3500 RPM, suministro e instalación.	und	1,00	$51.636.186,00	$ 51.636.186,00	1,00	$51.636.186,00

N.P. 8,05	Bomba sumergible tipo lapicero Acero Inox laminar Modelo SSI 3 Etapas, con caudal de 53 Lts a 81 MCA 6" descarga, incluye cheque, Suministro e instalación.	und	1,00	$14.578.009,00	$ 14.578.009,00	1,00	$14.578.009,00
N.P. 8,06	Motor sumergible Tipo Lapicero pozo profundo 75 HP, 460 Voltios, 60HZ, 3500 RPM, suministro e instalación.	und	1,00	$51.636.186,00	$ 51.636.186,00	1,00	$51.636.186,00
N.P. 8,07	Instalación de tuberia de producción a.c. s/c Ø=6, bomba sumergible 75hp, motor tipo lapicero y cableado	m	172,00	$78.942,00	$ 13.578.024,00	172,00	$13.578.024,00

N.P. 8,08	Sistema de dosificación de cloro a vacio, para ser instalado en la válvula de ¾" del cilindro de 68 kg de cloro o sobre el distribuidor múltiple, con todos sus accesorios estándar e incluyendo lo siguiente: * Unidad de control manual para regular la dosificación de cloro con rotámetro integrado y con sus respectivos racores de ⅜" para conectar las mangueras de inyección y desfogue (venteo) * Un (1) eyector de ¾" de diámetro de garganta fija, con sus respectivas boquillas. * Diez (10) empaques de plomo. * Un (1) tapón malla protectora para manguera de venteo. * Siete (7) metros de manguera en polietileno de ⅜" para línea de cloro y desfogue o venteo. * Una (1) llave universal y un (1) frasco de 100 ml de amoniaco para detectar fugas de cloro. * Un (1) filtro de entrada VRA-5010. * Manual de operación y mantenimiento. Capacidad: 0 a 100 libras/dia (2 kg/h). Referencia AI471C (Incluye instalacion)	und	1,00	$12.233.200,00	$ 12.233.200,00	1,00	$12.233.200,00
	VALORES DIRECTO				**$723.148.961,35**		**$723.148.961,35**
	ADMINISTRACION (25.5%)				$184.402.985,14		$184.402.985,14
	IMPREVISTOS (2%)				$14.462.979,23		$14.462.979,23
	UTILIDAD (5%)				$36.157.448,07		$36.157.448,07
	VALOR TOTAL OBRAS				**$958.172.373,79**		**$958.172.373,79**
	VALOR TOTAL OBRAS (AJUSTADO AL PESO)				**$958.172.374,00**		**$958.172.374,00**

SUMAS IGUALES

Valor del contrato inicial	$729.130.856,00	
Valor pago parcial 1		$222.709.341.00
Valor pago parcial 2		$437.832.296,04
Valor adicional	$ 229.083.450,00	
Saldo a favor de Espavi	$ 41.932,00	
Valor pendiente		$ 297.630.736,96
Total	$958,172,374,00	$958,172,374,00

5. CONCLUSION

En el periodo comprendido del 12 de diciembre de 2025 al 11 de mayo de 2026 el contratista llevo el desarrollo de las actividades presentadas en el informe, enmarcadas en el contrato 320.11.053-2025, cumpliendo con un avance corresponde al 100 % de las labores asociadas al contrato,


Se emplearon materiales que cumplieran con los estándares de calidad que exige el contrato y los procesos se han realizado en acompañamiento con la supervisión garantizando que se ejecuten las actividades de la mejor manera.

Por parte de la presente supervisión se realizó acompañamiento constante, verificando el cumplimiento de las actividades ejecutadas.

6. ANEXO FOTOGRAFICO DESCRIPTIVO



Registro fotográfico 1

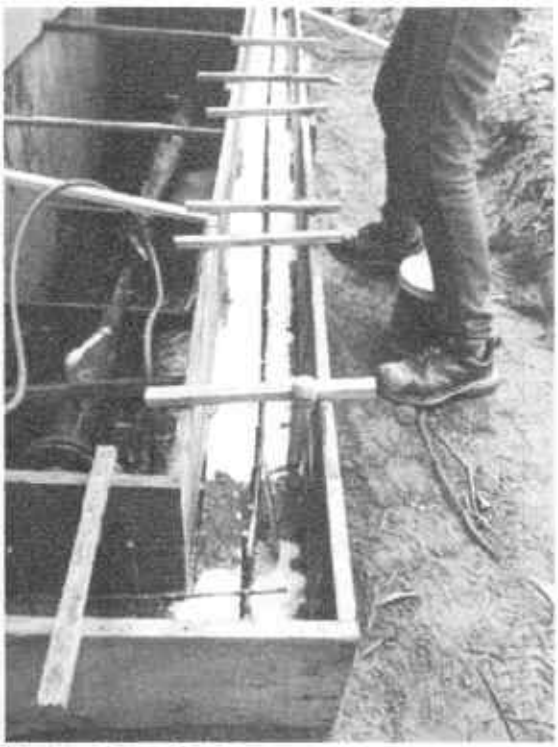

Registro fotográfico 2



Registro fotográfico 3



Registro fotográfico 4



Registro fotográfico 5



Registro fotográfico 6



Registro fotográfico 7



Registro fotográfico 8



Registro fotográfico 8



Registro fotográfico 9



Registro fotográfico 10



Registro fotográfico 11




Registro fotográfico 12



Registro fotográfico 13



Registro fotográfico 14

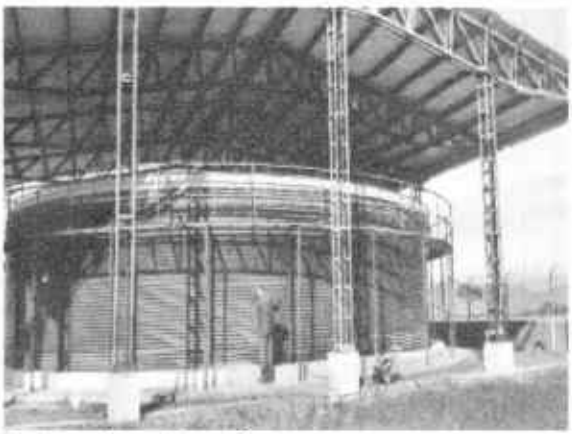

Registro fotográfico 15



Registro fotográfico 16



Registro fotográfico 17



Registro fotográfico 18



Registro fotográfico 19



Registro fotográfico 20



Registro fotográfico 21





Registro fotográfico 22



Registro fotográfico 23



Registro fotográfico 24



Registro fotográfico 25



Registro fotográfico 26

Registro fotográfico 27



Registro fotográfico 28



Registro fotográfico 29



Registro fotográfico 30



Registro fotográfico 31



Registro fotográfico 32



Registro fotográfico 33



Registro fotográfico 34



Registro fotográfico 35



Registro fotográfico 36



Registro fotográfico 37



Registro fotográfico 38



Registro fotográfico 39



Registro fotográfico 40



Registro fotográfico 41






Registro fotográfico 42



Registro fotográfico 43



Registro fotografico 44

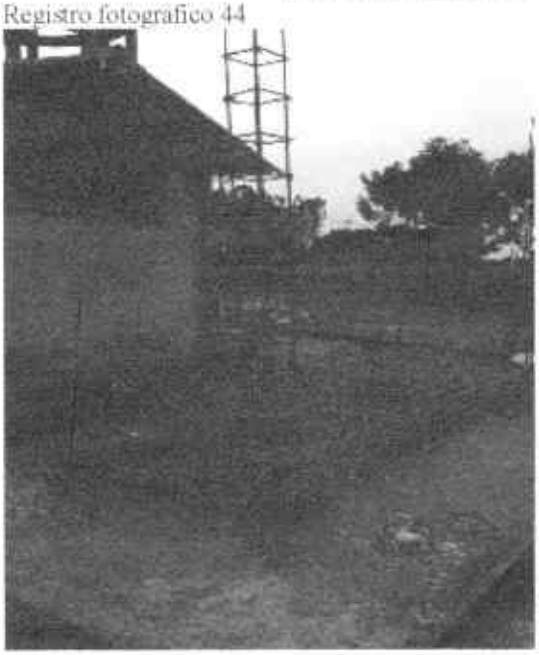


Registro fotográfico 45



Registro fotográfico 46



Registro fotográfico 47

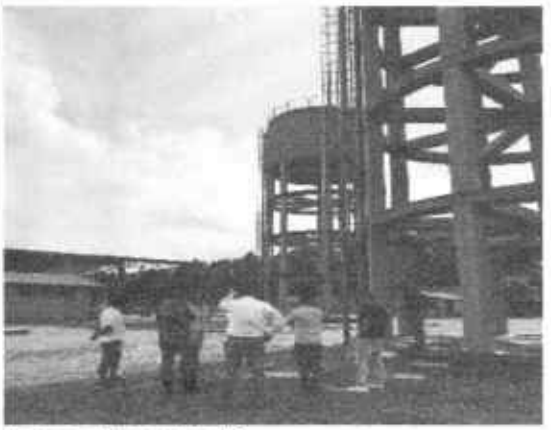

Registro fotográfico 48



Registro fotográfico 49



Registro fotográfico 50

Villanueva Casanare, 28 de mayo de 2026.

OSCAR HERNANDO FRANCO MEJIA
GERENTE
SUPERVISOR

HUGO RICARDO PEDRAZA CARO
CPS 320.11.002-2026
Apoyo a la supervisión

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que LAURA CAMILA MONDRAGON MARTINEZ identificado(a) con CC 1118196404 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: SUMINISTROS INGENIERIA Y MONTAJES DE COLOMBIA S. A. S ZONAC NI 901360205																								
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades														
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	ect	irl	vip
9495999767	1980698440	E	2025-12-04	EPS	EPS001	ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9495999767	1980698440	E	2025-12-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9495999767	1980698440	E	2025-12-04	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9495999767	1980698440	E	2025-12-04	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	

Este certificado se expide el día 2026-05-05 a las 14:05.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que LAURA CAMILA MONDRAGON MARTINEZ identificado(a) con CC 1118196404 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: SUMINISTROS INGENIERIA Y MONTAJES DE COLOMBIA S. A. S ZOMAC NI 901360205

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9497899915	2084305931	E	2026-01-15	EPS	EPS001	ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9497899915	2084305931	E	2026-01-15	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9497899915	2084305931	E	2026-01-15	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9497899915	2084305931	E	2026-01-15	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	

APORTANTE: CONSORCIO MACRO NI 902013398

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9497129876	2044565373	E	2025-12-29	EPS	EPS001	ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	20	X																
9497129876	2044565373	E	2025-12-29	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	20	X																
9497129876	2044565373	E	2025-12-29	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	20	X																
9497129876	2044565373	E	2025-12-29	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	20	X																

Este certificado se expide el día 2026-05-05 a las 14:05.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que LAURA CAMILA MONDRAGON MARTINEZ identificado(a) con CC 1118196404 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: SUMINISTROS INGENIERIA Y MONTAJES DE COLOMBIA S. A. S ZOMAC NI 901360205

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades
										ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip
9499374328	43692095	E	2026-02-09	EPS	EPS001	ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30	X
9499374328	43692095	E	2026-02-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30	X
9499374328	43692095	E	2026-02-09	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30	X
9499374328	43692095	E	2026-02-09	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30	X

APORTANTE: CONSORCIO MACRO NI 902013398

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades
										ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip
9499237929	40171827	E	2026-02-05	EPS	EPS001	ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30	X
9499237929	40171827	E	2026-02-05	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30	X
9499237929	40171827	E	2026-02-05	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30	X
9499237929	40171827	E	2026-02-05	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30	X

Este certificado se expide el día 2026-05-05 a las 14:05.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que LAURA CAMILA MONDRAGON MARTINEZ identificado(a) con CC 1118196404 realizó los siguientes aportes al Sistema de Segundad Social.

APORTANTE: SUMINISTROS INGENIERIA Y MONTAJES DE COLOMBIA S. A. S ZOMAC NI 901360205

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip					
9501251090	127293215	E	2026-03-10	EPS	EPS001	ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30																	
9501251090	127293215	E	2026-03-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																	
9501251090	127293215	E	2026-03-10	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																	
9501251090	127293215	E	2026-03-10	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																	

APORTANTE: CONSORCIO MACRO NI 902013398

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip					
9501251034	127286016	E	2026-03-10	EPS	EPS001	ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30																	
9501251034	127286016	E	2026-03-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																	
9501251034	127286016	E	2026-03-10	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																	
9501251034	127286016	E	2026-03-10	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																	

Este certificado se expide el día 2026-05-05 a las 14:05.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que LAURA CAMILA MONDRAGON MARTINEZ identificado(a) con CC 1118196404 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: CONSORCIO MACRO NI 902013398

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades
9504688444	310357862	E	2026-05-15	EPS	EPS001	ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30	
9504688444	310357862	E	2026-05-15	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30	
9504688444	310357862	E	2026-05-15	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30	
9504688444	310357862	E	2026-05-15	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30	

APORTANTE: SUMINISTROS INGENIERIA Y MONTAJES DE COLOMBIA S. A. S ZOMAC NI 901360205

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades
9503043669	220877139	E	2026-04-14	EPS	EPS001	ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30	
9503043669	220877139	E	2026-04-14	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30	
9503043669	220877139	E	2026-04-14	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30	
9503043669	220877139	E	2026-04-14	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30	

Este certificado se expide el día 2026-05-26 a las 15:05.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que LAURA CAMILA MONDRAGON MARTINEZ identificado(a) con CC 1118196404 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: CONSORCIO MACRO NI 902013398

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades
9504688359	9504688359	E	2026-05-15	EPS	EPS001	ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30	
9504688359	9504688359	E	2026-05-15	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30	
9504688359	9504688359	E	2026-05-15	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30	
9504688359	9504688359	E	2026-05-15	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30	

APORTANTE: SUMINISTROS INGENIERIA Y MONTAJES DE COLOMBIA S. A. S ZOMAC NI 901360205

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades
9504463952	289139177	E	2026-05-07	EPS	EPS001	ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30	
9504463952	289139177	E	2026-05-07	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30	
9504463952	289139177	E	2026-05-07	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30	
9504463952	289139177	E	2026-05-07	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30	

Este certificado se expide el día 2026-05-26 a las 15:05.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JUAN RAMON BULLA NEIRA identificado(a) con CC 7061622 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: PRIMEX CONSTRUCCIONES SAS NI 900506930

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	ect	trl	esp
9497606676	2063160379	E	2026-01-06	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9497606676	2063160379	E	2026-01-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9497606676	2063160379	E	2026-01-06	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9497606676	2063160379	E	2026-01-06	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	

APORTANTE: SUMINISTROS INGENIERIA Y MONTAJES DE COLOMBIA S. A. S ZOMAC NI 901360205

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	ect	trl	esp
9495999767	1980698440	E	2025-12-04	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	5		X															
9495999767	1980698440	E	2025-12-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	5		X															
9495999767	1980698440	E	2025-12-04	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	5		X															
9495999767	1980698440	E	2025-12-04	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	5		X															

Este certificado se expide el día 2026-05-05 a las 09:05.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JUAN RAMON BULLA NEIRA identificado(a) con CC 7061622 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: PRIMEX CONSTRUCCIONES SAS NI 900506930

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9497606679	2063160379	E	2026-01-06	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9497606679	2063160379	E	2026-01-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9497606679	2063160379	E	2026-01-06	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9497606679	2063160379	E	2026-01-06	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	

APORTANTE: CONSORCIO MACRO NI 902013398

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9497129876	2044565373	E	2025-12-29	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	20	X																
9497129876	2044565373	E	2025-12-29	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	20	X																
9497129876	2044565373	E	2025-12-29	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	20	X																
9497129876	2044565373	E	2025-12-29	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	20	X																

Este certificado se expide el día 2026-05-05 a las 09:05.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JUAN RAMON BULLA NEIRA identificado(a) con CC 7061622 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: PRIMEX CONSTRUCCIONES SAS NI 900506930

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	vt	vip
9501152149	83093243	E	2026-03-09	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30							X										
9501152149	83093243	E	2026-03-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30							X										
9501152149	83093243	E	2026-03-09	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30							X										
9501152149	83093243	E	2026-03-09	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30							X										

APORTANTE: CONSORCIO MACRO NI 902013398

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	vt	vip
9499237929	40171827	E	2026-02-05	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACION OBLIGATORIA	2026-02	30																	
9499237929	40171827	E	2026-02-05	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9499237929	40171827	E	2026-02-05	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9499237929	40171827	E	2026-02-05	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	

Este certificado se expide el día 2026-05-05 a las 09:05.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JUAN RAMON BULLA NEIRA identificado(a) con CC 7061622 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: CONSORCIO MACRO NI 902013398																													
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Codigo	Administradora	Concepto	Periodo	Dias	Novedades																			
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9501251034	127286016	E	2026-03-10	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30																				
9501251034	127286016	E	2026-03-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																				
9501251034	127286016	E	2026-03-10	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																				
9501251034	127286016	E	2026-03-10	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																				
APORTANTE: PRIMEX CONSTRUCCIONES SAS NI 900506930																													
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Codigo	Administradora	Concepto	Periodo	Dias	Novedades																			
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9501152125	18671415	E	2026-03-09	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30																				
9501152125	18671415	E	2026-03-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																				
9501152125	18671415	E	2026-03-09	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																				
9501152125	18671415	E	2026-03-09	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																				

Este certificado se expide el día 2026-05-05 a las 09:05.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JUAN RAMON BULLA NEIRA identificado(a) con CC 7061622 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: CONSORCIO MACRO NI 902013398																								
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Codigo	Administradora	Concepto	Periodo	Dias	Novedades														
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9504688444	310357862	E	2026-05-15	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30																	
9504688444	310357862	E	2026-05-15	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30																	
9504688444	310357862	E	2026-05-15	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30																	
9504688444	310357862	E	2026-05-15	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30																	

Este certificado se expide el día 2026-05-26 a las 15:05.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JUAN RAMON BULLA NEIRA identificado(a) con CC 7061622 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: CONSORCIO MACRO NI 902013398																										
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	irp	rcf	vti	nip
9504688359	9504688359	E	2026-05-15	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30																	
9504688359	9504688359	E	2026-05-15	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30																	
9504688359	9504688359	E	2026-05-15	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30																	
9504688359	9504688359	E	2026-05-15	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30																	

Este certificado se expide el día 2026-05-26 a las 15:05.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que CARLOS EDUARDO AMAYA AGUIRRE identificado(a) con CC 1118197251 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: AMAYA AGUIRRE CARLOS EDUARDO CC 1118197251																										
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9498216901	1189286	I	2026-01-22	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30		X															
9498216901	1189286	I	2026-01-22	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30		X															
9498216901	1189286	I	2026-01-22	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30		X															

Este certificado se expide el día 2026-05-05 a las 09:05.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que CARLOS EDUARDO AMAYA AGUIRRE identificado(a) con CC 1118197251 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: CONSORCIO MACRO NI 902013398																												
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																		
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	vt	vip
9497129876	2044565373	E	2025-12-29	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	20	X																		
9497129876	2044565373	E	2025-12-29	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	20	X																		
9497129876	2044565373	E	2025-12-29	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	20	X																		
9497129876	2044565373	E	2025-12-29	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	20	X																		

Este certificado se expide el día 2026-05-05 a las 09:05.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que CARLOS EDUARDO AMAYA AGUIRRE identificado(a) con CC 1118197251 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: CONSORCIO MACRO NI 902013398																										
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9499237929	40171827	E	2026-03-05	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																	
9499237929	40171827	E	2026-02-05	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACION OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9499237929	40171827	E	2026-02-05	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	
9499237929	40171827	E	2026-02-05	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																	

Este certificado se expide el día 2026-05-05 a las 10:05.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que CARLOS EDUARDO AMAYA AGUIRRE identificado(a) con CC 1118197251 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: CONSORCIO MACRO NI 902013398																								
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades														
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9501251034	127286016	E	2026-03-10	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30															
9501251034	127286016	E	2026-03-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30															
9501251034	127286016	E	2026-03-10	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30															
9501251034	127286016	E	2026-03-10	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30															

Este certificado se expide el día 2026-05-05 a las 10:05.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que CARLOS EDUARDO AMAYA AGUIRRE identificado(a) con CC 1118197251 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: CONSORCIO MACRO NI 902013398																								
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades														
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	vst	vsi	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9504688444	310357862	E	2026-05-15	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30																	
9504688444	310357862	E	2026-05-15	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30																	
9504688444	310357862	E	2026-05-15	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30																	
9504688444	310357862	E	2026-05-15	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30																	

Este certificado se expide el día 2026-05-26 a las 15:05.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que CARLOS EDUARDO AMAYA AGUIRRE identificado(a) con CC 1118197251 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: CONSORCIO MACRO NI 902013398																										
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9504688359	9504688359	E	2026-05-15	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30																	
9504688359	9504688359	E	2026-05-15	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30																	
9504688359	9504688359	E	2026-05-15	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30																	
9504688359	9504688359	E	2026-05-15	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30																	

Este certificado se expide el día 2026-05-26 a las 15:05.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que EDGAR FERNANDO CUBIDES CUBIDES identificado(a) con CC 1118203780 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: CONSORCIO MACRO NI 902013398

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9499237929	40171827	E	2026-02-05	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	7										X							
9499237929	40171827	E	2026-02-05	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	23							X										
9499237929	40171827	E	2026-02-05	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	7										X							
9499237929	40171827	E	2026-02-05	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	23							X										
9499237929	40171827	E	2026-02-05	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	7										X							
9499237929	40171827	E	2026-02-05	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	23							X										
9499237929	40171827	E	2026-02-05	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	7										X							
9499237929	40171827	E	2026-02-05	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	23							X										

Este certificado se expide el día 2026-05-05 a las 10:05.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que EDGAR FERNANDO CUBIDES CUBIDES identificado(a) con CC 1118203780 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: CONSORCIO MACRO NI 902013398																												
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																		
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9501251034	127286016	E	2026-03-10	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	13		X																	
9501251034	127286016	E	2026-03-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	13		X																	
9501251034	127286016	E	2026-03-10	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	13		X																	
9501251034	127286016	E	2026-03-10	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	13		X																	

Este certificado se expide el día 2026-05-05 a las 10:05.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JUAN GUILLERMO CARO VEGA identificado(a) con CC 1129244201 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: FABRICACION MONTAJES & MANTENIMIENTOS YR SAS NI 901955693																										
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9495937293	9495937293	E	2025-12-19	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	
9495937293	9495937293	E	2025-12-19	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9495937293	9495937293	E	2025-12-19	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	
9495937293	9495937293	E	2025-12-19	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	

Este certificado se expide el día 2026-05-05 a las 10:05.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JUAN GUILLERMO CARO VEGA identificado(a) con CC 1129244201 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: CONSORCIO MACRO NI 902013398

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9499238585	126997817	N	2026-03-10	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	9	X							A									
9499238585	126997817	N	2026-03-10	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	9	X							C	X								
9497129876	2044565373	E	2025-12-29	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	9	X																
9499238585	126997817	N	2026-03-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	9	X							A									
9499238585	126997817	N	2026-03-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	9	X							C	X								
9499238585	126997817	N	2026-03-10	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	9	X							A									
9499238585	126997817	N	2026-03-10	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	9	X							C	X								
9499238585	126997817	N	2026-03-10	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	9	X							A									
9499238585	126997817	N	2026-03-10	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	9	X							C	X								
9497129876	2044565373	E	2025-12-29	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	9	X																
9497129876	2044565373	E	2025-12-29	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	9	X																
9497129876	2044565373	E	2025-12-29	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	9	X																

APORTANTE: FABRICACION MONTAJES & MANTENIMIENTOS YR SAS NI 901955693

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9497712910	9497712910	E	2026-01-09	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	13		X															
9497712910	9497712910	E	2026-01-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	13		X															
9497712910	9497712910	E	2026-01-09	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	13		X															
9497712910	9497712910	E	2026-01-09	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	13		X															

Este certificado se expide el día 2026-05-05 a las 10:05.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JUAN GUILLERMO CARO VEGA identificado(a) con CC 1129244201 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: CONSORCIO MACRO NI 902013398																													
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																			
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9499237929	40171827	E	2026-02-05	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	4										X										
9499237929	40171827	E	2026-02-05	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	26							X													
9499237929	40171827	E	2026-02-05	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	4										X										
9499237929	40171827	E	2026-02-05	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	26							X													
9499237929	40171827	E	2026-02-05	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	4										X										
9499237929	40171827	E	2026-02-05	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	26							X													
9499237929	40171827	E	2026-02-05	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	4										X										
9499237929	40171827	E	2026-02-05	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	26							X													

Este certificado se expide el día 2026-05-05 a las 10:05.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JUAN GUILLERMO CARO VEGA identificado(a) con CC 1129244201 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: CONSORCIO MACRO Nit 902013398																										
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	cnp
9501251034	127286016	E	2026-03-10	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	27		X															
9501251034	127286016	E	2026-03-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	27		X															
9501251034	127286016	E	2026-03-10	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	27		X															
9501251034	127286016	E	2026-03-10	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	27		X															

Este certificado se expide el día 2026-05-05 a las 10:05.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que DIEGO ALEJANDRO BAUTISTA JIMENEZ identificado(a) con CC 1118168856 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: CONSORCIO MACRO NI 902013398

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9499238585	126997817	N	2026-03-10	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACION OBLIGATORIA	2026-01	16	X	X						A									
9499238585	126997817	N	2026-03-10	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACION OBLIGATORIA	2026-01	16	X	X						C	X								
9497129876	2044565373	E	2025-12-29	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	16	X	X															
9499238585	126997817	N	2026-03-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	16	X	X						A									
9499238585	126997817	N	2026-03-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	16	X	X						C	X								
9499238585	126997817	N	2026-03-10	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	16	X	X						A									
9499238585	126997817	N	2026-03-10	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	16	X	X						C	X								
9499238585	126997817	N	2026-03-10	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	16	X	X						A									
9499238585	126997817	N	2026-03-10	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	16	X	X						C	X								
9497129876	2044565373	E	2025-12-29	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	16	X	X															
9497129876	2044565373	E	2025-12-29	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	16	X	X															
9497129876	2044565373	E	2025-12-29	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	16	X	X															

Este certificado se expide el día 2026-05-05 a las 10:05.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JUAN MANUEL BOHORQUEZ GUZMAN identificado(a) con CC 1129244236 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: CONSORCIO MACRO NIT 902013398

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vsp	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9499238585	126997817	N	2026-03-10	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	7	X	X						A									
9499238585	126997817	N	2026-03-10	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	7	X	X						C	X								
9497129876	2044565373	E	2025-12-29	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	7	X	X															
9499238585	126997817	N	2026-03-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	7	X	X						A									
9499238585	126997817	N	2026-03-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	7	X	X						C	X								
9499238585	126997817	N	2026-03-10	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	7	X	X						A									
9499238585	126997817	N	2026-03-10	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	7	X	X						C	X								
9499238585	126997817	N	2026-03-10	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	7	X	X						A									
9499238585	126997817	N	2026-03-10	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	7	X	X						C	X								
9497129876	2044565373	E	2025-12-29	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	7	X	X															
9497129876	2044565373	E	2025-12-29	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	7	X	X															
9497129876	2044565373	E	2025-12-29	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	7	X	X															

Este certificado se expide el día 2026-05-05 a las 10:05.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que KEVIN SEBASTIAN MONTENEGRO MONTENEGRO identificado(a) con CC 1049794255 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: CONSORCIO MACRO NI 902013398

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	sup
9499238585	126997817	N	2026-03-10	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	9	X	X						A									
9499238585	126997817	N	2026-03-10	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	8	X	X						C	X								
9499238585	126997817	N	2026-03-10	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	1								C		X							
9497129876	2044565373	E	2025-12-29	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	9	X	X															
9499238585	126997817	N	2026-03-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	9	X	X						A									
9499238585	126997817	N	2026-03-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	8	X	X						C	X								
9499238585	126997817	N	2026-03-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	1								C		X							
9499238585	126997817	N	2026-03-10	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	9	X	X						A									
9499238585	126997817	N	2026-03-10	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	8	X	X						C	X								
9499238585	126997817	N	2026-03-10	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	1								C		X							
9499238585	126997817	N	2026-03-10	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	9	X	X						A									
9499238585	126997817	N	2026-03-10	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	8	X	X						C	X								
9499238585	126997817	N	2026-03-10	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	1								C		X							
9497129876	2044565373	E	2025-12-29	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	9	X	X															
9497129876	2044565373	E	2025-12-29	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	9	X	X															
9497129876	2044565373	E	2025-12-29	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	9	X	X															

Este certificado se expide el día 2026-05-05 a las 14:05.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que MIGUEL ANGEL BORDA BOHORQUEZ identificado(a) con CC 1050605322 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: CONSORCIO MACRO NI 902013398																												
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																		
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9499238585	126997817	N	2026-03-10	EPS	EPSC25	CAPRESOCA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	7	X							A										
9499238585	126997817	N	2026-03-10	EPS	EPSC25	CAPRESOCA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	7	X							C	X									
9497129876	2044565373	E	2025-12-29	EPS	EPSC25	CAPRESOCA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	7	X																	
9499238585	126997817	N	2026-03-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	7	X							A										
9499238585	126997817	N	2026-03-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	7	X							C	X									
9499238585	126997817	N	2026-03-10	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	7	X							A										
9499238585	126997817	N	2026-03-10	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	7	X							C	X									
9499238585	126997817	N	2026-03-10	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	7	X							A										
9499238585	126997817	N	2026-03-10	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	7	X							C	X									
9497129876	2044565373	E	2025-12-29	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	7	X																	
9497129876	2044565373	E	2025-12-29	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	7	X																	
9497129876	2044565373	E	2025-12-29	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	7	X																	

Este certificado se expide el día 2026-05-05 a las 10:05.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que MIGUEL ANGEL BORDA BOHORQUEZ identificado(a) con CC 1050605322 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: CONSORCIO MACRO NI 902013398																										
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	ecl	irl	vip
9499237929	40171827	E	2026-02-05	EPS	EPSC25	CAPRESOCA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	7										X							
9499237929	40171827	E	2026-02-05	EPS	EPSC25	CAPRESOCA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	14		X					X										
9499237929	40171827	E	2026-02-05	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	7										X							
9499237929	40171827	E	2026-02-05	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	14		X					X										
9499237929	40171827	E	2026-02-05	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	7										X							
9499237929	40171827	E	2026-02-05	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	14		X					X										
9499237929	40171827	E	2026-02-05	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	7										X							
9499237929	40171827	E	2026-02-05	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	14		X					X										

Este certificado se expide el día 2026-05-05 a las 10:05.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que RONALDO ANTONIO UYABAN identificado(a) con CC 7361738 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: PRIMEX CONSTRUCCIONES SAS NI 900506930																												
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																		
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9497606676	2063160379	E	2026-01-06	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	5		X																	
9497606676	2063160379	E	2026-01-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	5		X																	
9497606676	2063160379	E	2026-01-06	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	5		X																	
9497606676	2063160379	E	2026-01-06	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	5		X																	

Este certificado se expide el día 2026-05-05 a las 15:05.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que RONALDO ANTONIO UYABAN identificado(a) con CC 7361738 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: CONSORCIO MACRO NI 902013398																												
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Codigo	Administradora	Concepto	Periodo	Dias	Novedades																		
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9499238585	126997817	N	2026-03-10	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	16	X							A									
9499238585	126997817	N	2026-03-10	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	16	X							C	X								
9497129876	2044565373	E	2025-12-29	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	16	X																
9499238585	126997817	N	2026-03-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	16	X							A									
9499238585	126997817	N	2026-03-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	16	X							C	X								
9499238585	126997817	N	2026-03-10	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	16	X							A									
9499238585	126997817	N	2026-03-10	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	16	X							C	X								
9499238585	126997817	N	2026-03-10	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	16	X							A									
9499238585	126997817	N	2026-03-10	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	16	X							C	X								
9497129876	2044565373	E	2025-12-29	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	16	X																
9497129876	2044565373	E	2025-12-29	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	16	X																
9497129876	2044565373	E	2025-12-29	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	16	X																

Este certificado se expide el día 2026-05-05 a las 15:05.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que RONALDO ANTONIO UYABAN identificado(a) con CC 7361738 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: CONSORCIO MACRO NI 902013398																													
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																			
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9499237929	40171827	E	2026-02-05	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	4										X										
9499237929	40171827	E	2026-02-05	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	28							X													
9499237929	40171827	E	2026-02-05	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	4										X										
9499237929	40171827	E	2026-02-05	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	28							X													
9499237929	40171827	E	2026-02-05	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	4										X										
9499237929	40171827	E	2026-02-05	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	28							X													
9499237929	40171827	E	2026-02-05	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	4										X										
9499237929	40171827	E	2026-02-05	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	28							X													

Este certificado se expide el día 2026-05-05 a las 15:05.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que RONALDO ANTONIO UYABAN identificado(a) con CC 7361738 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: CONSORCIO MACRO Nit 902013398																										
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9501251034	127286016	E	2026-03-10	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30																	
9501251034	127286016	E	2026-03-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																	
9501251034	127286016	E	2026-03-10	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																	
9501251034	127286016	E	2026-03-10	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																	

Este certificado se expide el día 2026-05-05 a las 15:05.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JOSE SANTIAGO GALAN RIAPIRA identificado(a) con CC 1129244334 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: CONSORCIO MACRO Nit 902013398

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9499238585	126997817	N	2026-03-10	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	16	X							A									
9499238585	126997817	N	2026-03-10	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	16	X							C	X								
9497129876	2044565373	E	2025-12-29	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	16	X																
9499238585	126997817	N	2026-03-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	16	X							A									
9499238585	126997817	N	2026-03-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	16	X							C	X								
9499238585	126997817	N	2026-03-10	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	16	X							A									
9499238585	126997817	N	2026-03-10	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	16	X							C	X								
9499238585	126997817	N	2026-03-10	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	16	X							A									
9499238585	126997817	N	2026-03-10	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	16	X							C	X								
9497129876	2044565373	E	2025-12-29	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	16	X																
9497129876	2044565373	E	2025-12-29	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	16	X																
9497129876	2044565373	E	2025-12-29	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	16	X																

Este certificado se expide el día 2026-05-05 a las 11:05.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JOSE SANTIAGO GALAN RIAPIRA identificado(a) con CC 1129244334 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: CONSORCIO MACRO NI 902013398

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vst	irl	vip
9499237929	40171827	E	2026-02-05	EPS	EPS041	NUEVA EPS MOVILIDAD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	6										X							
9499237929	40171827	E	2026-02-05	EPS	EPS041	NUEVA EPS MOVILIDAD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	7		X															
9499237929	40171827	E	2026-02-05	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	6										X							
9499237929	40171827	E	2026-02-05	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	7		X															
9499237929	40171827	E	2026-02-05	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	6										X							
9499237929	40171827	E	2026-02-05	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	7		X															
9499237929	40171827	E	2026-02-05	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	6										X							
9499237929	40171827	E	2026-02-05	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	7		X															

Este certificado se expide el día 2026-05-05 a las 11:05.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JOSE ALEXANDER SALAMANCA BULLA identificado(a) con CC 1129244182 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: CLECOL-CLEAN ECOLOGY S.A.S. NI 901322896																												
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																		
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9496645637	2021279794	E	2025-12-19	EPS	EPSC25	CAPRESOCA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	1		X																	
9496645637	2021279794	E	2025-12-19	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	1		X																	
9496645637	2021279794	E	2025-12-19	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	1		X																	
9496645637	2021279794	E	2025-12-19	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	1		X																	

Este certificado se expide el día 2026-05-05 a las 14:05.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JOSE ALEXANDER SALAMANCA BULLA identificado(a) con CC 1129244182 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: CONSORCIO MACRO NI 902013398

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	epi
9499238585	126997817	N	2026-03-10	EPS	EPSC25	CAPRESOCA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	16	X	X						A									
9499238585	126997817	N	2026-03-10	EPS	EPSC25	CAPRESOCA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	14	X	X						C	X								
9499238585	126997817	N	2026-03-10	EPS	EPSC25	CAPRESOCA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	2								C		X							
9497129876	2044565373	E	2025-12-29	EPS	EPSC25	CAPRESOCA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	16	X	X															
9499238585	126997817	N	2026-03-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	16	X	X						A									
9499238585	126997817	N	2026-03-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	14	X	X						C	X								
9499238585	126997817	N	2026-03-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	2								C		X							
9499238585	126997817	N	2026-03-10	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	16	X	X						A									
9499238585	126997817	N	2026-03-10	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	14	X	X						C	X								
9499238585	126997817	N	2026-03-10	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	2								C		X							
9499238585	126997817	N	2026-03-10	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	16	X	X						A									
9499238585	126997817	N	2026-03-10	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	14	X	X						C	X								
9499238585	126997817	N	2026-03-10	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	2								C		X							
9497129876	2044565373	E	2025-12-29	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	16	X	X															
9497129876	2044565373	E	2025-12-29	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	16	X	X															
9497129876	2044565373	E	2025-12-29	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	16	X	X															

aportes en línea

Certificado de Aportes

APORTANTE: PRIMEX CONSTRUCCIONES SAS NI 900506930

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Codigo	Administradora	Concepto	Periodo	Dias	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9497606679	2063160379	E	2026-01-06	EPS	EPSC25	CAPRESOCA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	12	X	X															
9497606679	2063160379	E	2026-01-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	12	X	X															
9497606679	2063160379	E	2026-01-06	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	12	X	X															
9497606679	2063160379	E	2026-01-06	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	12	X	X															

Este certificado se expide el día 2026-05-05 a las 14:05.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que BRANDOUN ESTEBAN CASTIBLANCO SANDOVAL identificado(a) con CC 1129244141 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: PRIMEX CONSTRUCCIONES SAS NI 900506930

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9497606676	2063160379	E	2026-01-06	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	10	X																
9497606676	2063160379	E	2026-01-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	10	X																
9497606676	2063160379	E	2026-01-06	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	10	X																
9497606676	2063160379	E	2026-01-06	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	10	X																

Este certificado se expide el día 2026-05-05 a las 10:05.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que BRANDOUN ESTEBAN CASTIBLANCO SANDOVAL identificado(a) con CC 1129244141 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: CONSORCIO MACRO NI 902013398

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cue	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9499238585	126997817	N	2026-03-10	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	16	X	X						A									
9499238585	126997817	N	2026-03-10	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	15	X	X						C	X								
9499238585	126997817	N	2026-03-10	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	1								C		X							
9497129876	2044565373	E	2025-12-29	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	16	X	X															
9499238585	126997817	N	2026-03-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	16	X	X						A									
9499238585	126997817	N	2026-03-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	15	X	X						C	X								
9499238585	126997817	N	2026-03-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	1								C		X							
9499238585	126997817	N	2026-03-10	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	16	X	X						A									
9499238585	126997817	N	2026-03-10	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	15	X	X						C	X								
9499238585	126997817	N	2026-03-10	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	1								C		X							
9499238585	126997817	N	2026-03-10	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	16	X	X						A									
9499238585	126997817	N	2026-03-10	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	15	X	X						C	X								
9499238585	126997817	N	2026-03-10	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	1								C		X							
9497129876	2044565373	E	2025-12-29	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	16	X	X															
9497129876	2044565373	E	2025-12-29	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	16	X	X															
9497129876	2044565373	E	2025-12-29	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	16	X	X															

aportes en línea

Certificado de Aportes

APORTANTE: PRIMEX CONSTRUCCIONES SAS NI 900506930

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tda	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	ptp
9497606679	2063160379	E	2025-01-06	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	12		X															
9497606679	2063160379	E	2025-01-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	12		X															
9497606679	2063160379	E	2025-01-06	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	12		X															
9497606679	2063160379	E	2025-01-06	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	12		X															

Este certificado se expide el día 2026-05-05 a las 10:05.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que CARLOS ANDRES GARCIA AMAYA identificado(a) con CC 1124990933 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: CONSORCIO MACRO NI 902013398																											
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9497129876	2044565373	E	2025-12-29	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	1	X	X																
9497129876	2044565373	E	2025-12-29	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	1	X	X																
9497129876	2044565373	E	2025-12-29	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	1	X	X																
9497129876	2044565373	E	2025-12-29	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	1	X	X																

Este certificado se expide el día 2026-05-05 a las 11:05.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que CESAR AUGUSTO ESCOBAR PAEZ identificado(a) con CC 1006534792 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: TEMPORALES INTEGRALES SAS NI 900375602

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9495869314	1975214410	E	2025-12-02	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	1		X							X								
9495869314	1975214410	E	2025-12-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	1		X							X								
9495869314	1975214410	E	2025-12-02	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	1		X							X								
9495869314	1975214410	E	2025-12-02	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	1		X							X								

Este certificado se expide el día 2026-05-05 a las 11:05.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que CESAR AUGUSTO ESCOBAR PAEZ identificado(a) con CC 1006534792 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: CONSORCIO MACRO NI 902013398

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9499238585	126997817	N	2026-03-10	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	16	X							A									
9499238585	126997817	N	2026-03-10	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	15	X							C	X								
9499238585	126997817	N	2026-03-10	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	1								C		X							
9497129876	2044565373	E	2025-12-29	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	16	X																
9499238585	126997817	N	2026-03-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	16	X							A									
9499238585	126997817	N	2026-03-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	15	X							C	X								
9499238585	126997817	N	2026-03-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	1								C		X							
9499238585	126997817	N	2026-03-10	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	16	X							A									
9499238585	126997817	N	2026-03-10	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	15	X							C	X								
9499238585	126997817	N	2026-03-10	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	1								C		X							
9499238585	126997817	N	2026-03-10	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	16	X							A									
9499238585	126997817	N	2026-03-10	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	15	X							C	X								
9499238585	126997817	N	2026-03-10	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	1								C		X							
9497129876	2044565373	E	2025-12-29	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	16	X																
9497129876	2044565373	E	2025-12-29	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	16	X																
9497129876	2044565373	E	2025-12-29	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	16	X																

Este certificado se expide el día 2026-05-05 a las 11:05.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que CESAR AUGUSTO ESCOBAR PAEZ identificado(a) con CC 1006534792 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: CONSORCIO MACRO NI 902013398

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9499237929	40171827	E	2026-02-05	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	6										X							
9499237929	40171827	E	2026-02-05	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	14		X					X										
9499237929	40171827	E	2026-02-05	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	6										X							
9499237929	40171827	E	2026-02-05	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	14		X					X										
9499237929	40171827	E	2026-02-05	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	6										X							
9499237929	40171827	E	2026-02-05	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	14		X					X										
9499237929	40171827	E	2026-02-05	CCF	CCF69	COMPACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	6										X							
9499237929	40171827	E	2026-02-05	CCF	CCF69	COMPACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	14		X					X										

Este certificado se expide el día 2026-05-05 a las 11:05.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que DANIEL SANTIAGO UYABAN VANEGAS identificado(a) con CC 1006533965 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: CONSORCIO MACRO NI 902013398																												
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																		
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9499238585	126997817	N	2026-03-10	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACION OBLIGATORIA	2026-01	16	X							A									
9499238585	126997817	N	2026-03-10	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	16	X							C	X								
9497129876	2044565373	E	2025-12-29	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	16	X																
9499238585	126997817	N	2026-03-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	16	X							A									
9499238585	126997817	N	2026-03-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	16	X							C	X								
9499238585	126997817	N	2026-03-10	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	16	X							A									
9499238585	126997817	N	2026-03-10	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	16	X							C	X								
9499238585	126997817	N	2026-03-10	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	16	X							A									
9499238585	126997817	N	2026-03-10	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	16	X							C	X								
9497129876	2044565373	E	2025-12-29	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	16	X																
9497129876	2044565373	E	2025-12-29	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	16	X																
9497129876	2044565373	E	2025-12-29	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	16	X																

Este certificado se expide el día 2026-05-05 a las 14:05.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que DANIEL SANTIAGO UYABAN VANEGAS identificado(a) con CC 1006533965 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: CONSORCIO MACRO NI 902013398

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9499237929	40171827	E	2026-02-05	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	4										X							
9499237929	40171827	E	2026-02-05	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	26							X										
9499237929	40171827	E	2026-02-05	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	4										X							
9499237929	40171827	E	2026-02-05	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	26							X										
9499237929	40171827	E	2026-02-05	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	4										X							
9499237929	40171827	E	2026-02-05	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	26							X										
9499237929	40171827	E	2026-02-05	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	4										X							
9499237929	40171827	E	2026-02-05	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	26							X										

Este certificado se expide el día 2026-05-05 a las 14:05.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que DANIEL SANTIAGO UYABAN VANEGAS identificado(a) con CC 1006533965 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: CONSORCIO MACRO NI 902013398

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	pvj
9501251034	127286016	E	2026-03-10	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30																	
9501251034	127286016	E	2026-03-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																	
9501251034	127286016	E	2026-03-10	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																	
9501251034	127286016	E	2026-03-10	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																	

Este certificado se expide el día 2026-05-05 a las 14:05.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que DANIEL SANTIAGO UYABAN VANEGAS identificado(a) con CC 1006533965 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: CONSORCIO MACRO NI 902013398																								
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades														
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	ect	irl	vip
9504688444	310357862	E	2026-05-15	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30																	
9504688444	310357862	E	2026-05-15	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30																	
9504688444	310357862	E	2026-05-15	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30																	
9504688444	310357862	E	2026-05-15	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30																	

Este certificado se expide el día 2026-05-26 a las 15:05.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que DANIEL SANTIAGO UYABAN VANEGAS identificado(a) con CC 1006533965 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: CONSORCIO MACRO NI 902013398																									
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades															
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9504688359	9504688359	E	2026-05-15	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30																	
9504688359	9504688359	E	2026-05-15	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30																	
9504688359	9504688359	E	2026-05-15	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30																	
9504688359	9504688359	E	2026-05-15	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30																	

Este certificado se expide el día 2026-05-26 a las 15:05.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que ELIECER SMITH CEPEDA RODRIGUEZ identificado(a) con CC 1057462567 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: SERVIAGROLLANOS S.A.S. NI 900537706																												
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Codigo	Administradora	Concepto	Periodo	Dias	Novedades																		
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9495514218	1976056396	E	2025-12-02	EPS	EPS041	NUEVA EPS MOVILIDAD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	15		X							X									
9495514218	1976056396	E	2025-12-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	15		X							X									
9495514218	1976056396	E	2025-12-02	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	15		X							X									
9495514218	1976056396	E	2025-12-02	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	15		X							X									

Este certificado se expide el día 2026-05-05 a las 10:05.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que ELIECER SMITH CEPEDA RODRIGUEZ identificado(a) con CC 1057462567 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: CONSORCIO MACRO NI 902013398

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vsi	irl	vip
9497129876	2044565373	E	2025-12-29	EPS	EPS041	NUEVA EPS MOVILIDAD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	3	X	X															
9497129876	2044565373	E	2025-12-29	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	3	X	X															
9497129876	2044565373	E	2025-12-29	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	3	X	X															
9497129876	2044565373	E	2025-12-29	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	3	X	X															

Este certificado se expide el día 2026-05-05 a las 10:05.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que EDGAR FERNANDO CUBIDES CUBIDES identificado(a) con CC 1118203780 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: CONSORCIO MACRO NI 902013398

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Codigo	Administradora	Concepto	Periodo	Dias	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	esp
9499238585	126997817	N	2026-03-10	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	16	X							A									
9499238585	126997817	N	2026-03-10	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	14	X							C	X								
9499238585	126997817	N	2026-03-10	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	2								C		X							
9497129876	2044565373	E	2025-12-29	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	16	X																
9499238585	126997817	N	2026-03-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	16	X							A									
9499238585	126997817	N	2026-03-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	14	X							C	X								
9499238585	126997817	N	2026-03-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	2								C		X							
9499238585	126997817	N	2026-03-10	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	16	X							A									
9499238585	126997817	N	2026-03-10	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	14	X							C	X								
9499238585	126997817	N	2026-03-10	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	2								C		X							
9499238585	126997817	N	2026-03-10	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	16	X							A									
9499238585	126997817	N	2026-03-10	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	14	X							C	X								
9499238585	126997817	N	2026-03-10	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	2								C		X							
9497129876	2044565373	E	2025-12-29	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	16	X																
9497129876	2044565373	E	2025-12-29	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	16	X																
9497129876	2044565373	E	2025-12-29	CCF	CCF69	COMFACASANARE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	16	X																

Este certificado se expide el día 2026-05-05 a las 10:05.

ESPAVI S.A. E.S.P NIT. 900.262.261-4	**ESPAVI S.A. E.S.P** **PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA** **OFICIO**	**CÓDIGO:** F-GA-006 **FECHA:** 01/06/2022 **VERSIÓN:** 01 **PÁGINAS:** ___DE___

100.12.02-574

Villanueva, Casanare, 25 de mayo de 2026

Doctor
JHON JAIRO ECHEVARRIA PEREZ
Personero Municipal
Villanueva Casanare
Email: personeria@villanueva-casanare.gov.co

Referencia: Contrato de Obra N° 320.11.053-2025. OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS AEROPUERTO, TRIUNFO, ENCANTO, HORQUETON, Y CARACOLIA DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE.

Asunto: Solicitud de Información.

Cordial saludo,

En atención de las obligaciones como Supervisor del contrato de la referencia, y dado que actualmente se adelantan los trámites correspondientes para el recibo y liquidación del contrato, de manera atenta solicito de su valiosa colaboración con la siguiente información:

- Informar a esta dependencia si han sido radicadas a su despacho peticiones, quejas o reclamaciones respecto de incumplimientos en el pago y/o pasivos con trabajadores o proveedores de bienes y servicios por parte de CONSORCIO MACRO representada Legalmente por LAURA CAMILA MONDRAGON MARTINEZ en desarrollo del contrato de la referencia.

Agradezco su valiosa colaboración, sin otro particular,

OSCAR HERNANDO FRANCO MEJIA
Gerente ESPAVI S.A. E.S.P

PERSONERÍA MUNICIPAL
VILLANUEVA CASANARE
Tus Derechos, Nuestra Razón de Ser
RECIBIDO
FECHA 28/05/2026 HORA 10:73 am
FOLIOS 20 RADICADO 347
FIRMA

Elaboró:

Proyectó: Hugo Ricardo Pedraza Caro
CPS 320.11.004-2025
Apoyo a la supervisión

EL SUSCRITO PERSONERO MUNICIPAL DE VILLANUEVA CASANARE

INFORMA QUE:

Mediante oficio 100.12.02.574 del 25 de mayo del 2026, radicado internamente bajo el número 347 del 28 de mayo del 2026, por medio del cual se solicita información referente a quejas, peticiones y/o reclamos de pasivos laborales o pasivos de proveedores relacionados con el contrato de obra No 320.11.053-2025, cuyo objeto es la "**OPTIMIZACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS AEROPUERTO, TRIUNFO, ENCANTO, HORQUETON Y CARACOLI DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE.**"

En atención a lo anterior, este Despacho procede a realizar la respectiva verificación.

Una vez revisada nuestra base de datos, **NO** se encuentra ninguna queja petición o reclamos de pasivos laborales o pasivos de proveedores que guarden relación con el contrato de la referencia.

Es importante señalar que este documento no se considera como un "paz y salvo" por parte del Municipio y/o la Personería de Villanueva, ya que se expide únicamente en función de la información disponible en la Personería Municipal. Por lo tanto, se desconoce si existen quejas o reclamaciones al respecto ante otros entes de control, entidades administrativas y/o judiciales de orden local, departamental o nacional.

El presente documento se expide a solicitud del ingeniero Oscar Hernando Franco Mejía, para los trámites de liquidación del contrato mencionado.

Dada en Villanueva Casanare, a los once (11) días de mes de junio de dos mil veintiséis (2026).

JHON JAIRO ECHEVERRÍA PÉREZ
Personero Municipal

Proyectó: Edith Leguizamo salamanca
Secretaria
