FECHA (D/M/A): 06/03/26

BITACORA DE OBRA

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Mantenimiento puntual
RANGO:	1
CANTIDAD:	10,04 T
ZONA	3
COMUNA	9
BARRIO	La Milagrosa
FRENTE DE TRABAJO:	6

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 07:00h	—
TERMINACIÓN: 17:00h	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA	Soleado
TARDE	Soleado

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Se adelanta recorrido para identificar intervenciones en la zona, se continua con las actividades de fresado, demolición, limpieza, imprimación, instalación y compactación de 10,04 cm en un área de 92,14 cm todos los requerimientos necesarios para una correcta aplicación, el resto de actividades se desarrollaron sin novedad.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Alfredo [illegible] Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Alexa María López Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Fernando Rodriguez Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: José Luis Guzmán A. Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

FECHA (D/M/A): 06/03/26

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULA
1	Tecnólogo/Ingeniero	Alejandro Riquelme	X		
2	Encargado				
3	Liguero	Yeimin Marquez	X		
4	Rastrillero	Camilo Marquez	X		
5	Rastrillero				
6	Ayudante	Jeferson Correa		X	
7	Ayudante	Yuner Mejia	X		
8	Ayudante	Sebastian Vallejo	X		
9	Ayudante	Jorge Urian	X		
10	Ayudante				
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual	Luis Emiro Marquez	X		
17	Operador compresor	Jubel Ramirez	X		
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Hector Moreno	X		
29	Conductor Volqueta(s)	Yuranny Gonzales	X		
30	Apoyo de transito		X		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual	EC 771	1		
2	Compresor	Dynapac CP	1		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Mamita	1		
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	Foton WCU 774	1		
16	Volqueta(s)	International UPE121	1		

FECHA (D/M/A): 06/03/22

5. CÁLCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO PUNTOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (M)	X (M)	e (M)	ÁREA (M2)	VOL (M3)	TON (TN)
SW 3332	167321	1A	CL 34A CR 30A-53	0,85	3,40	0,07/81	2,35	0,25	0,61
SW 3332	167321	1B	CL 34A CR 30A-53	3,85	3,60	0,07/81	13,21	1,37	3,34
SW 3332	167320	2A	CL 34A CR 30A-55	3,10	3,50	0,07/81	10,85	1,08	2,60
SW 3332	167320	2B	CL 34A CR 30A-55	0,75	2,35	0,07/81	2,04	0,21	0,49
SW 3332	167319	3	CL 34A CR 30A-57	2,30	3,50	0,07/81	8,17	0,90	2,15
TOTALES							42,19	4,31	10,49

MEZCLA ASFÁLTICA


REMISIÓN No.	PLACA VOLQ.	CANT. (TON)	ACUM. (TON)	TEMP. (°C)
236542	[illegible]	14,09		141


NOTA DE DESPACHO

REMISIÓN No.	PLACA VOLQ.	TIPO (NORMAL/DIESEL)	No. VIAJES	OTRO (ESPECIFICAR)
29794	WEE 121	S	1	Parcial

FECHA (D/M/A): 06/03/26

10. ESQUEMAS

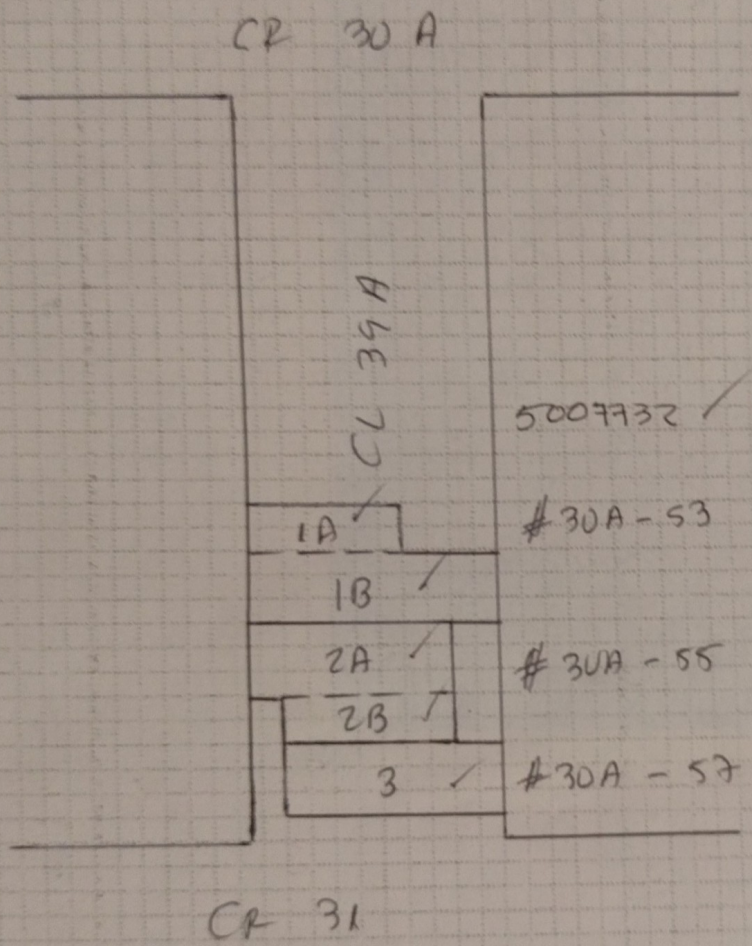

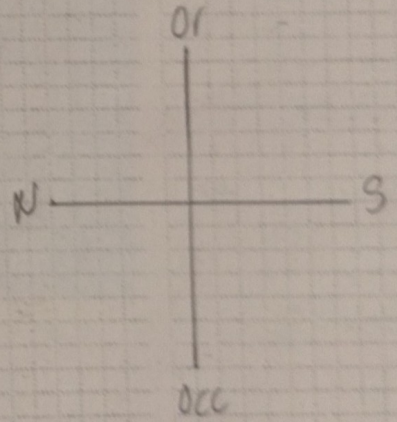

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Mantenimiento puntual	FRENTE	6
RANGO:	1	CANTIDAD:	10,04 T
BARRIO	La Milagrosa	DIRECCIÓN	CL 39A CR 30A

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 25594

PROVEEDOR: Frank #6

VALE POR UN VIAJE: Cambios

06/03/26

PLACA No: UDE 121 CAPACIDAD: 7 M3

DESTINO: PROCOPAL

RECIBIDO POR:

PROCOPAL S.A
NIT. 800.[illegible]-0

NOTA IMPORTANTE

Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

PROCOPAL S.A.
DESPACHO BASCULA:
