FECHA (D/M/A): 09-03-2026

BITACORA DE OBRA

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Intervencion Puntual
RANGO: 4	CANTIDAD: 11,01
ZONA: 4	FRENTE DE TRABAJO: 14
COMUNA: 12	
BARRIO: Santa Monica	

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377

CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:
INICIO: 07:00 Am
TERMINACIÓN: 02:00 Pm

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS: N/A

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: soleado
TARDE: soleado

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

El contratista se presenta al punto de inicio para realizar la jornada establecida a solicitud de la SIF se realiza la demarcacion de la zona a intervenir, se dan inicio a las actividades de demolicion donde se remueve la capa superficial del pavimento viejo para posteriormente Aplicar la mezda asfaltica y Reponerla, la Jornada transcurre en normalidad.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Angel Usuga Vo. Bo. TECNÓLOGO CONTRATISTA	clenton Peseq Vo. Bo. TECNÓLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Luis Alejandro Castro L. Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 04-03-2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	Angel Usuga			
2	Encargado				
3	Liguero				
4	Rastrillero	Sergio Eustaquio Perea	✓		E y P
5	Rastrillero	Johnny Londoño	✓		
6	Ayudante				
7	Ayudante	Esneider escudero	✓		
8	Ayudante	victor Alfonzo cordoba	✓		
9	Ayudante	orlando Jose Mendoza	✓		
10	Ayudante	Jenry Perea	✓		
11	Ayudante	Jeferson Muñoz	✓		
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual	Jose Manuel Lozano	✓		E y P
17	Operador compresor	Freddy Hernandez	✓		
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Alvaro Gomez	✓		
29	Conductor Volqueta(s)	Duvilson Bonilla	✓		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual	ROAD ROLLER			
2	Compresor	KAESER			
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Masmix			
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	Foton SUOAZO			
16	Volqueta(s)	STH139 Sencilla			

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A):

9. CALCULO DE CANTIDADES


SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
4000537	167396	1A	CR89 CL34EE 13	4,41	1,9	0,08	8,38	0,67	1,61
4000537	167396	1B	CR89 CL34EE 13	9,8	4,7	0,085	46,06	3,92	9,40
TOTALES									11,01

MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
236974	STH139	11,01		142	24556	STH139	sencilla	1	Procopal

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 09 -03- 2026

10. ESQUEMAS

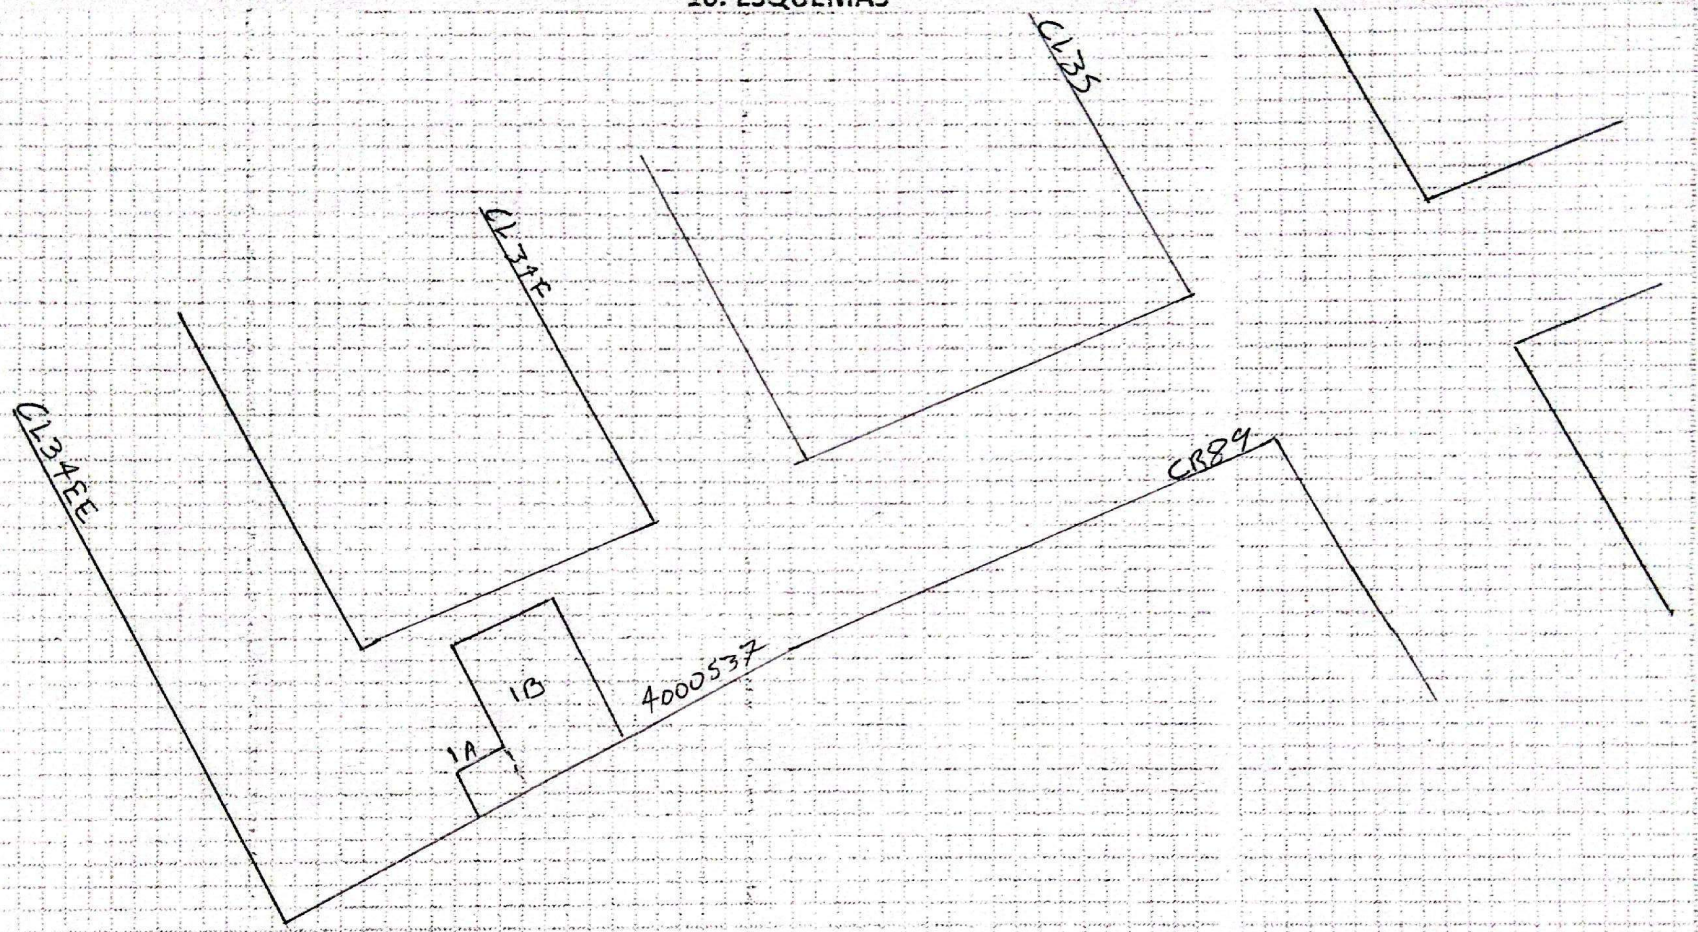

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Intervencion Puntual	FRENTE	14
RANGO:	7	CANTIDAD:	11,01
BARRIO	Santa Monica	DIRECCIÓN	CR89 CCL34EE - CL34F

Powered by CamScanner

PROCOPAL S.A.
DESPACHOS-BASCULA

236874

STH 139

11.01

Angel Uruga

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 26156

PROVEEDOR: FRENTE 14 VIALMED 2025

VALE POR UN VIAJE: Escombro

09/03/2026

PLACA No: STH 139 CAPACIDAD: PROCOPAL S.A. M3

DESTINO: PROCOPAL

10 MAR 2026

RECIBIDO POR: DESPACHOS - BASCULA

NOTA IMPORTANTE

Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Angel Uruga
Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Powered by CamScanner
