FECHA (D/M/A): 10-03-2026

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Intervencion Puntual
RANGO: 1	CANTIDAD: 12,01
ZONA: 4	FRENTE DE TRABAJO: 14
COMUNA: 12	
BARRIO: Santa Monica	

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:
INICIO: 07:00 am
TERMINACIÓN: 02:00 pm

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS: N/A

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: soleada
TARDE: soleada

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Se dan inicio a las actividades continuando con el remplazo de la capa superior de asfalto de la zona, se realiza demolicion de la capa existente, se realiza imprimacion y Aplicacion de mezcla Asfaltica. La jornada concluyo con total normalidad.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Angel [illegible]	Cleyton Perea
Vo Bo TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Luis Alejandro Castro R.	NOMBRE:
Vo Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 10-03-2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	Angel Uruga	✓		
2	Encargado				
3	Liguero	Sergio Eustaquio Peres	✓		E y P
4	Rastrillero	Johny Londoño	✓		
5	Rastrillero				
6	Ayudante	Eneider Cerquera Escudero	✓		
7	Ayudante	Victor Alfonzo Cordoba	✓		
8	Ayudante	Orlando Jose Mendoza	✓		
9	Ayudante	Jenry Peres	✓		
10	Ayudante	Jeferson Muñoz	✓		
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual	Jose Manuel Lozano	✓		E y P
17	Operador compresor	Freddy Hernandez	✓		
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Danilson Benitez	✓		
29	Conductor Volqueta(s)	Alvaro Gomez	✓		
30	Auxiliar vial	Leidyana Ponce	✓		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual	ROAD ROLLER	✓		
2	Compresor	KAESER	✓		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Marmita	✓		
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	Foton SV0420	✓		
16	Volqueta(s)	STH139 sencilla	✓		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 10-03-2026

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
4000537	167414	1A	CR89 CL34EE 33	9,8	6	0,065	58,80	3,82	9,17
4000537	167414	1B	CR89 CL34EE 33	3	1,7	0,060	14,10	0,85	2,03
5016923	167415	2	CR89 CL34F	2,2	2,55	0,060	5,61	0,34	0,81
TOTALES									12,01

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
236900	STH139	12,01		141


BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
26157	STH139	Sencilla	9	PROCOPAL

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 10-03-2026

10. ESQUEMAS

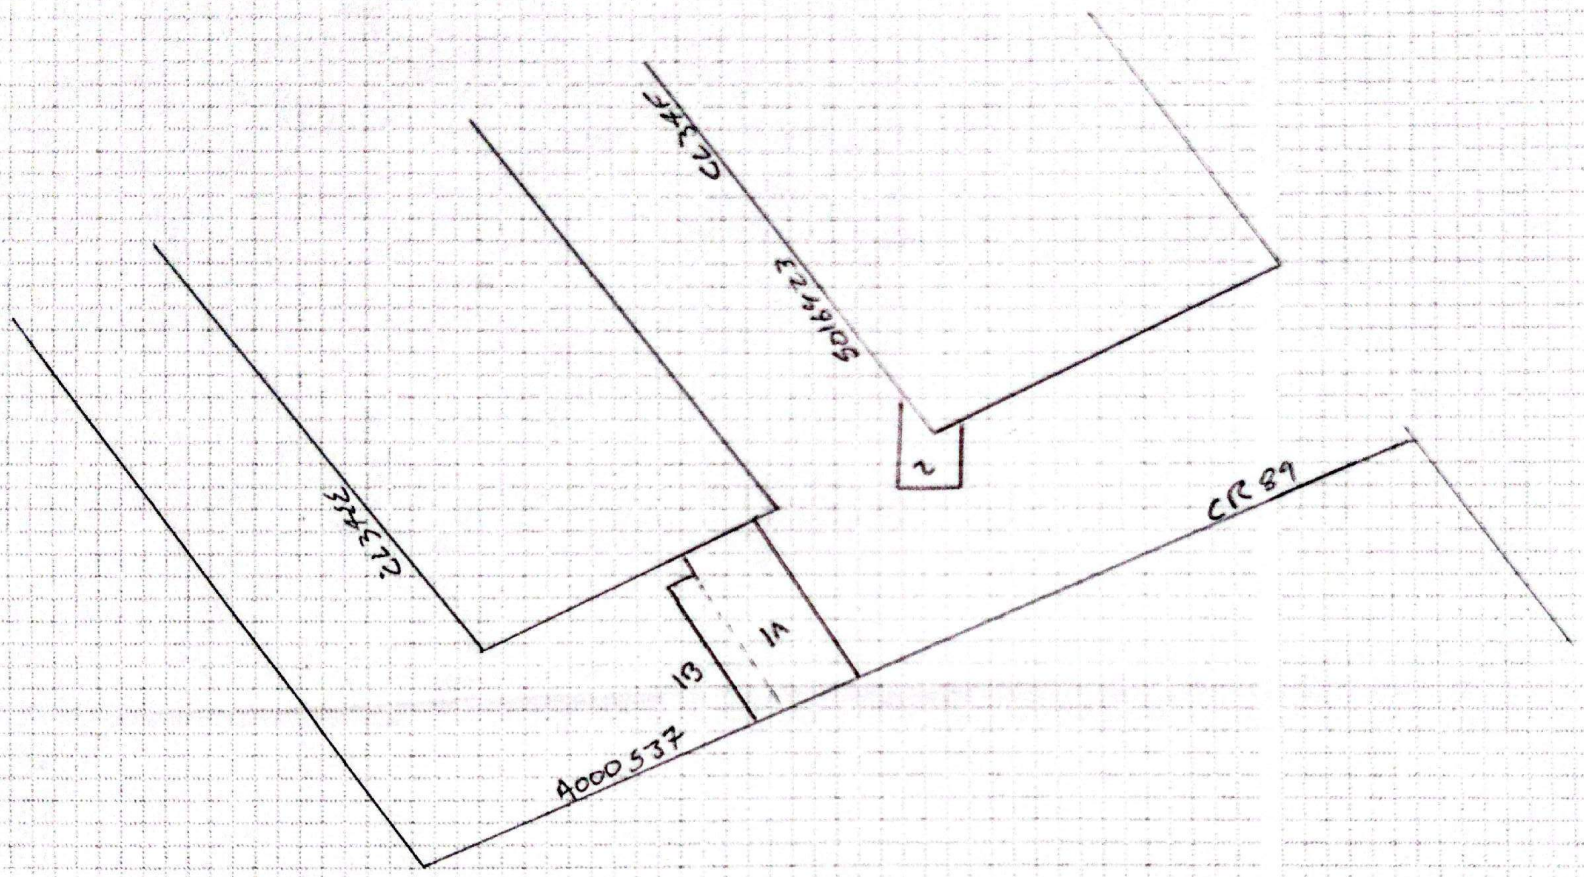

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Intervencion Puntual	FRENTE	14
RANGO:	7	CANTIDAD:	12,01
BARRIO	Santa Monica	DIRECCIÓN	CR89 (CL34EE- CL35)

Powered by CamScanner

PROCOPAL S.A.
DESPACHOS BASCULA

236900

STH139

12.01

Angel Urrea

1417

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 26157

PROVEEDOR: FRENTE 14 VIALNED 2025

VALE POR UN VIAJE: Escombro

10/03/2026

PLACA No: STH 139 CAPACIDAD: 7 M3

DESTINO: PROCOPAL

RECIBIDO POR: PROCOPAL S.A. NIT. 890 906.330-0

NOTA IMPORTANTE

Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Angel Urrea.
Firma Autorizada

Calle 10 Sur Nº 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Powered by CamScanner
