FECHA (D/M/A): 6/04/2026.

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD): DEMARCACIÓN

RANGO: —

CANTIDAD: —

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

ZONA	5	5
COMUNA	14	14
BARRIO	Santa María A.	El Tesoro

FRENTE DE TRABAJO: 8.

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:

INICIO: 8:30 PM

TERMINACIÓN: 4:30 AM

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS: —

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: —

TARDE: —

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Personal llega al lugar citado de forma los uegos para Realizar la fecha con fin que fue Borrada Como Corrección (Santa maría de los Angeles, al sitio Cuadrilla se moviliza a la zona del tesoro para continuar En la Aplicación de Plastico en frio Entre la cl6 Entre cls y cr 29, se instala Señalización y se Realiza cerramiento por carril para tirar Raya Blanca derecha faltante con flechas y continuar con Eje Amarilla Hasta llegar a las flechas de Reducción de CARRIL, Se Toman pruebas de Reflectividad

JORNADA TERMINADA A LAS 4:30 AM.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Luisa María Bermudez Cano Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Tatiana Henao Perez. Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Daniel Acuña G. Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 06/04/2026

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	Wilson Bermudez	—		
2	Encargado	Diego Londoño	—		
3	Liguero				
4	Rastrillero				
5	Rastrillero				
6	Ayudante	Cristian Camilo	—		
7	Ayudante	Julian Valencia	—		
8	Ayudante	Yeiny Yuliana	—		
9	Ayudante	Andres Lopera	—		
10	Ayudante				
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor				
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Jhordan montoya	—		
29	Conductor Volqueta(s)				

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual				
2	Compresor				
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación				
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	J44 330	—		
16	Volqueta(s)				

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 06/04/2026


9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	ITEM	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES			OBSERVACIONES
				CANTIDAD (UND)	AREA (m2)/ LONGITUD (m)	TOTAL	
4001053	4.1.3		Cl 6 Cr 29 Cl 5.	—	48m	48 m	Linea de borde derecho 0.12
4001053	4.1.1		" "	4	1,2 m	48 m	Flecha de frente
4001053	4.1.3		" "	—	80.1 m	80.1 m	Linea de eje Amarilla 0.12
4001054	4.1.1		" "	3	4,2 m²	12,6 m²	Flecha terminacion carril
4001054	4.1.3		" "	—	12 m	12 m	Linea de eje 0.12 blanca
	4.1.1		Cr 48 Dg 47	1	1,5 m²	1,5 m²	Flecha sobre giro
TOTALES							

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 06/04/2026.

10. ESQUEMAS

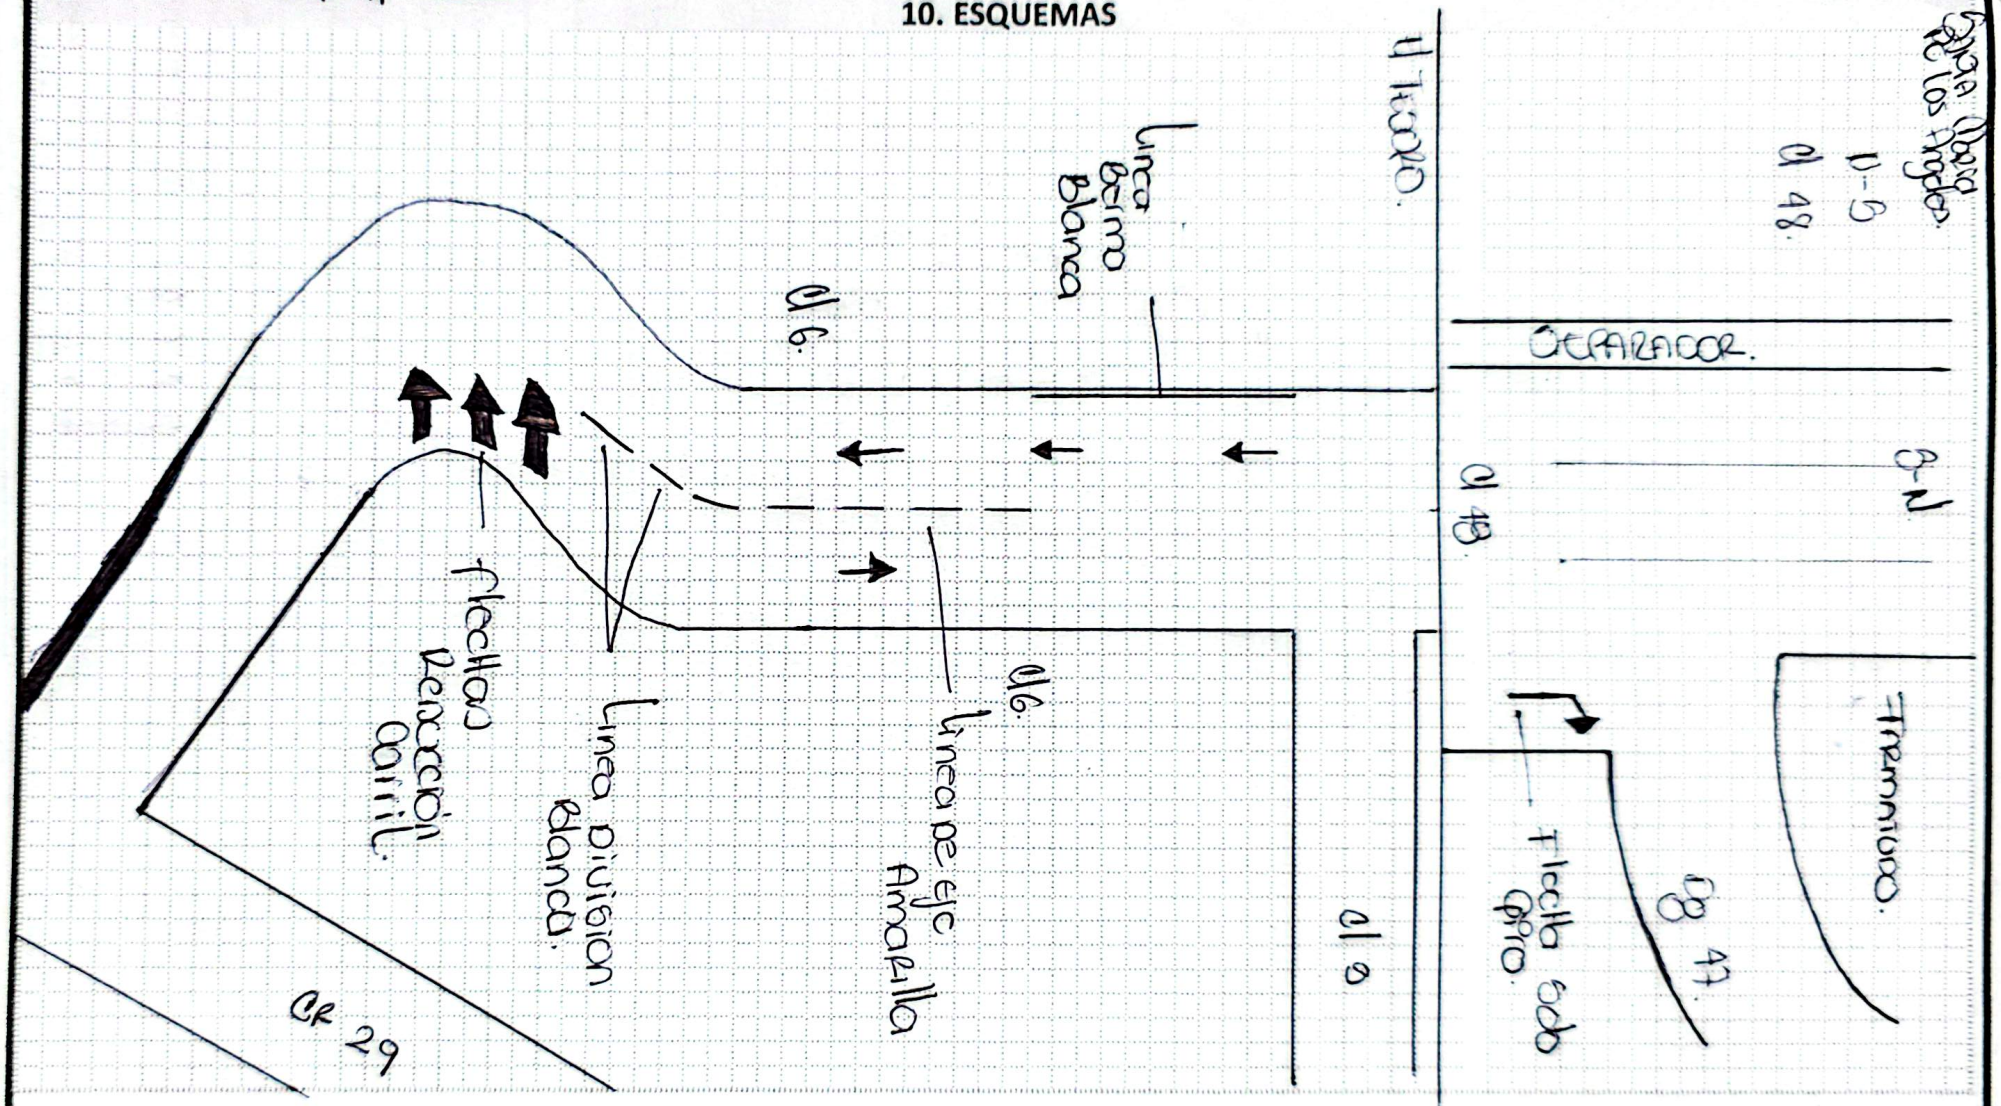

TIPO DE INTERVENCIÓN:	SEÑALIZACIÓN	FRENTE	8
RANGO:	—	CANTIDAD:	—
BARRIO	SANTA MARIA LA A / EL TESORO	DIRECCIÓN	Cl 48 Cra 47 / Cl 6 este Cl 5 Cra 29

Powered by CamScanner
