CONTRATO ICCU-CTO 1595 DE 2025

INFORME DE AVANCE N°3
PERIODO: ABRIL DEL 2026

PROVINCIA: RIO NEGRO
MUNICIPIO: EL PEÑON

CLL 13 # 47 – 12 BOGOTA – CUNDINAMARCA D.C TEL 313 258 3561
EMAIL: COORDINACION.ICCU.2026@GMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES – PROVINCIA RIO NEGRO
MUNICIPIO DE EL PEÑON

OBJETO: "ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOSPARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

- **LOCALIZACIÓN**

Provincia Rio Negro:

Imagen 1. Ubicación Provincia de Rio Negro



Fuente: Google

El Peñón:

Imagen 2. Ubicación Provincia de Rio Negro



Fuente: Google

Maquinaria: ALQUILER

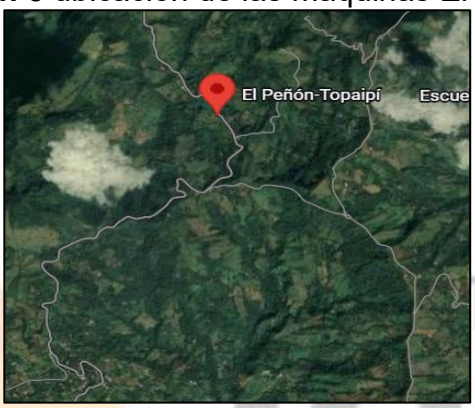
#	EQUIPO	PLACA
1	VOLQUETA SENCILLA	HMD 594
2	VOLQUETA SENCILLA	ZII 763

Ubicación:

El Peñon – sector Palacios – Terama y las vías El Peñón – Guayabal y El Peñón – Topaipí

Troncal del Rionegro (Actividades de Emergencia)

Imagen 3 ubicación de las maquinas El Peñón



Fuente: Google Maps

Imagen 4 ubicación de las maquinas Troncal de Rio Negro



Fuente: Google

- **GRUPO DE TRABAJO**

CARGO	NOMBRES
INSPECTOR DE OBRA UT	ANGIE LORENA JIMENEZ OBANDO
INSPECTOR DE OBRA ICCU	NICOLAS MAURICIO OCHOA LINARES
VOLQUETA HMD 594	WILVER VASQUEZ
VOLQUETA ZII 763	EDGAR RIAÑO

- **PLAN DE TRABAJO**

El presente cronograma fue elaborado en conjunto con la administración municipal de El Peñón, con el fin de programar las actividades de las volquetas **HMD 594** y **ZII 763** para el apoyo en la conformación y mantenimiento de los corredores **El Peñón – Topaipí** y **El Peñón – Guayabales**. Estas labores se desarrollarán de manera articulada con la demás maquinaria disponible en el municipio de El Peñón y con el apoyo del frente de trabajo del municipio de Topaipí.

Adicionalmente, las volquetas podrán ser utilizadas para la atención de emergencias que se presenten en la red vial, tales como derrumbes u otras situaciones que afecten la transitabilidad de las vías del municipio.

Imagen 5 Cronograma de actividades alcaldía del Peñón



FEBRERO				MARZO				ABRIL			
SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12
Transporte de material para mantenimiento vial El Peñón – Topaipí / El Peñón – Guayabales	Transporte de material para mantenimiento vial El Peñón – Topaipí / El Peñón – Guayabales	Transporte de material para mantenimiento vial El Peñón – Topaipí / El Peñón – Guayabales	Transporte de material para mantenimiento vial El Peñón – Topaipí / El Peñón – Guayabales	Transporte de material para mantenimiento vial El Peñón – Topaipí / El Peñón – Guayabales	Transporte de material para mantenimiento vial El Peñón – Topaipí / El Peñón – Guayabales	Transporte de material para mantenimiento vial El Peñón – Topaipí / El Peñón – Guayabales	Transporte de material para mantenimiento vial El Peñón – Topaipí / El Peñón – Guayabales	Transporte de material para mantenimiento vial El Peñón – Topaipí / El Peñón – Guayabales	Transporte de material para mantenimiento vial El Peñón – Topaipí / El Peñón – Guayabales	Transporte de material para mantenimiento vial El Peñón – Topaipí / El Peñón – Guayabales	Transporte de material para mantenimiento vial El Peñón – Topaipí / El Peñón – Guayabales

Fuente: Alcaldía municipal de El Peñón

Para el municipio de El Peñón, el avance estimado al cierre del mes de abril corresponde aproximadamente al 95% del total programado en el cronograma de actividades para el mes de abril. Respecto a la programación entregada por la alcaldía hasta el mes de abril se estima un avance del 90%. Lo anterior, teniendo en cuenta que debido a la emergencia presentada sobre la Troncal de Rio Negro a causa de la ola invernal, fue necesario el apoyo de las volquetas del frente para apoyar con actividades de remoción de derrumbes. Sin embargo, la maquinaria municipal continuo con actividades en el frente de obra.

- **CRONOGRAMA EJECUTADO**

FECHA	
01/04/2026	*01/04/2026* A continuación, se presenta el reporte de las actividades realizadas en el municipio de *El Peñón*, provincia de *Rionegro*.

	📍 Vereda/Sector: El Peñón - Guyabal 🌦️ Condición climática: Lluvias moderadas 🛠️ Actividad: Se realiza cargue y descargue de material sobrante proveniente de derrumbes sobre la Troncal de Río Negro 📏 Avance (km): 0.24 🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - - Alquiler - HMD 594 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: WILVER VÁSQUEZ 🚚 Número de viajes material sobrante: 10 ⏱️ H. inicial – H. final: 76.8 – 87.2 , 🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - - Alquiler - ZII 763 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: EDGAR HUMBERTO RIAÑO 🚚 Número de viajes material sobrante: 10 ⏱️ H. inicial – H. final: 89.3 – 99.1 ✅ *Fin del reporte.*
02/04/2026	FESTIVO
03/04/2026	FESTIVO
04/04/2026	SABADO
05/04/2026	DOMINGO
06/04/2026	🗓️ *06/04/2026* A continuación, se presenta el reporte de las actividades realizadas en el municipio de *El Peñón*, provincia de *Rionegro*. 📍 Vereda/Sector: El Peñón - Guyabal 🌦️ Condición climática: Soleado 🛠️ Actividad: Se realiza cargue y descargue de material de recebo para mejoramiento de la vía El Peñón - Guayabal 📏 Avance (km): 0.084

	🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - - Alquiler - HMD 594 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: WILVER VÁSQUEZ 🚚 Número de viajes recebo B400: 3 ⏱️ H. inicial – H. final: 98.3 – 109 , 🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - - Alquiler - ZII 763 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: EDGAR HUMBERTO RIAÑO 🚚 Número de viajes recebo B400: 3 ⏱️ H. inicial – H. final: 114.4 – 122.7 ✅ *Fin del reporte.*
07/04/2026	🗓️ *07/04/2026* A continuación, se presenta el reporte de las actividades realizadas en el municipio de *El Peñón*, provincia de *Rionegro*. 📍 Vereda/Sector: El Peñón - Guyabal 🌦️ Condición climática: Soleado 🛠️ Actividad: Se realiza cargue y descargue de material de recebo para mejoramiento de la vía El Peñón - Guayabal 📏 Avance (km): 0.196 🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - - Alquiler - HMD 594 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: WILVER VÁSQUEZ 🚚 Número de viajes recebo B400: 4 ⏱️ H. inicial – H. final: 19.7 – 30.3 📝 Observaciones: Debido a que la volqueta quedo inoperativa finalizando la jornada laboral del día anterior, el propietario realiza el reemplazo de la

	misma por medio de otra volqueta, cabe resaltar que el conductor sigue siendo el mismo. , 🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - - Alquiler - ZII 763 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: EDGAR HUMBERTO RIAÑO 🚚 Número de viajes recebo B400: 3 ⏱️ H. inicial – H. final: 123.1 – 132.3 ✅ *Fin del reporte.*
08/04/2026	🗓️ *08/04/2026* A continuación, se presenta el reporte de las actividades realizadas en el municipio de *El Peñón*, provincia de *Rionegro*. 📍 Vereda/Sector: El Peñón - Guyabal y Peñón - Guayabal 🌦️ Condición climática: Soleado 🛠️ Actividad: Se realiza cargue y descargue de material de recebo para mejoramiento de la vía El Peñón - Guayabal 📏 Avance (km): 0.112 🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - - Alquiler - HMD 594 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: WILVER VÁSQUEZ ⏱️ H. inicial – H. final: 113 – 123 📝 Observaciones: Volqueta operativa nuevamente, reanuda labores en el frente. , 🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - - Alquiler - ZII 763 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: EDGAR HUMBERTO RIAÑO 🚚 Número de viajes recebo B400: 2 ⏱️ H. inicial – H. final: 132.3 – 141.6

	✅ *Fin del reporte.*
09/04/2026	🗓️ *09/04/2026* A continuación, se presenta el reporte de las actividades realizadas en el municipio de *El Peñón*, provincia de *Rionegro*. 📍 Vereda/Sector: El Peñón - Guyabal y Troncal de Río Negro 🌦 Condición climática: Soleado 🛠 Actividad: Se realiza cargue y descargue de material de recebo para mejoramiento de la vía El Peñón - Guayabal. En horas de la tarde de vara la retroexcavadora del municipio con la que se carga material, por lo tanto, las volquetas se dirigieron hacia la Troncal del Río Negro para apoyar con actividades de cargue de material sobrante proveniente de derrumbes. 📏 Avance (km): 0.096 🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - - Alquiler - HMD 594 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: WILVER VÁSQUEZ 🚚 Número de viajes recebo B400: 2 🚚 Número de viajes material sobrante: 3 ⏱️ H. inicial – H. final: 123.1 – 133.1 , 🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - - Alquiler - ZII 763 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: EDGAR HUMBERTO RIAÑO ⏱️ H. inicial – H. final: 132.3 – 141.6 ✅ *Fin del reporte.*
10/04/2026	🗓️ *10/04/2026*

	A continuación, se presenta el reporte de las actividades realizadas en el municipio de *El Peñón*, provincia de *Rionegro*. 📍 Vereda/Sector: Troncal de Río Negro 🌦️ Condición climática: Lluvias moderadas 🛠️ Actividad: Se realiza cargue y descargue de material proveniente de derrumbes sobre la Troncal, debido a que la retroexcavadora del municipio del Peñón se encuentra inoperativa para cargar material de recebo. Volquetas finalizan actividades en el frente. 📏 Avance (km): 0.392 🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - - Alquiler - HMD 594 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: WILVER VÁSQUEZ 🚚 Número de viajes material sobrante: 7 ⏱️ H. inicial – H. final: 134.2 – 142.9 , 🔹 *VOLQUETA_SENCILLA - - Alquiler - ZII 763 (OPERATIVA)* 🏢 Propiedad: Alquiler 👷 Operador: EDGAR HUMBERTO RIAÑO 🚚 Número de viajes material sobrante: 7 ⏱️ H. inicial – H. final: 150.4 – 159.2 ✅ *Fin del reporte.*

- **RELACIÓN DE TRANSPORTE Y REMISIÓN DE MATERIALES**

RELACION DE TRANSPORTE Y REMISION DE MATERIALES.			
VOLQUETA HMD 594			
FECHA	**MATERIAL**	**N° DE VIAJES**	**DESCRIPCION**
1/04/2026	SOBRANTE	10	Emergencia Troncal del Rio Negro

2/04/2026	---	---	Festivo
3/04/2026	---	---	Festivo
4/04/2026	---	---	Sabado
5/04/2026	---	---	Domingo
6/04/2026	RECEBO	3	Peñon - Guayabal
7/04/2026	RECEBO	4	volqueta de reemplazo (mismo operador) Peñon - Guayabal
8/04/2026	RECEBO	2	Peñon - Topaipí y Peñon - Guayabal
9/04/2026	RECEBO y SOBRANTE	5	Peñon Guayabla y Troncal de Rio Negro
10/04/2026	SOBRANTE	7	Troncal de Rio Negro (FIN DE ACTIVIDADES)
11/04/2026	---	---	---
12/04/2026	---	---	---
13/04/2026	---	---	---
14/04/2026	---	---	---
15/04/2026	---	---	---
16/04/2026	---	---	---
17/04/2026	---	---	---
18/04/2026	---	---	---
19/04/2026	---	---	---
20/04/2026	---	---	---
21/04/2026	---	---	---
22/04/2026	---	---	---
23/04/2026	---	---	---
24/04/2026	---	---	---
25/04/2026	---	---	---
26/04/2026	---	---	---
27/04/2026	---	---	---
28/04/2026	---	---	---
29/04/2026	---	---	---
30/04/2026	---	---	---
TOTAL		31	

RELACION DE TRANSPORTE Y REMISION DE MATERIALES.			
VOLQUETA ALQUILADA ZII 763			
FECHA	**METERIAL**	**N° DE VIAJES**	**DESCRIPCION**
1/04/2026	SOBRANTE	10	Emergencia Troncal del Rio Negro
2/04/2026	---	---	Festivo
3/04/2026	---	---	Festivo
4/04/2026	---	---	Sabado
5/04/2026	---	---	Domingo
6/04/2026	RECEBO	3	Peñon - Guayabal
7/04/2026	RECEBO	3	Peñon - Guayabal
8/04/2026	RECEBO	2	Peñon - Topaipí y Peñon - Guayabal
9/04/2026	RECEBO y SOBRANTE	5	Peñon Guayabla y Troncal de Rio Negro
10/04/2026	SOBRANTE	7	Troncal de Rio Negro (FIN DE ACTIVIDADES)
11/04/2026	---	---	---
12/04/2026	---	---	---
13/04/2026	---	---	---
14/04/2026	---	---	---
15/04/2026	---	---	---
16/04/2026	---	---	---
17/04/2026	---	---	---
18/04/2026	---	---	---
19/04/2026	---	---	---
20/04/2026	---	---	---
21/04/2026	---	---	---
22/04/2026	---	---	---
23/04/2026	---	---	---
24/04/2026	---	---	---
25/04/2026	---	---	---
26/04/2026	---	---	---
27/04/2026	---	---	---
28/04/2026	---	---	---

29/04/2026	---	---	---
30/04/2026	---	---	---
TOTAL		30	

- **AVANCE EN CAMPO (KM)**

AVANCE DE OBRA EL PEÑON					
FECHA	**SECTOR**	**LONGITUD (KM)**	**AVANCE (KM)**	**REPETICION (KM)**	**DESCRIPCION**
1/04/2026	Emergencia Troncal del Rio Negro	0,24	0,24	---	Despeje de vía
2/04/2026	---	---	---	---	Festivo
3/04/2026	---	---	---	---	Festivo
4/04/2026	---	---	---	---	Sabado
5/04/2026	---	---	---	---	Domingo
6/04/2026	Peñon - Guayabal	0,084	0,324	---	Mejoramiento de vía
7/04/2026	volqueta de reemplazo (mismo operador) Peñon - Guayabal	0,196	0,520	---	Mejoramiento de vía
8/04/2026	Peñon - Topaipí y Peñon - Guayabal	0,112	0,632	---	Mejoramiento de vía
9/04/2026	Peñon Guayabal y Troncal de Rio Negro	0,096	0,728	---	Mejoramiento de vía y despeje de vía
10/04/2026	Troncal de Rio Negro (FIN DE ACTIVIDADES)	0,392	1,120	---	Despeje de vía
11/04/2026	---	---	---	---	---
12/04/2026	---	---	---	---	---
13/04/2026	---	---	---	---	---
14/04/2026	---	---	---	---	---
15/04/2026	---	---	---	---	---
16/04/2026	---	---	---	---	---
17/04/2026	---	---	---	---	---
18/04/2026	---	---	---	---	---
19/04/2026	---	---	---	---	---

20/04/2026	---	---	---	---	---
21/04/2026	---	---	---	---	---
22/04/2026	---	---	---	---	---
23/04/2026	---	---	---	---	---
24/04/2026	---	---	---	---	---
25/04/2026	---	---	---	---	---
26/04/2026	---	---	---	---	---
27/04/2026	---	---	---	---	---
28/04/2026	---	---	---	---	---
29/04/2026	---	---	---	---	---
30/04/2026	---	---	---	---	---
TOTAL		1,12		0	

- **RESUMEN DE HORAS DE LLUVIA, INOPERATIVIDAD Y EFECTIVAS LABORALES**

RESUMEN DE HORAS LLUVIA, INOPERANCIA Y EFECTIVAS LABORALES				
FECHA	**HORAS DE LLUVIA**	**HORAS DE INOPERATIVAS**	**HORAS EFECTIVAS**	**DESCRIPCION**
1/04/2026	---	---	9	Lluvias moderadas
2/04/2026	---	---	---	Festivo
3/04/2026	---	---	---	Festivo
4/04/2026	---	---	---	Sabado
5/04/2026	---	---	---	Domingo
6/04/2026	---	---	9	Soleado
7/04/2026	---	---	9	Soleado
8/04/2026	---	---	9	Soleado
9/04/2026	---	---	9	Soleado
10/04/2026	---	---	9	Lluvias moderadas
11/04/2026	---	---	---	---
12/04/2026	---	---	---	---
13/04/2026	---	---	---	---
14/04/2026	---	---	---	---

15/04/2026	---	---	---	---
16/04/2026	---	---	---	---
17/04/2026	---	---	---	---
18/04/2026	---	---	---	---
19/04/2026	---	---	---	---
20/04/2026	---	---	---	---
21/04/2026	---	---	---	---
22/04/2026	---	---	---	---
23/04/2026	---	---	---	---
24/04/2026	---	---	---	---
25/04/2026	---	---	---	---
26/04/2026	---	---	---	---
27/04/2026	---	---	---	---
28/04/2026	---	---	---	---
29/04/2026	---	---	---	---
30/04/2026	---	---	---	---
TOTAL	0	0	54	

- **MOVILIZACIONES**

MOVILIZACIONES MANTA					
FECHA	**EQUIPO**	**SERIAL**	**OPERADOR**	**ORIGEN**	**DESTINO**
01/04/2026	VOLQUETA EN ALQUILER	HMD 594	WILVER VASQUEZ	EL PEÑON	TRONCAL RIO NEGRO
01/04/2026	VOLQUETA EN ALQUILER	ZII 763	EDGAR RIAÑO	EL PEÑON	TRONCAL RIO NEGRO
06/04/2026	VOLQUETA EN ALQUILER	HMD 594	WILVER VASQUEZ	TRONCAL RIO NEGRO	EL PEÑON
06/04/2026	VOLQUETA EN ALQUILER	ZII 763	EDGAR RIAÑO	TRONCAL RIO NEGRO	EL PEÑON
09/04/2026	VOLQUETA EN ALQUILER	HMD 594	WILVER VASQUEZ	EL PEÑON	TRONCAL RIO NEGRO
09/04/2026	VOLQUETA EN ALQUILER	ZII 763	EDGAR RIAÑO	EL PEÑON	TRONCAL RIO NEGRO

- **MANTENIMIENTOS**

No aplica para alquileres.

- **CONTROL DE TRABAJO MAQUINARIA**

A continuación, se reporta planilla de control diario de horas y novedades de las dos volquetas.

Tabla 1. Control horario Volqueta HMD 594

ICCU	CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA ALQUILADA				UNIÓN TEMPORAL ICCU PARQUE 2025
OBJETO	"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".				
PERIODO	ABRIL				
MUNICIPIO				EL PEÑON	
VOLQUETA SENCILLA				PLACA	HMD 594
FECHA	HR INICIAL	HR FINAL	VIAJES	DIAS LABORADOS	OBSERVACIÓN
1/4/2026	76,8	87,2	10	1	Emergencia Troncal del Rio Negro
2/4/2026					Festivo
3/4/2026					Festivo
4/4/2026					Sabado
5/4/2026					Domingo
6/4/2026	98,3	109	3	1	Peñon - Guayabal
7/4/2026	19,7	30,3	4	1	volqueta de reemplazo (mismo operador) Peñon - Guayabal
8/4/2026	113	123	2	1	Peñon - Topaipí y Peñon - Guayabal
9/4/2026	123,1	133,1	5	1	Peñon Guayabla y Troncal de Rio Negro
10/4/2026	134,2	142,9	7	1	Troncal de Rio Negro (FIN DE ACTIVIDADES)
11/4/2026					
12/4/2026					
13/4/2026					
14/4/2026					
15/4/2026					
16/4/2026					
17/4/2026					
18/4/2026					
19/4/2026					
20/4/2026					
21/4/2026					
22/4/2026					
23/4/2026					
24/4/2026					
25/4/2026					
26/4/2026					
27/4/2026					
28/4/2026					
29/4/2026					
30/4/2026					
SUBTOTAL MES			31	6	
TOTAL MES			6		

Registro Fotográfico de Horómetros Volqueta HMD 594		
01/04/2026		
02/04/2026	---	Festivo
03/04/2026	---	Festivo
04/04/2026	---	Sábado
05/04/2026	---	Domingo
06/04/2026		
07/04/2026		

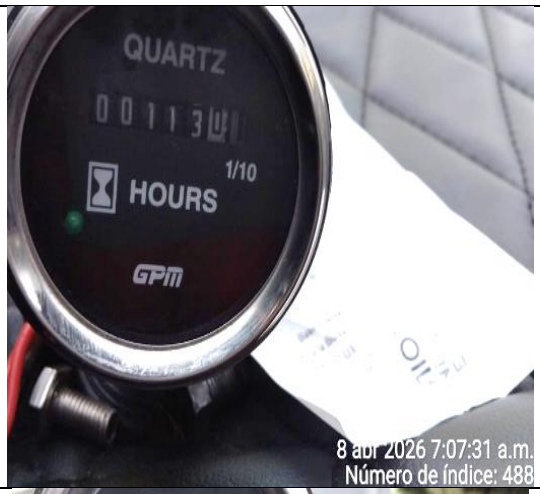
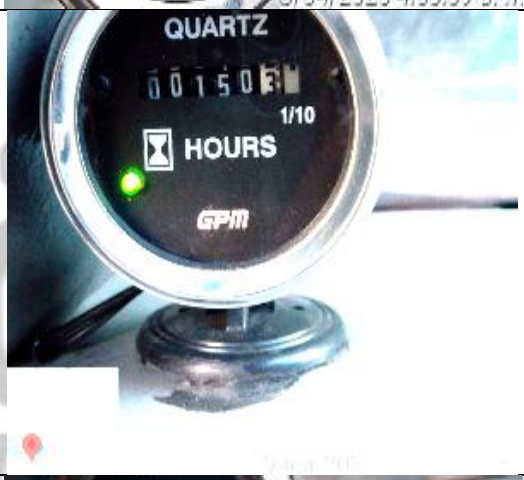
08/04/2026		
09/04/2026		
10/04/2026		

Tabla 2. Control horario Volqueta ZII 763

ICCU	CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA ALQUILADA				UNIÓN TEMPORAL ICCU PARQUE 2025
OBJETO	"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".				
PERIODO	ABRIL				
MUNICIPIO				EL PEÑON	
VOLQUETA SENCILLA				PLACA	ZII 763
FECHA	HR INICIAL	HR FINAL	VIAJES	DIAS LABORADOS	OBSERVACIÓN
1/4/2026	89,3	99,1	10	1	Emergencia Troncal del Rio Negro
2/4/2026					Festivo
3/4/2026					Festivo
4/4/2026					Sabado
5/4/2026					Domingo
6/4/2026	114,4	122,7	3	1	Peñon - Guayabal
7/4/2026	123,1	132,3	3	1	Peñon - Guayabal
8/4/2026	132,3	141,6	2	1	Peñon - Topaipí y Peñon - Guayabal
9/4/2026	141,8	150,3	5	1	Peñon Guayabla y Troncal de Rio Negro
10/4/2026	150,4	159,2	7	1	Troncal de Rio Negro (FIN DE ACTIVIDADES)
11/4/2026					
12/4/2026					
13/4/2026					
14/4/2026					
15/4/2026					
16/4/2026					
17/4/2026					
18/4/2026					
19/4/2026					
20/4/2026					
21/4/2026					
22/4/2026					
23/4/2026					
24/4/2026					
25/4/2026					
26/4/2026					
27/4/2026					
28/4/2026					
29/4/2026					
30/4/2026					
SUBTOTAL MES			30	6	
TOTAL MES			6		

Registro Fotográfico de Horómetros Volqueta ZII 763		
01/04/2026		
02/04/2026	---	Festivo
03/04/2026	---	Festivo
04/04/2026	---	Sábado
05/04/2026	---	Domingo
06/04/2026		
07/04/2026		

08/04/2026		
09/04/2026		
10/04/2026		

- **RESULTADOS Y CONCLUSIONES**

Durante el período correspondiente al mes de abril de 2026, se ejecutaron actividades de apoyo a la red vial del municipio de El Peñón mediante el uso de dos volquetas en alquiler, evidenciando los siguientes resultados:

- Se alcanzó un avance total de 1,12 km intervenidos, distribuidos en actividades de mejoramiento vial y atención de emergencias.
- Se ejecutaron labores tanto en los corredores El Peñón – Guayabal, El Peñón – Topaipí como en la Troncal del Río Negro, esta última por situación de emergencia derivada de la ola invernal.
- Se registró un total de 61 viajes de material (31 viajes volqueta HMD 594 y 30 viajes volqueta ZII 763), incluyendo transporte de recebo y material sobrante producto de derrumbes.
- Se contabilizaron 54 horas efectivas de operación, sin registro de horas de inoperatividad ni suspensión por lluvias.
- Se logró atender de manera oportuna la emergencia vial en la Troncal del Río Negro, garantizando la transitabilidad mediante actividades de despeje.
- Se presentó una novedad mecánica en una de las volquetas, la cual fue solucionada mediante reemplazo inmediato del equipo, evitando afectaciones significativas en la continuidad de las actividades.
- El desarrollo de las actividades permitió cumplir con un avance aproximado del 95% de la programación mensual, lo cual evidencia una ejecución eficiente pese a la atención de emergencias no previstas.
- La destinación de maquinaria para la atención de la emergencia en la Troncal del Río Negro impactó parcialmente el cumplimiento del cronograma inicial (90% respecto a la programación acumulada), sin embargo, esta decisión fue técnica y necesaria para garantizar la conectividad vial.
- La operación de las volquetas fue en general continua y eficiente, con adecuada respuesta ante contingencias mecánicas, lo que permitió mantener la productividad del frente de trabajo.
- La articulación con la administración municipal y otros frentes de maquinaria contribuyó al cumplimiento de los objetivos planteados para el período.
- Las actividades ejecutadas permitieron mejorar las condiciones de transitabilidad en los corredores intervenidos, así como mitigar los efectos de la ola invernal sobre la infraestructura vial.
- Se evidencia un adecuado control operativo, reflejado en el registro de actividades, transporte de materiales y control de horas trabajadas.

- **REGISTRO FOTOGRÁFICO VOLQUETAS ALQUILER**

01/04/2026	
VOLQUETA HMD	
	
Cargue de material sobrante	Descargue de material sobrante
VOLQUETA ZII	
	
Cargue de material sobrante	Descargue de material sobrante

02/04/2026 FESTIVO
03/04/2026 FESTIVO
02/04/2026 SABADO
02/04/2026 DOMINGO
06/04/2026
VOLQUETA HMD

	
Cargue de material	Descargue de material
VOLQUETA ZII	
	
Descargue de material	Descargue de material

<table>
<tr><td colspan="2">07/04/2026</td></tr>
<tr><td colspan="2">VOLQUETA HMD

Durante la jornada de hoy, la volqueta presentó una falla mecánica. No obstante, el proveedor realizó el reemplazo oportuno del equipo, garantizando la continuidad de la operación.

Se precisa que el conductor asignado se mantiene sin cambios.</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>Descargue de material</td><td>Descargue de material</td></tr>
<tr><td colspan="2">VOLQUETA ZII</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>Descargue de material</td><td>Descargue de material</td></tr>
</table>

08/04/2026	
VOLQUETA HMD	
	
Cargue de material	Descargue de material
VOLQUETA ZII	
	
Descargue de material	Descargue de material

09/04/2026	
VOLQUETA HMD	
	
Descargue de material	Descargue de material
VOLQUETA ZII	
	
Descargue de material	Cargue de material sobrante

10/04/2026	
VOLQUETA HMD	
	
Descargue de material sobrante	Cargue de material sobrante
VOLQUETA ZII	
	
Descargue de material sobrante	Cargue de material sobrante

Nicolas Mauricio Ochoa
INSPECTOR ICCU

Angie Jimenez Obando
INSPECTOR UT ICCU PARQUE 2025

CONTRATO ICCU-CTO 1595 DE 2025

INFORME DE AVANCE N°3
PERIODO: ABRIL DEL 2026

PROVINCIA: RIO NEGRO
MUNICIPIO: LA PALMA

INFORME DE ACTIVIDADES – PROVINCIA RIO NEGRO
MUNICIPIO DE LA PALMA

OBJETO: "ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOSPARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

1. LOCALIZACIÓN

Provincia Rio Negro:

La Palma:

#	EQUIPO	SERIAL
1	EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGA LINK BELT 210X3E	LBX210I6NKHEX1235
2	MOTONIVELADORA HYUNDAI HG170	LCL717H0EL2000338
3	VIBROCOMPACTADOR AMMANN ASC 70	3003606
4	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416E	CAT0416EAMFG08173
5	VOLQUETA SENCILLA INTERNATIONAL MV607 SBA 4X2	GZM755
6	MINICARGADOR CATERPILLAR 242D	CAT0242DJA9W00744
7	VOLQUETA SENCILLA INTERNATIONAL MV607 SBA 4X2	GZM 758
8	VOLQUETA DOBLETROQUE	ODR 782
9	RETROCARGADOR ALQUILER	CAT416C6673

Ubicación:

Imagen 1. Ubicación La palma

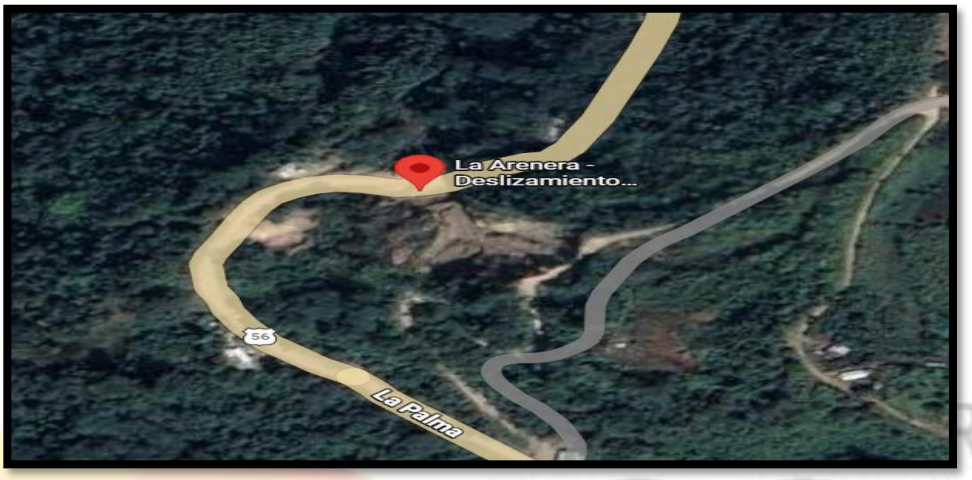


Fuente: Google Earth

La Palma:

- La Arenera

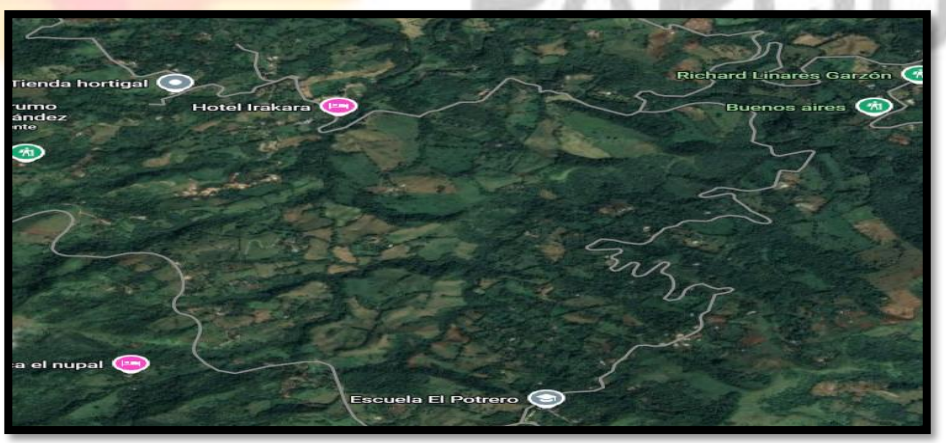
Imagen 2. Ubicación de las máquinas La Arenera



Fuente: Google Earth

- Hortigal - El Potrero – La Hermosa – Guanacas - Zumbe

Imagen 3. Ubicación de las máquinas Hortigal – El Potrero – La Hermosa



Fuente: Google Earth

2. GRUPO DE TRABAJO

CARGO	NOMBRES
INSPECTOR DE OBRA UT	RICARDO ANDRES ORTIZ VASQUEZ
INSPECTOR DE OBRA ICCU	ALEJANDRO CASTAÑEDA
OPERADOR EXCAVADORA SOBRE ORUGAS-BRAZO LARGO 1235	JOSELIN CIFUENTES RUEDA
OPERADOR MOTONIVELADORA HYUNDAI HG170 0338	JONATHAN STIVEN AGUILAR FLORIDO
OPERADOR VIBROCOMPACTADOR AMMANN ASC 70 3606	ALFREDO RODRIGUEZ
OPERADOR RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416E 8173	HENNRY ROJAS AGUIRRE
CONDUCTOR VOLQUETA SENCILLA GZM755	JOSE RUFINO PEREZ
OPERADOR MINICARGADOR CATERPILLAR 242D	JORGE LUIS VIEDA GOMEZ
CONDUCTOR VOLQUETA DOBLE TROQUE ODR 782	ALEXANDER MONTERO
CONDUCTOR VOLQUETA SENCILLA GZM 758	DANIEL TOVAR
OPERARIO RETROCARGADOR EN ALQUILER	BERNARDO RODRIGUEZ

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025

1. PLAN DE TRABAJO

El presente cronograma fue elaborado en conjunto con la Alcaldía Municipal de La Palma, conforme a las necesidades priorizadas para la atención de emergencias viales y mantenimiento de la red terciaria, especialmente en el sector crítico conocido como La Arenera y el tramo El Potrero – La Hermosa – Ortigal.
Durante el mes de febrero de 2026 se dio prioridad a la atención de la emergencia en el sector La Arenera, garantizando la transitabilidad del corredor vial.

AVANCE 30%

CRONOGRAMA DE MAQUINARIA ICCU												
MAQUINAS	FEBRERO				MARZO				ABRIL			
	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12
VOLQUETAS	Potrero – La Hermosa	Potrero – La Hermosa	Potrero – La Hermosa	Potrero – La Hermosa	Potrero – La Hermosa	Potrero – La Hermosa	Potrero – La Hermosa	Potrero – La Hermosa	Alto de Izacar – Minipí	Alto de Izacar – Minipí	Alto de Izacar – Minipí	Alto de Izacar – Minipí
RETROEXCAVADORA	Troncal (emergencias)	Troncal (emergencias)	Troncal (emergencias)	Troncal (emergencias)	Troncal (emergencias)	Troncal (emergencias)	Troncal (emergencias)	Troncal (emergencias)	Troncal (emergencias)	Troncal (emergencias)	Troncal (emergencias)	Troncal (emergencias)
ORUGA	Arenera	Arenera	Arenera	Arenera	Arenera	Arenera	Arenera	Arenera	Arenera	Arenera	Arenera	Arenera
MOTONIVELADORA	Potrero – La Hermosa	Potrero – La Hermosa	Potrero – La Hermosa	Potrero – La Hermosa	Potrero – La Hermosa	Potrero – La Hermosa	Potrero – La Hermosa	Potrero – La Hermosa	Alto de Izacar – Minipí	Alto de Izacar – Minipí	Alto de Izacar – Minipí	Alto de Izacar – Minipí
VIBRO	Potrero – La Hermosa	Potrero – La Hermosa	Potrero – La Hermosa	Potrero – La Hermosa	Potrero – La Hermosa	Potrero – La Hermosa	Potrero – La Hermosa	Potrero – La Hermosa	Alto de Izacar – Minipí	Alto de Izacar – Minipí	Alto de Izacar – Minipí	Alto de Izacar – Minipí

Fuente: Alcaldía Municipal de La Palma

2. CRONOGRAMA EJECUTADO

FECHA	ACTIVIDADES
01/04/2026	Municipio de La Palma, provincia de Rionegro. Vereda/Sector: ARENERA- LA HERMOSA - MURCA - MINIPI - GUANACAS - CAPITAN - RIO NEGRO. Actividad: Actividades de remoción de derrumbes y dragado sobre la Troncal del Rio Negro con excavadora de oruga y volquetas. Retrocargador realizo cargue de derrumbes sector hinche. Motoniveladora y vibro sin actividad, motoniveladora inoperativa. Avance (km): 0.0. VOLQUETA_SENCILLA - ICCU - GZM755 (NO OPERATIVA). Operador: JOSE RUFINO. H. inicial – H. final: 4609 – 4609. Kilometraje inicial - final: 87204 – 87204. Novedades mecánicas: Se revienta la manguera del Toma fuerza. Intervención mecanica/Repuesto: Se bajo manguera de toma fuerza, se llevo al taller para su respectiva reparación. VOLQUETA_DOBLE_TROQUE - IVECO - ICCU - ODR782 (NO OPERATIVA). Operador: ALEXANDER MONTERO. Viajes: 0. H. inicial – H. final: 3691.1. Kilometraje inicial - final: 67226.2. Novedades mecánicas: Se le daño el turbo, cambio de filtros y aceites. VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - GZM758 (OPERATIVA). Operador: DANIEL RAMIREZ. Viajes: 10. H. inicial – H. final: 4720 - 4725. Kilometraje inicial - final: 64506 - 64538. RETROEXCAVADORA - ICCU - CAT08173 (OPERATIVA). Operador: HENRRY ROJAS. H. inicial – H. final: 8772.1 - 8781.1. Novedades mecánicas: Esta para cambio de filtros. MINICARGADOR - CAT - ICCU - 0744 (OPERATIVA). Operador: JORGE LUIS VIEDA. H. inicial – H. final: 5115.1 - 5120.1. Intervención mecanica/Repuesto: Cambio de un filtro de ACPM, cambio de filtro de hidráulico y cambio de la valvulina de las cadenas de la servotransmisión. MOTONIVELADORA - HYUNDAY - ICCU - 2000338 (NO OPERATIVA). Operador: JHONATAN AGUILAR. H. inicial – H. final: 4238.4 - 4238.4. Novedades mecánicas: Se le estalla manguera principal y se solicitan pines de tornamesa. VIBROCOMPACTADOR - AMMAN - ICCU - 3003606 (OPERATIVA). Operador: ALFREDO RODRIGUEZ. H. inicial – H. final: 3036.4 - 3037.0. EXCAVADORA_DE_ORUGAS_BRAZO_LARGO - LINK BELT - ICCU - LBX210I6NKHEX1235 (OPERATIVA). Operador: JOSELIN CIFUENTES. H. inicial – H. final: 6133.1 - 6140.9. ACPM (gl): 60.000 GL. Intervención mecánica/Repuesto: Se le instalaron las calzas del balde. Novedades mecánicas: Se solicitan cambio de filtros de ACPM y del Aire.
06/04/2026	Municipio de La Palma, provincia de Rionegro. Vereda/Sector: ARENERA- LA HERMOSA - MURCA - MINIPI - GUANACAS - CAPITAN - RIO NEGRO. Actividad: Actividades de remoción de derrumbes y dragado sobre la Troncal del Rio Negro con excavadora de oruga y volquetas. Retrocargador realizo cargue de derrumbes sector hinche. Motoniveladora y vibro sin actividad, motoniveladora inoperativa. Avance (km): 0.0. VOLQUETA_SENCILLA - ICCU - GZM755 (NO OPERATIVA). Operador: JOSE RUFINO. H. inicial – H. final: 4609 – 4609. Kilometraje inicial - final: 87204 – 87204. Novedades mecánicas: Se revienta la manguera del Toma fuerza. Intervención mecanica/Repuesto: Se bajo manguera de toma fuerza, se llevo al taller para su respectiva reparación. VOLQUETA_DOBLE_TROQUE - IVECO - ICCU - ODR782 (NO OPERATIVA). Operador: ALEXANDER MONTERO. Viajes: 0. H. inicial – H. final: 3691.1. Kilometraje inicial - final: 67226.2. Novedades mecánicas: Se le daño el turbo, cambio de filtros y aceites. VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - GZM758 (OPERATIVA). Operador: DANIEL RAMIREZ. Viajes: 2. H. inicial – H. final: 4725 - 4732. Kilometraje inicial - final: 64538 - 64642. ACPM (gl): 18.000 GL. RETROEXCAVADORA - ICCU - CAT08173 (NO OPERATIVA). Operador: HENRRY ROJAS. H. inicial – H. final: 8781.1. Novedades mecánicas: Esta para cambio de filtros, no prende la Maquina por bomba de combustible. MINICARGADOR - CAT - ICCU - 0744 (OPERATIVA). Operador: JORGE LUIS VIEDA. H. inicial – H. final: 5120.1. Intervención mecanica/Repuesto: Cambio de un filtro de ACPM, cambio de filtro de hidráulico y cambio de la valvulina de las cadenas de la servotransmisión. MOTONIVELADORA - HYUNDAY - ICCU - 2000338 (NO OPERATIVA). Operador: JHONATAN AGUILAR. H. inicial – H. final: 4238.4. Novedades mecánicas: Se le estalla manguera principal y se solicitan pines de tornamesa. VIBROCOMPACTADOR - AMMAN - ICCU - 3003606 (OPERATIVA). Operador: ALFREDO RODRIGUEZ. H. inicial – H. final: 3037.0. EXCAVADORA_DE_ORUGAS_BRAZO_LARGO - LINK BELT - ICCU - LBX210I6NKHEX1235 (NO OPERATIVA). Operador: JOSELIN CIFUENTES. H. inicial – H. final:

	6140.9 - 6143.7. Novedades mecánicas: Se solicitan cambio de filtros de ACPM y del Aire. Se daño o'ring del cilindro de arrastre.
07/04/2026	Municipio de La Palma, provincia de Rionegro. Vereda/Sector: ARENERA- LA HERMOSA - MURCA - MINIPI - GUANACAS - CAPITAN - RIO NEGRO. Actividad: Actividades de remoción de derrumbes y dragado sobre la Troncal del Rio Negro. Motoniveladora y vibro sin actividad, motoniveladora inoperativa. Retrocargador y oruga inoperativas, a la espera de filtros. Avance (km): 0.0. VOLQUETA_SENCILLA - ICCU - GZM755 (NO OPERATIVA). Operador: JOSE RUFINO. H. inicial: 4609. Kilometraje inicial: 87204. Novedades mecánicas: Se revienta la manguera del Toma fuerza. Intervención mecanica/Repuesto: Se bajo manguera de toma fuerza, se llevo al taller para su respectiva reparación. VOLQUETA_DOBLE_TROQUE - IVECO - ICCU - ODR782 (NO OPERATIVA). Operador: ALEXANDER MONTERO. Viajes: 0. H. inicial: 3691.1. Kilometraje inicial: 67226.2. Novedades mecánicas: Se le daño el turbo, cambio de filtros y aceites. VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - GZM758 (OPERATIVA). Operador: DANIEL RAMIREZ. Viajes: 12. H. inicial – H. final: 4732 - 4739. Kilometraje inicial - final: 64642 - 64678. RETROEXCAVADORA - ICCU - CAT08173 (NO OPERATIVA). Operador: HENRRY ROJAS. H. inicial: 8781.1. Novedades mecánicas: Esta para cambio de filtros, no prende la Maquina por bomba de combustible. MINICARGADOR - CAT - ICCU - 0744 (OPERATIVA). Operador: JORGE LUIS VIEDA. H. inicial: 5120.1. Intervención mecánica/Repuesto: Cambio de un filtro de ACPM, cambio de filtro de hidráulico y cambio de la valvulina de las cadenas de la servotransmisión. MOTONIVELADORA - HYUNDAY - ICCU - 2000338 (NO OPERATIVA). Operador: JHONATAN AGUILAR. H. inicial: 4238.4. Novedades mecánicas: Se le estalla manguera principal y se solicitan pines de tornamesa. Intervención mecánica/Repuesto: Se bajo manguera y se manda grafar. VIBROCOMPACTADOR - AMMAN - ICCU - 3003606 (OPERATIVA). Operador: ALFREDO RODRIGUEZ. H. inicial: 3037.0. EXCAVADORA_DE_ORUGAS_BRAZO_LARGO - LINK BELT - ICCU - LBX210I6NKHEX1235 (NO OPERATIVA). Operador: JOSELIN CIFUENTES. H. inicial: 6143.7. Novedades mecánicas: Se solicitan cambio de filtros de ACPM y del Aire. Se daño o'ring del cilindro de arrastre. Intervención mecánica/Repuesto: Se le cambio o'ring, pero queda inoperativa por filtros de combustible.
08/04/2026	Municipio de La Palma, provincia de Rionegro. Vereda/Sector: ARENERA- LA HERMOSA - MURCA - MINIPI - GUANACAS - CAPITAN - RIO NEGRO. Actividad: Actividades de remoción de derrumbes sobre la Troncal del Rio Negro. Motoniveladora y vibro sin actividad, motoniveladora inoperativa. Retrocargador y oruga inoperativas, a la espera de filtros. Minicargador sale a la unidad de mantenimiento. Avance (km): 0.0. VOLQUETA_SENCILLA - ICCU - GZM755 (NO OPERATIVA). Operador: JOSE RUFINO. H. inicial: 4609. Kilometraje inicial: 87204. Novedades mecánicas: Se revienta la manguera del Toma fuerza. Intervención mecanica/Repuesto: Se bajo manguera de toma fuerza, se llevo al taller para su respectiva reparación. VOLQUETA_DOBLE_TROQUE - IVECO - ICCU - ODR782 (NO OPERATIVA). Operador: ALEXANDER MONTERO. Viajes: 0. H. inicial: 3691.1. Kilometraje inicial: 67226.2. Novedades mecánicas: Se le daño el turbo, cambio de filtros y aceites. VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - GZM758 (OPERATIVA). Operador: DANIEL RAMIREZ. Viajes: 7. H. inicial – H. final: 4739 - 4745. Kilometraje inicial - final: 64678 - 64719. RETROEXCAVADORA - ICCU - CAT08173 (NO OPERATIVA). Operador: HENRRY ROJAS. H. inicial: 8781.1. Novedades mecánicas: Esta para cambio de filtros, no prende la Maquina por bomba de combustible. MOTONIVELADORA - HYUNDAY - ICCU - 2000338 (NO OPERATIVA). Operador: JHONATAN AGUILAR. H. inicial: 4238.4. Novedades mecánicas: Se le estalla manguera principal y se solicitan pines de tornamesa. Intervención mecánica/Repuesto: Se bajo manguera y se manda grafar. VIBROCOMPACTADOR - AMMAN - ICCU - 3003606 (OPERATIVA). Operador: ALFREDO RODRIGUEZ. H. inicial: 3037.0. EXCAVADORA_DE_ORUGAS_BRAZO_LARGO - LINK BELT - ICCU - LBX210I6NKHEX1235 (NO OPERATIVA). Operador: JOSELIN CIFUENTES. H. inicial: 6143.7. Novedades mecánicas: Se solicitan cambio de filtros de ACPM. Se parte pasador del brazo. Intervención mecánica/Repuesto: Se le cambio o'ring, pero queda inoperativa por filtros de combustible.
09/04/2026	Municipio de La Palma, provincia de Rionegro. Vereda/Sector: ARENERA- LA HERMOSA - MURCA - MINIPI - GUANACAS - CAPITAN - RIO NEGRO. Actividad: Actividades de remoción de derrumbes sobre la Troncal del Rio Negro. Motoniveladora se intervino mecánicamente, queda operativa. Retrocargador y oruga inoperativas, a la espera de filtros. Avance (km): 0.0. VOLQUETA_SENCILLA - ICCU - GZM755 (NO OPERATIVA). Operador: JOSE RUFINO. H. inicial: 4609. Kilometraje inicial: 87204. Novedades mecánicas: Se revienta la manguera del

	Toma fuerza. Intervención mecánica/Repuesto: Se bajo manguera de toma fuerza, se llevo al taller para su respectiva reparación. VOLQUETA_DOBLE_TROQUE - IVECO - ICCU - ODR782 (OPERATIVA). Operador: ALEXANDER MONTERO. Viajes: 2. H. inicial – H. final: 3698.1 - 3706.4. Kilometraje inicial - final: 67226.2 - 67407.4. ACPM (gl): 38.004 GL. Novedades mecánicas: Se requiere escáner. Intervención mecánica/Repuesto: Se cambiaron los Aceites y filtros. VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - GZM758 (OPERATIVA). Operador: DANIEL RAMIREZ. Viajes: 7. H. inicial – H. final: 4745 - 4751. Kilometraje inicial - final: 64719 - 64776. RETROEXCAVADORA - ICCU - CAT08173 (NO OPERATIVA). Operador: HENRRY ROJAS. H. inicial: 8781.1. Novedades mecánicas: Esta para cambio de filtros, no prende la Maquina por bomba de combustible. MOTONIVELADORA - HYUNDAY - ICCU - 2000338 (OPERATIVA). Operador: JHONATAN AGUILAR. H. inicial: 4238.4. Intervención mecánica/Repuesto: Se intervino motoniveladora, maquina operativa. VIBROCOMPACTADOR - AMMAN - ICCU - 3003606 (OPERATIVA). Operador: ALFREDO RODRIGUEZ. H. inicial: 3037.0. EXCAVADORA_DE_ORUGAS_BRAZO_LARGO - LINK BELT - ICCU - LBX210I6NKHEX1235 (NO OPERATIVA). Operador: JOSELIN CIFUENTES. H. inicial: 6143.7. Novedades mecánicas: Se solicitan cambio de filtros de ACPM. Se parte pasador del brazo. Intervención mecánica/Repuesto: inoperativa por filtros de combustible y pasador del brazo.
10/04/2026	Municipio de La Palma, provincia de Rionegro. Vereda/Sector: ARENERA- LA HERMOSA - MURCA - MINIPI - GUANACAS - CAPITAN - RIO NEGRO. Actividad: Actividades de remoción de derrumbes sobre la Troncal del Rio Negro. Motoniveladora había quedado operativa pero se totea correa de motor Inoperativa. Retrocargador aun inoperativo por falla eléctrica. Oruga queda operativa e interviene vía entre la palma y pacho. Avance (km): 0.15. VOLQUETA_SENCILLA - ICCU - GZM755 (NO OPERATIVA). Operador: JOSE RUFINO. H. inicial: 4609. Kilometraje inicial: 87204. Novedades mecánicas: Se revienta la manguera del Toma fuerza. Intervención mecánica/Repuesto: Se bajo manguera de toma fuerza, se llevo al taller para su respectiva reparación. VOLQUETA_DOBLE_TROQUE - IVECO - ICCU - ODR782 (OPERATIVA). Operador: ALEXANDER MONTERO. Viajes: 2. H. inicial – H. final: 3706.4 - 3713.1. Kilometraje inicial - final: 67407.4 - 67540.9. ACPM (gl): 38.004 GL. Novedades mecánicas: Se requiere escáner. Intervención mecánica/Repuesto: Se cambiaron los Aceites y filtros. VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - GZM758 (OPERATIVA). Operador: DANIEL RAMIREZ. Viajes: 4. H. inicial – H. final: 4751 - 4757. Kilometraje inicial - final: 64776 - 64849. RETROEXCAVADORA - ICCU - CAT08173 (NO OPERATIVA). Operador: HENRRY ROJAS. H. inicial – H. final: 8781.1 - 8784.5. Novedades mecánicas: Presento falla eléctrica. MOTONIVELADORA - HYUNDAY - ICCU - 2000338 (NO OPERATIVA). Operador: JHONATAN AGUILAR. H. inicial – H. final: 4238.4 - 42340.2. ACPM (gl): 59.086 GL. Novedades mecánicas: Se totea correa del motor. VIBROCOMPACTADOR - AMMAN - ICCU - 3003606 (OPERATIVA). Operador: ALFREDO RODRIGUEZ. ACPM (gl): 58.940 GL. H. inicial – H. final: 3037.0 - 3043.9. EXCAVADORA_DE_ORUGAS_BRAZO_LARGO - LINK BELT - ICCU - LBX210I6NKHEX1235 (OPERATIVA). Operador: JOSELIN CIFUENTES. H. inicial – H. final: 6143.7 - 6150.7. Intervención mecánica/Repuesto: Se intervino mecánicamente Retro operativa.
11/04/2026	Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de La Palma, provincia de Rionegro. Vereda/Sector: ARENERA- LA HERMOSA - MURCA - MINIPI - GUANACAS - CAPITAN - RIO NEGRO. Actividad: Equipos sin actividad programada, Día sábado. Doblé troque traslada el vibro desde la cañada hasta Yacopí para realizar actividad de compactación. Avance (km): 0.0. VOLQUETA_SENCILLA - - ICCU - GZM755 (NO OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: JOSE RUFINO. H. inicial – H. final: 4609. Kilometraje inicial - final: 87204. Novedades mecánicas: Se revienta la manguera del Toma fuerza. Intervención mecánica/Repuesto: Se bajo manguera de toma fuerza, se llevo al taller para su respectiva reparación. VOLQUETA_DOBLE_TROQUE - IVECO - ICCU - ODR782 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: ALEXANDER MONTERO. Número de viajes material sobrante: . H. inicial – H. final: 3713.1 - 3718.7. Kilometraje inicial - final: 67540.9 - 67610.2. ACPM (gl): . Novedades mecánicas: Se requiere escáner. Intervención mecánica/Repuesto: . VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - GZM758 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: DANIEL RAMIREZ. Número de viajes material sobrante: 0. H. inicial – H. final: 4757. Kilometraje inicial - final: 64849. ACPM (gl): . RETROEXCAVADORA - - ICCU - CAT08173 (NO OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: HENRRY ROJAS. H. inicial – H. final: 8784.5. ACPM (gl): . Intervención mecánica/Repuesto: . Novedades mecánicas: Presento falla eléctrica. MOTONIVELADORA - HYUNDAY - ICCU

	- 2000338 (NO OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: JHONATAN AGUILAR. H. inicial – H. final: 42340.2. ACPM (gl): . Novedades mecánicas: Se totea correa del motor. Intervención mecánica/Repuesto: VIBROCOMPACTADOR - AMMAN - ICCU - 3003606 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: ALFREDO RODRIGUEZ. ACPM (gl): . H. inicial – H. final: 3043.9 - 3048.7. EXCAVADORA_DE_ORUGAS_BRAZO_LARGO - LINK BELT - ICCU - LBX210I6NKHEX1235 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: JOSELIN CIFUENTES. H. inicial – H. final: 6150.7. ACPM (gl): . Intervención mecánica/Repuesto: . Novedades mecánicas: . Fin del reporte.
13/04/2026	Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de La Palma, provincia de Rionegro. Vereda/Sector: ARENERA- LA HERMOSA - MURCA - MINIPI - GUANACAS - CAPITAN - RIO NEGRO. Actividad: Actividades de remoción de derrumbes sobre la Troncal del Rio Negro. Motoniveladora había quedado operativa pero se totea correa de motor Inoperativa. Retrocargador aun inoperativo por falla eléctrica. Oruga queda operativa e interviene vía entre la palma y pacho. Avance (km): 0.0. VOLQUETA_SENCILLA - - ICCU - GZM755 (NO OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: JOSE RUFINO. H. inicial – H. final: 4609. Kilometraje inicial - final: 87204. Novedades mecánicas: Se revienta la manguera del Toma fuerza. Intervención mecánica/Repuesto: Se bajo manguera de toma fuerza, se llevo al taller para su respectiva reparación. VOLQUETA_DOBLE_TROQUE - IVECO - ICCU - ODR782 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: ALEXANDER MONTERO. Número de viajes material sobrante: 3. H. inicial – H. final: 3718.7 - 3730.5. Kilometraje inicial - final: 67610.2 - 67787.0. ACPM (gl): 64.000 GL. Novedades mecánicas: Se requiere escáner. Intervención mecánica/Repuesto: . VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - GZM758 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: DANIEL RAMIREZ. Número de viajes material sobrante: 5. H. inicial – H. final: 4757 - 4763. Kilometraje inicial - final: 64849 - 64937. ACPM (gl): . RETROEXCAVADORA - - ICCU - CAT08173 (NO OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: HENRRY ROJAS. H. inicial – H. final: 8784.5 - 8785.0. ACPM (gl): 40.000. Intervención mecánica/Repuesto: . Novedades mecánicas: Presento falla eléctrica. MOTONIVELADORA - HYUNDAY - ICCU - 2000338 (NO OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: JHONATAN AGUILAR. H. inicial – H. final: 42340.2. ACPM (gl): . Novedades mecánicas: Se totea correa del motor. Intervención mecánica/Repuesto: VIBROCOMPACTADOR - AMMAN - ICCU - 3003606 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: ALFREDO RODRIGUEZ. ACPM (gl): . H. inicial – H. final: 3048.7 - 3052.5. EXCAVADORA_DE_ORUGAS_BRAZO_LARGO - LINK BELT - ICCU - LBX210I6NKHEX1235 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: JOSELIN CIFUENTES. H. inicial – H. final: 6150.7 - 6157.4. ACPM (gl): 60.000 GL. Intervención mecánica/Repuesto: . Novedades mecánicas: . Fin del reporte.
14/04/2026	Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de La Palma, provincia de Rionegro. Vereda/Sector: ARENERA- LA HERMOSA - MURCA - MINIPI - GUANACAS - CAPITAN - RIO NEGRO. Actividad: Actividades de remoción de derrumbes sobre la Troncal del Rio Negro. Motoniveladora había quedado operativa pero se totea correa de motor Inoperativa. Retrocargador aun inoperativo por falla eléctrica. Oruga interviene vía entre la palma y pacho. Avance (km): 0.0. VOLQUETA_SENCILLA - - ICCU - GZM755 (NO OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: JOSE RUFINO. H. inicial – H. final: 4609. Kilometraje inicial - final: 87204. Novedades mecánicas: Se revienta la manguera del Toma fuerza. Intervención mecánica/Repuesto: Se bajo manguera de toma fuerza, se llevo al taller para su respectiva reparación. VOLQUETA_DOBLE_TROQUE - IVECO - ICCU - ODR782 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: ALEXANDER MONTERO. Número de viajes material sobrante: 5. H. inicial – H. final: 3730.5 - 3739.7. Kilometraje inicial - final: 67787.0 - 67891.0. ACPM (gl): . Novedades mecánicas: Se requiere escáner. Intervención mecánica/Repuesto: . VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - GZM758 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: DANIEL RAMIREZ. Número de viajes material sobrante: 5. H. inicial – H. final: 4763 - 4772. Kilometraje inicial - final: 64937 - 65029. ACPM (gl): . RETROEXCAVADORA - - ICCU - CAT08173 (NO OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: HENRRY ROJAS. H. inicial – H. final: 8785.0. ACPM (gl): . Intervención mecánica/Repuesto: . Novedades mecánicas: Presento falla eléctrica. MOTONIVELADORA - HYUNDAY - ICCU - 2000338 (NO OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: JHONATAN AGUILAR. H. inicial – H. final: 42340.2. ACPM (gl): . Novedades mecánicas: Se totea correa del motor. Intervención mecánica/Repuesto: VIBROCOMPACTADOR - AMMAN - ICCU - 3003606 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: ALFREDO RODRIGUEZ. ACPM (gl): . H. inicial – H. final: 3052.5 - 3059.0. EXCAVADORA_DE_ORUGAS_BRAZO_LARGO - LINK BELT - ICCU -

	LBX210I6NKHEX1235 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: JOSELIN CIFUENTES. H. inicial – H. final: 6157.4 - 6166.1. ACPM (gl): . Intervención mecánica/Repuesto: . Novedades mecánicas: . Fin del reporte.
15/04/2026	Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de La Palma, provincia de Rionegro. Vereda/Sector: ARENERA- LA HERMOSA - MURCA - MINIPI - GUANACAS - CAPITAN - RIO NEGRO. Actividad: Actividades de remoción de derrumbes sobre la Troncal del Rio Negro. Motoniveladora había quedado operativa pero se totea correa de motor Inoperativa. Retrocargador aun inoperativo por falla eléctrica. Oruga interviene vía entre la palma y pacho. Avance (km): 0.0. VOLQUETA_SENCILLA - - ICCU - GZM755 (NO OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: JOSE RUFINO. H. inicial – H. final: 4609. Kilometraje inicial - final: 87204. Novedades mecánicas: Se revienta la manguera del Toma fuerza. Intervención mecánica/Repuesto: Se bajo manguera de toma fuerza, se llevo al taller para su respectiva reparación. VOLQUETA_DOBLE_TROQUE - IVECO - ICCU - ODR782 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: ALEXANDER MONTERO. Número de viajes material sobrante: 2. H. inicial – H. final: 3739.7 - 3746.1. Kilometraje inicial - final: 67891.0 - 67948.1. ACPM (gl): . Novedades mecánicas: Se requiere escáner. Intervención mecánica/Repuesto: . VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - GZM758 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: DANIEL RAMIREZ. Número de viajes material sobrante: 2. H. inicial – H. final: 4772 - 4780. Kilometraje inicial - final: 65029 - 65140. ACPM (gl): 33.003 GL. RETROEXCAVADORA - - ICCU - CAT08173 (NO OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: HENRRY ROJAS. H. inicial – H. final: 8785.0. ACPM (gl): . Intervención mecánica/Repuesto: . Novedades mecánicas: Presento falla eléctrica. MOTONIVELADORA - HYUNDAY - ICCU - 2000338 (NO OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: JHONATAN AGUILAR. H. inicial – H. final: 42340.2 - 4242.2. ACPM (gl): . Novedades mecánicas: Se totea correa del motor. Intervención mecánica/Repuesto: VIBROCOMPACTADOR - AMMAN - ICCU - 3003606 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: ALFREDO RODRIGUEZ. ACPM (gl): . H. inicial – H. final: 3059.0 - 3063.0. EXCAVADORA_DE_ORUGAS_BRAZO_LARGO - LINK BELT - ICCU - LBX210I6NKHEX1235 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: JOSELIN CIFUENTES. H. inicial – H. final: 6166.1 - 6174.8. ACPM (gl): 90.000 GL. Intervención mecánica/Repuesto: . Novedades mecánicas: . Fin del reporte.
16/04/2026	Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de La Palma, provincia de Rionegro. Vereda/Sector: ARENERA- LA HERMOSA - MURCA - MINIPI - GUANACAS - CAPITAN - RIO NEGRO. Actividad: Actividades de remoción de derrumbes sobre la Troncal del Rio Negro. Motoniveladora había quedado operativa pero se totea correa de motor Inoperativa. Retrocargador queda operativo después de revisión electrica. Oruga interviene vía entre la palma y pacho. Avance (km): 0.0. VOLQUETA_SENCILLA - - ICCU - GZM755 (NO OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: JOSE RUFINO. H. inicial – H. final: 4609. Kilometraje inicial - final: 87204. Novedades mecánicas: Se revienta la manguera del Toma fuerza. Intervención mecánica/Repuesto: Se bajo manguera de toma fuerza, se llevo al taller para su respectiva reparación. VOLQUETA_DOBLE_TROQUE - IVECO - ICCU - ODR782 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: ALEXANDER MONTERO. Número de viajes material sobrante: 3. H. inicial – H. final: 3746.1 - 3755.3. Kilometraje inicial - final: 67948.1 - 68078.3. ACPM (gl): 60.004 GL. Novedades mecánicas: Se requiere escáner. Intervención mecánica/Repuesto: . VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - GZM758 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: DANIEL RAMIREZ. Número de viajes material sobrante: 5. H. inicial – H. final: 4780 - 4788. Kilometraje inicial - final: 65140 - 65236. ACPM (gl): . RETROEXCAVADORA - - ICCU - CAT08173 (PERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: HENRRY ROJAS. H. inicial – H. final: 8785.0 - 8787.4. ACPM (gl): . Intervención mecánica/Repuesto: Se reviso tema eléctrico dejando la maquina operativa. Novedades mecánicas: Se necesita revisar Servo y la doble. MOTONIVELADORA - HYUNDAY - ICCU - 2000338 (NO OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: JHONATAN AGUILAR. H. inicial – H. final: 4242.2. ACPM (gl): . Novedades mecánicas: Se totea correa del motor. Intervención mecánica/Repuesto: VIBROCOMPACTADOR - AMMAN - ICCU - 3003606 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: ALFREDO RODRIGUEZ. ACPM (gl): . H. inicial – H. final: 3063.0 - 3065.1. EXCAVADORA_DE_ORUGAS_BRAZO_LARGO - LINK BELT - ICCU - LBX210I6NKHEX1235 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: JOSELIN CIFUENTES. H. inicial – H. final: 6174.8 - 6183.7. ACPM (gl): . Intervención mecánica/Repuesto: . Novedades mecánicas: . Fin del reporte.

17/04/2026	Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de La Palma, provincia de Rionegro. Vereda/Sector: ARENERA- LA HERMOSA - MURCA - MINIPI - GUANACAS - CAPITAN - RIO NEGRO. Actividad: Actividades de remoción de derrumbes sobre la Troncal del Rio Negro. Motoniveladora había quedado operativa pero se totea correa de motor Inoperativa. Retrocargador extiende material en el botadero. Oruga interviene vía entre la palma y pacho. Avance (km): 0.0. VOLQUETA_SENCILLA - - ICCU - GZM755 (NO OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: JOSE RUFINO. H. inicial – H. final: 4609. Kilometraje inicial - final: 87204. Novedades mecánicas: Se revienta la manguera del Toma fuerza. Intervención mecánica/Repuesto: Se bajo manguera de toma fuerza, se llevo al taller para su respectiva reparación. VOLQUETA_DOBLE_TROQUE - IVECO - ICCU - ODR782 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: ALEXANDER MONTERO. Número de viajes material sobrante: 5. H. inicial – H. final: 3755.3 - 3762.1. Kilometraje inicial - final: 68078.3 - 68138.1. ACPM (gl): . Novedades mecánicas: Se requiere escáner y vidrio lateral derecho. Intervención mecánica/Repuesto: . VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - GZM758 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: DANIEL RAMIREZ. Número de viajes material sobrante: 12. H. inicial – H. final: 4788 - 4792. Kilometraje inicial - final: 65236 - 65242. ACPM (gl): . RETROEXCAVADORA - - ICCU - CAT08173 (OERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: HENRRY ROJAS. H. inicial – H. final: 8787.4 - 8794.4. ACPM (gl): . Intervención mecánica/Repuesto: . Novedades mecánicas: Se necesita revisar Servo y la doble. MOTONIVELADORA - HYUNDAY - ICCU - 2000338 (NO OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: JHONATAN AGUILAR. H. inicial – H. final: 4242.2. ACPM (gl): . Novedades mecánicas: Se totea correa del alternador. Intervención mecánica/Repuesto: VIBROCOMPACTADOR - AMMAN - ICCU - 3003606 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: ALFREDO RODRIGUEZ. ACPM (gl): . H. inicial – H. final: 3065.1 - 3066.4. EXCAVADORA_DE_ORUGAS_BRAZO_LARGO - LINK BELT - ICCU - LBX210I6NKHEX1235 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: JOSELIN CIFUENTES. H. inicial – H. final: 6183.7 - 6187.5. ACPM (gl): . Intervención mecánica/Repuesto: . Novedades mecánicas: . Fin del reporte.
20/04/2026	Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de La Palma, provincia de Rionegro. Vereda/Sector: ARENERA- LA HERMOSA - MURCA - MINIPI - GUANACAS - CAPITAN - RIO NEGRO. Actividad: Actividades de remoción de derrumbes sobre la Troncal del Rio Negro. Motoniveladora había quedado operativa pero se totea correa de motor Inoperativa. Retrocargador extiende material en el botadero. Oruga interviene vía entre la palma y pacho. Avance (km): 0.0. VOLQUETA_SENCILLA - - ICCU - GZM755 (NO OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: JOSE RUFINO. H. inicial – H. final: 4609. Kilometraje inicial - final: 87204. Novedades mecánicas: Se revienta la manguera del Toma fuerza. Intervención mecánica/Repuesto: Se bajo manguera de toma fuerza, se llevo al taller para su respectiva reparación. VOLQUETA_DOBLE_TROQUE - IVECO - ICCU - ODR782 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: ALEXANDER MONTERO. Número de viajes material sobrante: 6. H. inicial – H. final: 3762.1 - 3773.0. Kilometraje inicial - final: 68138.1 - 68255.1. ACPM (gl): . Novedades mecánicas: Se requiere escáner y vidrio lateral derecho. Intervención mecánica/Repuesto: . VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - GZM758 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: DANIEL RAMIREZ. Número de viajes material sobrante: 9. H. inicial – H. final: 4792 - 4801. Kilometraje inicial - final: 65242 - 65354. ACPM (gl): 25.024 GL. RETROEXCAVADORA - - ICCU - CAT08173 (OERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: HENRRY ROJAS. H. inicial – H. final: 8794.4 - 8802.3. ACPM (gl): 40.000 GL. Intervención mecánica/Repuesto: . Novedades mecánicas: Se necesita revisar Servo y la doble. MOTONIVELADORA - HYUNDAY - ICCU - 2000338 (NO OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: JHONATAN AGUILAR. H. inicial – H. final: 4242.2. ACPM (gl): . Novedades mecánicas: Se totea correa del alternador. Intervención mecánica/Repuesto: VIBROCOMPACTADOR - AMMAN - ICCU - 3003606 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: ALFREDO RODRIGUEZ. ACPM (gl): . H. inicial – H. final: 3066.4 - 3071.1. EXCAVADORA_DE_ORUGAS_BRAZO_LARGO - LINK BELT - ICCU - LBX210I6NKHEX1235 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: JOSELIN CIFUENTES. H. inicial – H. final: 6187.5 - 6196.0. ACPM (gl): 80.000 GL. Intervención mecánica/Repuesto: . Novedades mecánicas: . Fin del reporte.
21/04/2026	Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de La Palma, provincia de Rionegro. Vereda/Sector: ARENERA- LA HERMOSA - MURCA - MINIPI - GUANACAS - CAPITAN - RIO NEGRO. Actividad: Actividades de remoción de derrumbes sobre la Troncal del Rio Negro. Motoniveladora había quedado operativa pero se totea correa de motor Inoperativa. Retrocargador extiende material en el botadero. Oruga

	interviene vía entre la palma y pacho. Avance (km): 0.0. VOLQUETA_SENCILLA - - ICCU - GZM755 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: JOSE RUFINO. H. inicial – H. final: 4609 - 4618. Kilometraje inicial - final: 87204 - 87225. Novedades mecánicas: Se revienta la manguera del Toma fuerza. Intervención mecánica/Repuesto: Se Cambia manguera de toma fuerza y queda operativa la volqueta. VOLQUETA_DOBLE_TROQUE - IVECO - ICCU - ODR782 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: ALEXANDER MONTERO. Número de viajes material sobrante: 8. H. inicial – H. final: 3773.0 - 3780.2. Kilometraje inicial - final: 68255.1 - 68352.4. ACPM (gl): 53.001 GL. Novedades mecánicas: Se requiere escáner y vidrio lateral derecho. Intervención mecánica/Repuesto: . VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - GZM758 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: DANIEL RAMIREZ. Número de viajes material sobrante: 15. H. inicial – H. final: 4801 - 4808. Kilometraje inicial - final: 65354 - 65439. ACPM (gl): . RETROEXCAVADORA - - ICCU - CAT08173 (OERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: HENRRY ROJAS. H. inicial – H. final: 8802.3 - 8807.8. ACPM (gl): . Intervención mecánica/Repuesto: . Novedades mecánicas: Se necesita revisar Servo y la doble. MOTONIVELADORA - HYUNDAY - ICCU - 2000338 (NO OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: JHONATAN AGUILAR. H. inicial – H. final: 4242.2. ACPM (gl): . Novedades mecánicas: Se totea correa del alternador. Intervención mecánica/Repuesto: VIBROCOMPACTADOR - AMMAN - ICCU - 3003606 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: ALFREDO RODRIGUEZ. ACPM (gl): 59.711 GL. H. inicial – H. final: 3071.1 - 3077.6. EXCAVADORA_DE_ORUGAS_BRAZO_LARGO - LINK BELT - ICCU - LBX210I6NKHEX1235 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: JOSELIN CIFUENTES. H. inicial – H. final: 6196.0 - 6205.3. ACPM (gl): . Intervención mecánica/Repuesto: . Novedades mecánicas: . Fin del reporte.
22/04/2026	Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de La Palma, provincia de Rionegro. Vereda/Sector: ARENERA- LA HERMOSA - MURCA - MINIPI - GUANACAS - CAPITAN - RIO NEGRO. Actividad: Actividades de remoción de derrumbes sobre la Troncal del Rio Negro. Motoniveladora se interviene mecánicamente y queda operativa. Retrocargador extiende material en el botadero. Oruga interviene vía entre la palma y pacho. Avance (km): 0.0. VOLQUETA_SENCILLA - - ICCU - GZM755 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: JOSE RUFINO. Número de viajes material sobrante: 11. H. inicial – H. final: 4618 - 4625. Kilometraje inicial - final: 87225 - 87328. Novedades mecánicas: Intervención mecánica/Repuesto: . VOLQUETA_DOBLE_TROQUE - IVECO - ICCU - ODR782 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: ALEXANDER MONTERO. Número de viajes material sobrante: 12. H. inicial – H. final: 3780.2 - 3790.0. Kilometraje inicial - final: 68352.4 - 68455. ACPM (gl): . Novedades mecánicas: Se requiere escáner y vidrio lateral derecho. Intervención mecánica/Repuesto: . VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - GZM758 (NO OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: DANIEL RAMIREZ. Número de viajes material sobrante: 5. H. inicial – H. final: 4808 - 4815. Kilometraje inicial - final: 65439 - 65522. ACPM (gl): . Novedades mecánicas: Se daña manguera del tomafuerza. RETROEXCAVADORA - - ICCU - CAT08173 (OERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: HENRRY ROJAS. H. inicial – H. final: 8807.8 - 8813.8. ACPM (gl): . Intervención mecánica/Repuesto: . Novedades mecánicas: Se necesita revisar Servo y la doble. MOTONIVELADORA - HYUNDAY - ICCU - 2000338 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: JHONATAN AGUILAR. H. inicial – H. final: 4242.2 - 4246.2. ACPM (gl): . Novedades mecánicas: Se totea correa del alternador. Intervención mecánica/Repuesto: Se pone correa del alternador dejando el equipo operativo. VIBROCOMPACTADOR - AMMAN - ICCU - 3003606 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: ALFREDO RODRIGUEZ. ACPM (gl): 59.711 GL. H. inicial – H. final: 3077.6 - 3080.8. EXCAVADORA_DE_ORUGAS_BRAZO_LARGO - LINK BELT - ICCU - LBX210I6NKHEX1235 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: JOSELIN CIFUENTES. H. inicial – H. final: 6205.3 - 6214.5. ACPM (gl): . Intervención mecánica/Repuesto: . Novedades mecánicas: . Fin del reporte.
23/04/2026	Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de La Palma, provincia de Rionegro. Vereda/Sector: ARENERA- LA HERMOSA - MURCA - MINIPI - GUANACAS - CAPITAN - RIO NEGRO. Actividad: Actividades de remoción de derrumbes sobre la Troncal del Rio Negro. Motoniveladora conformación de vía en el sector Cucharito. Retrocargador extiende material en el botadero. Oruga interviene vía entre la palma y pacho. Avance (km): 0.8. VOLQUETA_SENCILLA - - ICCU - GZM755 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: JOSE RUFINO. Número de viajes material sobrante: 7. H. inicial – H. final: 4625 - 4634. Kilometraje inicial - final: 87328 - 87450. ACPM (gl): 34.001 GL. Novedades mecánicas: Intervención mecánica/Repuesto: . VOLQUETA_DOBLE_TROQUE - IVECO - ICCU - ODR782 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador:

	ALEXANDER MONTERO. Número de viajes material sobrante: 5. H. inicial – H. final: 3790.0 - 3794.5. Kilometraje inicial - final: 68455 - 68494.8. ACPM (gl): . Novedades mecánicas: Se requiere escáner y vidrio lateral derecho. Intervención mecánica/Repuesto: . VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - GZM758 (NO OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: DANIEL RAMIREZ. Número de viajes material sobrante: 5. H. inicial – H. final: 4808 - 4815. Kilometraje inicial - final: 65439 - 65522. ACPM (gl): . Novedades mecánicas: Se daña manguera del tomafuerza. RETROEXCAVADORA - - ICCU - CAT08173 (OERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: HENRRY ROJAS. H. inicial – H. final: 8813.8 - 8821.8. ACPM (gl): . Intervención mecánica/Repuesto: . Novedades mecánicas: Se necesita revisar Servo y la doble. MOTONIVELADORA - HYUNDAY - ICCU - 2000338 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: JHONATAN AGUILAR. H. inicial – H. final: 4246.2 - 4253.5. ACPM (gl): . Novedades mecánicas: Se totea correa del alternador. Intervención mecánica/Repuesto: Se pone correa del alternador dejando el equipo operativo. VIBROCOMPACTADOR - AMMAN - ICCU - 3003606 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: ALFREDO RODRIGUEZ. ACPM (gl): 59.711 GL. H. inicial – H. final: 3080.8 - 3085.7. EXCAVADORA_DE_ORUGAS_BRAZO_LARGO - LINK BELT - ICCU - LBX210I6NKHEX1235 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: JOSELIN CIFUENTES. H. inicial – H. final: 6214.5 - 6218.0. ACPM (gl): . Intervención mecánica/Repuesto: . Novedades mecánicas: . Fin del reporte.
24/04/2026	Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de La Palma, provincia de Rionegro. Vereda/Sector: ARENERA- LA HERMOSA - MURCA - GUANACAS - CAPITAN - RIO NEGRO - ZUMBE. Actividad: Actividades de remoción de derrumbes sobre la Troncal del Rio Negro. Motoniveladora y vibro conformación de vía Sector Zumbe. Retrocargador removiendo derrumbes sector Zumbe. Oruga interviene vía entre la palma y pacho. Avance (km): 0.1. VOLQUETA_SENCILLA - - ICCU - GZM755 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: JOSE RUFINO. Número de viajes material sobrante: 2. H. inicial – H. final: 4634 - 4642. Kilometraje inicial - final: 87450 - 87533. ACPM (gl): . Novedades mecánicas: Intervención mecánica/Repuesto: . VOLQUETA_DOBLE_TROQUE - IVECO - ICCU - ODR782 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: ALEXANDER MONTERO. Número de viajes material sobrante: 2. H. inicial – H. final: 3794.5 - 3800.8. Kilometraje inicial - final: 68494.8 - 68567.0. ACPM (gl): . Novedades mecánicas: Se requiere escáner y vidrio lateral derecho. Intervención mecánica/Repuesto: . VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - GZM758 (NO OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: DANIEL RAMIREZ. Número de viajes material sobrante: 5. H. inicial – H. final: 4808 - 4815. Kilometraje inicial - final: 65439 - 65522. ACPM (gl): . Novedades mecánicas: Se daña manguera del tomafuerza. RETROEXCAVADORA - - ICCU - CAT08173 (OERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: HENRRY ROJAS. H. inicial – H. final: 8821.8 - 8830.2. ACPM (gl): 17.629 GL. Intervención mecánica/Repuesto: . Novedades mecánicas: Se necesita revisar Servo y la doble. Esta sin fuerza la maquina. MOTONIVELADORA - HYUNDAY - ICCU - 2000338 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: JHONATAN AGUILAR. H. inicial – H. final: 4253.5 - 4260.2. ACPM (gl): . Novedades mecánicas: Se totea correa del alternador. Intervención mecánica/Repuesto: Se pone correa del alternador dejando el equipo operativo. VIBROCOMPACTADOR - AMMAN - ICCU - 3003606 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: ALFREDO RODRIGUEZ. ACPM (gl): . H. inicial – H. final: 3085.7 - 3092.4. EXCAVADORA_DE_ORUGAS_BRAZO_LARGO - LINK BELT - ICCU - LBX210I6NKHEX1235 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: JOSELIN CIFUENTES. H. inicial – H. final: 6218.0 - 6227.0. ACPM (gl): 55.000 GL. Intervención mecánica/Repuesto: . Novedades mecánicas: . Fin del reporte.
27/04/2026	Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de La Palma, provincia de Rionegro. Vereda/Sector: ARENERA- LA HERMOSA - MURCA - GUANACAS - CAPITAN - RIO NEGRO - ZUMBE. Actividad: Actividades de remoción de derrumbes sobre la Troncal del Rio Negro. Motoniveladora y vibro conformación de vía Sector Cucharito - Zumbe. Retrocargador removiendo derrumbes sector Zumbe. Oruga interviene vía entre la palma y pacho. Avance (km): 0.4. VOLQUETA_SENCILLA - - ICCU - GZM755 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: JOSE RUFINO. Número de viajes material sobrante: 5. H. inicial – H. final: 4642 - 4648. Kilometraje inicial - final: 87533 - 87656. ACPM (gl): . Novedades mecánicas: Intervención mecánica/Repuesto: . VOLQUETA_DOBLE_TROQUE - IVECO - ICCU - ODR782 (INOPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: ALEXANDER MONTERO. Número de viajes material sobrante: 2. H. inicial – H. final: 3794.5 - 3800.8. Kilometraje inicial - final: 68494.8 - 68567.0. ACPM (gl): . Novedades mecánicas: Se requiere escáner, se daña bomba del aceite. Intervención mecánica/Repuesto: . VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU -

	GZM758 (NO OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: DANIEL RAMIREZ. Número de viajes material sobrante: 0. H. inicial – H. final: 4815. Kilometraje inicial - final: 65522. ACPM (gl): . Novedades mecánicas: Se daña manguera del tomafuerza. RETROEXCAVADORA - - ICCU - CAT08173 (INOPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: HENRRY ROJAS. H. inicial – H. final: 8830.2. ACPM (gl): 40.000 GL. Intervención mecánica/Repuesto: . Novedades mecánicas: Se necesita revisar Servo y la doble. Esta sin fuerza la maquina. MOTONIVELADORA - HYUNDAY - ICCU - 2000338 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: JHONATAN AGUILAR. H. inicial – H. final: 4260.2 - 4262.8. ACPM (gl): 80.000 GL. Novedades mecánicas: Se totea correa del alternador. Intervención mecánica/Repuesto: Se pone correa del alternador dejando el equipo operativo. VIBROCOMPACTADOR - AMMAN - ICCU - 3003606 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: ALFREDO RODRIGUEZ. ACPM (gl): 40.000 GL. H. inicial – H. final: 3092.4 - 3098.7. EXCAVADORA_DE_ORUGAS_BRAZO_LARGO - LINK BELT - ICCU - LBX210I6NKHEX1235 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: JOSELIN CIFUENTES. H. inicial – H. final: 6227.0 - 6234.5. ACPM (gl): . Intervención mecánica/Repuesto: . Novedades mecánicas: . RETROEXCAVADORA - - ALQUILER - CAT416E (OERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: Bernardo. H. inicial – H. final: 15886.0 - 15894.1. Fin del reporte.
28/04/2026	Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de La Palma, provincia de Rionegro. Vereda/Sector: ARENERA- LA HERMOSA - MURCA - GUANACAS - CAPITAN - RIO NEGRO - ZUMBE. Actividad: Actividades de remoción de derrumbes sobre la Troncal del Rio Negro. Motoniveladora y vibro conformación de vía Sector Cucharito - Zumbe. Retrocargador removiendo derrumbes sector Zumbe pero queda inoperativo. Oruga interviene vía entre la palma y pacho. Avance (km): 1.0. VOLQUETA_SENCILLA - - ICCU - GZM755 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: JOSE RUFINO. Número de viajes material sobrante: 3. H. inicial – H. final: 4648 - 4651. Kilometraje inicial - final: 87656 - 87678. ACPM (gl): . Novedades mecánicas: Intervención mecánica/Repuesto: . VOLQUETA_DOBLE_TROQUE - IVECO - ICCU - ODR782 (NO OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: ALEXANDER MONTERO. Número de viajes material sobrante: 0. H. inicial – H. final: 3794.5 - 3800.8. Kilometraje inicial - final: 68494.8 - 68567.0. ACPM (gl): . Novedades mecánicas: Se requiere escáner, se daña bomba del aceite. Intervención mecánica/Repuesto: . VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - GZM758 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: DANIEL RAMIREZ. Número de viajes material sobrante: 5. H. inicial – H. final: 4815 - 4822. Kilometraje inicial - final: 65522 - 65575. ACPM (gl): 30.043 GL. Novedades mecánicas: . RETROEXCAVADORA - - ICCU - CAT08173 (NO OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: HENRRY ROJAS. H. inicial – H. final: 8830.2. ACPM (gl): . Intervención mecánica/Repuesto: . Novedades mecánicas: Se necesita revisar Servo y la doble. Esta sin fuerza la maquina. MOTONIVELADORA - HYUNDAY - ICCU - 2000338 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: JHONATAN AGUILAR. H. inicial – H. final: 4262.8 - 4269.6. ACPM (gl): . Novedades mecánicas: Se totea correa del alternador. Intervención mecánica/Repuesto: Se pone correa del alternador dejando el equipo operativo. VIBROCOMPACTADOR - AMMAN - ICCU - 3003606 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: ALFREDO RODRIGUEZ. ACPM (gl): . H. inicial – H. final: 3098.7 - 3106.2. EXCAVADORA_DE_ORUGAS_BRAZO_LARGO - LINK BELT - ICCU - LBX210I6NKHEX1235 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: JOSELIN CIFUENTES. H. inicial – H. final: 6234.5 - 6241.1. ACPM (gl): . Intervención mecánica/Repuesto: . Novedades mecánicas: . RETROEXCAVADORA - - ALQUILER - CAT416E (OERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: Bernardo. H. inicial – H. final: 15894.1. Fin del reporte.
29/04/2026	Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de La Palma, provincia de Rionegro. Vereda/Sector: ARENERA- LA HERMOSA - MURCA - GUANACAS - CAPITAN - RIO NEGRO - ZUMBE. Actividad: Actividades de remoción de derrumbes sobre la Troncal del Rio Negro. Motoniveladora y vibro conformación de vía Sector Cucharito - Zumbe, motoniveladora se le parte un pasador se intervino inmediatamente. Retrocargador en alquiler removiendo derrumbes sector Zumbe. Oruga interviene vía entre la palma y pacho. Avance (km): 0.0. VOLQUETA_SENCILLA - - ICCU - GZM755 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: JOSE RUFINO. Número de viajes material sobrante: 0. H. inicial – H. final: 4651. Kilometraje inicial - final: 87678. ACPM (gl): . Novedades mecánicas: Intervención mecánica/Repuesto: . VOLQUETA_DOBLE_TROQUE - IVECO - ICCU - ODR782 (NO OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: ALEXANDER MONTERO. Número de viajes material sobrante: 0. H. inicial – H. final: 3800.8. Kilometraje inicial - final: 68567.0. ACPM (gl): . Novedades mecánicas: Se requiere escáner, se daña bomba del aceite. Intervención

	mecánica/Repuesto: . VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - GZM758 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: DANIEL RAMIREZ. Número de viajes material sobrante: 2. H. inicial – H. final: 4822 - 4823. Kilometraje inicial - final: 65575 - 65593. ACPM (gl): . Novedades mecánicas: . Intervención mecánica/Repuesto: Se realiza cambio de llantas y mantenimiento general. RETROEXCAVADORA - - ICCU - CAT08173 (NO OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: HENRRY ROJAS. H. inicial – H. final: 8830.2. ACPM (gl): . Intervención mecánica/Repuesto: Se realiza intervención mecánica, el equipo necesita ser intervenido en Bogotá. Novedades mecánicas: Se necesita revisar Servo y la doble. Esta sin fuerza la maquina. MOTONIVELADORA - HYUNDAY - ICCU - 2000338 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: JHONATAN AGUILAR. H. inicial – H. final: 4269.6. ACPM (gl): . Novedades mecánicas: Se parte pasador de giro. Intervención mecánica/Repuesto: . VIBROCOMPACTADOR - AMMAN - ICCU - 3003606 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: ALFREDO RODRIGUEZ. ACPM (gl): . H. inicial – H. final: 3106.2 - 3108.7. EXCAVADORA_DE_ORUGAS_BRAZO_LARGO - LINK BELT - ICCU - LBX210I6NKHEX1235 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: JOSELIN CIFUENTES. H. inicial – H. final: 6241.1 - 6242.4. ACPM (gl): 84.899 GL. Intervención mecánica/Repuesto: . Novedades mecánicas: . RETROEXCAVADORA - - ALQUILER - CAT416E (OERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: Bernardo. H. inicial – H. final: 15904.9 - 15914.1. Fin del reporte.
30/04/2026	Buenas tardes. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de La Palma, provincia de Rionegro. Vereda/Sector: ARENERA- LA HERMOSA - MURCA - GUANACAS - CAPITAN - RIO NEGRO - ZUMBE. Actividad: Actividades de remoción de derrumbes sobre la Troncal del Rio Negro. Motoniveladora y vibro conformación de vía Sector Cucharito - Zumbe. Retrocargador en alquiler removiendo derrumbes sector Zumbe. Oruga interviene vía entre la palma y pacho. Avance (km): 0.2. VOLQUETA_SENCILLA - - ICCU - GZM755 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: JOSE RUFINO. Número de viajes material sobrante: 6. H. inicial – H. final: 4651 - 4658. Kilometraje inicial - final: 87678 - 87741. ACPM (gl): . Novedades mecánicas: Intervención mecánica/Repuesto: . VOLQUETA_DOBLE_TROQUE - IVECO - ICCU - ODR782 (NO OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: ALEXANDER MONTERO. Número de viajes material sobrante: 0. H. inicial – H. final: 3800.8. Kilometraje inicial - final: 68567.0. ACPM (gl): . Novedades mecánicas: Se requiere escáner, se daña bomba del aceite. Intervención mecánica/Repuesto: . VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - GZM758 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: DANIEL RAMIREZ. Número de viajes material sobrante: 2. H. inicial – H. final: 4823 - 4829. Kilometraje inicial - final: 65593 - 65670. ACPM (gl): . Novedades mecánicas: . Intervención mecánica/Repuesto: Se realiza cambio de llantas y mantenimiento general. RETROEXCAVADORA - - ICCU - CAT08173 (NO OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: HENRRY ROJAS. H. inicial – H. final: 8830.2. ACPM (gl): . Intervención mecánica/Repuesto: Se realiza intervención mecánica, el equipo necesita ser intervenido en Bogotá. Novedades mecánicas: Se necesita revisar Servo y la doble. Esta sin fuerza la maquina. MOTONIVELADORA - HYUNDAY - ICCU - 2000338 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: JHONATAN AGUILAR. H. inicial – H. final: 4269.6 - 4271.8. ACPM (gl): . Novedades mecánicas: Se parte pasador de giro. Intervención mecánica/Repuesto: . VIBROCOMPACTADOR - AMMAN - ICCU - 3003606 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: ALFREDO RODRIGUEZ. ACPM (gl): . H. inicial – H. final: 3108.7 - 3115.2. EXCAVADORA_DE_ORUGAS_BRAZO_LARGO - LINK BELT - ICCU - LBX210I6NKHEX1235 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: JOSELIN CIFUENTES. H. inicial – H. final: 6242.4 - 6251.6. ACPM (gl): . Intervención mecánica/Repuesto: . Novedades mecánicas: . RETROEXCAVADORA - - ALQUILER - CAT416E (OERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: Bernardo. H. inicial – H. final: 15914.1 - 15922.5. Fin del reporte.

3. RELACIÓN DE TRANSPORTE Y REMISIÓN DE MATERIALES

RELACIÓN DE TRANSPORTE Y REMISIÓN DE MATERIALES			
FECHA	**MATERIAL**	**N° DE VIAJES**	**DESCRIPCIÓN**
1/04/2026	SOBRANTE	10	
2/04/2026	SOBRANTE	0	
3/04/2026	SOBRANTE	0	
4/04/2026	SOBRANTE	0	
5/04/2026	SOBRANTE	0	
6/04/2026	SOBRANTE	2	
7/04/2026	SOBRANTE	12	
8/04/2026	SOBRANTE	7	
9/04/2026	SOBRANTE	9	
10/04/2026	SOBRANTE	6	
11/04/2026	SOBRANTE	2	
12/04/2026	SOBRANTE	0	
13/04/2026	SOBRANTE	8	
14/04/2026	SOBRANTE	10	
15/04/2026	SOBRANTE	4	
16/04/2026	SOBRANTE	8	
17/04/2026	SOBRANTE	17	
18/04/2026	SOBRANTE	0	
19/04/2026	SOBRANTE	0	
20/04/2026	SOBRANTE	15	
21/04/2026	SOBRANTE	23	
22/04/2026	SOBRANTE	28	
23/04/2026	SOBRANTE	17	
24/04/2026	SOBRANTE	9	
25/04/2026	SOBRANTE	0	
26/04/2026	SOBRANTE	0	
27/04/2026	SOBRANTE	7	
28/04/2026	SOBRANTE	8	
29/04/2026	SOBRANTE	2	
30/04/2026	SOBRANTE	8	
TOTAL		**212**	

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025

4. AVANCE EN CAMPO (KM)

AVANCE DE OBRA LA PALMA				
FECHA	**LONGITUD (KM)**	**AVANCE (KM)**	**REPETICIÓN (KM)**	**DESCRIPCIÓN**
1/04/2026	0	0		**MOTO INOPERATIVA**
2/04/2026	0	0		**MOTO INOPERATIVA**
3/04/2026	0	0		**MOTO INOPERATIVA**
4/04/2026	0	0		**MOTO INOPERATIVA**
5/04/2026	0	0		**MOTO INOPERATIVA**
6/04/2026	0	0		**MOTO INOPERATIVA**
7/04/2026	0	0		**MOTO INOPERATIVA**
8/04/2026	0	0		**MOTO INOPERATIVA**
9/04/2026	0	0		**MOTO INOPERATIVA**
10/04/2026	0.15	0.15		**SOLEADO**
11/04/2026	**DOMINGO**			
12/04/2026	0	0.15		**LLUVIAS**
13/04/2026	0	0.15		**LLUVIAS**
14/04/2026	0	0.15		**LLUVIAS**
15/04/2026	0.1	0.25		**SOLEADO**
16/04/2026	0	0.25		**SOLEADO**
17/04/2026	0	0.25		**SOLEADO**
18/04/2026	0	0.25		**SOLEADO**
19/04/2026	**DOMINGO**			
20/04/2026	0	0.25		**LLUVIAS**
21/04/2026	0	0.25		**LLUVIAS**
22/04/2026	0.2	0.45		**SOLEADO**
23/04/2026	0.8	1.25		**SOLEADO**
24/04/2026	1	2.25		**SOLEADO**
25/04/2026	0	2.25		**SOLEADO**
26/04/2026	**DOMINGO**			
27/04/2026	0.4	2.65		**SOLEADO**
28/04/2026	1	3.65		**SOLEADO**
29/04/2026	0	3.65		**SOLEADO**
30/04/2026	0.2	3.85		**SOLEADO**
TOTAL	**3.85**	**3.85**		

5. RESUMEN DE HORAS DE LLUVIA, INOPERATIVIDAD Y EFECTIVAS LABORALES

RESUMEN DE HORAS DE LLUVIA, INOPERATIVIDAD Y EFECTIVAS LABORALES				
FECHA	**HORAS DE LLUVIA**	**HORAS DE INOPERATIVIDAD**	**HORAS EFECTIVAS**	**DESCRIPCIÓN**
1/04/2026	0	0	8	
2/04/2026	0	0	0	
3/04/2026	0	0	0	
4/04/2026	0	0	0	
5/04/2026	0	0	0	
6/04/2026	0	0	8	
7/04/2026	0	0	8	
8/04/2026	0	0	8	
9/04/2026	0	0	8	
10/04/2026	0	0	8	
11/04/2026	**DOMINGO**			
12/04/2026	0	0	0	
13/04/2026	0	0	0	
14/04/2026	0	0	8	
15/04/2026	0	0	8	
16/04/2026	0	0	8	
17/04/2026	0	0	8	
18/04/2026	0	0	8	
19/04/2026	**DOMINGO**			
20/04/2026	0	0	8	
21/04/2026	0	0	8	
22/04/2026	0	0	8	
23/04/2026	0	0	8	
24/04/2026	0	0	8	
25/04/2026	0	0	8	
26/04/2026	**DOMINGO**			
27/04/2026	0	0	8	
28/04/2026	0	0	8	
29/04/2026	0	0	8	
30/04/2026	0	0	8	
TOTAL	**0**	**0**	**184**	

6. MOVILIZACIONES

No se realizaron movilizaciones en este mes.

7. MANTENIMIENTOS

MANTENIMIENTOS			
Fecha	**Equipo**	**Serial**	**Descripción**
21/04/2026	Motoniveladora	HYUNDAY 2000338	SE INTERVIENE BASTIDOR DE LA TORNAMESA
13/04/2026	Retrocargador	CAT8173	SE ARREGLA PROBLEMA ELECTRICO EN EL ENCENDIDO.
22/04/2026	Volqueta	GZM 755	SE INSTALA MANGUERA DEL TOMA FUERZA
09/04/2026	Volqueta	LINKBELT1235	CAMBIO DE FILTROS

8. CONTROL DE TRABAJO MAQUINARIA

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025	CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA, VOLQUETAS Y TRACTOCAMIÓN E INSUMOS BASICOS											ICCU
OBJETO	"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".											
PERIODO:	ABRIL											
MUNICIPIO:	LA PALMA						PROVINCIA:	RIO NEGRO				
MAQUINA:	VOLQUETA						SERIE	GZM755				
CONTROL HORARIO				ACPM				UREA				OBSERVACIÓN
FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS	ACPM (GLS)	HOROMETRO DE TANQUEO	RENDIMIENTO	No. TIRILLA	UREA	HOROMETRO DE TANQUEO	RENDIMIENTO	No. TIRILLA	
1/04/2026	4609	4609	0									INOPERATIVA
2/04/2026	4609	4609	0									INOPERATIVA
3/04/2026	4609	4609	0									INOPERATIVA
4/04/2026	4609	4609	0									INOPERATIVA
5/04/2026	4609	4609	0									INOPERATIVA
6/04/2026	4609	4609	0									INOPERATIVA
7/04/2026	4609	4609	0									INOPERATIVA
8/04/2026	4609	4609	0									INOPERATIVA
9/04/2026	4609	4609	0									INOPERATIVA
10/04/2026	4609	4609	0									INOPERATIVA
11/04/2026	4609	4609	0									INOPERATIVA
12/04/2026	4609	4609	0									INOPERATIVA
13/04/2026	4609	4609	0									INOPERATIVA
14/04/2026	4609	4609	0									INOPERATIVA
15/04/2026	4609	4609	0									INOPERATIVA
16/04/2026	4609	4609	0									INOPERATIVA
17/04/2026	4609	4609	0									INOPERATIVA
18/04/2026	4609	4609	0									INOPERATIVA
19/04/2026	4609	4609	0									INOPERATIVA
20/04/2026	4609	4609	0									INOPERATIVA
21/04/2026	4609	4618	9									
22/04/2026	4618	4625	7									
23/04/2026	4625	4634	9	34.001	87328		148					
24/04/2026	4634	4642	8									
25/04/2026	4642	4642	0									
26/04/2026	4642	4642	0									
27/04/2026	4642	4648	6	25.622	87533	8.0	5207					
28/04/2026	4648	4651	3									
29/04/2026	4651	4651	0									
30/04/2026	4651	4658	7									
TOTAL MES			49.00	59.62		8.00		0.00		0.00		

UNIÓN TEMPORAL ICCU PARQUE 2025
NIT 902.017.719 -3

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025	CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA, VOLQUETAS Y TRACTOCAMIÓN E INSUMOS BASICOS	ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

OBJETO	"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".		
PERIODO:	ABRIL		
MUNICIPIO:	LA PALMA	PROVINCIA:	RIO NEGRO
MAQUINA:	VOLQUETA	SERIE	GZM758

CONTROL HORARIO				ACPM				UREA				OBSERVACIÓN
FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS	ACPM (GLS)	HOROMETRO DE TANQUEO	RENDIMIENTO	No. TIRILLA	UREA	HOROMETRO DE TANQUEO	RENDIMIENTO	No. TIRILLA	
1/04/2026	4720	4725	5									
2/04/2026	4725	4725	0									
3/04/2026	4725	4725	0									
4/04/2026	4725	4725	0									
5/04/2026	4725	4725	0									
6/04/2026	4725	4732	7	18	64538		122	5	64538		1	
7/04/2026	4732	4739	7									
8/04/2026	4739	4745	6									
9/04/2026	4745	4751	6									
10/04/2026	4751	4757	6	28.001	64776	8.5	130					
11/04/2026	4757	4757	0									
12/04/2026	4757	4757	0									
13/04/2026	4757	4763	6									
14/04/2026	4763	4772	9									
15/04/2026	4772	4780	8	33.003	65029	7.7	124					
16/04/2026	4780	4788	8									
17/04/2026	4788	4792	4									
18/04/2026	4792	4792	0									
19/04/2026	4792	4792	0									
20/04/2026	4792	4792	0	25.024	65242	8.5	141					
21/04/2026	4801	4808	7									
22/04/2026	4808	4815	7									
23/04/2026	4808	4815	7									
24/04/2026	4808	4815	7									
25/04/2026	4815	4815	0									
26/04/2026	4815	4815	0									
27/04/2026	4815	4815	0									
28/04/2026	4815	4822	7	30.043	65522	9.3	5229					
29/04/2026	4822	4823	1									
30/04/2026	4823	4829	6									
TOTAL MES			**114.00**	**134.07**		**8.50**		**5.00**		**0.00**		

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025

CLL 13 # 47 – 12 BOGOTA – CUNDINAMARCA D.C TEL 313 258 3561
EMAIL: COORDINACION.ICCU.2026@GMAIL.COM

UNIÓN TEMPORAL ICCU PARQUE 2025
NIT 902.017.719 -3

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025	CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA, VOLQUETAS Y TRACTOCAMIÓN E INSUMOS BASICOS												ICCU
OBJETO	"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".												
PERIODO:	ABRIL												
MUNICIPIO:	LA PALMA						PROVINCIA:	RIO NEGRO					
MAQUINA:	VOLQUETA DOBLETROQUE						SERIE	ODR782					
CONTROL HORARIO				ACPM				UREA				OBSERVACIÓN	
FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS	ACPM (GLS)	HOROMETRO DE TANQUEO	RENDIMIENTO	No. TIRILLA	UREA	HOROMETRO DE TANQUEO	RENDIMIENTO	No. TIRILLA		
1/04/2026	3691.1	3691.1	0										
2/04/2026	3691.1	3691.1	0										
3/04/2026	3691.1	3691.1	0										
4/04/2026	3691.1	3691.1	0										
5/04/2026	3691.1	3691.1	0										
6/04/2026	3691.1	3691.1	0										
7/04/2026	3691.1	3691.1	0										
8/04/2026	3691.1	3691.1	0										
9/04/2026	3698.1	3706.4	8.3	38.004	67083		127	5	67083		2		
10/04/2026	3706.4	3713.1	6.7										
11/04/2026	3713.1	3718.7	5.6										
12/04/2026	3718.7	3718.7	0										
13/04/2026	3718.7	3730.5	11.8	64	67610.2	8.2	3350						
14/04/2026	3730.5	3739.7	9.2										
15/04/2026	3739.7	3746.1	6.4										
16/04/2026	3746.1	3755.3	9.2	60.004	67948.1	6	139						
17/04/2026	3755.3	3762.1	6.8										
18/04/2026	3762.1	3762.1	0										
19/04/2026	3762.1	3762.1	0										
20/04/2026	3762.1	3773	10.9										
21/04/2026	3773	3780.2	7.2	53.004	68352.4	7.6	145						
22/04/2026	3780.2	3790	9.8										
23/04/2026	3790	3794.5	4.5										
24/04/2026	3794.5	3800.8	6.3										
25/04/2026	3800.8	3800.8	0										
26/04/2026	3800.8	3800.8	0										
27/04/2026	3794.5	3800.8	6.3										
28/04/2026	3794.5	3800.8	6.3										
29/04/2026	3800.8	3800.8	0										
30/04/2026	3800.8	3800.8	0										
TOTAL MES			115.30	215.01		7		5.00		0.00			

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025

CLL 13 # 47 – 12 BOGOTA – CUNDINAMARCA D.C TEL 313 258 3561
EMAIL: COORDINACION.ICCU.2026@GMAIL.COM

UNIÓN TEMPORAL ICCU PARQUE 2025
NIT 902.017.719 -3

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025	CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA, VOLQUETAS Y TRACTOCAMIÓN E INSUMOS BASICOS	ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

OBJETO	"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".		
PERIODO:	ABRIL		
MUNICIPIO:	LA PALMA	**PROVINCIA:**	RIO NEGRO
MAQUINA:	RETROEXCAVADORA CAT	**SERIE**	8173

CONTROL HORARIO				ACPM				
FECHA	**HOROMETRO INICIAL**	**HOROMETRO FINAL**	**HORAS**	**ACPM (GLS)**	**HOROMETRO DE TANQUEO**	**RENDIMIENTO**	**No. TIRILLA**	**OBSERVACIÓN**
1/04/2026	8772.1	8781.1	9					
2/04/2026	8781.1	8781.1	0					
3/04/2026	8781.1	8781.1	0					
4/04/2026	8781.1	8781.1	0					
5/04/2026	8781.1	8781.1	0					
6/04/2026	8781.1	8781.1	0					
7/04/2026	8781.1	8781.1	0					
8/04/2026	8781.1	8781.1	0					
9/04/2026	8781.1	8781.1	0					
10/04/2026	8781.1	8781.1	0					
11/04/2026	8784.5	8784.5	0					
12/04/2026	8784.5	8784.5	0					
13/04/2026	8784.5	8785	0.5	40	8784.5		134	
14/04/2026	8785	8785	0					
15/04/2026	8785	8785	0					
16/04/2026	8785	8787.4	2.4					
17/04/2026	8787.4	8794.4	7					
18/04/2026	8794.4	8794.4	0					
19/04/2026	8794.4	8794.4	0					
20/04/2026	8794.4	8794.4	0					
21/04/2026	8794.4	8802.3	7.9	40	8807.8	1.7	143	
22/04/2026	8802.3	8807.8	5.5					
23/04/2026	8807.8	8813.8	6					
24/04/2026	8813.8	8821.8	8	17.629	8813.8	2.9	7033	
25/04/2026	8821.8	8830.2	8.4					
26/04/2026	8830.2	8830.2	0					
27/04/2026	8830.2	8830.2	0	40	8830.2	2.4	154	
28/04/2026	8830.2	8830.2	0					
29/04/2026	8830.2	8830.2	0					
30/04/2026	8830.2	8830.2	0					
TOTAL MES			**54.70**	**137.63**		**2.4**		

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025

UNIÓN TEMPORAL ICCU PARQUE 2025
NIT 902.017.719 -3

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025	CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA, VOLQUETAS Y TRACTOCAMIÓN E INSUMOS BASICOS												ICCU
OBJETO	"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".												
PERIODO:	ABRIL												
MUNICIPIO:	LA PALMA						PROVINCIA:	RIO NEGRO					
MAQUINA:	MOTONIVELADORA HYUNDAY						SERIE	2000338					
CONTROL HORARIO				ACPM				UREA				OBSERVACIÓN	
FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS	ACPM (GLS)	HOROMETRO DE TANQUEO	RENDIMIENTO	No. TIRILLA	UREA	HOROMETRO DE TANQUEO	RENDIMIENTO	No. TIRILLA		
1/04/2026	4238.4	4238.4	0										
2/04/2026	4238.4	4238.4	0										
3/04/2026	4238.4	4238.4	0										
4/04/2026	4238.4	4238.4	0										
5/04/2026	4238.4	4238.4	0										
6/04/2026	4238.4	4238.4	0										
7/04/2026	4238.4	4238.4	0										
8/04/2026	4238.4	4238.4	0										
9/04/2026	4238.4	4238.4	0										
10/04/2026	4238.4	4240.2	1.8	59.086	4238.4		128						
11/04/2026	4240.2	4240.2	0										
12/04/2026	4240.2	4240.2	0										
13/04/2026	4240.2	4240.2	0										
14/04/2026	4240.2	4240.2	0										
15/04/2026	4240.2	4242.2	2										
16/04/2026	4242.2	4242.2	0										
17/04/2026	4242.2	4242.2	0										
18/04/2026	4242.2	4242.2	0										
19/04/2026	4242.2	4242.2	0										
20/04/2026	4242.2	4242.2	0										
21/04/2026	4242.2	4242.2	0										
22/04/2026	4242.2	4246.2	4										
23/04/2026	4246.2	4253.5	7.3										
24/04/2026	4253.5	4260.2	6.7										
25/04/2026	4260.2	4260.2	0										
26/04/2026	4260.2	4260.2	0										
27/04/2026	4260.2	4262.8	2.6	80	4260.2	3.7	152						
28/04/2026	4262.8	4269.6	6.8										
29/04/2026	4269.6	4269.6	0										
30/04/2026	4269.6	4271.8	2.2										
TOTAL MES			33.40	139.09		4		0.00		0.00			

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025

CLL 13 # 47 – 12 BOGOTA – CUNDINAMARCA D.C TEL 313 258 3561
EMAIL: COORDINACION.ICCU.2026@GMAIL.COM

UNIÓN TEMPORAL ICCU PARQUE 2025
NIT 902.017.719 -3

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025	CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA, VOLQUETAS Y TRACTOCAMIÓN E INSUMOS BASICOS												ICCU
OBJETO	"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".												
PERIODO:	ABRIL												
MUNICIPIO:	LA PALMA						PROVINCIA:	RIO NEGRO					
MAQUINA:	VIBROCOMPACTADOR AMMAN						SERIE	3003606					
CONTROL HORARIO				ACPM				UREA				OBSERVACIÓN	
FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS	ACPM (GLS)	HOROMETRO DE TANQUEO	RENDIMIENTO	No. TIRILLA	UREA	HOROMETRO DE TANQUEO	RENDIMIENTO	No. TIRILLA		
1/04/2026	3036.4	3037	0.6										
2/04/2026	3037	3037	0										
3/04/2026	3037	3037	0										
4/04/2026	3037	3037	0										
5/04/2026	3037	3037	0										
6/04/2026	3037	3037	0										
7/04/2026	3037	3037	0										
8/04/2026	3037	3037	0										
9/04/2026	3037	3037	0										
10/04/2026	3037	3037	0	58.94	3037		129						
11/04/2026	3043.9	3048.7	4.8										
12/04/2026	3048.7	3048.7	0										
13/04/2026	3048.7	3052.5	3.8										
14/04/2026	3052.5	3059	6.5										
15/04/2026	3059	3063	4										
16/04/2026	3063	3065.1	2.1										
17/04/2026	3065.1	3066.4	1.3										
18/04/2026	3066.4	3066.4	0										
19/04/2026	3066.4	3066.4	0										
20/04/2026	3066.4	3071.1	4.7										
21/04/2026	3071.1	3077.6	6.5	59.711	3071.1	1.8	146						
22/04/2026	3077.6	3080.8	3.2										
23/04/2026	3080.8	3085.7	4.9										
24/04/2026	3085.7	3092.4	6.7										
25/04/2026	3092.4	3092.4	0										
26/04/2026	3092.4	3092.4	0										
27/04/2026	3092.4	3098.7	6.3	40	3092.4	1.9	153						
28/04/2026	3098.7	3106.2	7.5										
29/04/2026	3106.2	3108.7	2.5										
30/04/2026	3108.7	3115.2											
TOTAL MES			65.40	158.65		2		0.00		0.00			

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025

CLL 13 # 47 – 12 BOGOTA – CUNDINAMARCA D.C TEL 313 258 3561
EMAIL: COORDINACION.ICCU.2026@GMAIL.COM

UNIÓN TEMPORAL ICCU PARQUE 2025
NIT 902.017.719 -3

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025	CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA, VOLQUETAS Y TRACTOCAMIÓN E INSUMOS BASICOS	ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

OBJETO	"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".		
PERIODO:	ABRIL		
MUNICIPIO:	LA PALMA	PROVINCIA:	RIO NEGRO
MAQUINA:	ORUGA LINK BELT	SERIE	LBX210I6NKHEX1235

CONTROL HORARIO				ACPM				OBSERVACIÓN
FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS	ACPM (GLS)	HOROMETRO DE TANQUEO	RENDIMIENTO	No. TIRILLA	
1/04/2026	6133.1	6140.9	7.8	60.004	6133.1		120	
2/04/2026	6140.9	6140.9	0					
3/04/2026	6140.9	6140.9	0					
4/04/2026	6140.9	6140.9	0					
5/04/2026	6140.9	6140.9	0					
6/04/2026	6140.9	6143.7	2.8					
7/04/2026	6143.7	6143.7	0					
8/04/2026	6143.7	6143.7	0					
9/04/2026	6143.7	6143.7	0					
10/04/2026	6143.7	6150.7	7					
11/04/2026	6150.7	6150.7	0					
12/04/2026	6150.7	6150.7	0					
13/04/2026	6150.7	6157.4	6.7	60	6150.7	3.4	132	
14/04/2026	6157.4	6166.1	8.7					
15/04/2026	6166.1	6174.8	8.7	90	6174.8	3.7	123	
16/04/2026	6174.8	6183.7	8.9					
17/04/2026	6183.7	6187.5	3.8					
18/04/2026	6187.5	6187.5	0					
19/04/2026	6187.5	6187.5	0					
20/04/2026	6187.5	6196	8.5	80	6196	4	142	
21/04/2026	6196	6205.3	9.3					
22/04/2026	6205.3	6214.5	9.2					
23/04/2026	6214.5	6218	3.5					
24/04/2026	6218	6227	9	55	6218	3	150	
25/04/2026	6227	6227	0					
26/04/2026	6227	6227	0					
27/04/2026	6227	6234.5	7.5					
28/04/2026	6234.5	6241.1	6.6					
29/04/2026	6241.1	6242.4	1.3	84.899	6241.1	3.7	155	
30/04/2026	6242.4	6251.6	9.2					
TOTAL MES			118.50	429.90		3.4		




UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025	CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA, VOLQUETAS Y TRACTOCAMIÓN E INSUMOS BASICOS	ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

OBJETO	**"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".**			
PERIODO:	**ABRIL**			
MUNICIPIO:	**LA PALMA**	**PROVINCIA:**	**RIO NEGRO**	
MAQUINA:	**MINICARGADOR CAT**	**SERIE**	**744**	

CONTROL HORARIO				**ACPM**				**OBSERVACIÓN**
FECHA	**HOROMETRO INICIAL**	**HOROMETRO FINAL**	**HORAS**	**ACPM (GLS)**	**HOROMETRO DE TANQUEO**	**RENDIMIENTO**	**No. TIRILLA**	
1/04/2026	5115.1	5120.1	5					
2/04/2026	5120.1	5120.1	0					
3/04/2026	5120.1	5120.1	0					
4/04/2026	5120.1	5120.1	0					
5/04/2026	5120.1	5120.1	0					
6/04/2026	5120.1	5120.1	0					
7/04/2026	5120.1	5120.1	0					
8/04/2026	5120.1	5120.1	0					
9/04/2026	5120.1	5120.1	0					SALE PARA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO
TOTAL MES			**5.00**	**0.00**		**0.00**		

UNIÓN TEMPORAL ICCU PARQUE 2025
NIT 902.017.719 -3

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025	CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA ALQUILADA						ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
OBJETO	**"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".**						
PERIODO:	**ABRIL**						
MUNICIPIO:	**LA PALMA**						
MAQUINA:	**RETROEXCAVADORA**					**SERIE**	**CAT416E**
FECHA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO HOROMETRO INICIAL**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO HOROMETRO FINAL**	**HOROMETRO INICIAL**	**HOROMETRO FINAL**	**HORAS**	**STAND BY**	**OBSERVACIÓN**
25/04/2026			15886	15894.1	8.1		EMERGENCIA
26/04/2026	X	X			0		
27/04/2026	X	X			0		
28/04/2026	X	X			0		
29/04/2026			15904.9	15914.1	9.2		
30/04/2026			15914.1	15922.5	8.4		
SUBTOTAL MES					**25.7**	**0.0**	
TOTAL MES						**25.7**	
Firma	Ricardo Ortiz U.		**Firma**		Alejandro Castañeda M.		
Nombre:	**RICARDO ORTIZ**		**Nombre:**		**ALEJANDRO CASTAÑEDA**		
INSPECTOR UNION TEMPORAL PARQUE 2025			**INSPECTOR ICCU**				

CLL 13# 4A-12 BOGOTA – CUNDINAMARCA D.C TEL 3106250561
EMAIL : COORDINACION.ICCU.2026@GMAIL.COM

9. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Durante el mes de abril de 2026, en el municipio de La Palma, provincia de Rionegro, se ejecutaron actividades orientadas a la remoción de derrumbes y conformación de la Troncal del Río Negro, abarcando sectores como Arenera, La Hermosa, Murca, Minipí, Guanacas, Capitán, Zumbe y Río Negro.

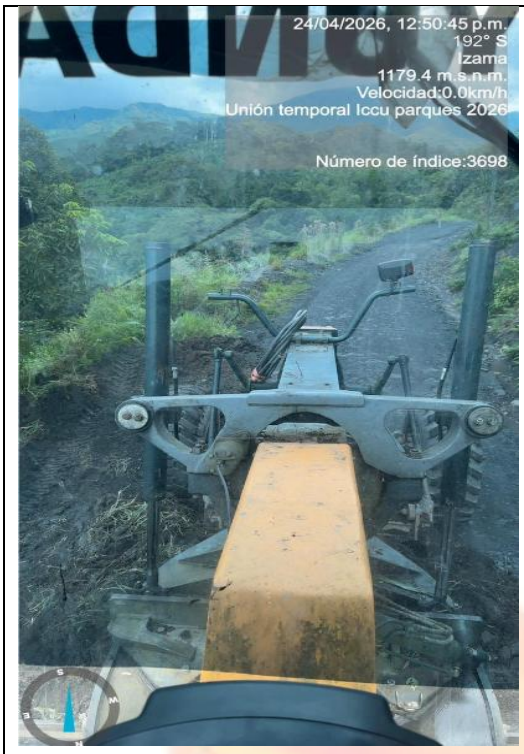
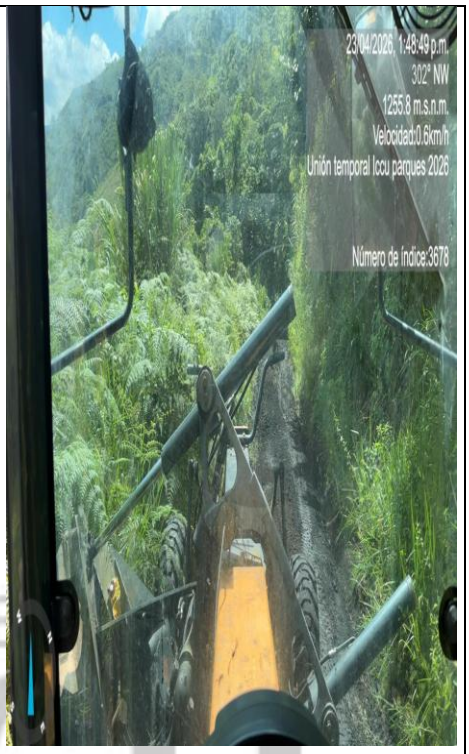
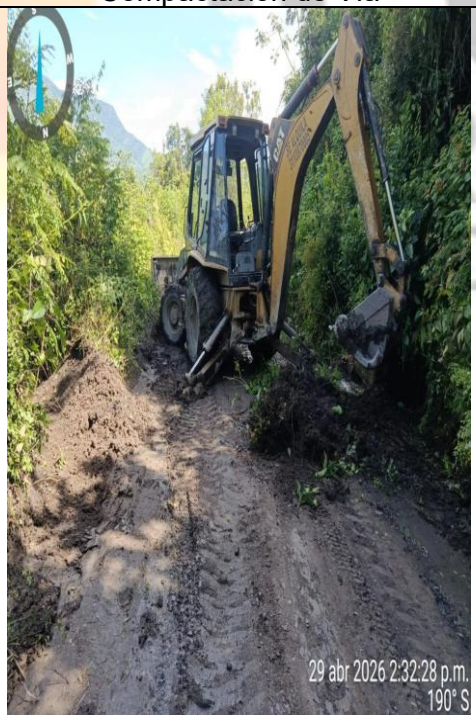
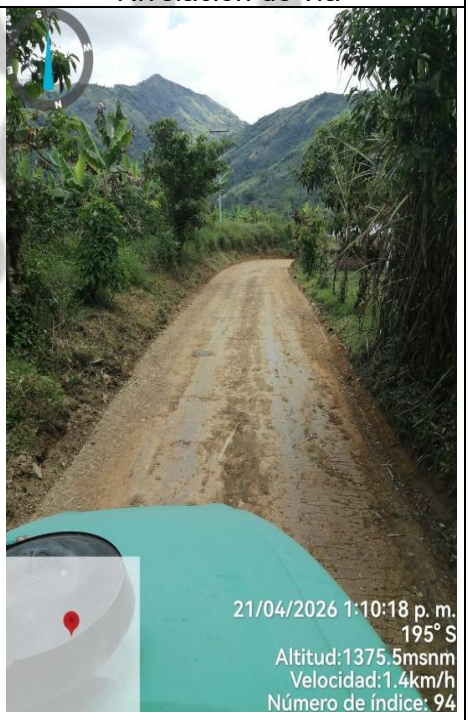
El desarrollo de las labores estuvo condicionado por las fallas mecánicas en la maquinaria, lo que generó periodos de inoperatividad en equipos clave como volquetas, retroexcavadora y motoniveladora, afectando la continuidad y eficiencia de las actividades programadas. No obstante, mediante la ejecución de mantenimientos correctivos, intervenciones mecánicas oportunas y el apoyo con maquinaria en alquiler, se logró reactivar progresivamente la operación, especialmente durante la segunda mitad del mes, permitiendo avanzar en la atención de puntos críticos y en la conformación de la vía.

Como resultado, se alcanzó un **avance general del 30%**, con un total de **3.85 km intervenidos**, la realización de **212 viajes de material** y un acumulado de **184 horas efectivas de trabajo**, reflejando un nivel de ejecución condicionado por las dificultades operativas presentadas.

A pesar de las condiciones climáticas adversas y del estado de emergencia en la zona, las actividades se desarrollaron de manera satisfactoria y dentro de los tiempos establecidos, permitiendo dar cumplimiento al cronograma previsto y contribuyendo al mejoramiento de la movilidad rural.

10. REGISTRO FOTOGRÁFICO

		
Cargue de material	Cargue de material	Cargue de material
		
Remoción de derrumbes	Descargue de Material	Remoción de derrumbes

		
Conformación de Vía	Compactación de Vía	Nivelación de vía
		
Descargue de Material	Remoción de derrumbes	Compactación de Vía

		
Mantenimiento	Nivelación de Vía	Conformación de Via

ALEJANDRO CASTAÑEDA
INSPECTOR ICCU

RICARDO ORTIZ
INSPECTOR UT ICCU PARQUE 2025

CONTRATO ICCU-CTO 1595 DE 2025

INFORME DE AVANCE N°3
PERIODO: ABRIL DEL 2026

PROVINCIA: RIO NEGRO
MUNICIPIO: PACHO

INFORME DE ACTIVIDADES – PROVINCIA RIO NEGRO
MUNICIPIO DE PACHO

OBJETO: "ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOSPARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

1. LOCALIZACIÓN

Provincia Rio Negro:

Pacho:

	EQUIPO	PLACA
1	MOTONIVELADORA HYUNDAI HG170	LCL717H0HL2000337
2	RETROEXCAVADORA JCB 3CXTT	S0R3CXTTPM2936947
3	ORUGA LINK BELT	LBX210QNHHX2526
4	VIBROCOMPACTADOR CATERPILLAR CS44B	CATCS44BPRGE00141

Alquiler:

#	EQUIPO	PLACA
1	VOLQUETA SENCILLA	UFE849
2	RETROEXCAVADORA JCB	GE03CXTTEG2416322
3	VOLQUETA SENCILLA	OJJ883
4	VOLQUETA SENCILLA	OWG 591
5	RETROEXCAVADORA	CAT440033
6	RETROEXCAVADORA	JCB3423035
7	RETROEXCAVADORA DE ORUGA	KOMATSU452

Ubicación:

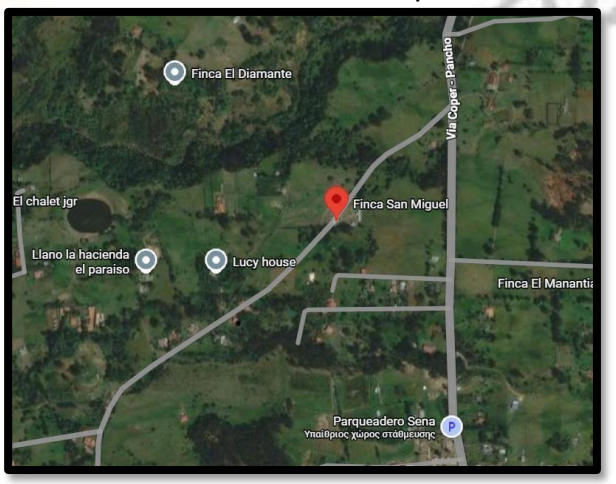
Pacho:



Fuente: Google Earth

Ubicación:
Pacho : Los Ramones – San Miguel – La Cabrera – La Hacienda - Goteras

ubicación de las maquinas



Fuente: Google Maps

2. GRUPO DE TRABAJO

Maquinaria propia

CARGO	NOMBRES
INSPECTOR DE OBRA UT	RICARDO ANDRES ORTIZ VASQUEZ
INSPECTOR DE OBRA ICCU	ALEJANDRO CASTAÑEDA
OPERADOR MOTONIVELADORAHYUNDAIHG170 0338	ISRAELCANO WILCHES
RETROEXCAVADORA JCB 3CXTT 6947	PEDRO BARON
ORUGA LBX210QNHHX2526	FERNEY VARGAS
VIBROCOMPACTADOR CATERPILLAR CS44B 0141	GERMAN ALEXIS RUIZ CONZALES

Alquiler:

CARGO	NOMBRES
VOLQUETA	HECTOR WILSON PIRA CARDENAS
RETROEXCAVADORA JCB	BRAYAN YESID CASTRO ESCOBAR
VOLQUETA SENCILLA OJJ883	MAURICIO HERNANDEZ
VOLQUETA SENCILLA OWG 591	BERNARDO RODRIGUEZ
RETROEXCAVADORA CAT440033	ANDERSON PINZON
RETROEXCAVADORA JCB3423035	EDILBERTO ORTIZ
RETROEXCAVADORA DE ORUGA KOMATSU452	RODOLFO SANTANA

3. PLAN DE TRABAJO

Las actividades programadas corresponden principalmente a rehabilitación y conformación de vías terciarias, apoyo a obras de drenaje y atención de emergencias, mediante el uso de maquinaria amarilla y vehículos de apoyo asignados al contrato. Las actividades realizadas con la maquinaria en alquiler se ejecutan para la atención de emergencias en la red vial. Debido a que estas situaciones son imprevistas, la programación de las labores se define según las necesidades que se presenten en el momento, por lo cual no se cuenta con un cronograma previo para este tipo de actividades.
A continuación, se presenta el cronograma de actividades programadas.

AVANCE 30%

Cronograma de actividades Municipio de Pacho

CRONOGRAMA DE MAQUINARIA ICCU												
MAQUINAS	FEBRERO				MARZO				ABRIL			
	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12
VOLQUETAS	Los Ramones – San Miguel	Los Ramones – San Miguel	Los Ramones – San Miguel	Los Ramones – San Miguel	Veredas Huertas – Fajonales – Caquian – Loma Alta	Veredas Huertas – Fajonales – Caquian – Loma Alta	Veredas Huertas – Fajonales – Caquian – Loma Alta	Veredas Huertas – Fajonales – Caquian – Loma Alta	Llano del Trigo – Monte Verde – El Cabrero – La Cabrera	Llano del Trigo – Monte Verde – El Cabrero – La Cabrera	Llano del Trigo – Monte Verde – El Cabrero – La Cabrera	Llano del Trigo – Monte Verde – El Cabrero – La Cabrera
RETROEXCAVADORA	Los Ramones – San Miguel	Los Ramones – San Miguel	Los Ramones – San Miguel	Los Ramones – San Miguel	Veredas Huertas – Fajonales – Caquian – Loma Alta	Veredas Huertas – Fajonales – Caquian – Loma Alta	Veredas Huertas – Fajonales – Caquian – Loma Alta	Veredas Huertas – Fajonales – Caquian – Loma Alta	Llano del Trigo – Monte Verde – El Cabrero – La Cabrera	Llano del Trigo – Monte Verde – El Cabrero – La Cabrera	Llano del Trigo – Monte Verde – El Cabrero – La Cabrera	Llano del Trigo – Monte Verde – El Cabrero – La Cabrera
MOTONIVELADORA	Los Ramones – San Miguel	Los Ramones – San Miguel	Los Ramones – San Miguel	Los Ramones – San Miguel	Veredas Huertas – Fajonales – Caquian – Loma Alta	Veredas Huertas – Fajonales – Caquian – Loma Alta	Veredas Huertas – Fajonales – Caquian – Loma Alta	Veredas Huertas – Fajonales – Caquian – Loma Alta	Llano del Trigo – Monte Verde – El Cabrero – La Cabrera	Llano del Trigo – Monte Verde – El Cabrero – La Cabrera	Llano del Trigo – Monte Verde – El Cabrero – La Cabrera	Llano del Trigo – Monte Verde – El Cabrero – La Cabrera
VIBROCOMPACTADOR	Los Ramones – San Miguel	Los Ramones – San Miguel	Los Ramones – San Miguel	Los Ramones – San Miguel	Veredas Huertas – Fajonales – Caquian – Loma Alta	Veredas Huertas – Fajonales – Caquian – Loma Alta	Veredas Huertas – Fajonales – Caquian – Loma Alta	Veredas Huertas – Fajonales – Caquian – Loma Alta	Llano del Trigo – Monte Verde – El Cabrero – La Cabrera	Llano del Trigo – Monte Verde – El Cabrero – La Cabrera	Llano del Trigo – Monte Verde – El Cabrero – La Cabrera	Llano del Trigo – Monte Verde – El Cabrero – La Cabrera

Fuente: Alcaldía Municipal de Pacho

4. CRONOGRAMA EJECUTADO

FECHA	ACTIVIDADES
01 abril 2026	Envío reporte de las actividades realizadas en el frente de Pacho provincia del Rio negro. Actividades: Retrocargadores en alquiler y propia removiendo derrumbes y abriendo vía en el sector Goteras y Guanacas. Volquetas transporte de material en zonas de derrumbe Pacho - La Palma. Excavadora de oruga abriendo vía en la vereda las Brujas. Vibro y motoniveladora Conformación de vía en la vereda Algodones. Excavadora de oruga presenta fallas en su horómetro. Sector: PASUNCHA - TRONCAL DE RIO NEGRO - LA LOMA - LAS HUERTAS - ALGODONES - GOTERAS Longitud: 1000 mts Lluvias: N/A COMBUSTIBLE: Viajes: VOLQUETA UFE 849 ALQ: 5 VIAJES Volqueta OJJ 883 ALQ: 5 VIAJES Volqueta OWG 591 ALQ: 5 VIAJES Km inicio-fin VOL(ALQ) UFE 849: SIN HR - TCM VOL(ALQ) OJJ 883: SIN HR - TCM VOL(ALQ) OWG 591: SIN HR - TCM HR inicio - Fin MOTONIVELADORA HYUNDAY2000337: 4093.1 - 4099.1 VIBROCOMPACTADOR CAT00141: 5686.1 - 5690.7 RETROCARGADOR JCB2936947: 4819.0 - 4825.1 RETRO ALQ JCB6322: 5377.7 - 5385.7 RETRO ALQ JCB3423035:1657.2 - 1666 RETRO ALQ CAT440033: 166.2 - 174.8 EXCAVADORA KOMATSU452: 16083 ESTADO MAQUINARIA: OP-INOP ESTADO MAQUINARIA: OP-INOP: MOTONIVELADORA HYUNDAY2000337: OPERATIVA VIBROCOMPACTADOR CAT00141: OPERATIVO RETROCARGADOR JCB2936947: OPERATIVO
06 abril 2026	Envío reporte de las actividades realizadas en el frente de Pacho provincia del Rio negro. Actividades: Retrocargadores en alquiler y propia removiendo derrumbes y abriendo vía en el sector Goteras y Guanacas. Volquetas transporte de material en zonas de derrumbe Pacho - La Palma. Excavadora de oruga abriendo vía en la vereda las Brujas. Vibro y motoniveladora Conformación de vía en la vereda Algodones. Excavadora de oruga presenta fallas en su horómetro. Sector: PASUNCHA - TRONCAL DE RIO NEGRO - LA LOMA - LAS HUERTAS - ALGODONES - GOTERAS Longitud: 400 mts Lluvias: N/A COMBUSTIBLE: Viajes: VOLQUETA UFE 849 ALQ: 5 VIAJES Volqueta OJJ 883 ALQ: 5 VIAJES Volqueta OWG 591 ALQ: 5 VIAJES Km inicio-fin VOL(ALQ) UFE 849: SIN HR - TCM VOL(ALQ) OJJ 883: SIN HR - TCM VOL(ALQ) OWG 591: SIN HR - TCM HR inicio - Fin MOTONIVELADORA HYUNDAY2000337: 4099.1 - 4102.8 VIBROCOMPACTADOR CAT00141: 5690.7 - 5694.2 RETROCARGADOR JCB2936947: 4825.1 - 48320 RETRO ALQ JCB6322: 5385.7 - 5393 RETRO ALQ JCB3423035: 1666 - 1674.7 RETRO ALQ CAT440033: 174.8 - 188.4 EXCAVADORA KOMATSU452: 16083 ESTADO MAQUINARIA: OP-INOP ESTADO MAQUINARIA: OP-INOP: MOTONIVELADORA HYUNDAY2000337: OPERATIVA VIBROCOMPACTADOR CAT00141: OPERATIVO RETROCARGADOR JCB2936947: OPERATIVO
07 abril 2026	Envío reporte de las actividades realizadas en el frente de Pacho provincia del Rio negro. Actividades: Retrocargadores en alquiler y propia removiendo derrumbes y abriendo vía en el sector Goteras y Guanacas. Volquetas transporte de material en zonas de derrumbe Pacho - La Palma. Excavadora de oruga abriendo vía en la vereda las Brujas. Vibro y motoniveladora Conformación de vía en la vereda Algodones. Excavadora de oruga propia llega a reforzar actividades. Sector: PASUNCHA -

	TRONCAL DE RIO NEGRO - LA LOMA - LAS HUERTAS - ALGODONES - GOTERAS Longitud: 1000 mts Lluvias: N/A COMBUSTIBLE: RETROCARGADOR JCB2936947: 28.019 GL Viajes: VOLQUETA UFE 849 ALQ: 7 VIAJES Volqueta OJJ 883 ALQ: 8 VIAJES Volqueta OWG 591 ALQ: 7 VIAJES Km inicio-fin VOL(ALQ) UFE 849: SIN HR - TCM VOL(ALQ) OJJ 883: SIN HR - TCM VOL(ALQ) OWG 591: SIN HR - TCM HR inicio - Fin MOTONIVELADORA HYUNDAY2000337: 4102.8 - 4107.5 VIBROCOMPACTADOR CAT00141: 5694.2 - 5698.6 RETROCARGADOR JCB2936947: 48320 - 4840.2 EXCAVADORA LBX210QNHHX2526: 6696.6 - 6704.7 RETRO ALQ JCB6322: 5393 - 5400 RETRO ALQ JCB3423035: 1674.7 - 1683.7 RETRO ALQ CAT440033: 188.4 - 196.8 EXCAVADORA KOMATSU452: 0.0 - 11 ESTADO MAQUINARIA: OP-INOP ESTADO MAQUINARIA: OP-INOP: MOTONIVELADORA HYUNDAY2000337: OPERATIVA VIBROCOMPACTADOR CAT00141: OPERATIVO RETROCARGADOR JCB2936947: OPERATIVO
08 abril 2026	Envío reporte de las actividades realizadas en el frente de Pacho provincia del Rio negro. Actividades: Retrocargadores en alquiler y propia removiendo derrumbes y abriendo vía en el sector Goteras y Guanacas. Volquetas transporte de material en zonas de derrumbe Pacho - La Palma. Excavadora de oruga abriendo vía en la vereda las Brujas. Vibro y motoniveladora Conformación de vía en la Vereda capitan. Excavadora de oruga propia llega a reforzar actividades. Sector: PASUNCHA - TRONCAL DE RIO NEGRO - LAS HUERTAS - ALGODONES - GOTERAS - CAPITAN Longitud: 1000 mts Lluvias: N/A COMBUSTIBLE: MOTONIVELADORA HYUNDAY2000337: 53.649 GL EDS EL TOTUMO VIBROCOMPACTADOR CAT00141: 40.657 GL EDS EL TOTUMO Viajes: VOLQUETA UFE 849 ALQ: 7 VIAJES Volqueta OJJ 883 ALQ: 7 VIAJES Volqueta OWG 591 ALQ: 7 VIAJES Km inicio-fin VOL(ALQ) UFE 849: SIN HR - TCM VOL(ALQ) OJJ 883: SIN HR - TCM VOL(ALQ) OWG 591: SIN HR - TCM HR inicio - Fin MOTONIVELADORA HYUNDAY2000337: 4107.5 - 4115.4 VIBROCOMPACTADOR CAT00141: 5698.6 - 5703.2 RETROCARGADOR JCB2936947: 4840.2 - 4846.3 EXCAVADORA LBX210QNHHX2526: 6704.7 RETRO ALQ JCB6322: 5400 - 5407.6 RETRO ALQ JCB3423035: 1683.7 - 1692.0 RETRO ALQ CAT440033: 196.8 - 205.2 EXCAVADORA KOMATSU452: 11 - 21.0 ESTADO MAQUINARIA: OP-INOP ESTADO MAQUINARIA: OP-INOP: MOTONIVELADORA HYUNDAY2000337: OPERATIVA VIBROCOMPACTADOR CAT00141: OPERATIVO RETROCARGADOR JCB2936947: OPERATIVO
09 abril 2026	Envío reporte de las actividades realizadas en el frente de Pacho provincia del Rio negro. Actividades: Retrocargadores en alquiler y propia removiendo derrumbes y abriendo vía en el sector Goteras y Guanacas. Volquetas transporte de material en zonas de derrumbe Pacho - La Palma. Excavadora de oruga abriendo vía en la vereda las Brujas. Vibro y motoniveladora Conformación de vía en la Vereda capitan. Excavadora de oruga propia llega a reforzar actividades, operario con incapacidad. Sector: PASUNCHA - TRONCAL DE RIO NEGRO - LAS HUERTAS - ALGODONES - GOTERAS - CAPITAN Longitud: 300 mts Lluvias: N/A COMBUSTIBLE: Viajes: VOLQUETA UFE 849 ALQ: 8 VIAJES Volqueta OJJ 883 ALQ: 8 VIAJES Volqueta OWG 591 ALQ: 8 VIAJES Km inicio-fin VOL(ALQ) UFE 849: SIN HR - TCM VOL(ALQ) OJJ 883: SIN HR - TCM VOL(ALQ) OWG 591: SIN HR - TCM HR inicio - Fin MOTONIVELADORA HYUNDAY2000337: 4115.4 - 4117.8 VIBROCOMPACTADOR CAT00141: 5703.2 - 5705.0 RETROCARGADOR JCB2936947: 4846.3 - 4854.2 EXCAVADORA LBX210QNHHX2526: 6704.7 RETRO ALQ JCB6322: 5407.6 - 5415.2

	RETRO ALQ JCB3423035: 1692.0 - 1700.2 RETRO ALQ CAT440033: 205.2 - 213.7 EXCAVADORA KOMATSU452: 21.0 - 31.0 ESTADO MAQUINARIA: OP-INOP ESTADO MAQUINARIA: OP-INOP: MOTONIVELADORA HYUNDAY2000337: OPERATIVA VIBROCOMPACTADOR CAT00141: OPERATIVO RETROCARGADOR JCB2936947: OPERATIVO
10 abril 2026	Envío reporte de las actividades realizadas en el frente de Pacho provincia del Rio negro. Actividades: Retrocargadores en alquiler y propia removiendo derrumbes y abriendo vía en el sector Goteras y Guanacas. Volquetas transporte de material en zonas de derrumbe Pacho - La Palma. Excavadora de oruga abriendo vía en la vereda las Brujas. Vibro y motoniveladora sin actividad, motoniveladora inoperativa. Excavadora de oruga propia llega a reforzar actividades, operario con incapacidad. Sector: PASUNCHA - TRONCAL DE RIO NEGRO - LAS HUERTAS - ALGODONES - GOTERAS - CAPITAN Longitud: 000 mts Lluvias: N/A COMBUSTIBLE: RETROCARGADOR JCB2936947: 31.003 GL EDS EL TOTUMO Viajes: VOLQUETA UFE 849 ALQ: 6 VIAJES Volqueta OJJ 883 ALQ: 6 VIAJES Volqueta OWG 591 ALQ: 6 VIAJES Km inicio-fin VOL(ALQ) UFE 849: SIN HR - TCM VOL(ALQ) OJJ 883: SIN HR - TCM VOL(ALQ) OWG 591: SIN HR - TCM HR inicio - Fin MOTONIVELADORA HYUNDAY2000337: 4117.8 VIBROCOMPACTADOR CAT00141: 5705.0 RETROCARGADOR JCB2936947: 4854.2 - 4861.3 EXCAVADORA LBX210QNHHX2526: 6704.7 RETRO ALQ JCB6322: 5415.2 - 5422.5 RETRO ALQ JCB3423035: 1700.2 - 1709.1 RETRO ALQ CAT440033: 213.7 - 223.0 EXCAVADORA KOMATSU452: 31.0 - 41.0 NOVEDADES: MOTONIVELADORA HYUNDAY2000337:Se sale la varilla estabilizadora de la maquina. ESTADO MAQUINARIA: OP-INOP ESTADO MAQUINARIA: OP-INOP: MOTONIVELADORA HYUNDAY2000337: INOPERATIVA VIBROCOMPACTADOR CAT00141: OPERATIVO RETROCARGADOR JCB2936947: OPERATIVO
11 abril 2026	Envío reporte de las actividades realizadas en el frente de Pacho provincia del Rio negro. Actividades: Excavadora de oruga adecuando botadero en el sector paraíso, demás equipos disponibles. Dia sabado Sector: PASUNCHA - TRONCAL DE RIO NEGRO - LAS HUERTAS - ALGODONES - GOTERAS - CAPITAN Longitud: 000 mts Lluvias: N/A COMBUSTIBLE: RETROCARGADOR JCB2936947: 31.003 GL EDS EL TOTUMO Viajes: VOLQUETA UFE 849 ALQ: 0 VIAJES Volqueta OJJ 883 ALQ: 0 VIAJES Volqueta OWG 591 ALQ: 0 VIAJES Km inicio-fin VOL(ALQ) UFE 849: SIN HR - TCM VOL(ALQ) OJJ 883: SIN HR - TCM VOL(ALQ) OWG 591: SIN HR - TCM HR inicio - Fin MOTONIVELADORA HYUNDAY2000337: 4117.8 VIBROCOMPACTADOR CAT00141: 5705.0 RETROCARGADOR JCB2936947: 4861.3 EXCAVADORA LBX210QNHHX2526: 6704.7 RETRO ALQ JCB6322: 5422.5 RETRO ALQ JCB3423035: 1709.1 RETRO ALQ CAT440033: 223.0 EXCAVADORA KOMATSU452: 41.0 - 49.0 NOVEDADES: MOTONIVELADORA HYUNDAY2000337:Se sale la varilla estabilizadora de la maquina. ESTADO MAQUINARIA: OP-INOP ESTADO MAQUINARIA: OP-INOP: MOTONIVELADORA HYUNDAY2000337: INOPERATIVA VIBROCOMPACTADOR CAT00141: OPERATIVO RETROCARGADOR JCB2936947: OPERATIVO
13 abril 2026	Envío reporte de las actividades realizadas en el frente de Pacho provincia del Rio negro. Actividades: Retrocargadores en alquiler y propia removiendo derrumbes y abriendo vía en el sector Goteras y Guanacas. Volquetas transporte de material en zonas de derrumbe Pacho - La Palma. Excavadora de oruga alquiler abriendo extendiendo botadero. Vibro y motoniveladora sin actividad, motoniveladora

	inoperativa. Excavadora de oruga actividades de remoción de derrumbes y mejoramiento de vía. Sector: PASUNCHA - TRONCAL DE RIO NEGRO - LAS HUERTAS - ALGODONES - GOTERAS - CAPITAN Longitud: 000 mts Lluvias: N/A COMBUSTIBLE: EXCAVADORA LBX210QNHHX2526: 60.000 GL EDS EL TOTUMO Viajes: VOLQUETA UFE 849 ALQ: 6 VIAJES Volqueta OJJ 883 ALQ: 6 VIAJES Volqueta OWG 591 ALQ: 6 VIAJES Km inicio-fin VOL(ALQ) UFE 849: SIN HR - TCM VOL(ALQ) OJJ 883: SIN HR - TCM VOL(ALQ) OWG 591: SIN HR - TCM HR inicio - Fin MOTONIVELADORA HYUNDAY2000337: 4117.8 VIBROCOMPACTADOR CAT00141: 5705.0 RETROCARGADOR JCB2936947: 4861.3 - 4868.9 EXCAVADORA LBX210QNHHX2526: 6704.7 - 6711.7 RETRO ALQ JCB6322: 5422.5 - 5430.7 RETRO ALQ JCB3423035: 1709.1 - 1720.1 RETRO ALQ CAT440033: 223.0 - 230.4 EXCAVADORA KOMATSU452: 49.0 - 59.0 NOVEDADES: MOTONIVELADORA HYUNDAY2000337:Se sale la varilla estabilizadora de la maquina. ESTADO MAQUINARIA: OP-INOP ESTADO MAQUINARIA: OP-INOP: MOTONIVELADORA HYUNDAY2000337: INOPERATIVA VIBROCOMPACTADOR CAT00141: OPERATIVO RETROCARGADOR JCB2936947: OPERATIVO EXCAVADORA LBX210QNHHX2526: OPERATIVO
14 abril 2026	Envío reporte de las actividades realizadas en el frente de Pacho provincia del Rio negro. Actividades: Retrocargadores en alquiler y propia removiendo derrumbes y abriendo vía en el sector Goteras y Guanacas. Volquetas transporte de material en zonas de derrumbe Pacho - La Palma. Excavadora de oruga alquiler abriendo extendiendo botadero. Vibro y motoniveladora sin actividad, motoniveladora inoperativa. Excavadora de oruga actividades de remoción de derrumbes y mejoramiento de vía. Sector: PASUNCHA - TRONCAL DE RIO NEGRO - LAS HUERTAS - ALGODONES - GOTERAS - CAPITAN Longitud: 000 mts Lluvias: N/A COMBUSTIBLE: RETROCARGADOR JCB2936947: 27.873 GL EDS EL TOTUMO Viajes: VOLQUETA UFE 849 ALQ: 7 VIAJES Volqueta OJJ 883 ALQ: 6 VIAJES Volqueta OWG 591 ALQ: 6 VIAJES Km inicio-fin VOL(ALQ) UFE 849: SIN HR - TCM VOL(ALQ) OJJ 883: SIN HR - TCM VOL(ALQ) OWG 591: SIN HR - TCM HR inicio - Fin MOTONIVELADORA HYUNDAY2000337: 4117.8 VIBROCOMPACTADOR CAT00141: 5705.0 RETROCARGADOR JCB2936947: 4868.9 - 4876.9 EXCAVADORA LBX210QNHHX2526: 6711.7 - 6719.3 RETRO ALQ JCB6322: 5430.7 - 5437.5 RETRO ALQ JCB3423035: 1720.1 - 1728.2 RETRO ALQ CAT440033: 230.4 - 239.1 EXCAVADORA KOMATSU452: 59.0 - 69.0 NOVEDADES: MOTONIVELADORA HYUNDAY2000337:Se sale la varilla estabilizadora de la maquina. ESTADO MAQUINARIA: OP-INOP ESTADO MAQUINARIA: OP-INOP: MOTONIVELADORA HYUNDAY2000337: INOPERATIVA VIBROCOMPACTADOR CAT00141: OPERATIVO RETROCARGADOR JCB2936947: OPERATIVO EXCAVADORA LBX210QNHHX2526: OPERATIVO
15 abril 2026	Envío reporte de las actividades realizadas en el frente de Pacho provincia del Rio negro. Actividades: Retrocargadores en alquiler y propia removiendo derrumbes y abriendo vía en el sector Goteras y Guanacas. Volquetas transporte de material en zonas de derrumbe Pacho - La Palma. Excavadora de oruga alquiler abriendo vía y extendiendo botadero. Vibro y motoniveladora sin actividad, motoniveladora inoperativa. Excavadora de oruga actividades de remoción de derrumbes y mejoramiento de vía. Sector: PASUNCHA - TRONCAL DE RIO NEGRO - LAS HUERTAS - ALGODONES - GOTERAS - CAPITAN Longitud: 000 mts Lluvias: N/A COMBUSTIBLE: EXCAVADORA LBX210QNHHX2526: 60.000 GL EDS EL TOTUMO

	Viajes: VOLQUETA UFE 849 ALQ: 7 VIAJES Volqueta OJJ 883 ALQ: 7 VIAJES Volqueta OWG 591 ALQ: 7 VIAJES Km inicio-fin VOL(ALQ) UFE 849: SIN HR - TCM VOL(ALQ) OJJ 883: SIN HR - TCM VOL(ALQ) OWG 591: SIN HR - TCM HR inicio - Fin MOTONIVELADORA HYUNDAY2000337: 4117.8 VIBROCOMPACTADOR CAT00141: 5705.0 RETROCARGADOR JCB2936947: 4876.9 - 4884.2 EXCAVADORA LBX210QNHHX2526: 6711.7 - 6719.3 RETRO ALQ JCB6322: 5437.5 - 5437.7 RETRO ALQ JCB3423035: 1728.2 - 1736.2 RETRO ALQ CAT440033: 239.1 - 247.7 EXCAVADORA KOMATSU452: 69.0 - 77.1 NOVEDADES: MOTONIVELADORA HYUNDAY2000337:Se sale la varilla estabilizadora de la maquina. ESTADO MAQUINARIA: OP-INOP ESTADO MAQUINARIA: OP-INOP: MOTONIVELADORA HYUNDAY2000337: INOPERATIVA VIBROCOMPACTADOR CAT00141: OPERATIVO RETROCARGADOR JCB2936947: OPERATIVO EXCAVADORA LBX210QNHHX2526: OPERATIVO
16 abril 2026	Envío reporte de las actividades realizadas en el frente de Pacho provincia del Rio negro. Actividades: Retrocargadores en alquiler y propia removiendo derrumbes y abriendo vía en el sector Goteras y Guanacas. Volquetas transporte de material en zonas de derrumbe Pacho - La Palma. Excavadora de oruga alquiler abriendo vía y extendiendo botadero. Vibro y motoniveladora sin actividad, motoniveladora inoperativa. Excavadora de oruga actividades de remoción de derrumbes y mejoramiento de vía. Sector: PASUNCHA - TRONCAL DE RIO NEGRO - LAS HUERTAS - ALGODONES - GOTERAS - CAPITAN Longitud: 000 mts Lluvias: N/A COMBUSTIBLE: Viajes: VOLQUETA UFE 849 ALQ: 7 VIAJES Volqueta OJJ 883 ALQ: 7 VIAJES Volqueta OWG 591 ALQ: 7 VIAJES Km inicio-fin VOL(ALQ) UFE 849: SIN HR - TCM VOL(ALQ) OJJ 883: SIN HR - TCM VOL(ALQ) OWG 591: SIN HR - TCM HR inicio - Fin MOTONIVELADORA HYUNDAY2000337: 4117.8 VIBROCOMPACTADOR CAT00141: 5705.0 RETROCARGADOR JCB2936947: 4884.2 - 4891.7 EXCAVADORA LBX210QNHHX2526: 6719.3 - 6728.8 RETRO ALQ JCB6322: 5437.7 - 5445.5 RETRO ALQ JCB3423035: 1736.2 - 1744.6 RETRO ALQ CAT440033: 247.7 - 256.0 EXCAVADORA KOMATSU452: 77.1 - 87.0 NOVEDADES: MOTONIVELADORA HYUNDAY2000337:Se sale la varilla estabilizadora de la maquina. ESTADO MAQUINARIA: OP-INOP ESTADO MAQUINARIA: OP-INOP: MOTONIVELADORA HYUNDAY2000337: INOPERATIVA VIBROCOMPACTADOR CAT00141: OPERATIVO RETROCARGADOR JCB2936947: OPERATIVO EXCAVADORA LBX210QNHHX2526: OPERATIVO
17 abril 2026	Envío reporte de las actividades realizadas en el frente de Pacho provincia del Rio negro. Actividades: Retrocargadores en alquiler y propia removiendo derrumbes y abriendo vía en el sector Goteras y Guanacas. Volquetas transporte de material en zonas de derrumbe Pacho - La Palma. Excavadora de oruga alquiler traslado para el sector capitán. Motoniveladora sin actividad, motoniveladora inoperativa. Vibro compactación de vía sector San Miguel. Excavadora de oruga actividades de remoción de derrumbes y mejoramiento de vía. Sector: PASUNCHA - TRONCAL DE RIO NEGRO - LAS HUERTAS - ALGODONES - GOTERAS - CAPITAN Longitud: 000 mts Lluvias: N/A COMBUSTIBLE: Viajes: VOLQUETA UFE 849 ALQ: 4 VIAJES Volqueta OJJ 883 ALQ: 4 VIAJES Volqueta OWG 591 ALQ: 4 VIAJES Km inicio-fin VOL(ALQ) UFE 849: SIN HR - TCM VOL(ALQ) OJJ 883: SIN HR - TCM VOL(ALQ) OWG 591: SIN HR - TCM HR inicio - Fin MOTONIVELADORA HYUNDAY2000337: 4117.8 VIBROCOMPACTADOR CAT00141: 5705.0 - 5708.5 RETROCARGADOR JCB2936947: 4891.7 - 4895.0 EXCAVADORA LBX210QNHHX2526: 6728.8 - 6734.1

	RETRO ALQ JCB6322: 5445.5 - 5455.2 RETRO ALQ JCB3423035: 1744.6 - 1750.9 RETRO ALQ CAT440033: 256.0 - 262.7 EXCAVADORA KOMATSU452: 87.0 - 94.5 NOVEDADES: MOTONIVELADORA HYUNDAY2000337:Se sale la varilla estabilizadora de la maquina. ESTADO MAQUINARIA: OP-INOP ESTADO MAQUINARIA: OP-INOP: MOTONIVELADORA HYUNDAY2000337: INOPERATIVA VIBROCOMPACTADOR CAT00141: OPERATIVO RETROCARGADOR JCB2936947: OPERATIVO EXCAVADORA LBX210QNHHX2526: OPERATIVO
18 abril 2026	Envío reporte de las actividades realizadas en el frente de Pacho provincia del Rio negro. Actividades: Retrocargadores en alquiler y propia removiendo derrumbes y abriendo vía en el sector Goteras y Guanacas. Volquetas transporte de material en zonas de derrumbe Pacho - La Palma. Excavadora de oruga alquiler traslado para el sector capitán. Motoniveladora sin actividad, motoniveladora inoperativa. Vibro compactación de vía sector San Miguel. Excavadora de oruga actividades de remoción de derrumbes y mejoramiento de vía. Sector: PASUNCHA - TRONCAL DE RIO NEGRO - LAS HUERTAS - ALGODONES - GOTERAS - CAPITAN Longitud: 000 mts Lluvias: N/A COMBUSTIBLE: Viajes: VOLQUETA UFE 849 ALQ: 4 VIAJES Volqueta OJJ 883 ALQ: 4 VIAJES Volqueta OWG 591 ALQ: 4 VIAJES Km inicio-fin VOL(ALQ) UFE 849: SIN HR - TCM VOL(ALQ) OJJ 883: SIN HR - TCM VOL(ALQ) OWG 591: SIN HR - TCM HR inicio - Fin MOTONIVELADORA HYUNDAY2000337: 4117.8 VIBROCOMPACTADOR CAT00141: 5705.0 - 5708.5 RETROCARGADOR JCB2936947: 4891.7 - 4895.0 EXCAVADORA LBX210QNHHX2526: 6728.8 - 6734.1 RETRO ALQ JCB6322: 5445.5 - 5455.2 RETRO ALQ JCB3423035: 1744.6 - 1750.9 RETRO ALQ CAT440033: 256.0 - 262.7 EXCAVADORA KOMATSU452: 87.0 - 94.5 NOVEDADES: MOTONIVELADORA HYUNDAY2000337:Se sale la varilla estabilizadora de la maquina. ESTADO MAQUINARIA: OP-INOP ESTADO MAQUINARIA: OP-INOP: MOTONIVELADORA HYUNDAY2000337: INOPERATIVA VIBROCOMPACTADOR CAT00141: OPERATIVO RETROCARGADOR JCB2936947: OPERATIVO EXCAVADORA LBX210QNHHX2526: OPERATIVO
20 abril 2026	Envío reporte de las actividades realizadas en el frente de Pacho provincia del Rio negro. Actividades: Retrocargadores en alquiler y propia removiendo derrumbes y abriendo vía en el sector Goteras y Guanacas. Volquetas transporte de material en zonas de derrumbe Pacho - La Palma. Excavadora de oruga alquiler traslado para el sector capitán. Motoniveladora sin actividad, motoniveladora inoperativa. Vibro compactación de vía sector San Miguel. Excavadora de oruga actividades de remoción de derrumbes y mejoramiento de vía principal. Sector: PASUNCHA - TRONCAL DE RIO NEGRO - LAS HUERTAS - ALGODONES - GOTERAS - CAPITAN Longitud: 000 mts Lluvias: N/A COMBUSTIBLE: RETROCARGADOR JCB2936947: 29.027 GL Viajes: VOLQUETA UFE 849 ALQ: 14 VIAJES Volqueta OJJ 883 ALQ: 14 VIAJES Volqueta OWG 591 ALQ: 14 VIAJES Km inicio-fin VOL(ALQ) UFE 849: SIN HR - TCM VOL(ALQ) OJJ 883: SIN HR - TCM VOL(ALQ) OWG 591: SIN HR - TCM HR inicio - Fin MOTONIVELADORA HYUNDAY2000337: 4117.8 VIBROCOMPACTADOR CAT00141: 5708.5 - 5709.6 RETROCARGADOR JCB2936947: 4895.0 - 4904.0 EXCAVADORA LBX210QNHHX2526: 6734.1 - 6741.1 RETRO ALQ JCB6322: 5455.2 - 5460.3 RETRO ALQ JCB3423035: 1750.9 - 1760.2 RETRO ALQ CAT440033: 262.7 - 274.0 EXCAVADORA KOMATSU452: 94.5 NOVEDADES: MOTONIVELADORA HYUNDAY2000337:Se sale la varilla estabilizadora de la maquina. ESTADO MAQUINARIA: OP-INOP ESTADO MAQUINARIA: OP-INOP: MOTONIVELADORA HYUNDAY2000337: INOPERATIVA VIBROCOMPACTADOR CAT00141:

	OPERATIVO RETROCARGADOR JCB2936947: OPERATIVO EXCAVADORA LBX210QNHHX2526: OPERATIVO
21 abril 2026	Envío reporte de las actividades realizadas en el frente de Pacho provincia del Rio negro. Actividades: Retrocargador en alquiler removiendo derrumbes y adecuando vía en el sector de pasuncha. Volquetas transporte de material en zonas de derrumbe Pacho - La Palma. Excavadora de oruga alquiler traslado para el sector capitán. Motoniveladora sin actividad, motoniveladora inoperativa. Vibro compactación de vía sector San Miguel. Excavadora de oruga actividades de remoción de derrumbes y mejoramiento de vía principal. Finalizan dos pajaritas en alquiler. Sector: PASUNCHA - TRONCAL DE RIO NEGRO - LAS HUERTAS - ALGODONES - GOTERAS - CAPITAN Longitud: 000 mts Lluvias: N/A COMBUSTIBLE: EXCAVADORA LBX210QNHHX2526: 59.184 GL EDS EL TOTUMO Viajes: VOLQUETA UFE 849 ALQ: 8 VIAJES Volqueta OJJ 883 ALQ: 8 VIAJES Volqueta OWG 591 ALQ: 8 VIAJES Km inicio-fin VOL(ALQ) UFE 849: SIN HR - TCM VOL(ALQ) OJJ 883: SIN HR - TCM VOL(ALQ) OWG 591: SIN HR - TCM HR inicio - Fin MOTONIVELADORA HYUNDAY2000337: 4117.8 VIBROCOMPACTADOR CAT00141: 5709.6 - 5711.9 RETROCARGADOR JCB2936947: 4904.0 - 4912.2 EXCAVADORA LBX210QNHHX2526: 6741.1 - 6748.3 RETRO ALQ JCB6322: 5460.3 - 5463.8 RETRO ALQ JCB3423035: 1760.2 RETRO ALQ CAT440033: 274.0 EXCAVADORA KOMATSU452: 94.5 NOVEDADES: MOTONIVELADORA HYUNDAY2000337:Se sale la varilla estabilizadora de la maquina. ESTADO MAQUINARIA: OP-INOP ESTADO MAQUINARIA: OP-INOP: MOTONIVELADORA HYUNDAY2000337: INOPERATIVA VIBROCOMPACTADOR CAT00141: OPERATIVO RETROCARGADOR JCB2936947: OPERATIVO EXCAVADORA LBX210QNHHX2526: OPERATIVO
22 abril 2026	Envío reporte de las actividades realizadas en el frente de Pacho provincia del Rio negro. Actividades: Retrocargador en alquiler removiendo derrumbes y adecuando vía en el sector de pasuncha. Volquetas transporte de material en zonas de derrumbe Pacho - La Palma. Excavadora de oruga alquiler removiendo derrumbes en el sector capitán. Motoniveladora sin actividad, motoniveladora inoperativa. Vibro compactación de vía sector San Miguel. Excavadora de oruga actividades de remoción de derrumbes y mejoramiento de vía principal. Sector: PASUNCHA - TRONCAL DE RIO NEGRO - LAS HUERTAS - ALGODONES - GOTERAS - CAPITAN Longitud: 000 mts Lluvias: N/A COMBUSTIBLE: EXCAVADORA LBX210QNHHX2526: 84.894 GL EDS EL TOTUMO Viajes: VOLQUETA UFE 849 ALQ: 7 VIAJES Volqueta OJJ 883 ALQ: 7 VIAJES Volqueta OWG 591 ALQ: 7 VIAJES Km inicio-fin VOL(ALQ) UFE 849: SIN HR - TCM VOL(ALQ) OJJ 883: SIN HR - TCM VOL(ALQ) OWG 591: SIN HR - TCM HR inicio - Fin MOTONIVELADORA HYUNDAY2000337: 4117.8 VIBROCOMPACTADOR CAT00141: 5711.9 - 5717.6 RETROCARGADOR JCB2936947: 4912.2 - 4919.1 EXCAVADORA LBX210QNHHX2526: 6748.3 - 6756.1 RETRO ALQ JCB6322: 5463.8 - 5470.7 EXCAVADORA KOMATSU452: 94.5 NOVEDADES: MOTONIVELADORA HYUNDAY2000337:Se sale la varilla estabilizadora de la maquina. ESTADO MAQUINARIA: OP-INOP ESTADO MAQUINARIA: OP-INOP: MOTONIVELADORA HYUNDAY2000337: INOPERATIVA VIBROCOMPACTADOR CAT00141: OPERATIVO RETROCARGADOR JCB2936947: OPERATIVO EXCAVADORA LBX210QNHHX2526: OPERATIVO
23 abril 2026	Envío reporte de las actividades realizadas en el frente de Pacho provincia del Rio negro. Actividades: Retrocargador en alquiler removiendo derrumbes y adecuando vía en el sector de pasuncha. Volquetas transporte de material en zonas de derrumbe

	Pacho - La Palma. Excavadora de oruga alquiler removiendo derrumbes en el sector capitán. Motoniveladora sin actividad, motoniveladora inoperativa. Vibro compactación de vía sector San Miguel. Excavadora de oruga actividades de remoción de derrumbes y mejoramiento de vía principal. Sector: PASUNCHA - TRONCAL DE RIO NEGRO - LAS HUERTAS - ALGODONES - GOTERAS - CAPITAN Longitud: 000 mts Lluvias: N/A COMBUSTIBLE: VIBROCOMPACTADOR CAT00141: 40.000 GL Viajes: VOLQUETA UFE 849 ALQ: 9 VIAJES Volqueta OJJ 883 ALQ: 11 VIAJES Volqueta OWG 591 ALQ: 11 VIAJES Km inicio-fin VOL(ALQ) UFE 849: SIN HR - TCM VOL(ALQ) OJJ 883: SIN HR - TCM VOL(ALQ) OWG 591: SIN HR - TCM HR inicio - Fin MOTONIVELADORA HYUNDAY2000337: 4117.8 VIBROCOMPACTADOR CAT00141: 5717.6 - 5724.9 RETROCARGADOR JCB2936947: 4919.1 - 4926.6 EXCAVADORA LBX210QNHHX2526: 6756.1 - 6764.1 RETRO ALQ JCB6322: 5470.7 - 5473.1 EXCAVADORA KOMATSU452: 94.5 - 98.0 NOVEDADES: MOTONIVELADORA HYUNDAY2000337:Se sale la varilla estabilizadora de la maquina. ESTADO MAQUINARIA: OP-INOP ESTADO MAQUINARIA: OP-INOP: MOTONIVELADORA HYUNDAY2000337: INOPERATIVA VIBROCOMPACTADOR CAT00141: OPERATIVO RETROCARGADOR JCB2936947: OPERATIVO EXCAVADORA LBX210QNHHX2526: OPERATIVO
24 abril 2026	Envío reporte de las actividades realizadas en el frente de Pacho provincia del Rio negro. Actividades: Retrocargador en alquiler removiendo derrumbes y adecuando vía en el sector de pasuncha. Volquetas transporte de material en zonas de derrumbe Pacho - La Palma. Excavadora de oruga alquiler removiendo y abriendo via en el sector capitán. Motoniveladora sin actividad, motoniveladora inoperativa. Vibro compactación de vía sector San Miguel. Excavadora de oruga actividades de remoción de derrumbes y mejoramiento de vía principal. Sector: PASUNCHA - TRONCAL DE RIO NEGRO - LAS HUERTAS - ALGODONES - GOTERAS - CAPITAN Longitud: 000 mts Lluvias: N/A COMBUSTIBLE: Viajes: VOLQUETA UFE 849 ALQ: 8 VIAJES Volqueta OJJ 883 ALQ: 8 VIAJES Volqueta OWG 591 ALQ: 8 VIAJES Km inicio-fin VOL(ALQ) UFE 849: SIN HR - TCM VOL(ALQ) OJJ 883: SIN HR - TCM VOL(ALQ) OWG 591: SIN HR - TCM HR inicio - Fin MOTONIVELADORA HYUNDAY2000337: 4117.8 VIBROCOMPACTADOR CAT00141: 5724.9 RETROCARGADOR JCB2936947: 4926.6 - 4934.8 EXCAVADORA LBX210QNHHX2526: 6764.1 - 6771.2 RETRO ALQ JCB6322: 5473.1 - 5479.1 EXCAVADORA KOMATSU452: 98.0 - 108.0 NOVEDADES: MOTONIVELADORA HYUNDAY2000337:Se sale la varilla estabilizadora de la maquina. ESTADO MAQUINARIA: OP-INOP ESTADO MAQUINARIA: OP-INOP: MOTONIVELADORA HYUNDAY2000337: INOPERATIVA VIBROCOMPACTADOR CAT00141: OPERATIVO RETROCARGADOR JCB2936947: OPERATIVO EXCAVADORA LBX210QNHHX2526: OPERATIVO
25 abril 2026	Actividad de emergencia en el sector Cucharal, se interviene con equipos y volquetas Alquiladas. Demas equipos sin actividad día sábado. Sector: PASUNCHA - TRONCAL DE RIO NEGRO - LAS HUERTAS - ALGODONES - GOTERAS - CAPITAN Longitud: 000 mts Lluvias: N/A COMBUSTIBLE: Viajes: VOLQUETA UFE 849 ALQ: 9 VIAJES Volqueta OJJ 883 ALQ: 9 VIAJES Volqueta OWG 591 ALQ: 9 VIAJES Km inicio-fin VOL(ALQ) UFE 849: SIN HR - TCM VOL(ALQ) OJJ 883: SIN HR - TCM VOL(ALQ) OWG 591: SIN HR - TCM HR inicio - Fin MOTONIVELADORA HYUNDAY2000337: 4117.8 VIBROCOMPACTADOR CAT00141: 5724.9 RETROCARGADOR JCB2936947: 4934.8 EXCAVADORA LBX210QNHHX2526: 6771.2 RETRO ALQ JCB6322: 5479.1 - 5486.1 EXCAVADORA KOMATSU452: 108.0 RETRO ALQ

	JCB3423035: 1771.8 - 1783.5 NOVEDADES: MOTONIVELADORA HYUNDAY2000337:Se sale la varilla estabilizadora de la maquina. ESTADO MAQUINARIA: OP-INOP ESTADO MAQUINARIA: OP-INOP: MOTONIVELADORA HYUNDAY2000337: INOPERATIVA VIBROCOMPACTADOR CAT00141: OPERATIVO RETROCARGADOR JCB2936947: OPERATIVO EXCAVADORA LBX210QNHHX2526: OPERATIVO
27 abril 2026	Envío reporte de las actividades realizadas en el frente de Pacho provincia del Rio negro. Actividades: Retrocargador en alquiler removiendo derrumbes y adecuando vía en el sector de pasuncha. Volquetas transporte de material en zonas de derrumbe Pacho - La Palma. Excavadora de oruga alquiler removiendo y abriendo via en el sector capitán. Motoniveladora sin actividad, motoniveladora inoperativa. Vibro compactación de vía sector San Miguel. Excavadora de oruga actividades de remoción de derrumbes y mejoramiento de vía principal, para actividades por lluvias. Sector: PASUNCHA - TRONCAL DE RIO NEGRO - LAS HUERTAS - ALGODONES - GOTERAS - CAPITAN Longitud: 000 mts Lluvias: N/A COMBUSTIBLE: RETROCARGADOR JCB2936947: 35.000 GL Viajes: VOLQUETA UFE 849 ALQ: 10 VIAJES Volqueta OJJ 883 ALQ: 10 VIAJES Volqueta OWG 591 ALQ: 10 VIAJES Km inicio-fin VOL(ALQ) UFE 849: SIN HR - TCM VOL(ALQ) OJJ 883: SIN HR - TCM VOL(ALQ) OWG 591: SIN HR - TCM HR inicio - Fin MOTONIVELADORA HYUNDAY2000337: 4117.8 VIBROCOMPACTADOR CAT00141: 5724.9 RETROCARGADOR JCB2936947: 4934.8 - 4943.4 EXCAVADORA LBX210QNHHX2526: 6771.2 RETRO ALQ JCB6322: 5486.1 - 5494.8 EXCAVADORA KOMATSU452: 108.0 - 117.5 RETRO EMERGENCIA: 15894.1 RETRO ALQ JCB3423035: 1783.5 NOVEDADES: MOTONIVELADORA HYUNDAY2000337:Se sale la varilla estabilizadora de la maquina. ESTADO MAQUINARIA: OP-INOP ESTADO MAQUINARIA: OP-INOP: MOTONIVELADORA HYUNDAY2000337: INOPERATIVA VIBROCOMPACTADOR CAT00141: OPERATIVO RETROCARGADOR JCB2936947: OPERATIVO EXCAVADORA LBX210QNHHX2526: OPERATIVO
28 abril 2026	Envío reporte de las actividades realizadas en el frente de Pacho provincia del Rio negro. Actividades: Retrocargador en alquiler removiendo derrumbes y adecuando vía en el sector de pasuncha. Volquetas transporte de material en zonas de derrumbe Pacho - La Palma. Excavadora de oruga alquiler se retira. Motoniveladora sin actividad, motoniveladora inoperativa. Vibro compactación de vía sector Villa maria. Excavadora de oruga actividades de remoción de derrumbes y mejoramiento de vía principal, para actividades por lluvias. Sector: PASUNCHA - TRONCAL DE RIO NEGRO - LAS HUERTAS - ALGODONES - GOTERAS - CAPITAN Longitud: 000 mts Lluvias: N/A COMBUSTIBLE: Viajes: VOLQUETA UFE 849 ALQ: 14 VIAJES Volqueta OJJ 883 ALQ: 13 VIAJES Volqueta OWG 591 ALQ: 14 VIAJES Km inicio-fin VOL(ALQ) UFE 849: SIN HR - TCM VOL(ALQ) OJJ 883: SIN HR - TCM VOL(ALQ) OWG 591: SIN HR - TCM HR inicio - Fin MOTONIVELADORA HYUNDAY2000337: 4117.8 VIBROCOMPACTADOR CAT00141: 5724.9 - 5736.9 RETROCARGADOR JCB2936947: 4943.4 - 4951.7 EXCAVADORA LBX210QNHHX2526: 6771.2 - 6775.7 RETRO ALQ JCB6322: 5494.8 - 5501.9 EXCAVADORA KOMATSU452: 117.5 RETRO ALQ JCB3423035: 1783.5 NOVEDADES: MOTONIVELADORA HYUNDAY2000337:Se sale la varilla estabilizadora de la maquina. ESTADO MAQUINARIA: OP-INOP ESTADO MAQUINARIA: OP-INOP: MOTONIVELADORA HYUNDAY2000337: INOPERATIVA VIBROCOMPACTADOR CAT00141:

	OPERATIVO RETROCARGADOR JCB2936947: OPERATIVO EXCAVADORA LBX210QNHHX2526: OPERATIVO
29 abril 2026	Envío reporte de las actividades realizadas en el frente de Pacho provincia del Rio negro. Actividades: Retrocargador en alquiler removiendo derrumbes y adecuando vía en el sector de pasuncha. Volquetas transporte de material en zonas de derrumbe Pacho - La Palma. Motoniveladora sin actividad, motoniveladora se interviene mecánicamente y queda operativa. Vibro compactación de vía sector Chatarral. Excavadora de oruga actividades de remoción de derrumbes y mejoramiento de vía principal, para actividades por lluvias. Sector: PASUNCHA - TRONCAL DE RIO NEGRO - LAS HUERTAS - ALGODONES - GOTERAS - CAPITAN Longitud: 000 mts Lluvias: N/A COMBUSTIBLE: EXCAVADORA LBX210QNHHX2526: 59.555 GL EDS EL TOTUMO VIBROCOMPACTADOR CAT00141: 30.000 GL EDS EL TOTUMO Viajes: VOLQUETA UFE 849 ALQ: 8 VIAJES Volqueta OJJ 883 ALQ: 8 VIAJES Volqueta OWG 591 ALQ: 8 VIAJES Km inicio-fin VOL(ALQ) UFE 849: SIN HR - TCM VOL(ALQ) OJJ 883: SIN HR - TCM VOL(ALQ) OWG 591: SIN HR - TCM HR inicio - Fin MOTONIVELADORA HYUNDAY2000337: 4117.8 - 4121.9 VIBROCOMPACTADOR CAT00141: 5736.9 - 5743.0 RETROCARGADOR JCB2936947: 4951.7 - 4960.3 EXCAVADORA LBX210QNHHX2526: 6775.7 - 6780.2 RETRO ALQ JCB6322: 5501.9 - 5509.9 EXCAVADORA KOMATSU452: 117.5 RETRO ALQ JCB3423035: 1783.5 NOVEDADES: MOTONIVELADORA HYUNDAY2000337:Se intervino mecánicamente y queda operativa. ESTADO MAQUINARIA: OP-INOP ESTADO MAQUINARIA: OP-INOP: MOTONIVELADORA HYUNDAY2000337: OPERATIVA VIBROCOMPACTADOR CAT00141: OPERATIVO RETROCARGADOR JCB2936947: OPERATIVO EXCAVADORA LBX210QNHHX2526: OPERATIVO
30 abril 2026	Envío reporte de las actividades realizadas en el frente de Pacho provincia del Rio negro. Actividades: Retrocargador en alquiler removiendo derrumbes y adecuando vía en el sector de pasuncha. Volquetas transporte de material en zonas de derrumbe Pacho - La Palma. Motoniveladora y vibro conformación de vía en el sector la cabrera. Excavadora de oruga actividades de remoción de derrumbes y mejoramiento de vía principal. Sector: PASUNCHA - TRONCAL DE RIO NEGRO - LAS HUERTAS - ALGODONES - GOTERAS - CAPITAN Longitud: 1000 mts Lluvias: N/A COMBUSTIBLE: Viajes: VOLQUETA UFE 849 ALQ: 5 VIAJES Volqueta OJJ 883 ALQ: 5 VIAJES Volqueta OWG 591 ALQ: 5 VIAJES Km inicio-fin VOL(ALQ) UFE 849: SIN HR - TCM VOL(ALQ) OJJ 883: SIN HR - TCM VOL(ALQ) OWG 591: SIN HR - TCM HR inicio - Fin MOTONIVELADORA HYUNDAY2000337: 4121.9 - 4131.7 VIBROCOMPACTADOR CAT00141: 5743.0 - 5747.4 RETROCARGADOR JCB2936947: 4960.3 - 4968.7 EXCAVADORA LBX210QNHHX2526: 6780.2 - 6788.7 RETRO ALQ JCB6322: 5509.9 - 5517.2 EXCAVADORA KOMATSU452: 117.5 RETRO ALQ JCB3423035: 1783.5 NOVEDADES: MOTONIVELADORA HYUNDAY2000337:Se intervino mecánicamente y queda operativa. ESTADO MAQUINARIA: OP-INOP ESTADO MAQUINARIA: OP-INOP: MOTONIVELADORA HYUNDAY2000337: OPERATIVA VIBROCOMPACTADOR CAT00141: OPERATIVO RETROCARGADOR JCB2936947: OPERATIVO EXCAVADORA LBX210QNHHX2526: OPERATIVO

5. RELACIÓN DE TRANSPORTE Y REMISIÓN DE MATERIALES

RELACIÓN DE TRANSPORTE Y REMISIÓN DE MATERIALES			
FECHA	**MATERIAL**	**N° DE VIAJES**	**DESCRIPCIÓN**
1/04/2026	SOBRANTE	15	
2/04/2026	SOBRANTE	0	**SIN ACTIVIDAD**
3/04/2026	SOBRANTE	0	**SIN ACTIVIDAD**
4/04/2026	SOBRANTE	0	**SIN ACTIVIDAD**
5/04/2026	SOBRANTE	0	**SIN ACTIVIDAD**
6/04/2026	SOBRANTE	15	
7/04/2026	SOBRANTE	21	
8/04/2026	SOBRANTE	21	
9/04/2026	SOBRANTE	24	
10/04/2026	SOBRANTE	18	
11/04/2026	SOBRANTE	0	**SIN ACTIVIDAD**
12/04/2026	SOBRANTE	0	**SIN ACTIVIDAD**
13/04/2026	SOBRANTE	18	
14/04/2026	SOBRANTE	19	
15/04/2026	SOBRANTE	21	
16/04/2026	SOBRANTE	21	
17/04/2026	SOBRANTE	12	
18/04/2026	SOBRANTE	8	
19/04/2026	SOBRANTE	0	**SIN ACTIVIDAD**
20/04/2026	SOBRANTE	42	
21/04/2026	SOBRANTE	16	
22/04/2026	SOBRANTE	21	
23/04/2026	SOBRANTE	31	
24/04/2026	SOBRANTE	24	
25/04/2026	SOBRANTE	27	
26/04/2026	SOBRANTE	0	**SIN ACTIVIDAD**
27/04/2026	SOBRANTE	30	
28/04/2026	SOBRANTE	43	
29/04/2026	SOBRANTE	24	
30/04/2026	SOBRANTE	15	
TOTAL		**486**	

6. AVANCE EN CAMPO (KM)

AVANCE DE OBRA PACHO				
FECHA	LONGITUD (KM)	AVANCE (KM)	REPETICIÓN (KM)	DESCRIPCIÓN
1/04/2026	1	1		VIA ALGODONES
2/04/2026	0	1		VIA ALGODONES
3/04/2026	0	1		VIA ALGODONES
4/04/2026	0	1		VIA ALGODONES
5/04/2026	0	1		VIA ALGODONES
6/04/2026	0.4	1.4		VIA ALGODONES
7/04/2026	1	2.4		VIA ALGODONES
8/04/2026	1	3.4		VIA ALGODONES
9/04/2026	0.3	3.7		VIA ALGODONES
10/04/2026	0	3.7		VIA ALGODONES
11/04/2026	DOMINGO			
12/04/2026	0	3.7		MOTO INOPERATIVA
13/04/2026	0	3.7		MOTO INOPERATIVA
14/04/2026	0	3.7		MOTO INOPERATIVA
15/04/2026	0	3.7		MOTO INOPERATIVA
16/04/2026	0	3.7		MOTO INOPERATIVA
17/04/2026	0	3.7		MOTO INOPERATIVA
18/04/2026	0	3.7		MOTO INOPERATIVA
19/04/2026	DOMINGO			
20/04/2026	0	3.7		MOTO INOPERATIVA
21/04/2026	0	3.7		MOTO INOPERATIVA
22/04/2026	0	3.7		MOTO INOPERATIVA
23/04/2026	0	3.7		MOTO INOPERATIVA
24/04/2026	0	3.7		MOTO INOPERATIVA
25/04/2026	0	3.7		MOTO INOPERATIVA
26/04/2026	DOMINGO			
27/04/2026	0	3.7		MOTO INOPERATIVA
28/04/2026	0	3.7		MOTO INOPERATIVA
29/04/2026	0	3.7		MOTO INOPERATIVA
30/04/2026	1	4.7		VIA LA CABRERA
TOTAL	**4.7**	**4.7**		

7. RESUMEN DE HORAS DE LLUVIA, INOPERATIVIDAD Y EFECTIVAS LABORALES

RESUMEN DE HORAS DE LLUVIA, INOPERATIVIDADY EFECTIVAS LABORALES				
FECHA	**HORAS DE LLUVIA**	**HORAS DE INOPERATIVIDAD**	**HORAS EFECTIVAS**	**DESCRIPCIÓN**
1/04/2026	0	0	8	
2/04/2026	0	0	0	
3/04/2026	0	0	0	
4/04/2026	0	0	0	
5/04/2026	0	0	0	
6/04/2026	0	0	8	
7/04/2026	0	0	8	
8/04/2026	0	0	8	
9/04/2026	0	0	8	
10/04/2026	0	0	8	
11/04/2026	DOMINGO			
12/04/2026	0	0	8	
13/04/2026	0	0	8	
14/04/2026	0	0	8	
15/04/2026	0	0	8	
16/04/2026	0	0	8	
17/04/2026	0	0	8	
18/04/2026	0	0	8	
19/04/2026	DOMINGO			
20/04/2026	0	0	8	
21/04/2026	0	0	8	
22/04/2026	0	0	8	
23/04/2026	0	0	8	
24/04/2026	0	0	8	
25/04/2026	0	0	8	
26/04/2026	DOMINGO			
27/04/2026	0	0	8	
28/04/2026	0	0	8	
29/04/2026	0	0	8	
30/04/2026	0	0	8	
TOTAL	**0**	**0**	**184**	

8. MOVILIZACIONES

No se realizaron movilizaciones en este mes

9. MANTENIMIENTOS

MANTENIMIENTOS			
FECHA	**EQUIPO**	**SERIAL**	**DESCRIPCIÓN**
08-04-2026	RETROCARGADOR	JCB 3CXTT 6947	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
16-04-2026	EXCAVADORA DE ORUGA	LBX210QNHHX2526	CAMBIO DE DIENTES PARA EL BALDE
24-04-2026	EXCAVADORA DE ORUGA	LBX210QNHHX2526	CENTRALIZACION DEL TREN DE ARRASTRE
28-04-2026	MOTONIVELADORA HYUNDAY	2000337	MANTENIMIENTO DE CUCHILLA Y BOTELLAS
24-04-2026	EXCAVADORA DE ORUGA	LBX210QNHHX2526	CAMBIO DE BATERIAS

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025

10. CONTROL DE TRABAJO MAQUINARIA

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025	CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA, VOLQUETAS Y TRACTOCAMIÓN E INSUMOS BASICOS							ICCU
OBJETO	"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".							
PERIODO:	ABRIL							
MUNICIPIO:	PACHO			PROVINCIA:		RIO NEGRO		
MAQUINA:	RETROEXCAVADORA			SERIE		JCB2936947		
CONTROL HORARIO				ACPM				OBSERVACIÓN
FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS	ACPM (GLS)	HOROMETRO DE TANQUEO	RENDIMIENTO	No. TIRILLA	
1/04/2026	4819	4825.1	6.1					
2/04/2026	4825.1	4825.1	0					
3/04/2026	4825.1	4825.1	0					
4/04/2026	4825.1	4825.1	0					
5/04/2026	4825.1	4825.1	0					
6/04/2026	4825.1	4832	6.9					
7/04/2026	4832	4840.2	8.2	28.019	4832		124	
8/04/2026	4840.2	4846.3	6.1					
9/04/2026	4846.3	4854.2	7.9					
10/04/2026	4854.2	4861.3	7.1	31.003	4854.2	1.4	131	
11/04/2026	4861.3	4861.3	0					
12/04/2026	4861.3	4861.3	0					
13/04/2026	4861.3	4868.9	7.6	30.000	4868.9	2.0	133	
14/04/2026	4868.9	4876.9	8					
15/04/2026	4876.9	4884.2	7.3	30.000	4884.2	2.0	133	
16/04/2026	4884.2	4891.7	7.5					
17/04/2026	4891.7	4895	3.3	27.837	4895	2.6	135	
18/04/2026	4895	4895	0					
19/04/2026	4895	4895	0					
20/04/2026	4895	4904	9					
21/04/2026	4904	4912.2	8.2	29.027	4912.2	1.7	140	
22/04/2026	4912.2	4919.1	6.9					
23/04/2026	4919.1	4926.6	7.5					
24/04/2026	4926.6	4934.8	8.2					
25/04/2026	4934.8	4934.8	0					
26/04/2026	4934.8	4934.8	0					
27/04/2026	4934.8	4943.4	8.6	35.000	4934.8	1.5	151	
28/04/2026	4943.4	4951.7	8.3					
29/04/2026	4951.7	4960.3	8.6	35.000	4960.3	1.4	1147	
30/04/2026	4960.3	4968.7	8.4					
TOTAL MES			149.70	245.89		1.8		

UNIÓN TEMPORAL ICCU PARQUE 2025
NIT 902.017.719 -3

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025	CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA, VOLQUETAS Y TRACTOCAMIÓN E INSUMOS BASICOS	ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
OBJETO	"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".	
PERIODO:	ABRIL	
MUNICIPIO:	PACHO	PROVINCIA: RIO NEGRO
MAQUINA:	MOTONIVELADORA	SERIE HYUNDAY2000337

CONTROL HORARIO				ACPM				UREA				OBSERVACIÓN
FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS	ACPM (GLS)	HOROMETRO DE TANQUEO	RENDIMIENTO	No. TIRILLA	UREA	HOROMETRO DE TANQUEO	RENDIMIENTO	No. TIRILLA	
1/04/2026	4093.1	4099.1	6									
2/04/2026	4099.1	4099.1	0									
3/04/2026	4099.1	4099.1	0									
4/04/2026	4099.1	4099.1	0									
5/04/2026	4099.1	4099.1	0									
6/04/2026	4099.1	4102.8	3.7									
7/04/2026	4102.8	4107.5	4.7									
8/04/2026	4107.5	4115.4	7.9	53.649	4107.5		126					
9/04/2026	4115.4	4117.8	2.4									
10/04/2026	4117.8	4117.8	0									INOPERATIVA
11/04/2026	4117.8	4117.8	0									INOPERATIVA
12/04/2026	4117.8	4117.8	0									INOPERATIVA
13/04/2026	4117.8	4117.8	0									INOPERATIVA
14/04/2026	4117.8	4117.8	0									INOPERATIVA
15/04/2026	4117.8	4117.8	0									INOPERATIVA
16/04/2026	4117.8	4117.8	0									INOPERATIVA
17/04/2026	4117.8	4117.8	0									INOPERATIVA
18/04/2026	4117.8	4117.8	0									INOPERATIVA
19/04/2026	4117.8	4117.8	0									INOPERATIVA
20/04/2026	4117.8	4117.8	0									INOPERATIVA
21/04/2026	4117.8	4117.8	0									INOPERATIVA
22/04/2026	4117.8	4117.8	0									INOPERATIVA
23/04/2026	4117.8	4117.8	0									INOPERATIVA
24/04/2026	4117.8	4117.8	0									INOPERATIVA
25/04/2026	4117.8	4117.8	0									INOPERATIVA
26/04/2026	4117.8	4117.8	0									INOPERATIVA
27/04/2026	4117.8	4117.8	0									INOPERATIVA
28/04/2026	4117.8	4117.8	0									INOPERATIVA
29/04/2026	4117.8	4121.9	4.1									
30/04/2026	4121.9	4131.7	9.8									
TOTAL MES			38.60	53.65		#¡DIV/0!		0.00		0.00		

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025

CLL 13 # 47 – 12 BOGOTA – CUNDINAMARCA D.C TEL 313 258 3561
EMAIL: COORDINACION.ICCU.2026@GMAIL.COM

UNIÓN TEMPORAL ICCU PARQUE 2025
NIT 902.017.719 -3

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025	CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA, VOLQUETAS Y TRACTOCAMIÓN E INSUMOS BASICOS	ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
OBJETO	"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".	
PERIODO:	ABRIL	
MUNICIPIO:	PACHO	PROVINCIA: RIO NEGRO
MAQUINA:	VIBRO	SERIE CAT00141

CONTROL HORARIO				ACPM				UREA				OBSERVACIÓN
FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS	ACPM (GLS)	HOROMETRO DE TANQUEO	RENDIMIENTO	No. TIRILLA	UREA	HOROMETRO DE TANQUEO	RENDIMIENTO	No. TIRILLA	
1/03/2026	5686.1	5690.7	4.6									
2/03/2026	5690.7	5690.7	0									
3/03/2026	5690.7	5690.7	0									
4/03/2026	5690.7	5690.7	0									
5/03/2026	5690.7	5690.7	0									
6/03/2026	5690.7	5694.2	3.5									
7/03/2026	5694.2	5698.6	4.4									
8/03/2026	5698.6	5703.2	4.6	40.657	5698.6		125					
9/03/2026	5703.2	5705	1.8									
10/03/2026	5705	5705	0									
11/03/2026	5705	5705	0									
12/03/2026	5705	5705	0									
13/03/2026	5705	5705	0									
14/03/2026	5705	5705	0									
15/03/2026	5705	5705	0									
16/03/2026	5705	5705	0									
17/03/2026	5705	5708.5	3.5									
18/03/2026	5705	5708.5	3.5									
19/03/2026	5708.5	5708.5	0									
20/03/2026	5708.5	5709.6	1.1									
21/03/2026	5709.6	5711.9	2.3									
22/03/2026	5711.9	5717.6	5.7									
23/03/2026	5717.6	5724.9	7.3	40.000	5717.6	2.1	149					
24/03/2026	5724.9	5724.9	0									
25/03/2026	5724.9	5724.9	0									
26/03/2026	5724.9	5724.9	0									
27/03/2026	5724.9	5724.9	0									
28/03/2026	5724.9	5736.9	12									
29/03/2026	5736.9	5743	6.1	30.000	5736.9	1.6	157					
30/03/2026	5743	5747.4	4.4									
TOTAL MES			**64.80**	**110.66**		**1.8**		**0.00**		**0.00**		

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025

CLL 13 # 47 – 12 BOGOTA – CUNDINAMARCA D.C TEL 313 258 3561
EMAIL: COORDINACION.ICCU.2026@GMAIL.COM


UNIÓN TEMPORAL ICCU PARQUE 2025
NIT 902.017.719 -3

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025	CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA, VOLQUETAS Y TRACTOCAMIÓN E INSUMOS BASICOS							ICCU
OBJETO	**"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIAPESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".**							
PERIODO:	**ABRIL**							
MUNICIPIO:	**PACHO**			**PROVINCIA:**	**RIO NEGRO**			
MAQUINA:	**ORUGA LINK BELT**			**SERIE**	**LBX210QNHHX2526**			
CONTROL HORARIO				**ACPM**				**OBSERVACIÓN**
FECHA	**HOROMETRO INICIAL**	**HOROMETRO FINAL**	**HORAS**	**ACPM (GLS)**	**HOROMETRO DE TANQUEO**	**RENDIMIENTO**	**No. TIRILLA**	
7/04/2026	6696.6	6704.7	8.1					LLEGA MAQUINA
8/04/2026	6704.7	6704.7	0					
9/04/2026	6704.7	6704.7	0					
10/04/2026	6704.7	6704.7	0					
11/04/2026	6704.7	6704.7	0					
12/04/2026	6704.7	6704.7	0					
13/04/2026	6704.7	6711.7	7					
14/04/2026	6711.7	6719.3	7.6					
15/04/2026	6711.7	6719.3	7.6	60	6719.3		138	
16/04/2026	6719.3	6728.8	9.5					
17/04/2026	6728.8	6734.1	5.3					
18/04/2026	6728.8	6734.1	5.3					
19/04/2026	6734.1	6734.1	0					
20/04/2026	6734.1	6741.1	7					
21/04/2026	6741.1	6748.3	7.2	59.184	6741.1	2.7	144	
22/04/2026	6748.3	6756.1	7.8					
23/04/2026	6756.1	6764.1	8					
24/04/2026	6764.1	6771.2	7.1	84.894	6764.1	4	147	
25/04/2026	6771.2	6771.2	0					
26/04/2026	6771.2	6771.2	0					
27/04/2026	6771.2	6771.2	0					
28/04/2026	6771.2	6775.7	4.5					
29/04/2026	6775.7	6780.2	4.5					
30/04/2026	6780.2	6788.7	8.5	59.555	6780.2	3.7	156	
TOTAL MES			**105.00**	**263.63**		**3.4**		

CRA 13 # 17 - 13 BOGOTA - CUNDINAMARCA TEL 310 350 25 61
EMAIL: COORDINACION.ICCU.2026@GMAIL.COM

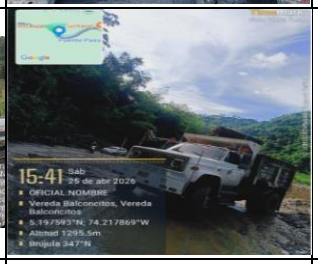
UNIÓN TEMPORAL ICCU PARQUE 2025
NIT 902.017.719 -3

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025	CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA ALQUILADA	ICCU
OBJETO	"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".	
PERIODO:	ABRIL	
MUNICIPIO:	PACHO	
MAQUINA:	VOLQUETA SENCILLA	SERIE: OWG 591

FECHA	REGISTRO FOTOGRÁFICO INICIAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO FINAL	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	VIAJES	DIAS LABORADOS	OBSERVACIÓN
1/04/2026			SIN HR	SIN HR	5	1	
2/04/2026	x	x	SIN HR	SIN HR	0		FESTIVO
3/04/2026	x	x	SIN HR	SIN HR	0		FESTIVO
4/04/2026	x	x	SIN HR	SIN HR	0		FESTIVO
5/04/2026	x	x	SIN HR	SIN HR	0		FESTIVO
6/04/2026			SIN HR	SIN HR	5	1	
7/04/2026			SIN HR	SIN HR	8	1	
8/04/2026			SIN HR	SIN HR	7	1	
9/04/2026			SIN HR	SIN HR	8	1	
10/04/2026			SIN HR	SIN HR	6	1	

11/04/2026	X	X	SIN HR	SIN HR	0	0	
12/04/2026	X	X	SIN HR	SIN HR	0	0	
13/04/2026			SIN HR	SIN HR	6	1	
14/04/2026			SIN HR	SIN HR	6	1	
15/04/2026			SIN HR	SIN HR	7	1	
16/04/2026			SIN HR	SIN HR	7	1	
17/04/2026			SIN HR	SIN HR	4	1	

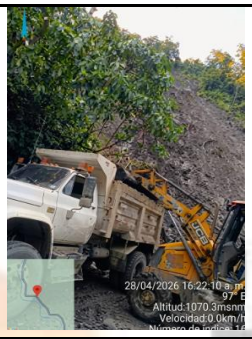
UNIÓN TEMPORAL ICCU PARQUE 2025
NIT 902.017.719 -3

18/04/20 2 6	x	x	SIN HR	SIN HR	0	0	
19/04/20 2 6	x	x	SIN HR	SIN HR	0	0	
20/04/20 2 6			SIN HR	SIN HR	14	1	
21/04/20 2 6			SIN HR	SIN HR	8	1	
22/04/20 2 6			SIN HR	SIN HR	7	1	
23/04/20 2 6			SIN HR	SIN HR	7	1	
24/04/20 2 6			SIN HR	SIN HR	11	1	
25/04/20 2 6			SIN HR	SIN HR	8	1	
26/04/20 2 6	x	x	SIN HR	SIN HR	0	0	

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025

CLL 13 # 47 – 12 BOGOTA – CUNDINAMARCA D.C TEL 313 258 3561
EMAIL: COORDINACION.ICCU.2026@GM AIL.COM

UNIÓN TEMPORAL ICCU PARQUE 2025
NIT 902.017.719 -3

27/04/2026			SIN HR	SIN HR	10	1	
28/04/2026			SIN HR	SIN HR	14	1	
29/04/2026			SIN HR	SIN HR	8	**1**	
30/04/2026			SIN HR	SIN HR	**5**	**1**	
SUBTOTAL MES					**161.0**	**21.0**	
TOTAL MES					**21.0**		
Firma			**Firma**				
Nombre:	**RICARDO ORTIZ**		**Nombre:**		**ALEJANDRO CASTAÑEDA**		
INSPECTOR UNION TEMPORAL PARQUE 2025			**INSPECTOR ICCU**				

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025

UNIÓN TEMPORAL ICCU PARQUE 2025
NIT 902.017.719 -3

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025	CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA ALQUILADA						ICCU
OBJETO	"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".						
PERIODO:	ABRIL						
MUNICIPIO:	PACHO						
MAQUINA:	VOLQUETA SENCILLA					SERIE	OJJ883
FECHA	REGISTRO FOTOGRÁFICO INICIAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO FINAL	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	VIAJES	DIAS LABORADOS	OBSERVACIÓN
1/04/2026			SIN HR	SIN HR	5	1	
2/04/2026	X	X	SIN HR	SIN HR	0		
3/04/2026	X	X	SIN HR	SIN HR	0		
4/04/2026	X	X	SIN HR	SIN HR	0		
5/04/2026	X	X	SIN HR	SIN HR	0		
6/04/2026			SIN HR	SIN HR	5	1	
7/04/2026			SIN HR	SIN HR	7	1	
8/04/2026			SIN HR	SIN HR	7	1	
9/04/2026			SIN HR	SIN HR	8	1	
10/04/2026			SIN HR	SIN HR	6	1	

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025

UNIÓN TEMPORAL ICCU PARQUE 2025
NIT 902.017.719 -3

11/04/2026	X	X	SIN HR	SIN HR	0	0	
12/04/2026	X	X	SIN HR	SIN HR	0	0	
13/04/2026			SIN HR	SIN HR	6	1	
14/04/2026			SIN HR	SIN HR	6	1	
15/04/2026			SIN HR	SIN HR	7	1	
16/04/2026			SIN HR	SIN HR	7	1	
17/04/2026			SIN HR	SIN HR	4	1	

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025

UNIÓN TEMPORAL ICCU PARQUE 2025
NIT 902.017.719 -3

18/04/2026	X	X	SIN HR	SIN HR	0	0	
19/04/2026	X	X	SIN HR	SIN HR	0	0	
20/04/2026			SIN HR	SIN HR	14	1	
21/04/2026			SIN HR	SIN HR	8	1	
22/04/2026			SIN HR	SIN HR	7	1	
23/04/2026			SIN HR	SIN HR	7	1	
24/04/2026			SIN HR	SIN HR	11	1	
25/04/2026			SIN HR	SIN HR	8	1	

UNIÓN TEMPORAL ICCU PARQUE 2025

CLL 13 # 47 – 12 BOGOTA – CUNDINAMARCA D.C TEL 313 258 3561
EMAIL: COORDINACION.ICCU.2026@GM AIL.COM

UNIÓN TEMPORAL ICCU PARQUE 2025
NIT 902.017.719 -3

26/04/2026	X	X	SIN HR	SIN HR	0	0	
27/04/2026			SIN HR	SIN HR	10	1	
28/04/2026			SIN HR	SIN HR	13	1	
29/04/2026			SIN HR	SIN HR	8	1	
30/04/2026			SIN HR	SIN HR	5	1	
SUBTOTAL MES					159.0	21.0	
TOTAL MES					21.0		
Firma			Firma				
Nombre:	RICARDO ORTIZ		Nombre:		ALEJANDRO CASTAÑEDA		
INSPECTOR UNION TEMPORAL PARQUE 2025			INSPECTOR ICCU				

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025

UNIÓN TEMPORAL ICCU PARQUE 2025
NIT 902.017.719 -3

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025

CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA ALQUILADA

ICCU

OBJETO	"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".
PERIODO:	ABRIL
MUNICIPIO:	PACHO
MAQUINA:	VOLQUETA SENCILLA — SERIE — UFE 849

FECHA	REGISTRO FOTOGRAFICO INICIAL	REGISTRO FOTOGRAFICO FINAL	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	VIAJES	DIAS LABORADOS	OBSERVACION
1/04/2026			SIN HR	SIN HR	5	1	
2/04/2026	X	X	SIN HR	SIN HR	0		
3/04/2026	X			SIN HR	0		
4/04/2026	X	X	SIN HR	SIN HR	0		
5/04/2026	X		SIN HR	SIN HR	0		
6/04/2026			SIN HR	SIN HR	5	1	
7/04/2026			SIN HR	SIN HR	7	1	
8/04/2026			SIN HR	SIN HR	7	1	
9/04/2026			SIN HR	SIN HR	8	1	
10/04/2026			SIN HR	SIN HR	6	1	
11/04/2026			SIN HR	SIN HR	0	1	DISPONIBLE

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025

12/04/2026	X	X	SIN HR	SIN HR	0	0	
13/04/2026			SIN HR	SIN HR	6	1	
14/04/2026			SIN HR	SIN HR	7	1	
15/04/2026			SIN HR	SIN HR	7	1	
16/04/2026			SIN HR	SIN HR	7	1	
17/04/2026			SIN HR	SIN HR	4	1	
18/04/2026	X	X	SIN HR	SIN HR	0	0	
19/04/2026	X	X	SIN HR	SIN HR	0	0	

UNIÓN TEMPORAL ICCU PARQUE 2025
NIT 902.017.719 -3

20/04/2026			SIN HR	SIN HR	14	1	
21/04/2026			SIN HR	SIN HR	8	1	
22/04/2026			SIN HR	SIN HR	7	1	
23/04/2026			SIN HR	SIN HR	7	1	
24/04/2026			SIN HR	SIN HR	9	1	
25/04/2026			SIN HR	SIN HR	8	1	
26/04/2026	X	X	SIN HR	SIN HR	0	0	







UNIÓN TEMPORAL ICCU PARQUE 2025

UNIÓN TEMPORAL ICCU PARQUE 2025
NIT 902.017.719 -3




27/04/2026			SIN HR	SIN HR	10	1	
28/04/2026			SIN HR	SIN HR	14	1	
29/04/2026			SIN HR	SIN HR	8	1	
30/04/2026			SIN HR	SIN HR	5	1	
SUBTOTAL MES					159.0	22.0	
TOTAL MES					22.0		
Firma			Firma				
Nombre:	RICARDO ORTIZ		Nombre:		AL EJANDRO CASTAÑEDA		
INSPECTOR UNION TEMPORAL PARQUE 2025			INSPECTOR ICCU				

UNIÓN TEMPORAL ICCU PARQUE 2025

UNIÓN TEMPORAL ICCU PARQUE 2025
NIT 902.017.719 -3

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025	CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA ALQUILADA						ICCU
OBJETO	"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".						
PERIODO:	ABRIL						
MUNICIPIO:	PACHO						
MAQUINA:	RETROEXCAVADORA					SERIE	CAT440033
FECHA	REGISTRO FOTOGRAFICO HOROMETRO INICIAL	REGISTRO FOTOGRAFICO HOROMETRO FINAL	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS	STAND BY	OBSERVACIÓN
1/04/2026			166.2	174.8	8.6		
2/04/2026	x	x	174.8	174.8	0		
3/04/2026	x	x	174.8	174.8	0		
4/04/2026	x	x	174.8	174.8	0		
5/04/2026	x	x	174.8	174.8	0		
6/04/2026			179.4	188.4	9		
7/04/2026			188.4	196.8	8.4		
8/04/2026			196.8	205.2	8.4		
9/04/2026			205.2	213.7	8.5		
10/04/2026			213.7	223	9.3		
11/04/2026			223	223	0		

UNIÓN TEMPORAL ICCU PARQUE 2025
NIT 902.017.719 -3





12/04/2026			223	223	0		
13/04/2026			223	230.4	7.4		
14/04/2026			230.4	239.1	8.7		
15/04/2026			239.1	247.7	8.6		
16/04/2026			247.7	256	8.3		
17/04/2026			256	262.7	6.7		
18/04/2026			262.7	262.7	0		
19/04/2026			262.7	262.7	0		
20/04/2026			262.7	274	11.3		FINALIZAN ACTIVIDADES
SUBTOTAL MES					**103.2**	**0.0**	
TOTAL MES						**103.2**	


Firma	Ricardo Ortiz	**Firma**	Alejandro Castaneda M.
Nombre:	**RICARDO ORTIZ**	**Nombre:**	**ALEJANDRO CASTANEDA**
INSPECTOR UNION TEMPORAL PARQUE 2025			

UNIÓN TEMPORAL ICCU PARQUE 2025
NIT 902.017.719 -3

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025	CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA ALQUILADA						ICCU
OBJETO	"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".						
PERIODO:	ABRIL						
MUNICIPIO:	PACHO						
MAQUINA:	RETROEXCAVADORA					SERIE	JCB 6322
FECHA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO HOROMETRO INICIAL**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO HOROMETRO FINAL**	**HOROMETRO INICIAL**	**HOROMETRO FINAL**	**HORAS**	**STAND BY**	**OBSERVACIÓN**
1/04/2026			5377.7	5385.7	8		
2/04/2026	X	X	5385.7	5385.7	0		
3/04/2026	X	X	5385.7	5385.7	0		
4/04/2026	X	X	5385.7	5385.7	0		
5/04/2026	X	X	5385.7	5385.7	0		
6/04/2026			5385.7	5393	7.3		
7/04/2026			5393	5400	7		
8/04/2026			5400	5407.6	7.6		
9/04/2026			5407.6	5415.2	7.6		
10/04/2026			5415.2	5422.5	7.3		





UNIÓN TEMPORAL ICCU PARQUE 2025
NIT 902.017.719 -3



11/04/2026			5422.5	5422.5	0	5	DISPONIBLE
12/04/2026			5422.5	5422.5	0		
13/04/2026			5422.5	5430.7	8.2		
14/04/2026			5430.7	5437.5	6.8		
15/04/2026			5437.5	5437.7	0.2	4.8	
16/04/2026			5437	5445.5	8.5		
17/04/2026			5445.5	5455.2	9.7		
18/04/2026			5455.2	5455.2	0		
19/04/2026			5455.2	5455.2	0		
20/04/2026			5455.2	5460.3	5.1		

21/04/2026			5460. 3	5463. 8	3. 5		
22/04/2026			5463. 8	5470. 7	6. 9		
23/04/2026			5470. 7	5473. 1	2. 4		
24/04/2026			5473. 1	5479. 1	6		
25/04/2026			5479. 1	5486. 1	7		
26/04/2026			5486. 1	5486. 1	0		
27/04/2026			5486. 1	5494. 8	8. 7		
28/04/2026			5494. 8	5501. 9	7. 1		
29/04/2026			5501. 9	5509. 9	8		
30/04/2026			5509. 9	5517. 2	7. 3		
SUBTOTAL MES					**140. 2**	**9. 8**	
TOTAL MES						**150. 0**	

Firma		**Firma**	
Nombre:	**RICARDO ORTIZ**	**Nombre:**	**ALEJANDRO CASTAÑEDA**
I PECTOR UNION TEMPORAL PARQUE 2025		**INSPECTOR ICCU**	

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025	CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA ALQUILADA	ICCU
OBJETO	"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".	
PERIODO:	ABRIL	
MUNICIPIO:	PACHO	
MAQUINA:	RETROEXCAVADORA	SERIE: JCB3423035

FECHA	REGISTRO FOTOGRAFICO HOROMETRO INICIAL	REGISTRO FOTOGRAFICO HOROMETRO FINAL	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS	STAND BY	OBSERVACIÓN
1/04/2026			1657.2	1666	8.8		
2/04/2026	X	X	1666	1666	0		FESTIVO
3/04/2026	X	X	1666	1666	0		FESTIVO
4/04/2026	X	X	1666	1666	0		FESTIVO
5/04/2026	X	X	1666	1666	0		FESTIVO
6/04/2026			1666	1674.7	8.7		
7/04/2026			1674.7	1683.7	9		
8/04/2026			1683.7	1692	8.3		
9/04/2026			1692	1700.2	8.2		
10/04/2026			1700.2	1709.1	8.9		

11/04/2026			1709.1	1709.1	0		
12/04/2026			1709.1	1709.1	0		
13/04/2026			1709.1	1720.1	11		
14/04/2026			1720.1	1728.2	8.1		
15/04/2026			1728.2	1736.2	8		
16/04/2026			1736.2	1744.6	8.4		


UNIÓN TEMPORAL ICCU PARQUE 2025
NIT 902.017.719 -3

17/04/2026			1744.6	1750.9	6.3		
18/04/2026			1750.9	1750.9	0		
19/04/2026			1750.9	1750.9	0		
20/04/2026			1750.9	1760.2	9.3		FINALIZAN ACTIVIDADES
25/04/2026			1771.8	1783.5	11.7		EMERGENCIA
SUBTOTAL MES					**114.7**	**0.0**	
TOTAL MES						**114.7**	
Firma			**Firma**				
Nombre:	**RICARDO ORTIZ**		**Nombre:**		**ALEJANDRO CASTAÑEDA**		
INSPECTOR UNION TEMPORAL PARQUE 2025			**INSPECTOR ICCU**				



UNIÓN TEMPORAL ICCU PARQUE 2025
NIT 902.017.719 -3

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025	CONTROL D E TRABAJO DE MAQUINARIA ALQUILADA	ICCU

OBJETO	"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".
PERIODO:	ABRIL
MUNICIPIO:	PACHO
MAQUINA:	RETROEXCAVADORA DE ORUGA — SERIE: KOMATS U 45 2


FECHA	REGISTRO FOTOGRAFICO HOROMETRO INICIAL	REGISTRO FOTOGRAFICO HOROMETRO FINAL	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS	STAND BY	OBSERVACIÓN
1/04/2026			SIN HR	SIN HR	10		DAÑO EN EL HR
2/04/2026	X	X	SIN HR	SIN HR	0		FESTIVO
3/04/2026	X	X	SIN HR	SIN HR	0		FESTIVO
4/04/2026	X	X	SIN HR	SIN HR	0		FESTIVO
5/04/2026	X	X	SIN HR	SIN HR	0		FESTIVO
6/04/2026			SIN HR	SIN HR	8		DAÑO EN EL HR
7/04/2026			0	11	11		CAMBIO DE HR
8/04/2026			11	21	10		
9/04/2026			21	31	10		
10/04/2026							

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025

11/04/2026			41	49	8		
12/04/2026			49	49	0		
13/04/2026			49	59	10		
14/04/2026			59	69	10		
15/04/2026			69	77. 1	8. 1		
16/04/2026			77. 1	87	9. 9		
17/04/2026			87	94. 5	7. 5		
18/04/2026			94. 5	94. 5	0		
19/04/2026			94. 5	94. 5	0		
20/04/2026			94. 5	94. 5	8		

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025

UNIÓN TEMPORAL ICCU PARQUE 2025
NIT 902.017.719 -3

21/04/2026			94.5	94.5	6.5		DAÑO EN EL HR
22/04/2026			94.5	94.5	8		DAÑO EN EL HR
23/04/2026			94.5	98	3.5		DAÑO EN EL HR
24/04/2026			98	108	10		
25/04/2026			108	109	1		LLUVIAS
26/04/2026			109	109	0		
27/04/2026			109	117.5	8.5		RETIRO DE MAQUINA
SUBTOTAL MES					**158**	**0.0**	
TOTAL MES						**158.0**	

Firma	Ricardo Ortiz U.	**Firma**	Alejandro Castaneda M.
Nombre:	**RICARDO ORTIZ**	**Nombre:**	**ALEJANDRO CASTANEDA**
INSPECTOR UNION TEMPORAL PARQUE 2025		**INSPECTOR ICCU**	

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025

11. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Durante el mes de abril de 2026, el Frente Pacho desarrolló de manera continua actividades orientadas a la atención de emergencias viales, remoción de derrumbes, conformación de banca y mejoramiento de la infraestructura vial en diferentes, alcanzando un avance físico **general del 30%** frente a las metas establecidas para el periodo. Gracias a la articulación operativa de los equipos y al seguimiento permanente de las actividades ejecutadas, se consolidaron **184 horas efectivas de trabajo de maquinaria**, permitiendo intervenir aproximadamente **4.7 km de vía** y efectuar un **total de 486 viajes** de material producto de las labores de limpieza y conformación.

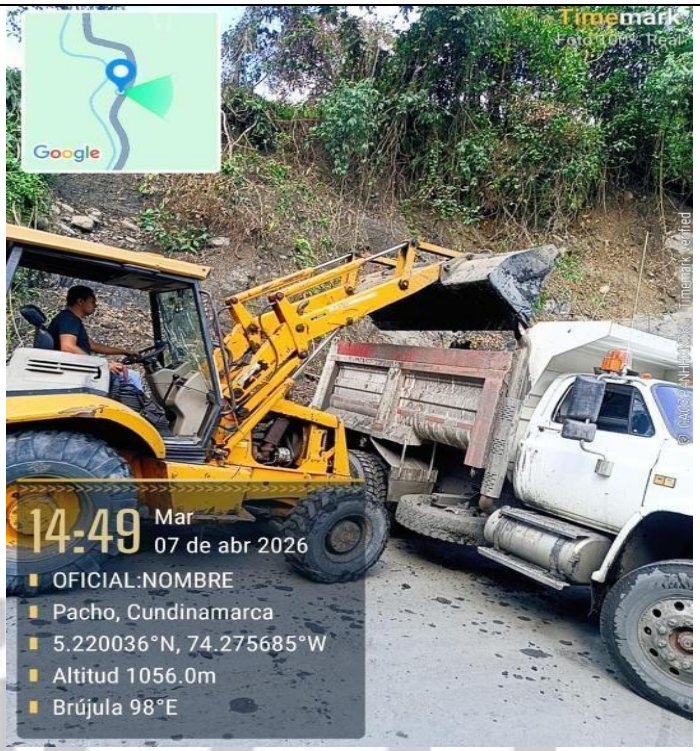
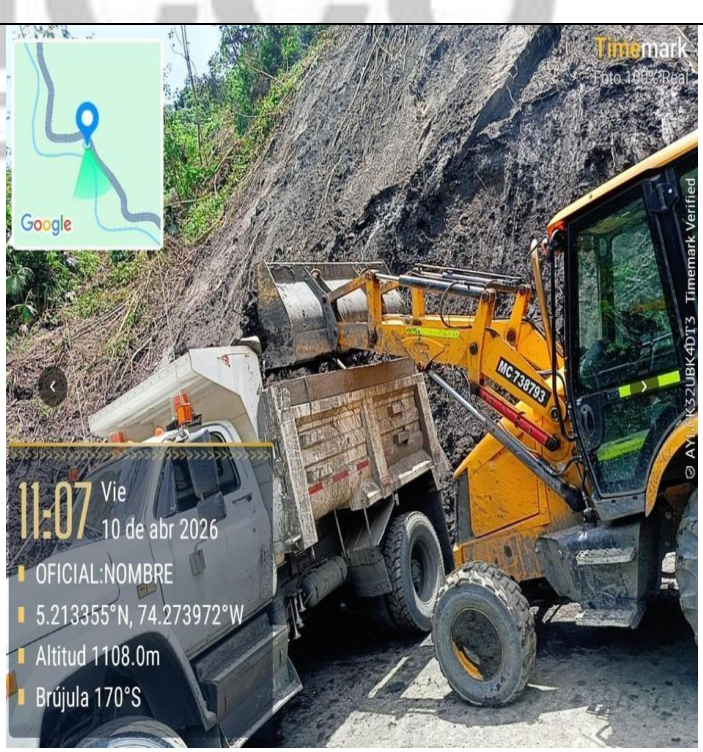
El desarrollo de las actividades estuvo condicionado por diferentes contingencias operativas y climáticas, entre las que se destacan la suspensión temporal de la motoniveladora Hyundai por fallas mecánicas en la varilla estabilizadora entre el 10 y el 28 de abril, la incapacidad temporal del operador de la excavadora de oruga propia, los ajustes técnicos efectuados al horómetro de la excavadora Komatsu y las afectaciones ocasionadas por las lluvias registradas al cierre del mes. Sin embargo, mediante una adecuada coordinación técnica y operativa, fue posible optimizar los recursos disponibles y reducir significativamente los tiempos de inoperancia, garantizando la continuidad de las intervenciones programadas.

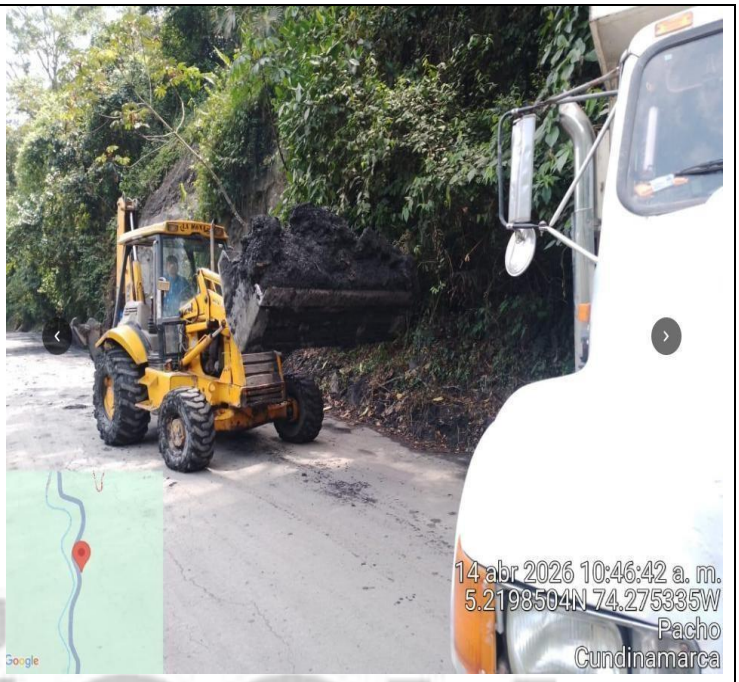
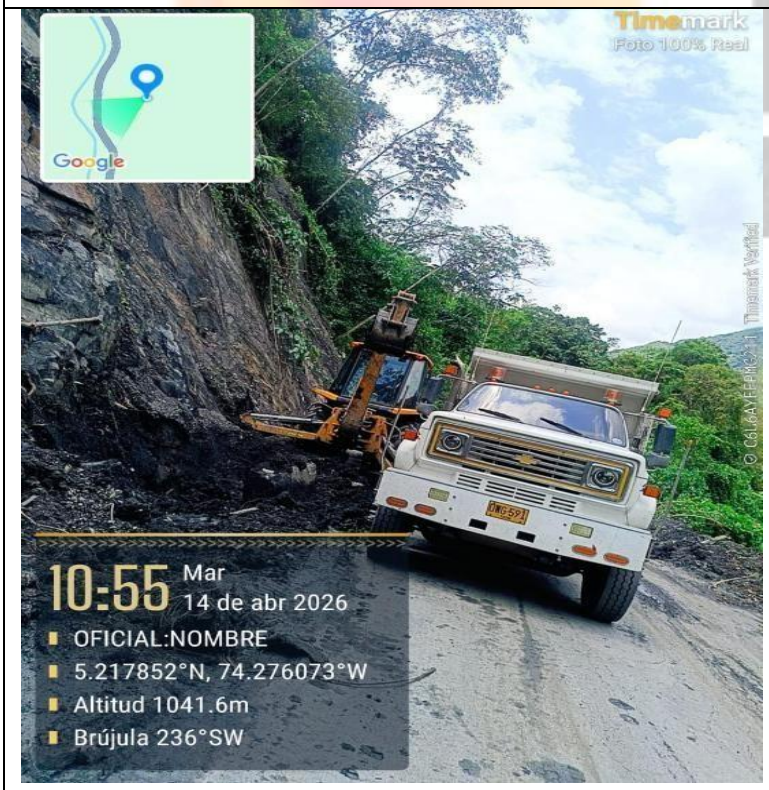
De igual manera, el ingreso de la excavadora LBX210QNHHX2526 representó un apoyo fundamental para fortalecer las labores de ampliación de botaderos, remoción de material y recuperación de la transitabilidad en sectores de alta afectación como Goteras, Guanacas y la vereda Las Brujas, contribuyendo de manera directa a mejorar las condiciones de movilidad y seguridad vial de las comunidades beneficiadas.

En conclusión, el Frente Pacho culmina el periodo con resultados operativos favorables, manteniendo la capacidad de respuesta frente a las emergencias presentadas y optimizando el rendimiento de la maquinaria propia y alquilada. Lo anterior permitió garantizar la atención oportuna de los corredores priorizados y avanzar satisfactoriamente en el cumplimiento de los objetivos establecidos.

12. REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
NIVELACION DE VIA	**REMOCION DE DERRUMBES**
	
CARGUE DE MATERIAL	**NIVELACION DE VIA**

	
COMPACTACION DE VIA	**CARGUE DE MATERIAL**
	
REMOCION DE DERRUMBES	**CARGUE DE MATERIAL**

	
REMOCION DE DERRUMBES	**CARGUE DE MATERIAL**
	
REMOCION DE DERRUMBES	**CARGUE DE MATERIAL**

UNIÓN TEMPORAL ICCU PARQUE 2025
NIT 902.017.719 -3

	
CARGUE DE MATERIAL	**ABRIENDO VIA**
	
REMOCION DE DERRUMBES	**CARGUE DE MATERIAL**

CLL 13 # 47 – 12 BOGOTA – CUNDINAMARCA D.C TEL 313 258 3561
EMAIL: COORDINACION.ICCU.2026@GM AIL.COM

	
COMPACTACION DE VIA	**COMPACTACION DE VIA**
	
CARGUE DE MATERIAL	**LIMPIEZA DE VIA**

UNIÓN TEMPORAL ICCU PARQUE 2025
NIT 902.017.719 -3

	
REMOCION DE DERRUMBES	**CARGUE DE MATERIAL**
	
LIMPIEZA DE VIA	**CARGUE DE MATERIAL**

Alejandro Castañeda M.

ALEJANDRO CASTAÑEDA
INSPECTOR ICCU

Ricardo Ortiz V.

Ricardo Ortiz Vasquez
INSPECTOR UT ICCU PARQUE 2025

CONTRATO ICCU-CTO 1595 DE 2025

INFORME DE AVANCE N°3
PERIODO: ABRIL DEL 2026

PROVINCIA: RIO NEGRO
MUNICIPIO: PAIME

Gobernación de Cundinamarca

ICCU
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

CLL 13 # 47 – 12 BOGOTA – CUNDINAMARCA D.C TEL 313 258 3561
EMAIL: COORDINACION.ICCU.2026@GMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES – PROVINCIA RIO NEGRO
MUNICIPIO DE PAIME

OBJETO: "ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOSPARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

1. LOCALIZACIÓN

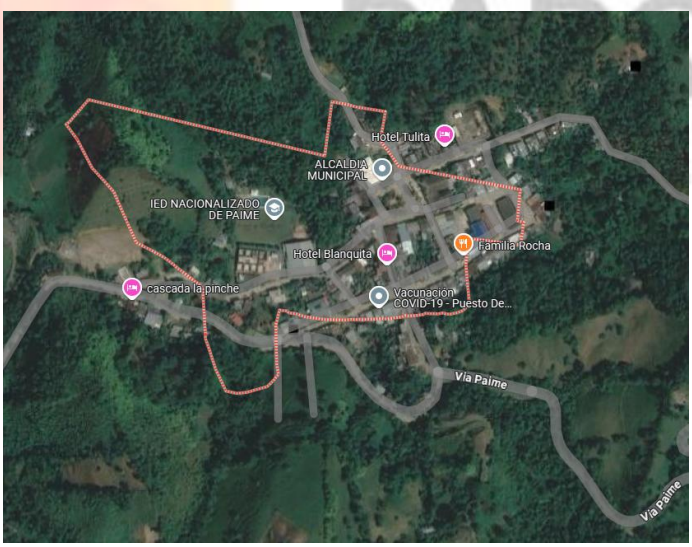
Provincia RIO NEGRO:

PAIME:

1. Retrocargador CAT0441
2. Motoniveladora BAUKEMA 083750

Ubicación:

PAIME - Venecia - 4 caminos - Trinidad - La piedra – Tudela – Ginebra -Tauche.
5°22′14″N 74°09′06



Fuente: Google earth

2. GRUPO DE TRABAJO

CARGO	NOMBRE
INSPECTOR DE OBRA UT	RICARDO ORTIZ
INSPECTOR DE OBRA ICCU	NICOLAS OCHOA
RETROCARGADOR CAT0441	EDWIN ACERO
MOTONIVELADORA BAUKEMA 083750	MAICOL ARENAS

3. PLAN DE TRABAJO

Se buscar realizar el mantenimiento y rehabilitación de diferentes tramos viales en el municipio (casco urbano y rural, con el fin de optimizar los diferentes puntos de tramos viales a intervenir. Se realiza trabajos cargue y transporte de material.

AVANCE 25%

Alcaldía Municipal de Paime Cundinamarca

CRONOGRAMA MAQUINARIA ICCU

MAQUINAS	% EJECUTADO	SEMANA											
	INCIO 05 DE MARZO	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12
RETROCARGADOR	25%	VENECIA	4 CAMINOS	TRINIDAD	LA PIEDRA	LA PIEDRA	TULEDA	TAUCHE	GINEBRA	SANTUARIO	SANTUARIO	SANTUARIO	SANTUARIO
MOTONIVELADORA	20%	N/A	4 CAMINOS	TRINIDAD	LA PIEDRA	LA PIEDRA	TULEDA	TAUCHE	GINEBRA	SANTUARIO	SANTUARIO	SANTUARIO	SANTUARIO

Fuente: Alcaldía de Paime

4. CRONOGRAMA EJECUTADO

01/04/2026	Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Paime, provincia de Rionegro. Vereda/Sector: Venecia - 4 caminos - Trinidad - La piedra. Condición climática: Lluvias. Actividad: Conformación de vía en la vereda Tudela. Equipos disponibles. Avance (km): 1.0. RETROEXCAVADORA - CAT - Alquiler - 04441 (OPERATIVA). Propiedad: Alquiler. H. inicial – H. final: 10016.6 -. MOTONIVELADORA - BAUKEMA - Alquiler - 083750 (OPERATIVA). Propiedad: Alquiler. H. inicial – H. final: 759.4 - 767.9. Fin del reporte.
06/04/2026	Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Paime, provincia de Rionegro. Vereda/Sector: Venecia - 4 caminos - Trinidad - La piedra - Tudela. Condición climática: Lluvias. Actividad: Conformación de vía en la vereda Tudela. Avance (km): 1.0. RETROEXCAVADORA - CAT - Alquiler - 04441 (OPERATIVA). Propiedad: Alquiler. H. inicial – H. final: 10032.8 - 10039.3. MOTONIVELADORA - BAUKEMA - Alquiler - 083750 (OPERATIVA). Propiedad: Alquiler. H. inicial – H. final: 767.9 - 775.9. Fin del reporte.
07/04/2026	Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Paime, provincia de Rionegro. Vereda/Sector: Venecia - 4 caminos - Trinidad - La piedra - Tudela. Condición climática: Lluvias. Actividad: Conformación de vía Guaquimay y Tauche. Avance (km): 1.0. RETROEXCAVADORA - CAT - Alquiler - 04441 (OPERATIVA). Propiedad: Alquiler. H. inicial – H. final: 10039.3 - 10044.9. MOTONIVELADORA - BAUKEMA - Alquiler - 083750 (OPERATIVA). Propiedad: Alquiler. H. inicial – H. final: 775.9 - 785.3. Fin del reporte.
08/04/2026	Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Paime, provincia de Rionegro. Vereda/Sector: Venecia - 4 caminos - Trinidad - La piedra - Tudela. Condición climática: Lluvias. Actividad: Conformación de vía Guaquimay y Tauche. Avance (km): 1.0. RETROEXCAVADORA - CAT - Alquiler - 04441 (OPERATIVA). Propiedad: Alquiler. H. inicial – H. final: 10044.9 - 10050.7. MOTONIVELADORA - BAUKEMA - Alquiler - 083750 (OPERATIVA). Propiedad: Alquiler. H. inicial – H. final: 785.3 - 794.1. Fin del reporte.
09/04/2026	Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Paime, provincia de Rionegro. Vereda/Sector: Venecia - 4 caminos - Trinidad - La piedra - Tudela. Condición climática: Lluvias. Actividad: Conformación de vía Guaquimay y Tauche. Avance (km): 1.0. RETROEXCAVADORA - CAT - Alquiler - 04441 (OPERATIVA). Propiedad: Alquiler. H. inicial – H. final: 10050.7 - 10061.4. MOTONIVELADORA - BAUKEMA - Alquiler - 083750 (OPERATIVA). Propiedad: Alquiler. H. inicial – H. final: 794.1 - 803.6. Fin del reporte.
10/04/2026	Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Paime, provincia de Rionegro. Vereda/Sector: Venecia - 4 caminos - Trinidad - La piedra - Tudela. Condición climática: Lluvias. Actividad: Conformación de vía Guaquimay y Tauche. Motoniveladora disponible. Avance (km): 0.0. RETROEXCAVADORA - CAT - Alquiler - 04441 (OPERATIVA). Propiedad: Alquiler. H. inicial – H. final: 10061.4 - 10067.0. MOTONIVELADORA - BAUKEMA - Alquiler - 083750 (OPERATIVA). Propiedad: Alquiler. H. inicial – H. final: 803.6. Fin del reporte.
11/04/2026	Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Paime, provincia de Rionegro. Vereda/Sector: Venecia - 4 caminos - Trinidad - La piedra - Tudela. Condición climática: Lluvias. Actividad: Conformación de vía Guaquimay y Tauche. Demas equipos sin actividad, Sábado. Avance (km): 0.0. RETROEXCAVADORA - CAT - Alquiler - 04441 (OPERATIVA).

	Propiedad: Alquiler. H. inicial – H. final: 10067.0 - 10075.6. MOTONIVELADORA - BAUKEMA - Alquiler - 083750 (OPERATIVA). Propiedad: Alquiler. H. inicial – H. final: 803.6. Fin del reporte.
13/04/2026	Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Paime, provincia de Rionegro. Vereda/Sector: Venecia - 4 caminos - Trinidad - La piedra - Tudela. Condición climática: Lluvias. Actividad: Conformación de vía Guaquimay y Tauche, pero sin actividad por mal estado de las vias. Demas equipos disponibles. Avance (km): 0.0. RETROEXCAVADORA - CAT - Alquiler - 04441 (OPERATIVA). Propiedad: Alquiler. H. inicial – H. final: 10075.6. MOTONIVELADORA - BAUKEMA - Alquiler - 083750 (OPERATIVA). Propiedad: Alquiler. H. inicial – H. final: 803.6. Fin del reporte.
14/04/2026	Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Paime, provincia de Rionegro. Vereda/Sector: Venecia - 4 caminos - Trinidad - La piedra - Tudela. Condición climática: Lluvias. Actividad: Conformación de vía Guaquimay y Tauche, Sin actividad por lluvias. Se aprovecha para intervenir equipos alquilados. Avance (km): 0.0. RETROEXCAVADORA - CAT - Alquiler - 04441 (OPERATIVA). Propiedad: Alquiler. H. inicial – H. final: 10075.6 - 10088.0. MOTONIVELADORA - BAUKEMA - Alquiler - 083750 (OPERATIVA). Propiedad: Alquiler. H. inicial – H. final: 803.6. Fin del reporte.
15/04/2026	Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Paime, provincia de Rionegro. Vereda/Sector: Venecia - 4 caminos - Trinidad - La piedra - Tudela. Condición climática: Lluvias. Actividad: Conformación de vía Guaquimay y Tauche, se paran actividades por mal estado del terreno y fuertes lluvia. Avance (km): 0.15. RETROEXCAVADORA - CAT - Alquiler - 04441 (OPERATIVA). Propiedad: Alquiler. H. inicial – H. final: 10088.0 - 10091.7. MOTONIVELADORA - BAUKEMA - Alquiler - 083750 (OPERATIVA). Propiedad: Alquiler. H. inicial – H. final: 803.6 - 807.6. Fin del reporte.
16/04/2026	Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Paime, provincia de Rionegro. Vereda/Sector: Venecia - 4 caminos - Trinidad - La piedra - Tudela. Condición climática: Lluvias. Actividad: Conformación de vía Guaquimay y Tauche. Avance (km): 0.5. RETROEXCAVADORA - CAT - Alquiler - 04441 (OPERATIVA). Propiedad: Alquiler. H. inicial – H. final: 10091.7 - 10096.0. MOTONIVELADORA - BAUKEMA - Alquiler - 083750 (OPERATIVA). Propiedad: Alquiler. H. inicial – H. final: 807.6 - 814.3. Fin del reporte.
17/04/2026	Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Paime, provincia de Rionegro. Vereda/Sector: Venecia - 4 caminos - Trinidad - La piedra - Tudela. Condición climática: Soleado. Actividad: Conformación de vía Guaquimay y Tauche. Avance (km): 0.6. RETROEXCAVADORA - CAT - Alquiler - 04441 (OPERATIVA). Propiedad: Alquiler. H. inicial – H. final: 10096.0 - 10101.3. MOTONIVELADORA - BAUKEMA - Alquiler - 083750 (OPERATIVA). Propiedad: Alquiler. H. inicial – H. final: 814.3 - 821.0. Fin del reporte.
18/04/2026	Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Paime, provincia de Rionegro. Vereda/Sector: Venecia - 4 caminos - Trinidad - La piedra - Tudela. Condición climática: Soleado. Actividad: Conformación de vía Tauche. Avance (km): 0.4. RETROEXCAVADORA - CAT - Alquiler - 04441 (OPERATIVA). Propiedad: Alquiler. H. inicial – H. final: 10101.3 - 10111.1. MOTONIVELADORA - BAUKEMA - Alquiler - 083750 (OPERATIVA). Propiedad: Alquiler. H. inicial – H. final: 821.0 - 830.1. Fin del reporte.

20/04/2026	Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Paime, provincia de Rionegro. Vereda/Sector: Venecia - 4 caminos - Trinidad - La piedra - Tudela. Condición climática: Soleado. Actividad: Conformación de vía Tudela - Ginebra. Avance (km): 0.4. RETROEXCAVADORA - CAT - Alquiler - 04441 (OPERATIVA). Propiedad: Alquiler. H. inicial – H. final: 10111.1 - 10119.8. MOTONIVELADORA - BAUKEMA - Alquiler - 083750 (OPERATIVA). Propiedad: Alquiler. H. inicial – H. final: 830.1 - 838.1. Fin del reporte.
21/04/2026	Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Paime, provincia de Rionegro. Vereda/Sector: Venecia - 4 caminos - Trinidad - La piedra - Tudela. Condición climática: Soleado. Actividad: Conformación de vía Tudela - Ginebra. Avance (km): 0.7. RETROEXCAVADORA - CAT - Alquiler - 04441 (OPERATIVA). Propiedad: Alquiler. H. inicial – H. final: 10119.8 - 10129.7. MOTONIVELADORA - BAUKEMA - Alquiler - 083750 (OPERATIVA). Propiedad: Alquiler. H. inicial – H. final: 838.1 - 847.1. Fin del reporte.
22/04/2026	Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Paime, provincia de Rionegro. Vereda/Sector: Venecia - 4 caminos - Trinidad - La piedra - Tudela. Condición climática: Soleado. Actividad: Conformación de vía Tudela - Ginebra. Avance (km): 0.8. RETROEXCAVADORA - CAT - Alquiler - 04441 (OPERATIVA). Propiedad: Alquiler. H. inicial – H. final: 10129.7 - 10137.5. MOTONIVELADORA - BAUKEMA - Alquiler - 083750 (OPERATIVA). Propiedad: Alquiler. H. inicial – H. final: 847.1 - 855.1. Fin del reporte.
23/04/2026	Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Paime, provincia de Rionegro. Vereda/Sector: Venecia - 4 caminos - Trinidad - La piedra - Tudela. Condición climática: Soleado. Actividad: Conformación de vía Tudela - Ginebra. Avance (km): 0.8. RETROEXCAVADORA - CAT - Alquiler - 04441 (OPERATIVA). Propiedad: Alquiler. H. inicial – H. final: 10137.5 - 10147.0. MOTONIVELADORA - BAUKEMA - Alquiler - 083750 (OPERATIVA). Propiedad: Alquiler. H. inicial – H. final: 855.1 - 863.9. Fin del reporte.
24/04/2026	Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Paime, provincia de Rionegro. Vereda/Sector: Venecia - 4 caminos - Trinidad - La piedra - Tudela. Condición climática: Soleado. Actividad: Conformación de vía Tudela - Ginebra. Avance (km): 0.5. RETROEXCAVADORA - CAT - Alquiler - 04441 (OPERATIVA). Propiedad: Alquiler. H. inicial – H. final: 10147.0 - 10155.1. MOTONIVELADORA - BAUKEMA - Alquiler - 083750 (OPERATIVA). Propiedad: Alquiler. H. inicial – H. final: 863.9 - 871.0. Fin del reporte.
25/04/2026	Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Paime, provincia de Rionegro. Vereda/Sector: Venecia - 4 caminos - Trinidad - La piedra - Tudela. Condición climática: Soleado. Actividad: Remoción de derrumbes vía guaquimay. Demas equipos disponibles. Avance (km): 0.0. RETROEXCAVADORA - CAT - Alquiler - 04441 (OPERATIVA). Propiedad: Alquiler. H. inicial – H. final: 10155.1 - 10160.4. MOTONIVELADORA - BAUKEMA - Alquiler - 083750 (OPERATIVA). Propiedad: Alquiler. H. inicial – H. final: 871.0. Fin del reporte.
27/04/2026	Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Paime, provincia de Rionegro. Vereda/Sector: Venecia - 4 caminos - Trinidad - La piedra - Tudela. Condición climática: Soleado. Actividad: Conformación de vía Tudela - Ginebra. Avance (km): 0.3. RETROEXCAVADORA - CAT - Alquiler - 04441 (OPERATIVA). Propiedad: Alquiler. H. inicial – H. final: 10160.4 - 10167.7. MOTONIVELADORA - BAUKEMA - Alquiler - 083750 (OPERATIVA). Propiedad: Alquiler. H. inicial – H. final: 871.0 - 875.6. Fin del reporte.

28/04/2026	Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Paime, provincia de Rionegro. Vereda/Sector: Venecia - 4 caminos - Trinidad - La piedra - Tudela. Condición climática: Soleado. Actividad: Conformación de vía Tudela - Ginebra. Sale motoniveladora, ala espera de cambio. Avance (km): 0.3. RETROEXCAVADORA - CAT - Alquiler - 04441 (OPERATIVA). Propiedad: Alquiler. H. inicial – H. final: 10167.7 - 10175.9. MOTONIVELADORA - BAUKEMA - Alquiler - 083750 (OPERATIVA). Propiedad: Alquiler. H. inicial – H. final: 875.6 - 886.1. Fin del reporte.
29/04/2026	Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Paime, provincia de Rionegro. Vereda/Sector: Venecia - 4 caminos - Trinidad - La piedra - Tudela. Condición climática: Soleado. Actividad: Conformación de vía Guaquimay. Sale motoniveladora, ala espera de cambio. Avance (km): 0.0. RETROEXCAVADORA - CAT - Alquiler - 04441 (OPERATIVA). Propiedad: Alquiler. H. inicial – H. final: 10175.9 - 10185.3. MOTONIVELADORA - BAUKEMA - Alquiler - 083750 (OPERATIVA). Propiedad: Alquiler. H. inicial – H. final: 886.1. Fin del reporte.
30/04/2026	Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Paime, provincia de Rionegro. Vereda/Sector: Venecia - 4 caminos - Trinidad - La piedra - Tudela - Ginebra. Condición climática: Soleado. Actividad: Conformación de vía en la vereda Ginebra. Avance (km): 0.0. RETROEXCAVADORA - CAT - Alquiler - 04441 (OPERATIVA). Propiedad: Alquiler. H. inicial – H. final: 10185.3 - 10195.4. MOTONIVELADORA - BAUKEMA - Alquiler - 083750 (OPERATIVA). Propiedad: Alquiler. H. inicial – H. final: 886.1. Fin del reporte.

5. RELACIÓN DE TRANSPORTE Y REMISIÓN DE MATERIALES

RELACIÓN DE TRANSPORTE Y REMISIÓN DE MATERIALES			
FECHA	**MATERIAL**	**N° DE VIAJES**	**DESCRIPCIÓN**
N/A	**N/A**	**N/A**	**N/A**

6. AVANCE EN CAMPO (KM)

AVANCE DE OBRA PAIME				
FECHA	LONGITUD (KM)	AVANCE (KM)	REPETICIÓN (KM)	DESCRIPCIÓN
1/04/2026	1	1		SOLEADO
2/04/2026	0	1		FESTIVO
3/04/2026	0	1		FESTIVO
4/04/2026	0	1		FESTIVO
5/04/2026	0	1		FESTIVO
6/04/2026	1	2		SOLEADO
7/04/2026	1	3		SOLEADO
8/04/2026	1	4		SOLEADO
9/04/2026	1	5		SOLEADO
10/04/2026	0	5		LLUVIAS
11/04/2026	DOMINGO			
12/04/2026	0	5		LLUVIAS
13/04/2026	0	5		LLUVIAS
14/04/2026	0	5		LLUVIAS
15/04/2026	0.15	5.15		SOLEADO
16/04/2026	0.5	5.65		SOLEADO
17/04/2026	0.6	6.25		SOLEADO
18/04/2026	0.4	6.65		SOLEADO
19/04/2026	DOMINGO			
20/04/2026	0.4	7.05		SOLEADO
21/04/2026	0.7	7.75		SOLEADO
22/04/2026	0.8	8.55		SOLEADO
23/04/2026	0.8	9.35		SOLEADO
24/04/2026	0.5	9.85		SOLEADO
25/04/2026	0.1	9.95		SOLEADO
26/04/2026	DOMINGO			
27/04/2026	0.3	10.25		SOLEADO
28/04/2026	0.6	10.85		CAMBIO DE MAQUINA
29/04/2026	-	-		
30/04/2026	-	-		
TOTAL	10.85	10.85		

7. RESUMEN DE HORAS DE LLUVIA, INOPERATIVIDAD Y EFECTIVAS LABORALES

RESUMEN DE HORAS DE LLUVIA, INOPERATIVIDAD Y EFECTIVAS LABORALES				
FECHA	HORAS DE LLUVIA	HORAS DE INOPERATIVIDAD	HORAS EFECTIVAS	DESCRIPCIÓN
1/04/2026	0	0	8	SOLEADO
2/04/2026	0	0	0	FESTIVO
3/04/2026	0	0	0	FESTIVO
4/04/2026	0	0	0	FESTIVO
5/04/2026	0	0	0	FESTIVO
6/04/2026	0	0	8	SOLEADO
7/04/2026	0	0	8	SOLEADO
8/04/2026	0	0	8	SOLEADO
9/04/2026	0	0	8	SOLEADO
10/04/2026	0	0	8	SOLEADO
11/04/2026	DOMINGO			
12/04/2026	8	0	0	LLUVIAS
13/04/2026	8	0	0	LLUVIAS
14/04/2026	0	0	8	SOLEADO
15/04/2026	0	0	8	SOLEADO
16/04/2026	0	0	8	SOLEADO
17/04/2026	0	0	8	SOLEADO
18/04/2026	0	0	8	SOLEADO
19/04/2026	DOMINGO			
20/04/2026	0	0	8	SOLEADO
21/04/2026	0	0	8	SOLEADO
22/04/2026	0	0	8	SOLEADO
23/04/2026	0	0	8	SOLEADO
24/04/2026	0	0	8	SOLEADO
25/04/2026	0	0	8	SOLEADO
26/04/2026	DOMINGO			
27/04/2026	0	0	8	SOLEADO
28/04/2026	0	0	8	SOLEADO
29/04/2026	0	0	8	SOLEADO
30/04/2026	0	0	8	SOLEADO
TOTAL	16	0	168	

8. MOVILIZACIONES

No se realizaron movilizaciones en este mes.




9. MANTENIMIENTOS

No se realizaron mantenimientos en este mes.

UNION TEMPORAL
ICCU
PARQUE
2025

UNIÓN TEMPORAL ICCU PARQUE 2025
NIT 902.017.719 -3

10. CONTROL DE TRABAJO MAQUINARIA



















UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025	CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA ALQUILADA						ICCU
OBJETO	"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".						
PERIODO:	ABRIL						
MUNICIPIO:	PAIME						
MAQUINA:	RETROCARGADOR					SERIE	CAT0441
FECHA	REGISTRO FOTOGRÁFICO HORÓMETRO INICIAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO HORÓMETRO FINAL	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS	STAND BY	OBSERVACIÓN
1/04/2026			10022.9	10032.8	9.9		
2/04/2026	X	X	10032.8	10032.8	0		FESTIVO
3/04/2026	X	X	10032.8	10032.8	0		FESTIVO
4/04/2026	X	X	10032.8	10032.8	0		FESTIVO
5/04/2026	X	X	10032.8	10032.8	0		FESTIVO
6/04/2026			10032.8	10039.3	6.5		
7/04/2026			10039.3	10044.9	5.6		
8/04/2026			10044.9	10050.7	5.8		
9/04/2026			10050.7	10061.4	10.7		
10/04/2026			10061.4	10067	5.6		
11/04/2026			10067	10075.6	8.6		
12/04/2026			10075.6	10075.6	0		
13/04/2026			10075.6	10075.6	0		
14/04/2026			10075.6	10088	12.4		
15/04/2026			10088	10091.7	3.7		
16/04/2026			10091.7	10096	4.3		
17/04/2026			10096	10101.3	5.3		
18/04/2026			10101.3	10111.1	9.8		
19/04/2026			10111.1	10111.1	0		
20/04/2026			10111.1	10119.8	8.7		
21/04/2026			10119.8	10129.7	9.9		
22/04/2026			10129.7	10137.5	7.8		
23/04/2026			10137.5	10147	9.5		
24/04/2026			10147	10155.1	8.1		
25/04/2026			10155.1	10160.4	5.3		
26/04/2026			10160.4	10160.4	0		
27/04/2026			10160.4	10167.7	7.3		
28/04/2026			10167.7	10175.9	8.2		
29/04/2026			10175.9	10185.3	9.4		
30/04/2026			10185.3	10195.4	10.1		
					172.5	0	
TOTAL MES					172.5		
Firma			Firma				
Nombre:	RICRADO ORTIZ		Nombre:		NICOLAS OCHOA		
INSPECTOR UNION TEMPORAL PARQUE 2025			INSPECTOR ICCU				

– CUNDINAMARCA D.C TEL 313 258 3561
IACION.ICCU.2026@GMAIL.COM

UNIÓN TEMPORAL ICCU PARQUE 2025
NIT 902.017.719 -3

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025	CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA ALQUILADA	ICCU

OBJETO	"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".
PERIODO:	ABRIL
MUNICIPIO:	PAIME
MAQUINA:	MOTONIVELADORA — SERIE: BAUKEMA 083750

FECHA	REGISTRO FOTOGRÁFICO HORÓMETRO INICIAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO HORÓMETRO FINAL	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS	STAND BY	OBSERVACIÓN
1/04/2026			759.4	767.9	8.5		
2/04/2026	X	X	767.9	767.9	0		FESTIVO
3/04/2026	X	X	767.9	767.9	0		FESTIVO
4/04/2026	X	X	767.9	767.9	0		FESTIVO
5/04/2026	X	X	767.9	767.9	0		FESTIVO
6/04/2026			767.9	775.9	8		
7/04/2026			775.9	785.3	9.4		
8/04/2026			785.3	794.1	8.8		
9/04/2026			794.1	803.6	9.5		
10/04/2026			803.6	803.6	0	5	LLUVIAS
11/04/2026	X	X	803.6	803.6	0		
12/04/2026	X	X	803.6	803.6	0		
13/04/2026			803.6	803.6	0	5	LLUVIAS
14/04/2026			803.6	805.3	1.7	3.3	LLUVIAS
15/04/2026			805.3	807.6	2.3	2.7	
16/04/2026			807.6	814.3	6.7		
17/04/2026			814.3	821	6.7		
18/04/2026			821	830.1	9.1		
19/04/2026			830.1	830.1	0		
20/04/2026			830.1	838.1	8		
21/04/2026			838.1	847.1	9		
22/04/2026			847.1	855.1	8		
23/04/2026			855.1	863.9	8.8		
24/04/2026			863.9	871	7.1		
25/04/2026			871	871.3	0.3	4.7	LLUVIAS
26/04/2026			871.3	871.3	0		
27/04/2026			871.3	875.6	4.3	0.7	
28/04/2026			875.6	886.1	10.5		CAMBIO DE MAQUINA
29/04/2026	X	X	X	X			
30/04/2026	X	X	X	X			
SUBTOTAL MES					126.7	21.4	
TOTAL MES					148.1		

Firma		Firma	
Nombre:	RICARDO ORTIZ	Nombre:	NICOLAS OCHOA
INSPECTOR UNION TEMPORAL PARQUE 2025		INSPECTOR ICCU	

CLL 18 # 47 -12 BOGOTA – CUNDINAMARCA D.C TEL 318 258 3561
EMAIL: COORDINACION.ICCU.2026@GMAIL.COM

11. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de abril de 2026, se ejecutaron actividades de mantenimiento, apertura y conformación de vías en los sectores de **Cuatro Caminos, La Piedra, Tudela, Tauche y Ginebra.** Como resultado, se alcanzó un avance físico total de **10,85 km.**

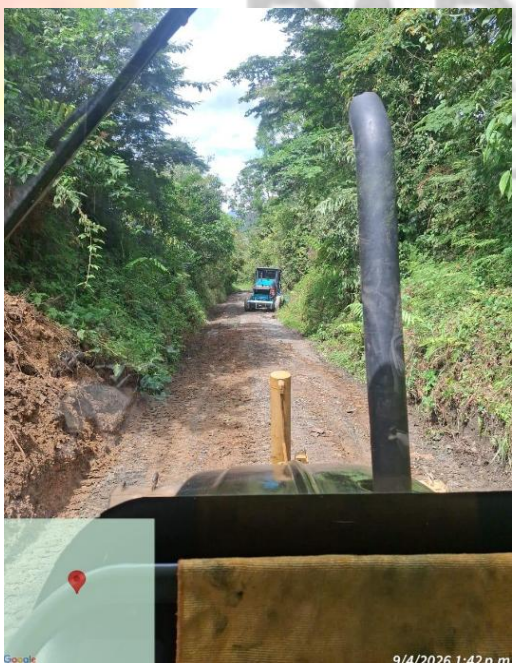
La ejecución de las actividades se desarrolló bajo condiciones climáticas variables, las cuales afectaron la continuidad operativa en diferentes momentos del mes. El mayor rendimiento se presentó durante las primeras semanas, alcanzando avances de hasta **1 km diarios**, posteriormente, en la penúltima semana, el ritmo disminuyó a promedios cercanos a **0,7 km diarios** debido a la intensificación de las lluvias.

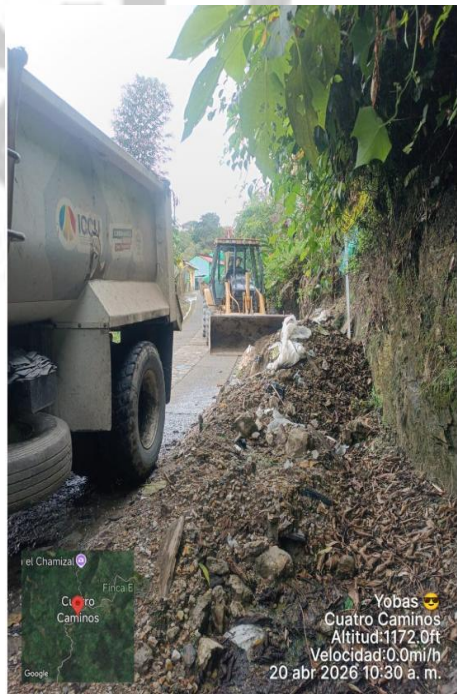
La presencia constante de precipitaciones limitó significativamente la operación de la maquinaria, lo que obligó a priorizar labores de atención de emergencias, especialmente la remoción de derrumbes mediante el uso de retroexcavadora, manteniendo los equipos en disponibilidad operativa.

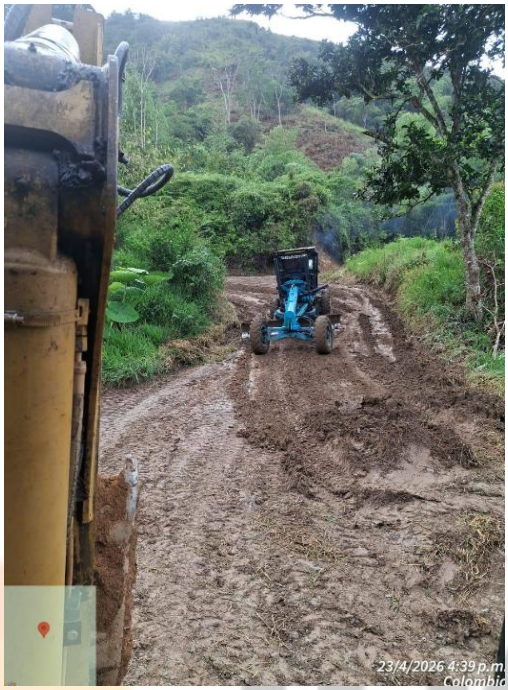
Las principales actividades ejecutadas incluyeron cargue de material, remoción de derrumbes y conformación de calzada. A pesar de las condiciones adversas, se logró cumplir con la intervención en sectores críticos como las **veredas Trinidad, Tauche y Ginebra.**

El frente de trabajo finaliza el mes con la maquinaria operativa y disponible, a la espera de condiciones climáticas favorables que permitan retomar el ritmo de ejecución en los sectores pendientes definidos por la administración municipal. Se registra un **avance acumulado del 25%** y un total de **168 horas efectivas** de operación.

12. REGISTRO FOTOGRÁFICO

		
Conformación de Vía	**Limpieza de vía**	**Conformación de Vía**
		
Equipos Disponibles	**Nivelación de Vía**	**Mejoramiento de vía**

		
Remoción de derrumbes	**Conformación de Vía**	**Cargue de Material**
		
Remoción de derrumbes	**Conformación de Vía**	**Limpieza de Vía**

		
Limpieza de Vía	**Conformación de Vía**	**Remoción de derrumbes**

NICOLAS OCHOA
INSPECTOR ICCU

RICARDO ORTIZ
INSPECTOR UT ICCU PARQUE 2025

UNIÓN TEMPORAL ICCU PARQUE 2025
NIT 902.017.719 -3

CONTRATO ICCU-CTO 1595 DE 2025

INFORME DE AVANCE N°3
PERIODO: ABRIL DEL 2026

PROVINCIA: RIO NEGRO
MUNICIPIO: SAN CAYETANO

Gobernación de Cundinamarca

ICCU
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

CLL 13 # 47 – 12 BOGOTA – CUNDINAMARCA D.C TEL 313 258 3561
EMAIL: COORDINACION.ICCU.2026@GMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES – PROVINCIA RIO NEGRO
MUNICIPIO DE SAN CAYETANO

OBJETO: "ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

1. LOCALIZACIÓN

Provincia Rio Negro:

San Cayetano:

1. MOTONIVELADORA ICCU HYUNDAI HG170 LCL717H0HM2000341
2. RETROEXCAVADORA ICCU CATERPILLAR 416E CAT0416EEMFG08159
3. VIBROCOMPACTADOR PRIVADO INGERSOLL 176497
4. VOLQUETA PRIVADA REE 655

Ubicación:

San Cayetano – Las Mercedes – Camancha.

Imagen 1 Zona de trabajo – Coordenadas (5.300221012973543, -74.00367478939606)



Fuente: Google earth

2. GRUPO DE TRABAJO

CARGO	NOMBRE	PERIODO
INSPECTOR DE OBRA UT	Edgar A Zambrano C	1 – 30 ABRIL
INSPECTOR DE OBRA ICCU	Camilo Delgado	1 – 30 ABRIL
MOTONIVELADORA ICCU HYUNDAI 0341	Jackson Reyes	1 – 30 ABRIL
RETROEXCAVADORA ICCU CATERPILLAR 8159	Pedro Beltrán	1 – 06 ABRIL
VIBROCOMPACTADOR PRIVADO INGERSOLL 176497	William Baracaldo	1 – 30 ABRIL
VOLQUETA PRIVADA REE 655	Juan Contreras Peña	1 – 30 ABRIL

3. PLAN DE TRABAJO

VEREDA	SECTOR	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
VEREDA MORTIÑO	SECTOR LOS PINOS - LA PAVIMENTADA	ACTIVIDADES DE LIMPEZA, CUNETAS Y CONFORMADO.
VEREDA BOCA DE MONTE	LA PAVIMENTADA - CASCO URBANO	ACTIVIDADES DE LIMPEZA, CUNETAS Y CONFORMADO.
VEREDA GUAMAL	LA PAVIMENTADA - CASCO URBANO	ACTIVIDADES DE LIMPEZA, CUNETAS Y CONFORMADO.
VEREDA BOCA DE MONTE	LA ESCUELA - LA ESPERANZA	ACTIVIDADES DE LIMPEZA, CUNETAS Y CONFORMADO.
VEREDA QUEBRADAS	LA ESCUELA - LA ESPERANZA	ACTIVIDADES DE LIMPEZA, CUNETAS Y CONFORMADO.

4. CRONOGRAMA EJECUTADO

Se cumplió con el 100% del cronograma inicial entregado por la alcaldía municipal, sin embargo, a solicitud de la administración municipal se adiciona el tramo las Mercedes – Camancha.

VEREDA O VIA	LONGITUD	VIAJES
Las Mercedes - Camancha	9.63	42
TOTAL	9.63	42

FECHA	ACTIVIDADES
06/04/2026	Vereda/Sector: Las Mercedes Condición climática: Lluvias Actividad: Conformación y compactación de subrasante y material de recarga Perfilado de cuentas y decoles, Traslado de material. Retro trasladada a Quipile. Avance (km): 0.5 MOTONIVELADORA - HYUNDAI - ICCU - LCL717H0HM2000341 (OPERATIVA) Propiedad: ICCU Operador: JACKSON REYES H. inicial – H. final: 4993.5 – 4997 RETROEXCAVADORA - CATERPILLAR - ICCU - CAT0416EEMFG08159 (OPERATIVA) Propiedad: ICCU Operador: PEDRO PABLO BELTRAN H. inicial – H. final: 10085.1 – 10091.1 VIBROCOMPACTADOR - Ingersoll - Alquiler - SD70 (OPERATIVA) H. inicial – H. final: 5002 – 5003.9 Observaciones: Lluvias. VOLQUETA_SENCILLA - - Alquiler - REE 655 (OPERATIVA) H. inicial – H. final: 69.5 – 69.5
07/04/2026	Vereda/Sector: Las Mercedes Condición climática: Soleado Actividad: Conformación y compactación de subrasante y material de recarga Perfilado de cuentas y decoles, Traslado de material. Retro trasladada a Quipile. Avance (km): 1.2 MOTONIVELADORA - HYUNDAI - ICCU - LCL717H0HM2000341 (OPERATIVA) Propiedad: ICCU Operador: JACKSON REYES H. inicial – H. final: 4997 – 5006.4 VIBROCOMPACTADOR - Ingersoll - Alquiler - SD70 (OPERATIVA) H. inicial – H. final: 5003.9 – 5011.9 VOLQUETA_SENCILLA - - Alquiler - REE 655 (OPERATIVA) Número de viajes recebo B400: 8 H. inicial – H. final: 69.5 – 77.7
08/04/2026	Vereda/Sector: Las Mercedes Condición climática: Soleado Actividad: Conformación y compactación de subrasante y material de recarga Perfilado de cuentas y decoles, Traslado de material. Avance (km): 0.8

	MOTONIVELADORA - HYUNDAI - ICCU - LCL717H0HM2000341 (OPERATIVA) Propiedad: ICCU Operador: JACKSON REYES H. inicial – H. final: 5006.4 – 5013 ACPM (gl): 57.37 | Km tanqueo: 5006.4 VIBROCOMPACTADOR - Ingersoll - Alquiler - SD70 (OPERATIVA) H. inicial – H. final: 5003.9 – 5011.9 VOLQUETA_SENCILLA - - Alquiler - REE 655 (OPERATIVA) H. inicial – H. final: 69.5 – 77.7
09/04/2026	Vereda/Sector: Las Mercedes Condición climática: Soleado Actividad: Conformación y compactación de subrasante y material de recarga Perfilado de cuentas y decoles, Traslado de material. Avance (km): 1.2 MOTONIVELADORA - HYUNDAI - ICCU - LCL717H0HM2000341 (OPERATIVA) Propiedad: ICCU Operador: JACKSON REYES H. inicial – H. final: 5013 – 5022.3 VIBROCOMPACTADOR - Ingersoll - Alquiler - SD70 (OPERATIVA) H. inicial – H. final: 5017.5 – 5025.2 VOLQUETA_SENCILLA - - Alquiler - REE 655 (OPERATIVA) H. inicial – H. final: 69.5 – 77.7
10/04/2026	Vereda/Sector: Las Mercedes Condición climática: Soleado Actividad: Conformación y compactación de subrasante y material de recarga Perfilado de cuentas y decoles, Traslado de material. Avance (km): 0.2 MOTONIVELADORA - HYUNDAI - ICCU - LCL717H0HM2000341 (OPERATIVA) Propiedad: ICCU Operador: JACKSON REYES H. inicial – H. final: 5022.3 – 5025.7 VIBROCOMPACTADOR - Ingersoll - Alquiler - SD70 (OPERATIVA) H. inicial – H. final: 5025.2 – 5028.6 VOLQUETA_SENCILLA - - Alquiler - REE 655 (OPERATIVA) Número de viajes recebo B400: 5 H. inicial – H. final: 91.7 – 98.3
11/04/2026	Vereda/Sector: Las Mercedes Condición climática: Soleado Actividad: Traslado de llantas de Carupa a San Cayetano para la Motoniveladora e instalación de las mismas.

	MOTONIVELADORA - HYUNDAI - ICCU - LCL717H0HM2000341 (OPERATIVA) Propiedad: ICCU Operador: JACKSON REYES H. inicial – H. final: 5025.7 – 5025.7 Intervención mecanica/Repuesto: Instalación de 4 llantas nuevas VIBROCOMPACTADOR - Ingersoll - Alquiler - SD70 (OPERATIVA) H. inicial – H. final: 5028.6 – 5028.6 Observaciones: Cambio de llantas motoniveladora. VOLQUETA_SENCILLA - - Alquiler - REE 655 (OPERATIVA) Número de viajes otros: 1 H. inicial – H. final: 98.3 – 105.7
13/04/2026	Vereda/Sector: Las Mercedes Condición climática: Lluvias Actividad: Traslado de llantas de Carupa a San Cayetano para la Motoniveladora e instalación de las mismas. Avance (km): 0.13 MOTONIVELADORA - HYUNDAI - ICCU - LCL717H0HM2000341 (OPERATIVA) Propiedad: ICCU Operador: JACKSON REYES H. inicial – H. final: 5025.7 – 5031.3 Intervención mecanica/Repuesto: Instalación de 4 llantas nuevas VIBROCOMPACTADOR - Ingersoll - Alquiler - SD70 (OPERATIVA) H. inicial – H. final: 5028.6 – 5033.8 VOLQUETA_SENCILLA - - Alquiler - REE 655 (OPERATIVA) Número de viajes recebo B400: 3 H. inicial – H. final: 105.7 – 113
14/04/2026	Vereda/Sector: Las Mercedes Condición climática: Lluvias Actividad: Traslado de llantas de Carupa a San Cayetano para la Motoniveladora e instalación de las mismas. Avance (km): 1.2 MOTONIVELADORA - HYUNDAI - ICCU - LCL717H0HM2000341 (OPERATIVA) Propiedad: ICCU Operador: JACKSON REYES H. inicial – H. final: 5031.3 – 5040.7 ACPM (gl): 60 | Km tanqueo: 5039.6 Intervención mecánica/Repuesto: Instalación de 4 llantas nuevas VIBROCOMPACTADOR - Ingersoll - Alquiler - SD70 (OPERATIVA) H. inicial – H. final: 5033.8 – 5042.8

	VOLQUETA_SENCILLA - - Alquiler - REE 655 (OPERATIVA) Número de viajes recebo B400: 12 H. inicial – H. final: 113 – 119.1
15/04/2026	Vereda/Sector: Las Mercedes Condición climática: Lluvias Actividad: Traslado de llantas de Carupa a San Cayetano para la Motoniveladora e instalación de las mismas. Avance (km): 0.1 MOTONIVELADORA - HYUNDAI - ICCU - LCL717H0HM2000341 (OPERATIVA) Propiedad: ICCU Operador: JACKSON REYES H. inicial – H. final: 5040.7 – 5041.8 VIBROCOMPACTADOR - Ingersoll - Alquiler - SD70 (OPERATIVA) H. inicial – H. final: 5042.8 – 5044.2 VOLQUETA_SENCILLA - - Alquiler - REE 655 (OPERATIVA) H. inicial – H. final: 119.1 – 119.1
16/04/202	Vereda/Sector: Las Mercedes Condición climática: Lluvias Actividad: No se realizan actividades debido a las fuertes lluvias en la zona. MOTONIVELADORA - HYUNDAI - ICCU - LCL717H0HM2000341 (OPERATIVA) Propiedad: ICCU Operador: JACKSON REYES H. inicial – H. final: 5041.8 – 5041.8 VIBROCOMPACTADOR - Ingersoll - Alquiler - SD70 (OPERATIVA) H. inicial – H. final: 5044.2 – 5044.3 VOLQUETA_SENCILLA - - Alquiler - REE 655 (OPERATIVA) H. inicial – H. final: 119.1 – 120.8
17/04/2026	Vereda/Sector: Las Mercedes Condición climática: Lluvias Actividad: No se realizan actividades debido a las fuertes lluvias en la zona. MOTONIVELADORA - HYUNDAI - ICCU - LCL717H0HM2000341 (OPERATIVA) Propiedad: ICCU Operador: JACKSON REYES H. inicial – H. final: 5041.8 – 5041.8 VIBROCOMPACTADOR - Ingersoll - Alquiler - SD70 (OPERATIVA) H. inicial – H. final: 5044.3 – 5044.3 VOLQUETA_SENCILLA - - Alquiler - REE 655 (OPERATIVA)

	H. inicial – H. final: 120.8 – 120.8
20/04/2026	Vereda/Sector: Las Mercedes Condición climática: Lluvias Actividad: No se realizan actividades debido a las fuertes lluvias en la zona. MOTONIVELADORA - HYUNDAI - ICCU - LCL717H0HM2000341 (OPERATIVA) Propiedad: ICCU Operador: JACKSON REYES H. inicial – H. final: 5041.8 – 5041.8 VIBROCOMPACTADOR - Ingersoll - Alquiler - SD70 (OPERATIVA) H. inicial – H. final: 5044.3 – 5044.3 Observaciones: Standby = Lluvias. VOLQUETA_SENCILLA - - Alquiler - REE 655 (OPERATIVA) H. inicial – H. final: 120.8 – 120.8 Observaciones: Standby = Lluvias.
21/04/2026	Vereda/Sector: Las Mercedes Condición climática: Lluvias Actividad: Conformación y compactación de subrasante y material de recarga, traslado de material. Avance (km): 1.3 MOTONIVELADORA - HYUNDAI - ICCU - LCL717H0HM2000341 (OPERATIVA) Propiedad: ICCU Operador: JACKSON REYES H. inicial – H. final: 5041.8 – 5051.6 VIBROCOMPACTADOR - Ingersoll - Alquiler - SD70 (OPERATIVA) H. inicial – H. final: 5044.3 – 5051.9 VOLQUETA_SENCILLA - - Alquiler - REE 655 (OPERATIVA) Número de viajes recebo B400: 2 H. inicial – H. final: 120.8 – 127.4
22/04/2026	Vereda/Sector: Las Mercedes Condición climática: Lluvias Actividad: Conformación y compactación de subrasante y material de recarga, traslado de material. Avance (km): 0.35 MOTONIVELADORA - HYUNDAI - ICCU - LCL717H0HM2000341 (OPERATIVA) Propiedad: ICCU Operador: JACKSON REYES H. inicial – H. final: 5051.6 – 5054.6 VIBROCOMPACTADOR - Ingersoll - Alquiler - SD70 (OPERATIVA) H. inicial – H. final: 5051.9 – 5055.1

	Observaciones: Standby Lluvias VOLQUETA_SENCILLA - - Alquiler - REE 655 (OPERATIVA) Número de viajes recebo B400: 4 H. inicial – H. final: 127.4 – 135
23/04/2025	Vereda/Sector: Las Mercedes Condición climática: Lluvias Actividad: Conformación y compactación de subrasante y material de recarga, traslado de material. Avance (km): 0.55 MOTONIVELADORA - HYUNDAI - ICCU - LCL717H0HM2000341 (OPERATIVA) Propiedad: ICCUOperador: JACKSON REYES H. inicial – H. final: 5054.6 – 5058.3 VIBROCOMPACTADOR - Ingersoll - Alquiler - SD70 (OPERATIVA) H. inicial – H. final: 5055.1 – 5059.4 Observaciones: Standby Lluvias VOLQUETA_SENCILLA - - Alquiler - REE 655 (OPERATIVA) Número de viajes recebo B400: 3 H. inicial – H. final: 135 – 141
24/04/2026	Vereda/Sector: Las Mercedes Condición climática: Lluvias Actividad: Conformación y compactación de subrasante y material de recarga, traslado de material. Avance (km): 0.1 MOTONIVELADORA - HYUNDAI - ICCU - LCL717H0HM2000341 (OPERATIVA) Propiedad: ICCU Operador: JACKSON REYES H. inicial – H. final: 5058.3 – 5058.3 Novedades mecánicas: Requiere deslizadores del tornamesa. VIBROCOMPACTADOR - Ingersoll - Alquiler - SD70 (OPERATIVA) H. inicial – H. final: 5059.4 – 5060.6 Observaciones: Standby Lluvias VOLQUETA_SENCILLA - - Alquiler - REE 655 (OPERATIVA) Número de viajes recebo B400: 1 H. inicial – H. final: 141 – 144.6
27/04/2026	Vereda/Sector: Las Mercedes Condición climática: Lluvias Actividad: No se realizan actividades debido a las lluvias y la inoperatividad de la Motoniveladora. MOTONIVELADORA - HYUNDAI - ICCU - LCL717H0HM2000341 (NO OPERATIVA)

	Propiedad: ICCU Operador: JACKSON REYES H. inicial – H. final: 5058.3 – 5058.3 Novedades mecánicas: Requiere deslizadores del tornamesa. VIBROCOMPACTADOR - Ingersoll - Alquiler - SD70 (OPERATIVA) H. inicial – H. final: 5060.6 – 5060.6 Observaciones: Standby Lluvias VOLQUETA_SENCILLA - - Alquiler - REE 655 (OPERATIVA) H. inicial – H. final: 144.6 – 144.6 Observaciones: Standby Lluvias
28/04/2026	Vereda/Sector: Las Mercedes Condición climática: Lluvias Actividad: No se realizan actividades debido a las lluvias, trabajos mecánicos Motoniveladora. MOTONIVELADORA - HYUNDAI - ICCU - LCL717H0HM2000341 (OPERATIVA) Propiedad: ICCU Operador: JACKSON REYES H. inicial – H. final: 5058.3 – 5058.3 Intervención mecanica/Repuesto: Instalación y ajuste de deslizadores tornamesa. VIBROCOMPACTADOR - Ingersoll - Alquiler - SD70 (OPERATIVA) H. inicial – H. final: 5060.6 – 5061 Observaciones: Standby Lluvias VOLQUETA_SENCILLA - - Alquiler - REE 655 (OPERATIVA) H. inicial – H. final: 144.6 – 144.6 Observaciones: Standby Lluvias
29/04/2026	Vereda/Sector: Las Mercedes Condición climática: Lluvias Actividad: Conformación y compactación de subrasante y material de recarga, traslado de material. Avance (km): 1 MOTONIVELADORA - HYUNDAI - ICCU - LCL717H0HM2000341 (OPERATIVA) Propiedad: ICCU Operador: JACKSON REYES H. inicial – H. final: 5058.3 – 5068 VIBROCOMPACTADOR - Ingersoll - Alquiler - SD70 (OPERATIVA) H. inicial – H. final: 5061 – 5067 VOLQUETA_SENCILLA - - Alquiler - REE 655 (OPERATIVA) Número de viajes recebo B400: 2 H. inicial – H. final: 144.6 – 151.1

30/04/2026	Vereda/Sector: Las Mercedes Condición climática: Soleado Actividad: Conformación y compactación de subrasante y material de recarga, traslado de material. Avance (km): 1 MOTONIVELADORA - HYUNDAI - ICCU - LCL717H0HM2000341 (OPERATIVA) Propiedad: ICCU Operador: JACKSON REYES H. inicial – H. final: 5068 – 5075.2 VIBROCOMPACTADOR - Ingersoll - Alquiler - SD70 (OPERATIVA) H. inicial – H. final: 5067 – 5074 VOLQUETA_SENCILLA - - Alquiler - REE 655 (OPERATIVA) Número de viajes recebo B400: 2 H. inicial – H. final: 151.1 – 158.4

UNION TEMPORAL
ICCU
PARQUE
2025

5. RELACIÓN DE TRANSPORTE Y REMISIÓN DE MATERIALES

RELACIÓN DE TRANSPORTE Y REMISIÓN DE MATERIALES			
FECHA	**MATERIAL**	**N° DE VIAJES**	**DESCRIPCIÓN**
1/04/2026	---	---	LLUVIAS
2/04/2026	---	---	FESTIVO
3/04/2026	---	---	FESTIVO
4/04/2026	---	---	NO TRABAJA ALCALDIA
5/04/2026	---	---	DOMINGO
6/04/2026	RECARGA	0	LLUVIAS
7/04/2026	RECARGA	8	SOLEADO
8/04/2026	RECARGA	0	SOLEADO
9/04/2026	RECARGA	5	SOLEADO
10/04/2026	RECARGA	5	CAMBIO DE LLANTAS MOTO
11/04/2026	RECARGA	0	CAMBIO DE LLANTAS MOTO
12/04/2026	---	---	DOMINGO
13/04/2026	RECARGA	3	LLUVIAS
14/04/2026	RECARGA	6	SOLEADO
15/04/2026	RECARGA	1	LLUVIAS
16/04/2026	RECARGA	0	LLUVIAS
17/04/2026	RECARGA	0	LLUVIAS
18/04/2026	RECARGA	0	LLUVIAS
19/04/2026	---	---	DOMINGO
20/04/2026	RECARGA	0	LLUVIAS
21/04/2026	RECARGA	2	SOLEADO
22/04/2026	RECARGA	4	LLUVIAS
23/04/2026	RECARGA	3	SOLEADO
24/04/2026	RECARGA	1	MOTO INOPERATIVA
25/04/2026	RECARGA	0	MOTO INOPERATIVA
26/04/2026	---	---	DOMINGO
27/04/2026	RECARGA	0	MOTO INOPERATIVA
28/04/2026	RECARGA	0	MOTO INOPERATIVA
29/04/2026	RECARGA	2	SOLEADO
30/04/2026	RECARGA	2	SOLEADO
---	---	---	---
TOTAL			**42**

6. AVANCE EN CAMPO (KM)

AVANCE DE OBRA SAN CAYETANO				
FECHA	**LONGITUD (KM)**	**AVANCE (KM)**	**REPETICIÓN (KM)**	**DESCRIPCIÓN**
1/04/2026	0	0	0	LLUVIAS
2/04/2026	0	0	0	FESTIVO
3/04/2026	0	0	0	FESTIVO
4/04/2026	0	0	0	NO TRABAJA ALCALDIA
5/04/2026	0	0	0	DOMINGO
6/04/2026	0,50	0,5	0	LLUVIAS
7/04/2026	1,20	1,7	0	SOLEADO
8/04/2026	0,80	2,5	0	SOLEADO
9/04/2026	1,20	3,7	0	SOLEADO
10/04/2026	0,20	3,9	0	CAMBIO DE LLANTAS MOTO
11/04/2026	0,00	3,9	0	CAMBIO DE LLANTAS MOTO
12/04/2026	0,00	3,9	0	DOMINGO
13/04/2026	0,13	4,03	0	LLUVIAS
14/04/2026	1,20	5,23	0	SOLEADO
15/04/2026	0,10	5,33	0	LLUVIAS
16/04/2026	0,00	5,33	0	LLUVIAS
17/04/2026	0,00	5,33	0	LLUVIAS
18/04/2026	0,00	5,33	0	LLUVIAS
19/04/2026	0,00	5,33	0	DOMINGO
20/04/2026	0,00	5,33	0	LLUVIAS
21/04/2026	1,30	6,63	0	SOLEADO
22/04/2026	0,35	6,98	0	LLUVIAS
23/04/2026	0,55	7,53	0	SOLEADO
24/04/2026	0,00	7,53	0	MOTO INOPERATIVA
25/04/2026	0,50	8,03	0	MOTO INOPERATIVA
26/04/2026	0,00	8,03	0	DOMINGO
27/04/2026	0,00	8,03	0	MOTO INOPERATIVA
28/04/2026	0,00	8,03	0	MOTO INOPERATIVA
29/04/2026	1,00	9,03	0	SOLEADO
30/04/2026	0,60	9,63	0	SOLEADO
---	---	---	---	---
TOTAL		**9,63**		

7. RESUMEN DE HORAS DE LLUVIA, INOPERATIVIDAD Y EFECTIVAS LABORALES

RESUMEN DE HORAS DE LLUVIA, INOPERATIVIDAD Y EFECTIVAS LABORALES				
FECHA	**HORAS DE LLUVIA**	**HORAS DE INOPERATIVIDAD**	**HORAS EFECTIVAS**	**DESCRIPCIÓN**
1/04/2026	8	0	0	LLUVIAS
2/04/2026	---	---	---	FESTIVO
3/04/2026	---	---	---	FESTIVO
4/04/2026	---	---	---	NO TRABAJA ALCALDIA
5/04/2026	---	---	---	DOMINGO
6/04/2026	2	0	6	LLUVIAS
7/04/2026	0	0	8	SOLEADO
8/04/2026	0	0	8	SOLEADO
9/04/2026	0	0	8	SOLEADO
10/04/2026	4	4	0	CAMBIO DE LLANTAS MOTO
11/04/2026	4	4	0	CAMBIO DE LLANTAS MOTO
12/04/2026	---	---	---	DOMINGO
13/04/2026	1	0	7	LLUVIAS
14/04/2026	0	0	8	SOLEADO
15/04/2026	1	0	7	LLUVIAS
16/04/2026	8	0	0	LLUVIAS
17/04/2026	8	0	0	LLUVIAS
18/04/2026	8	0	0	LLUVIAS
19/04/2026	---	---	---	DOMINGO
20/04/2026	8	0	0	LLUVIAS
21/04/2026	0	0	8	SOLEADO
22/04/2026	1	0	7	LLUVIAS
23/04/2026	0	0	8	SOLEADO
24/04/2026	0	4	4	MOTO INOPERATIVA
25/04/2026	0	8	0	MOTO INOPERATIVA
26/04/2026	---	---	---	DOMINGO
27/04/2026	0	8	0	MOTO INOPERATIVA
28/04/2026	0	8	0	MOTO INOPERATIVA
29/04/2026	0	0	8	SOLEADO
30/04/2026	0	0	8	SOLEADO
---	---	---	---	---
TOTAL	53	36	95	

8. MOVILIZACIONES

MOVILIZACIONES SAN CAYETANO					
FECHA	EQUIPO	SERIAL	OPERADOR	ORIGEN	DESTINO
06/04/2026	Retroexcavadora	8159	Pedro Beltrán	San Cayetano	Quipile



9. MANTENIMIENTOS

MANTENIMIENTOS			
FECHA	EQUIPO	SERIAL	DESCRIPCIÓN
28/04/2026	MOTONIVELADORA ICCU	0341	Ajuste de tornamesa, instalación de strips.
12/04/2026	MOTONIVELADORA ICCU	0341	Instalación 4 llantas nuevas.

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025	CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA ALQUILADA						ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
OBJETO	**"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".**						
PERIODO:	**ABRIL**						
MUNICIPIO:	**SAN CAYETANO**						
MAQUINA:	**VIBROCOMPACTADOR PRIVADO**					**SERIE**	**INGERSOLL 176497**
FECHA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO HORÓMETRO INICIAL**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO HORÓMETRO FINAL**	**HOROMETRO INICIAL**	**HOROMETRO FINAL**	**HORAS**	**STANDBY**	**OBSERVACIÓN**
1/04/2026			5002,0	5002,0	0,0	0,0	LLUVIAS
2/04/2026			5002,0	5002,0	0,0	0,0	FESTIVO
3/04/2026			5002,0	5002,0	0,0	0,0	FESTIVO
4/04/2026			5002,0	5002,0	0,0	0,0	NO TRABAJA ALCALDIA
5/04/2026	—	—	---	---	---	---	DOMINGO
6/04/2026			5002,0	5003,9	1,9	3,1	LLUVIAS
7/04/2026			5003,9	5011,9	8,0	0,0	SOLEADO
8/04/2026			5011,9	5017,5	5,6	0,0	SOLEADO
9/04/2026			5017,5	5025,2	7,7	0,0	SOLEADO
10/04/2026			5025,2	5028,6	3,4	1,6	CAMBIO DE LLANTAS MOTO
11/04/2026			5028,6	5028,6	0,0	5,0	CAMBIO DE LLANTAS MOTO
12/04/2026	—	—	---	---	---	---	DOMINGO

13/04/2026			5028,6	5033,8	5,2	0,0	LLUVIAS
14/04/2026			5033,8	5042,8	9,0	0,0	SOLEADO
15/04/2026			5042,8	5044,2	1,4	3,6	LLUVIAS
16/04/2026			5044,2	5044,3	0,1	4,9	LLUVIAS
17/04/2026			5044,3	5044,3	0,0	5,0	LLUVIAS
18/04/2026			5044,3	5044,3	0,0	5,0	LLUVIAS
19/04/2026	—	—	---	---	---	---	DOMINGO
20/04/2026			5044,3	5044,3	0,0	5,0	LLUVIAS
21/04/2026			5044,3	5051,9	7,6	0,0	SOLEADO
22/04/2026			5051,9	5055,1	3,2	1,8	LLUVIAS
23/04/2026			5055,1	5059,4	4,3	0,7	SOLEADO
24/04/2026			5059,4	5060,6	1,2	3,8	MOTO INOPERATIVA
25/04/2026			5060,6	5060,6	0,0	5,0	MOTO INOPERATIVA
26/04/2026	—	—	---	---	---	---	DOMINGO
27/04/2026			5060,6	5060,6	0,0	5,0	MOTO INOPERATIVA
28/04/2026			5060,6	5061,0	0,4	4,6	MOTO INOPERATIVA
29/04/2026			5061,0	5067,0	6,0	0,0	SOLEADO
30/04/2026			5067,0	5074,0	7,0	0,0	SOLEADO
—	—	—	---	---	---	—	---
SUBTOTAL MES					**72,00**	**54,10**	
TOTAL MES					**126,10**		

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025	CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA ALQUILADA						ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
OBJETO	**"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".**						
PERIODO:	**ABRIL**						
MUNICIPIO:	**SAN CAYETANO**						
VEHICULO:	**VOLQUETA PRIVADA**					**PLACA**	**REE 655**
FECHA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO HORÓMETRO INICIAL**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO HORÓMETRO FINAL**	**HOROMETRO INICIAL**	**HOROMETRO FINAL**	**VIAJES**	**DÍAS LABORADOS**	**OBSERVACIÓN**
1/04/2026			69.5	69.5	---	0	LLUVIAS
2/04/2026			69.5	69.5	---	0	FESTIVO
3/04/2026			69.5	69.5	---	0	FESTIVO
4/04/2026			69.5	69.5	---	0	NO TRABAJA ALCALDIA
5/04/2026	—	—	---	---	---	---	DOMINGO
6/04/2026			69.5	69.5	0	1	LLUVIAS
7/04/2026			69.5	77.7	8	1	SOLEADO
8/04/2026			77.7	83.1	0	1	SOLEADO
9/04/2026			83.1	91.6	5	1	SOLEADO
10/04/2026			91.6	98.3	5	1	CAMBIO DE LLANTAS MOTO
11/04/2026			98.3	105.7	0	1	CAMBIO DE LLANTAS MOTO
12/04/2026	—	—	---	---	---	---	DOMINGO

13/04/2026			105.7	113.0	3	1	LLUVIAS
14/04/2026			113.0	119.1	6	1	SOLEADO
15/04/2026			119.1	119.1	1	1	LLUVIAS
16/04/2026			119.1	120.8	0	1	LLUVIAS
17/04/2026			120.8	120.8	0	1	LLUVIAS
18/04/2026			120.8	120.8	0	1	LLUVIAS
19/04/2026	—	—	---	---	---	---	DOMINGO
20/04/2026			120.8	120.8	0	1	LLUVIAS
21/04/2026			120.8	127.4	2	1	SOLEADO
22/04/2026			127.4	135.0	4	1	LLUVIAS
23/04/2026			135.0	141.9	3	1	SOLEADO
24/04/2026			141.9	144.6	1	1	MOTO INOPERATIVA
25/04/2026			144.6	144.6	0	1	MOTO INOPERATIVA
26/04/2026	—	—	---	---	---	---	DOMINGO
27/04/2026			144.6	144.6	0	1	MOTO INOPERATIVA
28/04/2026			144.6	144.6	0	1	MOTO INOPERATIVA
29/04/2026			144.6	151.1	2	1	SOLEADO
30/04/2026			151.1	158.4	2	1	SOLEADO
—	—	—	—	—	---	—	---
SUBTOTAL MES					**42,00**	**22,00**	
TOTAL MES					**22,00**		

CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA, VOLQUETAS Y TRACTOCAMIÓN E INSUMOS BÁSICOS													
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHÍCULOS PARA LA ATENCIÓN DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.												
MUNICIPIO:	San Cayetano		**PROVINCIA:**	Rionegro				**PERIODO:**	01/04/2026 – 30/04/2026				
MÁQUINA:	MOTONIVELADORA - HYUNDAI - ICCU - LCL717H0HM2000341							**SERIE:**	LCL717H0HM2000341				

CONTROL HORARIO				ACPM				UREA				OPERATIVA	OBSERVACIONES
FECHA	H. INICIAL	H. FINAL	HORAS	ACPM (GLS)	HORÓMETRO/ KM TANQUEO	RENDIMIENTO	No. TIRILLA	UREA (Litros)	HOROMETRO TRANQUEO	RENDIMIENTO	No. TIRILLA		
01/04/2026	4,947.00	4,947.00	0.00			0.00				0.00		SI	
06/04/2026	4,993.50	4,997.00	3.50			0.00				0.00		SI	
07/04/2026	4,997.00	5,006.40	9.40			0.00				0.00		SI	
08/04/2026	5,006.40	5,013.00	6.60	57.370	5,006.4	0.01	1179			0.00		SI	
09/04/2026	5,013.00	5,022.30	9.30			0.00				0.00		SI	
10/04/2026	5,022.30	5,025.70	3.40			0.00				0.00		SI	
11/04/2026	5,025.70	5,025.70	0.00			0.00				0.00		NO	Instalación de 4 llantas nuevas
13/04/2026	5,025.70	5,031.30	5.60			0.00				0.00		SI	
14/04/2026	5,031.30	5,040.70	9.40	60.000	5,039.6	1.81	1222			0.00		SI	
15/04/2026	5,040.70	5,041.80	1.10			0.00				0.00		SI	
16/04/2026	5,041.80	5,041.80	0.00			0.00				0.00		SI	
17/04/2026	5,041.80	5,041.80	0.00			0.00				0.00		SI	
20/04/2026	5,041.80	5,041.80	0.00			0.00				0.00		SI	
21/04/2026	5,041.80	5,051.60	9.80			0.00				0.00		SI	
22/04/2026	5,051.60	5,054.60	3.00			0.00				0.00		SI	
23/04/2026	5,054.60	5,058.30	3.70			0.00				0.00		SI	
24/04/2026	5,058.30	5,059.50	1.20			0.00				0.00		NO	Inoperativa por Deslizadores del Tornamesa.
27/04/2026	5,059.50	5,059.50	0.00			0.00				0.00		NO	Inoperativa por Deslizadores del Tornamesa.
28/04/2026	5,059.50	5,059.50	0.00			0.00				0.00		NO	Inoperativa por Deslizadores del Tornamesa.
29/04/2026	5,059.50	5,068.00	8.50			0.00				0.00		SI	
30/04/2026	5,068.00	5,075.20	7.20			0.00				0.00		SI	
TOTAL MES			**81.7**	**117.370**		**1.81**		**0**					

CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA, VOLQUETAS Y TRACTOCAMIÓN E INSUMOS BÁSICOS													
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHÍCULOS PARA LA ATENCIÓN DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.												
MUNICIPIO:	San Cayetano		**PROVINCIA:**	Rionegro			**PERIODO:**	01/04/2026 – 30/04/2026					
MÁQUINA:	RETROEXCAVADORA - CATERPILLAR - ICCU - CAT0416EEMFG08159						**SERIE:**	CAT0416EEMFG08159					
CONTROL HORARIO				**ACPM**				**UREA**				**OPERATIVA**	**OBSERVACIONES**
FECHA	**H. INICIAL**	**H. FINAL**	**HORAS**	**ACPM (GLS)**	**HORÓMETRO/ KM TANQUEO**	**RENDIMIENTO**	**No. TIRILLA**	**UREA (Litros)**	**HOROMETRO TRANQUEO**	**RENDIMIENTO**	**No. TIRILLA**		
01/04/2026	10,091.10	10,091.10	0.00			0.00				0.00		SI	No se realizan actividades por lluvia
06/04/2026	10,085.10	10,091.10	6.00			0.00				0.00		SI	Traslado a Quipile
TOTAL MES			**6**	**0.000**		**0.00**		**0**					

11. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

- Se ejecutan actividades de mantenimiento vial tales como: perfilado y limpieza de cunetas, conformación de rasante y material granular, trasporte de material. Esto con el objetivo principal de atender la necesidad de mejorar el estado de la malla vial y así mismo la calidad de vida de la comunidad que transitan por los diferentes sectores.

- Se realizó un trabajo exhaustivo en la Vereda Las Mercedes – Camancha; donde la maquinaria operó de manera eficiente, se obtuvo un buen rendimiento lo que representa un avance de 9,63 km en el proyecto, se llevaron a cabo un total de 42 viajes de material granular.

- Se trabajó en articulación, teniendo gran importancia el desempeño mancomunado interinstitucional entre la alcaldía municipal de San Cayetano y la maquinaria allegada por el ICCU.

- Las horas lluvias en este mes fueron de 53, las de inoperatividad 36; esto da un total de 95 horas efectivas; Las afectaciones del clima sobresaturan el suelo y no permiten ejecutar labores de manera efectiva, por dicho motivo y por la inoperatividad de la motoniveladora se tuvieron varios días de no operación.

- El mantenimiento vial es esencial para garantizar la seguridad de los usuarios, mejorar la transitabilidad y conectividad entre comunidades, facilitar el acceso a servicios básicos y dinamizar la economía regional al reducir costos de trasportes y tiempo de desplazamientos.

- Mantener los equipos en buen estado es la clave para asegurar la continuidad de obra, mejorar la seguridad, optimizar el rendimiento y prolongar la vida útil de la maquinaria.

12. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO:	1	PROVINCIA:	RIO NEGRO
LOCALIZACIÓN:			SAN CAYETANO
COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE Y MATERIAL GRANUAR			



FOTO:	2	PROVINCIA:	RIO NEGRO
LOCALIZACIÓN:			SAN CAYETANO
TRASLADO DE MATERIAL GRANUAR			



FOTO:	3	PROVINCIA:	RIO NEGRO
LOCALIZACIÓN:			SAN CAYETANO
TRASLADO DE MATERIAL GRANUAR			



FOTO:	4	PROVINCIA:	RIO NEGRO
LOCALIZACIÓN:			SAN CAYETANO
CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE Y MATERIAL GRANUAR			



FOTO:	5	PROVINCIA:	RIO NEGRO
LOCALIZACIÓN:		SAN CAYETANO	
CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE Y MATERIAL GRANUAR			



FOTO:	6	PROVINCIA:	RIO NEGRO
LOCALIZACIÓN:		SAN CAYETANO	
PERFILADO DE CUNETAS Y DESCOLES.			



FOTO:	7	PROVINCIA:	RIO NEGRO
LOCALIZACIÓN:		SAN CAYETANO	
COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE Y MATERIAL GRANUAR			



FOTO:	8	PROVINCIA:	RIO NEGRO
LOCALIZACIÓN:		SAN CAYETANO	
COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE Y MATERIAL GRANUAR			



FOTO:	9	PROVINCIA:	RIO NEGRO
LOCALIZACIÓN:		SAN CAYETANO	
TRASLADO DE MATERIAL GRANUAR			



FOTO:	10	PROVINCIA:	RIO NEGRO
LOCALIZACIÓN:		SAN CAYETANO	
COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE Y MATERIAL GRANUAR			



FOTO:	11	PROVINCIA:	RIO NEGRO
LOCALIZACIÓN:		SAN CAYETANO	
TRASLADO DE MATERIAL GRANUAR			



FOTO:	12	PROVINCIA:	RIO NEGRO
LOCALIZACIÓN:		SAN CAYETANO	
COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE Y MATERIAL GRANUAR			



FOTO:	13	PROVINCIA:	RIO NEGRO
LOCALIZACIÓN:		SAN CAYETANO	
CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE Y MATERIAL GRANUAR			



FOTO:	14	PROVINCIA:	RIO NEGRO
LOCALIZACIÓN:		SAN CAYETANO	
CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE Y MATERIAL GRANUAR			



FOTO:	15	PROVINCIA:	RIO NEGRO
LOCALIZACIÓN:		SAN CAYETANO	
TRASLADO DE MATERIAL GRANUAR			



FOTO:	16	PROVINCIA:	RIO NEGRO
LOCALIZACIÓN:		SAN CAYETANO	
CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE Y MATERIAL GRANUAR			



Camilo Delgado
INSPECTOR ICCU

Edgar A Zambrano C
INSPECTOR UT ICCU PARQUE 2025

CONTRATO ICCU-CTO 1595 DE 2025

INFORME DE AVANCE N°3
PERIODO: ABRIL DEL 2026

PROVINCIA: RIO NEGRO
MUNICIPIO: TOPAIPI

CLL 13 # 47 – 12 BOGOTA – CUNDINAMARCA D.C TEL 313 258 3561
EMAIL: COORDINACION.ICCU.2026@GMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES – PROVINCIA RIO NEGRO
MUNICIPIO DE TOPAIPÍ

OBJETO: "ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOSPARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

1. LOCALIZACIÓN

Provincia Rio Negro:

TOPAIPI:

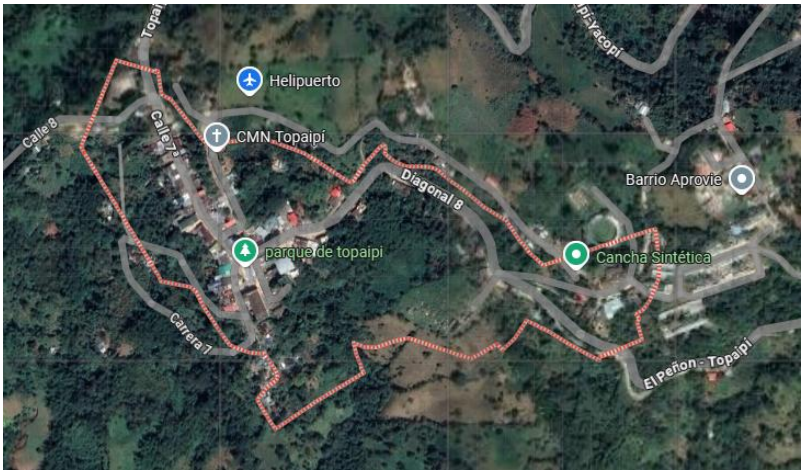
Maquinaria:

#	EQUIPO	PLACA
1	RETROEXCAVADORA ALQ	CAT00416TH9P00549
2	MOTONIVELADORA ALQ	710A1576521944089
3	VIBROCOMPACTADOR	CAT0CS10ED6H03639

Ubicación:

Topaipí – Papatas, Naranjal, Nacopay, Suárez, Terama, Palacios, Bunque, Alto de Chamusca, Términos, Kaquian, Muchipay y Sabenta - 5°20′10″N 74°18′11.

Imagen 1. Ubicación Topaipi



Fuente: Google earth

2. GRUPO DE TRABAJO

#	CARGO	NOMBRES
1	INSPECTOR DE OBRA UT	RICARDO ANDRES ORTIZ
2	INSPECTOR DE OBRA ICCU	NICOLAS MAURICIO OCHOA LINARES
3	RETROEXCAVADORA CAT00549	ADRIAN LOZANO
5	MOTONIVELADORA 44089	LUIS BALLEN
6	VIBROCOMPACTADOR CAT03639	YEISON GUILLEN

3. PLAN DE TRABAJO

El presente cronograma corresponde a la programación de actividades para el frente de trabajo del municipio de Topaipí, en el marco de las labores de mantenimiento y atención de la red vial rural mediante el uso de maquinaria amarilla. Para este frente se dispone de una retroexcavadora, vibro y motoniveladora, los cuales serán utilizados en diferentes sectores del municipio de acuerdo con las necesidades identificadas y las prioridades establecidas por la Secretaría de Planeación municipal.

Durante el período comprendido entre los meses de febrero, marzo y abril, la maquinaria se destinará a la atención de los sectores Suárez, San Antonio, Naranjal, Monte Alegre, Minipay, El Bunque y la vía al Peñón, así como en otros puntos que se determinen según los requerimientos de mantenimiento y las condiciones de transitabilidad de las vías rurales. La programación presentada permite organizar de manera preliminar la utilización de la maquinaria, manteniendo flexibilidad para atender emergencias o necesidades prioritarias que se presenten en el territorio.

AVANCE DEL 30%

Imagen 2 Cronograma de actividades Municipio de Topaipí

CRONOGRAMA DE MAQUINARIA ICCU												
MAQUINAS	FEBRERO				MARZO				ABRIL			
	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12
Retroexcavadora, Motoniveladora y vibro	Sectores Suárez – San Antonio – Naranjal – Monte Alegre – Minipay – El Bunque – Vía al Peñón y demás puntos priorizados por la Secretaría de Planeación	Sectores Suárez – San Antonio – Naranjal – Monte Alegre – Minipay – El Bunque – Vía al Peñón y demás puntos priorizados por la Secretaría de Planeación	Sectores Suárez – San Antonio – Naranjal – Monte Alegre – Minipay – El Bunque – Vía al Peñón y demás puntos priorizados por la Secretaría de Planeación	Sectores Suárez – San Antonio – Naranjal – Monte Alegre – Minipay – El Bunque – Vía al Peñón y demás puntos priorizados por la Secretaría de Planeación	Sectores Suárez – San Antonio – Naranjal – Monte Alegre – Minipay – El Bunque – Vía al Peñón y demás puntos priorizados por la Secretaría de Planeación	Sectores Suárez – San Antonio – Naranjal – Monte Alegre – Minipay – El Bunque – Vía al Peñón y demás puntos priorizados por la Secretaría de Planeación	Sectores Suárez – San Antonio – Naranjal – Monte Alegre – Minipay – El Bunque – Vía al Peñón y demás puntos priorizados por la Secretaría de Planeación	Sectores Suárez – San Antonio – Naranjal – Monte Alegre – Minipay – El Bunque – Vía al Peñón y demás puntos priorizados por la Secretaría de Planeación	Sectores Suárez – San Antonio – Naranjal – Monte Alegre – Minipay – El Bunque – Vía al Peñón y demás puntos priorizados por la Secretaría de Planeación	Sectores Suárez – San Antonio – Naranjal – Monte Alegre – Minipay – El Bunque – Vía al Peñón y demás puntos priorizados por la Secretaría de Planeación	Sectores Suárez – San Antonio – Naranjal – Monte Alegre – Minipay – El Bunque – Vía al Peñón y demás puntos priorizados por la Secretaría de Planeación	Sectores Suárez – San Antonio – Naranjal – Monte Alegre – Minipay – El Bunque – Vía al Peñón y demás puntos priorizados por la Secretaría de Planeación

Fuente: Alcaldía Municipal de Topaipí

4. CRONOGRAMA EJECUTADO

FECHA	ACTIVIDADES
01/04/2026	Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Topaipí, provincia de Rionegro. Vereda/Sector: Puerto Bogota - Suaras - Buenos Aires - SanAntonio - Terminos. Condición climática: Lluvias. Actividad: sin actividad programada por lluvias. Equipos disponibles. Avance (km): 0.0. RETROEXCAVADORA - CAT - Alquiler - 00416TH9P00549 (OPERATIVA). Propiedad: Alquiler. H. inicial – H. final: 1289.0. VIBROCOMPACTADOR - CATERPILLAR - ICCU - CAT0CS10ED6H03639 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: VICTOR ADELMO BEJARANO. H. inicial – H. final: 523.1. Intervención mecanica/Repuesto:. MOTONIVELADORA - CAT - Alquiler - 710A1576521944089 (OPERATIVA). Propiedad: Alquiler. H. inicial – H. final: 5130.3. Fin del reporte.
06/04/2026	Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Topaipí, provincia de Rionegro. Vereda/Sector: Suaras - Buenos Aires - SanAntonio - Terminos - Kaquian. Condición climática: Lluvias. Actividad: Conformación de vía en la vereda Kaquian, incluye limpieza de cunetas, mejoramiento y compactación de vía. Avance (km): 0.7. RETROEXCAVADORA - CAT - Alquiler - 00416TH9P00549 (OPERATIVA). Propiedad: Alquiler. H. inicial – H. final: 1289.0 - 1298.6. VIBROCOMPACTADOR - CATERPILLAR - ICCU - CAT0CS10ED6H03639 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: VICTOR ADELMO BEJARANO. H. inicial – H. final: 523.1 - 526.0. ACPM (gl):35.000 GL. Intervención mecanica/Repuesto:. MOTONIVELADORA - CAT - Alquiler - 710A1576521944089 (OPERATIVA). Propiedad: Alquiler. H. inicial – H. final: 5130.3 - 5134.5. Fin del reporte.
07/04/2026	Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Topaipí, provincia de Rionegro. Vereda/Sector: Suaras - Buenos Aires - SanAntonio - Terminos - Kaquian. Condición climática: Lluvias. Actividad: Sin actividad por lluvias, equipos disponibles. Avance (km): 0.7. RETROEXCAVADORA - CAT - Alquiler - 00416TH9P00549 (OPERATIVA). Propiedad: Alquiler. H. inicial – H. final: 1298.6 - 1301.9. VIBROCOMPACTADOR - CATERPILLAR - ICCU - CAT0CS10ED6H03639 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: VICTOR ADELMO BEJARANO. H. inicial – H. final: 526.0. ACPM (gl):. Intervención mecanica/Repuesto:. MOTONIVELADORA - CAT - Alquiler - 710A1576521944089 (OPERATIVA). Propiedad: Alquiler. H. inicial – H. final: 5134.5 - 5136.1. Fin del reporte.
08/04/2026	Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Topaipí, provincia de Rionegro. Vereda/Sector: Suaras - Buenos Aires - SanAntonio - Terminos - Kaquian. Condición climática: Lluvias. Actividad: Sin actividad por lluvias, se movilizan equipos a la vereda san Antonio. Avance (km): 0.0. RETROEXCAVADORA - CAT - Alquiler - 00416TH9P00549 (OPERATIVA). Propiedad: Alquiler. H. inicial – H. final: 1301.9 - 1306.0. VIBROCOMPACTADOR - CATERPILLAR - ICCU - CAT0CS10ED6H03639 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: VICTOR ADELMO BEJARANO. H. inicial – H. final: 526.0 - 528.0. ACPM (gl):. Intervención mecanica/Repuesto:. MOTONIVELADORA - CAT - Alquiler - 710A1576521944089 (OPERATIVA). Propiedad: Alquiler. H. inicial – H. final: 5136.1 - 5140.0. Fin del reporte.

09/04/2026	Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Topaipí, provincia de Rionegro. Vereda/Sector: Suaras - Buenos Aires - SanAntonio - Terminos - Kaquian. Condición climática: Lluvias. Actividad: Remoción de derrumbes en la vereda San Antonio, moto y vibro sin actividad por mal estado del terreno. Avance (km): 0.0. RETROEXCAVADORA - CAT - Alquiler - 00416TH9P00549 (OPERATIVA). Propiedad: Alquiler. H. inicial – H. final: 1306.0 - 1314.1. VIBROCOMPACTADOR - CATERPILLAR - ICCU - CAT0CS10ED6H03639 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: VICTOR ADELMO BEJARANO. H. inicial – H. final: 528.0. ACPM (gl):. Intervención mecanica/Repuesto: Se realiza mantenimiento del tanque del combustible por parte de Gecolsa. MOTONIVELADORA - CAT - Alquiler - 710A1576521944089 (OPERATIVA). Propiedad: Alquiler. H. inicial – H. final: 5140.0. Fin del reporte.
10/04/2026	Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Topaipí, provincia de Rionegro. Vereda/Sector: Suaras - Buenos Aires - SanAntonio - Terminos - Kaquian. Condición climática: Lluvias. Actividad: Remoción de derrumbes en la vereda San Antonio, moto y vibro sin actividad por mal estado del terreno. Avance (km): 0.0. RETROEXCAVADORA - CAT - Alquiler - 00416TH9P00549 (OPERATIVA). Propiedad: Alquiler. H. inicial – H. final: 1314.1 - 1320.4. VIBROCOMPACTADOR - CATERPILLAR - ICCU - CAT0CS10ED6H03639 (NO OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: VICTOR ADELMO BEJARANO. H. inicial – H. final: 528.0. ACPM (gl):. Intervención mecanica/Repuesto: Se realiza mantenimiento del tanque del combustible por parte de Gecolsa. MOTONIVELADORA - CAT - Alquiler - 710A1576521944089 (OPERATIVA). Propiedad: Alquiler. H. inicial – H. final: 5140.0. Fin del reporte.
11/04/2026	Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Topaipí, provincia de Rionegro. Vereda/Sector: Suaras - Buenos Aires - SanAntonio - Terminos - Kaquian. Condición climática: Lluvias. Actividad: Remoción de derrumbes en la vereda San Antonio, moto y vibro sin actividad programada. Equipos disponibles. Avance (km): 0.0. RETROEXCAVADORA - CAT - Alquiler - 00416TH9P00549 (OPERATIVA). Propiedad: Alquiler. H. inicial – H. final: 1320.4 - 1324.5. VIBROCOMPACTADOR - CATERPILLAR - ICCU - CAT0CS10ED6H03639 (NO OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: VICTOR ADELMO BEJARANO. H. inicial – H. final: 528.0. ACPM (gl):. Intervención mecanica/Repuesto: Se realiza mantenimiento del tanque del combustible por parte de Gecolsa, ala espera de entrega del tanque. MOTONIVELADORA - CAT - Alquiler - 710A1576521944089 (OPERATIVA). Propiedad: Alquiler. H. inicial – H. final: 5140.0. Fin del reporte.
13/04/2026	Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Topaipí, provincia de Rionegro. Vereda/Sector: Suaras - Buenos Aires - SanAntonio - Terminos - Kaquian. Condición climática: Lluvias. Actividad: Remoción de derrumbes en la vereda San Antonio, moto y vibro sin actividad programada. Equipos disponibles. Avance (km): 0.0. RETROEXCAVADORA - CAT - Alquiler - 00416TH9P00549 (OPERATIVA). Propiedad: Alquiler. H. inicial – H. final: 1324.5 - 1332.8. VIBROCOMPACTADOR - CATERPILLAR - ICCU - CAT0CS10ED6H03639 (NO OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: VICTOR ADELMO BEJARANO. H. inicial – H. final: 528.0. ACPM (gl):. Intervención mecanica/Repuesto: Se realiza mantenimiento del tanque del combustible por parte de Gecolsa, ala espera de entrega del tanque. MOTONIVELADORA - CAT - Alquiler - 710A1576521944089 (OPERATIVA). Propiedad: Alquiler. H. inicial – H. final: 5140.0. Fin del reporte.

14/04/2026	Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Topaipí, provincia de Rionegro. Vereda/Sector: Suaras - Buenos Aires - SanAntonio - Terminos - Kaquian. Condición climática: Lluvias. Actividad: Cargue de material en el sector Pisco Grande, moto y vibro sin actividad programada a la espera del tanque del vibro. Equipos disponibles. Avance (km): 0.0. RETROEXCAVADORA - CAT - Alquiler - 00416TH9P00549 (OPERATIVA). Propiedad: Alquiler. H. inicial – H. final: 1332.8 - 1339.2. VIBROCOMPACTADOR - CATERPILLAR - ICCU - CAT0CS10ED6H03639 (NO OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: VICTOR ADELMO BEJARANO. H. inicial – H. final: 528.0. ACPM (gl):. Intervención mecanica/Repuesto: Se realiza mantenimiento del tanque del combustible por parte de Gecolsa, ala espera de entrega del tanque. MOTONIVELADORA - CAT - Alquiler - 710A1576521944089 (OPERATIVA). Propiedad: Alquiler. H. inicial – H. final: 5140.0. Fin del reporte.
15/04/2026	Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Topaipí, provincia de Rionegro. Vereda/Sector: Suaras - Buenos Aires - SanAntonio - Terminos - Kaquian. Condición climática: Lluvias. Actividad: Cargue y limpieza de via en el sector Pisco Grande, moto y vibro sin actividad programada a la espera del tanque del vibro por parte de gecolsa. Equipos disponibles. Avance (km): 0.0. RETROEXCAVADORA - CAT - Alquiler - 00416TH9P00549 (OPERATIVA). Propiedad: Alquiler. H. inicial – H. final: 1339.2 - 1348.6. VIBROCOMPACTADOR - CATERPILLAR - ICCU - CAT0CS10ED6H03639 (NO OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: VICTOR ADELMO BEJARANO. H. inicial – H. final: 528.0. ACPM (gl):. Intervención mecanica/Repuesto: Se realiza mantenimiento del tanque del combustible por parte de Gecolsa, ala espera de entrega del tanque. MOTONIVELADORA - CAT - Alquiler - 710A1576521944089 (OPERATIVA). Propiedad: Alquiler. H. inicial – H. final: 5140.0. Fin del reporte.
16/04/2026	Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Topaipí, provincia de Rionegro. Vereda/Sector: Suaras - Buenos Aires - SanAntonio - Terminos - Kaquian. Condición climática: Lluvias. Actividad: Cargue y limpieza de via en sabaneta, moto y vibro sin actividad programada a la espera del tanque del vibro por parte de gecolsa. Equipos disponibles. Avance (km): 0.0. RETROEXCAVADORA - CAT - Alquiler - 00416TH9P00549 (OPERATIVA). Propiedad: Alquiler. H. inicial – H. final: 1348.6 - 1358.4. VIBROCOMPACTADOR - CATERPILLAR - ICCU - CAT0CS10ED6H03639 (NO OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: VICTOR ADELMO BEJARANO. H. inicial – H. final: 528.0. ACPM (gl):. Intervención mecanica/Repuesto: Se realiza mantenimiento del tanque del combustible por parte de Gecolsa, ala espera de entrega del tanque. MOTONIVELADORA - CAT - Alquiler - 710A1576521944089 (OPERATIVA). Propiedad: Alquiler. H. inicial – H. final: 5140.0. Fin del reporte.
17/04/2026	Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Topaipí, provincia de Rionegro. Vereda/Sector: Suaras - Buenos Aires - SanAntonio - Terminos - Kaquian. Condición climática: Lluvias. Actividad: Cargue y limpieza de vía en sabaneta, moto y vibro sin actividad programada a la espera del tanque del vibro por parte de gecolsa. Equipos disponibles. Avance (km): 0.0. RETROEXCAVADORA - CAT - Alquiler - 00416TH9P00549 (OPERATIVA). Propiedad: Alquiler. H. inicial – H. final: 1358.4 - 1367.7. VIBROCOMPACTADOR - CATERPILLAR - ICCU - CAT0CS10ED6H03639 (NO OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: VICTOR ADELMO BEJARANO. H. inicial – H. final: 528.0. ACPM (gl):. Intervención mecanica/Repuesto: Se realiza mantenimiento del tanque del combustible por parte de Gecolsa, ala espera de entrega

	del tanque. MOTONIVELADORA - CAT - Alquiler - 710A1576521944089 (OPERATIVA). Propiedad: Alquiler. H. inicial – H. final: 5140.0. Fin del reporte.
18/04/2026	Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Topaipí, provincia de Rionegro. Vereda/Sector: Buenos Aires - SanAntonio - Terminos - Kaquian - Muchipay. Condición climática: Lluvias. Actividad: Cargue y limpieza de vía en el sector Muchipay. Demas equipos sin actividad día Sábado. Avance (km): 0.0. RETROEXCAVADORA - CAT - Alquiler - 00416TH9P00549 (OPERATIVA). Propiedad: Alquiler. H. inicial – H. final: 1367.7 - 1374.0. VIBROCOMPACTADOR - CATERPILLAR - ICCU - CAT0CS10ED6H03639 (NO OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: VICTOR ADELMO BEJARANO. H. inicial – H. final: 528.0. ACPM (gl):. Intervención mecanica/Repuesto: Se realiza mantenimiento del tanque del combustible por parte de Gecolsa, ala espera de entrega del tanque. MOTONIVELADORA - CAT - Alquiler - 710A1576521944089 (OPERATIVA). Propiedad: Alquiler. H. inicial – H. final: 5140.0. Fin del reporte.
20/04/2026	Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Topaipí, provincia de Rionegro. Vereda/Sector: SanAntonio - Terminos - Kaquian - Muchipay - Sabaneta. Condición climática: Lluvias. Actividad: Cargue y limpieza de vía en el sector Sabaneta. Demas equipos sin actividad por vibro inoperativo. Avance (km): 0.0. RETROEXCAVADORA - CAT - Alquiler - 00416TH9P00549 (OPERATIVA). Propiedad: Alquiler. H. inicial – H. final: 1374.0 - 1383.6. VIBROCOMPACTADOR - CATERPILLAR - ICCU - CAT0CS10ED6H03639 (NO OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: VICTOR ADELMO BEJARANO. H. inicial – H. final: 528.0. ACPM (gl):. Intervención mecanica/Repuesto: Se realiza mantenimiento del tanque del combustible por parte de Gecolsa, ala espera de entrega del tanque. MOTONIVELADORA - CAT - Alquiler - 710A1576521944089 (OPERATIVA). Propiedad: Alquiler. H. inicial – H. final: 5140.0 - 5141.0. Fin del reporte.
21/04/2026	Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Topaipí, provincia de Rionegro. Vereda/Sector: SanAntonio - Terminos - Kaquian - Muchipay - Sabaneta. Condición climática: Lluvias. Actividad: Cargue y limpieza de vía en el sector Pisco Grande. Motoniveladora realizo conformación de vía en zona veredal. a la espera del vibro. Avance (km): 0.25. RETROEXCAVADORA - CAT - Alquiler - 00416TH9P00549 (OPERATIVA). Propiedad: Alquiler. H. inicial – H. final: 1383.6 - 193.3. VIBROCOMPACTADOR - CATERPILLAR - ICCU - CAT0CS10ED6H03639 (NO OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: VICTOR ADELMO BEJARANO. H. inicial – H. final: 528.0. ACPM (gl):. Intervención mecanica/Repuesto: Se realiza mantenimiento del tanque del combustible por parte de Gecolsa, ala espera de entrega del tanque. MOTONIVELADORA - CAT - Alquiler - 710A1576521944089 (OPERATIVA). Propiedad: Alquiler. H. inicial – H. final: 5141.0 - 5143.0. Fin del reporte.
22/04/2026	Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Topaipí, provincia de Rionegro. Vereda/Sector: SanAntonio - Terminos - Kaquian - Muchipay - Sabaneta - Castaño. Condición climática: Lluvias. Actividad: Cargue y limpieza de vía en el sector Castaño. Motoniveladora realizo conformación de vía en zona veredal. Vibro inopertaivo. Avance (km): 0.5. RETROEXCAVADORA - CAT - Alquiler - 00416TH9P00549 (OPERATIVA). Propiedad: Alquiler. H. inicial – H. final: 193.3 - 1403.4. VIBROCOMPACTADOR - CATERPILLAR - ICCU - CAT0CS10ED6H03639 (NO OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: VICTOR ADELMO BEJARANO. H. inicial – H. final: 528.0. ACPM (gl):. Intervención mecanica/Repuesto: Se realiza

	mantenimiento del tanque del combustible por parte de Gecolsa, ala espera de entrega del tanque. MOTONIVELADORA - CAT - Alquiler - 710A1576521944089 (OPERATIVA). Propiedad: Alquiler. H. inicial – H. final: 5143.0 - 5148.9. Fin del reporte.
23/04/2026	Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Topaipí, provincia de Rionegro. Vereda/Sector: SanAntonio - Terminos - Kaquian - Muchipay - Sabaneta - Castaño. Condición climática: Lluvias. Actividad: Cargue y limpieza de vía en el sector Naranjal. Motoniveladora realizo conformación de vía en zona veredal. Motoniveladora a la espera de operatividad de vibro. Avance (km): 0.1. RETROEXCAVADORA - CAT - Alquiler - 00416TH9P00549 (OPERATIVA). Propiedad: Alquiler. H. inicial – H. final: 1403.4 - 1413.4. VIBROCOMPACTADOR - CATERPILLAR - ICCU - CAT0CS10ED6H03639 (NO OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: VICTOR ADELMO BEJARANO. H. inicial – H. final: 528.0. ACPM (gl):. Intervención mecanica/Repuesto: Se realiza mantenimiento del tanque del combustible por parte de Gecolsa, ala espera de entrega del tanque. MOTONIVELADORA - CAT - Alquiler - 710A1576521944089 (OPERATIVA). Propiedad: Alquiler. H. inicial – H. final: 5148.9 - 5149.2. Fin del reporte.
24/04/2026	Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Topaipí, provincia de Rionegro. Vereda/Sector: SanAntonio - Terminos - Kaquian - Muchipay - Sabaneta - Castaño. Condición climática: Lluvias. Actividad: Cargue y limpieza de vía en el sector Naranjal. Motoniveladora realizo conformación de vía en zona veredal. Motoniveladora a la espera de operatividad de vibro. Avance (km): 0.1. RETROEXCAVADORA - CAT - Alquiler - 00416TH9P00549 (OPERATIVA). Propiedad: Alquiler. H. inicial – H. final: 1413.4 - 1423.7. VIBROCOMPACTADOR - CATERPILLAR - ICCU - CAT0CS10ED6H03639 (NO OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: VICTOR ADELMO BEJARANO. H. inicial – H. final: 528.0. ACPM (gl):. Intervención mecanica/Repuesto: Se realiza mantenimiento del tanque del combustible por parte de Gecolsa, ala espera de entrega del tanque. MOTONIVELADORA - CAT - Alquiler - 710A1576521944089 (OPERATIVA). Propiedad: Alquiler. H. inicial – H. final: 5149.2 - 5150.5. Fin del reporte.
25/04/2026	. Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Topaipí, provincia de Rionegro. Vereda/Sector: SanAntonio - Terminos - Kaquian - Muchipay - Sabaneta - Castaño. Condición climática: Lluvias. Actividad: Cargue y limpieza de vía en el sector MUchipay. Demas equipos sin Actividad día sábado. Avance (km): 0.0. RETROEXCAVADORA - CAT - Alquiler - 00416TH9P00549 (OPERATIVA). Propiedad: Alquiler. H. inicial – H. final: 1423.7 - 1429.5. VIBROCOMPACTADOR - CATERPILLAR - ICCU - CAT0CS10ED6H03639 (NO OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: VICTOR ADELMO BEJARANO. H. inicial – H. final: 528.0. ACPM (gl):. Intervención mecanica/Repuesto: Se realiza mantenimiento del tanque del combustible por parte de Gecolsa, ala espera de entrega del tanque. MOTONIVELADORA - CAT - Alquiler - 710A1576521944089 (OPERATIVA). Propiedad: Alquiler. H. inicial – H. final: 5150.5. Fin del reporte.
27/04/2026	Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Topaipí, provincia de Rionegro. Vereda/Sector: SanAntonio - Terminos - Kaquian - Muchipay - Sabaneta - Castaño. Condición climática: Lluvias. Actividad: Cargue y limpieza de vía en el sector Monte Alegre. Se interviene Vibrocompactador por parte de Gecolsa. Motoniveladora disponible. Avance (km): 0.0. RETROEXCAVADORA - CAT - Alquiler -

	00416TH9P00549 (OPERATIVA). Propiedad: Alquiler. H. inicial – H. final: 1429.5 - 1438.6. VIBROCOMPACTADOR - CATERPILLAR - ICCU - CAT0CS10ED6H03639 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: VICTOR ADELMO BEJARANO. H. inicial – H. final: 528.0. ACPM (gl):. Intervención mecanica/Repuesto: Se realiza mantenimiento del tanque del combustible por parte de Gecolsa. MOTONIVELADORA - CAT - Alquiler - 710A1576521944089 (OPERATIVA). Propiedad: Alquiler. H. inicial – H. final: 5150.5 - 5151.3. Fin del reporte.
28/04/2026	Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Topaipí, provincia de Rionegro. Vereda/Sector: SanAntonio - Terminos - Kaquian - Muchipay - Sabaneta - Castaño. Condición climática: Lluvias. Actividad: Cargue y limpieza de vía en el sector Nacopay. Se interviene Vibrocompactador por parte de Gecolsa. Motoniveladora disponible. Avance (km): 0.1. RETROEXCAVADORA - CAT - Alquiler - 00416TH9P00549 (OPERATIVA). Propiedad: Alquiler. H. inicial – H. final: 1438.6 - 1447.3. VIBROCOMPACTADOR - CATERPILLAR - ICCU - CAT0CS10ED6H03639 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: VICTOR ADELMO BEJARANO. H. inicial – H. final: 528.0. ACPM (gl):. Intervención mecanica/Repuesto: Se realiza mantenimiento del tanque del combustible por parte de Gecolsa. MOTONIVELADORA - CAT - Alquiler - 710A1576521944089 (OPERATIVA). Propiedad: Alquiler. H. inicial – H. final: 5151.3. Fin del reporte.
29/04/2026	Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Topaipí, provincia de Rionegro. Vereda/Sector: SanAntonio - Terminos - Kaquian - Muchipay - Sabaneta - Castaño. Condición climática: Lluvias. Actividad: Cargue y limpieza de vía en el sector Pisco chiquito. Se termina de intervenir Vibrocompactador por parte de Gecolsa. Motoniveladora disponible. Avance (km): 0.1. RETROEXCAVADORA - CAT - Alquiler - 00416TH9P00549 (OPERATIVA). Propiedad: Alquiler. H. inicial – H. final: 1447.3 - 1457.0. VIBROCOMPACTADOR - CATERPILLAR - ICCU - CAT0CS10ED6H03639 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: VICTOR ADELMO BEJARANO. H. inicial – H. final: 528.0. ACPM (gl):. Intervención mecanica/Repuesto: Se realiza mantenimiento del tanque del combustible por parte de Gecolsa. MOTONIVELADORA - CAT - Alquiler - 710A1576521944089 (OPERATIVA). Propiedad: Alquiler. H. inicial – H. final: 5151.3. Fin del reporte.
30/04/2026	Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Topaipí, provincia de Rionegro. Vereda/Sector: SanAntonio - Terminos - Kaquian - Muchipay - Sabaneta - Castaño. Condición climática: Lluvias. Actividad: Cargue y limpieza de vía en el sector Monte Alegre. Vibro se desplaza hacia el sector se san Antonio de aguilera. Motoniveladora sin actividad. Avance (km): 0.0. RETROEXCAVADORA - CAT - Alquiler - 00416TH9P00549 (OPERATIVA). Propiedad: Alquiler. H. inicial – H. final: 1457.0 - 1467.0. VIBROCOMPACTADOR - CATERPILLAR - ICCU - CAT0CS10ED6H03639 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: VICTOR ADELMO BEJARANO. H. inicial – H. final: 528.0 - 532.2. ACPM (gl):. Intervención mecanica/Repuesto: Se realiza mantenimiento del tanque del combustible por parte de Gecolsa. MOTONIVELADORA - CAT - Alquiler - 710A1576521944089 (OPERATIVA). Propiedad: Alquiler. H. inicial – H. final: 5151.3. Fin del reporte.

5. RELACIÓN DE TRANSPORTE Y REMISIÓN DE MATERIALES

RELACION DE TRANSPORTE Y REMISION DE MATERIALES.
NO APLICA

6. AVANCE EN CAMPO (KM)

AVANCE DE OBRA TOPAIPI				
FECHA	LONGITUD (KM)	AVANCE (KM)	REPETICIÓN (KM)	DESCRIPCIÓN
1/04/2026	0	0		SIN ACITIVIDAD
2/04/2026	0	0		FESTIVO
3/04/2026	0	0		FESTIVO
4/04/2026	0	0		FESTIVO
5/04/2026	0	0		FESTIVO
6/04/2026	0.7	0.7		SOLEADO
7/04/2026	0.7	1.4		SOLEADO
8/04/2026	0.5	1.9		SOLEADO
9/04/2026	0	1.9		LLUVIAS
10/04/2026	0	1.9		LLUVIAS
11/04/2026	DOMINGO			
12/04/2026	0	1.9		LLUVIAS
13/04/2026	0	1.9		LLUVIAS
14/04/2026	0	1.9		VIBRO INOPERATIVO
15/04/2026	0	1.9		VIBRO INOPERATIVO
16/04/2026	0	1.9		VIBRO INOPERATIVO
17/04/2026	0	1.9		VIBRO INOPERATIVO
18/04/2026	0	1.9		VIBRO INOPERATIVO
19/04/2026	DOMINGO			
20/04/2026	0.1	2		SOLEADO
21/04/2026	0.5	2.5		SOLEADO
22/04/2026	0.1	2.6		SOLEADO
23/04/2026	0.1	2.7		LLUVIAS/VIBRO INOP
24/04/2026	0.1	2.8		LLUVIAS/VIBRO INOP
25/04/2026	0	2.8		LLUVIAS/VIBRO INOP
26/04/2026	DOMINGO			
27/04/2026	0.1	2.9		LLUVIAS
28/04/2026	0	2.9		LLUVIAS
29/04/2026	0	2.9		LLUVIAS
30/04/2026	0	2.9		LLUVIAS
TOTAL	2.9	2.9		

7. RESUMEN DE HORAS DE LLUVIA, INOPERATIVIDAD Y EFECTIVAS LABORALES

RESUMEN DE HORAS DE LLUVIA, INOPERATIVIDAD Y EFECTIVAS LABORALES				
FECHA	**HORAS DE LLUVIA**	**HORAS DE INOPERATIVIDAD**	**HORAS EFECTIVAS**	**DESCRIPCIÓN**
1/04/2026	8	0	0	**SOLEADO**
2/04/2026	0	0	0	**FESTIVO**
3/04/2026	0	0	0	**FESTIVO**
4/04/2026	0	0	0	**FESTIVO**
5/04/2026	0	0	0	**FESTIVO**
6/04/2026	0	0	8	**SOLEADO**
7/04/2026	0	0	8	**SOLEADO**
8/04/2026	0	0	8	**SOLEADO**
9/04/2026	0	0	8	**SOLEADO**
10/04/2026	0	0	8	**SOLEADO**
11/04/2026	**DOMINGO**			
12/04/2026	8	0	0	**LLUVIAS**
13/04/2026	8	0	0	**LLUVIAS**
14/04/2026	0	0	8	**SOLEADO**
15/04/2026	0	0	8	**SOLEADO**
16/04/2026	0	0	8	**SOLEADO**
17/04/2026	0	0	8	**SOLEADO**
18/04/2026	0	0	8	**SOLEADO**
19/04/2026	**DOMINGO**			
20/04/2026	0	0	8	**SOLEADO**
21/04/2026	0	0	8	**SOLEADO**
22/04/2026	0	0	8	**SOLEADO**
23/04/2026	0	0	8	**SOLEADO**
24/04/2026	0	0	8	**SOLEADO**
25/04/2026	0	0	8	**SOLEADO**
26/04/2026	**DOMINGO**			
27/04/2026	0	0	8	**SOLEADO**
28/04/2026	0	0	8	**SOLEADO**
29/04/2026	0	0	8	**SOLEADO**
30/04/2026	0	0	8	**SOLEADO**
TOTAL	**8**	**0**	**176**	

8. MOVILIZACIONES










MOVILIZACIONES
No se realizaron movilizaciones en este mes

9. MANTENIMIENTOS



MANTENIMIENTOS			
FECHA	**EQUIPO**	**SERIAL**	**DESCRIPCIÓN**
10-04-2026	VIBRO	CAT0CS10ED6H03639	MANTENIMIENTO GENERAL DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE(GECOLSA)
27-04-2026	VIBRO	CAT0CS10ED6H03639	SE INSTALA TANQUE DE COMBUSTIBLE Y FILTROS (GECOLSA)

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025

10. CONTROL DE TRABAJO MAQUINARIA









UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025	CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA ALQUILADA						ICCU
OBJETO	"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".						
PERIODO:	ABRIL						
MUNICIPIO:	TOPAIPI						
MAQUINA:	RETROEXCAVADORA					SERIE	CAT 0549
FECHA	REGISTRO FOTOGRÁFICO HOROMETRO INICIAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO HOROMETRO FINAL	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS	STAND BY	OBSERVACIÓN
1/04/2026			1289	1289	0		LLUVIAS
2/04/2026	X	X	1289	1289	0		FESTIVO
3/04/2026	X	X	1289	1289	0		FESTIVO
4/04/2026	X	X	1289	1289	0		FESTIVO
5/04/2026	X	X	1289	1289	0		FESTIVO
6/04/2026			1289	1298.5	9.5		
7/04/2026			1298.5	1301.9	3.4		
8/04/2026			1301.9	1306	4.1		
9/04/2026			1306	1314.1	8.1		
10/04/2026			1314.1	1320.4	6.3		
11/04/2026			1320.4	1324.5	4.1		
12/04/2026			1324.5	1324.5	0		
13/04/2026			1324.5	1332.8	8.3		
14/04/2026			1332.8	1339.2	6.4		
15/04/2026			1339.2	1348.6	9.4		
16/04/2026			1348.6	1358.4	9.8		
17/04/2026			1358.4	1367.7	9.3		

UNIÓN TEMPORAL ICCU PARQUE 2025
NIT 902.017.719 -3










18/04/2026			1367.7	1374	6.3		
19/04/2026			1374	1374	0		
20/04/2026			1374	1383.6	9.6		
21/04/2026			1383.6	1393.3	9.7		
22/04/2026			1393.3	1403.4	10.1		
23/04/2026			1403.4	1413.4	10		
24/04/2026			1413.4	1423.7	10.3		
25/04/2026			1423.7	1429.5	5.8		
26/04/2026			1429.5	1429.5	0		
27/04/2026			1429.5	1438.6	9.1		
28/04/2026			1438.6	1447.3	8.7		
29/04/2026			1447.3	1457	9.7		
30/04/2026			1457	1467	10		
SUBTOTAL MES					**178.0**	**0.0**	
TOTAL MES						**178.0**	

Firma		**Firma**	
Nombre:	**RICARDO ORTIZ**	**Nombre:**	**NICOLAS OCHOA**
INSPECTOR UNION TEMPORAL PARQUE 2025		**INSPECTOR ICCU**	

MOTONIVELADORA ALQUILER CAT944089

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025	CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA ALQUILADA						ICCU
OBJETO	"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".						
PERIODO:	ABRIL						
MUNICIPIO:	TOPAIPI						
MAQUINA:	MOTONIVELADORA					SERIE	710A1576521944089
FECHA	REGISTRO FOTOGRÁFICO HOROMETRO INICIAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO HOROMETRO FINAL	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS	STAND BY	OBSERVACIÓN
1/04/2026			5130.3	5130.3	0	5	SIN ACTIVIDAD PROGRAMADA
2/04/2026	X	X	5130.3	5130.3	0		FESTIVO
3/04/2026	X	X	5130.3	5130.3	0		FESTIVO
4/04/2026	X	X	5130.3	5130.3	0		FESTIVO
5/04/2026	X	X	5130.3	5130.3	0		FESTIVO
6/04/2026			5130.3	5134.5	4.2	0.8	
7/04/2026			5134.5	5136.1	1.6	3.4	
8/04/2026			5136.1	5140	3.9	1.1	
9/04/2026			5140	5140	0	5	TERRENO SATURADO
10/04/2026			5140	5140	0	5	TERRENO SATURADO
11/04/2026			5140	5140	0		SABADO
12/04/2026			5140	5140	0		DOMINGO
13/04/2026			5140	5140	0	5	LLUVIAS
14/04/2026			5140	5140	0	5	VIBRO INOPERATIVO
15/04/2026			5140	5140	0	5	VIBRO INOPERATIVO
16/04/2026			5140	5140	0	5	VIBRO INOPERATIVO
17/04/2026			5140	5140	0	5	VIBRO INOPERATIVO

UNIÓN TEMPORAL ICCU PARQUE 2025
NIT 902.017.719 -3

18/04/2026			5140	5140	0		
19/04/2026			5140	5140	0		
20/04/2026			5140	5141	1	4	
21/04/2026			5141	5143.2	2.2	2.8	
22/04/2026			5143.2	5148.9	5.7		
23/04/2026			5148.9	5149.2	0.3	4.7	LLUVIAS/VIBRO INP
24/04/2026			5149.2	5150.5	1.3	3.7	LLUVIAS/VIBRO INP
25/04/2026			5150.5	5150.5	0		
26/04/2026			5150.5	5150.5	0		
27/04/2026			5150.5	5151.3	0.8	4.2	LLUVIAS
28/04/2026			5151.3	5151.3	0	5	LLUVIAS
29/04/2026			5151.3	5151.3	0	5	LLUVIAS
30/04/2026			5151.3	5151.3	0		SIN ACTIVIDAD
SUBTOTAL MES					**21.0**	**74.7**	
TOTAL MES						**95.7**	
Firma			**Firma**				
Nombre:	**RICARDO ORTIZ**		**Nombre:**		**NICOLAS OCHOA**		
INSPECTOR UNION TEMPORAL PARQUE 2025			**INSPECTOR ICCU**				

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025

UNIÓN TEMPORAL ICCU PARQUE 2025
NIT 902.017.719 -3

VIBROCOMPACTADOR CAT03639

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025	CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA, VOLQUETAS Y TRACTOCAMIÓN E INSUMOS BASICOS											ICCU
OBJETO	"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".											
PERIODO:	ABRIL											
MUNICIPIO:	TOPAIPI						PROVINCIA:	RIO NEGRO				
MAQUINA:	VIBROCOMPACTADOR CATERPILLAR						SERIE	CAT0CS10ED6H03639				
CONTROL HORARIO				ACPM				UREA				OBSERVACIÓN
FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS	ACPM (GLS)	HOROMETRO DE TANQUEO	RENDIMIENTO	No. TIRILLA	UREA	HOROMETRO DE TANQUEO	RENDIMIENTO	No. TIRILLA	
1/04/2026	523.1	523.1	0	26.246	523.1		1					EDS SERVITECA/ SIN FACTURA ELECTRONICA
2/04/2026	523.1	523.1	0									FESTIVO
3/04/2026	523.1	523.1	0									FESTIVO
4/04/2026	523.1	523.1	0									FESTIVO
5/04/2026	523.1	523.1	0									FESTIVO
6/04/2026	523.1	526	2.9									
7/04/2026	526	526	0									
8/04/2026	526	528	2									
9/04/2026	528	528	0									
10/04/2026	528	528	0									INOPERATIVO/MANTENIMIENTO GECOLSA
11/04/2026	528	528	0									INOPERATIVO/MANTENIMIENTO GECOLSA
12/04/2026	528	528	0									INOPERATIVO/MANTENIMIENTO GECOLSA
13/04/2026	528	528	0									INOPERATIVO/MANTENIMIENTO GECOLSA
14/04/2026	528	528	0									INOPERATIVO/MANTENIMIENTO GECOLSA
15/04/2026	528	528	0									INOPERATIVO/MANTENIMIENTO GECOLSA
16/04/2026	528	528	0									INOPERATIVO/MANTENIMIENTO GECOLSA
17/04/2026	528	528	0									INOPERATIVO/MANTENIMIENTO GECOLSA
18/04/2026	528	528	0									INOPERATIVO/MANTENIMIENTO GECOLSA
19/04/2026	528	528	0									INOPERATIVO/MANTENIMIENTO GECOLSA
20/04/2026	528	528	0									INOPERATIVO/MANTENIMIENTO GECOLSA
21/04/2026	528	528	0									INOPERATIVO/MANTENIMIENTO GECOLSA
22/04/2026	528	528	0									INOPERATIVO/MANTENIMIENTO GECOLSA
23/04/2026	528	528	0									INOPERATIVO/MANTENIMIENTO GECOLSA
24/04/2026	528	528	0									INOPERATIVO/MANTENIMIENTO GECOLSA
25/04/2026	528	528	0									INOPERATIVO/MANTENIMIENTO GECOLSA
26/04/2026	528	528	0									INOPERATIVO/MANTENIMIENTO GECOLSA
27/04/2026	528	528	0									INOPERATIVO/MANTENIMIENTO GECOLSA
28/04/2026	528	528	0									INOPERATIVO/MANTENIMIENTO GECOLSA
29/04/2026	528	528	0									OPERATIVO
30/04/2026	528	532.2	4.2	35.003	532.2	3.8	123					OPERATIVO/SE LIMPIA TANQUE DE COMBUSTIBLE
TOTAL MES			9.10	61.25		3.85		0.00		0.00		

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025

CLL 13 # 47 – 12 BOGOTA – CUNDINAMARCA D.C TEL 313 258 3561
EMAIL: COORDINACION.ICCU.2026@GMAIL.COM

11. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de abril de 2026, en el municipio de Topaipí, provincia de Rionegro, se ejecutaron actividades de mantenimiento vial en diferentes sectores veredales, tales como San Antonio, Kaquian, Sabaneta, Muchipay, Castaño, Naranjal, entre otros.

Las labores desarrolladas se enfocaron principalmente en la remoción de derrumbes, cargue de material, limpieza de vía y conformación de tramos específicos, alcanzando un **avance físico acumulado del 30%**, se intervino aproximadamente **2.9 km intervenidos**. Asimismo, se registró un total de **176 horas efectivas de operación**, reflejando la continuidad de los trabajos dentro de las condiciones disponibles.

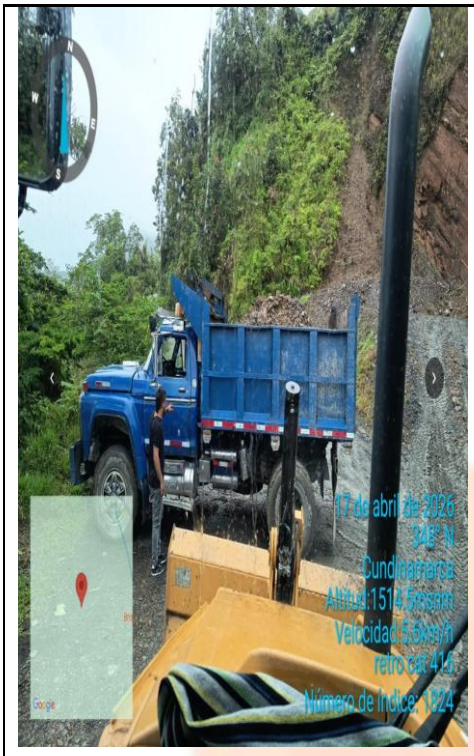
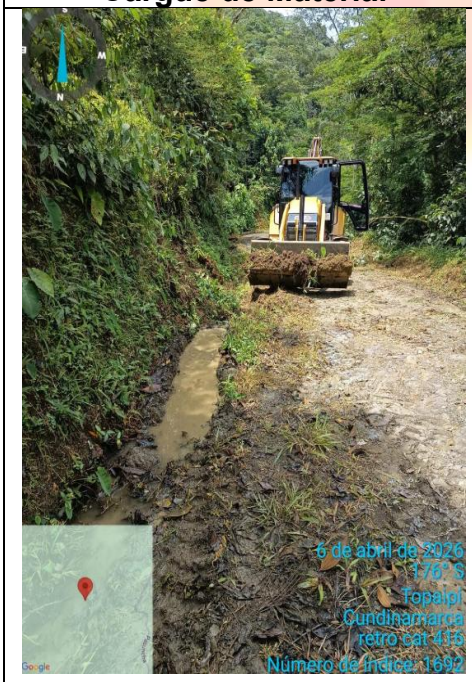
No obstante, la ejecución de las actividades se vio significativamente afectada por las **condiciones climáticas adversas**, caracterizadas por lluvias constantes durante gran parte del mes, lo que limitó la continuidad y eficiencia de los trabajos programados.

De igual forma, se evidenció una disminución en el rendimiento operativo debido a la inoperatividad del vibrocompactador, ocasionada por intervenciones mecánicas en el sistema de combustible realizadas por Gecolsa. Esta situación restringió la ejecución de actividades de compactación, afectando directamente la conformación de las vías junto a la motoniveladora que se mantuvo en disponibilidad.

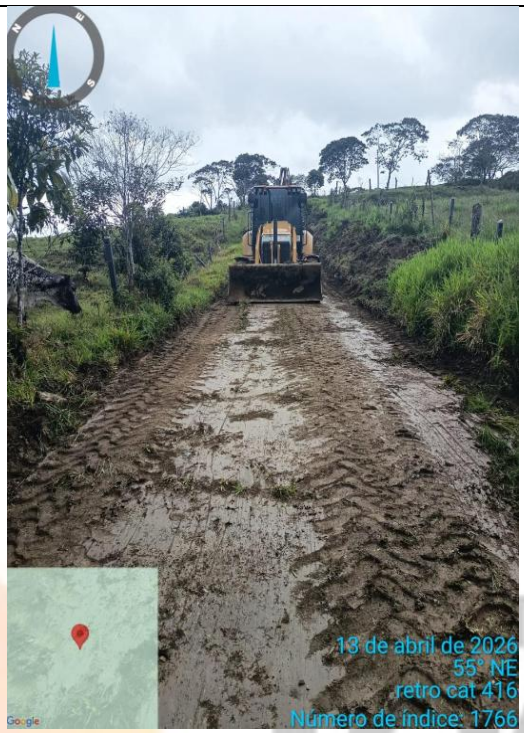
A pesar de estas limitaciones, la retroexcavadora mantuvo una operación continua, permitiendo la atención oportuna de emergencias viales y apoyo en actividades de cargue y limpieza. Por su parte, la motoniveladora operó de manera intermitente, condicionada por el estado del terreno y la disponibilidad del equipo de compactación.

En términos generales, el desarrollo del proyecto durante el mes estuvo condicionado por factores climáticos y operativos que incidieron en el cumplimiento de las metas de avance. Sin embargo, se garantizó la intervención de puntos críticos y la conservación de la transitabilidad en los sectores atendidos.

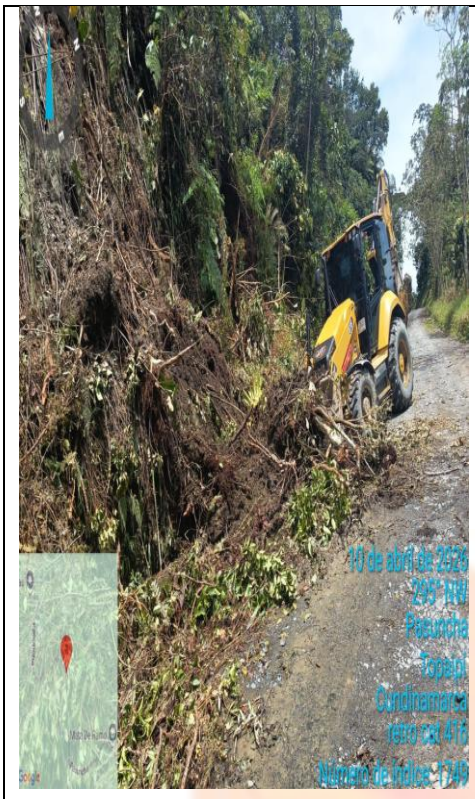
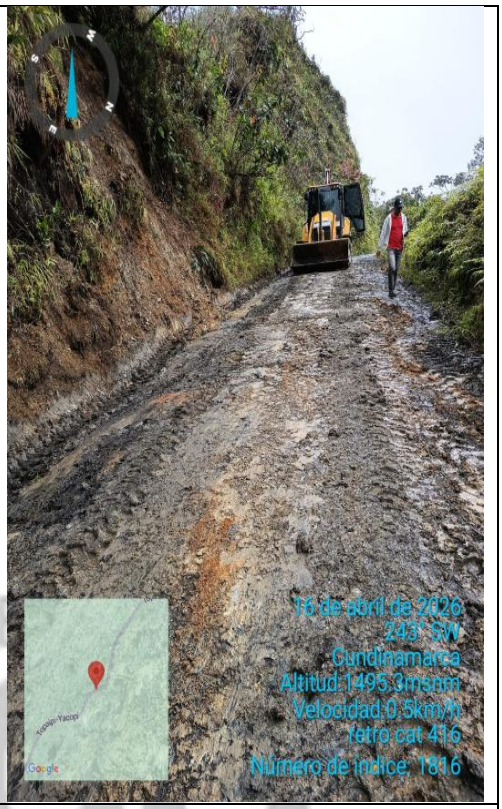
12. REGISTRO FOTOGRÁFICO

		
Cargue de Material	**Remoción de derrumbes**	**Mantenimiento Vibro**
		
Limpieza de Vía	**Remoción de derrumbes**	**Mejoramiento de vía**

UNIÓN TEMPORAL ICCU PARQUE 2025
NIT 902.017.719 -3

		
Compactación de vía	**Perfilando Vía**	**Mejoramiento de Vía**
		
Mantenimiento Vibro	**Equipos disponibles**	**Conformación de via**

CLL 13 # 47 – 12 BOGOTA – CUNDINAMARCA D.C TEL 313 258 3561
EMAIL: COORDINACION.ICCU.2026@GMAIL.COM

		
Remoción de derrumbes	**Perfilación de vía**	**Mejoramiento Vía**

Nicolas Mauricio Ochoa
INSPECTOR ICCU

Ricardo Ortiz
INSPECTOR UT ICCU PARQUE 2025

CONTRATO ICCU-CTO 1595 DE 2025

INFORME DE AVANCE N°3
PERIODO: ABRIL DEL 2026

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025

PROVINCIA: RIO NEGRO
MUNICIPIO: YACOPI

INFORME DE ACTIVIDADES – PROVINCIA RIO NEGRO
MUNICIPIO DE YACOPI

OBJETO: "ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOSPARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

1. LOCALIZACIÓN

Provincia Rio Negro

Yacopí:

#	EQUIPO	SERIAL
1	VIBROCOMPACTADOR AMMANN ASC 70	3003610
2	RETROEXCAVADORA CASE 580SN	JJGN58SRKJC754124
3	VOLQUETA SENCILLA INTERNATIONAL MV607 SBA	GZM 756
4	RETROEXCAVADORA JHON DEERE - ALQUILER	JHDEERE3688
5	MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K	CAT0120KCSZN01630
6	RETROEXCAVADORA JCB 3CXTT	S0R3CXTTCM2936945
7	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS LBX - LINK BELT 210X2	LBX210Q5NDEX2154
8	VOLQUETA SENCILLA INTERNATIONAL	GZM 769

Imagen 1. Ubicación



Fuente: Google Earth

Ubicación:
YACOPI: Llano Mateo – La Ye- Alto del Aguila- Salamanca- Castillo – Tórtolas – Bejucales. – Caipal.

Imagen 2 ubicación de las maquinas



Fuente: Google Maps

2. GRUPO DE TRABAJO

CARGO	NOMBRES
INSPECTOR DE OBRA UT	RICARDO ANDRES ORTIZ VASQUEZ
INSPECTOR DE OBRA ICCU	NICOLAS MAURICIO OCHOA LINARES
OPERADOR VIBROCOMPACTADOR AMMANN ASC 70 3610	WILSON WILCHEZ VELASQUEZ
RETROEXCAVADORA CASE 580SN 4124	PEDRO JOSE BELTRAN PARDO
CONDUCTOR VOLQUETA SENCILLA GZM 756	JOSE EDWIN CAMBERO
RETROEXCAVADORA JHON DEERE - ALQUILER	HERNANDO BONILLA
MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K 1630	RAMON SERRATO ALVAREZ
RETROEXCAVADORA JCB 3CXTT 6945	JUAN SEBASTIAN PACHECO PAEZ
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS LBX - LINK BELT 210X2 2154	ROBINSON EDUARDO OLAYA MAHECHA
CONDUCTOR VOLQUETA SENCILLA GZM 769	BRAYAN PACHECO

1. PLAN DE TRABAJO

Las actividades ejecutadas en el frente del municipio de Yacopí fueron desarrolladas conforme al plan de trabajo suministrado y direccionado por la Alcaldía Municipal, quien definió las prioridades de intervención y los lineamientos operativos para la atención de la emergencia vial basada en la maquinaria amarilla presentada.

AVANCE 30%

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MUNICIPIO DE YACOPI

MAQUINAS	FEBRERO				MARZO				ABRIL			
	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12
Motoniveladora	Conformación vías Llano Matero – La Ye – Azucena – Alto del Águila – Salamanca – Agua del Perro	Conformación vías Llano Matero – La Ye – Azucena – Alto del Águila – Salamanca – Agua del Perro	Conformación vías Llano Matero – La Ye – Azucena – Alto del Águila – Salamanca – Agua del Perro	Conformación vías Llano Matero – La Ye – Azucena – Alto del Águila – Salamanca – Agua del Perro	Sector El Castillo	Sector El Castillo	Sector El Castillo	Sector El Castillo	Castillo – Patevaca	Castillo – Patevaca	Castillo – Patevaca	Castillo – Patevaca
Vibrocompactador	Conformación vías Llano Matero – La Ye – Azucena – Alto del Águila – Salamanca – Agua del Perro	Conformación vías Llano Matero – La Ye – Azucena – Alto del Águila – Salamanca – Agua del Perro	Conformación vías Llano Matero – La Ye – Azucena – Alto del Águila – Salamanca – Agua del Perro	Conformación vías Llano Matero – La Ye – Azucena – Alto del Águila – Salamanca – Agua del Perro	Sector El Castillo	Sector El Castillo	Sector El Castillo	Sector El Castillo	Castillo – Patevaca	Castillo – Patevaca	Castillo – Patevaca	Castillo – Patevaca
Retroexcavadora	Vereda Pueblo Nuevo	Vereda Pueblo Nuevo	Vereda Pueblo Nuevo	Vereda Pueblo Nuevo	Sector El Castillo	Sector El Castillo	Sector El Castillo	Sector El Castillo	Castillo – Patevaca	Castillo – Patevaca	Castillo – Patevaca	Castillo – Patevaca
Volquetas	Transporte de recebo San Luis – Alonso / traslado de combustible	Transporte de recebo San Luis – Alonso / traslado de combustible	Transporte de recebo San Luis – Alonso / traslado de combustible	Transporte de recebo San Luis – Alonso / traslado de combustible	Transporte de material sector El Castillo	Transporte de material sector El Castillo	Transporte de material sector El Castillo	Transporte de material sector El Castillo	Transporte de material Castillo – Patevaca	Transporte de material Castillo – Patevaca	Transporte de material Castillo – Patevaca	Transporte de material Castillo – Patevaca
Excavadora	Sector Collarejas	Sector Collarejas	Sector Collarejas	Sector Collarejas	Sector Palma Rajada	Sector Palma Rajada	Sector Palma Rajada	Sector Palma Rajada	Sector Palma Rajada	Patevaca	Patevaca	Patevaca

Fuente: Alcaldía Municipal de Yacopí

2. CRONOGRAMA EJECUTADO

FECHA	ACTIVIDADES REGISTRADAS EN BITÁCORA
01/04/2026	Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Yacopí, provincia de Rionegro. Vereda/Sector: MUÑOZ - BEJUCALES - APOSENTOS - TORTOLAS - CAIPAL. Actividad: Retro en alquiler cargue de material y mejoramiento de vía en Aposentos, retro JCB arreglo paso críticos en sector Avipay. Motoniveladora y vibro conformación de vía el Sector el Castillo. Transporte de material en el sector el castillo. Avance (km): 0.4. VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - GZM756 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: JOSE EDWIN CAMBEROS. Número de viajes material sobrante: 6. H. inicial – H. final: 5554 - 5560. Kilometraje inicial - final: 73656 - 73677. VOLQUETA_SENCILLA - - ICCU - GZM769 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: BRAYAN PACHECO. Número de viajes material sobrante: 6. H. inicial – H. final: 5700 - 5705. Kilometraje inicial - final: 148396 - 148410. MOTONIVELADORA - CATERPILLAR - ICCU - CATERPILLAR1630 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: RAMON SERRATO. H. inicial – H. final: 12145.7 - 12150.0. VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - 3003610 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: WILSON WILCHEZ. H. inicial – H. final: 3633.2 - 3637.7. RETROEXCAVADORA - CASE - ICCU - JJGN58SRKJC754124 (NO OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: PEDRO JOSE BELTRAN. H. inicial – H. final: 5375.9. Novedades mecánicas: Segunda sección del brazo no cierra, queda con el brazo estirado. Garantía de banco de válvulas. RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - 2936945 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: SEBASTIAN PACHECO. H. inicial – H. final: 5751.5 - 5760.0. Combustible: 35.000 GL. Intervención mecánica/Repuesto: Se soldaron ambos baldes frontal y trasero. Quedo Operativo. EXCAVADORA_DE_ORUGAS - LBX - ICCU - 21005NOHEX2154 (NO OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: ROBINSO OLAYA. H. inicial – H. final: 8513.4. Novedades mecánicas: El equipo queda inoperativo, el motor esta botando agua. Intervención mecánica/Repuesto: Se reviso equipo, tiene todo los filtros tapados. RETROEXCAVADORA - JHON DEERE - Alquiler - 883688 (OPERATIVA). Propiedad: Alquiler. H. inicial – H. final: 19348.2 - 19355.8. Fin del reporte.
06/04/2026	Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Yacopí, provincia de Rionegro. Vereda/Sector: MUÑOZ - BEJUCALES - APOSENTOS - TORTOLAS - CAIPAL. Actividad: Retro en alquiler cargue de material y mejoramiento de vía en Aposentos, retro JCB arreglo paso críticos en sector Avipay. Motoniveladora y vibro conformación de vía el Sector el Castillo. Transporte de material en el sector el castillo. Avance (km): 0.3. VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - GZM756 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: JOSE EDWIN CAMBEROS. Número de viajes material sobrante: 7. H. inicial – H. final: 5560 - 5566. Kilometraje inicial - final: 73677 - 73718. VOLQUETA_SENCILLA - - ICCU - GZM769 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: BRAYAN PACHECO. Número de viajes material sobrante: 7. H. inicial – H. final: 5705 - 5713. Kilometraje inicial - final: 148410 - 1488432. MOTONIVELADORA - CATERPILLAR - ICCU - CATERPILLAR1630 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: RAMON SERRATO. H. inicial – H. final: 12150.0 - 12153.4. VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - 3003610 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: WILSON WILCHEZ. H. inicial – H. final: 3637.7 - 3641.7. RETROEXCAVADORA - CASE - ICCU - JJGN58SRKJC754124 (NO OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: PEDRO JOSE BELTRAN. H. inicial – H. final: 5375.9. Novedades mecánicas: Segunda sección del brazo no cierra, queda con el brazo estirado. Garantía de banco de válvulas. RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - 2936945 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: SEBASTIAN PACHECO. H. inicial – H. final: 5760.0 - 5768.6. Combustible: 60.000 GL.

	Intervención mecánica/Repuesto: Se soldaron ambos baldes frontal y trasero. Quedo Operativo. EXCAVADORA_DE_ORUGAS - LBX - ICCU - 21005NOHEX2154 (NO OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: ROBINSO OLAYA. H. inicial – H. final: 8513.4. Novedades mecánicas: El equipo queda inoperativo, el motor esta botando agua. Intervención mecánica/Repuesto: Se reviso equipo, tiene todo los filtros tapados. RETROEXCAVADORA - JHON DEERE - Alquiler - 883688 (OPERATIVA). Propiedad: Alquiler. H. inicial – H. final: 19355.8 - 19363.4. Fin del reporte.
07/04/2026	Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Yacopí, provincia de Rionegro. Vereda/Sector: MUÑOZ - BEJUCALES - APOSENTOS - TORTOLAS - CAIPAL. Actividad: Retro en alquiler cargue de material y mejoramiento de vía en Aposentos, retro JCB arreglo paso críticos en sector Avipay. Motoniveladora y vibro conformación de vía el Caipal. Transporte de material en el sector el castillo, pero no realizaron actividades por inoperancia de la retro de la alcaldia. Avance (km): 0.95. VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - GZM756 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: JOSE EDWIN CAMBEROS. Número de viajes material sobrante: 0. H. inicial – H. final: 5566. Kilometraje inicial - final: 73718. VOLQUETA_SENCILLA - - ICCU - GZM769 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: BRAYAN PACHECO. Número de viajes material sobrante: 0. H. inicial – H. final: 5713. Kilometraje inicial - final: 148432. MOTONIVELADORA - CATERPILLAR - ICCU - CATERPILLAR1630 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: RAMON SERRATO. H. inicial – H. final: 12153.4 - 12160.3. VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - 3003610 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: WILSON WILCHEZ. H. inicial – H. final: 3641.7 - 3647.8. RETROEXCAVADORA - CASE - ICCU - JJGN58SRKJC754124 (NO OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: PEDRO JOSE BELTRAN. H. inicial – H. final: 5375.9. Novedades mecánicas: Segunda sección del brazo no cierra, queda con el brazo estirado. Garantía de banco de válvulas. RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - 2936945 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: SEBASTIAN PACHECO. H. inicial – H. final: 5768.6 - 5777.6. Combustible:. Intervención mecánica/Repuesto:. EXCAVADORA_DE_ORUGAS - LBX - ICCU - 21005NOHEX2154 (NO OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: ROBINSO OLAYA. H. inicial – H. final: 8513.4. Novedades mecánicas: El equipo queda inoperativo, el motor esta botando agua. Intervención mecánica/Repuesto: Se reviso equipo, tiene todo los filtros tapados. RETROEXCAVADORA - JHON DEERE - Alquiler - 883688 (OPERATIVA). Propiedad: Alquiler. H. inicial – H. final: 19363.4 - 19371.8. Fin del reporte.
08/04/2026	Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Yacopí, provincia de Rionegro. Vereda/Sector: MUÑOZ - BEJUCALES - APOSENTOS - TORTOLAS - CAIPAL. Actividad: Retro en alquiler cargue de material y mejoramiento de vía en Aposentos, retro JCB arreglo paso críticos en sector Avipay. Motoniveladora y vibro conformación de vía el Caipal al castillo. Transporte de material en el sector el castillo. Avance (km): 0.8. VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - GZM756 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: JOSE EDWIN CAMBEROS. Número de viajes material sobrante: 12. H. inicial – H. final: 5566 - 5573. Kilometraje inicial - final: 73718 - 73750. VOLQUETA_SENCILLA - - ICCU - GZM769 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: BRAYAN PACHECO. Número de viajes material sobrante: 12. H. inicial – H. final: 5713 - 5719. Kilometraje inicial - final: 148432 - 148448. MOTONIVELADORA - CATERPILLAR - ICCU - CATERPILLAR1630 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: RAMON SERRATO. H. inicial – H. final: 12160.3 - 12167.8. VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - 3003610 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: WILSON WILCHEZ. H. inicial – H. final: 3647.8 - 3654.4. RETROEXCAVADORA - CASE - ICCU - JJGN58SRKJC754124 (NO OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: PEDRO JOSE BELTRAN. H. inicial – H. final: 5375.9. Novedades mecánicas: Segunda sección del brazo no cierra, queda con el brazo estirado. Garantía de banco de válvulas. RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - 2936945 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador:

	SEBASTIAN PACHECO. H. inicial – H. final: 5777.6 - 5786.3. Combustible:. Intervención mecánica/Repuesto:. EXCAVADORA_DE_ORUGAS - LBX - ICCU - 21005NOHEX2154 (NO OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: ROBINSO OLAYA. H. inicial – H. final: 8513.4. Novedades mecánicas: El equipo queda inoperativo, el motor esta botando agua. Intervención mecánica/Repuesto: Se reviso equipo, tiene todo los filtros tapados. RETROEXCAVADORA - JHON DEERE - Alquiler - 883688 (OPERATIVA). Propiedad: Alquiler. H. inicial – H. final: 19371.8 - 19376.3. Fin del reporte.
09/04/2026	Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Yacopí, provincia de Rionegro. Vereda/Sector: MUÑOZ - BEJUCALES - APOSENTOS - TORTOLAS - CAIPAL. Actividad: Retro en alquiler cargue de material y mejoramiento de vía en Aposentos, retro JCB arreglo paso críticos en sector Avipay. Motoniveladora y vibro conformación de vía el Caipal al castillo. Transporte de material en el sector el castillo. Avance (km): 0.45. VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - GZM756 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: JOSE EDWIN CAMBEROS. Número de viajes material sobrante: 12. H. inicial – H. final: 5573 - 5579. Kilometraje inicial - final: 73750 - 73788. Combustible: 20.000 GL. VOLQUETA_SENCILLA - - ICCU - GZM769 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: BRAYAN PACHECO. Número de viajes material sobrante: 12. H. inicial – H. final: 5719 - 5725. Kilometraje inicial - final: 148448 - 148466. Combustible: 20.000 GL. MOTONIVELADORA - CATERPILLAR - ICCU - CATERPILLAR1630 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: RAMON SERRATO. H. inicial – H. final: 12167.8 - 12174.0. Combustible: 60.000 GL. VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - 3003610 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: WILSON WILCHEZ. H. inicial – H. final: 3654.4 - 3660.8. Combustible: 20.000 GL. RETROEXCAVADORA - CASE - ICCU - JJGN58SRKJC754124 (NO OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: PEDRO JOSE BELTRAN. H. inicial – H. final: 5375.9. Novedades mecánicas: Segunda sección del brazo no cierra, queda con el brazo estirado. Garantía de banco de válvulas. RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - 2936945 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: SEBASTIAN PACHECO. H. inicial – H. final: 5786.3 - 5794.2. Combustible:. Intervención mecánica/Repuesto:. EXCAVADORA_DE_ORUGAS - LBX - ICCU - 21005NOHEX2154 (NO OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: ROBINSO OLAYA. H. inicial – H. final: 8513.4. Combustible: 103.3 GL. Novedades mecánicas: El equipo queda inoperativo, el motor esta botando agua. Intervención mecánica/Repuesto: Se reviso equipo, tiene todo los filtros tapados. RETROEXCAVADORA - JHON DEERE - Alquiler - 883688 (OPERATIVA). Propiedad: Alquiler. H. inicial – H. final: 19376.3 - 19384.1. Fin del reporte.
10/04/2026	Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Yacopí, provincia de Rionegro. Vereda/Sector: MUÑOZ - BEJUCALES - APOSENTOS - TORTOLAS - CAIPAL. Actividad: Retro en alquiler cargue de material y mejoramiento de vía en Aposentos, retro JCB arreglo paso críticos en sector Avipay. Motoniveladora y vibro conformación de vía el Caipal al castillo. Transporte de material en el sector el castillo. Avance (km): 0.35. VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - GZM756 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: JOSE EDWIN CAMBEROS. Número de viajes material sobrante: 4. H. inicial – H. final: 5579 - 5581. Kilometraje inicial - final: 73788 - 73801. Combustible:. VOLQUETA_SENCILLA - - ICCU - GZM769 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: BRAYAN PACHECO. Número de viajes material sobrante: 4. H. inicial – H. final: 5725 - 5728. Kilometraje inicial - final: 148466 - 148472. Combustible:. MOTONIVELADORA - CATERPILLAR - ICCU - CATERPILLAR1630 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: RAMON SERRATO. H. inicial – H. final: 12174.0 - 12178.0. Combustible:. VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - 3003610 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: WILSON WILCHEZ. H. inicial – H. final: 3660.8 - 3663.4. Combustible:. Novedades mecánicas: Se requieren cambio de filtros de combustible. RETROEXCAVADORA - CASE - ICCU - JJGN58SRKJC754124 (NO OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: PEDRO JOSE BELTRAN. H. inicial – H. final: 5375.9. Novedades mecánicas:

	Segunda sección del brazo no cierra, queda con el brazo estirado. Garantía de banco de válvulas. RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - 2936945 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: SEBASTIAN PACHECO. H. inicial – H. final: 5794.2 - 5797.2. Combustible: 35.000 GL. Intervención mecánica/Repuesto:. EXCAVADORA_DE_ORUGAS - LBX - ICCU - 21005NOHEX2154 (NO OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: ROBINSO OLAYA. H. inicial – H. final: 8513.4. Combustible:. Novedades mecánicas: El equipo queda inoperativo, el motor esta botando agua. Intervención mecánica/Repuesto: Se reviso equipo, tiene todo los filtros tapados. RETROEXCAVADORA - JHON DEERE - Alquiler - 883688 (OPERATIVA). Propiedad: Alquiler. H. inicial – H. final: 19384.1 - 19392.5. Fin del reporte.
11/04/2026	Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Yacopí, provincia de Rionegro. Vereda/Sector: MUÑOZ - BEJUCALES - APOSENTOS - TORTOLAS - CAIPAL. Actividad: Retro en alquiler cargue de material y mejoramiento de vía en Aposentos, demás equipos sin actividad día sábado. Avance (km): 0.0. VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - GZM756 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: JOSE EDWIN CAMBEROS. Número de viajes material sobrante: 0. H. inicial – H. final: 5581. Kilometraje inicial - final: 73801. Combustible:. VOLQUETA_SENCILLA - - ICCU - GZM769 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: BRAYAN PACHECO. Número de viajes material sobrante: 0. H. inicial – H. final: 5728. Kilometraje inicial - final: 148472. Combustible:. MOTONIVELADORA - CATERPILLAR - ICCU - CATERPILLAR1630 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: RAMON SERRATO. H. inicial – H. final: 12178.0. Combustible:. VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - 3003610 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: WILSON WILCHEZ. H. inicial – H. final: 3663.4. Combustible:. Novedades mecánicas: Se requieren cambio de filtros de combustible. RETROEXCAVADORA - CASE - ICCU - JJGN58SRKJC754124 (NO OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: PEDRO JOSE BELTRAN. H. inicial – H. final: 5375.9. Novedades mecánicas: Segunda sección del brazo no cierra, queda con el brazo estirado. Garantía de banco de válvulas. RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - 2936945 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: SEBASTIAN PACHECO. H. inicial – H. final: 5797.2. Combustible:. Intervención mecánica/Repuesto:. EXCAVADORA_DE_ORUGAS - LBX - ICCU - 21005NOHEX2154 (NO OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: ROBINSO OLAYA. H. inicial – H. final: 8513.4. Combustible:. Novedades mecánicas: El equipo queda inoperativo, el motor esta botando agua. Intervención mecánica/Repuesto: Se reviso equipo, tiene todo los filtros tapados. RETROEXCAVADORA - JHON DEERE - Alquiler - 883688 (OPERATIVA). Propiedad: Alquiler. H. inicial – H. final: 19392.5 - 19399.1. Fin del reporte.
13/04/2026	Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Yacopí, provincia de Rionegro. Vereda/Sector: MUÑOZ - BEJUCALES - APOSENTOS - TORTOLAS - CAIPAL. Actividad: Retro en alquiler cargue de material y mejoramiento de vía en Aposentos, retro JCB arreglo paso críticos en sector Avipay. Motoniveladora y vibro conformación vía el Caipal al castillo por mal estado del terreno. Transporte de material en el sector el castillo. Avance (km): 0.26. VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - GZM756 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: JOSE EDWIN CAMBEROS. Número de viajes material sobrante: 4. H. inicial – H. final: 5581 - 5587. Kilometraje inicial - final: 73801 - 73839. Combustible:. VOLQUETA_SENCILLA - - ICCU - GZM769 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: BRAYAN PACHECO. Número de viajes material sobrante: 4. H. inicial – H. final: 5728 - 5734. Kilometraje inicial - final: 148472 - 148496. Combustible:. MOTONIVELADORA - CATERPILLAR - ICCU - CATERPILLAR1630 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: RAMON SERRATO. H. inicial – H. final: 12178.0 - 12183.6. Combustible:. VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - 3003610 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: WILSON WILCHEZ. H. inicial – H. final: 3663.4 - 3663.5. Combustible:. Novedades mecánicas: Se requieren cambio de filtros de combustible. RETROEXCAVADORA - CASE - ICCU - JJGN58SRKJC754124 (NO OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: PEDRO JOSE

	BELTRAN. H. inicial – H. final: 5375.9. Novedades mecánicas: Segunda sección del brazo no cierra, queda con el brazo estirado. Garantía de banco de válvulas. RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - 2936945 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: SEBASTIAN PACHECO. H. inicial – H. final: 5797.2 - 5807.5. Combustible:. Intervención mecánica/Repuesto:. EXCAVADORA_DE_ORUGAS - LBX - ICCU - 21005NOHEX2154 (NO OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: ROBINSO OLAYA. H. inicial – H. final: 8513.4. Combustible:. Novedades mecánicas: El equipo queda inoperativo, el motor esta botando agua. Intervención mecánica/Repuesto: Se reviso equipo, tiene todo los filtros tapados. RETROEXCAVADORA - JHON DEERE - Alquiler - 883688 (OPERATIVA). Propiedad: Alquiler. H. inicial – H. final: 19399.1 -. Fin del reporte.
14/04/2026	Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Yacopí, provincia de Rionegro. Vereda/Sector: MUÑOZ - BEJUCALES - APOSENTOS - TORTOLAS - CAIPAL. Actividad: Retro en alquiler sin actividad por lluvias, retro JCB arreglo paso críticos en sector Avipay. Motoniveladora y vibro conformación vía el Caipal al castillo por mal estado del terreno. Transporte de material en el sector el castillo. Avance (km): 0.25. VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - GZM756 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: JOSE EDWIN CAMBEROS. Número de viajes material sobrante: 2. H. inicial – H. final: 5587 - 5592. Kilometraje inicial - final: 73839 - 73866. Combustible:. VOLQUETA_SENCILLA - - ICCU - GZM769 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: BRAYAN PACHECO. Número de viajes material sobrante: 2. H. inicial – H. final: 5734 - 5745. Kilometraje inicial - final: 148496 - 148670. Combustible: 20.000 GL. MOTONIVELADORA - CATERPILLAR - ICCU - CATERPILLAR1630 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: RAMON SERRATO. H. inicial – H. final: 12183.6 - 12186.3. Combustible: 60.000 GL. VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - 3003610 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: WILSON WILCHEZ. H. inicial – H. final: 3663.4 - 3663.5. Combustible: 40.000 GL. Novedades mecánicas: Se requieren cambio de filtros de combustible. RETROEXCAVADORA - CASE - ICCU - JJGN58SRKJC754124 (NO OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: PEDRO JOSE BELTRAN. H. inicial – H. final: 5375.9. Novedades mecánicas: Segunda sección del brazo no cierra, queda con el brazo estirado. Garantía de banco de válvulas. RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - 2936945 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: SEBASTIAN PACHECO. H. inicial – H. final: 5807.5 - 5814.4. Combustible: 125.000 GL. Intervención mecánica/Repuesto:. EXCAVADORA_DE_ORUGAS - LBX - ICCU - 21005NOHEX2154 (NO OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: ROBINSO OLAYA. H. inicial – H. final: 8513.4. Combustible:. Novedades mecánicas: El equipo queda inoperativo, el motor esta botando agua. Intervención mecánica/Repuesto: Se reviso equipo, tiene todo los filtros tapados. RETROEXCAVADORA - JHON DEERE - Alquiler - 883688 (OPERATIVA). Propiedad: Alquiler. H. inicial – H. final: 19399.1. Fin del reporte.
15/04/2026	Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Yacopí, provincia de Rionegro. Vereda/Sector: MUÑOZ - BEJUCALES - APOSENTOS - TORTOLAS - CAIPAL. Actividad: Retro en alquiler removiendo derrumbes en Aposentos, retro JCB removiendo derrumbes en el sector sabana grande. Motoniveladora y vibro conformación vía el Caipal al castillo pero sin actividad por lluvias y por mal estado del terreno. Transporte de material en el sector el castillo. Avance (km): 0.25. VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - GZM756 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: JOSE EDWIN CAMBEROS. Número de viajes material sobrante: 0. H. inicial – H. final: 5592. Kilometraje inicial - final: 73866. Combustible:. VOLQUETA_SENCILLA - - ICCU - GZM769 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: BRAYAN PACHECO. Número de viajes material sobrante: 0. H. inicial – H. final: 5745. Kilometraje inicial - final: 148670. Combustible:. MOTONIVELADORA - CATERPILLAR - ICCU - CATERPILLAR1630 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: RAMON SERRATO. H. inicial – H. final: 12186.3. Combustible:. VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - 3003610

	(OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: WILSON WILCHEZ. H. inicial – H. final: 3663.5. Combustible:. Novedades mecánicas: Se requieren cambio de filtros de combustible. RETROEXCAVADORA - CASE - ICCU - JJGN58SRKJC754124 (NO OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: PEDRO JOSE BELTRAN. H. inicial – H. final: 5375.9. Novedades mecánicas: Segunda sección del brazo no cierra, queda con el brazo estirado. Garantía de banco de válvulas. RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - 2936945 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: SEBASTIAN PACHECO. H. inicial – H. final: 5814.4 - 5820.6. Combustible:. Intervención mecánica/Repuesto:. EXCAVADORA_DE_ORUGAS - LBX - ICCU - 21005NOHEX2154 (NO OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: ROBINSO OLAYA. H. inicial – H. final: 8513.4. Combustible:. Novedades mecánicas: El equipo queda inoperativo, el motor esta botando agua. Intervención mecánica/Repuesto: Se reviso equipo, tiene todo los filtros tapados. RETROEXCAVADORA - JHON DEERE - Alquiler - 883688 (OPERATIVA). Propiedad: Alquiler. H. inicial – H. final: 19399.1 - 19411.7. Fin del reporte.
16/04/2026	Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Yacopí, provincia de Rionegro. Vereda/Sector: MUÑOZ - BEJUCALES - APOSENTOS - TORTOLAS - CAIPAL. Actividad: Retro en alquiler removiendo derrumbes en Aposentos, retro JCB removiendo derrumbes en el sector sabana grande. Motoniveladora y vibro conformación vía el Caipal al castillo pero sin actividad por lluvias y por mal estado del terreno. Transporte de material en el sector el castillo. Avance (km): 0.0. VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - GZM756 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: JOSE EDWIN CAMBEROS. Número de viajes material sobrante: 2. H. inicial – H. final: 5592 - 5598. Kilometraje inicial - final: 73866 - 73930. Combustible:. VOLQUETA_SENCILLA - - ICCU - GZM769 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: BRAYAN PACHECO. Número de viajes material sobrante: 1. H. inicial – H. final: 5745 - 5747. Kilometraje inicial - final: 148670 - 148671. Combustible:. MOTONIVELADORA - CATERPILLAR - ICCU - CATERPILLAR1630 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: RAMON SERRATO. H. inicial – H. final: 12186.3. Combustible:. VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - 3003610 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: WILSON WILCHEZ. H. inicial – H. final: 3663.5. Combustible:. Novedades mecánicas: Se requieren cambio de filtros de combustible. RETROEXCAVADORA - CASE - ICCU - JJGN58SRKJC754124 (NO OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: PEDRO JOSE BELTRAN. H. inicial – H. final: 5375.9. Novedades mecánicas: Segunda sección del brazo no cierra, queda con el brazo estirado. Garantía de banco de válvulas. RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - 2936945 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: SEBASTIAN PACHECO. H. inicial – H. final: 5820.6 - 5824.0. Combustible:. Intervención mecánica/Repuesto:. EXCAVADORA_DE_ORUGAS - LBX - ICCU - 21005NOHEX2154 (NO OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: ROBINSO OLAYA. H. inicial – H. final: 8513.4. Combustible:. Novedades mecánicas: El equipo queda inoperativo, el motor esta botando agua. Intervención mecánica/Repuesto: Se reviso equipo, tiene todo los filtros tapados. RETROEXCAVADORA - JHON DEERE - Alquiler - 883688 (OPERATIVA). Propiedad: Alquiler. H. inicial – H. final: 19411.7 - 19418.7. Fin del reporte.
17/04/2026	Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Yacopí, provincia de Rionegro. Vereda/Sector: MUÑOZ - BEJUCALES - APOSENTOS - TORTOLAS - CAIPAL. Actividad: Retro en alquiler removiendo derrumbes en Aposentos, demás equipos sin actividad por lluvias, mal estado del terreno. Avance (km): 0.0. VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - GZM756 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: JOSE EDWIN CAMBEROS. Número de viajes material sobrante: 2. H. inicial – H. final: 5592 - 5598. Kilometraje inicial - final: 73866 - 73930. Combustible:. VOLQUETA_SENCILLA - - ICCU - GZM769 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: BRAYAN PACHECO. Número de viajes material sobrante: 1. H. inicial – H. final: 5747. Kilometraje inicial - final: 148671. Combustible:. MOTONIVELADORA - CATERPILLAR - ICCU - CATERPILLAR1630 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador:

	RAMON SERRATO. H. inicial – H. final: 12186.3. Combustible:. VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - 3003610 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: WILSON WILCHEZ. H. inicial – H. final: 3663.5. Combustible:. Novedades mecánicas: Se requieren cambio de filtros de combustible. RETROEXCAVADORA - CASE - ICCU - JJGN58SRKJC754124 (NO OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: PEDRO JOSE BELTRAN. H. inicial – H. final: 5375.9. Novedades mecánicas: Segunda sección del brazo no cierra, queda con el brazo estirado. Garantía de banco de válvulas. RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - 2936945 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: SEBASTIAN PACHECO. H. inicial – H. final: 5824.0. Combustible:. Intervención mecánica/Repuesto:. Novedades mecánicas: Se estalla manguera del brazo trasero. EXCAVADORA_DE_ORUGAS - LBX - ICCU - 21005NOHEX2154 (NO OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: ROBINSO OLAYA. H. inicial – H. final: 8513.4 - 8522.6. Combustible:. Novedades mecánicas: El equipo queda inoperativo, el motor esta botando agua. Intervención mecánica/Repuesto: Se reviso equipo, tiene todo los filtros tapados. RETROEXCAVADORA - JHON DEERE - Alquiler - 883688 (OPERATIVA). Propiedad: Alquiler. H. inicial – H. final: 19418.7 - 19421.2. Fin del reporte.
20/04/2026	Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Yacopí, provincia de Rionegro. Vereda/Sector: MUÑOZ - BEJUCALES - APOSENTOS - TORTOLAS - CAIPAL - CASTILLO. Actividad: Retro en alquiler removiendo derrumbes en Aposentos, Cargue, transporte y conformación de vía el castillo a Patevaca. Avance (km): 0.4. VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - GZM756 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: JOSE EDWIN CAMBEROS. Número de viajes material sobrante: 5. H. inicial – H. final: 5598 - 5603. Kilometraje inicial - final: 73930 - 73960. Combustible:. VOLQUETA_SENCILLA - - ICCU - GZM769 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: BRAYAN PACHECO. Número de viajes material sobrante: 5. H. inicial – H. final: 5747 - 5752. Kilometraje inicial - final: 148671 - 148689. Combustible:. MOTONIVELADORA - CATERPILLAR - ICCU - CATERPILLAR1630 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: RAMON SERRATO. H. inicial – H. final: 12186.3 - 12187.4. Combustible:. VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - 3003610 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: WILSON WILCHEZ. H. inicial – H. final: 3663.5 - 3663.8. Combustible:. Novedades mecánicas: Se requieren cambio de filtros de combustible. RETROEXCAVADORA - CASE - ICCU - JJGN58SRKJC754124 (NO OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: PEDRO JOSE BELTRAN. H. inicial – H. final: 5375.9. Novedades mecánicas: Segunda sección del brazo no cierra, queda con el brazo estirado. Garantía de banco de válvulas. RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - 2936945 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: SEBASTIAN PACHECO. H. inicial – H. final: 5824.0. Combustible:. Intervención mecánica/Repuesto:. Novedades mecánicas: Se estalla manguera del brazo trasero. EXCAVADORA_DE_ORUGAS - LBX - ICCU - 21005NOHEX2154 (NO OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: ROBINSO OLAYA. H. inicial – H. final: 8513.4 - 8522.6. Combustible:. Novedades mecánicas: El equipo queda inoperativo, el motor esta botando agua. Intervención mecánica/Repuesto: Se reviso equipo, tiene todo los filtros tapados. RETROEXCAVADORA - JHON DEERE - Alquiler - 883688 (OPERATIVA). Propiedad: Alquiler. H. inicial – H. final: 19421.2. Fin del reporte.
21/04/2026	Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Yacopí, provincia de Rionegro. Vereda/Sector: MUÑOZ - BEJUCALES - APOSENTOS - TORTOLAS - CAIPAL - CASTILLO. Actividad: Retro en alquiler removiendo derrumbes en Aposentos, Cargue, transporte y conformación de vía el castillo a Patevaca. Avance (km): 0.9. VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - GZM756 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: JOSE EDWIN CAMBEROS. Número de viajes material sobrante: 8. H. inicial – H. final: 5603 - 5609. Kilometraje inicial - final: 73960 - 74004. Combustible:. VOLQUETA_SENCILLA - - ICCU - GZM769 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: BRAYAN PACHECO. Número de viajes material sobrante: 8. H. inicial – H. final: 5752 - 5761. Kilometraje inicial - final: 148689 -

	148725. Combustible:. MOTONIVELADORA - CATERPILLAR - ICCU - CATERPILLAR1630 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: RAMON SERRATO. H. inicial – H. final: 12187.4 - 12199.9. Combustible:. VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - 3003610 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: WILSON WILCHEZ. H. inicial – H. final: 3663.8 - 3672.9. Combustible:. Novedades mecánicas: Se requieren cambio de filtros de combustible. RETROEXCAVADORA - CASE - ICCU - JJGN58SRKJC754124 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: PEDRO JOSE BELTRAN. H. inicial – H. final: 5375.9. Novedades mecánicas: Se intervino mecánicamente quedando el equipo operativo. RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - 2936945 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: SEBASTIAN PACHECO. H. inicial – H. final: 5824.0. Combustible:. Intervención mecánica/Repuesto: se pone manguera dejando el equipo operativo. Novedades mecánicas: Se estalla manguera del brazo trasero. EXCAVADORA_DE_ORUGAS - LBX - ICCU - 21005NOHEX2154 (NO OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: ROBINSO OLAYA. H. inicial – H. final: 8522.6 - 8531.0. Combustible:. Novedades mecánicas: El equipo queda inoperativo, el motor esta botando agua. Intervención mecánica/Repuesto: Se reviso equipo, tiene todo los filtros tapados. RETROEXCAVADORA - JHON DEERE - Alquiler - 883688 (OPERATIVA). Propiedad: Alquiler. H. inicial – H. final: 19421.2 - 19430.2. Fin del reporte.
22/04/2026	Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Yacopí, provincia de Rionegro. Vereda/Sector: MUÑOZ - BEJUCALES - APOSENTOS - TORTOLAS - CAIPAL - CASTILLO. Actividad: Retro en alquiler removiendo derrumbes en Aposentos, Cargue, transporte y conformación de vía el castillo a Patevaca. Retro JCB removiendo derrumbes en el sector de sabana grande. Avance (km): 0.8. VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - GZM756 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: JOSE EDWIN CAMBEROS. Número de viajes material sobrante: 6. H. inicial – H. final: 5609 - 5617. Kilometraje inicial - final: 74004 - 74054. Combustible: 20.000 GL. VOLQUETA_SENCILLA - - ICCU - GZM769 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: BRAYAN PACHECO. Número de viajes material sobrante: 2. H. inicial – H. final: 5761 - 5772. Kilometraje inicial - final: 148725 - 148905. Combustible: 20.000 GL. MOTONIVELADORA - CATERPILLAR - ICCU - CATERPILLAR1630 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: RAMON SERRATO. H. inicial – H. final: 12199.9 - 12205.9. Combustible: 40.000 GL. VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - 3003610 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: WILSON WILCHEZ. H. inicial – H. final: 3672.9 - 3676.2. Combustible: 20.000 GL. Novedades mecánicas: Se requieren cambio de filtros de combustible. RETROEXCAVADORA - CASE - ICCU - JJGN58SRKJC754124 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: PEDRO JOSE BELTRAN. H. inicial – H. final: 5375.9. Novedades mecánicas: Se intervino mecánicamente quedando el equipo operativo. RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - 2936945 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: SEBASTIAN PACHECO. H. inicial – H. final: 5824.0 - 5830.2. Combustible:. Intervención mecánica/Repuesto: se pone manguera dejando el equipo operativo. Novedades mecánicas: Se estalla manguera del brazo trasero. EXCAVADORA_DE_ORUGAS - LBX - ICCU - 21005NOHEX2154 (NO OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: ROBINSO OLAYA. H. inicial – H. final: 8531.0 - 8546.2. Combustible:. Novedades mecánicas: El equipo queda inoperativo, el motor esta botando agua. Intervención mecánica/Repuesto: Se reviso equipo, tiene todo los filtros tapados. RETROEXCAVADORA - JHON DEERE - Alquiler - 883688 (OPERATIVA). Propiedad: Alquiler. H. inicial – H. final: 19430.2 - 19439.5. Fin del reporte.
23/04/2026	Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Yacopí, provincia de Rionegro. Vereda/Sector: MUÑOZ - BEJUCALES - APOSENTOS - TORTOLAS - CAIPAL - CASTILLO. Actividad: Retro en alquiler removiendo derrumbes en Aposentos, Cargue, transporte y conformación de vía el castillo a Patevaca. Retro JCB removiendo derrumbes en el sector de sabana grande. Volqueta GZM 769 se traslada a bogota a recoger llantas. Avance (km): 0.4. VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - GZM756 (OPERATIVA). Propiedad:

	ICCU. Operador: JOSE EDWIN CAMBEROS. Número de viajes material sobrante: 6. H. inicial – H. final: 5617 - 5623. Kilometraje inicial - final: 74054 - 74102. Combustible:. Intervención mecánica/Repuesto: Se pone vidrio lateral y cambio de baterías. VOLQUETA_SENCILLA - - ICCU - GZM769 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: BRAYAN PACHECO. Número de viajes material sobrante: 0. H. inicial – H. final: 5772 - 5778. Kilometraje inicial - final: 148905 - 149079. Combustible: 41.000 GL. MOTONIVELADORA - CATERPILLAR - ICCU - CATERPILLAR1630 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: RAMON SERRATO. H. inicial – H. final: 12205.9 - 12210.0. Combustible:. VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - 3003610 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: WILSON WILCHEZ. H. inicial – H. final: 3676.2 - 3680.6. Combustible:. Novedades mecánicas: Se requieren cambio de filtros de combustible. RETROEXCAVADORA - CASE - ICCU - JJGN58SRKJC754124 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: PEDRO JOSE BELTRAN. H. inicial – H. final: 5375.9. Novedades mecánicas: Se intervino mecánicamente quedando el equipo operativo. RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - 2936945 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: SEBASTIAN PACHECO. H. inicial – H. final: 5830.2 - 5837.8. Combustible:. Intervención mecánica/Repuesto: se pone manguera dejando el equipo operativo. Novedades mecánicas: Se estalla manguera del brazo trasero. EXCAVADORA_DE_ORUGAS - LBX - ICCU - 21005NOHEX2154 (NO OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: ROBINSO OLAYA. H. inicial – H. final: 8531.0 - 8546.2. Combustible:. Novedades mecánicas: El equipo queda inoperativo, el motor esta botando agua. Intervención mecánica/Repuesto: Se reviso equipo, tiene todo los filtros tapados. RETROEXCAVADORA - JHON DEERE - Alquiler - 883688 (OPERATIVA). Propiedad: Alquiler. H. inicial – H. final: 19439.5 - 19448.1. Fin del reporte.
24/04/2026	Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Yacopí, provincia de Rionegro. Vereda/Sector: MUÑOZ - BEJUCALES - APOSENTOS - TORTOLAS - CAIPAL - CASTILLO. Actividad: Retro en alquiler removiendo derrumbes en Aposentos. Motoniveladora y vibro conformación de vía el castillo al Moro. Retro JCB removiendo derrumbes en el sector de sabana grande. Volqueta GZM 769 se traslada a Bogotá a recoger llantas. Avance (km): 0.45. VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - GZM756 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: JOSE EDWIN CAMBEROS. Número de viajes material sobrante: 6. H. inicial – H. final: 5623 - 5631. Kilometraje inicial - final: 74102 - 74154. Combustible:. Intervención mecánica/Repuesto: Se pone vidrio lateral y cambio de baterías. VOLQUETA_SENCILLA - - ICCU - GZM769 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: BRAYAN PACHECO. Número de viajes material sobrante: 0. H. inicial – H. final: 5778. Kilometraje inicial - final: 149079. Combustible:. Intervención mecánica/Repuesto: Se realizo Mantenimiento preventivo. MOTONIVELADORA - CATERPILLAR - ICCU - CATERPILLAR1630 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: RAMON SERRATO. H. inicial – H. final: 12210.0 - 12214.4. Combustible:. VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - 3003610 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: WILSON WILCHEZ. H. inicial – H. final: 3680.6 - 3685.5. Combustible:. Novedades mecánicas: Se requieren cambio de filtros de combustible. RETROEXCAVADORA - CASE - ICCU - JJGN58SRKJC754124 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: PEDRO JOSE BELTRAN. H. inicial – H. final: 5375.9. Novedades mecánicas: Se intervino mecánicamente quedando el equipo operativo. RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - 2936945 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: SEBASTIAN PACHECO. H. inicial – H. final: 5837.8 - 5845.1. Combustible:. Intervención mecánica/Repuesto: se pone manguera dejando el equipo operativo. Novedades mecánicas: Se estalla manguera del brazo trasero. EXCAVADORA_DE_ORUGAS - LBX - ICCU - 21005NOHEX2154 (NO OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: ROBINSO OLAYA. H. inicial – H. final: 8546.2. Combustible:. Novedades mecánicas: El equipo queda inoperativo, el motor esta botando agua. Intervención mecánica/Repuesto: Se reviso equipo, tiene todo los filtros tapados. RETROEXCAVADORA -

	JHON DEERE - Alquiler - 883688 (OPERATIVA). Propiedad: Alquiler. H. inicial – H. final: 19448.1 - 19454.5. Fin del reporte.
25/04/2026	Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Yacopí, provincia de Rionegro. Vereda/Sector: MUÑOZ - BEJUCALES - APOSENTOS - TORTOLAS - CAIPAL - CASTILLO. Actividad: Retro en alquiler removiendo derrumbes en Aposentos. Demas equipos sin actividad día sábado. Avance (km): 0.45. VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - GZM756 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: JOSE EDWIN CAMBEROS. Número de viajes material sobrante: 0. H. inicial – H. final: 5631. Kilometraje inicial - final: 74154. Combustible:. Intervención mecánica/Repuesto: Se pone vidrio lateral y cambio de baterías. VOLQUETA_SENCILLA - - ICCU - GZM769 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: BRAYAN PACHECO. Número de viajes material sobrante: 0. H. inicial – H. final: 5778. Kilometraje inicial - final: 149079. Combustible:. Intervención mecánica/Repuesto: Se realizo Mantenimiento preventivo. MOTONIVELADORA - CATERPILLAR - ICCU - CATERPILLAR1630 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: RAMON SERRATO. H. inicial – H. final: 12214.4. Combustible:. VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - 3003610 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: WILSON WILCHEZ. H. inicial – H. final: 3685.5. Combustible:. Novedades mecánicas: Se requieren cambio de filtros de combustible. RETROEXCAVADORA - CASE - ICCU - JJGN58SRKJC754124 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: PEDRO JOSE BELTRAN. H. inicial – H. final: 5375.9. Novedades mecánicas: Se intervino mecánicamente quedando el equipo operativo. RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - 2936945 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: SEBASTIAN PACHECO. H. inicial – H. final: 5845.1. Combustible:. Intervención mecánica/Repuesto: se pone manguera dejando el equipo operativo. Novedades mecánicas: Se estalla manguera del brazo trasero. EXCAVADORA_DE_ORUGAS - LBX - ICCU - 21005NOHEX2154 (NO OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: ROBINSO OLAYA. H. inicial – H. final: 8546.2. Combustible:. Novedades mecánicas: El equipo queda inoperativo, el motor esta botando agua. Intervención mecánica/Repuesto: Se reviso equipo, tiene todo los filtros tapados. RETROEXCAVADORA - JHON DEERE - Alquiler - 883688 (OPERATIVA). Propiedad: Alquiler. H. inicial – H. final: 19454.5 - 19461.1. Fin del reporte.
27/04/2026	Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Yacopí, provincia de Rionegro. Vereda/Sector: MUÑOZ - BEJUCALES - APOSENTOS - TORTOLAS - CAIPAL - CASTILLO. Actividad: Retro Case removiendo derrumbes en Aposentos. Motoniveladora y vibro conformación de vía el castillo - Moro. Retro JCB removiendo derrumbes en el sector de sabana grande. Volqueta GZM 769 se traslada a Bogotá a recoger llantas. Avance (km): 0.15. VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - GZM756 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: JOSE EDWIN CAMBEROS. Número de viajes material sobrante: 4. H. inicial – H. final: 5631 - 5635. Kilometraje inicial - final: 74154 - 74182. Combustible:. Intervención mecánica/Repuesto: Se pone vidrio lateral y cambio de baterías. VOLQUETA_SENCILLA - - ICCU - GZM769 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: BRAYAN PACHECO. Número de viajes material sobrante: 0. H. inicial – H. final: 5778. Kilometraje inicial - final: 149079. Combustible:. Intervención mecánica/Repuesto: Se realizo Mantenimiento preventivo. MOTONIVELADORA - CATERPILLAR - ICCU - CATERPILLAR1630 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: RAMON SERRATO. H. inicial – H. final: 12214.4 - 12215.8. Combustible:. VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - 3003610 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: WILSON WILCHEZ. H. inicial – H. final: 3685.5 - 3687.8. Combustible:. Novedades mecánicas: Se requieren cambio de filtros de combustible. RETROEXCAVADORA - CASE - ICCU - JJGN58SRKJC754124 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: PEDRO JOSE BELTRAN. H. inicial – H. final: 5375.9 - 5379.2. Novedades mecánicas:. RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - 2936945 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: SEBASTIAN PACHECO. H. inicial – H. final: 5845.1 - 5853.1. Combustible:. Intervención

	mecánica/Repuesto: se pone manguera dejando el equipo operativo. Novedades mecánicas: Se estalla manguera del brazo trasero. EXCAVADORA_DE_ORUGAS - LBX - ICCU - 21005NOHEX2154 (NO OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: ROBINSO OLAYA. H. inicial – H. final: 8546.2. Combustible:. Novedades mecánicas: El equipo queda inoperativo, el motor esta botando agua. Intervención mecánica/Repuesto: Se reviso equipo, tiene todo los filtros tapados. Fin del reporte.
28/04/2026	Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Yacopí, provincia de Rionegro. Vereda/Sector: MUÑOZ - BEJUCALES - APOSENTOS - TORTOLAS - CAIPAL - CASTILLO. Actividad: Retro Case removiendo derrumbes en Aposentos. Motoniveladora y vibro conformación de vía el castillo - Moro. Retro JCB removiendo derrumbes en el sector de sabana grande. Volqueta GZM 769 se traslada a Bogotá a recoger llantas. Retiran la oruga para intervención mecánica en Bogotá. Avance (km): 0.2. VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - GZM756 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: JOSE EDWIN CAMBEROS. Número de viajes material sobrante: 4. H. inicial – H. final: 5635 - 5642. Kilometraje inicial - final: 74182 - 74199. Combustible:. Intervención mecánica/Repuesto: Se pone vidrio lateral y cambio de baterías. VOLQUETA_SENCILLA - - ICCU - GZM769 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: BRAYAN PACHECO. Número de viajes material sobrante: 0. H. inicial – H. final: 5778 - 5785. Kilometraje inicial - final: 149079 - 149119. Combustible:. Intervención mecánica/Repuesto: Se realizo Mantenimiento preventivo. MOTONIVELADORA - CATERPILLAR - ICCU - CATERPILLAR1630 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: RAMON SERRATO. H. inicial – H. final: 12215.8 - 12216.9. Combustible:. VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - 3003610 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: WILSON WILCHEZ. H. inicial – H. final: 3687.8 - 3691.5. Combustible:. Novedades mecánicas: Se requieren cambio de filtros de combustible. RETROEXCAVADORA - CASE - ICCU - JJGN58SRKJC754124 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: PEDRO JOSE BELTRAN. H. inicial – H. final: 5379.2 - 5389.0. Novedades mecánicas:. RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - 2936945 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: SEBASTIAN PACHECO. H. inicial – H. final: 5853.1 - 5861.0. Combustible:. Intervención mecánica/Repuesto: se pone manguera dejando el equipo operativo. Novedades mecánicas: Se estalla manguera del brazo trasero. EXCAVADORA_DE_ORUGAS - LBX - ICCU - 21005NOHEX2154 (NO OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: ROBINSO OLAYA. H. inicial – H. final: 8546.2. Combustible:. Novedades mecánicas: El equipo queda inoperativo, el motor esta botando agua. Intervención mecánica/Repuesto: Recogen el equipo y se traslada a Bogotá. Fin del reporte.
29/04/2026	Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Yacopí, provincia de Rionegro. Vereda/Sector: MUÑOZ - BEJUCALES - APOSENTOS - TORTOLAS - CAIPAL - CASTILLO. Actividad: Retro Case removiendo derrumbes en la Glorieta. Motoniveladora y vibro conformación de vía el castillo - Moro, sin actividad por lluvias. Retro JCB removiendo derrumbes en el sector de sabana grande. Volqueta GZM 769 llega de Bogotá con llantas. Retiran la oruga para intervención mecánica en Bogotá. Avance (km): 0.0. VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - GZM756 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: JOSE EDWIN CAMBEROS. Número de viajes material sobrante: 0. H. inicial – H. final: 5642. Kilometraje inicial - final: 74199. Combustible:. Intervención mecánica/Repuesto: Se pone vidrio lateral y cambio de baterías. VOLQUETA_SENCILLA - - ICCU - GZM769 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: BRAYAN PACHECO. Número de viajes material sobrante: 0. H. inicial – H. final: 5785 - 5793. Kilometraje inicial - final: 149119 - 149287. Combustible:. Intervención mecánica/Repuesto: Se realizo Mantenimiento preventivo. MOTONIVELADORA - CATERPILLAR - ICCU - CATERPILLAR1630 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: RAMON SERRATO. H. inicial – H. final: 12216.9. Combustible:. VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - 3003610 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU.

	Operador: WILSON WILCHEZ. H. inicial – H. final: 3691.5. Combustible:. Novedades mecánicas: Se requieren cambio de filtros de combustible. RETROEXCAVADORA - CASE - ICCU - JJGN58SRKJC754124 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: PEDRO JOSE BELTRAN. H. inicial – H. final: 5389.0 - 5396.1. Novedades mecánicas:. RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - 2936945 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: SEBASTIAN PACHECO. H. inicial – H. final: 5861.0 - 5870.3. Combustible:. Intervención mecánica/Repuesto: se pone manguera dejando el equipo operativo. Novedades mecánicas: Se estalla manguera del brazo trasero. EXCAVADORA_DE_ORUGAS - LBX - ICCU - 21005NOHEX2154 (NO OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: ROBINSO OLAYA. H. inicial – H. final: 8546.2. Combustible:. Novedades mecánicas: El equipo queda inoperativo, el motor esta botando agua. Intervención mecánica/Repuesto: Recogen el equipo y se traslada a Bogotá. Fin del reporte.
30/04/2026	Envío reporte de las actividades realizadas en el municipio de Yacopí, provincia de Rionegro. Vereda/Sector: MUÑOZ - BEJUCALES - APOSENTOS - TORTOLAS - CAIPAL - CASTILLO. Actividad: Retro Case removiendo derrumbes en la Glorieta. Motoniveladora y vibro conformación de vía el castillo - Moro. Retro JCB removiendo derrumbes en el sector de sabana grande. Volqueta GZM 769 transporte de material. Retiran la oruga para intervención mecánica en Bogotá. Avance (km): 0.3. VOLQUETA_SENCILLA - INTERNATIONAL - ICCU - GZM756 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: JOSE EDWIN CAMBEROS. Número de viajes material sobrante: 2. H. inicial – H. final: 5642 - 5643. Kilometraje inicial - final: 74199 - 74202. Combustible:. Intervención mecánica/Repuesto: Se pone vidrio lateral y cambio de baterías. VOLQUETA_SENCILLA - - ICCU - GZM769 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: BRAYAN PACHECO. Número de viajes material sobrante: 5. H. inicial – H. final: 5793 - 5796. Kilometraje inicial - final: 149287 - 149321. Combustible:. Intervención mecánica/Repuesto: Se realizo Mantenimiento preventivo. MOTONIVELADORA - CATERPILLAR - ICCU - CATERPILLAR1630 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: RAMON SERRATO. H. inicial – H. final: 12216.9 - 12219.1. Combustible:. VIBROCOMPACTADOR - AMMANN - ICCU - 3003610 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: WILSON WILCHEZ. H. inicial – H. final: 3691.5 - 3693.7. Combustible:. Novedades mecánicas: Se requieren cambio de filtros de combustible. RETROEXCAVADORA - CASE - ICCU - JJGN58SRKJC754124 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: PEDRO JOSE BELTRAN. H. inicial – H. final: 5396.1 - 5402.9. Novedades mecánicas:. RETROEXCAVADORA - JCB - ICCU - 2936945 (OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: SEBASTIAN PACHECO. H. inicial – H. final: 5870.3 - 5878.2. Combustible:. Intervención mecánica/Repuesto: se pone manguera dejando el equipo operativo. Novedades mecánicas: Se estalla manguera del brazo trasero. EXCAVADORA_DE_ORUGAS - LBX - ICCU - 21005NOHEX2154 (NO OPERATIVA). Propiedad: ICCU. Operador: ROBINSO OLAYA. H. inicial – H. final: 8546.2. Combustible:. Novedades mecánicas: El equipo queda inoperativo, el motor esta botando agua. Intervención mecánica/Repuesto: Recogen el equipo y se traslada a Bogotá. Fin del reporte.

3. RELACIÓN DE TRANSPORTE Y REMISIÓN DE MATERIALES

RELACIÓN DE TRANSPORTE Y REMISIÓN DE MATERIALES			
FECHA	**MATERIAL**	**N° DE VIAJES**	**DESCRIPCIÓN**
1/04/2026	SOBRANTE	12	SOLEADO
2/04/2026	SOBRANTE	0	FESTIVO
3/04/2026	SOBRANTE	0	FESTIVO
4/04/2026	SOBRANTE	0	FESTIVO
5/04/2026	SOBRANTE	0	FESTIVO
6/04/2026	SOBRANTE	14	SOLEADO
7/04/2026	SOBRANTE	0	SOLEADO
8/04/2026	SOBRANTE	24	SOLEADO
9/04/2026	SOBRANTE	24	SOLEADO
10/04/2026	SOBRANTE	8	SOLEADO
11/04/2026	SOBRANTE	0	SOLEADO
12/04/2026	SOBRANTE	0	SOLEADO
13/04/2026	SOBRANTE	8	SOLEADO
14/04/2026	SOBRANTE	4	SOLEADO
15/04/2026	SOBRANTE	0	SOLEADO
16/04/2026	SOBRANTE	3	SOLEADO
17/04/2026	SOBRANTE	3	SOLEADO
18/04/2026	SOBRANTE	0	SOLEADO
19/04/2026	SOBRANTE	0	SOLEADO
20/04/2026	SOBRANTE	10	SOLEADO
21/04/2026	SOBRANTE	16	SOLEADO
22/04/2026	SOBRANTE	8	SOLEADO
23/04/2026	SOBRANTE	6	SOLEADO
24/04/2026	SOBRANTE	6	SOLEADO
25/04/2026	SOBRANTE	0	SOLEADO
26/04/2026	SOBRANTE	0	SOLEADO
27/04/2026	SOBRANTE	4	SOLEADO
28/04/2026	SOBRANTE	4	SOLEADO
29/04/2026	SOBRANTE	0	SOLEADO
30/04/2026	SOBRANTE	7	SOLEADO
TOTAL		**161**	

4. AVANCE EN CAMPO (KM)

AVANCE DE OBRA YACOPI				
FECHA	LONGITUD (KM)	AVANCE (KM)	REPETICIÓN (KM)	DESCRIPCIÓN
1/04/2026	0.4	0.4		SOLEADO
2/04/2026	0	0.4		FESTIVO
3/04/2026	0	0.4		FESTIVO
4/04/2026	0	0.4		FESTIVO
5/04/2026	0	0.4		FESTIVO
6/04/2026	0.3	0.7		SOLEADO
7/04/2026	0.95	1.65		SOLEADO
8/04/2026	0.8	2.45		SOLEADO
9/04/2026	0.45	2.9		SOLEADO
10/04/2026	0.35	3.25		SOLEADO
11/04/2026	DOMINGO			
12/04/2026	0	3.25		LLUVIAS
13/04/2026	0.26	3.51		SOLEADO
14/04/2026	0.25	3.76		SOLEADO
15/04/2026	0.25	4.01		SOLEADO
16/04/2026	0	4.01		LLUVIAS
17/04/2026	0	4.01		LLUVIAS
18/04/2026	0	4.01		LLUVIAS
19/04/2026	DOMINGO			
20/04/2026	0.4	4.41		SOLEADO
21/04/2026	0.9	5.31		SOLEADO
22/04/2026	0.8	6.11		SOLEADO
23/04/2026	0.4	6.51		SOLEADO
24/04/2026	0.45	6.96		SOLEADO
25/04/2026	0.45	7.41		SOLEADO
26/04/2026	DOMINGO			
27/04/2026	0.15	7.56		SOLEADO
28/04/2026	0.2	7.76		SOLEADO
29/04/2026	0	7.76		SOLEADO
30/04/2026	0.3	8.06		SOLEADO
TOTAL	**8.06**	**8.06**		

5. RESUMEN DE HORAS DE LLUVIA, INOPERATIVIDAD Y EFECTIVAS LABORALES

RESUMEN DE HORAS DE LLUVIA, INOPERATIVIDAD Y EFECTIVAS LABORALES				
FECHA	HORAS DE LLUVIA	HORAS DE INOPERATIVIDAD	HORAS EFECTIVAS	DESCRIPCIÓN
1/04/2026	0	0	8	
2/04/2026	0	0	0	
3/04/2026	0	0	0	
4/04/2026	0	0	0	
5/04/2026	0	0	0	
6/04/2026	0	0	8	
7/04/2026	0	0	8	
8/04/2026	0	0	8	
9/04/2026	0	0	8	
10/04/2026	0	0	8	
11/04/2026	DOMINGO			
12/04/2026	0	0	0	
13/04/2026	0	0	0	
14/04/2026	0	0	8	
15/04/2026	0	0	8	
16/04/2026	0	0	8	
17/04/2026	0	0	8	
18/04/2026	0	0	8	
19/04/2026	DOMINGO			
20/04/2026	0	0	8	
21/04/2026	0	0	8	
22/04/2026	0	0	8	
23/04/2026	0	0	8	
24/04/2026	0	0	8	
25/04/2026	0	0	8	
26/04/2026	DOMINGO			
27/04/2026	0	0	8	
28/04/2026	0	0	8	
29/04/2026	0	0	8	
30/04/2026	0	0	8	
TOTAL	**0**	**0**	**184**	

UNIÓN TEMPORAL ICCU PARQUE 2025

6. MOVILIZACIONES

No se realizaron movilizaciones en este mes.

7. MANTENIMIENTOS

MANTENIMIENTOS			
FECHA	**EQUIPO**	**SERIAL**	**DESCRIPCIÓN**
17-04-2026	MOTONIVELADORA	CAT0120KCSZN01630	DESPINCHE DE LLANTAS Y CAMBIO DE MANGUERA DE PRINCIPAL
27-04-2026	ORUGA LBX	21005NOHEX2154	SE RECOGE ORUGA PARA REVISION DE MOTOR
24-04-2026	VOLQUETA	GZM 769	MANTENIMIENTO GENERAL

UNIÓN TEMPORAL ICCU PARQUE 2025

8. CONTROL DE TRABAJO MAQUINARIA

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025	CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA, VOLQUETAS Y TRACTOCAMIÓN E INSUMOS BASICOS											ICCU
OBJETO	"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".											
PERIODO:	ABRIL											
MUNICIPIO:	YACOPI						PROVINCIA:	RIO NEGRO				
MAQUINA:	VOLQUETA						SERIE	GZM 756				
CONTROL HORARIO				ACPM				UREA				OBSERVACIÓN
FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS	ACPM (GLS)	HOROMETRO DE TANQUEO	RENDIMIENTO	No. TIRILLA	UREA	HOROMETRO DE TANQUEO	RENDIMIENTO	No. TIRILLA	
1/04/2026	5554	5560	6									
2/04/2026	5560	5560	0									
3/04/2026	5560	5560	0									
4/04/2026	5560	5560	0									
5/04/2026	5560	5560	0									
6/04/2026	5560	5566	6									
7/04/2026	5566	5566	0									
8/04/2026	5566	5573	7	20.000	73788		3347	5	73788		248	
9/04/2026	5573	5579	6									
10/04/2026	5579	5581	2									
11/04/2026	5581	5581	0									
12/04/2026	5581	5581	0									
13/04/2026	5581	5587	6									
14/04/2026	5587	5592	5									
15/04/2026	5592	5592	0									
16/04/2026	5592	5598	6									
17/04/2026	5598	5598	0									
18/04/2026	5598	5598	0									
19/04/2026	5598	5598	0									
20/04/2026	5598	5603	5									
21/04/2026	5603	5609	6									
22/04/2026	5609	5617	8	20.000	74004	10.8	3209					
23/04/2026	5617	5623	6									
24/04/2026	5623	5631	8									
25/04/2026	5631	5631	0									
26/04/2026	5631	5631	0									
27/04/2026	5631	5635	4									
28/04/2026	5635	5642	7									
29/04/2026	5642	5642	0									
30/04/2026	5642	5643	1									
TOTAL MES			89.00	40.00		11		5.00		0.00		

UNIÓN TEMPORAL ICCU PARQUE 2025
NIT 902.017.719 -3

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025	CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA, VOLQUETAS Y TRACTOCAMIÓN E INSUMOS BASICOS	ICCU

OBJETO	"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".		
PERIODO:	ABRIL		
MUNICIPIO:	YACOPI	PROVINCIA:	RIO NEGRO
MAQUINA:	VOLQUETA	SERIE	GZM769

CONTROL HORARIO				ACPM				UREA				
FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS	ACPM (GLS)	HOROMETRO DE TANQUEO	RENDIMIENTO	No. TIRILLA	UREA	HOROMETRO DE TANQUEO	RENDIMIENTO	No. TIRILLA	OBSERVACIÓN
1/04/2026	5700	5705	5									
2/04/2026	5705	5705	0									
3/04/2026	5705	5705	0									
4/04/2026	5705	5705	0									
5/04/2026	5705	5705	0									
6/04/2026	5705	5713	8									
7/04/2026	5713	5713	0									
8/04/2026	5713	5719	6	20.000	148432		3346					
9/04/2026	5719	5725	6									
10/04/2026	5725	5728	3									
11/04/2026	5728	5728	0									
12/04/2026	5728	5728	0									
13/04/2026	5728	5734	6									
14/04/2026	5734	5745	11	20.000	148496	3	3203					
15/04/2026	5745	5745	0									
16/04/2026	5745	5745	0									
17/04/2026	5745	5747	2									
18/04/2026	5747	5747	0									
19/04/2026	5747	5747	0									
20/04/2026	5747	5752	5									
21/04/2026	5752	5761	9									
22/04/2026	5761	5772	11	20.000	148725	11	3206					
23/04/2026	5772	5778	6	41.000	149079	9	3210					
24/04/2026	5778	5778	0									
25/04/2026	5778	5778	0									
26/04/2026	5778	5778	0									
27/04/2026	5778	5778	0									
28/04/2026	5778	5785	7									
29/04/2026	5785	5793	8									
30/04/2026	5793	5796	3									
TOTAL MES			96.00	101.00		8		0.00		0.00		

CLL 13 # 47 – 12 BOGOTA – CUNDINAMARCA D.C TEL 313 258 3561
EMAIL: COORDINACION.ICCU.2026@GMAIL.COM

UNIÓN TEMPORAL ICCU PARQUE 2025
NIT 902.017.719 -3

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025	CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA, VOLQUETAS Y TRACTOCAMIÓN E INSUMOS BASICOS							ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
OBJETO	"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".							
PERIODO:	ABRIL							
MUNICIPIO:	YACOPI			PROVINCIA:	RIO NEGRO			
MAQUINA:	RETROEXCAVADORA CASE			SERIE	JJGN58SRKJC754124			
CONTROL HORARIO				ACPM				OBSERVACIÓN
FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS	ACPM (GLS)	HOROMETRO DE TANQUEO	RENDIMIENTO	No. TIRILLA	
1/04/2026	5375.9	5375.9	0					INOPERATIVA
2/04/2026	5375.9	5375.9	0					INOPERATIVA
3/04/2026	5375.9	5375.9	0					INOPERATIVA
4/04/2026	5375.9	5375.9	0					INOPERATIVA
5/04/2026	5375.9	5375.9	0					INOPERATIVA
6/04/2026	5375.9	5375.9	0					INOPERATIVA
7/04/2026	5375.9	5375.9	0					INOPERATIVA
8/04/2026	5375.9	5375.9	0					INOPERATIVA
9/04/2026	5375.9	5375.9	0					INOPERATIVA
10/04/2026	5375.9	5375.9	0					INOPERATIVA
11/04/2026	5375.9	5375.9	0					INOPERATIVA
12/04/2026	5375.9	5375.9	0					INOPERATIVA
13/04/2026	5375.9	5375.9	0					INOPERATIVA
14/04/2026	5375.9	5375.9	0					INOPERATIVA
15/04/2026	5375.9	5375.9	0					INOPERATIVA
16/04/2026	5375.9	5375.9	0					INOPERATIVA
17/04/2026	5375.9	5375.9	0					INOPERATIVA
18/04/2026	5375.9	5375.9	0					INOPERATIVA
19/04/2026	5375.9	5375.9	0					INOPERATIVA
20/04/2026	5375.9	5375.9	0					INOPERATIVA
21/04/2026	5375.9	5375.9	0					INOPERATIVA
22/04/2026	5375.9	5375.9	0					INOPERATIVA
23/04/2026	5375.9	5375.9	0					INOPERATIVA
24/04/2026	5375.9	5375.9	0					INOPERATIVA
25/04/2026	5375.9	5375.9	0					INOPERATIVA
26/04/2026	5375.9	5375.9	0					
27/04/2026	5375.9	5379.2	3.3	30.000	5375.9		3343	
28/04/2026	5379.2	5389	9.8					
29/04/2026	5389	5396.1	7.1					
30/04/2026	5396.1	5402.9	6.8					
TOTAL MES			27.00	30.00		0.00		

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025

UNIÓN TEMPORAL ICCU PARQUE 2025
NIT 902.017.719 -3

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025	CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA, VOLQUETAS Y TRACTOCAMIÓN E INSUMOS BASICOS	ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

OBJETO	"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".		
PERIODO:	ABRIL		
MUNICIPIO:	YACOPI	PROVINCIA:	RIO NEGRO
MAQUINA:	RETROEXCAVADORA JCB	SERIE	2936945

CONTROL HORARIO				ACPM				OBSERVACIÓN
FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS	ACPM (GLS)	HOROMETRO DE TANQUEO	RENDIMIENTO	No. TIRILLA	
1/04/2026	5751.5	5760	8.5					
2/04/2026	5760	5760	0					
3/04/2026	5760	5760	0					
4/04/2026	5760	5760	0					
5/04/2026	5760	5760	0					
6/04/2026	5760	5768.6	8.6	30.000	5760		3343	
7/04/2026	5768.6	5777.6	9					
8/04/2026	5777.6	5786.3	8.7	30.000	5777.6	1.7	3343	
9/04/2026	5786.3	5794.2	7.9					
10/04/2026	5794.2	5797.2	3	35.000	5794.2	2.1	3349	
11/04/2026	5797.2	5797.2	0					
12/04/2026	5797.2	5797.2	0					
13/04/2026	5797.2	5807.5	10.3					
14/04/2026	5807.5	5814.4	6.9	30.000	5807.5	2.3	3205	
15/04/2026	5814.4	5820.6	6.2					
16/04/2026	5820.6	5824	3.4	30.000	5824	1.8	3204	
17/04/2026	5824	5824	0					
18/04/2026	5824	5824	0					
19/04/2026	5824	5824	0					
20/04/2026	5824	5824	0					
21/04/2026	5824	5824	0					
22/04/2026	5824	5830.2	6.2					
23/04/2026	5830.2	5837.8	7.6					
24/04/2026	5837.8	5845.1	7.3	30.000	5845.1	1.4	3204	
25/04/2026	5845.1	5845.1	0					
26/04/2026	5845.1	5845.1	0					
27/04/2026	5845.1	5853.1	8					
28/04/2026	5853.1	5861	7.9					
29/04/2026	5861	5870.3	9.3	35.000	5861	2.2	3204	
30/04/2026	5870.3	5879.2	7.9					
TOTAL MES			126.70	220.00		1.9		

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025

CLL 13 # 47 – 12 BOGOTA – CUNDINAMARCA D.C TEL 313 258 3561
EMAIL: COORDINACION.ICCU.2026@GMAIL.COM

UNIÓN TEMPORAL ICCU PARQUE 2025
NIT 902.017.719 -3

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025	CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA, VOLQUETAS Y TRACTOCAMIÓN E INSUMOS BASICOS	ICCU

OBJETO	"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".		
PERIODO:	ABRIL		
MUNICIPIO:	YACOPI	PROVINCIA:	RIO NEGRO
MAQUINA:	MOTONIVELADORA CAT	SERIE	CATERPILLAR1630

CONTROL HORARIO				ACPM				UREA				
FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS	ACPM (GLS)	HOROMETRO DE TANQUEO	RENDIMIENTO	No. TIRILLA	UREA	HOROMETRO DE TANQUEO	RENDIMIENTO	No. TIRILLA	OBSERVACIÓN
1/04/2026	12145.7	12150	4.3									
2/04/2026	12150	12150	0									
3/04/2026	12150	12150	0									
4/04/2026	12150	12150	0									
5/04/2026	12150	12150	0									
6/04/2026	12150	12150	0									
7/04/2026	12150	12153.4	3.4									
8/04/2026	12153.4	12160.3	6.9	60.000	12153.4		3344					
9/04/2026	12160.3	12167.8	7.5									
10/04/2026	12167.8	12174	6.2									
11/04/2026	12174	12178	4									
12/04/2026	12178	12178	0									
13/04/2026	12178	12183.6	5.6									
14/04/2026	12183.6	12186.3	2.7	60.000	12183.6	2.0	3201					
15/04/2026	12186.3	12186.3	0									
16/04/2026	12186.3	12186.3	0									
17/04/2026	12186.3	12186.3	0									
18/04/2026	12186.3	12186.3	0									
19/04/2026	12186.3	12186.3	0									
20/04/2026	12186.3	12187.4	1.1									
21/04/2026	12187.4	12199.9	12.5									
22/04/2026	12199.9	12205.9	6	40.000	12199.9	2.5	3206					
23/04/2026	12205.9	12210	4.1									
24/04/2026	12210	12214.4	4.4									
25/04/2026	12214.4	12214.4	0									
26/04/2026	12214.4	12214.4	0									
27/04/2026	12214.4	12215.8	1.4									
28/04/2026	12215.8	12216.9	1.1									
29/04/2026	12216.9	12216.9	0									
30/04/2026	12216.9	12219.1	2.2									
TOTAL MES			**73.40**	**160.00**		**2.22**		**0.00**		**0.00**		

CLL 13 # 47 – 12 BOGOTA – CUNDINAMARCA D.C TEL 313 258 3561
EMAIL: COORDINACION.ICCU.2026@GMAIL.COM

UNIÓN TEMPORAL ICCU PARQUE 2025
NIT 902.017.719 -3

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025	CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA, VOLQUETAS Y TRACTOCAMIÓN E INSUMOS BASICOS	ICCU

OBJETO	"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".		
PERIODO:	ABRIL		
MUNICIPIO:	YACOPI	PROVINCIA:	RIO NEGRO
MAQUINA:	VIBROCOMPACTADOR AMMANN	SERIE	3003610

CONTROL HORARIO				ACPM				UREA				
FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS	ACPM (GLS)	HOROMETRO DE TANQUEO	RENDIMIENTO	No. TIRILLA	UREA	HOROMETRO DE TANQUEO	RENDIMIENTO	No. TIRILLA	OBSERVACIÓN
1/04/2026	3633.2	3637.7	4.5									
2/04/2026	3637.7	3637.7	0									
3/04/2026	3637.7	3637.7	0									
4/04/2026	3637.7	3637.7	0									
5/04/2026	3637.7	3637.7	0									
6/04/2026	3637.7	3641.7	4	20.000	3637.7		3345					
7/04/2026	3641.7	3647.8	6.1									
8/04/2026	3647.8	3654.4	6.6									
9/04/2026	3654.4	3660.8	6.4									
10/04/2026	3660.8	3663.4	2.6									
11/04/2026	3663.4	3663.4	0									
12/04/2026	3663.4	3663.4	0									
13/04/2026	3663.4	3663.5	0.1									
14/04/2026	3663.4	3663.5	0.1	40.000	3663.4	1.6	3202					
15/04/2026	3663.5	3663.5	0									
16/04/2026	3663.5	3663.5	0									
17/04/2026	3663.5	3663.5	0									
18/04/2026	3663.5	3663.5	0									
19/04/2026	3663.5	3663.5	0									
20/04/2026	3663.5	3663.8	0.3									
21/04/2026	3663.8	3672.9	9.1									
22/04/2026	3672.9	3676.2	3.3	20.000	3672.9	2.1	3207					
23/04/2026	3676.2	3680.6	4.4									
24/04/2026	3680.6	3685.5	4.9									
25/04/2026	3685.5	3685.5	0									
26/04/2026	3685.5	3685.5	0									
27/04/2026	3685.5	3687.8	2.3									
28/04/2026	3687.8	3691.5	3.7									
29/04/2026	3691.5	3691.5	0									
30/04/2026	3691.5	3693.7	2.2									
TOTAL MES			60.60	80.00		1.8		0.00		0.00		







UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025










CLL 13 # 47 – 12 BOGOTA – CUNDINAMARCA D.C TEL 313 258 3561
EMAIL: COORDINACION.ICCU.2026@GMAIL.COM

UNIÓN TEMPORAL ICCU PARQUE 2025
NIT 902.017.719 -3

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025	CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA, VOLQUETAS Y TRACTOCAMIÓN E INSUMOS BASICOS							ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
OBJETO	"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".							
PERIODO:	ABRIL							
MUNICIPIO:	YACOPI			PROVINCIA:	RIO NEGRO			
MAQUINA:	ORUGA LBX			SERIE	21005NOHEX2154			
CONTROL HORARIO				ACPM				OBSERVACIÓN
FECHA	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS	ACPM (GLS)	HOROMETRO DE TANQUEO	RENDIMIENTO	No. TIRILLA	
1/04/2026	8513.4	8513.4	0					INOPERATIVA
2/04/2026	8513.4	8513.4	0					INOPERATIVA
3/04/2026	8513.4	8513.4	0					INOPERATIVA
4/04/2026	8513.4	8513.4	0					INOPERATIVA
5/04/2026	8513.4	8513.4	0					INOPERATIVA
6/04/2026	8513.4	8513.4	0					INOPERATIVA
7/04/2026	8513.4	8513.4	0					INOPERATIVA
8/04/2026	8513.4	8513.4	0					INOPERATIVA
9/04/2026	8513.4	8513.4	0					INOPERATIVA
10/04/2026	8513.4	8513.4	0					INOPERATIVA
11/04/2026	8513.4	8513.4	0					INOPERATIVA
12/04/2026	8513.4	8513.4	0					INOPERATIVA
13/04/2026	8513.4	8513.4	0					INOPERATIVA
14/04/2026	8513.4	8513.4	0					INOPERATIVA
15/04/2026	8513.4	8513.4	0					INOPERATIVA
16/04/2026	8513.4	8513.4	0					INOPERATIVA
17/04/2026	8513.4	8522.6	9.2	103.3	8513.4		3348	INOPERATIVA
18/04/2026	8522.6	8522.6	0					INOPERATIVA
19/04/2026	8522.6	8522.6	0					INOPERATIVA
20/04/2026	8513.4	8522.6	9.2					INOPERATIVA
21/04/2026	8522.6	8531	8.4					INOPERATIVA
22/04/2026	8531	8540.3	9.3					INOPERATIVA
23/04/2026	8540.3	8546.2	5.9					INOPERATIVA
24/04/2026	8546.2	8546.2	0					INOPERATIVA
25/04/2026	8546.2	8546.2	0					INOPERATIVA
26/04/2026	8546.2	8546.2	0					INOPERATIVA
27/04/2026	8546.2	8546.2	0					INOPERATIVA
28/04/2026	8546.2	8546.2	0					INOPERATIVA
29/04/2026	8546.2	8546.2	0					INOPERATIVA
30/04/2026	8546.2	8546.2	0					INOPERATIVA
TOTAL MES			42.00	103.30		0.00		

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025

UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025	CONTROL DE TRABAJO DE MAQUINARIA ALQUILADA						ICCU
OBJETO	"ADMINISTRACION, OPERACION, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".						
PERIODO:	ABRIL						
MUNICIPIO:	YACOPI						
MAQUINA:	RETROCARGADOR					SERIE	JOHN DEERE 3688
FECHA	REGISTRO FOTOGRÁFICO HORÓMETRO INICIAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO HORÓMETRO FINAL	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	HORAS	STAND BY	OBSERVACIÓN
1/04/2026			19348.2	19355.8	7.6		
2/04/2026	X	X	19355.8	19355.8	0		FESTIVO
3/04/2026	X	X	19355.8	19355.8	0		FESTIVO
4/04/2026	X	X	19355.8	19355.8	0		FESTIVO
5/04/2026	X	X	19355.8	19355.8	0		FESTIVO
6/04/2026			19355.8	19363.4	7.6		
7/04/2026			19363.4	19371.8	8.4		
8/04/2026			19371.8	19376.3	4.5	0.5	
9/04/2026			19376.3	19384.1	7.8		
10/04/2026			19384.1	19392.5	8.4		
11/04/2026			19392.5	19399.1	6.6		
12/04/2026	X	X	19399.1	19399.1	0		
13/04/2026	X	X	19399.1	19399.1	0		

14/04/2026			19399.1	19407.2	8.1		
15/04/2026			19407.2	19411.7	4.5	0.5	
16/04/2026			19411.7	19418.7	7		
17/04/2026			19418.7	19421.2	2.5	2.5	
18/04/2026	X	X	19421.2	19421.2	0		
19/04/2026	X	X	19421.2	19421.2	0		
20/04/2026	X	X	19421.2	19421.2	0		
21/04/2026			19421.2	19430.2	9		
22/04/2026			19430.2	19439.5	9.3		
23/04/2026			19439.5	19448.1	8.6		
24/04/2026			19448.1	19454.5	6.4		
25/04/2026			19454.5	19461.1	6.6		FINALIZA ACTIVIDADES
SUBTOTAL MES					**112.9**	**3.5**	
TOTAL MES					**116.4**		
Firma			**Firma**				
Nombre:	**RICARDO ORTIZ**		**Nombre:**		**NICOLAS OCHOA**		
INSPECTOR UNION TEMPORAL PARQUE 2025			**INSPECTOR ICCU**				

9. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

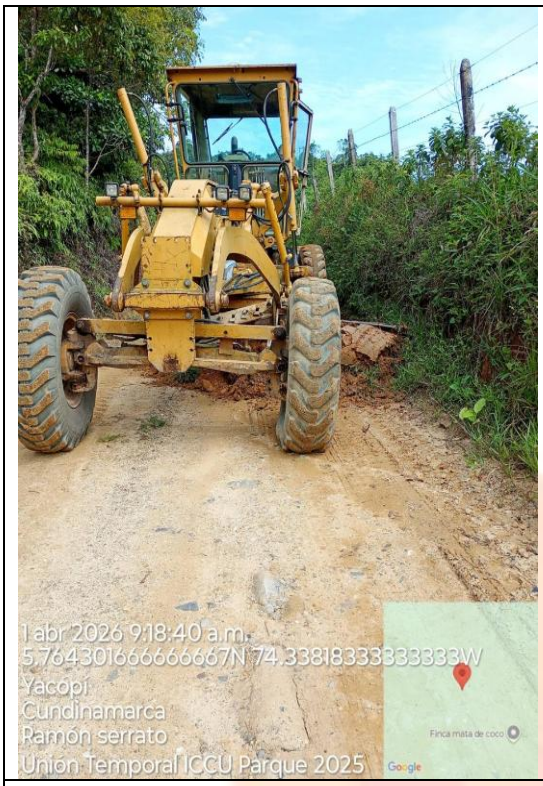
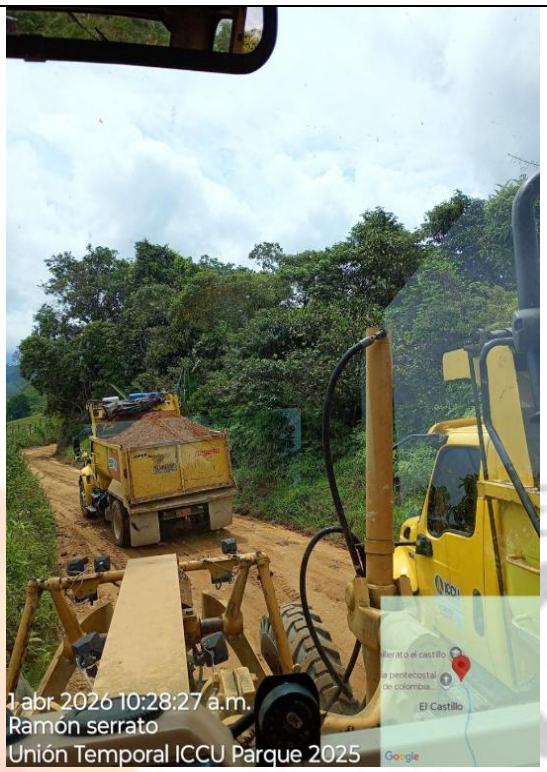
Durante el mes de Abril del 2026 se ejecutaron de manera continua las labores de mejoramiento y mantenimiento de la red vial, alcanzando un avance total de **8.06 kilómetros intervenidos**, distribuidos principalmente en los sectores de APOSENTOS, TORTOLAS, CASTILLO, BEJUCALES y CAIPAL. Las actividades se desarrollaron con normalidad y bajo condiciones climáticas estables, sin periodos de inoperancia, registrando un total de **184 horas efectivas de trabajo**.

En cuanto al transporte de materiales, se movilizaron **161 viajes de material orgánico**, destinados a las labores de relleno, conformación de la vía y apoyo de emergencias. No se realizaron movilizaciones de maquinaria durante el periodo, evidenciando estabilidad operativa en el frente de trabajo.

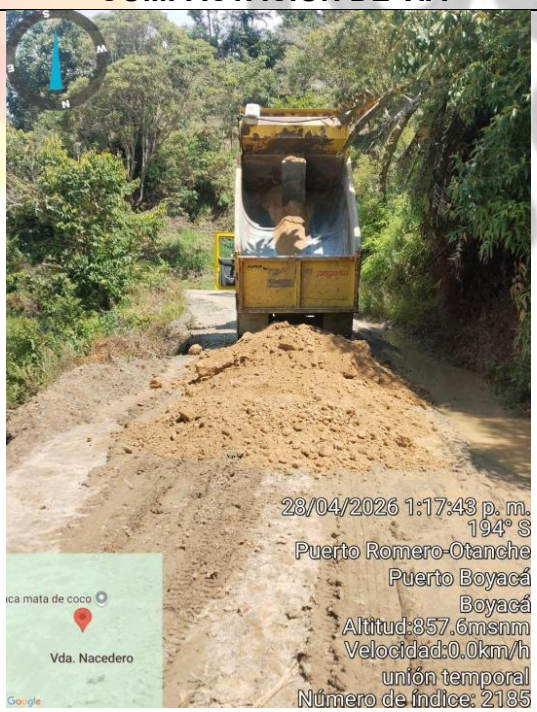
Las actividades incluyeron **remoción de derrumbes, escarificación, perfilación y cargue de material**, empleando para ello los equipos asignados al frente de trabajo: excavadora, vibrocompactador, motoniveladora, retroexcavadora y volqueta, los cuales operaron de manera eficiente ya que se contó con la operatividad de la excavadora de oruga nuevamente.

El frente de trabajo alcanzó un **avance físico del 30%**, cumpliendo satisfactoriamente con las metas programadas. Este resultado permitió atender de manera efectiva las necesidades de transitabilidad en los diferentes sectores rurales intervenidos, a pesar de tratarse de un mes con muchas precipitaciones, el cual fue aprovechado de forma eficiente para garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO

		
CONFORMACION DE VIA	**MEJORAMIENTO DE VIA**	**DESCARGUE DE MATERIAL**
		
CONFORMACION DE VIA	**CONFORMACION DE VIA**	**CARGUE DE MATERIAL**

UNIÓN TEMPORAL ICCU PARQUE 2025
NIT 902.017.719 -3

		
REMOCION DE DERRUMBES	**COMPACTACION DE VIA**	**CARGUE DE MATERIAL**
		
COMPACTACION DE VIA	**DESCARGUE DE MATERIAL**	**COMPACTACION DE VIA**

CLL 13 # 47 – 12 BOGOTA – CUNDINAMARCA D.C TEL 313 258 3561
EMAIL: COORDINACION.ICCU.2026@GMAIL.COM

		
NIVELACION DE VIA	**NIVELACION DE VIA**	**LIMPIEZA DE VIA**

NICOLAS OCHOA LINARES
INSPECTOR ICCU

RICARDO ORTIZ
INSPECTOR UT ICCU PARQUE 2025
