DIANA MARCELA DURAN RAMIREZ

Asunto: Cierre de Obras pendientes Colegio Buenavista IED
Ubicación: Reunión de Microsoft Teams

Iniciar: Jue 4/06/2026 10:00 AM
Finalizar: Jue 4/06/2026 11:00 AM

Mostrar como: Ocupado

Estado de la reunión: Organizador

Organizador: DIANA MARCELA DURAN RAMIREZ
Asistentes obligatorios: YOJANA PAOLA MONSALVE ROJAS; CAROL VIVIANA NIETO CARMONA; KAREN ILEANA MELO BUITRAGO; JUAN GUILLERMO AREVALO MEJIA; ANGELA LICETH MAHECHA MARTINEZ; IED - Directora Administrativa : Maria Constanza Rodriguez Diaz
Asistentes opcionales: SANTIAGO ANGEL URIBE

Buenos Días

La presente reunión se programa con el fin de definir fechas de terminación de obras en comedor y alrededores de la IED Buenavista, y con ello programar el inicio de funcionamiento luego del receso escolar.

Agradezco a todos remitir la presente citación de reunión a quienes crean pertinente que puedan aportar en la reunión.

Cordial Saludo.

_____

Reunión de Microsoft Teams

Unirse: https://teams.microsoft.com/meet/283865059857439?p=4o95aQNp4JDeiMAG2h

Id. de reunión: 283 865 059 857 439

Código de acceso: BN2Mq2sA

¿Necesita ayuda? | Referencia del sistema

Marcar por teléfono

+57 601 3299772,,419079694# Colombia, Bogota, D.C.

Buscar un número local

Id. de conferencia telefónica: 419 079 694#

Para organizadores: Opciones de la reunión | Restablecer el PIN de marcado

_____

Outlook

Apertura Comedor Escolar Colegio Buenavista IED - 8 de Julio 2026

Desde YOJANA PAOLA MONSALVE ROJAS <ymonsalve@educacionbogota.gov.co>
Fecha Jue 4/06/2026 4:21 PM
Para ORLANDO VARGAS MONSALVE <ovargasm@compensar.com>; ANDRES RICARDO HERRERA BERNAL <arherrerab@compensar.com>; JOHAN SEBASTIAN CARDENAS BETANCOURT <jscardenasb@compensar.com>; PAE NOVEDADES <pae.novedades@educacionbogota.gov.co>; DIANA MARCELA ZAPATA MONCADA <dzapata@educacionbogota.gov.co>; Patricia Mendez <coordinacion.tecnica@consorciodacpae2025.com.co>; IED - Información Y Contacto Institucional <institucional@calasanzbuenavista.edu.co>
CC SANDRA LORENA MORENO FORERO <slmoreno@educacionbogota.gov.co>; CLAUDIA YANETH LEON VELAZCO <cleon@educacionbogota.gov.co>; ESTEVE AMAURY COY MORENO <ecoym@educacionbogota.gov.co>; FREDY JERLEYN GOMEZ GOMEZ <fgomezg@educacionbogota.gov.co>; ADRIANA CORDOBA <acordoba1@educacionbogota.gov.co>; LEIDY ZOLANLLY GARCIA ALGARRA <lzgarcia@educacionbogota.gov.co>; DIANA MARCELA DURAN RAMIREZ <dduranr@educacionbogota.gov.co>; KAREN ILEANA MELO BUITRAGO <kmelo@educacionbogota.gov.co>; LILY ANDREA COLLAZOS FAJARDO <lcollazos@educacionbogota.gov.co>

Cordial saludo

De acuerdo con la confirmación emitida por la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos (DCCEE) y la Dirección de Cobertura (DC) respecto a la finalización de las intervenciones en el área social del comedor escolar durante el periodo de vacaciones de mitad de año, y en concertación con la Institución Educativa, se definieron las siguientes fechas:

1. Simulacro con estudiantes: 7 de julio de 2026.
2. Apertura del comedor escolar: 8 de julio de 2026.

Teniendo en cuenta lo anterior se proyecta la apertura del comedor escolar a partir del 8 de julio de 2026 confirmando el cambio de modalidad, iniciando la entrega del complemento alimentario en modalidad SIDAE (Primera entrega: Complemento Alimentario AM y Segunda entrega almuerzo)

Es importante señalar que la cocina móvil se encuentra operando actualmente, la cual se está entregando los suministros en la modalidad SIAT-i a los estudiantes de la IED.

Envío información para su conocimiento y demás fines.

Agradezco su atención y quedo atenta a cualquier inquietud o información adicional que se requiera.

Cordialmente.

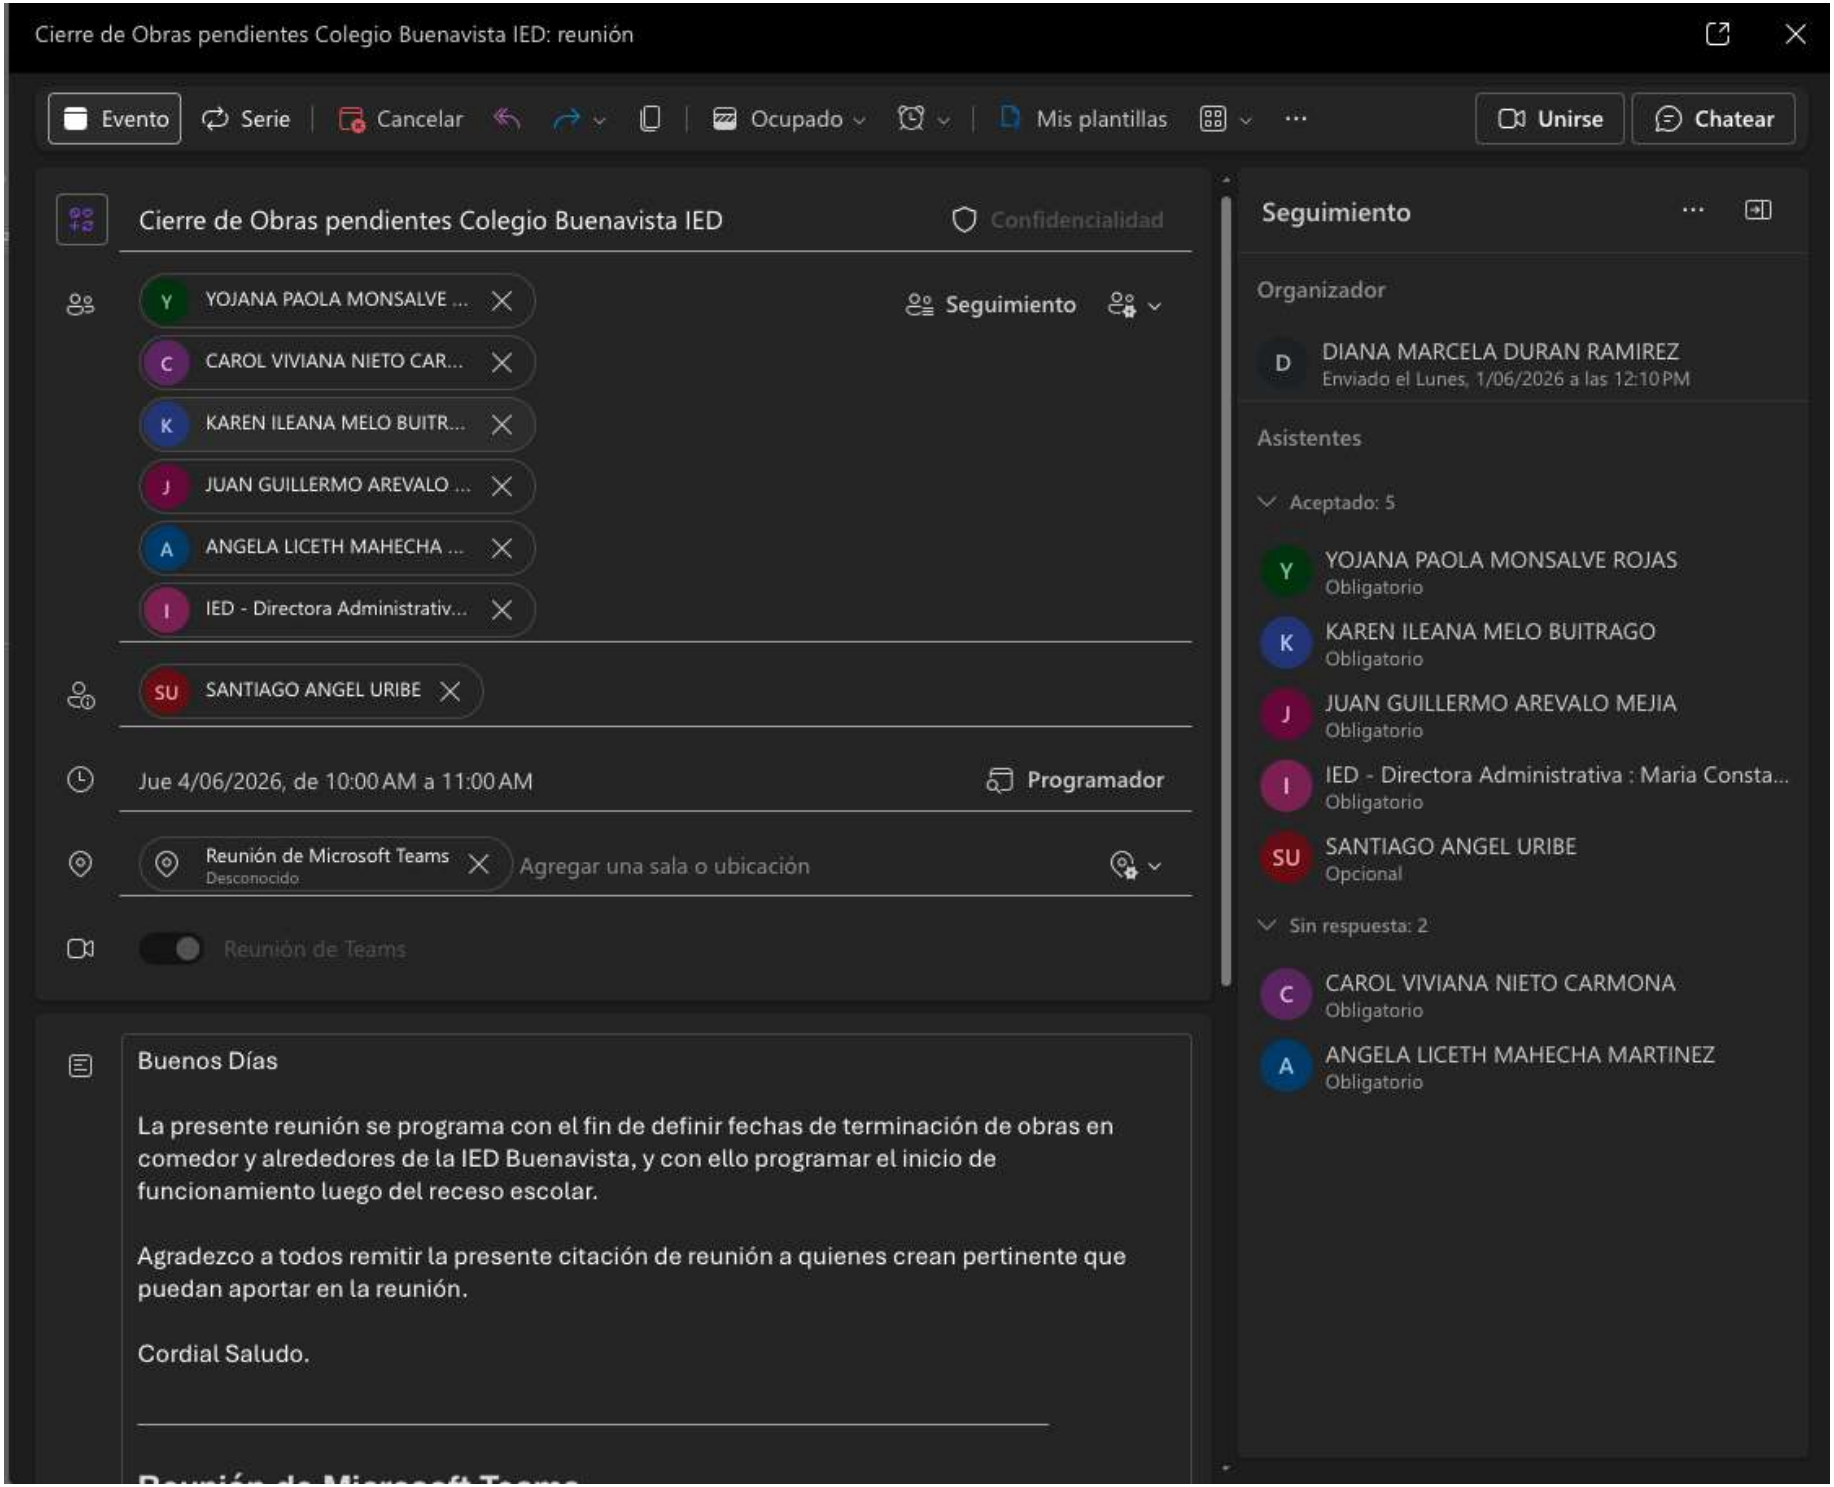
BOGOTÁ
Secretaría de Educación

Yojana Paola Monsalve Rojas
Programa de Alimentación Escolar
Profesional Equipo SIDAE – Contratista
Dirección de Bienestar Estudiantil
Av. El Dorado No. 66 - 63
Código postal: 111321
PBX: (+571) 324 1000 **Ext.:** 3117
Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195

Por favor evita imprimir, a menos que sea estrictamente necesario, al preferir el uso de documentos digitales se ahorra agua, energía y recursos forestales.

__ La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Educación del Distrito, pues su contenido

puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Educación del Distrito no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma.
www.educacionbogota.edu.co


Cierre de Obras pendientes Colegio Buenavista IED: reunión
Evento
Serie
Cancelar
Ocupado
Mis plantillas
Unirse
Chatear
Cierre de Obras pendientes Colegio Buenavista IED
Confidencialidad
YOJANA PAOLA MONSALVE ...
CAROL VIVIANA NIETO CAR...
KAREN ILEANA MELO BUITR...
JUAN GUILLERMO AREVALO ...
ANGELA LICETH MAHECHA ...
IED - Directora Administrativ...
Seguimiento
SANTIAGO ANGEL URIBE
Jue 4/06/2026, de 10:00 AM a 11:00 AM
Programador
Reunión de Microsoft Teams
Desconocido
Agregar una sala o ubicación
Reunión de Teams
Buenos Días
La presente reunión se programa con el fin de definir fechas de terminación de obras en comedor y alrededores de la IED Buenavista, y con ello programar el inicio de funcionamiento luego del receso escolar.
Agradezco a todos remitir la presente citación de reunión a quienes crean pertinente que puedan aportar en la reunión.
Cordial Saludo.
Seguimiento
Organizador
DIANA MARCELA DURAN RAMIREZ
Enviado el Lunes, 1/06/2026 a las 12:10 PM
Asistentes
Aceptado: 5
YOJANA PAOLA MONSALVE ROJAS
Obligatorio
KAREN ILEANA MELO BUITRAGO
Obligatorio
JUAN GUILLERMO AREVALO MEJIA
Obligatorio
IED - Directora Administrativa : Maria Consta...
Obligatorio
SANTIAGO ANGEL URIBE
Opcional
Sin respuesta: 2
CAROL VIVIANA NIETO CARMONA
Obligatorio
ANGELA LICETH MAHECHA MARTINEZ
Obligatorio

AYUDA DE MEMORIA	
TEMA:	Cierre de Obras pendientes Colegio Buenavista IED
FECHA:	04 – junio - 2026
HORA DE INICIO Y FIN:	10:00a.m – 11:00a.m
MODALIDAD:	Reunión Virtual – Microsoft Teams
RESUMEN DE LA REUNION:	La reunión es convocada por por parte de la Dirección de Cobertura con el fin de definir con el Administrador del servicio Educativo del colegio Buenavista y la Dirección de Construcciones, las fechas de terminación de las obras por reparación de tubería y socavación de terreno junto al aula múltiple, y las actividades pendientes de la obra de mejoramiento de cubierta del aula múltiple, ya que la terminación de estas actividades se requiere para la programación de apertura e inauguración del comedor escolar. Por lo anterior se proyectan las siguientes fechas como compromiso de las partes involucradas: • Terminación de reparaciones de los apiques y excavaciones, por parte del administrador 3-julio. • Finalización de limpieza y pintura estructura interna aula múltiple por el administrador 20 - junio • Terminación de destroncado de piso aula múltiple por la Dirección de Construcciones, 6 – jun. • Instalación de baranda en rampa, por la Dirección de Construcciones fecha máxima el 15 de julio. • Simulacro con estudiantes, por la Dir de Bienestar, 7 de julio. • Apertura del comedor escolar próximo 8 de julio. La anterior información fue validada por las partes involucradas con el fin de la puesta en operación del comedor escolar, se requiere que en caso de algún atraso o inconveniente que se presente durante la ejecución de las actividades y que pueda modificar la fecha de inicio de la operación, sea reportado oportunamente.
