Remite: CONSORCIO SG VIAL 25 <amvg4santander@gmail.com>

Fecha: 2026-06-19 09:55:36

Para: atencionciudadano@invias.gov.co


Asunto: REMISI N COMUNICADO 1535.00.496 REPORTE DESLIZAMIENTOS TALUD SUPERIOR EN LA V A BUCARAMANGA CUEST

Adjuntos: 01

Radicado: 2026E-VUVRAZ-063390

Fecha Radicación: 2026-06-19 10:18:12

Cc: Maria Conchita Ardila Itriago <mardila@invias.gov.co>



Bucaramanga, junio 19 de 2026

Ingeniero
JAIME ALCIDES RODRIGUEZ PEÑA
Instituto Nacional de Vías – INVIAS
DIRECTOR TERRITORIAL SANTANDER (E)
Autopista Floridablanca Km 1. Entrada a Ruitoque
Floridablanca Santander

REFERENCIA: Contrato 1535 de 2025 cuyo objeto es: "Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Santander AMV Grupo 4 Lote 1."

ASUNTO: Reporte de Deslizamientos de Tierra Talud Superior en la vía Bucaramanga - Pamplona, sector Bucaramanga – Cuestaboba, RN6603.

Cordial saludo,

De manera atenta, nos permitimos informar sobre las afectaciones registradas el pasado viernes 12 de junio y martes 16 de junio del año en curso, derivadas de las intensas precipitaciones presentadas en la zona, donde se identificaron cuatro (4) nuevos eventos de remoción en masa (deslizamientos de tierra, material arbóreo y capa vegetal) provenientes del talud superior en el corredor vial Bucaramanga – Cuestaboba.

Los desprendimientos se localizan en las siguientes abscisas, con un volumen consolidado aproximado de 80 m³:

- PR19+0050 (Margen Izquierda)
- PR20+0400 (Margen Izquierda)
- PR30+0610 (Margen Izquierda)
- PR41+0430 (Margen Izquierda)

A la fecha, el material desprendido en los PR19+0050 MI, PR20+0400 MI, PR30+0610 MI y PR41+0430 MI se encuentra confinado sobre la sección de la cuneta y debidamente señalizado. Asimismo, se reitera la necesidad de atender los deslizamientos previamente reportados mediante los comunicados ***No. 1535.00.249*** y ***No. 1535.00.488***, con el fin de evitar incidentes y restablecer las condiciones normales de operación del corredor vial.

En este sentido, y con el propósito de consolidar los eventos que a la fecha permanecen pendientes de intervención mediante maquinaria para el retiro y disposición final del material, se relacionan a continuación los ocho (8) puntos actualmente identificados sobre la vía:


- PR19+0050 MI (Presente comunicado).
- PR20+0400 MI (Presente comunicado).
- PR23+0430 MI (Comunicado No. 1535.00.488).
- PR27+0880 MD (Comunicado No. 1535.00.249).

- PR30+0610 MI (Presente comunicado).
- PR39+0020 MI (Comunicado No. 1535.00.488).
- PR41+0018 MI (Comunicado No. 1535.00.488).
- PR41+0430 MI (Presente comunicado).

Se anexa el respectivo registro fotográfico de los deslizamientos anteriormente relacionados, correspondiente a la inspección realizada el jueves 18 de junio de 2026, con el fin de evidenciar el estado actual de las afectaciones presentes sobre el corredor vial.

Dada la obstrucción parcial de la calzada y la acumulación de material sobre las cunetas en los diferentes puntos anteriormente descritos, se solicita de manera respetuosa impartir instrucciones a quien corresponda, para proceder con el retiro y la disposición final del material, con el objetivo de restablecer las condiciones normales de tránsito, prevenir procesos de infiltración que puedan afectar la estructura del pavimento debido a la disminución de la capacidad hidráulica de las cunetas y mitigar los riesgos asociados a la seguridad vial de los usuarios que transitan por este corredor.

Atentamente,



ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
Ingeniera Residente
Administración Vial G4 – Territorial Santander
CONSORCIO SG VIAL 25

Proyectó/Elaboró: CAJD-Ing. Auxiliar II
Revisó: EPET- Ing. Residente

C.C.	• Ingeniera María Conchita Ardila – Apoyo a la Supervisión del Cto. No.1535 de 2025 • Archivo Oficina
Anexos	• Registro Fotográfico

ANEXOS

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL SANTANDER
ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 4 LOTE 1

CONSORCIO SG VIAL 25

ANEXO 1 DE 1 COMUNICADO 1535.00.496- DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2026


REGISTRO FOTOGRÁFICO

DESLIZAMIENTO DE ÁRBOLES, CAPA VEGETAL Y TIERRA DE TALUD SUPERIOR VIA BUCARAMANGA - PAMPLONA, SECTOR BUCARAMANGA - CUESTABOBA, RN 6603





CAIDA DE TRONCOS DE ÁRBOL Y CAPA VEGETAL EN EL PR19+0050 MI VÍA BUCARAMANGA - CUESTABOBA, RN6603

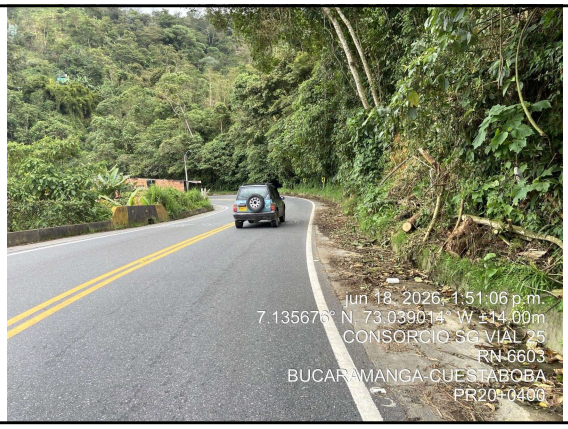



CAIDA DE TRONCOS DE ÁRBOL Y CAPA VEGETAL EN EL PR20+0400 MI VÍA BUCARAMANGA - CUESTABOBA, RN6603





MOVIMIENTO EN MASA DE SUELO EN EL PR23+0430 MI VÍA BUCARAMANGA - CUESTABOBA, RN6603


	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS TERRITORIAL SANTANDER ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 4 LOTE 1	CONSORCIO SG VIAL 25

ANEXO 1 DE 1 COMUNICADO 1535.00.496- DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2026

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DESLIZAMIENTO DE ÁRBOLES, CAPA VEGETAL Y TIERRA DE TALUD SUPERIOR VIA BUCARAMANGA - PAMPLONA, SECTOR BUCARAMANGA - CUESTABOBA, RN 6603



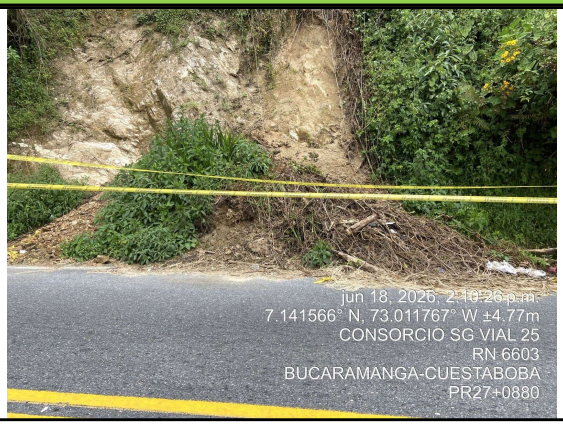

MOVIMIENTO EN MASA DE SUELO Y CAPA VEGETALEN EL PR27+0880 MD VÍA BUCARAMANGA - CUESTABOBA, RN6603





CAIDA DE TRONCO DE ÁRBOL Y CAPA VEGETAL EN EL PR30+0610 MI VÍA BUCARAMANGA - CUESTABOBA, RN6603





MOVIMIENTO EN MASA DE SUELO EN EL PR39+0020 MI VÍA BUCARAMANGA - CUESTABOBA, RN6603

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL SANTANDER
ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 4 LOTE 1

CONSORCIO SG VIAL 25

ANEXO 1 DE 1 COMUNICADO 1535.00.496- DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2026

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DESLIZAMIENTO DE ÁRBOLES, CAPA VEGETAL Y TIERRA DE TALUD SUPERIOR VIA BUCARAMANGA - PAMPLONA, SECTOR BUCARAMANGA - CUESTABOBA, RN 6603





MOVIMIENTO EN MASA DE SUELO Y CAIDA RAIZ DE ÁRBOL EN EL PR41+0018 MI VÍA BUCARAMANGA - CUESTABOBA, RN6603





MOVIMIENTO EN MASA DE SUELO EN EL PR41+0430 MI VÍA BUCARAMANGA - CUESTABOBA, RN6603

ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
Ingeniera Residente
Administración Vial G4 - INVIAS
CONSORCIO SG VIAL 25
