MEMORIA NUMERICA DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATANTE:	**MINISTERIO DE CULTURA**	**MUNICIPIO**	**BOGOTA**	**CUNDINAMARCA**	**INMUEBLE**
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS SJD-25	**CONTRATANTE**	MINISTERIO DE CULTURA		
INTERVENTORIA	CONSORCIO HOSPITALARIO CABA RC	**PROYECTO:**	"EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO SALUD MENTAL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."		COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS
LUGAR DE EJECUCION	COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS	**VALOR:**	$ 16.498.039.996		

N° ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD TOTAL**
INP-007	Corte con pulidora sobre muro en mamposteria	ML	1921,46

No	FECHA	UBICACIÓN. GENERAL	UBICACIÓN ESPECIFICA	Espacio	E N	T R E -	E J	E S	OBSERV	ACIONES	CANT.	LARGO	ANCHO	ALTO	TOTAL
1		Nivel 1	Habitación		F	H	13				9	2,44			21,96
2		Nivel 1	Habitación		F	H	14				11	2,44			26,84
3		Nivel 1	Habitación		F	H	13				2	2,44			4,88
4		Nivel 1	Habitación		F	H	14				2	2,44			4,88
5		Nivel 1	Habitación		G"		17				4	2,44			9,76
6		Nivel 1	Habitación		G	H	17				12	2,44			29,28
7		Nivel 1	Habitación		G		16				2	2,44			4,88
8		Nivel 1	Habitación		E		16				2	2,44			4,88
9		Nivel 1	Habitación		F	H	10'				2	2,44			4,88
10		Nivel 1	Habitación		F	H	10'				12	2,44			29,28
11		Nivel 1	Habitación		H		9	10			12	2,44			29,28
12		Nivel 1	Habitación		H		9	10			3	2,44			7,32
13		Nivel 1	Habitación		D	E	10'	13			6	2,44			14,64
14		Nivel 1	Habitación		A	C	16				7	2,44			17,08
15		Nivel 1	Habitación		A	B	14				7	2,44			17,08
16		Nivel 1	Habitación		A	D	13				10	2,44			24,40
17		Nivel 1	Habitación		A	D	13				6	2,44			14,64
18		Nivel 2	Habitación		F	H	13				6	2,44			14,64
19		Nivel 2	Habitación		F	H	14				8	2,44			19,52
20		Nivel 2	Habitación		F	H	13				4	2,44			9,76
21		Nivel 2	Habitación		F	H	14				2	2,44			4,88
22		Nivel 2	Habitación		G"		16				2	2,44			4,88
23		Nivel 2	Habitación		G	H	17				14	2,44			34,16
24		Nivel 2	Habitación		E		16				2	2,44			4,88
25		Nivel 2	Habitación		D	E	10'	13			6	2,44			14,64
26		Nivel 2	Habitación		A	C	16				7	2,44			17,08
27		Nivel 2	Habitación		B		15				4	2,44			9,76
28		Nivel 2	Habitación		B		14				2	2,44			4,88
29		Nivel 2	Habitación		A	D	13				14	2,44			34,16
30		Nivel 2	Habitación		A	D	13				2	2,44			4,88
31		Nivel 2	Habitación		B		10'				2	2,44			4,88
32		Nivel 1	Habitación		A	C	5				14	2,44			34,16
33		Nivel 1	Habitación		A	B	2				8	2,44			19,52
34		Nivel 2	Habitación		A	C	5				10	2,44			24,40
35		Nivel 2	Habitación		A	B	2				8	2,44			19,52
36		Nivel 1	Habitación		A	B	2				8	2,44			19,52
37		Nivel 1	Habitación		E		2				1	2,44			2,44
38		Nivel 1	Habitación		E		2				1	2,85			2,85
39		Nivel 1	Habitación		H'		1				4	2,85			11,40
40		Nivel 1	Habitación		C	D	3	5			10	1,00			10,00
41		Nivel 1	Habitación		F	G	3	5			12	2,44			29,28
42		Nivel 1	Habitación		D	E	6	7			16	2,44			39,04
43		Nivel 1	Habitación		D	E	8	9			10	2,44			24,40
44		Nivel 1	Habitación		E	G	17				8	2,61			20,88
45		Nivel 2	Habitación		E	G	17				8	2,61			20,88
46		Nivel 1	Habitación		E	G	17				20	2,61			52,20
47		Nivel 2	Habitación		E	G	17				20	2,61			52,20
48		Nivel 1	Habitación		H		9	11			2	7,60			15,20
49		Nivel 1	Habitación		C	D	8				4	2,61			10,44
50		Nivel 1	Habitación		C	D	9		TANQUE		4	2,61			10,44
51		Nivel 1	Habitación		D	E	8	9			8	2,61			20,88
52		Nivel 1	Habitación		H		1	5			12	3,10			37,20
53		Nivel 2	Habitación		A	C	17				20	2,61			52,20
54		Nivel 1	Habitación		F		7	8			4	2,61			10,44
55		Nivel 1	Habitación		G"		8	9			4	2,61			10,44
56		Nivel 1	Habitación		H'		8	9			4	2,61			10,44
57		Nivel 1	Habitación		G"	H'	9				8	2,61			20,88
58		Nivel 1	Habitación		F		8				4	2,61			10,44
59		Nivel 1	Habitación		H	H'	7	9			20	1,60			32,00
60		Nivel 1	Habitación		G	H'	7				12	1,40			16,80
61		Nivel 1	Habitación		F		5				4	2,61			10,44
62		Nivel 1	Habitación		E		14				2	2,61			5,22
63		Nivel 1	Habitación		E		11				4	2,61			10,44
64		Nivel 2	Habitación		E		5	9			16	2,61			41,76

MEMORIA NUMERICA DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATANTE:	**MINISTERIO DE CULTURA**	**MUNICIPIO**	**BOGOTA**	**CUNDINAMARCA**	**INMUEBLE**
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS SJD-25	**CONTRATANTE**	MINISTERIO DE CULTURA		
INTERVENTORIA	CONSORCIO HOSPITALARIO CABA RC	**PROYECTO:**	"EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO SALUD MENTAL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."		COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS
LUGAR DE EJECUCION	COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS	**VALOR:**	$ 16.498.039.996		

N° ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD TOTAL**
INP-007	Corte con pulidora sobre muro en mamposteria	ML	1921,46

No	FECHA	UBICACIÓN. GENERAL	UBICACIÓN ESPECIFICA	Espacio	E N	T R E -	E J	E S	OBSERV	ACIONES	CANT.	LARGO	ANCHO	ALTO	TOTAL
65		Nivel 2	Habitación		D		10				1	3,40			3,40
66		Nivel 2	Habitación		D		7				1	3,75			3,75
67		Nivel 2	Habitación		D		9				1	3,94			3,94
68		Nivel 2	Habitación		C		7	10			56	1,60			89,60
69		Nivel 2	Habitación		F		9				4	2,61			10,44
70		Nivel 2	Habitación		A	D	11				20	2,61			52,20
71		Nivel 2	Habitación		A		13				4	2,61			10,44
72		Nivel 2	Habitación		C		8	10			16	2,61			41,76
73		Nivel 2	Habitación		E		5	9			4	2,61			10,44
74		Nivel 2	Habitación		A	C	1	7			36	1,60			57,60
75		Nivel 1	Habitacion		E	F	14				4	2,61			10,44
76		Nivel 1	Habitacion		H		13				4	2,61			10,44
77		Nivel 2	Habitación		A	D	11				20	2,61			52,20
78		Nivel 2	Habitacion		A		13				4	2,61			10,44
79		Nivel 2	Habitacion		H		13				4	2,61			10,44
80		Nivel 2	Habitación		A	D	11				24	2,61			62,64
81		Nivel 1	Habitación		C	D	7	10			36	2,61			93,96
82		Nivel 1	Habitación		E	H	1	5			28	2,61			73,08
83		terraza	Habitación		H		11	17			2	12,36			24,72
84		terraza	Habitación		A		11	17			2	12,36			24,72
85		terraza	Habitación		E		10	11			2	27,48			54,96
86		terraza	Habitación		E		10	11			32	0,50			16,00
87		Nivel 2	Habitación		D		7	10			2	1,20			2,40
88		Nivel 2	Habitación		D		7	10			2	3,20			6,40
89		Nivel 2	Habitación		D		7	10			2	1,20			2,40
90		Nivel 2	Habitación		D		7	10			2	3,60			7,20
91		Nivel 2	Habitación		D		7	10			2	1,20			2,40
92		Nivel 2	Habitación		D		7	10			2	3,60			7,20
93		Nivel 2	Habitación		D		7	10			2	4,27			8,54
94															
					CANTIDADES TOTALES >>>										1921,46


MEMORIA NUMERICA DE CANTIDADES DE OBRA					
CONTRATANTE:	**MINISTERIO DE CULTURA**	**MUNICIPIO**	**BOGOTA**	**CUNDINAMARCA**	**INMUEBLE**
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS SJD-25	**CONTRATANTE**	MINISTERIO DE CULTURA		
INTERVENTORIA	CONSORCIO HOSPITALARIO CABA RC	**PROYECTO:**	"EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO SALUD MENTAL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."		COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS
LUGAR DE EJECUCION	COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS	**VALOR:**	$ 16.498.039.996		

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
INP-007	Corte con pulidora sobre muro en mamposteria	ML	1921,46

No	FECHA	UBICACIÓN. GENERAL	UBICACIÓN ESPECIFICA	Espacio	E N	T R E -	E J E S	OBSERV ACIONES	CANT.	LARGO	ANCHO	ALTO	TOTAL

MEMORIA GRAFICA DE CANTIDADES DE OBRA

PISO 1

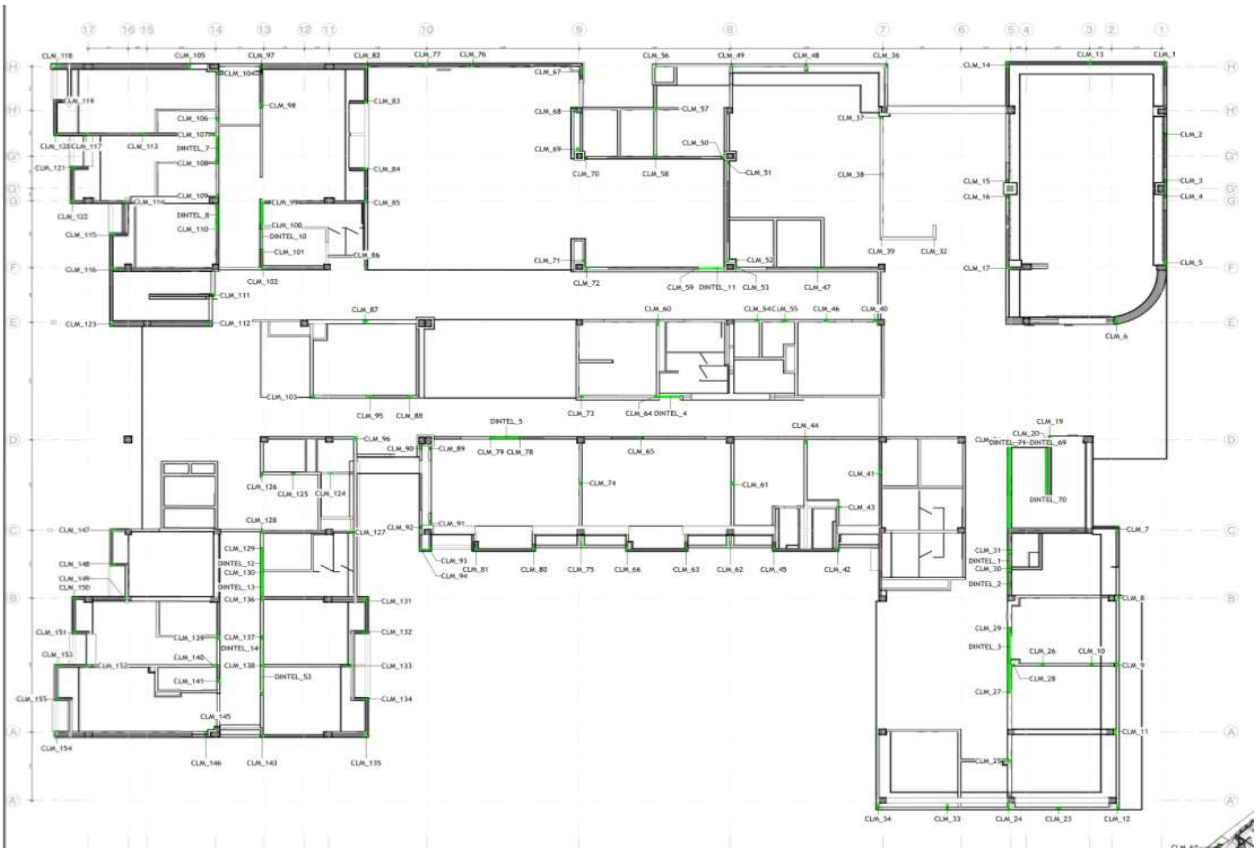


MEMORIA NUMERICA DE CANTIDADES DE OBRA					
CONTRATANTE:	**MINISTERIO DE CULTURA**	**MUNICIPIO**	**BOGOTA**	**CUNDINAMARCA**	**INMUEBLE**
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS SJD-25	**CONTRATANTE**	MINISTERIO DE CULTURA		
INTERVENTORIA	CONSORCIO HOSPITALARIO CABA RC	**PROYECTO:**	"EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO SALUD MENTAL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."		COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS
LUGAR DE EJECUCION	COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS	**VALOR:**	$ 16.498.039.996		

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
INP-007	Corte con pulidora sobre muro en mamposteria	ML	1921,46

No	FECHA	UBICACIÓN. GENERAL	UBICACIÓN ESPECIFICA	Espacio	E N	T R E -	E J E S	OBSERVACIONES	CANT.	LARGO	ANCHO	ALTO	TOTAL

IMAGEN:

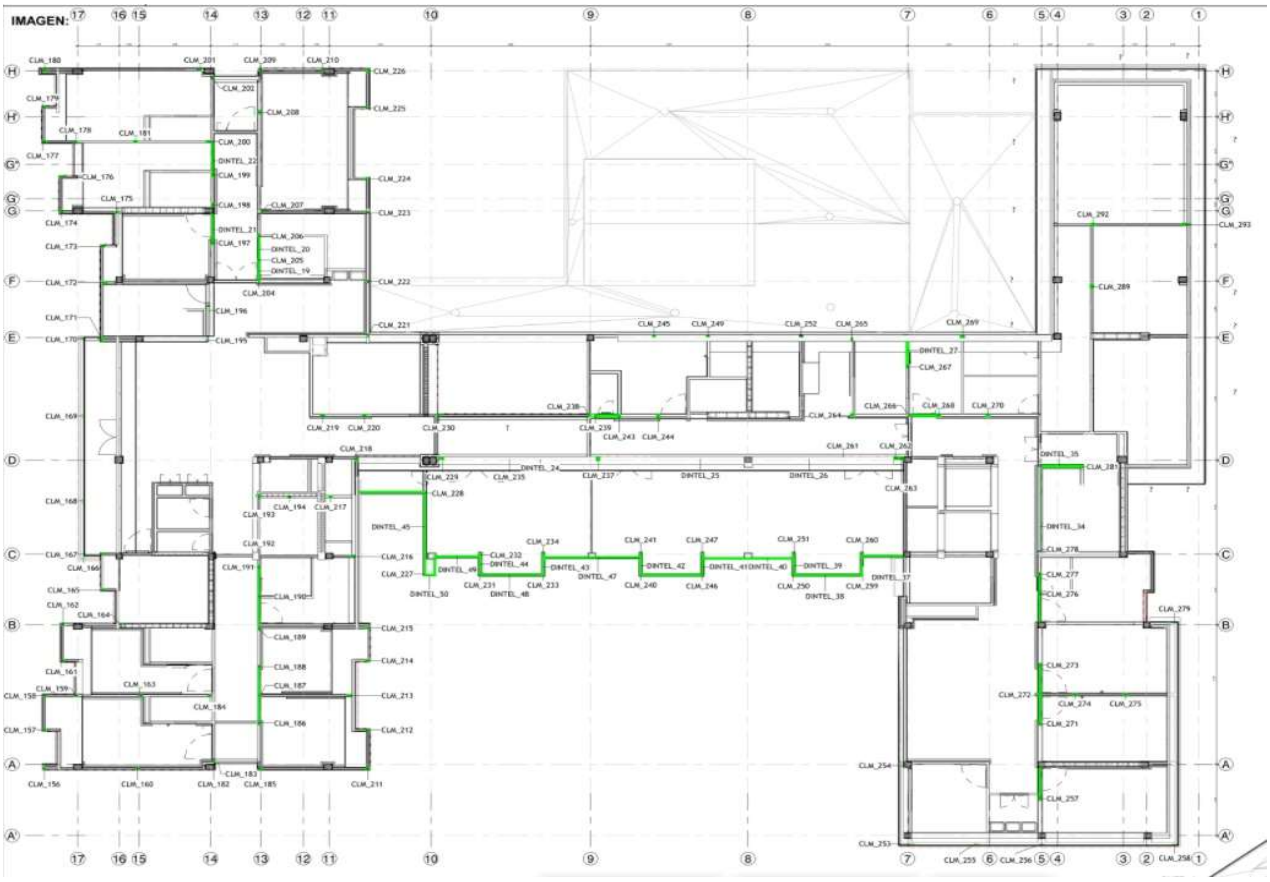


MEMORIA NUMERICA DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATANTE:	**MINISTERIO DE CULTURA**	**MUNICIPIO**	**BOGOTA**	**CUNDINAMARCA**	**INMUEBLE**
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS SJD-25	**CONTRATANTE**	MINISTERIO DE CULTURA		
INTERVENTORIA	CONSORCIO HOSPITALARIO CABA RC	**PROYECTO:**	"EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO SALUD MENTAL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."		COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS
LUGAR DE EJECUCION	COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS	**VALOR:**	$ 16.498.039.996		

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
INP-007	Corte con pulidora sobre muro en mamposteria	ML	1921,46

No	FECHA	UBICACIÓN. GENERAL	UBICACIÓN ESPECIFICA	Espacio	E N	T R E -	E J E S	OBSERV	ACIONES	CANT.	LARGO	ANCHO	ALTO	TOTAL

IMAGEN:

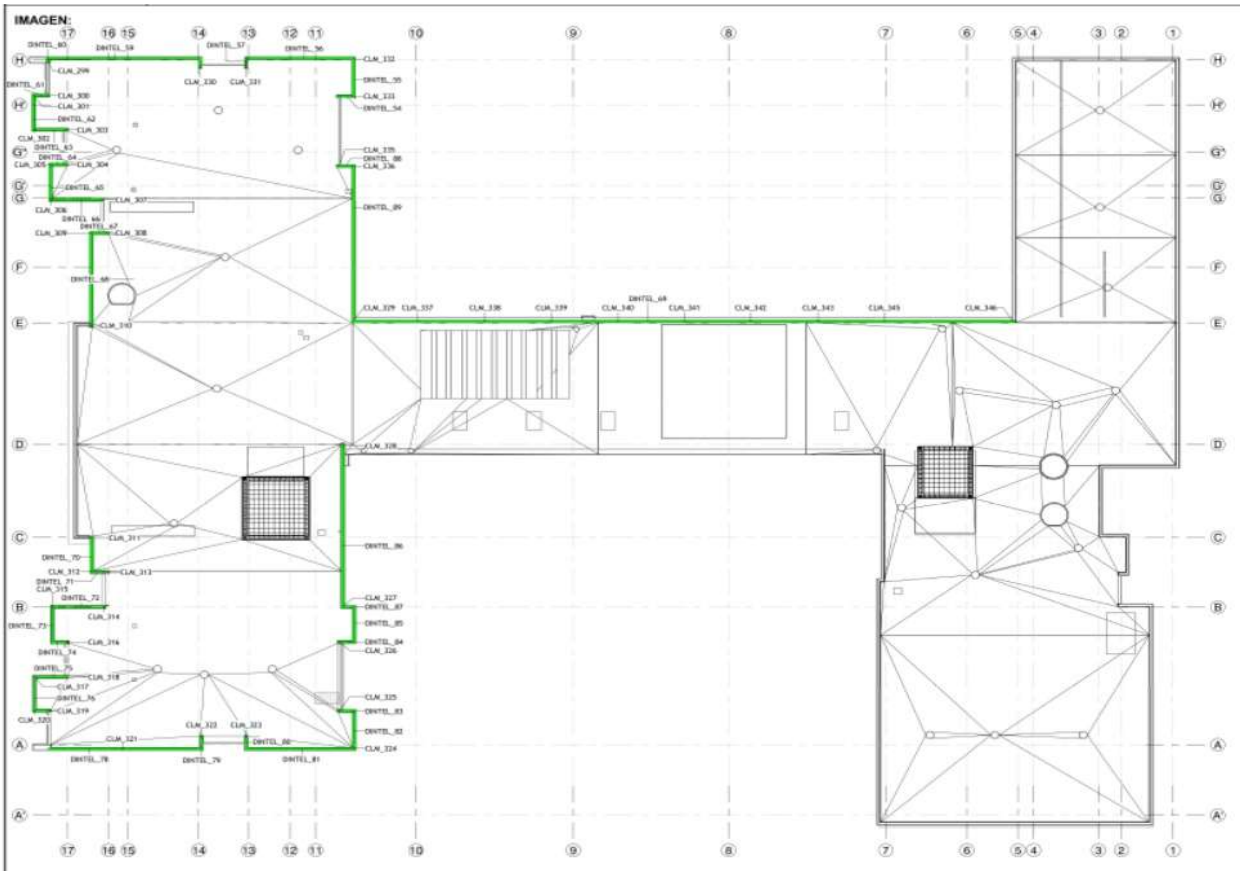

MEMORIA NUMERICA DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATANTE:	**MINISTERIO DE CULTURA**	**MUNICIPIO**	**BOGOTA**	**CUNDINAMARCA**	**INMUEBLE**
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS SJD-25	**CONTRATANTE**	MINISTERIO DE CULTURA		
INTERVENTORIA	CONSORCIO HOSPITALARIO CABA RC	**PROYECTO:**	"EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO SALUD MENTAL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."		COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS
LUGAR DE EJECUCION	COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS	**VALOR:**	$ 16.498.039.996		

N° ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD TOTAL**
INP-019	Suministro e instalacion de filtro frances para manejo de aguas. (No incluye excavación)	ML	2,00

No	FECHA	UBICACIÓN. GENERAL	UBICACIÓN ESPECIFICA	Espacio	E N	T R E -	E J	E S	OBSERV	ACIONES	CANT.	LARGO	ANCHO	ALTO	TOTAL
1		SOTANO			11	13	E	D	DEBAJO DE AREA		2				2,00
					CANTIDADES TOTALES >>>										2,00

MEMORIA GRAFICA DE CANTIDADES DE OBRA

SOTANO

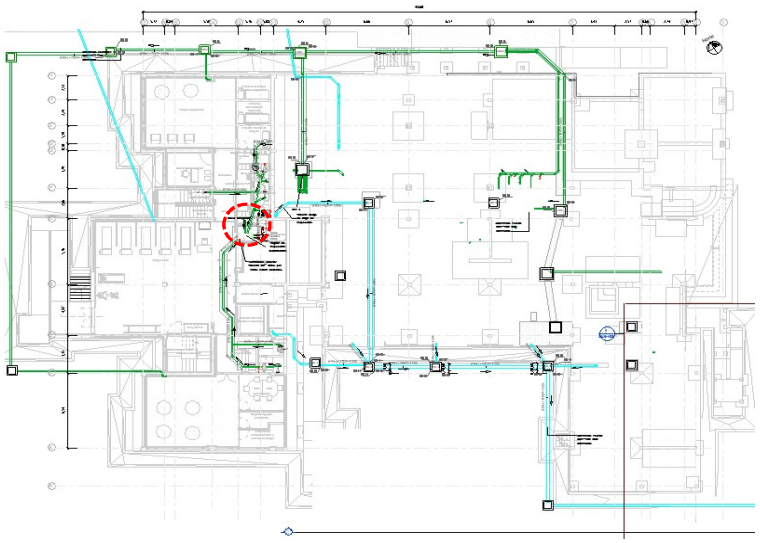

MEMORIA NUMERICA DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATANTE:	**MINISTERIO DE CULTURA**	**MUNICIPIO**	**BOGOTA**	**CUNDINAMARCA**	**INMUEBLE**
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS SJD-25	**CONTRATANTE**	MINISTERIO DE CULTURA		
INTERVENTORIA	CONSORCIO HOSPITALARIO CABA RC	**PROYECTO:**	"EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO SALUD MENTAL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."		COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS
LUGAR DE EJECUCION	COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS	**VALOR:**	$ 16.498.039.996		

N° ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD TOTAL**
INP-036	Acarreo horizontal y vertical para rellenos y demoliciones	M3	910,00

No	FECHA	UBICACIÓN. GENERAL	UBICACIÓN ESPECIFICA	Espacio	E N	T R E-	E J	E S	OBSERV	ACIONES	CANT.	LARGO	ANCHO	ALTO	TOTAL
1		Semisotano	Habitación		B	D	11	14			1	2,08	3,25	0,85	5,75
2		Semisotano	Habitación		B	D	11	14			-1	1,60	1,60	0,40	-1,02
3		Semisotano	Habitación		B	D	11	14			1	3,30	4,28	1,10	15,54
4		Semisotano	Habitación		B	D	11	14			-1	2,95	2,82	1,10	-9,15
5		Semisotano	Habitación		A	C	13	16			1	6,17	5,47	0,85	28,69
6		Semisotano	Habitación		A	C	13	16			-1	2,00	2,00	0,40	-1,60
7		Semisotano	Habitación		A	C	13	16			-1	1,60	0,80	0,40	-0,51
8		Semisotano	Habitación		A	C	13	16			-1	2,20	2,00	0,40	-1,76
9		Semisotano	Habitación		A	C	13	16			-1	1,37	1,60	0,40	-0,88
10		Semisotano	Habitación		G	H	14				1	4,65	0,65	0,50	1,51
11		Semisotano	Habitación		G		11	14			1	4,60	0,65	0,50	1,50
12		Semisotano	Habitación		G	F	14				1	2,30	0,65	0,50	0,75
13		Semisotano	Habitación		F		11	14			1	4,60	0,65	0,50	1,50
14		Semisotano	Habitación		E		11	14			1	4,35	0,65	0,50	1,41
15		Semisotano	Habitación		D	E	11	12			1	5,62	0,65	0,50	1,83
16		Semisotano	Habitación		D	F	12	14			1	7,62	0,65	0,50	2,48
17		Semisotano	Habitación		D	E	15	16			1	5,62	0,65	0,50	1,83
18		Semisotano	Habitación		D		15	17'			1	5,50	0,65	0,50	1,79
19		Semisotano	Habitación		D		15	13			1	5,50	0,65	0,50	1,79
20		Semisotano	Habitación		D		13	11			1	2,52	0,65	0,50	0,82
21		Semisotano	Habitación		F	E	14				1	1,79	0,65	0,50	0,58
22		Semisotano	Habitación		C	D	16				1	3,70	0,65	0,50	1,20
23		Semisotano	Habitación		C	D	13	14			1	4,15	0,65	0,50	1,35
24		Semisotano	Habitación		C	D	11				1	1,20	0,65	0,50	0,39
25		Semisotano	Habitación		C		14	15			1	3,51	0,65	0,50	1,14
26		Semisotano	Habitación		C	D	11				1	1,79	0,65	0,50	0,58
27		Semisotano	Habitación		B		12	14			1	2,89	0,65	0,50	0,94
28		Semisotano	Habitación		A	B	14				1	6,37	0,65	0,50	2,07
29		Semisotano	Habitación		A	B	11				1	2,92	0,65	0,50	0,95
30		Semisotano	Habitación		E	G"	11	13			1	0,50	1,80	0,65	0,59
31		Semisotano	Habitación		E	G"	11	13			1	2,30	1,80	0,65	2,69
32		Semisotano	Habitación		E	G"	11	13			1	2,10	1,80	0,65	2,46
33		Semisotano	Habitación		B	C	11	13			1	11,40	0,50	0,60	3,42
34		Semisotano	Habitación		B	C	11	13			1	3,50	0,50	0,60	1,05
35		Semisotano	Habitación		F	G"	14	16			1	3,50	4,00	0,90	12,60
36		Semisotano	Habitación		F	G"	14	16			-1	2,00	0,86	0,40	-0,69
37		Semisotano	Habitación		H		14				1	1,00	1,00	2,00	2,00
38		Semisotano	Habitación		A		14				1	1,00	1,00	2,00	2,00
39		Semisotano	Habitación		H		17				1	1,00	1,00	0,85	0,85
40		Semisotano	Habitación		D	F	11	14			1	6,00	5,20	0,20	6,24
41		Semisotano	Habitación		D	F	11	14			1	2,50	5,20	0,20	2,60
42		Semisotano	Habitación		A	C	11	17			1	5,60	5,00	0,15	4,20
43		Semisotano	Habitación		A	C	11	17			1	5,20	3,60	0,15	2,81
44		Semisotano	Habitación		A	C	11	17			1	3,50	3,30	0,15	1,73
45		Semisotano	Habitación		A	C	11	17			1	5,60	3,90	0,15	3,28
46		Semisotano	Habitación		A	C	11	17			1	4,70	4,25	0,15	3,00
47		Semisotano	Habitación		A	C	11	17			1	1,60	2,00	0,15	0,48
48		Semisotano	Habitación		G	H	11	17			1	4,22	5,90	0,15	3,73
49		Semisotano	Habitación		G	H	11	17			1	4,90	4,41	0,15	3,24
50		Semisotano	Habitación						TANQUE		1	138,75	1,00	1,00	138,75
51		Nivel 1	Habitación		F		9				1	2,47	2,57	2,13	13,52
52		Nivel 1	Habitación		F		9				-1	0,45	0,50	2,13	-0,48
53		Nivel 1	Habitación		D	E	7	9			1	3,60	1,87	1,20	8,08
54		Nivel 1	Habitación		D	E	7	9			1	6,20	3,50	1,20	26,04
55		Nivel 1	Habitación		C	E	4	7			1	4,33	4,99	2,40	51,86
56		Nivel 1	Columna C-7		C	E	4	7			-1	2,80	2,80	0,35	-2,74
57		Nivel 1	Columna C-7		C	E	4	7			-1	2,33	2,46	1,20	-6,88
58		Nivel 1	Habitación M-9		G'		5				1	2,60	2,55	1,18	7,82
59		Nivel 1	Columna - M 5		G'		5				-1	0,55	0,55	1,18	-0,36
60		Nivel 1	Columna - M 5		C	D	3				1	4,40	0,80	1,75	6,16
61		Nivel 1	Habitación		D		2	4			1	3,00	2,50	3,20	24,00
62		Nivel 1	Habitación		D		2	4			1	3,00	2,08	0,30	1,87
63		Nivel 1	Habitación		A	B	5	7			1	1,07	1,09	0,40	0,47
64		Nivel 1	Habitación		A	B	5	7			1	1,10	0,60	0,40	0,26

MEMORIA NUMERICA DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATANTE:	**MINISTERIO DE CULTURA**	**MUNICIPIO**	**BOGOTA**	**CUNDINAMARCA**	**INMUEBLE**
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS SJD-25	**CONTRATANTE**	MINISTERIO DE CULTURA		
INTERVENTORIA	CONSORCIO HOSPITALARIO CABA RC	**PROYECTO:**	"EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO SALUD MENTAL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."		COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS
LUGAR DE EJECUCION	COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS	**VALOR:**	$ 16.498.039.996		

N° ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD TOTAL**
INP-036	Acarreo horizontal y vertical para rellenos y demoliciones	M3	910,00

No	FECHA	UBICACIÓN. GENERAL	UBICACIÓN ESPECIFICA	Espacio	E N	T R E-	E J	E S	OBSERV	ACIONES	CANT.	LARGO	ANCHO	ALTO	TOTAL
65		Nivel 1	Habitación		A	B	5	7			1	1,40	0,27	0,40	0,15
66		Nivel 1	Habitación		A	B	5	7			1	4,00	0,60	0,40	0,96
67		Nivel 1	Habitación		A	B	5	7			1	3,00	0,40	0,40	0,48
68		Nivel 1	Habitación		A	B	5	7			1	0,80	1,00	0,40	0,32
69		Nivel 1	Habitación		A	B	5	7			1	0,40	0,35	0,40	0,06
70		Nivel 1	Habitación		A	B	5	7			1	2,30	0,40	0,40	0,37
71		Nivel 1	Habitación		B	C	2	5			1	1,20	0,90	0,40	0,43
72		Nivel 1	Habitación		B	C	2	5			1	1,00	0,30	0,40	0,12
73		Nivel 1	Habitación		A'	A	2	5			1	1,00	0,50	0,40	0,20
74		Nivel 1	Habitación		A'	A	2	5			1	0,50	0,50	0,40	0,10
75		Nivel 1	Habitación		A'	A	2	5			1	2,50	0,50	0,40	0,50
76		Nivel 1	Habitación		B	D	6	7			1	1,40	0,50	0,60	0,42
77		Nivel 1	Habitación		B	D	6	7			1	1,60	0,50	0,60	0,48
78		Nivel 1	Habitación		B	D	6	7			1	1,50	0,50	0,60	0,45
79		Nivel 1	Habitación		B	D	6	7			1	4,30	0,80	0,60	2,06
80		Nivel 1	Habitación		B	D	6	7			1	3,00	1,00	0,60	1,80
81		Nivel 1	Habitación		B	D	6	7			1	2,00	0,30	0,60	0,36
82		Nivel 1	Habitación		B	D	7	8			1	4,50	0,40	0,60	1,08
83		Nivel 1	Habitación		B	D	7	8			1	2,00	3,00	0,60	3,60
84		Nivel 1	Habitación		E	F	5	10			1	11,70	0,35	0,40	1,64
85		Nivel 1	Habitación		E	F	5	10			1	3,40	0,35	0,65	0,77
86		Nivel 1	Habitación		D	F	8	7			1	4,40	0,70	0,70	2,16
87		Nivel 1	Habitación		D	F	8	7			1	4,30	0,40	0,60	1,03
88		Nivel 1	Habitación		D	F	8	7			1	2,60	0,40	0,60	0,62
89		Nivel 1	Columna - M 2		D	E	7	9			1	3,60	1,87	1,20	8,08
90		Nivel 1	Habitación		D	E	7	9			1	6,20	3,50	1,20	26,04
91		Nivel 1	Habitación		A		2	5			1	4,25	3,31	2,13	29,96
92		Nivel 1	Habitación		E		5				1	2,15	0,50	0,20	0,22
93		Nivel 1	Habitación		B	F	9	10			1	14,00	0,50	0,75	5,25
94		Nivel 1	Habitación		D	E	7	8			1	6,00	0,50	0,40	1,20
95		Nivel 1	Habitación		H'		1				1	1,50	1,00	1,00	1,50
96		Nivel 1	Habitación		H'		1				1	0,80	1,00	1,00	0,80
97		Nivel 1	Habitación		F		8				1	2,47	2,57	2,13	13,52
98		Nivel 1	Habitación		A'		1				1	1,00	1,00	2,00	2,00
99		Nivel 1	Habitación		F	G	7	8			1	3,30	1,20	0,20	0,79
100		Nivel 1	Exterior		F	H	7	8			1	12,00	0,50	0,80	4,80
101		Nivel 1	Habitación		G	H	7	9			1	13,80	0,40	0,20	1,10
102		Nivel 1	Habitación		A	D	1	2			8	1,00	1,00	0,10	0,80
103		Nivel 1	Habitación		G''		9				1	2,47	2,57	2,13	13,52
104		Nivel 1	Habitación		F		9				1	2,47	2,57	2,13	13,52
105		Nivel 1	Habitación		E	H	1	5			1	12,50	6,56	0,20	16,40
106		Nivel 1	Habitación		E	D	1	7			1	5,78	9,00	0,20	10,40
107		Nivel 1	Habitación		A	C	5	7			1	5,45	14,90	0,10	8,12
108		Nivel 1	Habitación		G'		1				1	2,50	1,00	1,00	2,50
109		Nivel 1	Habitación		C	E	7	8			1	10,59	6,67	0,10	7,06
110		Nivel 1	Habitación		D	E	8	9			1	3,11	3,50	0,10	1,09
111		Nivel 1	Habitación		F	H	8	9			1	8,00	5,00	0,10	4,00
112		Nivel 1	Habitación		F	H	8	9			1	8,00	4,00	0,10	3,20
113		Nivel 1	Habitación		F	H	7	8			1	7,00	9,00	0,10	6,30
114		Nivel 1	Habitación		C	D	8	10			1	18,00	4,50	0,10	8,10
115		Nivel 1	Habitación		C			10			1	1,61	1,32	3,10	6,59
116		Nivel 1	Habitación		F	H	5	7			1	6,10	5,45	0,20	6,65
117		Nivel 1	Habitación		D	E		10			1	5,40	2,00	3,00	16,20
118		Nivel 1	Habitación		B	C	1	5			1	4,15	1,60	1,30	8,63
119		Nivel 1	Habitación		E	F	1	5			1	5,60	1,20	0,40	2,69
120		Nivel 1	Habitación		B	C	1	5			1	4,15	1,81	1,50	11,27
121		Nivel 1	Habitación		D	E		10			1	5,40	3,00	3,00	48,60
122		Nivel 1	Habitación		D	E		10			1	1,50	1,50	3,00	6,75
123		Nivel 1	Habitación		D	E		10			1	1,00	1,50	3,00	4,50
124		Nivel 1	Habitación		A	H	1	11			1	998,00	1,00	0,20	199,60
125															
					CANTIDADES TOTALES >>>									97,34	910,00


MEMORIA NUMERICA DE CANTIDADES DE OBRA					
CONTRATANTE:	**MINISTERIO DE CULTURA**	**MUNICIPIO**	**BOGOTA**	**CUNDINAMARCA**	**INMUEBLE**
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS SJD-25	**CONTRATANTE**	MINISTERIO DE CULTURA		
INTERVENTORIA	CONSORCIO HOSPITALARIO CABA RC	**PROYECTO:**	"EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO SALUD MENTAL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."		COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS
LUGAR DE EJECUCION	COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS	**VALOR:**	$ 16.498.039.996		

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
INP-036	Acarreo horizontal y vertical para rellenos y demoliciones	M3	910,00

No	FECHA	UBICACIÓN. GENERAL	UBICACIÓN ESPECIFICA	Espacio	E N	T R E -	E J E S	OBSERV	ACIONES	CANT.	LARGO	ANCHO	ALTO	TOTAL

MEMORIA GRAFICA DE CANTIDADES DE OBRA

SOTANO

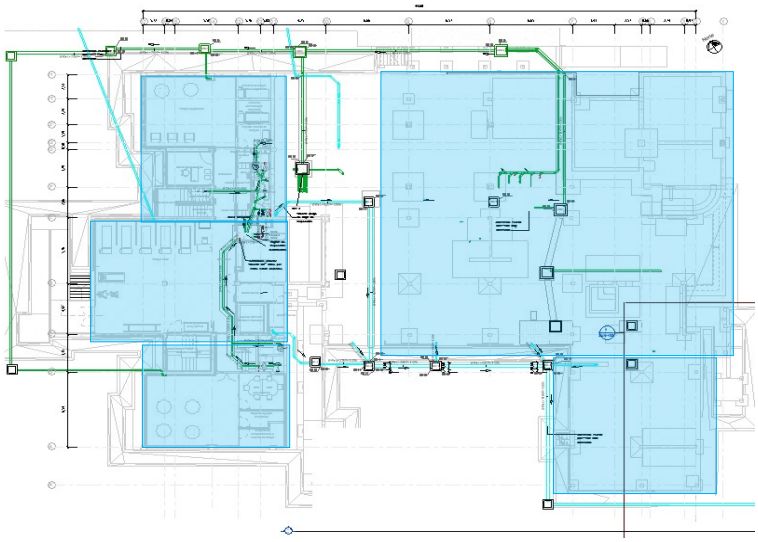


MEMORIA NUMERICA DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATANTE:	**MINISTERIO DE CULTURA**	**MUNICIPIO**	**BOGOTA**	**CUNDINAMARCA**	**INMUEBLE**
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS SJD-25	**CONTRATANTE**	MINISTERIO DE CULTURA		
INTERVENTORIA	COLOMBIAN INVESTMENTS GROUP S.A.S.	**PROYECTO:**	"EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO SALUD MENTAL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."		COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS
LUGAR DE EJECUCION	COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS	**VALOR:**	$ 16.498.039.996		

N° ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD TOTAL**
INP-038	Grouting Para Remate De Reforzamiento De muros pantallas	M3	2,33

No	FECHA	UBICACIÓN. GENERAL	UBICACIÓN ESPECIFICA	Espacio	E N	T R E-	E J	E S	OBSERV	ACIONES	CANT.	LARGO	ANCHO	ALTO	TOTAL
1		Semisotano	Habitación		B	C	14		M-6		1	3,05	0,20	0,15	0,09
2		Nivel 1	Habitación		B	C	14		M-6		1	3,05	0,20	0,15	0,09
3		Semisotano	Habitación		B		14	16	M-1		1	3,42	0,20	0,15	0,10
4		Nivel 1	Habitación		B		14	16	M-1		1	3,42	0,20	0,15	0,10
5		Nivel 2	Habitación		B	C	14		M-6		1	3,05	0,20	0,15	0,09
6		Nivel 2	Habitación		B		14	16	M-1		1	3,42	0,20	0,15	0,10
7		Semisotano	Habitación		G		14	16	M-4		1	3,42	0,30	0,15	0,15
8		Nivel 1	Habitación		G		14	16	M-4		1	3,42	0,30	0,15	0,15
9		Nivel 2	Habitación		G		14	16	M-4		1	3,42	0,30	0,15	0,15
10		Semisotano	Habitación	C		14	16		CORTA FUEGO		1	2,17	0,15	0,15	0,05
11		Nivel 1	Habitación	H		14	15		MURO CONT		1	0,80	0,25	0,15	0,03
12		Nivel 1	Habitación	A		14	15		MURO CONT		1	0,80	0,25	0,15	0,03
13		Nivel 1	Habitación	A		14	16		CORTA FUEGO		1	2,17	0,15	0,15	0,05
14		Nivel 2	Habitación	A		14	16		CORTA FUEGO		1	2,17	0,15	0,15	0,05
15		Nivel 1	Habitación	A	B	2	5		M-2		1	4,05	0,20	0,15	0,12
16		Nivel 1	Habitación	A	B	2	5		M-2		1	4,05	0,20	0,15	0,12
17		Nivel 2	Habitación	A	B	2	5		M-2		1	4,05	0,20	0,15	0,12
18		Nivel 1	Habitación		C	D	3		M-9		1	4,15	0,20	0,15	0,12
19		Nivel 1	Habitación	E		2	4		M-5		1	2,08	0,30	0,15	0,09
20		Nivel 2	Habitación	E		2	4		M-5		1	2,08	0,30	0,15	0,09
21		Nivel 1	Habitación	D	E	10			M-7		1	3,37	0,40	0,15	0,20
22		Nivel 1	Habitación	D	E	10			M-7		1	3,37	0,20	0,15	0,10
23		Nivel 1	Habitación	D	E	10			M-7		1	3,37	0,20	0,15	0,10
					CANTIDADES TOTALES >>>										2,33

MEMORIA GRAFICA DE CANTIDADES DE OBRA

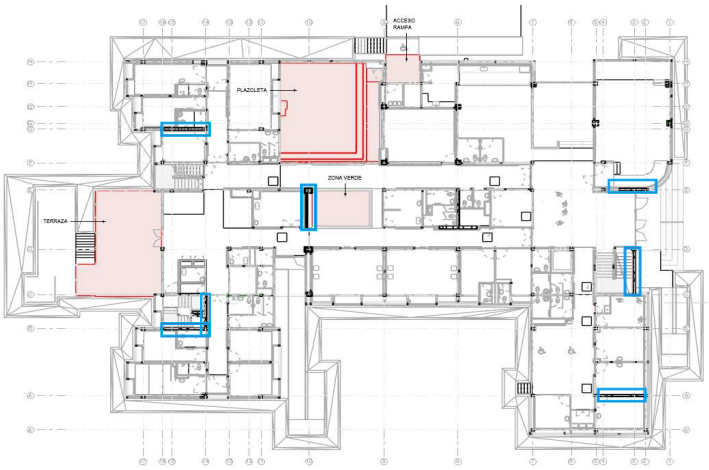

NIVEL 1


MEMORIA NUMERICA DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATANTE:	**MINISTERIO DE CULTURA**	**MUNICIPIO**	**BOGOTA**	**CUNDINAMARCA**	**INMUEBLE**
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS SJD-25	**CONTRATANTE**	MINISTERIO DE CULTURA		
INTERVENTORIA	COLOMBIAN INVESTMENTS GROUP S.A.S.	**PROYECTO:**	"EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO SALUD MENTAL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."		COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS
LUGAR DE EJECUCION	COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS	**VALOR:**	$ 16.498.039.996		

N° ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD TOTAL**
INP-057	Muro En Bloque De Arcilla Estriado N°4 (10x20x30cm) Con Pega De 1.0 Cm En Mortero. Refuerzo Y Elementos De Confinamiento Según Diseño Estructural. Metro Lineal	ML	200,00

No	FECHA	UBICACIÓN. GENERAL	UBICACIÓN ESPECIFICA	Espacio	E N	T R E -	E J	E S	OBSERV	ACIONES	CANT.	LARGO	ANCHO	ALTO	TOTAL
1		Nivel 1			11	17	A	H			1	25,00			25,00
2		Nivel 2			1	17	A	H			1	110,00			110,00
2		TERRAZA			1	17	A	H			1	65,00			65,00
					CANTIDADES TOTALES >>>										200,00

MEMORIA GRAFICA DE CANTIDADES DE OBRA

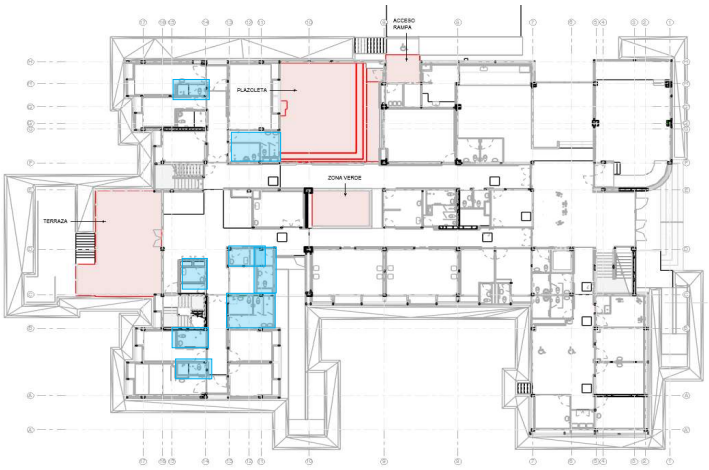

NIVEL 1


MEMORIA NUMERICA DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATANTE:	**MINISTERIO DE CULTURA**	**MUNICIPIO**	**BOGOTA**	**CUNDINAMARCA**	**INMUEBLE**
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS SJD-25	**CONTRATANTE**	MINISTERIO DE CULTURA		
INTERVENTORIA	COLOMBIAN INVESTMENTS GROUP S.A.S.	**PROYECTO:**	"EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO SALUD MENTAL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."		COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS
LUGAR DE EJECUCION	COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS	**VALOR:**	$ 16.498.039.996		

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
INP-057	Muro En Bloque De Arcilla Estriado N°4 (10x20x30cm) Con Pega De 1.0 Cm En Mortero. Refuerzo Y Elementos De Confinamiento Según Diseño Estructural. Metro Lineal	ML	40,00

No	FECHA	UBICACIÓN. GENERAL	UBICACIÓN ESPECIFICA	Espacio	E N	T R E-	E J	E S	OBSERV	ACIONES	CANT.	LARGO	ANCHO	ALTO	TOTAL
1		Nivel 1	PLAZOLETA		1	17	H				2	20,00			40,00
					CANTIDADES TOTALES >>>										40,00

MEMORIA GRAFICA DE CANTIDADES DE OBRA

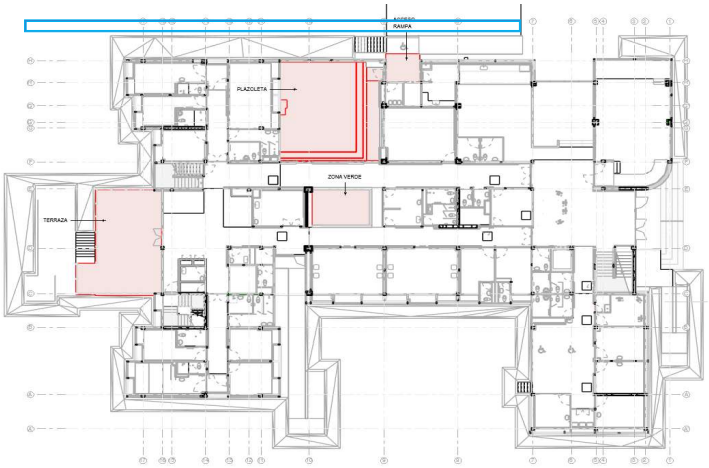

NIVEL 1


MEMORIA NUMERICA DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATANTE:	**MINISTERIO DE CULTURA**	**MUNICIPIO**	**BOGOTA**	**CUNDINAMARCA**	**INMUEBLE**
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS SJD-25	**CONTRATANTE**	MINISTERIO DE CULTURA		
INTERVENTORIA	COLOMBIAN INVESTMENTS GROUP S.A.S.	**PROYECTO:**	"EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO SALUD MENTAL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."		COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS
LUGAR DE EJECUCION	COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS	**VALOR:**	$ 16.498.039.996		

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
INP-062	Pañete Liso En Mortero 1:4 Para Muros Interiores (Incluye Filos Y Dilataciones) con espesores superiores a 1.5 cm y no mayor a 5 cm	ML	211,51

No	FECHA	UBICACIÓN. GENERAL	UBICACIÓN ESPECIFICA	Espacio	E N	T R E -	E J	E S	OBSERV	ACIONES	CANT.	LARGO	ANCHO	ALTO	TOTAL
1		Nivel 1	AUDITORIO		1	5	F	H			1	35,20		2,54	89,41
2		Nivel 1	PASILLO		7	10	F	G			1	15,50		2,54	15,50
2		Nivel 1	PASILLO		7	10	D	E			1	14,20		2,54	14,20
2		Nivel 1	ESCALERA		1	5	C	D			1	8,50		2,54	8,50
2		Nivel 1	ESCALERA		14	17	C	D			1	10,50		2,54	10,50
2		Nivel 1	HABITACION		A	H	11	17			1	19,50		2,54	19,50
2		Nivel 1	HABITACION		A	H	11	17			1	20,50		2,54	20,50
2		Nivel 1	HABITACION		A	H	11	17			1	18,20		2,54	18,20
2		Nivel 1	HABITACION		A	H	11	17			1	15,20		2,54	15,20
					CANTIDADES TOTALES >>>										211,51

MEMORIA GRAFICA DE CANTIDADES DE OBRA

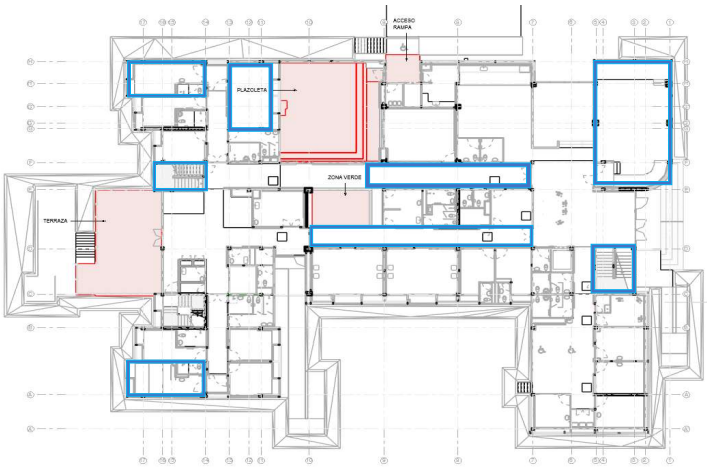

NIVEL 1

MEMORIA NUMERICA DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATANTE:	**MINISTERIO DE CULTURA**	**MUNICIPIO**	**BOGOTA**	**CUNDINAMARCA**	**INMUEBLE**
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS SJD-25	**CONTRATANTE**	MINISTERIO DE CULTURA		
INTERVENTORIA	CONSORCIO HOSPITALARIO CABA RC	**PROYECTO:**	"EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO SALUD MENTAL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."		COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS
LUGAR DE EJECUCION	COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS	**VALOR:**	$ 16.498.039.996		

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
INP-060	Cargue con mortero pobre (1:5) sobre muros de excavacion para mitigar efecto de erosion por lluvias.	M2	206,89

No	FECHA	UBICACIÓN. GENERAL	UBICACIÓN ESPECIFICA	Espacio	EN	TRE-	EJES	OBSERV	ACIONES	CANT.	LARGO	ANCHO	ALTO	TOTAL
1		Semisótano	TANQUE	TANQUE						1	71,34	2,90		206,89
2														
					CANTIDADES TOTALES >>>									206,89

MEMORIA GRAFICA DE CANTIDADES DE OBRA

TANQUE

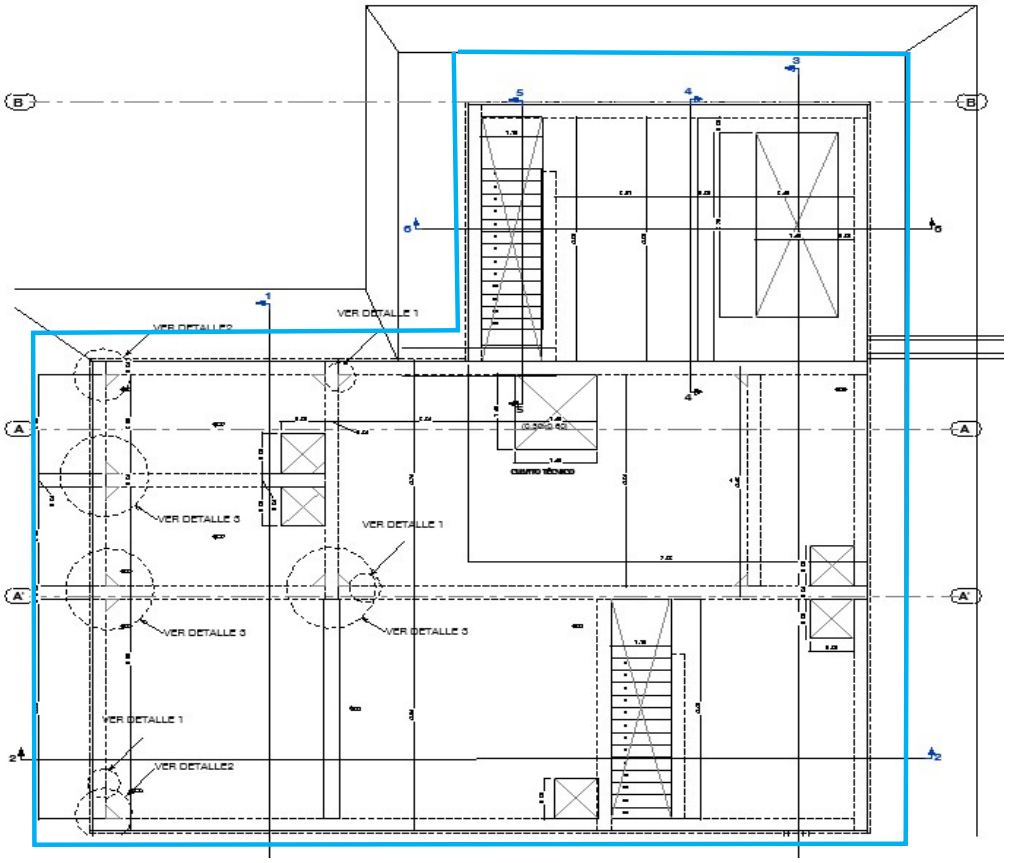

MEMORIA NUMERICA DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATANTE:	**MINISTERIO DE CULTURA**	**MUNICIPIO**	**BOGOTA**	**CUNDINAMARCA**	**INMUEBLE**
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS SJD-25	**CONTRATANTE**	MINISTERIO DE CULTURA		
INTERVENTORIA	CONSORCIO HOSPITALARIO CABA RC	**PROYECTO:**	"EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO SALUD MENTAL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."		COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS
LUGAR DE EJECUCION	COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS	**VALOR:**	$ 16.498.039.996		


N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
INP-208	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO EN PANEL FIBROCEMENTO 6 MM PARA CIELORRASO DE ESPACIOS GENERALES.	M2	1835,43

No	FECHA	UBICACIÓN. GENERAL	UBICACIÓN ESPECIFICA	Espacio	EN	TRE-	EJ	ES	OBSERV	ACIONES	CANT.	LARGO	ANCHO	ALTO	TOTAL
1		Semisótano	ESPACIOS GENERALES (Hab, consult, circul,Admin)	(-101 al -137)	10	17	A	H			1				313,68
2		Nivel 1	ESPACIOS GENERALES (Hab, consult, circul,Admin)	(E100 al E181)	1	17	A	H			1				839,60
3		Nivel 2	ESPACIOS GENERALES (Hab, consult, circul,Admin)	(E200 al E272)	1	17	A	H			1				682,15
					CANTIDADES TOTALES >>>										1835,43

MEMORIA GRAFICA DE CANTIDADES DE OBRA



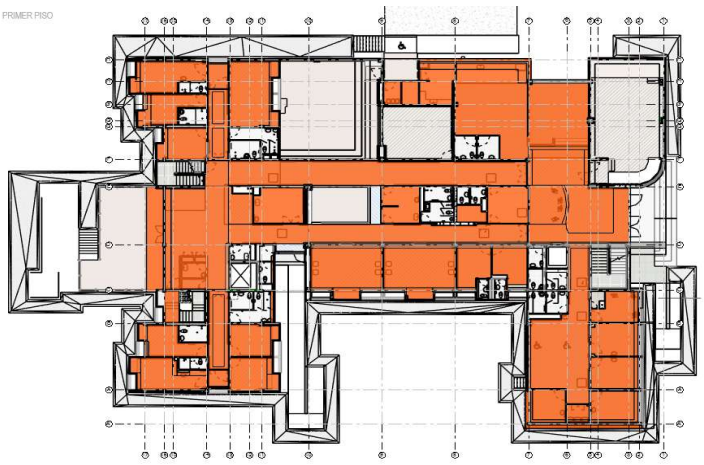

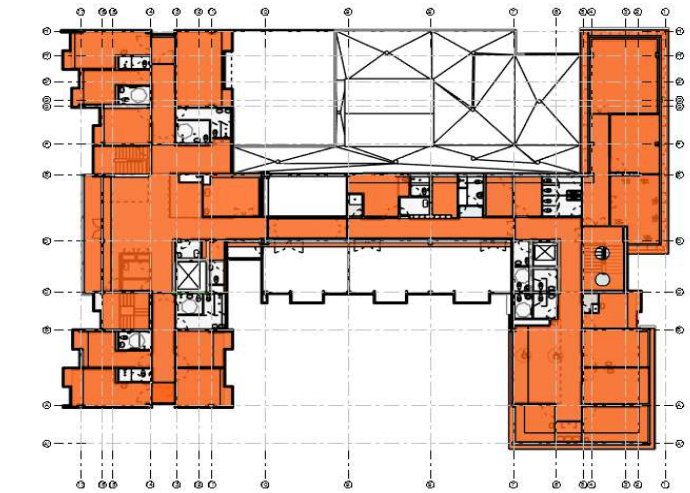

MEMORIA NUMERICA DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATANTE:	**MINISTERIO DE CULTURA**	**MUNICIPIO**	**BOGOTA**	**CUNDINAMARCA**	**INMUEBLE**
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS SJD-25	**CONTRATANTE**	MINISTERIO DE CULTURA		
INTERVENTORIA	CONSORCIO HOSPITALARIO CABA RC	**PROYECTO:**	"EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO SALUD MENTAL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."		COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS
LUGAR DE EJECUCION	COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS	**VALOR:**	$ 16.498.039.996		

N° ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD TOTAL**
INP-209	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO EN PANEL YESO RH PARA CIELORRASO DE ZONAS HUMEDAS. INCLUYE ESTRCUTURA	M2	256,46

No	FECHA	UBICACIÓN. GENERAL	UBICACIÓN ESPECIFICA	Espacio	E N	T R E -	E J	E S	OBSERV	ACIONES	CANT.	LARGO	ANCHO	ALTO	TOTAL
1		Semisótano	ZONAS HUMEDAS	(-101 al -137)	10	17	A	H			1				21,48
2		Nivel 1	ZONAS HUMEDAS	(E100 al E181)	1	17	A	H			1				144,27
3		Nivel 2	ZONAS HUMEDAS	(E200 al E272)	1	17	A	H			1				90,71
					CANTIDADES TOTALES >>>										256,46

MEMORIA GRAFICA DE CANTIDADES DE OBRA

SÓTANO

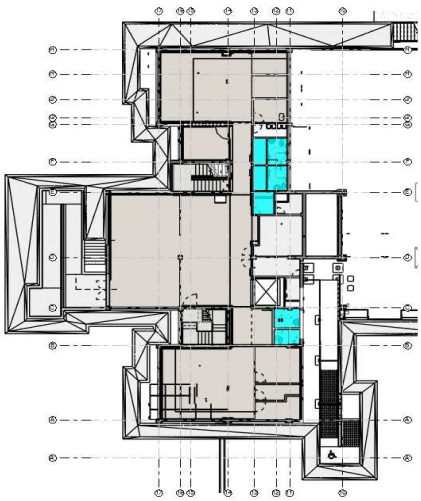

PRIMER PISO



SEGUNDO PISO




MEMORIA NUMERICA DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATANTE:	**MINISTERIO DE CULTURA**	**MUNICIPIO**	**BOGOTA**	**CUNDINAMARCA**	**INMUEBLE**
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS SJD-25	**CONTRATANTE**	MINISTERIO DE CULTURA		
INTERVENTORIA	CONSORCIO HOSPITALARIO CABA RC	**PROYECTO:**	"EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO SALUD MENTAL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."		COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS
LUGAR DE EJECUCION	COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS	**VALOR:**	$ 16.498.039.996		

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
INP-210	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO EN PANEL YESO ACUSTICO (EXSOUND O SIMILAR) PARA CIELORRASO DE AUDITORIO. INCLUYE ESTRUCTURA	M2	80,56

No	FECHA	UBICACIÓN. GENERAL	UBICACIÓN ESPECIFICA	Espacio	EN	TRE-	EJES	OBSERVACIONES	CANT.	LARGO	ANCHO	ALTO	TOTAL
1		Nivel 1	AUDITORIO						1				80,56
					CANTIDADES TOTALES >>>								80,56

MEMORIA GRAFICA DE CANTIDADES DE OBRA

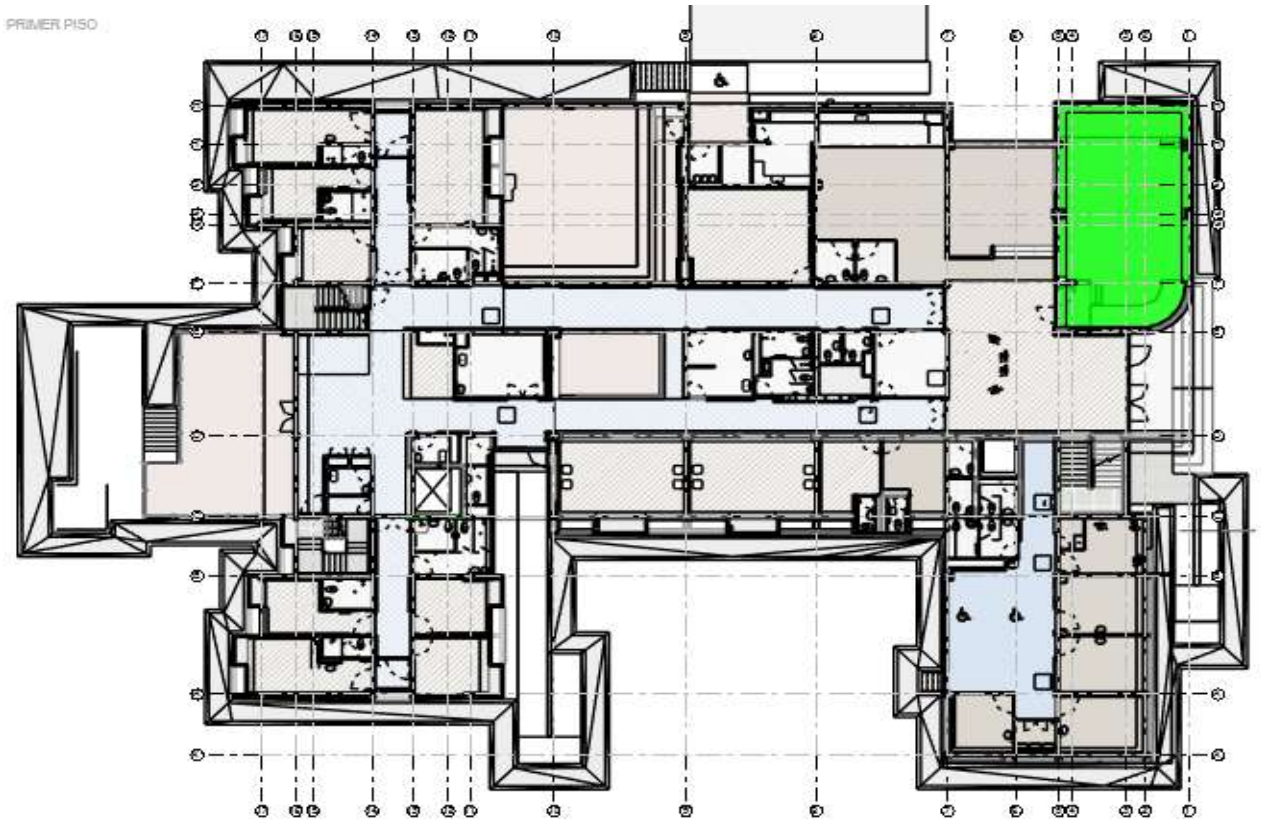


MEMORIA NUMERICA DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATANTE:	**MINISTERIO DE CULTURA**	**MUNICIPIO**	**BOGOTA**	**CUNDINAMARCA**	**INMUEBLE**
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS SJD-25	**CONTRATANTE**	MINISTERIO DE CULTURA		
INTERVENTORIA	COLOMBIAN INVESTMENTS GROUP S.A.S.	**PROYECTO:**	"EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO SALUD MENTAL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."		COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS
LUGAR DE EJECUCION	COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS	**VALOR:**	$ 16.498.039.996		

N° ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD TOTAL**
INP-211	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLON DE GRESS 30*30 O SIMILAR COLOR ROJO O ARENA	M2	190,06

No	FECHA	UBICACIÓN. GENERAL	UBICACIÓN ESPECIFICA	Espacio	E N	T R E-	E J	E S	OBSERV	ACIONES	CANT.	LARGO	ANCHO	ALTO	TOTAL
1		Nivel 1	PLAZOLETA		9	10	H	F			1				97,85
2		Nivel 1	TERRAZA		18	E	C				1				65,75
3		Nivel 1	ACCESO RAMPA		9	10	H	H'			1				8,80
4		Nivel 1	ZONA VERDE		9	10	E	D			1				17,66
					CANTIDADES TOTALES >>>										190,06

MEMORIA GRAFICA DE CANTIDADES DE OBRA

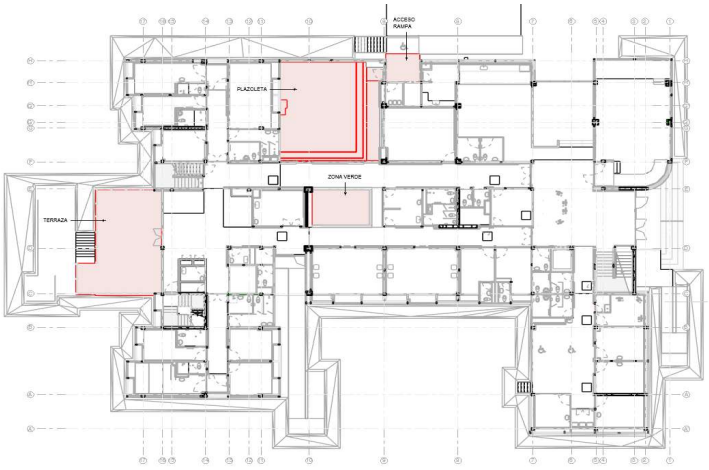


NIVEL 1

MEMORIA NUMERICA DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATANTE:	**MINISTERIO DE CULTURA**	**MUNICIPIO**	**BOGOTA**	**CUNDINAMARCA**	**INMUEBLE**
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS SJD-25	**CONTRATANTE**	MINISTERIO DE CULTURA		
INTERVENTORIA	COLOMBIAN INVESTMENTS GROUP S.A.S.	**PROYECTO:**	"EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO SALUD MENTAL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."		COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS
LUGAR DE EJECUCION	COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS	**VALOR:**	$ 16.498.039.996		

N° ITEM		**DESCRIPCIÓN**												**UNIDAD**	**CANTIDAD TOTAL**
INP-212		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN VINILO DE 2 MM												ML	1468,61
No	**FECHA**	**UBICACIÓN. GENERAL**	**UBICACIÓN ESPECIFICA**	**Espacio**	**E N**	**T R E-**	**E J**	**E S**	**OBSERV**	**ACIONES**	**CANT.**	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTO**	**TOTAL**
1		Semisótano	GENERAL												194,39
2		Nivel 1	ZONA CENTRO-NORTE												27,42
3		Nivel 1	ZONA CENTRO-OCCIDENTAL												122,48
4		Nivel 1	ZONA CENTRO-ORIENTAL												86,27
5		Nivel 1	ZONA CENTRO-SUR												193,93
6		Nivel 1	ZONA NOROCCIDENTAL												126,66
7		Nivel 1	ZONA SUROCCIDENTAL												72,84
8		Nivel 1	ZONA SURORIENTAL												67,53
9		Nivel 2	ZONA CENTRO-OCCIDENTAL												74,83
10		Nivel 2	ZONA CENTRO-ORIENTAL												70,83
11		Nivel 2	ZONA CENTRO-SUR												92,57
12		Nivel 2	ZONA NOROCCIDENTAL												147,80
13		Nivel 2	ZONA SUROCCIDENTAL												93,49
14		Nivel 2	ZONA SURORIENTAL												97,57
					CANTIDADES TOTALES >>>										1468,61


MEMORIA GRAFICA DE CANTIDADES DE OBRA

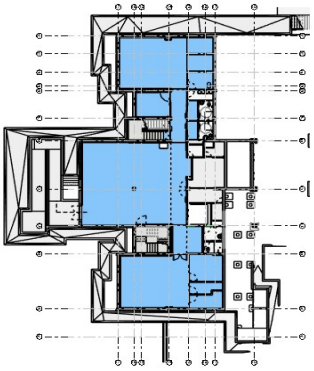

SEMISÓTANO

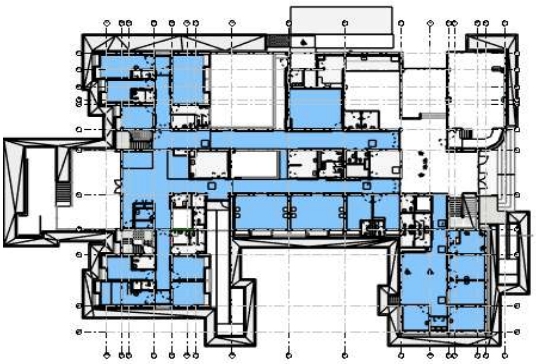

IVEL 1

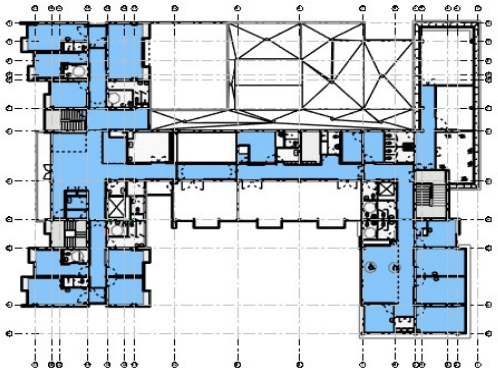

NIVEL 2


MEMORIA NUMERICA DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATANTE:	**MINISTERIO DE CULTURA**	**MUNICIPIO**	**BOGOTA**	**CUNDINAMARCA**	**INMUEBLE**
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS SJD-25	**CONTRATANTE**	MINISTERIO DE CULTURA		
INTERVENTORIA	COLOMBIAN INVESTMENTS GROUP S.A.S.	**PROYECTO:**	"EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO SALUD MENTAL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."		COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS
LUGAR DE EJECUCION	COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS	**VALOR: $**	**16.498.039.996**		

N° ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD TOTAL**
INP-213	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AUTONIVELANTE PARA PISO EN VINILO	M2	**1360,91**

No	FECHA	UBICACIÓN. GENERAL	UBICACIÓN ESPECIFICA	Espacio	E N T R E - E J E S	OBSERV ACIONES	CANT.	LARGO	ANCHO	ALTO	TOTAL
1		Semisótano	GENERAL								283,78
2		Nivel 1	ZONA CENTRO-NORTE								35,05
3		Nivel 1	ZONA CENTRO-OCCIDENTAL								92,34
4		Nivel 1	ZONA CENTRO-ORIENTAL								67,82
5		Nivel 1	ZONA CENTRO-SUR								175,56
6		Nivel 1	ZONA NOROCCIDENTAL								101,72
7		Nivel 1	ZONA SUROCCIDENTAL								56,63
8		Nivel 1	ZONA SURORIENTAL								53,34
9		Nivel 2	ZONA CENTRO-OCCIDENTAL								68,86
10		Nivel 2	ZONA CENTRO-ORIENTAL								48,46
11		Nivel 2	ZONA CENTRO-SUR								66,83
12		Nivel 2	ZONA NOROCCIDENTAL								133,44
13		Nivel 2	ZONA SUROCCIDENTAL								72,65
14		Nivel 2	ZONA SURORIENTAL								104,43
					CANTIDADES TOTALES >>>						**1360,91**

MEMORIA GRAFICA DE CANTIDADES DE OBRA

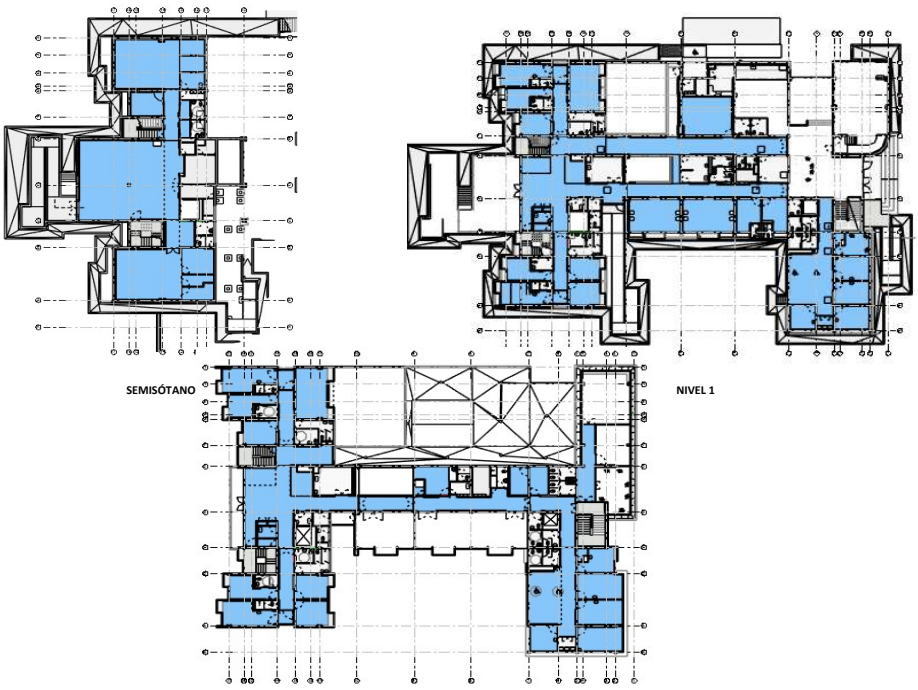

SEMISÓTANO

NIVEL 1

NIVEL 2

MEMORIA NUMERICA DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATANTE:	**MINISTERIO DE CULTURA**	**MUNICIPIO**	**BOGOTA**	**CUNDINAMARCA**	**INMUEBLE**
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS SJD-25	**CONTRATANTE**	MINISTERIO DE CULTURA		
INTERVENTORIA	COLOMBIAN INVESTMENTS GROUP S.A.S.	**PROYECTO:**	"EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO SALUD MENTAL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."		COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS
LUGAR DE EJECUCION	COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS	**VALOR:**	$ 16.498.039.996		


N° ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD TOTAL**
INP-214	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALFOMBRA PARA PISOS DE AUDITORIO Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS	M2	**132,42**

No	FECHA	UBICACIÓN. GENERAL	UBICACIÓN ESPECIFICA	Espacio	E N	T R E-	E J	E S	OBSERV	ACIONES	CANT.	LARGO	ANCHO	ALTO	TOTAL
1		NIVEL 1	AUDITORIO EDIFICIO SALUD MENTAL	E-124											57,22
2		Nivel 2	AULA MÉDICA	E-233											34,45
3		Nivel 2	SALA DE JUNTAS MÉDICAS Y CON RESIDENTES	E-234											19,64
4		Nivel 2	OFICINA ADMINISTRATIVA	E-235											21,11
					CANTIDADES TOTALES >>>										**132,42**

MEMORIA GRAFICA DE CANTIDADES DE OBRA



NIVEL 1

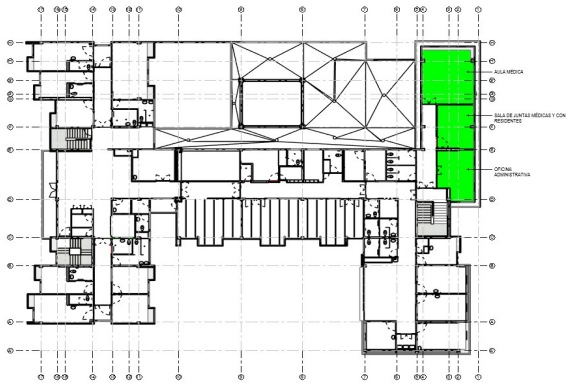

NIVEL 2


MEMORIA NUMERICA DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATANTE:	**MINISTERIO DE CULTURA**	**MUNICIPIO**	**BOGOTA**	**CUNDINAMARCA**	**INMUEBLE**
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS SJD-25	**CONTRATANTE**	MINISTERIO DE CULTURA		
INTERVENTORIA	CONSORCIO HOSPITALARIO CABA RC	**PROYECTO:**	"EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO SALUD MENTAL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."		COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS
LUGAR DE EJECUCION	COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS	**VALOR:**	$ 16.498.039.996		

N° ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD TOTAL**
INP-215	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE PASAMURO EN ACERO INOX DE 2 1/2" RANUEADO EN EXTREMOS	UND	4,00

No	FECHA	UBICACIÓN. GENERAL	UBICACIÓN ESPECIFICA	Espacio	E N	T R E -	E J	E S	OBSERV	ACIONES	CANT.	LARGO	ANCHO	ALTO	TOTAL
1		Semisótano	TANQUE	TANQUE							4		1,00		4,00
					CANTIDADES TOTALES >>>										4,00

MEMORIA GRAFICA DE CANTIDADES DE OBRA

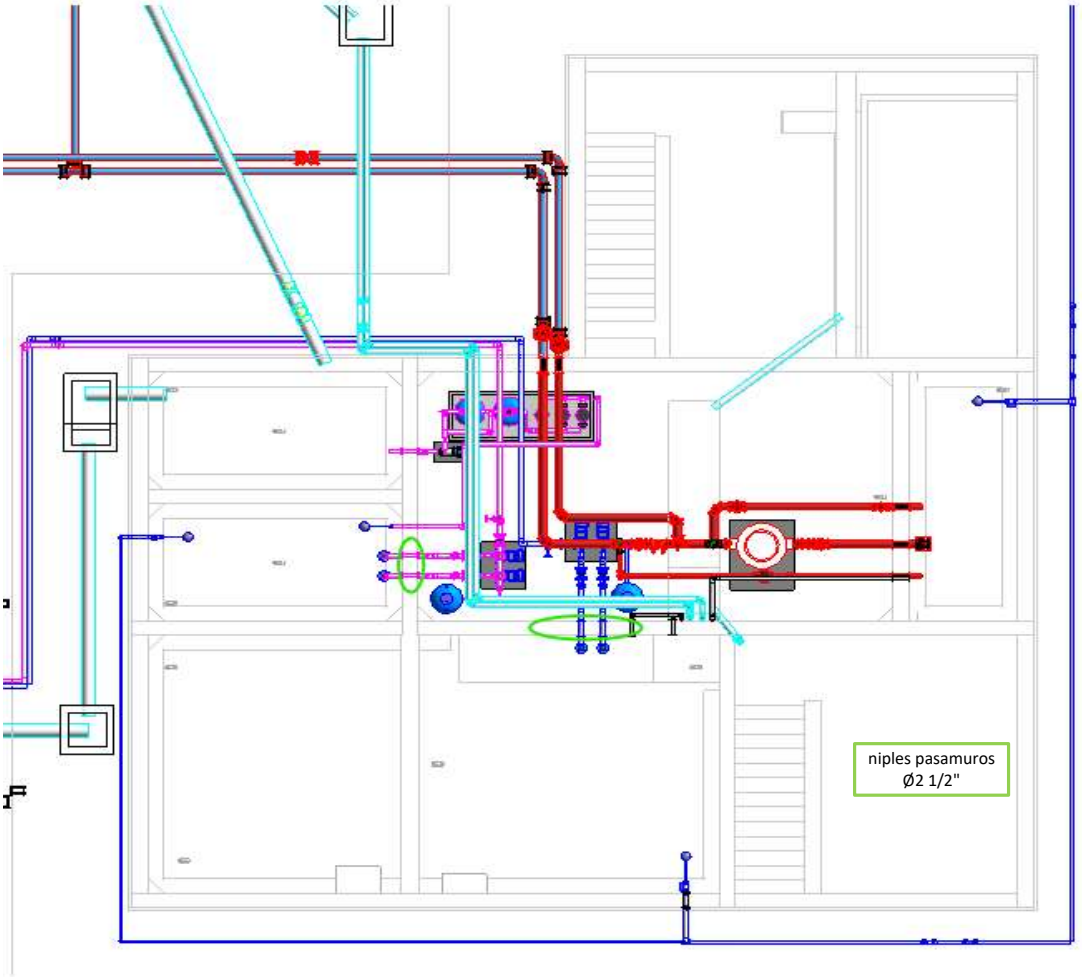


MEMORIA NUMERICA DE CANTIDADES DE OBRA					
CONTRATANTE:	**MINISTERIO DE CULTURA**	**MUNICIPIO**	**BOGOTA**	**CUNDINAMARCA**	**INMUEBLE**
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS SJD-25	**CONTRATANTE**	MINISTERIO DE CULTURA		
INTERVENTORIA	CONSORCIO HOSPITALARIO CABA RC	**PROYECTO:**	"EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO SALUD MENTAL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."		COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS
LUGAR DE EJECUCION	COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS	**VALOR:**	$ 16.498.039.996		

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
INP-216	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE PRESION CONSTANTE DUPLEX PARA AGUA TRATADA CON VARIACION DE VELOCIDAD	UND	1,00

No	FECHA	UBICACIÓN. GENERAL	UBICACIÓN ESPECIFICA	Espacio	EN TRE-EJES	OBSERV	ACIONES	CANT.	LARGO	ANCHO	ALTO	TOTAL
1		Semisótano	TANQUE	TANQUE				1	1,00			1,00
2												
					CANTIDADES TOTALES >>>							1,00

MEMORIA GRAFICA DE CANTIDADES DE OBRA

TANQUE

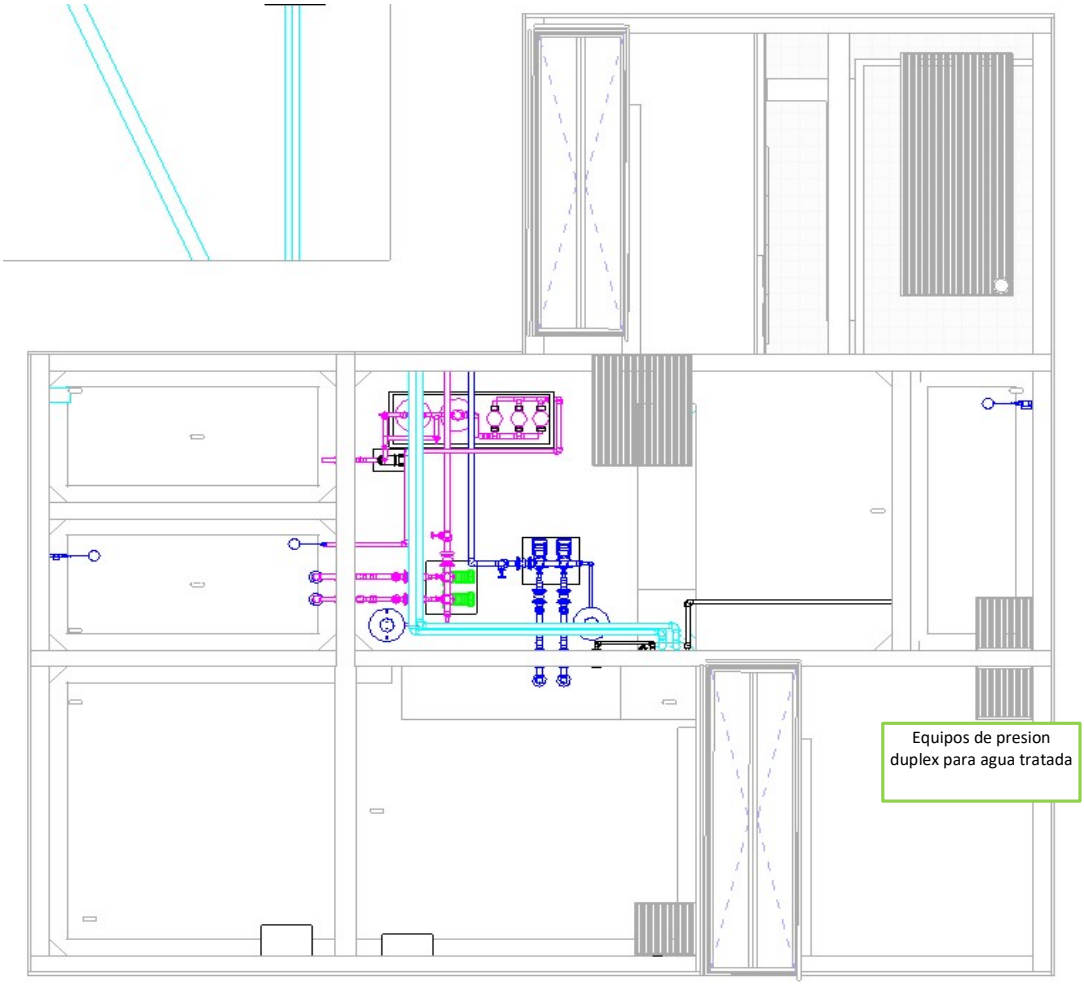

MEMORIA NUMERICA DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATANTE:	**MINISTERIO DE CULTURA**	**MUNICIPIO**	**BOGOTA**	**CUNDINAMARCA**	**INMUEBLE**
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS SJD-25	**CONTRATANTE**	MINISTERIO DE CULTURA		
INTERVENTORIA	CONSORCIO HOSPITALARIO CABA RC	**PROYECTO:**	"EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO SALUD MENTAL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."		COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS
LUGAR DE EJECUCION	COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS	**VALOR:**	$ 16.498.039.996		

N° ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD TOTAL**
INP-217	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE PRESION CONSTANTE DUPLEX PARA AGUA POTABLE CON VARIACION DE VELOCIDAD	UND	1,00

No	FECHA	UBICACIÓN. GENERAL	UBICACIÓN ESPECIFICA	Espacio	ENTRE CASETONES				OBSERV	ACCIONES	CANT.	LARGO	ANCHO	ALTO	TOTAL
1		Semisótano	TANQUE	TANQUE							1	1,00			1,00
					CANTIDADES TOTALES >>>										1,00

MEMORIA GRAFICA DE CANTIDADES DE OBRA

TANQUE

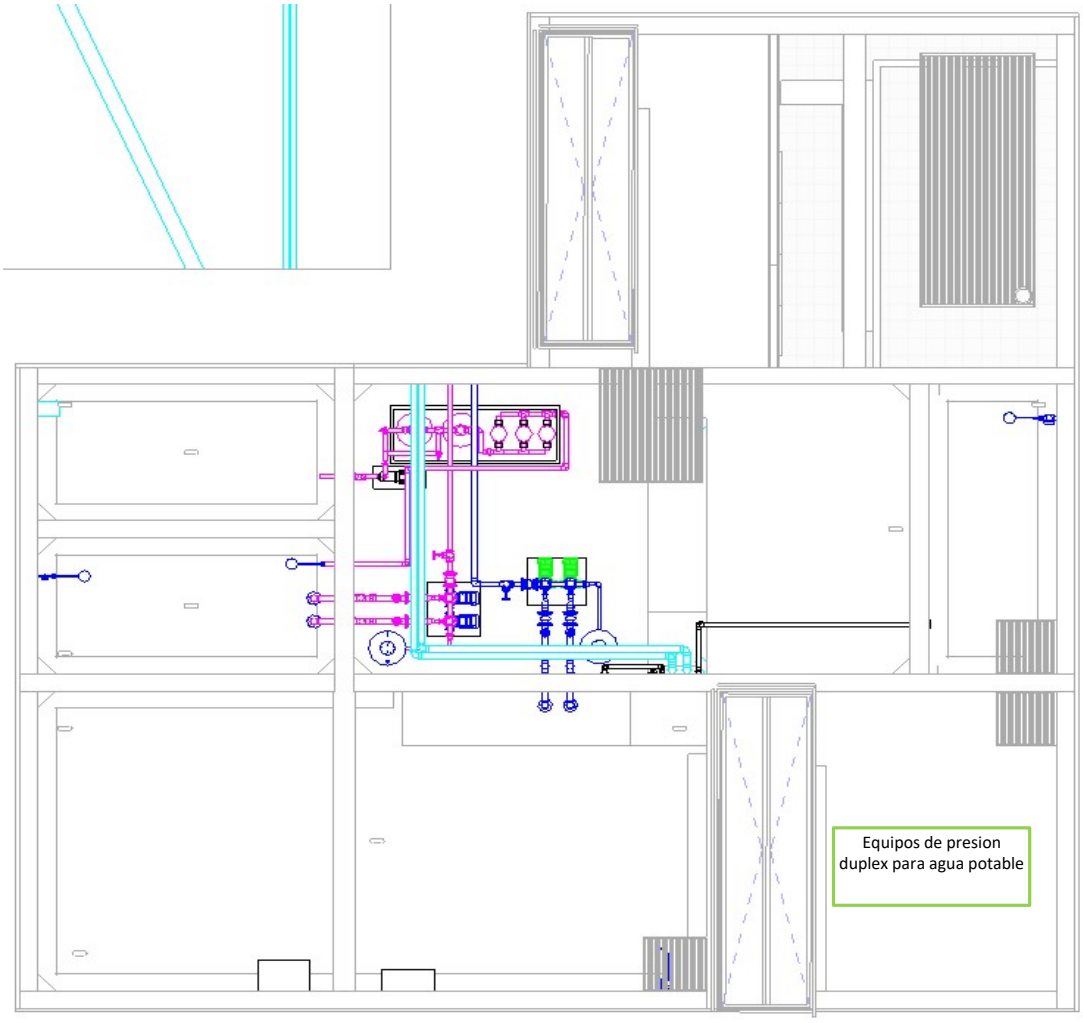

MEMORIA NUMERICA DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATANTE:	**MINISTERIO DE CULTURA**	**MUNICIPIO**	**BOGOTA**	**CUNDINAMARCA**	**INMUEBLE**
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS SJD-25	**CONTRATANTE**	MINISTERIO DE CULTURA		
INTERVENTORIA	CONSORCIO HOSPITALARIO CABA RC	**PROYECTO:**	"EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO SALUD MENTAL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."		COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS
LUGAR DE EJECUCION	COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS	**VALOR:**	$ 16.498.039.996		

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
INP-218	SUMINISTRO E INSTALACION EYECTOR DUPLES PARA AGUAS RESIDUALES	UND	2,00

No	FECHA	UBICACIÓN. GENERAL	UBICACIÓN ESPECIFICA	Espacio	E N	T R E -	E J	E S	OBSERV	ACIONES	CANT.	LARGO	ANCHO	ALTO	TOTAL
1		SOTANO	AREA CALIENTE-109		13	12	E	D	DEBAJO DE AREA		2				2,00
					CANTIDADES TOTALES >>>										2,00

MEMORIA GRAFICA DE CANTIDADES DE OBRA

SOTANO

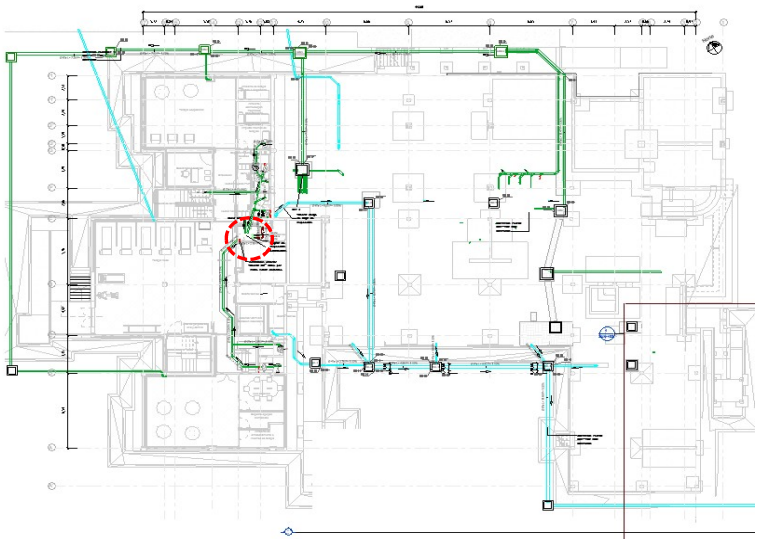

MEMORIA NUMERICA DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATANTE:	**MINISTERIO DE CULTURA**	**MUNICIPIO**	**BOGOTA**	**CUNDINAMARCA**	**INMUEBLE**
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS SJD-25	**CONTRATANTE**	MINISTERIO DE CULTURA		
INTERVENTORIA	CONSORCIO HOSPITALARIO CABA RC	**PROYECTO:**	"EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO SALUD MENTAL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."		COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS
LUGAR DE EJECUCION	COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS	**VALOR:**	$ 16.498.039.996		

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
INP-220	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO ADRIATICO CON FUXOMETRO SUPERIOR TIPO PUSH	UND	17,00

No	FECHA	UBICACIÓN. GENERAL	UBICACIÓN ESPECIFICA	Espacio	EN	TRE-	EJES		OBSERV	ACIONES	CANT.	LARGO	ANCHO	KG/M2	TOTAL
1		Semisótano	BAÑOS		11	12	G	B	INCLUYE BAÑOS PMR		3				3,00
2		Nivel 1	BAÑOS		7	15	A	H	INCLUYE BAÑOS PMR		8				8,00
3		Nivel 2	BAÑOS		A	G		17'	INCLUYE BAÑOS PMR		6				6,00
4															
					CANTIDADES TOTALES >>>										17,00

MEMORIA GRAFICA DE CANTIDADES DE OBRA

SEMISOTANO

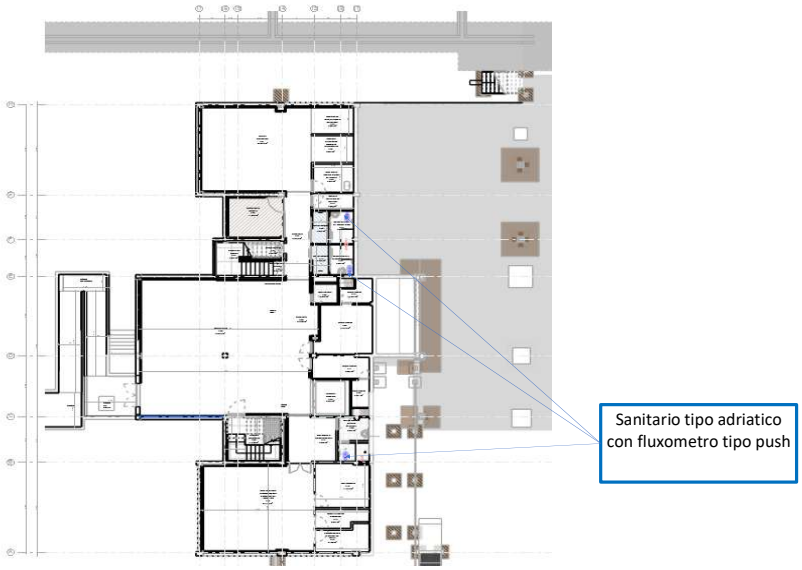


MEMORIA NUMERICA DE CANTIDADES DE OBRA					
CONTRATANTE:	**MINISTERIO DE CULTURA**	**MUNICIPIO**	**BOGOTA**	**CUNDINAMARCA**	**INMUEBLE**
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS SJD-25	**CONTRATANTE**	MINISTERIO DE CULTURA		
INTERVENTORIA	CONSORCIO HOSPITALARIO CABA RC	**PROYECTO:**	"EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO SALUD MENTAL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."		COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS
LUGAR DE EJECUCION	COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS	**VALOR:**	$ 16.498.039.996		

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
INP-220	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO ADRIATICO CON FUXOMETRO SUPERIOR TIPO PUSH	UND	17,00

No	FECHA	UBICACIÓN. GENERAL	UBICACIÓN ESPECIFICA	Espacio	EN TRE-EJES	OBSERV	ACIONES	CANT.	LARGO	ANCHO	KG/M2	TOTAL

PISO 1

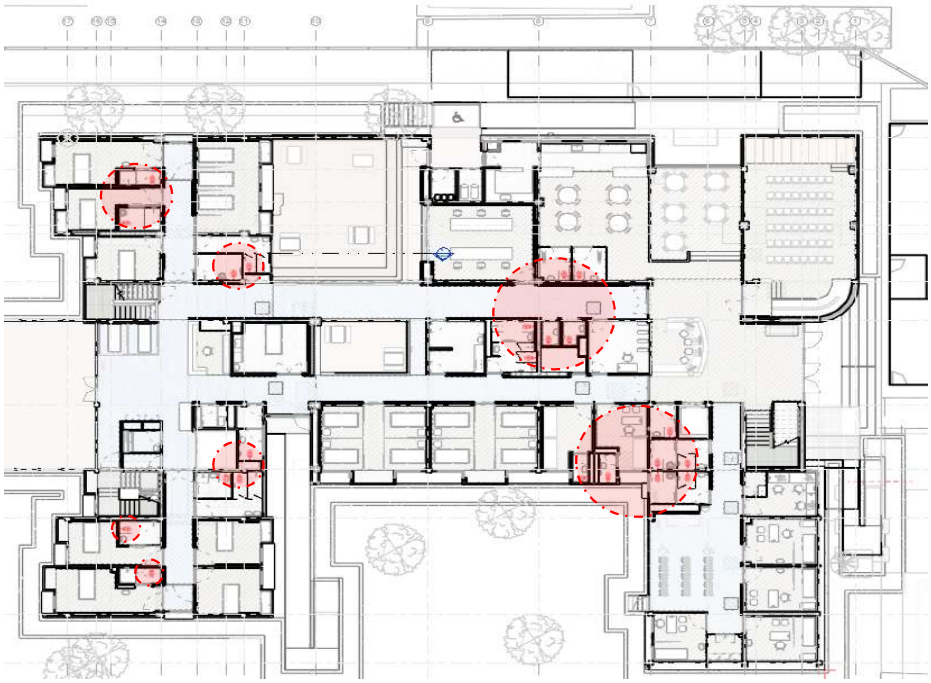

MEMORIA NUMERICA DE CANTIDADES DE OBRA					
CONTRATANTE:	**MINISTERIO DE CULTURA**	**MUNICIPIO**	**BOGOTA**	**CUNDINAMARCA**	**INMUEBLE**
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS SJD-25	**CONTRATANTE**	MINISTERIO DE CULTURA		
INTERVENTORIA	CONSORCIO HOSPITALARIO CABA RC	**PROYECTO:**	"EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO SALUD MENTAL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."		COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS
LUGAR DE EJECUCION	COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS	**VALOR:**	$ 16.498.039.996		

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
INP-220	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO ADRIATICO CON FUXOMETRO SUPERIOR TIPO PUSH	UND	17,00

No	FECHA	UBICACIÓN. GENERAL	UBICACIÓN ESPECIFICA	Espacio	EN TRE-EJES	OBSERV	ACIONES	CANT.	LARGO	ANCHO	KG/M2	TOTAL

PISO 2



MEMORIA NUMERICA DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATANTE:	**MINISTERIO DE CULTURA**	**MUNICIPIO**	**BOGOTA**	**CUNDINAMARCA**	**INMUEBLE**
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS SJD-25	**CONTRATANTE**	MINISTERIO DE CULTURA		
INTERVENTORIA	CONSORCIO HOSPITALARIO CABA RC	**PROYECTO:**	"EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO SALUD MENTAL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."		COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS
LUGAR DE EJECUCION	COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS	**VALOR:**	$ 16.498.039.996		

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
INP-222	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE PASAMURO EN ACERO INOX. DE 1" a 1 1/2" RANURADO EN EXTREMOS	UND	2,00

No	FECHA	UBICACIÓN. GENERAL	UBICACIÓN ESPECIFICA	Espacio	EN TRE-EJES	OBSERV ACIONES	CANT.	LARGO	ANCHO	KG/M2	TOTAL
1		Semisótano	TANQUE	TANQUE			2				2,00
4											
					CANTIDADES TOTALES >>>						2,00

MEMORIA GRAFICA DE CANTIDADES DE OBRA

TANQUE

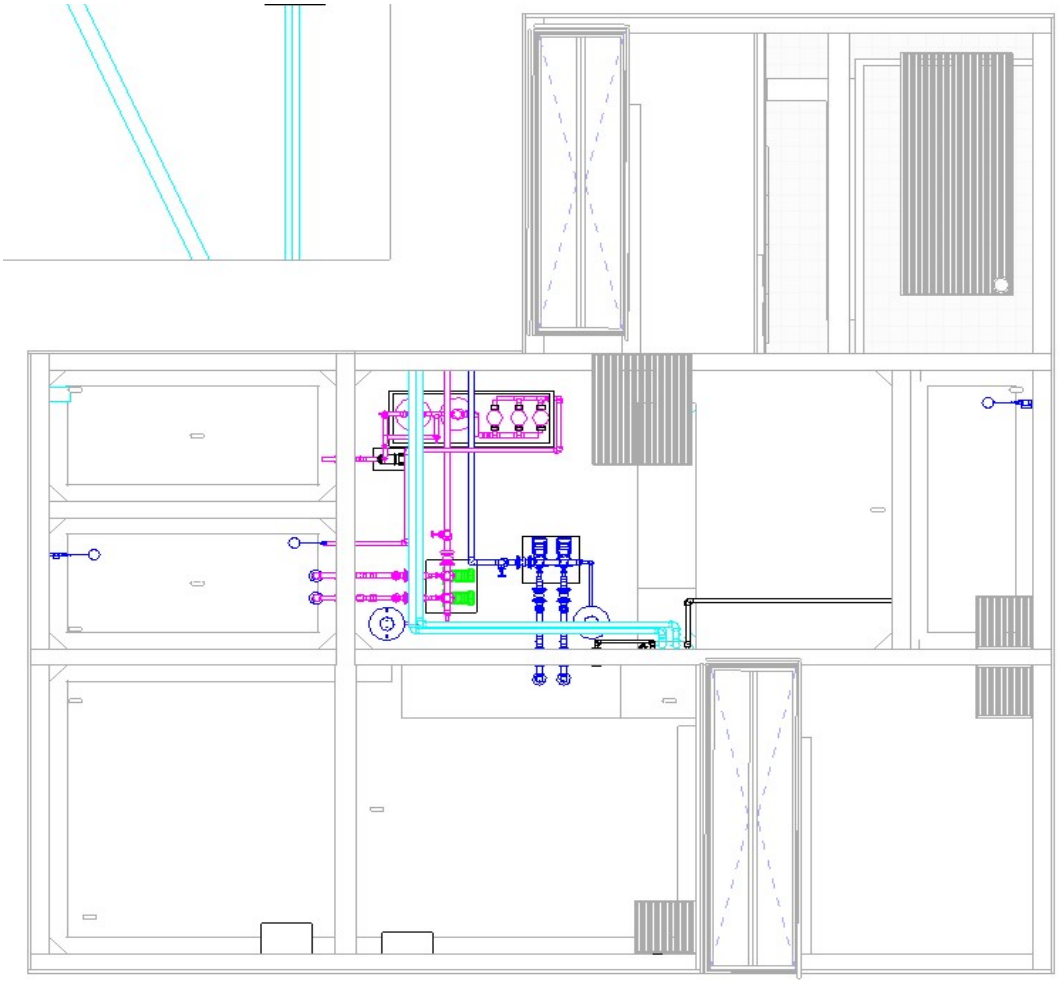

MEMORIA NUMERICA DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATANTE:	**MINISTERIO DE CULTURA**	**MUNICIPIO**	**BOGOTA**	**CUNDINAMARCA**	**INMUEBLE**
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS SJD-25	**CONTRATANTE**	MINISTERIO DE CULTURA		
INTERVENTORIA	CONSORCIO HOSPITALARIO CABA RC	**PROYECTO:**	"EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO SALUD MENTAL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."		COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS
LUGAR DE EJECUCION	COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS	**VALOR:**	$ 16.498.039.996		

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
INP-223	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE PASAMURO EN ACERO AL CARBON DE 1 1/2" a 2 1/2" RANURADO Y/O ROSCADO EN EXTREMOS HASTA 1,0 MT	UND	5,00

No	FECHA	UBICACIÓN. GENERAL	UBICACIÓN ESPECIFICA	Espacio	EN	TRE-	EJES	OBSERV	ACIONES	CANT.	LARGO	ANCHO	KG/M2	TOTAL
1		Semisótano	TANQUE	TANQUE						5				5,00
4														
					CANTIDADES TOTALES >>>									5,00

MEMORIA GRAFICA DE CANTIDADES DE OBRA

TANQUE

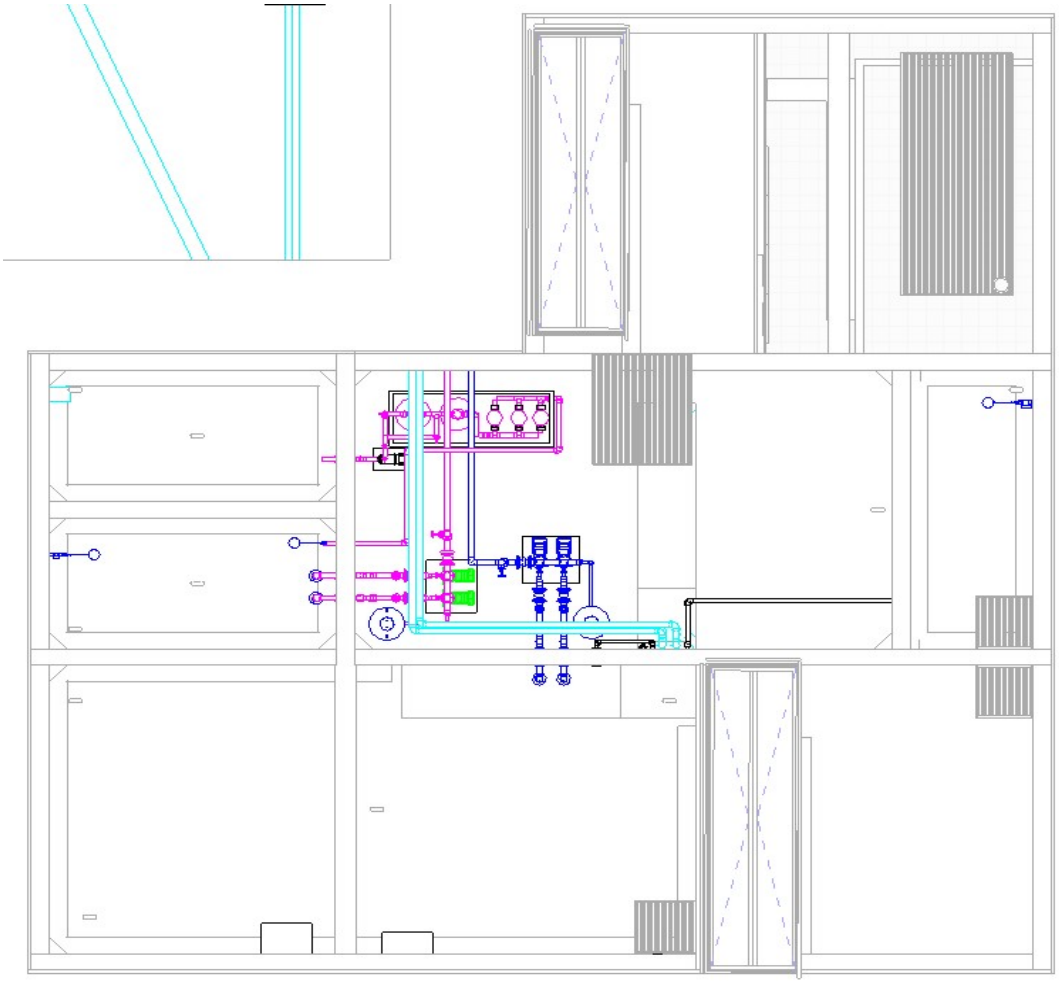

MEMORIA NUMERICA DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATANTE:	**MINISTERIO DE CULTURA**	**MUNICIPIO**	**BOGOTA**	**CUNDINAMARCA**	**INMUEBLE**
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS SJD-25	**CONTRATANTE**	MINISTERIO DE CULTURA		
INTERVENTORIA	CONSORCIO HOSPITALARIO CABA RC	**PROYECTO:**	"EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO SALUD MENTAL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."		COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS
LUGAR DE EJECUCION	COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS	**VALOR:**	$ 16.498.039.996		

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
INP-224	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE PASAMURO EN ACERO AL CARBON DE 4" RANURADO Y/O ROSCADO EN EXTREMOS HASTA 1,0 MT	UND	1,00

No	FECHA	UBICACIÓN. GENERAL	UBICACIÓN ESPECIFICA	Espacio	EN TRE-EJES	OBSERV ACIONES	CANT.	LARGO	ANCHO	KG/M2	TOTAL
1		Semisótano	TANQUE	TANQUE			1				1,00
4											
					CANTIDADES TOTALES >>>						1,00

MEMORIA GRAFICA DE CANTIDADES DE OBRA

TANQUE

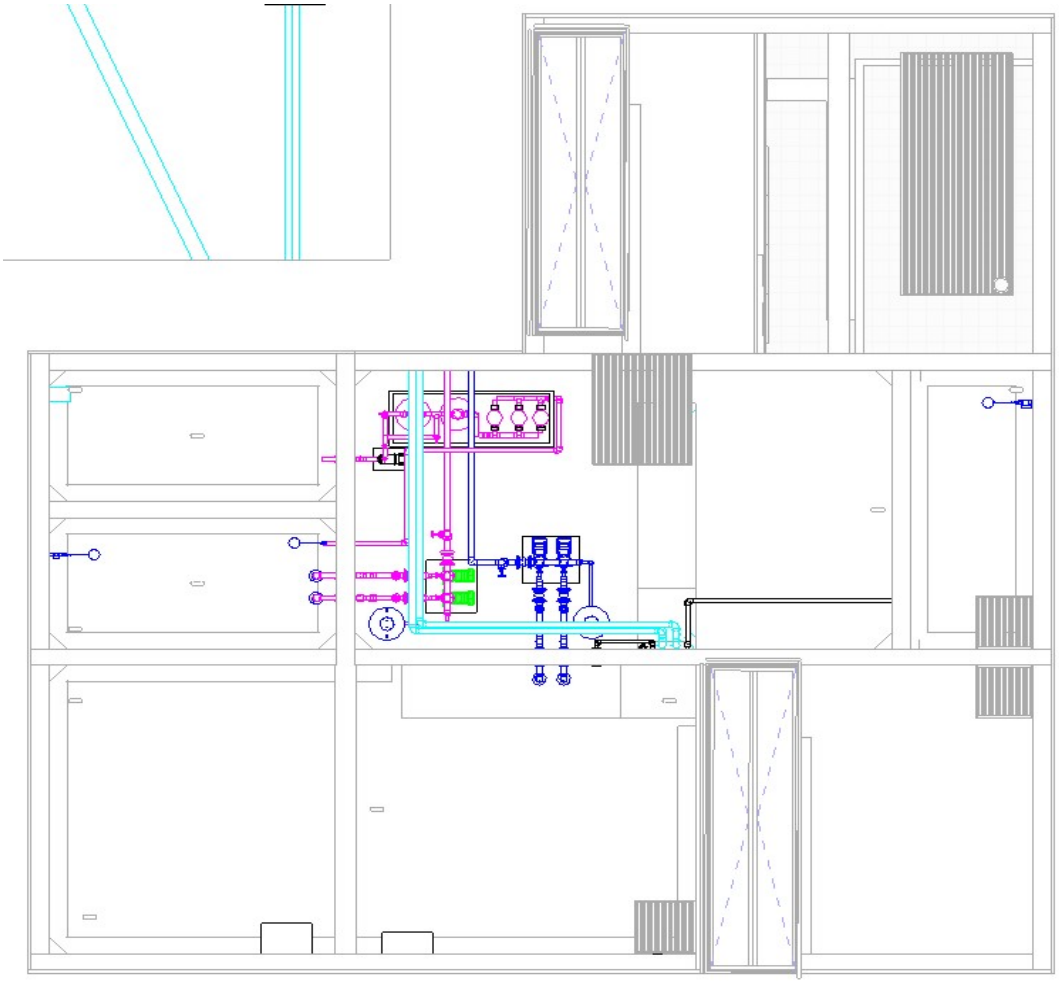

MEMORIA NUMERICA DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATANTE:	MINISTERIO DE CULTURA	**MUNICIPIO**	BOGOTA	CUNDINAMARCA	**INMUEBLE**
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS SJD-25	**CONTRATANTE**	MINISTERIO DE CULTURA		
INTERVENTORIA	CONSORCIO HOSPITALARIO CABA RC	**PROYECTO:**	"EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO SALUD MENTAL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."		COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS
LUGAR DE EJECUCION	COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS	**VALOR:**	$ 16.498.039.996		

N° ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD TOTAL**
INP-226	IMPREMEABILIZACION CARA EXTERNA MUROS TANQUE . MORTERO CEMENTOSO IMPERMEABILIZANTE	M2	1,00

No	FECHA	UBICACIÓN. GENERAL	UBICACIÓN ESPECIFICA	Espacio	E N	T R E-	E J	E S	OBSERV	ACCIONES	CANT.	LARGO	ANCHO	ALTO	TOTAL
1		Semisótano	TANQUE	TANQUE							1	1,00	1,00		1,00
2															
					CANTIDADES TOTALES >>>										1,00

MEMORIA GRAFICA DE CANTIDADES DE OBRA

TANQUE

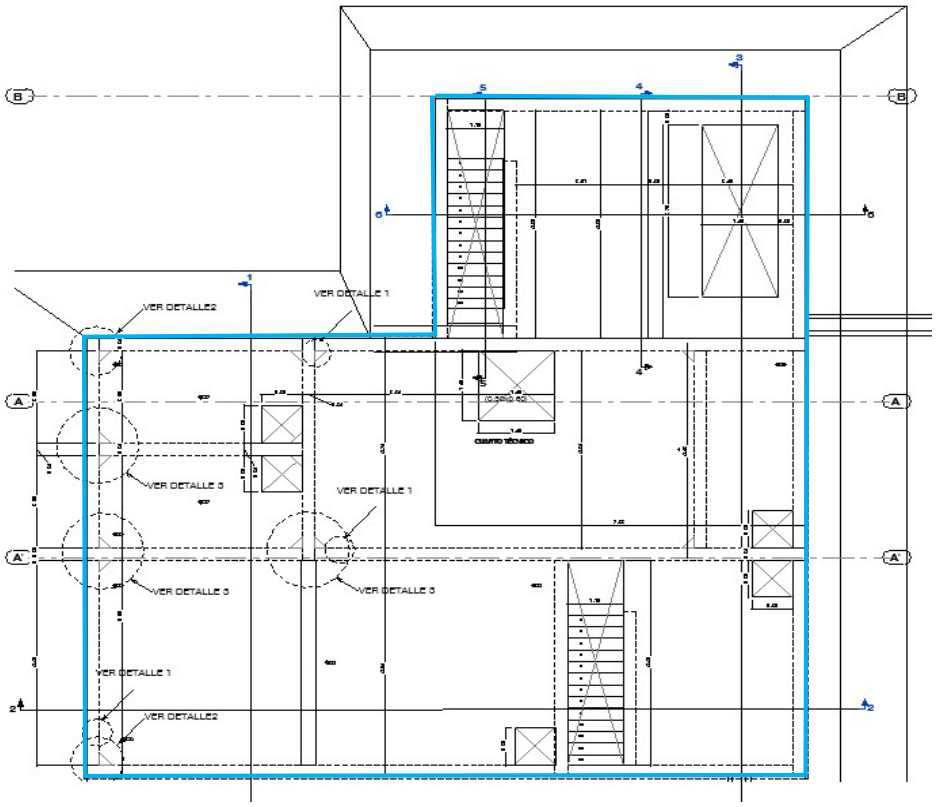

MEMORIA NUMERICA DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATANTE:	**MINISTERIO DE CULTURA**	**MUNICIPIO**	**BOGOTA**	**CUNDINAMARCA**	**INMUEBLE**
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS SJD-25	**CONTRATANTE**	MINISTERIO DE CULTURA		
INTERVENTORIA	CONSORCIO HOSPITALARIO CABA RC	**PROYECTO:**	"EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO SALUD MENTAL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."		COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS
LUGAR DE EJECUCION	COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS	**VALOR:**	$ 16.498.039.996		

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
INP-227	FLOTADOR EN BRONCE Ø1 1/2"	Und	3,00

No	FECHA	UBICACIÓN. GENERAL	UBICACIÓN ESPECIFICA	Espacio	E N	T R E -	E J	E S	OBSERV	ACIONES	CANT.	LARGO	ANCHO	ALTO	TOTAL
1		Semisótano	TANQUE	TANQUE							3				3,00
					CANTIDADES TOTALES >>>										3,00

MEMORIA GRAFICA DE CANTIDADES DE OBRA

TANQUE

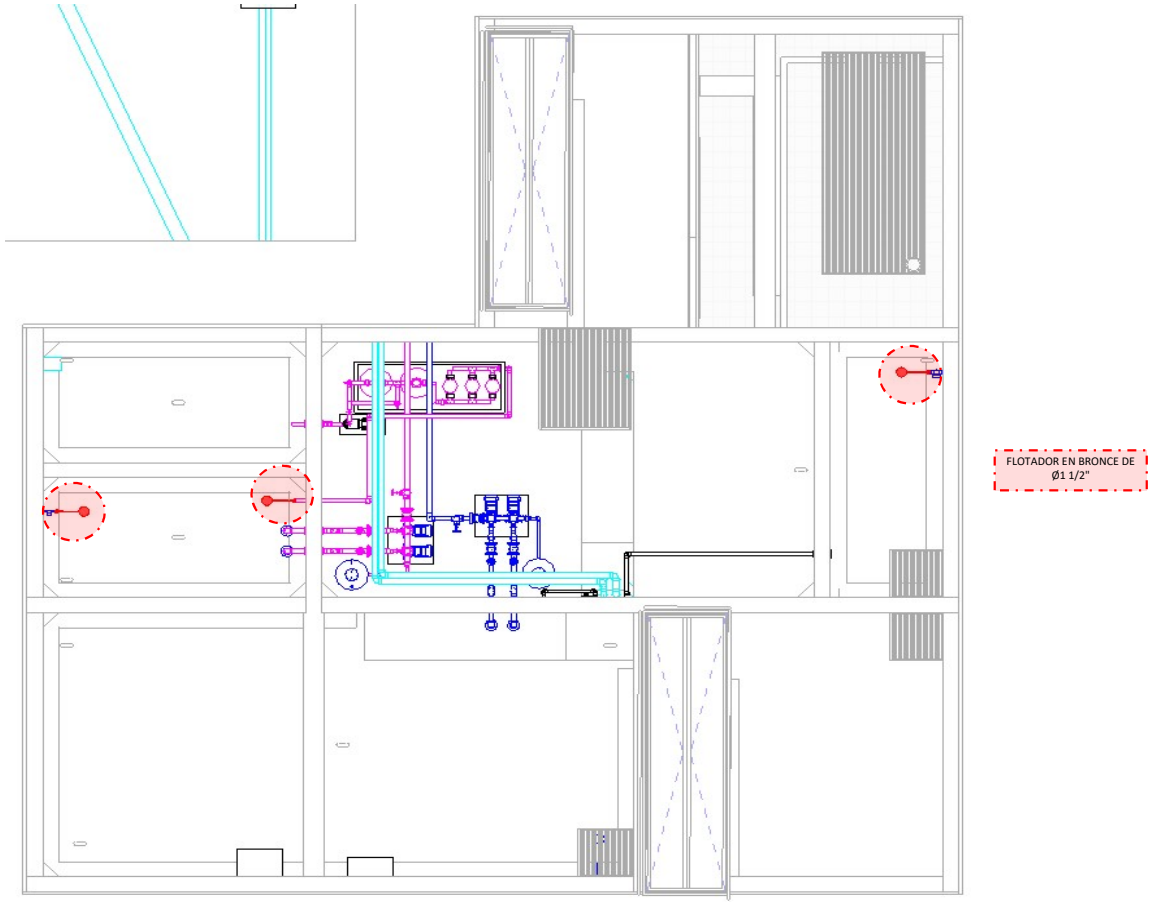

MEMORIA NUMERICA DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATANTE:	**MINISTERIO DE CULTURA**	**MUNICIPIO**	**BOGOTA**	**CUNDINAMARCA**	**INMUEBLE**
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS SJD-25	**CONTRATANTE**	MINISTERIO DE CULTURA		
INTERVENTORIA	CONSORCIO HOSPITALARIO CABA RC	**PROYECTO:**	"EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO SALUD MENTAL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."		COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS
LUGAR DE EJECUCION	COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS	**VALOR:**	$ 16.498.039.996		

N° ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD TOTAL**
INP-228	PAVIMENTO RÍGIDO EN CONCRETO HIDRÁULICO MR-41	m2	1,00

No	FECHA	UBICACIÓN. GENERAL	UBICACIÓN ESPECIFICA	Espacio	E N	T R E-	E J	E S	OBSERV	ACIONES	CANT.	LARGO	ANCHO	ALTO	TOTAL
1		Nivel 1	plazoleta								1	1,00	1,00		1,00
					CANTIDADES TOTALES >>>										1,00

MEMORIA GRAFICA DE CANTIDADES DE OBRA

NIVEL 1



MEMORIA NUMERICA DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATANTE:	**MINISTERIO DE CULTURA**	**MUNICIPIO**	**BOGOTA**	**CUNDINAMARCA**	**INMUEBLE**
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS SJD-25	**CONTRATANTE**	MINISTERIO DE CULTURA		
INTERVENTORIA	CONSORCIO HOSPITALARIO CABA RC	**PROYECTO:**	"EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO SALUD MENTAL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."		COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS
LUGAR DE EJECUCION	COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS	**VALOR:**	$ 16.498.039.996		

N° ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD TOTAL**
INP-229	SELLADO DE JUNTAS CON COLA DE RATÓN (INCLUYE CORTE CON PULIDORA)	ML	1,00

No	FECHA	UBICACIÓN. GENERAL	UBICACIÓN ESPECIFICA	Espacio	E N	T R E-	E J	E S	OBSERV	ACIONES	CANT.	LARGO	ANCHO	ALTO	TOTAL
1		Nivel 1	plazoleta								1	1,00			1,00
					CANTIDADES TOTALES >>>										1,00

MEMORIA GRAFICA DE CANTIDADES DE OBRA

NIVEL 1




MEMORIA NUMERICA DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATANTE:	**MINISTERIO DE CULTURA**	**MUNICIPIO**	**BOGOTA**	**CUNDINAMARCA**	**INMUEBLE**
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS SJD-25	**CONTRATANTE**	MINISTERIO DE CULTURA		
INTERVENTORIA	COLOMBIAN INVESTMENTS GROUP S.A.S.	**PROYECTO:**	"EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO SALUD MENTAL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."		COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS
LUGAR DE EJECUCION	COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS	**VALOR:**	$ 16.498.039.996		


N° ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD TOTAL**
INP-230	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO METALICA DE 30 cm X 30 cm	UNIDAD	20,00

No	FECHA	UBICACIÓN. GENERAL	UBICACIÓN ESPECIFICA	Espacio	E N	T R E -	E J	E S	OBSERV	ACIONES	CANT.	LARGO	ANCHO	ALTO	TOTAL
1		PISO 1	PASILLOS		5	10	H	F			5				5,00
2		PISO 2	PASILLOS		10	E	C				10				10,00
3		PISO 3	PASILLOS		9	10	H	H'			5				5,00
					CANTIDADES TOTALES >>>										20,00

MEMORIA GRAFICA DE CANTIDADES DE OBRA

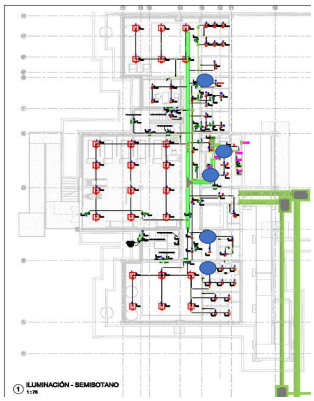

SEMISOTANO

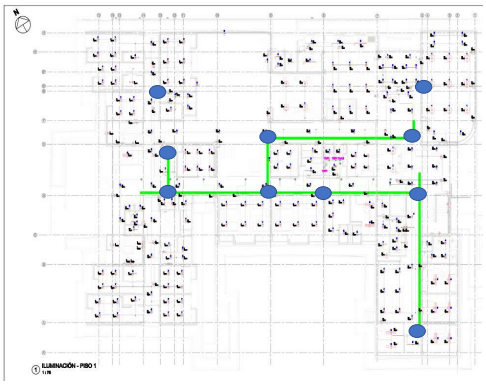

PISO 1



PISO 2


MEMORIA NUMERICA DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATANTE:	MINISTERIO DE CULTURA	**MUNICIPIO**	BOGOTA	CUNDINAMARCA	**INMUEBLE**
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS SJD-25	**CONTRATANTE**	MINISTERIO DE CULTURA		
INTERVENTORIA	COLOMBIAN INVESTMENTS GROUP S.A.S.	**PROYECTO:**	"EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO SALUD MENTAL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."		COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS
LUGAR DE EJECUCION	COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS	**VALOR:**	$ 16.498.039.996		

Nº ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD TOTAL**
INP-212	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN CABLE CU DE 3X10F+1X10N+10T AWG LSHF ALOJADO EN TUBERÍA EMT DE 3/4" DESDE DE TABLERO GENERAL CRITICO (TGC) - TABLERO AIRE A UNIDAD INTERIORES (TAAUI) (NO INCLUYE TUBERIA)	ML	45,00

No	**FECHA**	**UBICACIÓN. GENERAL**	**UBICACIÓN ESPECIFICA**	**Espacio**	**E N**	**T R E-**	**E J**	**E S**	**OBSERV**	**ACIONES**	**CANT.**	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTO**	**TOTAL**
1		SEMISOTANO	CUARTO ELECTRICO		5	10	H	F							45,00
					CANTIDADES TOTALES >>>										45,00

MEMORIA GRAFICA DE CANTIDADES DE OBRA

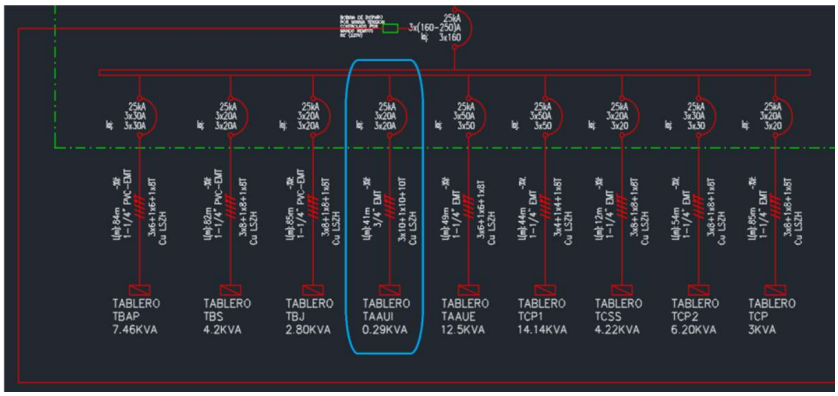

MEMORIA NUMERICA DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATANTE:	**MINISTERIO DE CULTURA**	**MUNICIPIO**	**BOGOTA**	**CUNDINAMARCA**	**INMUEBLE**
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS SJD-25	**CONTRATANTE**	MINISTERIO DE CULTURA		
INTERVENTORIA	CONSORCIO HOSPITALARIO CABA RC	**PROYECTO:**	"EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO SALUD MENTAL DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."		COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS
LUGAR DE EJECUCION	COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS	**VALOR:**	$ 16.498.039.996		

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
INP-232	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORRASO EN PANEL FIBROCEMENTO 6MM PARA CIELORRASO DE ESPACIOS GENERALES MENORES A 50CM. INCLUYE ESTRUCTURA	ML	718,00

No	FECHA	UBICACIÓN. GENERAL	UBICACIÓN ESPECIFICA	Espacio	EN TRE-	EJES	OBSERV	ACIONES	CANT.	LARGO	ANCHO	ALTO	TOTAL
1		Semisotano	Habitación						2	55,00			110,00
2		Nivel 1	Habitación						2	139,00			278,00
3		Nivel 2	Habitación						2	165,00			330,00
94													
					CANTIDADES TOTALES >>>								718,00

MEMORIA GRAFICA DE CANTIDADES DE OBRA

SEMISOTANO

