ACTA DE REUNION

CONSECUTIVO ACTA	FECHA	HORA INICIO	HORA FINAL	LUGAR
07	22/06/2026	10:00	10:46	Virtual -Teams

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Reunión de seguimiento de Proyecto Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) Armenia contrato COMP-02 de 2025

RESPONSABLES DE LA REUNIÓN	
NOMBRE	**CARGO/ ROL**
Victor Augusto Onate Daza	Gerente de Proyecto - UNIÓN TEMPORAL T.I.T SEGURIDAD ARMENIA

CONVOCADOS / ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	ASISTIÓ LIDER		DELEGÓ	
		SI	NO	SI	NO
Allen David Zuluaga Mateus	Supervisor de Contrato – CSJ ARMENIA	X			
Víctor Oñate Daza	Gerente de Proyecto - UNIÓN TEMPORAL T.I.T SEGURIDAD ARMENIA	X			
Ramiro Rincón Barbosa	Ingeniero de Proyecto - UNIÓN TEMPORAL T.I.T SEGURIDAD ARMENIA		X		
German Mora Mora	Líder de implementación - UNIÓN TEMPORAL T.I.T SEGURIDAD ARMENIA	X			

AGENDA

TEMA	JUSTIFICACIÓN	RESPONSABLE	TIEMPO ESTIMADO
Reunión de seguimiento ejecución proyecto contrato COMP 02 de 2025	Realizar seguimiento a la ejecución para el proyecto del Consejo Superior de la Judicatura - Armenia, CONTRATO No: COMP-02 DE 2025.	CSJ / UNIÓN TEMPORAL T.I.T SEGURIDAD ARMENIA	45 min

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Victor Oñate indica que el objetivo de la sesión es realizar el seguimiento al proyecto del Consejo Superior de la Judicatura en Armenia para las sedes de Armenia y Calarcá. Durante la sesión se abordaron los temas:

1. Revisión Temas pendientes

Victor Oñate informa:

- Se encuentra cargada en el repositorio del proyecto el acta de la reunión anterior
- Se envió correo electrónico con la gama de colores disponible, para lo cual el Ing. Allen confirma dos opciones puede ser utilizado: Crema claro o Marfil moderno.
- Se informó que, en el transcurso del día, se remitirá la solicitud de prórroga del contrato, acompañada de los soportes correspondientes de los proveedores y/o fabricantes. En este punto, el Ing. Allen Zuluaga consultó sobre la fecha prevista por la Unión Temporal para la finalización de la implementación, frente a lo cual el Víctor Oñate indicó que dicha fecha se proyecta para el 30 de septiembre.

2. Inicio de actividades en sitio

Germán Mora realiza la presentación de los informes de avance correspondientes a las sedes de Armenia y Calarcá. Adicionalmente, expone el formato de control en Excel que hace parte integral del informe, en el cual se registran los avances semanales desagregados por sede, piso, cámara y tipo de actividad.

Por su parte, Víctor Oñate indica que dichos informes serán cargados semanalmente en el repositorio del proyecto, con el fin de que el Ing. Allen Zuluaga pueda consultarlos y realizar el seguimiento detallado al avance de las actividades.

3. Cronograma

German Mora informa que, de acuerdo con el cuadro de avance, la sede de Armenia presenta un progreso general:


Tendido de tuberia y bandeja	Equipo tecnico	☑	20	81%
Cableado de los puntos de cámaras y red	Equipo tecnico	☑	20	56%
Certificacion de puntos de red	Equipo tecnico	☑	20	0%
Instalacion de cámaras	Equipo tecnico	☑	20	0%

Para la sede de Calarcá presenta un progreso general:

Tendido de tuberia y bandeja	Equipo tecnico	☑	12	75%
Cableado de los puntos de cámaras y red	Equipo tecnico	☑	12	53%
Certificacion de puntos de red	Equipo tecnico	☑	12	0%
Instalacion de cámaras	Equipo tecnico	☑	12	0%

4. Varios

German Mora informa que para Armenia es necesario instalar el segundo switch de 16 puerto para completar el total de puntos para el piso 1 como se muestra en la siguiente imagen:

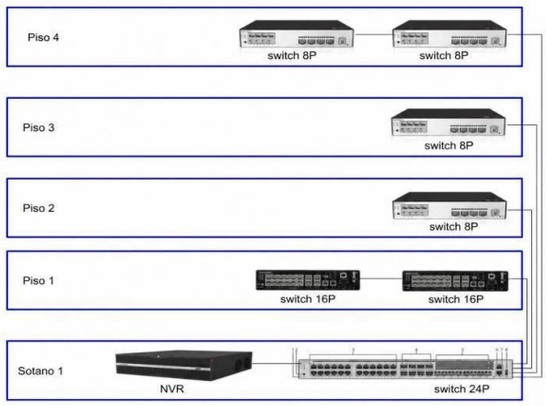

German Mora informa de la restricciones eléctricas y alternativa para UPS en Calarcá, debido a la falta de aprobación de parte de la interventoría del contrato Contrato SCJ-163-2025 - APCA CSJ UPSYSTEM 2025, a cargo de LAD IDOM CSJ para añadir cargas y circuitos necesarios para la UPS de 3 KVA, por lo que plantea se evalué la opción de no instalar esa UPS y conectar NVR y switches a las tomas reguladas contratadas por el consejo. Víctor Oñate indicó que las UPS ya están en la bodega (Bogotá). Se acuerda que German Mora y Allen Zuluaga realizarán una visita esta semana para evaluar y revisar esto directamente en Calarcá.

El Ing. Allen Zuluaga expuso la necesidad de implementar un mecanismo de registro de acceso (entrada y salida) desde los parqueaderos, mediante huella u otro sistema integrado a la plataforma principal, que permita realizar un mejor control de ingreso a través de los parqueaderos de las ssdes de Armenia y Calrcá. Por su parte, Víctor Oñate propuso validar las alternativas durante la visita técnica programada para la presente semana y trasladar el análisis al área de preventa, incluyendo la evaluación de frente a la UPS que se ha contemplado no instalar en la sede de Calarcá. Germán Moroa compartirá un esquema con fotos de los puntos de los parqueaderos para que preventa proponga solución técnica.

Germán Mora sugirió reubicar o desplazar el puesto de trabajo del guardia y el arco detector, con el fin de permitir la instalación del pasillo motorizado sin generar obstrucciones.

Germán Mora informó la necesidad de diseñar una base con brazos para la instalación de las dos pantallas, debido a que el centro de monitoreo no dispone de espacio suficiente, dado que actualmente está ocupado por los monitores existentes en operación. Por su parte, Víctor Oñate indicó que queda atento a la definición de la solución más adecuada para su implementación.

Sin más temas por tratar se da cierre a la sesión.

COMPROMISOS

N°	TEMA	RESPONSABLE	ENTREGA
1	Realizar visita técnica a Calarcá	Allen / Germán	Semana en curso
2	Diseñar base para monitores	Germán Mora	Pendiente
3	Radicar solicitud de prórroga con soportes	Víctor Oñate / Jurídica	El día de hoy
4	Escalar tema de UPS	Víctor Oñate	Pendiente
5	Definir solución control accesos parqueaderos	Víctor / Preventa	Pendiente
6	Enviar esquema con fotos para análisis técnico	Germán Mora	Pendiente

Link de la sesión:

Reunión de seguimiento Consejo Superior de la Judicatura - Armenia-202606022_110322-Meeting Recording.mp4

En Constancia firman,

Allen David Zuluaga Mateus
Supervisor Contrato
CSJ Armenia

Víctor Augusto Oñate Daza
Gerente del Proyecto
UT T.I.T SEGURIDAD ARMENIA

Anexos: SI() NO ()
Elaboró: Víctor Augusto Oñate Daza
Revisó: Allen David Zuluaga Mateus
