GOBIERNO DE CALDAS

ACTA RESUMEN Y ORDENACIÓN DEL GASTO No. 03 PARCIAL

Código: FO-GD-02-018
Versión: 28
Fecha de Modificación: 30/09/2025

SECRETARÍA	INFRAESTRUCTURA	FECHA ACTA	martes, 2 de junio de 2026
Número Radicado en SECOP: Contrato, Convenio, Proceso o Constancia Art 19 Decreto 1510/2013	SECOP II: LP-SI-007-2025 CO1.PCCNTR.8509308	Número Radicado Interno del Contrato:	20112025-1755
Numero de identificacion del contratista - NIT	902006571-3	No. Ficha BPIN (Solo para proyectos Regalias Anexar copia)	2024000043002
CONTRATISTA	CONSORCIO HORIZONTE AZUL		
CONTRATO CEDIDO A:	N/A		
CODIGO VIA	5004	NOMBRE DE LA VIA	Asia - Tres Puertas
Actividad Economica	4210	Tipo de Contrato	OBRA PUBLICA
Objeto del Contrato:	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS K0+100 - K2+540		

Valor del Contrato	Valor Adición	Valor Anticipo
$ 15.179.416.313,50	$ -	$ -

APORTANTES	%	VALOR	TIPO DE ENTIDAD	Duración Contrato:	
Aporte Departamento:	100%	$ 15.179.416.313,50	PÚBLICA	Fecha de Iniciación	23 de enero de 2026
Aporte Convenio No				Fecha de Terminación de ejecución	22 de enero de 2027
Aporte Convenio No				Prórrogas	-

Nº FACTURA	Nº PEDIDO - RPC	ITEM	VALOR ORDENADO	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO	FONDO	CEN GEST	POS PRE	A FUNCIONAL	ELEMENTO PEP
FE 4	4500032220 SOR12625	1	$ 975.867.421,00	$ -	$ 975.867.421,00	7-RFR0388	18INF	23201010010302	S2402314593?3AAA	INFR-250098.01.01
VALOR ACTA			$ 975.867.421,00	$ -	$ 975.867.421,00					

RESUMEN DEL CONTRATO			RESUMEN DEL ANTICIPO		
Valor del Contrato:		$ 15.179.416.313,50	Valor del Anticipo:		$ -
Adición del Contrato					
Valor Acta Nro. 1	$ 531.310.888,00		Amortización Acta 1	$ -	
Valor Acta Nro. 2	$ 571.059.390,00		Amortización Acta 2		
Valor Acta Nro. 3	$ 975.867.421,00		Amortización Acta 3		
Valor Acta Nro. 4			Amortización Acta 4		
Valor Acta Nro. 5			Amortización Acta 5		
Valor Acta Nro. 6			Amortización Acta 6		
Valor Acta Nro. 7			Amortización Acta 7		
Saldo del Contrato:	$ 13.101.078.614,50		Saldo por Amortizar:	$ -	
SUMAS IGUALES	$ 15.179.416.313,50	$ 15.179.416.313,50	SUMAS IGUALES	$ -	$ -

OBSERVACION: (si diligencia cuando se requiera)

Nota: EL (LA) CONTRATISTA HA ACREDITADO EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES CONFORME A LAS NORMAS VIGENTES , EL CUAL HA SIDO VERIFICADO POR PARTE DEL ORDENADOR, SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 23 DE LA LEY 1150 de 2007 PARAGRAFO 1° ("El servidor público que sin justa causa no verifique el pago de los aportes a que se refiere el presente artículo, incurrirá en causal de mala conducta, que será sancionada con arreglo al régimen disciplinario vigente," y del artículo 23 del Decreto 1703/2002 Celebrados en contratación no laboral para efectos de lo establecido en el artículo 27° de la Ley 100 de 1993, en los contratos en donde este involucrada la ejecución de un servicio por una persona natural en favor de una persona natural o persona jurídica de derecho público o privado, la parte contratante deberá verificar la afiliación y pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social

Firma
Nombre: JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA
Ordenador del gasto

Firma
Nombre: JORGE HERNAN NEIRA DIAZ
Supervisor (a)

Firma
Nombre: ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A BIC
Interventor (a) - (SI APLICA)

Espacio para
Logo Corporativo

CONSORCIO HORIZONTE AZUL
NIT 902.006.571-3
CRA 24 N 2008 OFI 309
Tel: 8849348
Manizales - Colombia
facturashorizonteazul@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 4

				Fecha y hora Factura	
Señores	DEPARTAMENTO DE CALDAS			**Generación**	02/06/2026, 11:25
NIT	890.801.052-1	**Teléfono**	(606) 8982444	**Expedición**	02/06/2026, 11:33
Dirección	CRA 21 CLL 22 23	**Ciudad**	Manizales - Colombia	**Vencimiento**	02/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Costo Directo	1.00	844,184,485.00
2	Administración	1.00	109,819,113.00
3	Utilidad	1.00	21,963,823.00

Total items: 3

Total Bruto	975,967,421.00
Total a Pagar	975,967,421.00

Valor en Letras:
Novecientos setenta y cinco millones novecientos sesenta y siete mil cuatrocientos veintiún pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Transferencia Débito - Transferencia $ 975,967,421.00

Observaciones:
Acta No 3, según contrato 29112025-1755 , favor consignar a la Cuenta Corriente del Banco Davivienda No 0860 6999 5840.

Fabricado Software y Propiedad Intelectual Siigo SAS - NIT 830.008.145-8. Normas Software Siigo Nube. Representación gráfica factura electrónica versión 1.9.5.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764105438935 aprobado en 20260202 prefijo FE desde el número 1 al 50 Vigencia: 24 Meses Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril Tarifa
CUFE: d8ab79c8fe1cca08c9b15b036e903be41d33c11afcdd975ae8e049680bdb1a8e889117ded74bdada4358d967c4085c8b

HORIZONTE AZUL
CONSORCIO

Manizales 2 de junio de 2026

CHA-132-2026

Ingeniero
Jorge Hernan Neira Diaz
Supervisor
GOBERNACIÓN DE CALDAS
L.C.

REF.: "MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS".

ASUNTO: ACLARACIÓN SOBRE EL PAGO DE RETENCIONES, IVA E ICA DEL CONTRATO DE OBRA.

Por medio del presente, el CONSORCIO HORIZONTE AZUL, contratista del proyecto cuyo objeto contractual es el " MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS", se permite informar que, aunque el objeto del contrato menciona actividades dentro de los municipios de Manizales y Palestina, todas las actividades constructivas se desarrollaran dentro de los límites del municipio de Manizales, por tal motivo todas las retenciones, el IVA y el impuesto de industria y comercio (ICA) correspondientes a la ejecución de dicho contrato se causan y se pagan exclusivamente en el municipio de Manizales, lugar donde el consorcio se encuentra registrado tributariamente y donde realiza la respectiva declaración y pago de sus obligaciones fiscales.

Lo anterior se comunica para efectos de claridad y correcta aplicación de las normas tributarias vigentes, evitando así cualquier confusión respecto a la jurisdicción de los pagos mencionados.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por LUIS ALBERTO MEZA GALEANO
Fecha: 2026.06.02 11:22:33 -05'00'

Ing. Luis Alberto Meza Galeano
Representante Legal
CONSÓRCIO HORIZONTE AZUL

Manizales, 2 de junio de 2026.

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002:

CERTIFICO:

Que El Consorcio Horizonte Azul:
902.006.571-3

Ha dado cumplimiento con los aportes y demás obligaciones legales que corresponden respecto al Sistema de Seguridad Social en los últimos (6) seis meses, cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a Salud, Pensiones, Riesgos profesionales, Caja de compensación Familiar.

Atentamente,

ADRIANA LUCÍA ALZATE L.
Contador Público
C.C. 30.338.836
MAT 71358-T

LUIS ALBERTO MEZA GALEANO
Representante Legal
C.C. 10.241.824

Cra 24 No 20-08 Of. 209 Teléfono: 321 8565198
E-mail. contabilidad.cimega@gmail.com

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



71358-T

ADRIANA LUCIA
ALZATE LARGO
C.C. 30338836
RESOLUCION INSCRIPCION 55 FECHA: 11/05/2000
UNIVERSIDAD DE MANIZALES

Presidente

80722

C

FIRMA DEL TITULAR

030691

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

030338836

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5 0 3 A 2 8 E 6 9 E 2 0 0 5 2 9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ADRIANA LUCIA ALZATE LARGO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 30338836 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 71358-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

30.338.836

NUMERO

ALZATE LARGO

APELLIDOS

ADRIANA LUCIA

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 07-ABR-1976

MANIZALES
(CALDAS)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA

O+ G.S. RH

F SEXO

31-OCT-1994 MANIZALES

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

A-0931100-00068282-F-0030338836-20080619 0003140767A 1 4490008730

LP-003-2025

FORMATO 6
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

VALENTINA MEZA BOTERO identificado con cedula de ciudadanía 1.053.854.213 en mi condición de representante legal de **ÁNGULO AZUL S.A.S** identificada con NIT 901.727.988-0, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (*artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983),* pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

MARCELA SERNA OSORIO identificado con cedula de ciudadanía 1.053.831.479, y con tarjeta profesional No. 271791-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **ÁNGULO AZUL** identificada con NIT 901.727.988-0, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Manizales, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción *(artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983),* pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Manizales, a los 2 días del mes de junio de 2026.

Marcela Serna Osorio

MARCELA SERNA OSORIO
Contador público
C.C. 1.053.831.479
T.P. 271791-T

Valentina M B

VALENTINA MEZA BOTERO
C.C. 1.053.854.213
Representante legal ÁNGULO AZUL S.A.S
NIT 901.727.988-0

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0 0 5 E C F 1 3 1 5 1 C E 4 5 2

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARCELA SERNA OSORIO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1053831479 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 271791-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.053.831.479**

SERNA OSORIO

APELLIDOS

MARCELA

NOMBRES

Marcela Serna Osorio

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **13-DIC-1993**

HERVEO
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60
ESTATURA

A+
G.S. RH

F
SEXO

04-ENE-2012 MANIZALES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



A-0900100-00804314-F-1053831479-20160323 0049040906A 2 4783828716

DAVIVIENDA

CERTIFICADO

MANIZALES, 21 de Noviembre del 2025
CALDAS
COLOMBIA
A quien interese

Por medio de la presente hacemos constar que **CONSORCIO HORIZONTE AZUL** con **NIT. 9020065713,**

Posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Numero	**086069996840**
Fecha de apertura	**21/11/2025**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
PERSONA NATURAL

LUIS ALBERTO MEZA GALEANO, identificado con cédula de ciudadanía No. C.C 10.241.824 de Manizales, mediante el presente documento me permito manifestar bajo la gravedad de juramento que me encuentro al día y a paz y salvo por concepto de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscal que me resultan exigibles por la Ley, para los últimos seis (06) meses

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
Dada en Manizales, a los DOS (02) días del mes de junio de 2026.

FIRMA: _____

LUIS ALBERTO MEZA GALEANO
No.10.241.824 de Manizales

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 2 5 Solicitud de inscripción Unión temporal y/o Consorcio

4. Número de formulario 141217622084

(415)7707212489984(8020) 000014121762208 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 2 0 0 6 5 7 1	3	Impuestos y Aduanas de Manizales	1 0	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO HORIZONTE AZUL

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Caldas 1 7	Manizales 0 0 1

41. Dirección principal
CR 24 20 08 OF 309

42. Correo electrónico facturashorizonteazul@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 6 2 5 0 6 4 3 2	3 1 8 3 7 0 2 4 2 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 2 5 1 0 2 8	4 2 9 0	2 0 2 5 1 0 2 8					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 7	1 4	1 6	5 5																						

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20)	55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3; 57. Modo; 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

584. Nombre MEZA GALEANO LUIS ALBERTO
585. Cargo Representante Legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 10-11-2025 09:15:30AM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141217622084

(415)7707212489984(8020) 000014121762208 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 2 0 0 6 5 7 1	3	Impuestos y Aduanas de Manizales	1 0	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades e institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 5 0 8 2 6	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento		
79. Ciudad/Municipio		
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 5 0 8 2 6	
81. Hasta	2 0 2 7 0 8 2 5	

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141217622084

[415]7707212489984(8020) 000014121762208 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 2 0 0 6 5 7 1	3	Impuestos y Aduanas de Manizales	1 0	

Representación

1

98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
REPRS LEGAL PRIN	1 8	2 0 2 5 0 8 2 6	

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	1 0 2 4 1 8 2 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MEZA	GALEANO	LUIS	ALBERTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
REPRS LEGAL SUPL	1 9	2 0 2 5 0 8 2 6	

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 5 3 8 5 4 2 1 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MEZA	BOTERO	VALENTINA	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

Copia Controlada

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141217622084

(415)7707212489984(8020)000014121762208 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 2 0 0 6 5 7 1	3	Impuestos y Aduanas de Manizales 1 0	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 0 2 4 1 8 2 4		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
MEZA	GALEANO	LUIS	ALBERTO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	6 0	2 0 2 5 0 8 2 6	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 7 2 7 9 8 8	0	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social
ÁNGULO AZUL SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	4 0	2 0 2 5 0 8 2 6	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

CONSORCIO HORIZONTE AZUL
NIT. 907.006.571-9

MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS-ALTO EL PAITA, MUNICIPIO DE PALESTINA, EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS

PERÍODO DE PAGO: 1-may-26 | 15-may-26

FECHA DE LIQUIDACIÓN: 15-may-26

DATOS DEL EMPLEADO						DEVENGADO						DEDUCCIONES					NETO A PAGAR	RECIBI CONFORME	OBSERVACIONES
No.	NOMBRE DEL EMPLEADO	APELLIDOS DEL EMPLEADO	CÉDULA	CARGO	SALARIO	DÍAS	BÁSICO	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	AUXILIO DE ALIMENTACIÓN Y VIVIENDA	AUXILIO DE RODAMIENTO	AUXILIO DE VIVIENDA	TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSION			TOTAL DEDUCIDO			
1	SANTIAGO	HERNANDEZ MANRIQUE	1.054.973.887	TOPOGRAFO	$ 3.000.000	15	$ 1.500.000	$ 124.548	$ 594.856	$ 217.946	$ 176.920	$ 2.214.270	$ 63.149	$ 63.149			$ 126.298	$ 2.087.981		
2	MANUEL FERNANDO	SALAZAR GONZALEZ	1.053.794.998	ING. RESIDENTE	$ 5.000.000	15	$ 2.500.000	$ 0	$ 475.000	$ 180.000	$ 285.000	$ 3.450.000	$ 100.000	$ 100.000			$ 200.000	$ 3.250.000		
3	ADRIANA CAROLINA	RODRIGUEZ MORA	1.098.758.226	RESIDENTE AMBIENTAL	$ 1.750.905	15	$ 875.453	$ 124.548	$ 250.000	$ 60.000	$ 90.000	$ 1.300.000	$ 35.018	$ 35.018			$ 70.036	$ 1.229.964		
4	ERIKA GERALDINE	HERNANDEZ	1.053.825.371	RESIDENTE SOCIAL	$ 2.300.000	15	$ 1.150.000	$ 124.548	$ 740.900	$ 96.200	$ 144.300	$ 2.255.548	$ 66.000	$ 66.000			$ 132.000	$ 2.123.548		
5	GABRIELA LUCÍA	MARTÍNEZ MAYA	1.006.119.261	ING. RESIDENTE AUX	$ 3.800.000	15	$ 1.900.000	$ 0	$ 525.000	$ 90.000	$ 135.000	$ 2.750.000	$ 76.000	$ 76.000			$ 152.000	$ 2.598.000		
6	YULIANA	NARVAEZ VILLEGAS	24.344.924	RESIDENTE SST	$ 3.800.000	15	$ 1.900.000	$ 124.548	$ 725.000	$ 90.000	$ 135.000	$ 2.224.548	$ 66.000	$ 66.000			$ 132.000	$ 2.092.548		
		TOTALES					$ 10.075.453	$ 1.758.932	$ 3.180.732	$ 15.404.741	$ 15.186.761	$ 14.606.709	$ 833.334	$ 406.167			$ 13.794.373	$ 12.382.041		

Observaciones	
NÓMINA ADMINISTRATIVA	
Elaborador Por:	Revisado Por:
MANUEL FERNANDO SALAZAR	MAURICIO A. CORTÉS

TABLA DE SALARIOS		
Salario Mínimo	2026	$ 1.750.905
Auxilio de Transporte	2026	$ 249.095
NOMINA DE EMPLEADOS ADMINISTRATIVA		

CONSORCIO HORIZONTE AZUL
NIT. 901.008.571-3

PERÍODO DE PAGO
1-may-26 | 15-may-26
FECHA DE LIQUIDACIÓN
15-may-26

MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS-ALTO EL PAISA, MUNICIPIO DE PALESTINA, EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS

DATOS DEL EMPLEADO							DEVENGADO						DEDUCCIONES					NETO A PAGAR	RECIBÍ CONFORME	OBSERVACIONES
CÓD	No.	NOMBRE DEL EMPLEADO	APELLIDO DEL EMPLEADO	CÉDULA	CARGO	SALARIO	DÍAS	BÁSICO	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	AUXILIO DE ALIMENTACIÓN	AUXILIO DE RODAMIENTO	AUXILIO DE VIVIENDA	TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSIÓN	OTROS DESCUENTOS	DESCUENTOS JUDICIALES	TOTAL DEDUCIDO			
3	1	ALEXANDER ANDRADE	RUIZ VERA	75.097.619	MAESTRO	$ 4.000.000	15,0	$ 2.000.000	$ 0	$ 287.274	$ 114.516	$ 172.354	$ 2.574.144	$ 80.000	$ 80.000			$ 160.000	$ 2.414.144		
31	2	JHONIFER ROBINSON	ZAPATA MARIN	9.847.457	CELADOR	$ 1.750.905	15,0	$ 875.453	$ 124.548	$ 175.093	$ 70.016	$ 105.054	$ 1.350.183	$ 57.430	$ 57.430			$ 114.860	$ 1.235.321		CELADOR NOCTURNO CAMPAMENTO
31	3	JAIME DE JESUS	CARMONA ERAZO	3.661.625.282	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905	15,0	$ 875.453	$ 124.548	$ 69.741	$ 28.017	$ 129.845	$ 1.089.483	$ 38.997	$ 38.997			$ 77.994	$ 1.011.489		
31	4	JOSÉ REINEL	RUEDA VANEGAS	3.054.999.448	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905	15,0	$ 875.453	$ 124.548	$ 57.487	$ 8.915	$ 10.492	$ 1.034.974	$ 35.217	$ 35.217			$ 70.434	$ 964.540		
31	5	JULIO CESAR	VALADA ZAPATA	1.059.784.489	OFICIAL	$ 2.093.100	15,0	$ 1.045.550	$ 124.548	$ 167.971	$ 67.118	$ 100.782	$ 1.506.039	$ 42.060	$ 42.060			$ 84.120	$ 1.421.919		
31	6	JOSE RAFAEL	ALVAREZ DORADO	92.534.535	AYUDANTE	$ 1.750.905	15,0	$ 875.453	$ 124.548	$ 175.093	$ 70.016	$ 105.054	$ 1.350.183	$ 57.430	$ 57.430			$ 114.860	$ 1.235.321		
31	7	JHON WILSON	RODRIGUEZ VARGAS	75.077.442	CONDUCTOR	$ 1.750.905	15,0	$ 875.453	$ 124.548	$ 114.613	$ 45.815	$ 68.768	$ 1.229.235	$ 40.087	$ 40.087			$ 80.174	$ 1.147.251		
31	8	JHON BAIRON	VILLA	3.054.865.828	AYUDANTE	$ 1.750.905	15,0	$ 875.453	$ 124.548	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.000.000	$ 35.018	$ 35.018			$ 70.035	$ 929.964		
31	9	DIEGO ALONSO	VILLAVICENCIO TAÑO	1.053.635.667	AYUDANTE	$ 1.750.905	15,0	$ 875.453	$ 124.548	$ 2.487	$ 995	$ 1.492	$ 1.004.974	$ 35.217	$ 35.217			$ 70.434	$ 934.540		
31	10	JOHN FREY	VELEZ ZAPATA	79.936.943	OFICIAL	$ 2.093.100	15,0	$ 1.045.550	$ 124.548	$ 165.000	$ 66.000	$ 99.000	$ 1.500.098	$ 41.822	$ 41.822			$ 83.644	$ 1.416.454		
31	11	JOSE FELIX	LOPEZ ESPITIA	1.072.323.039	OFICIAL	$ 2.093.100	15,0	$ 1.045.550	$ 124.548	$ 208.110	$ 83.244	$ 125.466	$ 1.589.318	$ 41.822	$ 41.822			$ 83.644	$ 1.504.674		
31	12	WALTER DE JESUS	PADILLA MURILLO	98.592.482	OPERADOR EXCAVADORA	$ 2.000.000	15,0	$ 1.000.000	$ 124.548	$ 188.250	$ 75.300	$ 112.950	$ 1.501.048	$ 40.000	$ 40.000			$ 80.000	$ 1.421.048		
31	13	MILTON	HERNANDEZ BETANCUR	3.104.694.351	OFICIAL	$ 2.093.100	15,0	$ 1.045.550	$ 124.548	$ 165.000	$ 66.000	$ 99.000	$ 1.500.098	$ 41.822	$ 41.822			$ 83.644	$ 1.416.454		
31	14	ALEXANDER	SUAREZ CEBALLOS	9.893.118	AYUDANTE	$ 1.750.905	15,0	$ 875.453	$ 124.548	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.000.000	$ 35.018	$ 35.018			$ 70.035	$ 929.964		
31	15	GEOVANNY	LOAIZA POSADA	94.529.317	AYUDANTE	$ 1.750.905	15,0	$ 875.453	$ 124.548	$ 175.093	$ 70.016	$ 105.054	$ 1.350.183	$ 56.419	$ 56.419			$ 112.838	$ 1.237.343		
31	16	LUIS TERNEY	ZAPATA PEREZ	9.957.664	AYUDANTE	$ 1.750.905	15,0	$ 875.453	$ 124.548	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.000.000	$ 35.018	$ 35.018			$ 70.035	$ 929.964		
31	17	CARLOS ANDRES	GONZALEZ GONZALEZ	1.058.912.092	AYUDANTE	$ 1.750.905	15,0	$ 875.453	$ 124.548	$ 120.000	$ 48.000	$ 72.000	$ 1.240.000	$ 35.018	$ 35.018			$ 70.035	$ 1.169.964		
31	18	CRISTHIAN CAMILO	PARTEARA AMAYA	1.110.545.737	CADENERO	$ 2.200.000	10,0	$ 733.333	$ 83.032	$ 140.667	$ 56.267	$ 88.000	$ 1.109.698	$ 30.083	$ 30.083			$ 60.166	$ 1.049.532		Entró el 05 de mayo
31	19	ALEX FERNANDO	VILLADA DIAZ	1.061.825.830	ALMACENISTA	$ 2.600.000	8,0	$ 693.333	$ 90.425	$ 44.318	$ 17.727	$ 26.591	$ 846.395	$ 33.279	$ 33.279			$ 66.558	$ 785.837		Entró el 06 de mayo
31	20	JUAN SEBASTIAN	MUÑOZ TORO	1.058.857.899	AYUDANTE	$ 1.750.905	4,0	$ 233.455	$ 33.233	$ 0	$ 0	$ 0	$ 266.667	$ 9.338	$ 9.338			$ 18.676	$ 247.991		Entró el 12 de mayo
31	21	JOSE FELIPE	PAEZ VERA	1.193.046.214	AYUDANTE	$ 1.750.905	4,0	$ 233.455	$ 33.233	$ 0	$ 0	$ 0	$ 266.667	$ 9.338	$ 9.338			$ 18.676	$ 247.991		Entró el 12 de mayo
31	22	RICARDO ARTURO	DAVILA QUESADA	7.7[illegible].469.186	AYUDANTE	$ 1.750.905	4,0	$ 233.455	$ 33.233	$ 0	$ 0	$ 0	$ 266.667	$ 9.338	$ 9.338			$ 18.676	$ 247.991		Entró el 12 de mayo
TOTALES								$ 16.939.208	$ 2.241.855	$ 2.203.188	$ 881.276	$ 1.321.913	$ 25.587.440	$ 838.171	$ 838.672	$ 0	$ 0	$ 1.677.343	$ 23.910.100		

Observaciones		
NÓMINA OPERATIVA		
Elaborado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:
MANUEL P SALAZAR GONZALEZ	MAURICIO A. CORTES REINA	

TABLA DE SALARIOS			
Salario Mínimo		2026	$ 1.750.905
Auxilio de Transporte		2026	$ 249.095
	0		

CONSORCIO NORTE AZUL
NIT. 902.006.577-3

MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS-ALTO EL PAISA, MUNICIPIO DE PALESTINA, EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS

PERÍODO DE PAGO: 1-may-26 | 15-may-26
FECHA DE LIQUIDACIÓN: 15-may-26

DATOS DEL EMPLEADO							DEVENGADO							DEDUCCIONES					NETO A PAGAR	RECIBI CONFORME	OBSERVACIONES
ITEM	NOMBRE DEL EMPLEADO	APELLIDO DEL EMPLEADO	CÉDULA	CARGO	SALARIO	DÍAS	BÁSICO	HORAS EXTRAS	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	AUXILIO DE ALIMENTACIÓN Y CONECTIVIDAD	AUXILIO DE RODAMIENTO	AUXILIO DE VIVIENDA	TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSIÓN	OTROS DESCUENTOS	DESCUENTOS JUDICIALES	TOTAL DEDUCIDO			
1	MARTHA ALEJANDRA	OSORIO GIL	1.053.779.055	CONTRATADORA	$ 1.750.905	15,0	$ 875.453	$ 0,00	$ 124.548	$ 4.974	$ 1.990	$ 2.984	$ 1.009.948	$ 35.426	$ 35.426			$ 70.852	$ 939.138		
33	VALENTINA	MEJIA RAMIREZ	1.061.626.160	CONTRATADORA	$ 1.750.905	15,0	$ 875.453	$ 34.822	$ 124.548	$ 7.461	$ 2.984	$ 4.477	$ 1.064.322	$ 35.613	$ 35.613			$ 71.226	$ 993.096		
		TOTALES					$ 1.750.905	$ 34.470	$ 249.095	$ 12.435	$ 4.974	$ 7.461	$ 2.074.170	$ 71.039	$ 71.039	$ 0	$ 0	$ 143.078	$ 1.932.234		

Observaciones

Elaborado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:
MARIBEL SALAZAR GONZALEZ	MAURICIO A. CORTES SILVA	

TABLA DE SALARIOS		
Salario Mínimo	2026	$ 1.750.905
Auxilio de Transporte	2026	$ 249.095
NOMINA DE EMPLEADOS OPERATIVA		

HORIZONTE AZUL
NIT. 901.727.588-0

PERÍODO DE PAGO
1-may-26 | 15-may-26

MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS-ALTO EL PAISA, MUNICIPIO DE PALESTINA, EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS

FECHA DE LIQUIDACIÓN
15-may-26

DATOS DEL EMPLEADO							DEVENGADO								DEDUCCIONES					NETO A PAGAR	RECIBI CONFORME	OBSERVACIONES
C.TO	No.	NOMBRE DEL EMPLEADO	APELLIDO DEL EMPLEADO	CÉDULA	CARGO	SALARIO	DÍAS	BÁSICO	HORAS EXTRAS	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	AUXILIO DE ALIMENTACIÓN Y VIVIENDA	AUXILIO DE RODAMIENTO	AUXILIO DE VIVIENDA	TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSION	OTROS DESCUENTOS	DESCUENTOS JUDICIALES	TOTAL DEDUCIDO			
12	9	MANUELA	MONTES MEJIA TO	1.061.629.488	CONTROLADORA	$ 1.750.905	15,0	$ 875.453	[illegible]	$ 114.516	$ 80.106	$ 92.042	$ 48.064	$ 1.150.212	$ 41.427	$ 41.427			$ 82.853	$ 1.067.358		Manuela M.
13	12	LINDA JULIETH	ZAPATA VARON	1.061.838.080	CONTROLADORA	$ 1.750.905	15,0	$ 875.453	$ 9.948	$ 124.548	$ 84.974	$ 1.890	$ 2.964	$ 1.099.948	$ 35.416	$ 35.416			$ 70.831	$ 939.116		Linda Zapata
TOTALES								$ 1.750.905	[illegible]	$ 249.093	$ 165.080	$ 94.032	$ 51.048	$ 2.250.160	$ 76.843	$ 76.843	$ 0	$ 0	$ 153.685	$ 2.006.474		

Observaciones

NÓMINA OPERATIVA

Elaborado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:
MANUEL F SALAZAR GONZALEZ	MAURICIO A. CORTES REINA	

TABLA DE SALARIOS			
Salario Mínimo		2026	$ 1.750.905
Auxilio de Transporte		2026	$ 249.093
NÓMINA DE EMPLEADOS OPERATIVA			

CONSORCIO HORIZONTE AZUL
NIT. 902.006.573-3

MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS-ALTO EL PAISA, MUNICIPIO DE PALESTINA, EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS

PERIODO DE PAGO
Del: 01-may-26 Al: 15-may-26
FECHA DE LIQUIDACIÓN
30-may-26

DATOS DEL EMPLEADO							DEVENGADO						DEDUCCIONES					NETO A PAGAR	OBSERVACIONES	RECIBI CONFORME
CÓD	No.	NOMBRE DEL EMPLEADO	APELLIDO DEL EMPLEADO	CÉDULA	CARGO	SALARIO	DÍAS	BÁSICO	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	AUXILIO DE ALIMENTACIÓN Y VIVIENDA	AUXILIO DE RODAMIENTO	AUXILIO DE VIVIENDA	TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSIÓN	OTROS DESCUENTOS	ESCUENTOS JUDICIALES	TOTAL DEDUCIDO			
5	5	SANTIAGO	BERNARDEZ GARCIA	1.094.970.887	TOPOGRAFO	$ 4.000.000	15	$ 2.000.000	$ 124.548	$ 800.000	$ 200.000	$ 380.000	$ 3.704.548	$ 80.000	$ 80.000			$ 160.000	$ 3.544.548		
6	2	MANUEL FERNANDO	SALAZAR GONZALEZ	1.053.794.998	ING. RESIDENTE	$ 5.000.000	15	$ 2.500.000	$ 0	$ 975.000	$ 250.000	$ 475.000	$ 4.200.000	$ 100.000	$ 100.000			$ 200.000	$ 4.000.000		
7	7	ADRIANA CAROLINA	RODRIGUEZ MORA	1.094.758.226	RESIDENTE AMBIENTAL	$ 3.750.905	15	$ 1.875.453	$ 124.548	$ 500.000	$ 60.000	$ 1.200.000	$ 3.760.000	$ 75.000	$ 75.000			$ 150.000	$ 3.610.000		
8	8	EDWIN FERNEY	PINZON PINZON	1.061.691.971	RESIDENTE SOCIAL	$ 3.500.000	15	$ 1.750.000	$ 124.548	$ 240.000	$ 90.000	$ 144.000	$ 2.348.548	$ 70.000	$ 70.000			$ 140.000	$ 2.208.548		
15	15	GABRIELA LUCIA	MARTINEZ AMAYA	1.005.319.981	ING. RESIDENTE Alte	$ 4.800.000	15	$ 2.400.000	$ 0	$ 225.000	$ 90.000	$ 225.000	$ 2.940.000	$ 96.000	$ 96.000			$ 192.000	$ 2.748.000		
17	6	YULIANA	NARVAEZ VALENCIA	24.941.524	RESIDENTE SST	$ 4.800.000	15	$ 2.400.000	$ 124.548	$ 225.000	$ 90.000	$ 135.000	$ 2.974.548	$ 96.000	$ 96.000			$ 192.000	$ 2.782.548		
TOTALES								$ 10.075.453	$ 3.638.605	$ 3.191.000	$ 15.270.348	$ 15.090.048	$ 14.518.552	$ 813.910	$ 406.955			$ 13.704.644	$ 17.890.734		



Observaciones	
NÓMINA ADMINISTRATIVA	
Elaborado Por:	Revisado Por:
MANUEL FERNANDO SALAZAR	MAURICIO A. CORTES

TABLA DE SALARIOS		
Salario Mínimo	2026	$ 1.750.905
Auxilio de Transporte	2026	$ 249.095
NÓMINA DE EMPLEADOS ADMINISTRATIVA		

CONSORCIO HORIZONTE AZUL
NIT. 902.006.571-3

MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS-ALTO EL PAISA, MUNICIPIO DE PALESTINA, EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS

PERIODO DE PAGO

DESDE: 01-may-20	HASTA: 15-may-20
NUMERO DE DIAS LABORADOS	15
FECHA DE PAGO	21-may-20

DATOS DEL EMPLEADO					DEVENGADO							DEDUCCIONES					NETO A PAGAR	RECIBI CONFORME	OBSERVACIONES
NOMBRE DEL EMPLEADO	APELLIDO DEL EMPLEADO	CEDULA	CARGO	SALARIO	DIAS	BASICO	HORAS EXTRAS	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	AUXILIO DE ALIMENTACION Y VIVIENDA	AUXILIO DE RODAMIENTO	AUXILIO DE VIVIENDA	TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSION	OTROS DESCUENTOS	DESCUENTOS JUDICIALES	TOTAL DEDUCIDO			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	CONTRATISTA	$ 1.750.905	15	$ 875.453	$ 24.871	$ 171.549	$ 12.439	$ 4.974	$ 7.461	$ 1.024.870	$ 16.033	$ 16.033			$ 32.065	$ 992.805	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	CONTRATISTA	$ 1.750.905	15	$ 875.453	$ 9.968	$ 124.549	$ 4.984	$ 1.992	$ 2.988	$ 1.019.944	$ 15.416	$ 15.416			$ 31.832	$ 988.112	
TOTALES						$ 1.750.905	$ 34.839	$ 240.099	$ 17.423	$ 6.966	$ 10.446	$ 2.034.813	$ 71.429	$ 71.429	$ 0	$ 0	$ 147.856	$ 1.880.961		

Observaciones

Elaborado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:
MANUEL F SALAZAR GONZÁLEZ	MAURICIO A. CORTES REINA	

TABLA DE SALARIOS		
Salario Mínimo	2020	$ 1.750.905
Auxilio de Transporte	2020	$ 249.095
NOMINA DE EMPLEADOS OPERATIVA		

HONORARIO AZUL
NIT. 901.737.988-0

MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS-ALTO EL PAVA, MUNICIPIO DE PALESTINA, EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS

PERIODO DE PAGO

16-may-26 | 31-may-26

PERIODO LIQUIDADO

16-may-26 | 30-may-26

DATOS DEL EMPLEADO							DEVENGADO							DEDUCCIONES					NETO A PAGAR	RECIBI CONFORME	OBSERVACIONES
CÓD	No	NOMBRE DEL EMPLEADO	APELLIDO DEL EMPLEADO	CÉDULA	CARGO	SALARIO	DÍAS	BÁSICO	HORAS EXTRAS	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	AUXILIO DE ALIMENTACIÓN Y VIVIENDA	AUXILIO DE ALOJAMIENTO	AUXILIO DE VIVIENDA	TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSIÓN	OTROS DESCUENTOS	DESCUENTOS JUDICIALES	TOTAL DEDUCIDO			
[illegible]	[illegible]	MARIELA	MONTES MOSQUERA	1.063.626.588	CONTRATO OBRA	$ 1.750.905	15,0	$ 875.453	$ 8.974	$ 324.548	$ 7.487	$ 993	$ 1.492	$ 1.009.934	$ 35.217	$ 35.217			$ 70.434	$ 939.500	X Manuela M
[illegible]	[illegible]	[illegible]	ZAPATA MARIN	1.063.629.068	CONTRATO OBRA	$ 1.750.905	15,0	$ 875.453	$ 8.974	$ 324.548	$ 8.174	$ 1.990	$ 2.984	$ 1.009.978	$ 35.418	$ 35.418			$ 70.837	$ 939.336	C.C. 1.063.629.068
TOTALES								$ 1.750.905	$ 17.948	$ 649.095	$ 15.661	$ 2.984	$ 4.477	$ 2.019.912	$ 70.635	$ 70.635	$ 0	$ 0	$ 141.271	$ 1.878.836	

Observaciones

NÓMINA OPERATIVA

Elaborado Por	Revisado Por	Aprobado Por
MARIBEL F SALAZAR GONZÁLEZ	MAURICIO A. CORTES REINA	

TABLA DE SALARIOS		
Salario Mínimo	2026	$ 1.750.905
Auxilio de Transporte	2026	$ 249.095
NÓMINA DE EMPLEADOS OPERATIVA		

CONSORCIO HORIZONTE AZUL
NIT. 902.006.572-3

PERIODO DE PAGO

15-may-26 | 30-may-26

FECHA DE LIQUIDACION

28-may-26

MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS ALTO EL PAGA, MUNICIPIO DE PALESTINA, EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS

DATOS DEL EMPLEADO						DEVENGADO							DEDUCCIONES					NETO A PAGAR	RECIBI CONFORME	OBSERVACIONES
No.	NOMBRE DEL EMPLEADO	APELLIDO DEL EMPLEADO	CÉDULA	CARGO	SALARIO	DÍAS	BÁSICO	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	AUXILIO DE ALIMENTACIÓN	AUXILIO DE RODAMIENTO	AUXILIO DE VIVIENDA	TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSION	OTROS DESCUENTOS	DESCUENTOS JUDICIALES	TOTAL DEDUCIDO			
1	ALEJANDRO ANTONIO	ALZATE VERA	75.09[illegible].633	MAESTRO	$ 4.000.000	15,0	$ 2.000.000	$ 0	$ 287.374	$ 114.930	$ 142.864	$ 2.545.168	$ 90.000	$ 80.000			$ 267.000	$ 1.414.548		
2	JHONNIER EDISON	ZAPATA MARIN	1.047.4[illegible]	CEBADOR	$ 1.750.905	15,0	$ 875.453	$ 124.548	$ 175.093	$ 70.036	$ 100.084	$ 1.350.181	$ 37.430	$ 37.430			$ 334.860	$ 1.235.321		CEBADOR ACOPLANC CONFIRMAR NTC
3	JAIME DE JESUS	CARDONA GIRALDO	1.051.625.282	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905	15,0	$ 875.453	$ 124.548	$ 149.926	$ 59.970	$ 85.677	$ 1.295.575	$ 40.371	$ 40.371			$ 91.095	$ 1.204.355		
4	JOSÉ REINEL	NUÑEZ MARULANDA	1.054.599.448	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905	15,0	$ 875.453	$ 124.548	$ 35.000	$ 14.000	$ 20.000	$ 1.069.001	$ 35.018	$ 35.018			$ 70.036	$ 959.964		
5	[illegible] OSSIP	VILLADA ZAPATA	1.152.764.480	OFICIAL	$ 2.091.300	15,0	$ 1.045.650	$ 124.548	$ 165.000	$ 66.000	$ 93.000	$ 1.500.198	$ 41.822	$ 41.822			$ 83.644	$ 1.416.454		
6	JOSE RAFAEL	ALVAREZ DONADO	92.534.531	AYUDANTE	$ 1.750.905	15,0	$ 875.453	$ 124.548	$ 175.093	$ 70.036	$ 100.084	$ 1.350.181	$ 37.430	$ 37.430			$ 334.860	$ 1.235.321		
7	JHON WILSON	ROCHEQUE VARGAS	75.087.042	CONDUCTOR	$ 1.750.905	15,0	$ 875.453	$ 124.548	$ 94.718	$ 37.886	$ 54.102	$ 1.189.432	$ 29.595	$ 29.595			$ 78.790	$ 1.110.642		
8	JHOVANNY	VILLA	1.054.465.808	AYUDANTE	$ 1.750.905	15,0	$ 875.453	$ 124.548	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.000.000	$ 35.018	$ 35.018			$ 70.036	$ 929.964		
9	DIEGO ALONSO	VILLADA CASTAÑO	1.051.625.067	AYUDANTE	$ 1.750.905	15,0	$ 875.453	$ 124.548	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.000.000	$ 35.018	$ 35.018			$ 70.036	$ 929.964		
10	JOHN FRED	VEGA ZAPATA	10.938.148	OFICIAL	$ 2.091.300	15,0	$ 1.045.650	$ 124.548	$ 165.000	$ 66.000	$ 93.000	$ 1.500.198	$ 41.822	$ 41.822			$ 83.644	$ 1.416.454		
11	LUIS FELIX	LOPEZ ESPITIA	1.012.323.019	OFICIAL	$ 2.091.300	15,0	$ 1.045.650	$ 124.548	$ 209.112	$ 83.644	$ 116.468	$ 1.588.718	$ 41.822	$ 41.822			$ 87.644	$ 1.501.074		
12	MARCEL DE JESUS	PADILLA MURILLO	15.039.452	OPERADOR EXCAVADORA	$ 2.000.000	15,0	$ 1.000.000	$ 124.548	$ 188.350	$ 75.300	$ 112.050	$ 1.500.248	$ 40.000	$ 40.000			$ 80.000	$ 1.421.048		
13	MILTON	HERNANDEZ BUITRAGO	1.104.694.351	OFICIAL	$ 2.091.300	15,0	$ 1.045.650	$ 124.548	$ 165.000	$ 66.000	$ 93.000	$ 1.500.198	$ 41.822	$ 41.822			$ 83.644	$ 1.416.454		
14	ALEXANDRE	SUAREZ CEBALLOS	1.893.118	AYUDANTE	$ 1.750.905	15,0	$ 875.453	$ 124.548	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.000.000	$ 35.018	$ 35.018			$ 70.036	$ 929.964		
15	GUSTAVO	LONDOÑA ROSADA	1.053.329.337	AYUDANTE	$ 1.750.905	15,0	$ 875.453	$ 124.548	$ 175.093	$ 70.036	$ 100.084	$ 1.350.181	$ 37.430	$ 37.430			$ 334.860	$ 1.233.761		
16	LUIS FERNEY	ZAPATA PEREZ	1.057.[illegible].964	AYUDANTE	$ 1.750.905	15,0	$ 875.453	$ 124.548	$ 175.093	$ 70.036	$ 100.084	$ 1.350.181	$ 37.430	$ 37.430			$ 300.860	$ 1.249.439		
17	CARLOS ENRIQUE	GONZALEZ CORREA	1.158.912.[illegible]	AYUDANTE	$ 1.750.905	15,0	$ 875.453	$ 124.548	$ 90.180	$ 36.000	$ 54.000	$ 1.180.000	$ 35.018	$ 35.018			$ 70.036	$ 1.109.964		
18	CRISTIAN CAMILO	HURTADO ARAYA	1.110.545.747	CADENERO	$ 2.200.000	15,0	$ 1.100.000	$ 124.548	$ 191.000	$ 76.400	$ 114.600	$ 1.606.548	$ 44.000	$ 44.000			$ 88.000	$ 1.518.548		Envio el 06 de mayo
19	ALEX FERNANDO	VILLADA DIAZ	1.151.[illegible].820	ALMACENISTA	$ 2.000.000	15,0	$ 1.000.000	$ 124.548	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.424.548	$ 52.000	$ 52.000			$ 104.000	$ 1.320.548		Envio el 08 de mayo
20	JUAN SEBASTIAN	MUÑOZ TORO	1.154.[illegible].833	AYUDANTE	$ 1.750.910	12,0	$ 700.364	$ 99.638	$ 0	$ 0	$ 0	$ 800.002	$ 29.015	$ 29.015			$ 58.030	$ 743.972		Envio el 12 de mayo
21	JOSE FERLEY	PAEZ VERA	1.193.040.284	AYUDANTE	$ 1.750.910	15,0	$ 875.455	$ 124.548	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.000.003	$ 35.018	$ 35.018			$ 70.036	$ 929.966		Envio el 12 de mayo
22	RICARDO ARTURO	SAAVEDRA GUTIERREZ	71.[illegible].766	AYUDANTE	$ 1.750.910	15,0	$ 875.455	$ 124.548	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.000.003	$ 35.018	$ 35.018			$ 70.036	$ 929.966		Envio el 12 de mayo
23	JHON JAIRO	AGUDELO HERNANDEZ	1.152.[illegible].993	CONDUCTOR	$ 2.[illegible].000	8,0	$ 930.000	$ 99.619	$ 80.000	$ 32.000	$ 48.000	$ 1.189.619	$ 16.000	$ 16.000			$ 32.000	$ 977.619		
TOTALES							$ 22.063.452	$ 2.640.407	$ 2.439.837	$ 999.935	$ 1.499.902	$ 29.703.533	$ 982.188	$ 982.188	$ 0	$ 0	$ 1.964.376	$ 27.739.160		

Observaciones		
	NÓMINA OPERATIVA	
Elaborado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:
MANUEL F SALAZAR GONZALEZ	MAURICIO A. CORTES REINA	

TABLA DE SALARIOS			
Salario Mínimo		2.026	$ 1.750.905
Auxilio de Transporte		2.026	$ 249.095
	0		

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900806571	3	CONSORCIO HORIZONTE AZUL	6 - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO HORIZONTE AZUL	CARRERA 24 30 08	MANIZALES-CALDAS	8849348	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	299140344	9504571846	E	2026/05/20	2026/05/11	BANCO DAVIVIENDA	0	$15,869,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO Identificacion		Nombre	NOVEDADES ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	PENSION Codigo	Dias	IBC	Aporte	SALUD Codigo	Dias	IBC	Aporte	CCF Codigo	Dias	IBC	Aporte	RIESGOS Codigo	Dias	IBC	Aporte	PARAFISCALES Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	93534533	ALVAREZ DONADO JOSE RAFAEL																		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF11	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
2	CL	105-999448	BUENO MARILANDA JOYE REINEL																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF11	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
3	CL	1061625282	CARMONA GIRALDO JAIME DE JESUS																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF11	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
4	CC	1024461399	GALVEZ BEDOYA ALEJANDRO		X															X	230201	26	$1,517,451	$242,800	EPS010	26	$1,517,451	$60,700	CCF11	26	$1,721,723	$68,900	14-23	26	$1,517,451	$105,700	26	$0	$0	SI	$478,100
5	CC	1059912052	GONZALEZ GONZALEZ CARLOS ANDRES	X																	230301	9	$525,272	$84,100	EPS037	9	$525,272	$21,100	CCF11	9	$525,272	$21,100	14-23	9	$525,272	$36,600	9	$0	$0	SI	$162,900
6	CC	1061135571	HENAO HENAO ERIKA GERALDINE																		230201	30	$3,300,000	$528,000	EPS005	30	$3,300,000	$132,000	CCF11	30	$3,300,000	$132,000	14-23	30	$3,300,000	$229,700	30	$0	$0	SI	$1,021,700
7	CC	1124694351	HERNANDEZ BUSTAMANTE MILTON	X																	230201	18	$1,254,660	$200,800	EPS037	18	$1,254,660	$50,200	CCF11	18	$1,254,660	$50,200	14-23	18	$1,254,660	$87,400	18	$0	$0	SI	$388,600
8	CC	1034972887	HERNANDEZ MANOR SANTIAGO																		230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS010	30	$3,000,000	$120,000	CCF11	30	$3,000,000	$120,000	14-23	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0	SI	$928,800
9	CC	1057758901	JARAMILLO JARAMILLO DEIBER ADRIAN		X															X	25-14	16	$933,816	$149,500	EPS037	16	$933,816	$37,400	CCF11	16	$1,006,770	$40,300	14-23	16	$933,816	$65,000	16	$0	$0	SI	$292,200
10	CC	94529317	LOAIZA POSADA GEOVANNY	X																	25-14	16	$933,816	$149,500	EPS037	16	$933,816	$37,400	CCF11	16	$933,816	$37,400	14-23	16	$933,816	$65,000	16	$0	$0	SI	$289,300
11	CC	1053771655	LONDOÑO GIL MAYRA ALEJANDRA																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF11	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
12	CC	1072523019	LOPEZ ESPITIA JOSE FELIX	X																	231001	24	$1,672,880	$267,700	EPS037	24	$1,672,880	$67,000	CCF11	24	$1,672,880	$67,000	14-23	24	$1,672,880	$116,500	24	$0	$0	SI	$518,200
13	CL	1006119381	MARTINEZ AMAYA GABRIELA LUCIA																		230201	30	$3,800,000	$608,000	EPS041	30	$3,800,000	$152,000	CCF11	30	$3,800,000	$152,000	14-23	30	$3,800,000	$264,500	30	$0	$0	SI	$1,176,500
14	CC	1061626161	MEJIA RAMIREZ VALENTINA																		231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF11	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
15	CC	75097619	MUÑOZ VERA ALEXANDER ANTONIO																		25-14	30	$4,000,000	$640,000	EPS002	30	$4,000,000	$160,000	CCF11	30	$4,000,000	$160,000	14-23	30	$4,000,000	$278,400	30	$0	$0	SI	$1,238,400
16	CC	24344324	NARVAEZ VALENCIA YULIANA																		230201	30	$3,300,000	$528,000	EPS010	30	$3,300,000	$132,000	CCF11	30	$3,300,000	$132,000	14-23	30	$3,300,000	$229,700	30	$0	$0	SI	$1,021,700
17	CC	15591432	PADILLA MURILLO WALTER DE JESUS	X																	230301	18	$1,200,000	$192,000	EPS037	18	$1,200,000	$48,000	CCF11	18	$1,200,000	$48,000	14-23	18	$1,200,000	$83,600	18	$0	$0	SI	$371,600
18	CC	75104876	RAMIREZ CORRALES ROBERTO CARLOS	X	X															X	230301	6	$440,000	$70,400	EPS002	6	$440,000	$17,600	CCF11	6	$488,333	$18,400	14-23	6	$440,000	$30,700	6	$0	$0	SI	$137,100
19	CC	1098758226	RODRIGUEZ MORA ADRIANA CAROLINA																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF11	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
20	CC	75077442	RODRIGUEZ VARGAS JHON WILSON																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF11	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
21	CC	1053794998	SALAZAR GONZALEZ MANUEL FERNANDO																		25-14	30	$5,000,000	$800,000	EPS010	30	$5,000,000	$200,000	CCF11	30	$5,000,000	$200,000	14-23	30	$5,000,000	$348,000	30	$0	$0	SI	$1,548,000
22	CL	9893198	SUAREZ CERALLOS JACOBADES	X																	25-14	16	$933,816	$149,500	EPS037	16	$933,816	$37,400	CCF11	16	$933,816	$37,400	14-23	16	$933,816	$65,000	16	$0	$0	SI	$289,300
23	CL	79938643	VEGA ZAPATA JOHN FREY																		230201	30	$2,091,100	$334,600	EPS037	30	$2,091,100	$83,700	CCF11	30	$2,091,100	$83,700	14-23	30	$2,091,100	$145,600	30	$0	$0	SI	$647,600
24	CC	1054865838	VILLA JHON BARON																		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF11	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
25	CC	1061625667	VILLADA CASTAÑO DIEGO ALONSO																		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF11	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
26	CC	1059784489	VILLADA ZAPATA JULIO CESAR																		230301	30	$2,091,100	$334,600	EPS005	30	$2,091,100	$83,700	CCF11	30	$2,091,100	$83,700	14-23	30	$2,091,100	$145,600	30	$0	$0	SI	$647,600
27	CC	1024769?	ZAPATA MARIN JHONFER EDILSON																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS001	30	$1,750,905	$70,100	CCF11	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
28	CC	9957664	ZAPATA PEREZ LUIS FERNEY	X																	230301	16	$933,816	$149,500	EPS001	16	$933,816	$37,400	CCF11	16	$933,816	$37,400	14-23	16	$933,816	$65,000	16	$0	$0	SI	$289,300
Total	**Afiliados(28)**																						$54,436,777	$8,711,000			$54,436,777	$2,178,600			$54,732,338	$2,190,500			$54,436,777	$3,789,800		$0	$0		$16,869,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901066571	3	CONSORCIO HORIZONTE AZUL	6 - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO HORIZONTE AZUL	CARRERA 24 20 08	MANIZALES-CALDAS	8843348	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	299140344	9504971846	E	2026/05/20	2026/05/11	BANCO DAVIVIENDA	0	$16,869,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				28	$8,711,000	$0	$0	$8,711,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$547,900	$0	$0	$547,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	$2,448,900	$0	$0	$2,448,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	$3,046,200	$0	$0	$3,046,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$2,668,000	$0	$0	$2,668,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				28	$3,789,800	$0	$0	$3,789,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	28	$3,789,800	$0	$0	$3,789,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				28	$2,190,500	$0	$0	$2,190,500
COMFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	28	$2,190,500	$0	$0	$2,190,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				28	$2,178,600	$0	$0	$2,178,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	$582,800	$0	$0	$582,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	10	$522,400	$0	$0	$522,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$292,200	$0	$0	$292,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	7	$495,400	$0	$0	$495,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$285,800	$0	$0	$285,800
TOTAL				28	$16,869,900	$0	$0	$16,869,900

GOBIERNO DE CALDAS

ACTA NRO TRES (03) PARCIAL AL CONTRATO DE OBRA NRO. 29112025-1755
RADICADO SECRETARIA JURIDICA Nro. 29112025-1755

Secretaría : INFRAESTRUCTURA

Fecha acta lunes, 1 de junio de 2026

Concepto	Descripción			
No. Radicado Contrato de Obra	29112025-1755	Acta Administrativa:	N/A	
No. Pedido en SAP:	4500029090			
NIT o RUT:	900306571-3			
Contratista:	CONSORCIO HORIZONTE AZUL			
Representante Legal:	LUIS ALBERTO MEZA GALEANO			
Valor del Contrato ($):	$ 15.179.416.313,50	Aporte Departamento	$ 15.179.416.313,50	
Valor Adición	$ 0,00	Aporte otras entidades	N/A	
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS K0+100 - K2+540			
Disponibilidad presupuesta	3500046155	FONDO	7RFR0388	
Duración del contrato (Plazo):	DOCE (12) MESES A PARTIR DE LA ACTA DE INICIO			
Fecha de iniciación	23 de enero de 2026	Fecha de terminación:	22 de enero de 2027	
Supervisor Departamento	JORGE HERNAN NEIRA DIAZ			

OBRA EJECUTADA SEGÚN CONTRATO

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTIC.					
1	210.1.1			EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	0,00	27.748,50	0,00
2	210.2.1			EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	0,00	53.518,40	0,00
3	220.1P			TERRAPLENES CONFORMADOS CON SUELO (MATERIAL SELECCIONADO PARA RELLENO)	m3	0,00	45.500,00	0,00
4	201.7			DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	m3	15,00	287.172,60	4.307.589,00
5	201.8			DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RIGIDOS Y FLEXIBLES	m2	48,60	15.600,00	761.280,00
6	450.2P			MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 - COMPRA DE MEZCLA	m3	0,00	1.163.500,00	0,00
7	420.2			RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-57	m2	0,00	5.850,00	0,00
8	330.2.1			BASE GRANULAR CLASE B	m3	0,00	204.852,70	0,00
9	320.2.2			SUB-BASE GRANULAR CLASE B	m3	71,92	175.125,60	12.591.531,00
10	311.1			AFIRMADO	m3	0,00	87.490,00	0,00
11	600.1.1			EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	1.481,90	114.400,00	169.529.360,00
12	600.2.1			EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO	m3	119,30	195.270,40	23.100.488,00
13	610.1			RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	m3	35,90	131.982,50	4.738.172,00
14	201.15			REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS	m	63,90	215.312,50	13.758.469,00
15	630.1.3.2			CONCRETO DE RESISTENCIA 28MPa - COMPRA DE MEZCLA	m3	16,60	1.029.442,70	17.088.749,00
16	630.1.4.2			CONCRETO DE RESISTENCIA 21MPa - COMPRA DE MEZCLA	m3	3,10	1.109.132,70	3.438.311,00
17	630.1.6			CONCRETO DE RESISTENCIA14MPa - MEZCLA IN SITU	m3	1,10	640.074,50	704.082,00
18	640.1			ACERO DE REFUERZO fy = 4200MPa	kg	2.376,10	8.395,40	19.948.310,00
19	311.1			AFIRMADO	m3	0,00	87.490,00	0,00
20	663.1			TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC NORMA NTC-5055, DE DIÁMETRO INTERNO 900 mm	m	73,50	1.280.464,60	94.114.148,00
21	663.1.2			TUBERÍA DE PVC 4" PARA FILTROS	m	16,00	34.160,10	546.562,00
22	673.1.1			GEOTEXTIL TIPO NT 2500	m2	56,00	7.482,80	419.037,00
23	673.2			MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3	11,90	132.600,00	1.577.940,00
24	601.6P			JUNTA DE CONSTRUCCIÓN CINTA PVC	m	16,00	73.972,60	1.183.562,00
25	670.5			DISIPADORES DE ENERGIA Y SEDIMENTADORES DE CONCRETO CICLOPEO	m3	0,00	602.635,80	0,00
26	600.1.1			EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	0,00	114.400,00	0,00
27	600.2.1			EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO	m3	0,00	195.270,40	0,00
28	610.1			RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	m3	0,00	131.982,50	0,00
29	630.1.3.2			CONCRETO DE RESISTENCIA 28MPa - COMPRA DE MEZCLA	m3	0,00	1.029.442,70	0,00
30	630.1.6			CONCRETO DE RESISTENCIA14MPa - MEZCLA IN SITU	m3	0,00	640.074,50	0,00
31	640.1			ACERO DE REFUERZO fy = 4200MPa	kg	0,00	8.395,40	0,00

GOBIERNO DE CALDAS

ACTA NRO TRES (03) PARCIAL AL CONTRATO DE OBRA NRO. 29112025-1755
RADICADO SECRETARIA JURIDICA Nro. 29112025-1755

Secretaría : INFRAESTRUCTURA

Fecha acta lunes, 1 de junio de 2026

Concepto	Descripción			
No. Radicado Contrato de Obra	29112025-1755	Acto Administrativo:	N/A	
No. Pedido en SAP	4500029290			
NIT o RUT	902006571-3			
Contratista	CONSORCIO HORIZONTE AZUL			
Representante Legal:	LUIS ALBERTO MEZA GALEANO			
Valor del Contrato ($):	$ 15.179.416.313,50	Aporte Departamento	$ 15.179.416.313,50	
Valor Adición	$ 0,00	Aporte otras entidades	N/A	
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS KD+100 - K2+540			
Disponibilidad presupuestal	3530046155	FONDO	7RFR0388	
Duración del contrato (Plazo):	DOCE (12) MESES A PARTIR DE LA ACTA DE INICIO			
Fecha de iniciación	23 de enero de 2026	Fecha de terminación		22 de enero de 2027
Supervisor Departamento	JORGE HERNAN NEIRA DIAZ			

32	673.2			MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3	0,00	132.600,00	0,00
33	663.1.4			TUBERÍA DE PVC 3"	m	0,00	32.656,60	0,00
34	663.1.2			TUBERÍA DE PVC 4" PARA FILTROS	m	0,00	34.160,10	0,00
35	601.8P			JUNTA DE CONSTRUCCIÓN CINTA PVC	m	0,00	73.972,60	0,00
36	673.1.1			GEOTEXTIL TIPO NT 2500	m2	0,00	7.482,80	0,00
37	600.1.1			EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	0,00	114.400,00	0,00
38	600.2.1			EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO	m3	0,00	195.270,40	0,00
39	610.1			RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	m3	0,00	131.982,50	0,00
40	630.1.4.2			CONCRETO DE RESISTENCIA 21MPa - COMPRA DE MEZCLA	m3	0,00	1.109.132,70	0,00
41	673.2			MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3	0,00	132.600,00	0,00
42	663.1.4			TUBERÍA DE PVC 3"	m	0,00	32.656,60	0,00
43	673.1.2P			GEOTEXTIL TIPO NT 1600	m2	0,00	8.862,10	0,00
44	681.1			GAVIONES O COLCHOGAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO ESTILO 1 RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO)	m3	0,00	352.523,60	0,00
45	640.2			MALLA DE REFUERZO fy = 420 MPa	kg	0,00	9.259,90	0,00
46	311.1			AFIRMADO	m3	0,00	87.490,00	0,00
47	700.1			LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	m	0,00	3.616,60	0,00
48	700.3			MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO	m2	0,00	52.898,10	0,00
49	701.1.1			TACHA REFLECTIVA CON ADHESIVO BITUMINOSO Y/O TERMOPLÁSTICO	u	0,00	12.915,50	0,00
50	710.1.1			SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR, SP Y/O SI, DIMENSIONES 75x75CM CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV	u	0,00	1.216.225,40	0,00
51	710.1.5			SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SP-75 DIMENSIONES 75x60CM CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV	u	0,00	968.061,90	0,00
52	672.4			BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO, INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO. BORDILLO DE 0.15Mx0.4M DE ÁREA	m	0,00	78.175,50	0,00
53	500.1.1			PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO	m3	0,00	1.048.749,00	0,00
54	320.2.2			SUB-BASE GRANULAR CLASE B	m3	0,00	175.125,60	0,00
55	632.1.3P			BARANDA PEATONAL SEGÚN DISEÑO	m	0,00	801.292,70	0,00
56	510.1.2P			LOSETA TÁCTIL GUÍA PREFABRICADA EN CONCRETO DE 0.40x0.40x0.06	m2	0,00	114.376,60	0,00
57	900.2.1			TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3 - Km	0,00	1.510,40	0,00
							VALOR TOTAL INCLUIDO AU DEL 30% (ADMINISTRACION: 25% - U: 5%)	**$ 367.807.590,00**

MAYORES CANTIDADES DE OBRA

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTIC.					
							VALOR TOTAL INCLUIDO AU DEL 30% (ADMINISTRACION: 25% - U: 5%)	**$ 0,00**

GOBIERNO DE CALDAS

ACTA NRO TRES (03) PARCIAL AL CONTRATO DE OBRA NRO. 29112025-1755
RADICADO SECRETARIA JURIDICA Nro. 29112025-1755

Secretaria : INFRAESTRUCTURA

Fecha acta lunes, 1 de junio de 2026

Concepto	Descripción			
No. Radicado Contrato de Obra	29112025-1755	Acto Administrativo	N/A	
No. Pedido en SAP	4500029290			
NIT o RUT:	902006571-3			
Contratista:	CONSORCIO HORIZONTE AZUL			
Representante Legal:	LUIS ALBERTO MEZA GALEANO			
Valor del Contrato ($):	$ 15.179.416.313,50	Aporte Departamento	$ 15.179.416.313,50	
Valor Adición	$ 0,00	Aporte otras entidades	N/A	
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS K0+100 - K2+540			
Disponibilidad presupuesta	3500046155	FONDO	7RFR0388	
Duración del contrato (Plazo)	DOCE (12) MESES A PARTIR DE LA ACTA DE INICIO			
Fecha de iniciación	23 de enero de 2026	Fecha de terminación	22 de enero de 2027	
Supervisor Departamento	JORGE HERNAN NEIRA DIAZ			

OBRA ADICIONAL NO PREVISTA

N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTIC.					
58	INP 1			AHUYENTAMIENTO, RESCATE Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE EN 2,44 KILÓMETROS DE LA VÍA TRES PUERTAS - LA ROCHELA	GI	0,50	33.972.120,00	16.986.060,00
59	INP 2			TALA DE ARBOL (ARBOL DE 1,0-5,00 M ALTURA (1 < h <= 5) , DAP > 0,10 M). INCLUYE CORTE PARTE AÉREA Y RADICULAR, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL VEGETAL	UND	11,00	572.728,00	6.300.008,00
60	INP 3			TALA DE ARBOL (ARBOL DE 5,0-10,0 M ALTURA (5 < h <= 10), DAP > 0,10 M). INCLUYE CORTE PARTE AÉREA Y RADICULAR, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL VEGETAL	UND	98,00	877.728,00	86.017.344,00
61	INP 4			TALA DE ARBOL (ARBOL DE 10,0-15,0 M ALTURA (10 < h <= 15), DAP > 0,10 M). INCLUYE CORTE PARTE AÉREA Y RADICULAR, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL VEGETAL	UND	87,00	1.266.927,00	110.264.049,00
62	INP 5			TALA DE ARBOL (ARBOL DE 15,0-20,0 M ALTURA (15 < h <= 20), DAP > 0,10 M). INCLUYE CORTE PARTE AÉREA Y RADICULAR, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL VEGETAL	UND	26,00	1.819.712,00	47.312.512,00
63	INP 6			TALA DE ARBOL (ARBOL DE > 20,0 M ALTURA, DAP > 0,10 M). INCLUYE CORTE PARTE AÉREA Y RADICULAR, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL VEGETAL	UND	2,00	3.498.535,00	6.997.070,00
64	INP 7			REMOCION DE CERCAS DE ALAMBRE	ml	0,00	7.154,00	0,00
65	INP 8			DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA	m2	57,40	4.842,00	277.931,00
66	INP 9			CERCA DE ALAMBRE DE PUAS CON POSTES DE MADERA (GUADUA, 5 HILOS)	ml	0,00	31.230,00	0,00
67	INP 10			MATERIAL MIXTO - (MATERIAL DE CANTERA + MATERIAL DE RIO SELECCIONADO)	m3	1.364,90	169.589,00	231.472.026,00
68	INP 11			GEOMALLA PARA REFUERZO DE CAPAS GRANULARES (Analizado para GEOMALLA BIAXIAL EN POLIÉSTER DE ALTA TENACIDAD - FORGRID RX 30)	m2	0,00	17.624,00	0,00
69	INP 12			CORTE PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	ml	50,60	18.443,00	933.216,00
70	INP 13			BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE B	m3	0,00	237.619,00	0,00
71	INP 14			MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA BACHEO TIPO MDC-19	m3	0,00	1.339.010,00	0,00
72	INP 15			RESCATE Y TRASLADO DE LA FLORA EPÍFITA VASCULAR EN VEDA NACIONAL	Und	732,00	81.789,00	59.869.548,00
73	INP 16			AHUYENTAMIENTO, RESCATE Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE PRESENTE EN LOS ARBOLES AISLADOS DEL PROYECTO VÍA TRES PUERTAS - LA ROCHELA BAJO EL PROTOCOLO DE MANEJO Y CONTINGENCIA DE FAUNA SILVESTRE SOLICITADO EN LA RESOLUCIÓN DE CORPOCALDAS No 2026-0544	GI	1,00	26.998.962,00	26.998.962,00
							VALOR TOTAL INCLUIDO AU DEL 30% (ADMINISTRACION: 25% - U: 5%)	**$ 596.239.626,00**

PRESUPUESTO PGIO - PMT

N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTIC.					
				PALETEROS	Persona	4,00	2.576.535,00	10.306.140,00
				SEÑAL INICIO DE OBRA	Unidad	0,00	140.000,00	0,00
				SEÑAL FIN DE OBRA	Unidad	0,00	140.000,00	0,00
				SEÑAL TRABAJOS EN LA VÍA X 60 CM	Unidad	0,00	120.000,00	0,00
				SEÑAL ANGOSTAMIENTO A LA DERECHA X 60 CM	Unidad	0,00	120.000,00	0,00
				SEÑAL ANGOSTAMIENTO A LA IZQUIERDA X 60 CM	Unidad	0,00	120.000,00	0,00
				SEÑAL AUXILIAR DE TRANSITO X 50 CM	Unidad	0,00	120.000,00	0,00
				SEÑAL MAQUINARIA EN LA VÍA X 50 CM	Unidad	0,00	120.000,00	0,00

GOBIERNO DE CALDAS

ACTA NRO TRES (03) PARCIAL AL CONTRATO DE OBRA NRO. 29112025-1755
RADICADO SECRETARIA JURIDICA Nro. 29112025-1755

Secretaria : INFRAESTRUCTURA

Fecha acta lunes, 1 de junio de 2026

Concepto	Descripción			
No. Radicado Contrato de Obra	29112025-1755	Acto Administrativo	N/A	
No. Pedido en SAP:	4500029090			
NIT o RUT	902006571-3			
Contratista	CONSORCIO HORIZONTE AZUL			
Representante Lega	LUIS ALBERTO MEZA GALEANO			
Valor del Contrato ($)	$ 15.179.416.313,50	Aporte Departamento	$ 15.179.416.313,50	
Valor Adición	$ 0,00	Aporte otras entidades	N/A	
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS KD+100 - K2+540			
Disponibilidad presupuestal	350004155	FONDO	7RFR0388	
Duración del contrato (Plazo)	DOCE (12) MESES A PARTIR DE LA ACTA DE INICIO			
Fecha de iniciación	23 de enero de 2026	Fecha de terminación		22 de enero de 2027
Supervisor Departamento	JORGE HERNAN NEIRA DIAZ			

				SEÑAL BARRICADA	Unidad	0,00	400.000,00	0,00
				SEÑAL BOMBONES	Unidad	40,00	35.000,00	1.400.000,00
				SEÑALIZACIÓN CON CINTA DE DEMARCACIÓN	m	475,70	450,00	214.065,00
				APROXIMACION OBRA EN LA VIA	Unidad	0,00	150.000,00	0,00
				DESVIO	Unidad	0,00	150.000,00	0,00
							VALOR TOTAL PGIO - PMT	**$ 11.920.205,00**

Valor Acta PARCIAL	X	TOTAL	$975.967.421,00
Amortización Anticipo			$0,00
Valor Ordenación del Gasto:			$975.967.421,00

RESUMEN DEL CONTRATO		
Valor Inicial del Contrato		15.179.416.313,50
Valor adicional		
Valor Acta No. 1:	531.310.868,00	
Valor Acta No. 2:	571.059.360,00	
Valor Acta No. 3:	975.967.421,00	
Saldo del contrato	13.101.078.614,50	
Sumas Iguales	15.179.416.313,50	15.179.416.313,50

RESUMEN DEL ANTICIPO		
Valor del Anticipo		0,00
Amortización del Anticipo Acta 1:	0,00	
Saldo por amortizar:	0,00	
Sumas Iguales	0,00	0,00

SE HACE CONSTAR

Que el **CONASORCIO HORIZONTE AZUL** representado legalmente por **LUIS ALBERTO MEZA GALEANO**, ejecuta parcialmente para el Departamento de Caldas e, **OBJETO DE ESTE CONTRATO DE OBRA A ENTERA SATISFACCION Y DENTRO DEL PLAZO PREVISTO.**

Cándo cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2 002, modificado por el Artículo 1° de la ley 828 de 2 003 y al Artículo 27 del Decreto 2150 de 2 002, la suscrita Interventoría verificó el cumplimiento de éstas obligaciones por parte del contratista.

Firma
JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA
Secretaria de Infraestructura
Ordenador del Gasto

Firma
CONSORCIO HORIZONTE AZUL
Contratista

Firma
JORGE HERNAN NEIRA DIAZ
Supervisor contrato

Firma
ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A BIC
Interventor

GOBIERNO DE CALDAS

RESUMEN DE ACTIVIDADES 03 PARCIAL

CONTRATO DE OBRA NRO: 2641/2025 1788

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS K0+100 - K2+540

CONTRATISTA: CONSORCIO HORIZONTE AZUL

INTERVENTOR ESTERNO: ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S.

SUPERVISOR: JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA

OBRA CIVIL CONTRATADA SEGÚN PROPUESTA Y PRECIOS PREVIOS (OBRA CIVIL CONTRATADA CONTRATO INICIAL)							CONTRATO ADICIONAL		OBRA CIVIL EJECUTADA+ MAYOR CANTIDAD+OBRA NO PREVISTA EJECUTADA — DESCRIPCION ACTA DE OBRA PARCIAL No. 1										OBRA CIVIL EJECUTADA+ MAYOR CANTIDAD+OBRA NO PREVISTA EJECUTADA — DESCRIPCION ACTA DE OBRA PARCIAL No. 2										OBRA CIVIL EJECUTADA+ MAYOR CANTIDAD+OBRA NO PREVISTA EJECUTADA — DESCRIPCION ACTA DE OBRA PARCIAL No. 3								TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	
									OBRA SEGÚN CONTRATO		MAYOR CANTIDAD		NO PREVISTA		TOTAL EJECUTADO				OBRA SEGÚN CONTRATO		MAYOR CANTIDAD		NO PREVISTA		TOTAL EJECUTADO				OBRA SEGÚN CONTRATO		MAYOR CANTIDAD		NO PREVISTA		TOTAL EJECUTADO			
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	OBRA CANT.	OBRA VALOR VR. TOTAL	OBRA CANT.	OBRA VALOR VR. TOTAL	OBRA CANT.	OBRA VALOR VR. TOTAL	OBRA CANT.	OBRA VALOR VR. TOTAL	OBRA CANT.	OBRA VALOR VR. TOTAL	OBRA CANT.	OBRA VALOR VR. TOTAL	OBRA CANT.	OBRA VALOR VR. TOTAL	OBRA CANT.	OBRA VALOR VR. TOTAL	OBRA CANT.	OBRA VALOR VR. TOTAL	OBRA CANT.	OBRA VALOR VR. TOTAL	OBRA CANT.	OBRA VALOR VR. TOTAL	OBRA CANT.	OBRA VALOR VR. TOTAL	OBRA CANT.	OBRA VALOR VR. TOTAL	OBRA CANT.	OBRA VALOR VR. TOTAL	OBRA CANT.	OBRA VALOR VR. TOTAL
1	203.1	EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	24856.00	27.748,00	697.487.888,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2	218.1.1	EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA SUPLANACIÓN Y CUNETAS	m3	8146.00	68.518,00	558.049.828,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3	220.1	TERRAPLENES CONFORMADOS CON SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO	m3	39114.00	46.500,00	1.819.071.000,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4	221.1	CONFORMACIÓN DE ESTRUCTURAS	m3	1617.00	241.772,00	390.940.668,00				0,00		0,00		0,00		0,00	77,00	18.616.844,00		18.616.844,00		0,00		0,00	18,76	4.534.289,00		0,00		0,00		0,00		4.534.289,00	95,00	22.951.133,00	95,00	22.951.133,00
5	251.8	EXCAVACIÓN DE ESCALONAMIENTO, ROCOA Y TUBERIAS	m3	10368.00	19.400,00	201.979.200,00	7936,00	153.958.400,00		0,00		0,00		0,00	7936,00	153.958.400,00	1434,50	27.829.300,00		0,00		0,00		0,00	1434,50	27.829.300,00	69,16	1.341.290,00		0,00		0,00		1.341.290,00	2.977,50	57.805.400,00
6	450.2	MEZCLA CONCRETO ASFALTICO TIPO MDC-19 COMPRA DE MEZCLA	m3	3213.00	1.453.500,00	3.618.910.000,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
7	630.1	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSION ASFALTICA CRL-01	m2	20619.00	5.800,00	119.615.200,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
8	330.2.1	BASE GRANULAR CLASE B	m3	6534.00	204.952,70	1.131.608.214,60				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
9	330.2.2	SUB-BASE GRANULAR CLASE B	m3	5940.00	115.126,90	1.049.002.244,00				0,00		0,00		0,00		0,00	54,73	6.679.372,00		0,00		0,00		0,00	54,73	6.679.372,00	71,90	12.581.531,00		0,00		0,00		12.581.531,00	126,62	22.170.991,00
10	311.1	ATRAQUE	m3	3674.00	87.496,30	326.559.290,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
11	600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	9410.00	154.400,00	291.019.200,00	2861,00	29.901.200,00		0,00		0,00		0,00	2861,00	29.901.200,00	5545,00	59.090.697,00		0,00		0,00		0,00	5545,00	59.090.697,00	1481,00	169.629.360,00		0,00		0,00		169.629.360,00	2.357,50	257.427.440,00
12	600.2.1	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA PARA FILTROS	m3	6405.00	108.271,40	693.656.162,00				0,00		0,00		0,00		0,00	92,10	10.573.698,00		0,00		0,00		0,00	92,10	10.573.698,00	176,90	23.330.409,00		0,00		0,00		23.330.409,00	733,40	33.274.278,00
13	610.1	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	m3	2601.00	131.960,50	46.870.010,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	35,30	4.658.172,00		0,00		0,00		4.658.172,00	35,30	4.658.172,00
14	221.12	REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS	m	87.00	279.873,50	25.034.782,50				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	63,40	17.739.749,00		0,00		0,00		17.739.749,00	63,40	17.739.749,00
15	600.1.2	CONCRETO DE RELLENO PARA OBRAS COMPRA DE MEZCLA	m3	60.00	1.109.441,31	70.302.155,80				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
16	630.1.1	CONCRETO DE RESISTENCIA PARA MEZCLA DE COMPRA	m3	371.00	3.129.132,70	616.163.027,30				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2,10	3.408.311,00		0,00		0,00		3.408.311,00	2,10	3.408.311,00
17	630.1.2	CONCRETO RESISTENCIA PARA MEZCLA DE COMPRA ETC	m3	6.00	840.074,50	3.540.447,30				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1,10	704.082,00		0,00		0,00		704.082,00	1,10	704.082,00
18	640.1	ACERO DE REFUERZO G 60 KG/CM2	kg	29484.00	8.595,40	253.501.143,60				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2.215,10	19.948.310,00		0,00		0,00		19.948.310,00	2.215,10	19.948.310,00
19	511.1	HERRADO	m3	7.00	87.496,00	612.432,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
20	640.1	TUBERIA DE PLASTICO TIPO PVC NORMA NTC 1087 DE DIAMETRO NOMINAL 6"	LF	134.70	1.280.464,60	172.452.216,40				0,00		0,00		0,00		0,00	57,70	73.902.601,60		0,00		0,00		0,00	57,70	73.902.601,60	72,10	94.114.140,00		0,00		0,00		94.114.140,00	131,20	167.996.901,60
21	640.1.2	TUBERIA DE PVC 4" PARA FILTROS	m	2463.00	84.190,13	84.136.328,30				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	18,70	549.542,70		0,00		0,00		549.542,70	18,70	549.542,70
22	673.1.1	GEOTEXTIL TIPO NT 2000	m2	10516.50	1.492,00	94.137.834,50				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	98,00	419.027,00		0,00		0,00		419.027,00	98,00	419.027,00
23	673.2	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3	3507.00	132.109,00	465.020.300,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	11,90	1.517.040,00		0,00		0,00		1.517.040,00	11,90	1.517.040,00
24	631.3P	JUNTA DE CONSTRUCCION CINTA PVC	m	22.70	73.972,80	1.701.369,60				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	10,50	1.168.942,50		0,00		0,00		1.168.942,50	10,50	1.168.942,50
25	670.3	SUMINISTRO DE BARRAS Y DOBLEMENTADAS EN CONCRETO CICLOPEO	m3	134.00	602.695,00	80.768.270,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
26	600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	1785.00	114.400,00	204.212.400,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
27	600.2	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO	m3	440.00	198.270,40	87.240.576,40				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
28	610.1	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	m3	1445.00	131.960,50	190.694.367,50				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
29	630.1.2	CONCRETO DE RESISTENCIA PARA MEZCLA DE COMPRA	m3	982.00	1.109.441,70	1.010.912.737,40				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
30	630.1.1	CONCRETO DE RESISTENCIA PARA MEZCLA DE COMPRA ETC	m3	36.00	840.074,50	24.594.022,60				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
31	640.1	ACERO DE REFUERZO G 60 KG/CM2	kg	2855.00	8.595,40	175.934.663,20				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
32	673.1	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3	1.00	132.000,00	84.599.270,70				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
33	640.1.2	TUBERIA DE PVC 3"	m	636.00	32.053,50	21.567.035,80				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
34	640.1.2	TUBERIA DE PVC 4" PARA FILTROS	m	474.00	84.190,13	15.191.661,40				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
35	631.3P	JUNTA DE CONSTRUCCION CINTA PVC	m	351.00	73.972,80	26.409.218,20				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
36	673.1.1	GEOTEXTIL TIPO NT 2000	m2	2466.30	7.492,30	11.577.097,20				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
37	600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	870.00	114.400,00	43.467.600,20				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
38	600.2.1	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO	m3	46.00	198.270,40	12.000.000,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
39	610.1	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	m3	68.00	141.960,50	7.994.308,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
40	630.1.2	CONCRETO DE RESISTENCIA PARA OBRAS COMPRA DE MEZCLA	m3	44.00	1.109.441,70	47.000.000,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
41	673.2	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3	41.00	132.000,00	5.000.000,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
42	600.1.2P	TUBERIA DE PVC 6"	m	78.00	52.564,00	2.949.295,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
43	673.1.2P	GEOTEXTIL TIPO NT 1600	m2	411.00	6.362,10	2.662.525,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

GOBIERNO DE CALDAS

RESUMEN DE ACTIVIDADES 03 PARCIAL

CONTRATO DE OBRA NRO: 2511/2025-1755

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS K0+100 - K2+540

CONTRATISTA: CONSORCIO HORIZONTE AZUL

INTERVENTOR EXTERNO: ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS SA BIC

SUPERVISOR: JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA

OBRA CIVIL CONTRATADA SEGUN PROPUESTA Y ESTUDIO PREVIO							OBRAS CONTRATO ADICIONAL		OBRA CIVIL EJECUTADA+ MAYOR CANTIDAD+OBRA NO PREVISTA EJECUTADA								OBRA CIVIL EJECUTADA+ MAYOR CANTIDAD+OBRA NO PREVISTA EJECUTADA								OBRA CIVIL EJECUTADA+ MAYOR CANTIDAD+OBRA NO PREVISTA EJECUTADA								TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	
OBRA CIVIL CONTRATADA CONTRATO INICIAL									DESCRIPCION ACTA DE OBRA PARCIAL No. 1								DESCRIPCION ACTA DE OBRA PARCIAL No. 2								DESCRIPCION ACTA DE OBRA PARCIAL No. 3									
									OBRA SEGUN CONTRATO		MAYOR CANTIDAD		NO PREVISTA		TOTAL EJECUTADO		OBRA SEGUN CONTRATO		MAYOR CANTIDAD		NO PREVISTA		TOTAL EJECUTADO		OBRA SEGUN CONTRATO		MAYOR CANTIDAD		NO PREVISTA		TOTAL EJECUTADO			
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	OBRA CANT.	VALOR VR.TOTAL	OBRA CANT.	VALOR VR.TOTAL	OBRA CANT.	VALOR VR.TOTAL	OBRA CANT.	VALOR VR.TOTAL	OBRA CANT.	VALOR VR.TOTAL	OBRA CANT.	VALOR VR.TOTAL	OBRA CANT.	VALOR VR.TOTAL	OBRA CANT.	VALOR VR.TOTAL	OBRA CANT.	VALOR VR.TOTAL	OBRA CANT.	VALOR VR.TOTAL	OBRA CANT.	VALOR VR.TOTAL	OBRA CANT.	VALOR VR.TOTAL
44	501.1	SARDINELES Y COLCHONETAS DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO, ESTILO I, RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO)	m3	468.00	352.521,60	164.991.244,80				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
45	640.2	MALLA DE REFUERZO fy = 420 MPa	kg	1217,00	9.299,60	11.316.293,20				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
46	511.1	APIQUES	M3	60,00	67.490,00	4.049.400,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
47	700.1	LINEA DE DEMARCACIÓN VÍA PINTURA BLANCA	m	9720,00	3.616,50	35.156.094,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
48	700.2	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO	m2	19,00	62.858,10	1.194.303,90				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
49	701.1	TACHA REFLECTIVA CON ADHESIVO (INCLUYE HUECO) TIPO BIDIRECCIONAL	u	1220,00	12.018,50	15.706.970,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
50	710.1.1	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR, SP, PG Y/O SI, DIMENSIONES 100CM CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV	u	35,00	1.236.226,40	42.567.699,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
51	710.1.3	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SP-71 (PREVENTIVAS) 180X64 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV	U	11,00	966.061,90	10.626.680,90				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
52	670.4	BORDILLO DE PIEDRA PREFABRICADAS DE CONCRETO, INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO, BORDILLO DE 0.15x0.35 m - DE ARTEA	m	2440,00	79.115,50	193.745.220,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
53	500.1.1	HORMIGON DE CONCRETO (CEMENTADO)	m3	600,47	1.042.249,00	607.125.691,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
54	500.1.2	SUMINISTRO (SUMINISTRO DE AGUA)	m3	574,00	175.125,50	100.540.937,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
55	670.1.3	GRAMADA PERFORADA SIMPLE (SIEMBRA)	m	584,00	801.202,12	467.900.996,80				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
56	510.1.20	CUNETA TIPO SUA, FABRICADA EN CONCRETO DE 3 KG/CM2	m2	967,00	114.615,60	113.622.113,20				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
57	900.3.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIONES DE EXPLANACIONES, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDOS A PARTIR DE OBRA (METROS CUBICOS)	m3 - Km	1117371,00	1.510,40	1.687.671.158,40				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
		ITEMS NO PREVISTOS																																
58	INP 1	ADECUACION, RETIRO DE ALTA Y REUBICACION DE VALLA INFORMATIVA DE LA OBRA (1 UNIDAD) EN EL PUNTO DE INICIO DEL PROYECTO EN LA VIA TRES PUERTAS - LA DORADA	UI		23.972.120,00	0,00				0,00	0,50	15.586.060,00	0,50	15.586.060,00							0,00	0,00				0,00	0,00	0,50	15.586.060,00	0,50	15.586.060,00	1,00	23.972.120,00
59	INP 2	TALA DE ARBOL ARBOL DE 10 A 20 M ALTURA (1 A 4 m Ø) - CON 1 A 2 M INCLUYE CORTE RAIZ AEREA Y RADICULAR, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE MATERIAL VEGETAL	UND		172.728,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00							0,00	42,00	24.054.476,00	42,00	24.054.476,00		0,00	0,00	11,00	6.300.309,00	11,00	6.300.309,00	53,00	30.354.785,00
60	INP 3	TALA DE ARBOL ARBOL DE 10 A 15 M ALTURA (1 A 4 m Ø) - CON 1 A 2 M INCLUYE CORTE RAIZ AEREA Y RADICULAR, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE MATERIAL VEGETAL	UND		671.728,00	0,00			2,00	4,00	3.510.912,00	4,00	3.510.912,00							2,00	69,00	72.663.600,00	80,00	72.663.600,00		0,00	0,00	98,00	65.817.344,00	98,00	65.817.344,00	182,00	142.191.856,00
61	INP 4	TALA DE ARBOL ARBOL DE 15 A 18,5 M ALTURA (5 A 9 m Ø) - CON 1 A 2 M INCLUYE CORTE RAIZ AEREA Y RADICULAR, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE MATERIAL VEGETAL	UND		1.295.927,00	0,00			0,00	40,00	51.837.080,00	40,00	51.837.080,00							0,00	45,00	58.502.561,00	45,00	58.502.561,00		0,00	0,00	57,00	73.849.849,00	57,00	73.849.849,00	142,00	184.189.490,00
62	INP 5	TALA DE ARBOL ARBOL DE 18,5 M ALTURA (9 A 12 m Ø) - CON 1 A 2 M INCLUYE CORTE RAIZ AEREA Y RADICULAR, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE MATERIAL VEGETAL	UND		1.811.712,00	0,00			0,00	150,00	272.056.800,00	150,00	272.056.800,00							0,00	21,00	38.215.952,00	21,00	38.215.952,00		0,00	0,00	26,00	47.212.512,00	26,00	47.212.512,00	197,00	357.485.264,00
63	INP 6	TALA DE ARBOL ARBOL DE + 20 M ALTURA (12 m Ø en adelante) - CON 1 A 2 M INCLUYE CORTE RAIZ AEREA Y RADICULAR, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE MATERIAL VEGETAL	UND		5.498.535,00	0,00			0,00	5,00	27.648.240,00	5,00	27.648.240,00							0,00	2,00	6.997.070,00	2,00	6.997.070,00		0,00	0,00	2,00	6.997.070,00	2,00	6.997.070,00	12,00	61.642.620,00
64	INP 7	REMOCION DE CERCA DE ALAMBRE	m		7.154,00	0,00			0,00	958,00	6.854.015,00	958,00	6.854.015,00							0,00	390,00	2.790.060,00	390,00	2.790.060,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,00	9.644.075,00
65	INP 8	DERRIBO Y LIMPIEZA EN ZONA MONTAÑOSA	m2		4.842,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00							0,00	2.223,00	10.763.114,00	2.223,00	10.763.114,00		0,00	0,00	57,00	277.961,00	57,00	277.961,00	2.280,00	11.041.075,00
66	INP 9	CHAPE DE ALAMBRE DE PUAS CON PASTO DE MAQUINA (CHAPA 1 VEZ)	m2		21.220,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	INP 10	MATERIAL MEJ. SUSTRATO TIPO LANZA A MATERIAL DE RIO (EXCEDENTE)	m3		180.548,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00							0,00	83,97	15.001.476,00	83,97	15.001.476,00		0,00	0,00	1.364,00	221.472.036,00	1.364,00	221.472.036,00	1.447,97	244.473.512,00
68	INP 11	DESALLA PARA DESAGUE DE LAVAS (ADECUADA) (Realizado por CERRALLA NAVAL De PONCHOS DE ALA TRINCHAS TORCIDAS)	m2		11.020,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOBIERNO DE CALDAS

RESUMEN DE ACTIVIDADES 03 PARCIAL

CONTRATO DE OBRA NRO: 3911/2020-1TES

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS K0+100 - K7+640

CONTRATISTA: CONSORCIO HORIZONTE AZUL

INTERVENTOR EXTERNO: ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A BIC

SUPERVISOR: JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA

Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBRAS EXTRAS CONTRATO ADICIONAL CANT.	OBRAS EXTRAS CONTRATO ADICIONAL VR. TOTAL	OBRA CIVIL EJECUTADA= MAYOR CANTIDAD=OBRA NO PREVISTA EJECUTADA DESCRIPCION ACTA DE OBRA PARCIAL No. 1 OBRA SEGUN CONTRATO CANT.	OBRA SEGUN CONTRATO VR. TOTAL	MAYOR CANTIDAD CANT.	MAYOR CANTIDAD VR. TOTAL	NO PREVISTA CANT.	NO PREVISTA VR. TOTAL	TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA CANT.	TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA VALOR	OBRA CIVIL EJECUTADA= MAYOR CANTIDAD=OBRA NO PREVISTA EJECUTADA DESCRIPCION ACTA DE OBRA PARCIAL No. 2 OBRA SEGUN CONTRATO CANT.	OBRA SEGUN CONTRATO VR. TOTAL	MAYOR CANTIDAD CANT.	MAYOR CANTIDAD VR. TOTAL	NO PREVISTA CANT.	NO PREVISTA VR. TOTAL	TOTAL EJECUTADO CANT.	TOTAL EJECUTADO VALOR	OBRA CIVIL EJECUTADA= MAYOR CANTIDAD=OBRA NO PREVISTA EJECUTADA DESCRIPCION ACTA DE OBRA PARCIAL No. 3 OBRA SEGUN CONTRATO CANT.	OBRA SEGUN CONTRATO VR. TOTAL	MAYOR CANTIDAD CANT.	MAYOR CANTIDAD VR. TOTAL	NO PREVISTA CANT.	NO PREVISTA VR. TOTAL	TOTAL EJECUTADO CANT.	TOTAL EJECUTADO VALOR	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO CANT.	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO VR. TOTAL
03	INV 11	CAPA PARA REPARACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	m3		19.440,00	0,00																												
11	INV 13	BASE GRANULAR PARA ESTRUCTURA CLASE B	m3		227.619,00	0,00																												
11	INV 14	MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA ESCRES TIPO MDC-19	m3		1.328.010,00	0,00																												
11	INV 15	CEPEAE Y TRASLADO DE LA PARA BARRA VARILLAR IN VIGA MANUAL	Und		81.709,00	0,00																												
11	INV 16	ADUANAMIENTO FACIAL Y PREVENTIVA DE FAUNA SILVESTRE PRESENTE EN LOS TRABAJOS ARQUEOLOGICOS DEL PROYECTO VIA TRES PUERTAS - LA ROSHELA BAJO EL PROTOCOLO DE MANEJO Y CONTINGENCIA DE FAUNA SILVESTRE ADJUNTO EN LA RESOLUCION DE LICENCIA No. 5230-004	Gl		2666662,00	0,00																												
VALOR TOTAL INCLUIDO AU DEL 30% (ADMINISTRACION 25% - U 5%)						$ 14.081.940.833,00	SUB TOTAL	0,00	SUB TOTAL	43.906.726,00	SUB TOTAL	0,00	SUB TOTAL	468.115.072,20	SUB TOTAL	512.076.792,00	SUB TOTAL	166.182.634,20	SUB TOTAL	0,00	SUB TOTAL	372.791.997,20	SUB TOTAL	538.924.616,20	SUB TOTAL	267.867.800,00	SUB TOTAL	0,00	SUB TOTAL	496.239.826,00	SUB TOTAL	984.047.219,00	SUB TOTAL	2.035.067.603,00

VALOR TOTAL INCLUIDO AU DEL 30% (ADMINISTRACION 25% - U 5%)						14.081.940.833,00		0,00		43.906.726,00		0,00		468.115.072,20		512.076.792,00		166.182.634,20		0,00		372.791.997,20		538.924.616,20		267.867.800,00		0,00		496.239.826,00		984.047.219,00		2.035.067.603,00
VALOR COSTO DIRECTO						11.467.599.648,98		0,00		33.774.405,00		0,00		360.088.532,30		393.862.937,30		127.832.795,54		0,00		286.701.536,30		414.557.397,08		206.052.153,85		0,00		381.722.943,08		757.033.245,38		1.565.436.179,50
ADMINISTRACION 25%						2.350.067.237,21		0,00		8.443.600,00		0,00		90.026.633,08		98.470.233,08		31.958.198,89		0,00		71.675.384,08		103.639.349,27		51.513.038,46		0,00		95.430.735,77		189.258.311,35		391.366.779,50
UTILIDAD 5%						573.813.647,44		0,00		1.688.720,00		0,00		18.005.661,62		19.694.381,62		7.021.551,55		0,00		14.385.076,92		21.481.170,20		10.734.184,62		0,00		22.555.255,00		37.270.730,00		78.271.220,50
Vlr SM FGD (Incluye PMT - FACAI) (INMODIFICABLE)						317.480.000,00		0,00		19.231.056,00		0,00		0,00		19.231.056,00		12.134.575,00		0,00		0,00		12.134.575,00		11.600.000,00		0,00		0,00		11.600.000,00		42.965.631,00
VALOR TOTAL						14.176.616.013,63		0,00		63.127.818,00		0,00		468.115.072,20		531.242.890,20		200.267.408,00		0,00		372.791.997,20		573.059.405,20		279.727.756,00		0,00		518.639.826,00		984.047.219,00		2.078.337.630,20

VALOR ACTA UNO PARCIAL	$	531.310.699,20
AMORTIZACION ANTICIPO	$	0,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$	531.310.699,20

VALOR ACTA DOS PARCIAL	$	671.060.350,00
AMORTIZACION ANTICIPO	$	0,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$	671.060.350,00

VALOR ACTA TRES PARCIAL	$	876.967.421,20	$	2.078.337.630,20
AMORTIZACION ANTICIPO	$	0,00	$	0,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$	876.967.421,20	$	2.078.337.630,20

CONSORCIO HORIZONTE AZUL
CONTRATISTA

ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.B.I.C.

JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA
SUPERVISOR CONTRATO

GOBIERNO DE CALDAS

PREACTA NRO TRES (03) PARCIAL AL CONTRATO DE OBRA NRO. 291
RADICADO SECRETARIA JURIDICA Nro. 29112025-1755

Secretaría : INFRAESTRUCTURA

Fecha acta lunes, 1 de junio de 2026

Concepto	Descripción		
No. Radicado Contrato de Obra	29112025-1755	Acto Administrativo	N
No. Pedido en SAP:	4500029290		
NIT o RUT:	902006571-3		
Contratista:	CONSORCIO HORIZONTE AZUL		
Representante Legal:	LUIS ALBERTO MEZA GALEANO		
Valor del Contrato ($):	$ 15.179.416.313,50	Aporte Departamento	$ 15.179.
Valor Adición	$ 0,00	Aporte otras entidades	N/A
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS K0+100 - K2+540		
Disponibilidad presupuestal	3500046155	FONDO	7RFR0388
Duración del contrato (Plazo):	DOCE (12) MESES A PARTIR DE LA ACTA DE INICIO		
Fecha de iniciación	23 de enero de 2026	Fecha de terminación	
Supervisor Departamento	JORGE HERNAN NEIRA DIAZ		

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	MED
		GENERAL	PARTIC.				
1	210.1.1			EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	0,00	0
2	210.2.1			EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	0,00	0
3	220.1P			TERRAPLENES CONFORMADOS CON SUELO (MATERIAL SELECCIONADO PARA RELLENO)	m3	0,00	0
4	201.7			DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	m3	15,00	VER ANEXO - MEM
5	201.8			DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RIGIDOS Y FLEXIBLES	m2	48,60	VER ANEXO - MEM
6	450.2P			MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 - COMPRA DE MEZCLA	m3	0,00	0
7	420.2			RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-57	m2	0,00	0
8	330.2.1			BASE GRANULAR CLASE B	m3	0,00	0
9	320.2.2			SUB-BASE GRANULAR CLASE B	m3	71,90	VER ANEXO - MEM
10	311,1			AFIRMADO	m3	0,00	0
11	600.1.1			EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	1.481,90	VER ANEXO - MEM
12	600.2.1			EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO	m3	118,30	VER ANEXO - MEM
13	610.1			RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	m3	35,90	VER ANEXO - MEM
14	201.15			REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS	m	63,90	VER ANEXO - MEM
15	630.1.3.2			CONCRETO DE RESISTENCIA 28MPa - COMPRA DE MEZCLA	m3	16,60	VER ANEXO - MEM
16	630.1.4.2			CONCRETO DE RESISTENCIA 21MPa - COMPRA DE MEZCLA	m3	3,10	VER ANEXO - MEM
17	630.1.6			CONCRETO DE RESISTENCIA14MPa - MEZCLA IN SITU	m3	1,10	VER ANEXO - MEM
18	640.1			ACERO DE REFUERZO fy = 4200MPa	kg	2.376,10	VER ANEXO - MEM
19	311.1			AFIRMADO	m3	0,00	0
20	663.1			TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC NORMA NTC-5055, DE DIÁMETRO INTERNO 900 mm	m	73,50	VER ANEXO - MEM

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA NRO TRES (03) PARCIAL AL CONTRATO DE OBRA NRO. 29112025-1755 RADICADO SECRETARIA JURIDICA Nro. 29112025-1755

Secretaría : INFRAESTRUCTURA

Fecha acta lunes, 1 de junio de 2026

Concepto	Descripción			
No. Radicado Contrato de Obra	29112025-1755	Acto Administrativo:	N/A	
No. Pedido en SAP:	4500029290			
NIT o RUT:	902006571-3			
Contratista:	CONSORCIO HORIZONTE AZUL			
Representante Legal:	LUIS ALBERTO MEZA GALEANO			
Valor del Contrato ($):	$ 15.179.416.313,50	Aporte Departamento	$ 15.179.416.313,50	
Valor Adición	$ 0,00	Aporte otras entidades	N/A	
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS KD+100 - K2+540			
Disponibilidad presupuestal	3500046155	FONDO	7RFR0388	
Duración del contrato (Plazo):	DOCE (12) MESES A PARTIR DE LA ACTA DE INICIO			
Fecha de iniciación	23 de enero de 2026	Fecha de terminación	22 de enero de 2027	
Supervisor Departamento	JORGE HERNAN NEIRA DIAZ			

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	MEDIDAS
		GENERAL	PARTIC.				
21	663.1.2			TUBERÍA DE PVC 4" PARA FILTROS	m	16,00	VER ANEXO - MEMORIA DE CALCULO
22	673.1.1			GEOTEXTIL TIPO NT 2500	m2	56,00	VER ANEXO - MEMORIA DE CALCULO
23	673.2			MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3	11,90	VER ANEXO - MEMORIA DE CALCULO
24	801.8P			JUNTA DE CONSTRUCCIÓN CINTA PVC	m	16,00	VER ANEXO - MEMORIA DE CALCULO
25	670.5			DISIPADORES DE ENERGIA Y SEDIMENTADORES DE CONCRETO CICLOPEO	m3	0,00	0,00
26	600.1.1			EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	0,00	0,00
27	600.2.1			EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO	m3	0,00	0,00
28	610.1			RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	m3	0,00	0,00
29	630.1.3.2			CONCRETO DE RESISTENCIA 28MPa - COMPRA DE MEZCLA	m3	0,00	0,00
30	630.1.6			CONCRETO DE RESISTENCIA14MPa - MEZCLA IN SITU	m3	0,00	0,00
31	640.1			ACERO DE REFUERZO fy = 4200MPa	kg	0,00	0,00
32	673.2			MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3	0,00	0,00
33	663.1.4			TUBERÍA DE PVC 3"	m	0,00	0,00
34	663.1.2			TUBERÍA DE PVC 4" PARA FILTROS	m	0,00	0,00
35	801.8P			JUNTA DE CONSTRUCCIÓN CINTA PVC	m	0,00	0,00
36	673.1.1			GEOTEXTIL TIPO NT 2500	m2	0,00	0,00
37	600.1.1			EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	0,00	0,00
38	600.2.1			EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO	m3	0,00	0,00
39	610.1			RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	m3	0,00	0,00

GOBIERNO DE CALDAS

PREACTA NRO TRES (03) PARCIAL AL CONTRATO DE OBRA NRO. 29112025-1755
RADICADO SECRETARIA JURIDICA Nro. 29112025-1755

Secretaria : INFRAESTRUCTURA

Fecha acta lunes, 1 de junio de 2026

Concepto	Descripción			
No. Radicado Contrato de Obra	29112025-1755	Acto Administrativo:	N/A	
No. Pedido en SAP:	4500029290			
NIT o RUT:	902006571-3			
Contratista:	CONSORCIO HORIZONTE AZUL			
Representante Legal:	LUIS ALBERTO MEZA GALEANO			
Valor del Contrato ($):	$ 15.179.416.313,50	Aporte Departamento:	$ 15.179.416.313,50	
Valor Adición	$ 0,00	Aporte otras entidades:	N/A	
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS K0+100 - K2+540			
Disponibilidad presupuestal	3500046155	FONDO	7RFR0388	
Duración del contrato (Plazo):	DOCE (12) MESES A PARTIR DE LA ACTA DE INICIO			
Fecha de iniciación	23 de enero de 2026	Fecha de terminación	22 de enero de 2027	
Supervisor Departamento	JORGE HERNAN NEIRA DIAZ			

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	MEDIDAS
		GENERAL	PARTIC.				
40	630.1.4.2			CONCRETO DE RESISTENCIA 21MPa - COMPRA DE MEZCLA	m3	0,00	0,00
41	673.2			MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3	0,00	0,00
42	663.1.4			TUBERÍA DE PVC 3"	m	0,00	0,00
43	673.1.2P			GEOTEXTIL TIPO NT 1600	m2	0,00	0,00
44	681.1			GAVIONES O COLCHOGAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO ESTILO 1: RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO)	m3	0,00	0,00
45	640.2			MALLA DE REFUERZO fy = 420 MPa	kg	0,00	0,00
46	311.1			AFIRMADO	m3	0,00	0,00
47	700.1			LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	m	0,00	0,00
48	700.3			MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	m2	0,00	0,00
49	701.1.1			TACHA REFLECTIVA CON ADHESIVO BITUMINOSO Y/O TERMOPLÁSTICO	u	0,00	0,00
50	710.1.1			SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR, SP Y/O SI, DIMENSIONES 75x75CM CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV	u	0,00	0,00
51	710.1.5			SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SP-75 DIMENSIONES 75x60CM CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV	u	0,00	0,00
52	672.4			BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO. BORDILLO DE 0.15Mx0.4M DE ÁREA	m	0,00	0,00
53	500.1.1			PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO	m3	0,00	0,00
54	320.2.2			SUB-BASE GRANULAR CLASE B	m3	0,00	0,00
55	632.1.3P			BARANDA PEATONAL SEGÚN DISEÑO	m	0,00	0,00

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA NRO TRES (03) PARCIAL AL CONTRATO DE OBRA NRO. 29112025-1755 RADICADO SECRETARIA JURIDICA Nro. 29112025-1755

Secretaría : INFRAESTRUCTURA

Fecha acta lunes, 1 de junio de 2026

Concepto	Descripción			
No. Radicado Contrato de Obra	29112025-1755	Acto Administrativo:	N/A	
No. Pedido en SAP:	4500029290			
NIT o RUT:	902006571-3			
Contratista:	CONSORCIO HORIZONTE AZUL			
Representante Legal:	LUIS ALBERTO MEZA GALEANO			
Valor del Contrato ($):	$ 15.179.416.313,50	Aporte Departamento	$ 15.179.416.313,50	
Valor Adición	$ 0,00	Aporte otras entidades	N/A	
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS K0+100 - K2+540			
Disponibilidad presupuestal	3500046155	FONDO	7RFR0388	
Duración del contrato (Plazo):	DOCE (12) MESES A PARTIR DE LA ACTA DE INICIO			
Fecha de iniciación	23 de enero de 2026	Fecha de terminación	22 de enero de 2027	
Supervisor Departamento	JORGE HERNAN NEIRA DIAZ			

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	MEDIDAS
		GENERAL	PARTIC.				
56	510.1.2P			LOSETA TÁCTIL GUÍA PREFABRICADA EN CONCRETO DE 0,40x0.40x0.06	m2	0,00	0,00
57	900.2.1			TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3 - Km	0,00	0,00

OBRA ADICIONAL NO PREVISTA

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	MEDIDAS
		GENERAL	PARTIC.				
58	INP 1			AHUYENTAMIENTO, RESCATE Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE EN 2,44 KILÓMETROS DE LA VÍA TRES PUERTAS - LA ROCHELA	GI	0,50	VER ANEXO - MEMORIA DE CALCULO
59	INP 2			TALA DE ARBOL (ARBOL DE 1,0-5,00 M ALTURA (1 < h <= 5) , DAP > 0,10 M). INCLUYE CORTE PARTE AÉREA Y RADICULAR, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL VEGETAL	UND.	11,00	VER ANEXO - MEMORIA DE CALCULO
60	INP 3			TALA DE ÁRBOL (ÁRBOL DE 5,0-10,0 M ALTURA (5 < h <= 10), DAP > 0,10 M). INCLUYE CORTE PARTE AÉREA Y RADICULAR, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL VEGETAL	UND.	98,00	VER ANEXO - MEMORIA DE CALCULO
61	INP 4			TALA DE ARBOL (ARBOL DE 10,0-15,0 M ALTURA (10 < h <= 15), DAP > 0,10 M). INCLUYE CORTE PARTE AÉREA Y RADICULAR, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL VEGETAL	UND.	87,00	VER ANEXO - MEMORIA DE CALCULO
62	INP 5			TALA DE ÁRBOL (ÁRBOL DE 15,0-20,0 M ALTURA (15 < h <= 20), DAP > 0,10 M). INCLUYE CORTE PARTE AÉREA Y RADICULAR, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL VEGETAL	UND.	26,00	VER ANEXO - MEMORIA DE CALCULO
63	INP 6			TALA DE ÁRBOL (ÁRBOL DE > 20,0 M ALTURA, DAP > 0,10 M). INCLUYE CORTE PARTE AÉREA Y RADICULAR, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL VEGETAL	UND.	2,00	VER ANEXO - MEMORIA DE CALCULO
64	INP 7			REMOCIÓN DE CERCAS DE ALAMBRE	ml	0,00	0,00
65	INP 8			DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA	m2	57,40	VER ANEXO - MEMORIA DE CALCULO

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA NRO TRES (03) PARCIAL AL CONTRATO DE OBRA NRO. 29112025-1755 RADICADO SECRETARIA JURIDICA Nro. 29112025-1755

Secretaría : INFRAESTRUCTURA

Fecha acta lunes, 1 de junio de 2026

Concepto	Descripción			
No. Radicado Contrato de Obra	29112025-1755	Acto Administrativo:	N/A	
No. Pedido en SAP:	4500029290			
NIT o RUT:	902006571-3			
Contratista:	CONSORCIO HORIZONTE AZUL			
Representante Legal:	LUIS ALBERTO MEZA GALEANO			
Valor del Contrato ($):	$ 15.179.416.313,50	Aporte Departamento	$ 15.179.416.313,50	
Valor Adición	$ 0,00	Aporte otras entidades	N/A	
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS K0+100 - K2+540			
Disponibilidad presupuestal	3500046155	FONDO	7RFR0388	
Duración del contrato (Plazo):	DOCE (12) MESES A PARTIR DE LA ACTA DE INICIO			
Fecha de iniciación	23 de enero de 2026	Fecha de terminación	22 de enero de 2027	
Supervisor Departamento	JORGE HERNAN NEIRA DIAZ			

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	MEDIDAS
		GENERAL	PARTIC.				
66	INP 9			CERCA DE ALAMBRE DE PUAS CON POSTES DE MADERA (GUADUA, 5 HILOS)	ml	0,00	0,00
67	INP 10			MATERIAL MIXTO - (MATERIAL DE CANTERA + MATERIAL DE RIO SELECCIONADO)	m3	1.364,90	VER ANEXO - MEMORIA DE CALCULO
68	INP 11			GEOMALLA PARA REFUERZO DE CAPAS GRANULARES (Analizado para GEOMALLA BIAXIAL EN POLIÉSTER DE ALTA TENACIDAD - FORGRID BX 30)	m2	0,00	0,00
69	INP 12			CORTE PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	ml	50,60	VER ANEXO - MEMORIA DE CALCULO
70	INP 13			BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE B	m3	0,00	0,00
71	INP 14			MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA BACHEO TIPO MDC-19	m3	0,00	0,00
72	INP 15			RESCATE Y TRASLADO DE LA FLORA EPÍFITA VASCULAR EN VEDA NACIONAL	Und	732,00	VER ANEXO - MEMORIA DE CALCULO
73	INP 16			AHUYENTAMIENTO, RESCATE Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE PRESENTE EN LOS ÁRBOLES AISLADOS DEL PROYECTO VÍA TRES PUERTAS - LA ROCHELA BAJO EL PROTOCOLO DE MANEJO Y CONTINGENCIA DE FAUNA SILVESTRE SOLICITADO EN LA RESOLUCIÓN DE CORPOCALDAS No 2026-0544	Gl	1,00	VER ANEXO - MEMORIA DE CALCULO

PGIO - PMT

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		Elemento	Unidad	CANTIDAD	MEDIDAS
		GENERAL	PARTIC.				
1				PALETEROS	Persona	4,00	VER ANEXO - MEMORIA DE CALCULO
2				SEÑAL INICIO DE OBRA	Unidad	0,00	0,00
3				SEÑAL FIN DE OBRA	Unidad	0,00	0,00
4				SEÑAL TRABAJOS EN LA VÍA X 60 CM	Unidad	0,00	0,00

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA NRO TRES (03) PARCIAL AL CONTRATO DE OBRA NRO. 29112025-1755 RADICADO SECRETARIA JURIDICA Nro. 29112025-1755

Secretaria : INFRAESTRUCTURA

Fecha acta lunes, 1 de junio de 2026

Concepto	Descripción			
No. Radicado Contrato de Obra	29112025-1755	Acto Administrativo:	N/A	
No. Pedido en SAP:	4500029290			
NIT o RUT:	902006571-3			
Contratista:	CONSORCIO HORIZONTE AZUL			
Representante Legal:	LUIS ALBERTO MEZA GALEANO			
Valor del Contrato ($):	$ 15.179.416.313,50	Aporte Departamento	$ 15.179.416.313,50	
Valor Adición	$ 0,00	Aporte otras entidades	N/A	
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS K0+100 - K2+540			
Disponibilidad presupuestal	3500046155	FONDO	7RFR0388	
Duración del contrato (Plazo):	DOCE (12) MESES A PARTIR DE LA ACTA DE INICIO			
Fecha de iniciación	23 de enero de 2026	Fecha de terminación	22 de enero de 2027	
Supervisor Departamento	JORGE HERNAN NEIRA DIAZ			

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	MEDIDAS
		GENERAL	PARTIC.				
5				SEÑAL ANGOSTAMIENTO A LA DERECHA X 60 CM	Unidad	0,00	0,00
6				SEÑAL ANGOSTAMIENTO A LA IZQUIERDA X 60 CM	Unidad	0,00	0,00
7				SEÑAL AUXILIAR DE TRANSITO X 60 CM	Unidad	0,00	0,00
8				SEÑAL MAQUINARIA EN LA VÍA X 60 CM	Unidad	0,00	0,00
9				SEÑAL BARRICADA	Unidad	0,00	0,00
10				SEÑAL BOMBONES	Unidad	40,00	VER ANEXO - MEMORIA DE CALCULO
11				SEÑALIZACIÓN CON CINTA DE DEMARCACIÓN	m	475,70	VER ANEXO - MEMORIA DE CALCULO
12				APROXIMACION OBRA EN LA VÍA	Unidad	0,00	0,00
13				DESVIO	Unidad	0,00	0,00

Firma
CONSORCIO HORIZONTE AZUL
Contratista

Firma
ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S BIC
Interventor externo

GOBIERNO DE CALDAS

FORMATO PREACTA

Tipo de Documento: Formato - Registro
Código: F-EJO-12
Versión aprobada: 1
Página 1 de 1

FECHA	1	6	2026	PREACTA N°	3	ELABORÓ	MAURICIO ANTONIO CORTES REINA	PÁGINA	1	DE	1

NUMERO Y OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA No. 28112025-1755 OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS K0+100 - K2+560		
CONTRATISTA	CONSORCIO HORIZONTE AZUL	INTERVENTORIA	ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A BIC

No.	14	ITEM DE PAGO	201.15	DESCRIPCION	REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS	UNID.	m	UBICACIÓN	Tres Puertas - Santagueda Caldas



Fecha	UBICACIÓN			DIMENSIONES LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	LONGITUD (M)
31/05/2026	K0+690	TRANSVERSAL EXISTENTE	TUBERIA 24"	9,50			9,50
31/05/2026	K1+353	TRANSVERSAL EXISTENTE	TUBERIA 24"	13,39			13,39
31/05/2026	K1+541	TRANSVERSAL EXISTENTE	TUBERIA 24"	8,04			8,04
31/05/2026	K1+990	TRANSVERSAL EXISTENTE	TUBERIA 24"	8,54			8,54
31/05/2026	K1+096	TRANSVERSAL EXISTENTE	TUBERIA 24"	8,31			8,31
31/05/2026	K0+906	TRANSVERSAL EXISTENTE	TUBERIA 24"	8,62			8,62
31/05/2026	K0+647	TRANSVERSAL EXISTENTE	TUBERIA 24"	7,50			7,50

SUBTOTAL CONSOLIDADO DE LA ACTIVIDAD	63,90
TOTAL COBROS ANTERIORES	0,00
TOTAL ACUMULADO	63,90
TOTAL COBRO PRESENTE ACTA	63,90

ING. MANUEL FERNANDO SALAZAR
Residente de Obra
Mat. Profesional 17202-215678 CLD

ING. KAREN ANDREA MURCIA GARCIA
Residente de Interventoria
Mat. Profesional 15202-400597 BYC

ING. MAURICIO A. CORTES R.
Director de Obra
Mat. Profesional 63202-725330ND

DANIEL FERNANDO MORALES DOTTOR
Director de Interventoria
Mat. Profesional 15202-207372BYC

GOBIERNO DE CALDAS

FORMATO PREACTA

Tipo de Documento: Formato - Registro
Código: FEJD-12
Versión aprobada: 1
Página 1 de 1

FECHA	1	6	2026	PREACTA N°	3	ELABORÓ	MAURICIO ANTONIO CORTES REINA	PÁGINA	1	DE	1


NUMERO Y OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA No. 2911/2025-1755 OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS KD+100 - KD+540		
CONTRATISTA	CONSORCIO HORIZONTE AZUL	INTERVENTORIA	ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A BIC

No.	16	ITEM DE PAGO	630 1.3.2	DESCRIPCION	CONCRETO DE RESISTENCIA 28MPa - COMPRA DE MEZCLA	UNID.	m3	UBICACIÓN	Tres Puertas - Santagueda, Caldas

Fecha	DIMENSIONES					VOLUMEN (M3)
	UBICACIÓN			LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	
15/06/2026	BOX CULVERT	K1+266	LOSA INFERIOR	8,00	2,00	0,30	4,80
22/06/2026	BOX CULVERT	K1+041	LATERAL DERECHO	8,00	0,25	1,50	3,00
22/06/2026	BOX CULVERT	K1+266	LATERAL IZQUIERDO	8,00	0,25	1,50	3,00
22/06/2026	BOX CULVERT	K1+266	LOSA SUPERIOR	8,00	2,00	0,30	4,80
22/06/2026	BOX CULVERT	K1+266	CHAFLAN DERECHO	8,00	0,25	0,25	0,50
22/06/2026	BOX CULVERT	K1+266	CHAFLAN IZQUIERDO	8,00	0,25	0,25	0,50





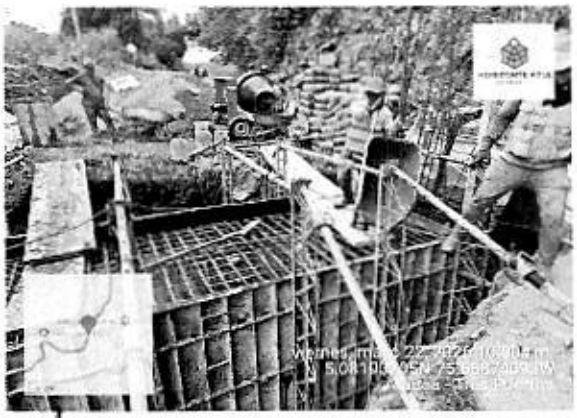

SUBTOTAL CONSOLIDADO DE LA ACTIVIDAD	16,00
TOTAL COBROS ANTERIORES	0,00
TOTAL ACUMULADO	16,00
TOTAL COBRO PRESENTE ACTA	16,00

ING. MANUEL FERNANDO SALAZAR
Residente de Obra
Mat. Profesional 17202-215678 CLD

ING. KAREN ANDREA MURCIA GARCIA
Residente de Interventoria
Mat. Profesional 15202-400567 BYC

ING. MAURICIO A. CORTES R.
Director de Obra
Mat. Profesional 68202-73533QND

DANIEL FERNANDO MORALES DOTTOR
Director de Interventoria
Mat. Profesional 15202-207372BYC

GOBIERNO DE CALDAS

FORMATO PREACTA

Tipo de Documento: Formato - Registro
Código: F-DJ-12
Versión aprobada: 1
Página 1 de 1

FECHA	1	6	2026	PREACTA N°	3	ELABORÓ	MAURICIO ANTONIO CORTES REINA	PÁGINA	1	DE	1

NÚMERO Y OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA No. 2911/2025-1755 OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS KD+100 - K2+640		
CONTRATISTA	CONSORCIO HORIZONTE AZUL	INTERVENTORIA	ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A BIC

No.	16	ITEM DE PAGO	630.1.4.2	DESCRIPCION	CONCRETO DE RESISTENCIA 21MPa - COMPRA DE MEZCLA	UNID.	m3	UBICACIÓN	Tres Puertas - Santagueda, Caldas

Fecha	DIMENSIONES						VOLUMEN (M3)
	UBICACIÓN			LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	
28/05/2026	K2+155	POCETA	CARA LATERAL DERECHA	1,80	0,20	1,95	0,70
28/05/2026	K2+155	POCETA	CARA LATERAL IZQUIERDA	1,80	0,20	1,95	0,70
28/05/2026	K2+155	POCETA	DESCUENTO SUMIDERO LATERAL IZQUIERDO	1,10	0,20	-0,30	-0,33
28/05/2026	K2+155	POCETA	PARED POSTERIOR	1,40	0,20	1,95	0,55
28/05/2026	K2+155	POCETA	PARED FRONTAL	1,40	0,20	1,95	0,55
28/05/2026	K2+155	POCETA	DESCUENTO TUBERIA	0,20		-0,64	-0,13
28/05/2026	K2+155	POCETA	BASE POCETA	1,80	1,80	0,25	0,81





SUBTOTAL CONSOLIDADO DE LA ACTIVIDAD	3,15
TOTAL COBROS ANTERIORES	0,00
TOTAL ACUMULADO	3,10
TOTAL COBRO PRESENTE ACTA	3,10

ING. MANUEL FERNANDO SALAZAR
Residente de Obra
Mat. Profesional 17202-215078 CLO

ING. KAREN ANDREA MURCIA GARCIA
Residente de Interventoría
Mat. Profesional 15202-400697 BYC

ING. MAURICIO A. CORTES R.
Director de Obra
Mat. Profesional 68202-72533CND

DANIEL FERNANDO MORALES DOTTOR
Director de Interventoría
Mat. Profesional 15202-207372BYC

GOBIERNO DE CALDAS

FORMATO PREACTA

FECHA	1	6	2026	PREACTA N°	3	ELABORÓ	MAURICIO ANTONIO CORTES REINA	PÁGINA	1	DE	1

NUMERO Y OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA No. 2911/2025-1755 OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS KD+130 - KD+640
CONTRATISTA	CONSORCIO HORIZONTE AZUL — INTERVENTORIA: ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A BIC

No.	17	ITEM DE PAGO	630 1 6	DESCRIPCION	CONCRETO DE RESISTENCIA 14MPa - MEZCLA IN SITU	UNID.	m3	UBICACIÓN	Tres Puertas - Santagueda, Caldas

Fecha	UBICACIÓN			DIMENSIONES: LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	VOLUMEN (M3)
31/05/2026	K1+286	BOX CULVERT	SOLADO	9,60	2,13	0,05	0,95
31/05/2026	K2+155	POCETA	SOLADO	1,80	1,80	0,05	0,16





SUBTOTAL CONSOLIDADO DE LA ACTIVIDAD	1,11
TOTAL COBROS ANTERIORES	0,00
TOTAL ACUMULADO	1,10
TOTAL COBRO PRESENTE ACTA	1,10

ING. MANUEL FERNANDO SALAZAR
Residente de Obra
Mat. Profesional 17202-215678 CLD

ING. KAREN ANDREA MURCIA GARCIA
Residente de Interventoria
Mat. Profesional 15202-400587 BYC

ING. MAURICIO A. CORTES R
Director de Obra
Mat. Profesional 63202-72533QND

DANIEL FERNANDO MORALES DOTTOR
Director de Interventoria
Mat. Profesional 15202-207372BYC

GOBIERNO DE CALDAS

FORMATO PREACTA


Tipo de Documento: Formato - Registro
Código: FCJO-13
Versión aprobada: 1
Página 1 de 1

FECHA	1	6	2026	PREACTA N°	3	ELABORÓ	MAURICIO ANTONIO CORTES REINA	PÁGINA	1	DE	1

NUMERO Y OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA No. 2911/2025-1755 OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS K0+100 - K2+540		
CONTRATISTA	CONSORCIO HORIZONTE AZUL	INTERVENTORIA	ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A BIC

No.	15	ITEM DE PAGO	540.1	DESCRIPCION	ACERO DE REFUERZO fy = 4200MPa	UNID.	kg	UBICACIÓN	Tres Puertas - Santagueda, Caldas



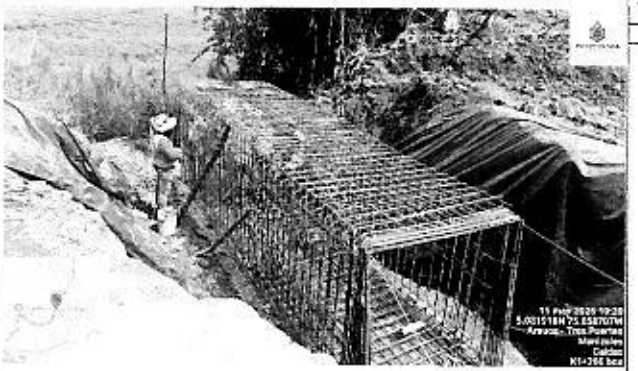

Fecha	DIMENSIONES						PESO (KG)
	UBICACIÓN			LONGITUD (M)	PESO VARILLA (KG/M)	CANTIDAD (UND)	
17/04/2026	K1+266	BOX CULVERT	T1	3,00	1,00	110,00	330,00
17/04/2026	K1+266	BOX CULVERT	T2	4,58	1,00	110,00	503,80
17/04/2026	K1+266	BOX CULVERT	T3	3,00	1,00	110,00	330,00
17/04/2026	K1+266	BOX CULVERT	T4	8,60	1,00	56,00	481,60
17/04/2026	K1+266	BOX CULVERT	T5	8,60	1,00	24,00	206,40
17/04/2026	K1+266	BOX CULVERT	T6	1,50	1,00	220,00	330,00
17/04/2026	POCETA - K2+155	CARA LATERAL IZQ - PISO - CARA LATERAL DER (U)		5,52	1,00	10,00	55,20
17/04/2026	POCETA - K2+155	CARA HACIA LA VIA - PISO - CARA PARED HACIA TALUD (U)		5,52	1,00	8,00	49,68
17/04/2026	POCETA - K2+155	DESCUENTO TUBERIA VERTICAL		0,90	1,00	-7,00	-6,30
17/04/2026	POCETA - K2+155	DESCUENTO TUBERIA HORIZONTAL		0,90	1,00	-7,00	-6,30
17/04/2026	POCETA - K2+155	FLEJES		6,00	1,00	12,00	72,00
17/04/2026	POCETA - K2+155	TRASLAPO FLEJE		1,50	1,00	12,00	18,00
17/04/2026	POCETA - K2+155	DIAGONALES REFUERZO TUBERIA		1,50	1,00	8,00	12,00



SUBTOTAL CONSOLIDADO DE LA ACTIVIDAD	2.376,08
TOTAL COBROS ANTERIORES	0,00
TOTAL ACUMULADO	2.376,10
TOTAL COBRO PRESENTE ACTA	2.376,10

ING. MANUEL FERNANDO SALAZAR
Residente de Obra
Mat. Profesional 17202-215678 CLD

ING. KAREN ANDREA MURCIA GARCIA
Residente de Interventoria
Mat. Profesional 15202-400697 BYC

ING. MAURICIO A. CORTES R.
Director de Obra
Mat. Profesional 63202-72633QND

DANIEL FERNANDO MORALES DOTTOR
Director de Interventoria
Mat. Profesional 16202-207372BYC

GOBIERNO DE CALDAS

FORMATO PREACTA

Tipo de Documento: Formato - Registro
Código: F-GJO-12
Versión aprobada: 1
Página 1 de 1

FECHA	1	6	2025	PREACTA Nº	3	ELABORO	MAURICIO ANTONIO CORTES REINA	PÁGINA	1	DE	1

NUMERO Y OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA No. 28112025-1755 OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS K0+100 - K2+540
CONTRATISTA	CONSORCIO HORIZONTE AZUL — INTERVENTORIA: ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A BIC

No.	20	ITEM DE PAGO	663 1	DESCRIPCION	TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC NORMA NTC-5055, DE DIÁMETRO INTERNO 900 mm	UNID.	m	UBICACIÓN	Tres Puertas - Santagueda Caldas





Fecha	DIMENSIONES UBICACIÓN			LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	LONGITUD (M)
31/05/2026	TRANSVERSAL	K2+155	ENCOLE	0,90			0,90
31/05/2026	TRANSVERSAL	K1+990	CD-CI	16,80			16,80
31/05/2026	ALARGAMIENTO	K1+990	CAPTACION AGUA	14,75			14,75
31/05/2026	TRANSVERSAL	K1+541	CD-CI	12,75			12,75
31/05/2026	TRANSVERSAL	K1+353	CI	4,50			4,50
31/05/2026	TRANSVERSAL	K0+822	CI	7,75			7,75
31/05/2026	TRANSVERSAL	K0+690	CD-CI	12,50			12,50
31/05/2026	TRANSVERSAL	K0+647	CD	3,50			3,50



SUBTOTAL CONSOLIDADO DE LA ACTIVIDAD	73,45
TOTAL COBROS ANTERIORES	57,70
TOTAL ACUMULADO	131,20
TOTAL COBRO PRESENTE ACTA	73,50

ING. MANUEL FERNANDO SALAZAR
Residente de Obra
Mat. Profesional 17202-215678 CLD

ING. KAREN ANDREA MURCIA GARCIA
Residente de Interventoría
Mat. Profesional 15202-400597 BYC

ING. MAURICIO A. CORTES R.
Director de Obra
Mat. Profesional 63202-72533QND

DANIEL FERNANDO MORALES DOTTOR
Director de Interventoría
Mat. Profesional 15202-207272BYC

GOBIERNO DE CALDAS

FORMATO PREACTA

Tipo de Documento: Formato - Registro	
Código: F-EJD-13	
Versión aprobada:	1
	Página 1 de 1

FECHA	1	6	2026	PREACTA N°	3	ELABORÓ	MAURICIO ANTONIO CORTES REINA	PÁGINA	1	DE	1

NUMERO Y OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA No. 2811/2025-1755 OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS KD+100 - K2+540
CONTRATISTA	CONSORCIO HORIZONTE AZUL — INTERVENTORÍA: ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A BIC

No.	21	ITEM DE PAGO	663.1.2	DESCRIPCION	TUBERÍA DE PVC 4" PARA FILTROS	UNID.	m	UBICACIÓN	Tres Puertas - Santagueda Caldas



Fecha	DIMENSIONES UBICACIÓN			LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	LONGITUD (M)
31/05/2026	BOX CULVERT	K1+266	FILTRO LATERAL DERECHO	8,00			8,00
31/05/2026	BOX CULVERT	K1+266	FILTRO LATERAL IZQUIERDO	8,00			8,00

SUBTOTAL CONSOLIDADO DE LA ACTIVIDAD	16,00
TOTAL COBROS ANTERIORES	0,00
TOTAL ACUMULADO	16,00
TOTAL COBRO PRESENTE ACTA	16,00

ING. MANUEL FERNANDO SALAZAR
Residente de Obra
Mat. Profesional 17202-215676 CLD

ING. KAREN ANDREA MURCIA GARCIA
Residente de Interventoría
Mat. Profesional 15202-400597 BYC

ING. MAURICIO A. CORTES R.
Director de Obra
Mat. Profesional 68202-72533QND

DANIEL FERNANDO MORALES DOTTOR
Director de Interventoría
Mat. Profesional 15202-207372BYC

GOBIERNO DE CALDAS

FORMATO PREACTA

Tipo de Documento: Formato - Registro
Código: F-EJO-12
Versión aprobada: 1
Página 1 de 1


FECHA	1	6	2026	PREACTA N°	3	ELABORÓ	MAURICIO ANTONIO CORTES REINA	PÁGINA	1	DE	1

NUMERO Y OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA No. 2811/2025-1755 OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS KO+100 - K2+540		
CONTRATISTA	CONSORCIO HORIZONTE AZUL	INTERVENTORIA	ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A BIC

No.	22	ITEM DE PAGO	673.1.1	DESCRIPCION	GEOTEXTIL TIPO NT 2500	UNID.	m2	UBICACIÓN	Tres Puertas - Santagueda, Caldas



Fecha	UBICACIÓN			DIMENSIONES			AREA (M2)
				LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	
31/05/2026	BOX CULVERT	K1+266	FILTRO LATERAL DERECHO	8,00	3,50		28,00
31/05/2026	BOX CULVERT	K1+266	FILTRO LATERAL IZQUIERDO	8,00	3,50		28,00

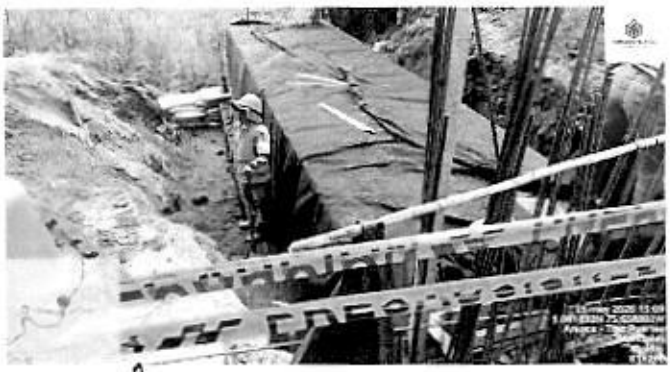

SUBTOTAL CONSOLIDADO DE LA ACTIVIDAD	56,00
TOTAL COBROS ANTERIORES	0,00
TOTAL ACUMULADO	56,00
TOTAL COBRO PRESENTE ACTA	56,00

ING. MANUEL FERNANDO SALAZAR
Residente de Obra
Mat. Profesional 17202-215678 CLD

ING. KAREN ANDREA MURCIA GARCIA
Residente de Interventoría
Mat. Profesional 15202-400597 BYC

ING. MAURICIO A. CORTES R.
Director de Obra
Mat. Profesional 68202-72533QND

DANIEL FERNANDO MORALES DOTTOR
Director de Interventoría
Mat. Profesional 15202-207372BYC

GOBIERNO DE CALDAS

FORMATO PREACTA

Tipo de Documento: Formato - Registro
Codigo: F-GJO-13
Versión aprobada: 1
Página 1 de 1

FECHA	1	6	2026	PREACTA Nº	3	ELABORÓ	MAURICIO ANTONIO CORTES REINA	PÁGINA	1	DE	1

NUMERO Y OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA No. 29112025-1755 OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS K0+100 - K2+540
CONTRATISTA	CONSORCIO HORIZONTE AZUL — INTERVENTORIA: ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A B/C

No.	23	ITEM DE PAGO	673.2	DESCRIPCION	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	UNID.	m3	UBICACIÓN	Tres Puertas - Santagueda, Caldas



Fecha	DIMENSIONES UBICACIÓN			LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	VOLUMEN (M3)
31/05/2026	BOX CULVERT	K1+266	FILTRO LATERAL DERECHO	6,00	0,30	2,50	6,00
31/05/2026	BOX CULVERT	K1+266	DESCUENTO TUBERIA 4"	6,00	-0,01		-0,06
31/05/2026	BOX CULVERT	K1+266	FILTRO LATERAL IZQUIERDO	6,00	0,30	2,50	6,00
31/05/2026	BOX CULVERT	K1+266	DESCUENTO TUBERIA 4"	6,00	-0,01		-0,06



SUBTOTAL CONSOLIDADO DE LA ACTIVIDAD	11,87
TOTAL COBROS ANTERIORES	0,00
TOTAL ACUMULADO	11,90
TOTAL COBRO PRESENTE ACTA	11,90

ING. MANUEL FERNANDO SALAZAR
Residente de Obra
Mat. Profesional 17202-215678 CLD

ING. KAREN ANDREA MURCIA GARCIA
Residente de Interventoria
Mat. Profesional 15202-400597 BYC

ING. MAURICIO A. CORTES R.
Director de Obra
Mat. Profesional 83202-72533CND

DANIEL FERNANDO MORALES DOTTOR
Director de Interventoria
Mat. Profesional 15202-207372BYC

GOBIERNO DE CALDAS

FORMATO PREACTA

Tipo de Documento: Formato - Registro
Código: F-EJG-12
Versión aprobada: 1
Página 1 de 1

FECHA	1	6	2026	PREACTA Nº	3	ELABORÓ	MAURICIO ANTONIO CORTES REINA	PÁGINA	1	DE	1

NUMERO Y OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA No. 29112025-1756 OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS KD+100 - K2+540		
CONTRATISTA	CONSORCIO HORIZONTE AZUL	INTERVENTORÍA	ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A BIC

No.	24	ITEM DE PAGO	601.8P	DESCRIPCION	JUNTA DE CONSTRUCCIÓN CINTA PVC	UNID.	m	UBICACIÓN	Tres Puertas - Santagueda, Caldas



Fecha	UBICACIÓN			DIMENSIONES			
				LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	LONGITUD (ML)
31/05/2026	BOX CULVERT	K1+266	LATERAL DERECHO	8,00			8,00
31/05/2026	BOX CULVERT	K1+266	LATERAL IZQUIERDO	8,00			8,00



SUBTOTAL CONSOLIDADO DE LA ACTIVIDAD	16,00
TOTAL COBROS ANTERIORES	0,00
TOTAL ACUMULADO	16,00
TOTAL COBRO PRESENTE ACTA	16,00

ING. MANUEL FERNANDO SALAZAR
Residente de Obra
Mat. Profesional 17202-215878 CLD

ING. KAREN ANDREA MURCIA GARCIA
Residente de Interventoría
Mat. Profesional 15202-400597 BYC

ING. MAURICIO A. CORTES R
Director de Obra
Mat. Profesional 63202-72533CND

DANIEL FERNANDO MORALES DOTTOR
Director de Interventoría
Mat. Profesional 15202-267372BYC

GOBIERNO DE CALDAS

FORMATO PREACTA

Código: F-GJG-12

Página 1 de 1

FECHA	1	6	2026	PREACTA N°	3	ELABORO	MAURICIO ANTONIO CORTES REINA	PÁGINA	1	DE	1

NUMERO Y OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA No. 29112025-1756 OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS K0+100 - K2+540		
CONTRATISTA	CONSORCIO HORIZONTE AZUL	INTERVENTORIA	ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A BIC

No.	55	ITEM DE PAGO	200.7P	DESCRIPCION	AHUYENTAMIENTO, RESCATE Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE EN 2.44 KILÓMETROS DE LA VÍA TRES PUERTAS - LA ROCHELA	UNID.	GL	UBICACIÓN	Tres Puertas - Sarragueta, Caldas





Fecha	DIMENSIONES				CANTIDAD (GL)
	UBICACIÓN	CANTIDAD (GL)			
7/01/1900	K0+100 AL K2+540	0,50			0,50
	AHUYENTAMIENTO CERCAS VIVAS				





SUBTOTAL CONSOLIDADO DE LA ACTIVIDAD	0,50
TOTAL COBROS ANTERIORES	0,50
TOTAL ACUMULADO	1,00
TOTAL COBRO PRESENTE ACTA	0,50

ING. MANUEL FERNANDO BALAZAR
Residente de Obra
Mat. Profesional 17202-215673 CLD

ING. KAREN ANDREA MURCIA GARCIA
Residente de Interventoría
Mat. Profesional 15202-400597 BYC

ING. MAURICIO A. CORTES R.
Director de Obra
Mat. Profesional 63202-72539QND

DANIEL FERNANDO MORALES DOTTOR
Director de Interventoría
Mat. Profesional 15202-207372BYC

GOBIERNO DE CALDAS

FORMATO PREACTA

Tipo de Documento Formato - Registro:
Código: F.E.G-12
Versión documento: 1
Página 1 de 1

FECHA	1	6	2026	PREACTA N°	3	ELABORÓ	MAURICIO ANTONIO CORTÉS REINA	PÁGINA	1	DE	1

NÚMERO Y OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA No. 20112025-1755 OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS K0+100 - K2+540		
CONTRATISTA	CONSORCIO HORIZONTE AZUL	INTERVENTORIA	ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A BIC

No.	69	ITEM DE PAGO	200.6P	DESCRIPCION	TALA DE ARBOL (ARBOL DE 1.0 5.00 M ALTURA (1 < h =< 5) ; DAP > 0.10 M). INCLUYE CORTE PARTE AÉREA Y RADICULAR, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL VEGETAL	UNID.	Und	UBICACIÓN	Tres Puertas - Santagueda, Caldas



Fecha	DIMENSIONES							Cantidad (Und)
	N° Arbol	ID árbol	Coordenadas Datum		CAP Cuadratico	Altura Total (m)	Observacion	
30/04/2026	27	L027	4705454,118	2120419,019	97	2		1,00
30/04/2026	47	L047	4705337,272	2120270,829	62	2		1,00
30/04/2026	55	L055	4705308,338	2120199,639	32	4		1,00
30/04/2026	67	L067	4705651,652	2120995,787	35	5		1,00
30/04/2026	68	L068	4705645,777	2120956,585	32	5		1,00
30/04/2026	71	L071	4705638,562	2120955,398	90	4		1,00
30/04/2026	72	L072	4705614,365	2120955,829	53	5		1,00
30/04/2026	76	L076	4705523,637	2120924,235	57	4		1,00
30/04/2026	119	L119	4705529,282	2120900,334	45	5		1,00
30/04/2026	134	L134	4705529,371	2120510,306	34	5		1,00
30/04/2026	322	L322	4704532,785	2119945,617	51	5		1,00

SUBTOTAL CONSOLIDADO DE LA ACTIVIDAD	11,00
TOTAL COBROS ANTERIORES	42,00
TOTAL ACUMULADO	53,00
TOTAL COBRO PRESENTE ACTA	11,00

ING. MANUEL FERNANDO SALAZAR
Residente de Obra
Mat. Profesional 17202-216678 CLD

ING. ADRIAN ANDRES MURCIA GARCIA
Residente de Interventoría
Mat. Profesional 1520240060 / SYC

ING. MAURICIO A. CORTES R.
Director de Obra
Mat. Profesional 63202-725330HD

DANIEL FERNANDO MORALES DOTTOR
Director de Interventoría
Mat. Profesional 13202-203373BYC

GOBIERNO DE CALDAS

FORMATO PREACTA

Tipo de Documento: Formato - Registro
Código: F-EJO-12
Versión aprobada: 1
Página 1 de 1

FECHA	1	6	2026	PREACTA N°	3	ELABORÓ	MAURICIO ANTONIO CORTES REINA	PÁGINA	1		1

NUMERO Y OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA No. 28112025-1755 OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS K0+100 - K2+540		
CONTRATISTA	CONSORCIO HORIZONTE AZUL	INTERVENTORIA	ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A BIC

No.	60	ITEM DE PAGO	200,9P	DESCRIPCION	TALA DE ÁRBOL (ÁRBOL DE 5,0-10,0 M ALTURA (5 < h <= 10), DAP > 0,10 M). INCLUYE CORTE PARTE AÉREA Y RADICULAR, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL VEGETAL	UNID.	Und	UBICACIÓN	Tres Puertas - Santagueda, Caldas





Fecha	DIMENSIONES							Cantidad (Und)
	N° Arbol	ID árbol	Coordenadas Datum		CAP Cuadratico	Altura Total (m)	Observacion	
31/05/2026	17	L017	4705498,215	2120487,414	73	10		1,00
31/05/2026	31	L031	4705362,054	2120309,442	44	10		1,00
31/05/2026	34	L034	4705358,272	2120306,803	87	9		1,00
31/05/2026	36	L036	4705362,472	2120303,025	32	7		1,00
31/05/2026	37	L037	4705356,923	2120302,274	118	9		1,00
31/05/2026	38	L038	4705356,169	2120307,807	172	10		1,00
31/05/2026	39	L039	4705353,272	2120304,612	54	7		1,00
31/05/2026	43	L043	4705345,610	2120302,431	50	10		1,00
31/05/2026	44	L044	4705342,518	2120305,762	34	6		1,00
31/05/2026	45	L045	4705341,623	2120303,885	93	7		1,00
31/05/2026	46	L046	4705349,820	2120301,307	60	7		1,00
31/05/2026	48	L048	4705338,273	2120244,388	35	8		1,00
31/05/2026	49	L049	4705323,632	2120217,469	56	9		1,00
31/05/2026	50	L050	4705322,858	2120218,015	69	7		1,00
31/05/2026	51	L051	4705322,862	2120219,121	179	8		1,00
31/05/2026	54	L054	4705308,558	2120166,085	110	9		1,00
31/05/2026	58	L058	4705746,833	2120959,709	32	6		1,00
31/05/2026	61	L061	4705736,403	2120958,867	40	9		1,00
31/05/2026	62	L062	4705736,403	2120958,867	57	6		1,00
31/05/2026	63	L063	4705736,071	2120958,979	55	9		1,00
31/05/2026	66	L066	4705651,319	2120955,788	39	6		1,00
31/05/2026	69	L069	4705645,777	2120956,585	34	6		1,00
31/05/2026	75	L075	4705524,004	2120932,530	67	9		1,00
31/05/2026	78	L078	4705516,047	2120912,652	47	6		1,00
31/05/2026	82	L082	4705513,192	2120892,532	60	10		1,00
31/05/2026	95	L095	4705520,810	2120803,346	44	10		1,00
31/05/2026	97	L097	4705515,470	2120799,275	40	8		1,00
31/05/2026	100	L100	4705530,644	2120740,255	104	10		1,00
31/05/2026	107	L107	4705535,916	2120727,513	67	10		1,00
31/05/2026	120	L120	4705533,912	2120590,913	64	8		1,00
31/05/2026	124	L124	4705523,727	2120514,852	33	7		1,00
31/05/2026	125	L125	4705523,508	2120515,406	63	9		1,00
31/05/2026	127	L127	4705516,589	2120505,258	47	10		1,00
31/05/2026	131	L131	4705517,025	2120503,376	57	9		1,00
31/05/2026	135	L135	4705526,592	2120510,084	35	6		1,00
31/05/2026	137	L137	4705498,699	2120470,377	54	10		1,00
31/05/2026	141	L141	4705500,983	2120459,196	57	10		1,00
31/05/2026	145	L145	4705498,872	2120458,430	53	9		1,00
31/05/2026	146	L146	4705499,320	2120459,424	50	8		1,00
31/05/2026	148	L148	4705495,629	2120451,917	32	6		1,00
31/05/2026	151	L151	4705489,385	2120444,089	32	7		1,00

GOBIERNO DE CALDAS

FORMATO PREACTA

Tipo de Documento: Formato - Registro	
Código: F-EJO-12	
Versión aprobada	1
	Página 1 de 1

FECHA	1	6	2026	PREACTA N°	3	ELABORÓ	MAURICIO ANTONIO CORTES REINA	PÁGINA	1		1

NUMERO Y OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA No. 29112025-1755 OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS K0+100 - K2+540
CONTRATISTA	CONSORCIO HORIZONTE AZUL — INTERVENTORIA: ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A BIC

No.	60	ITEM DE PAGO	200,8P	DESCRIPCION	TALA DE ÁRBOL (ÁRBOL DE 5,0-10,0 M ALTURA (5 < h <= 10), DAP > 0,10 M). INCLUYE CORTE PARTE AÉREA Y RADICULAR, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL VEGETAL	UNID.	Und	UBICACIÓN	Tres Puertas - Santagueda, Caldas





Fecha	DIMENSIONES							Cantidad (Und)
	Nº Arbol	ID árbol	Coordenadas Datum		CAP Cuadratico	Altura Total (m)	Observacion	
31/05/2026	153	L153	4705490,050	2120443,865	54	9		1,00
31/05/2026	159	L159	4705478,936	2120438,491	39	9		1,00
31/05/2026	160	L160	4705478,826	2120438,602	45	8		1,00
31/05/2026	165	L165	4705476,044	2120436,401	32	7		1,00
31/05/2026	170	L170	4705474,200	2120419,595	59	10		1,00
31/05/2026	172	L172	4705469,862	2120416,516	62	9		1,00
31/05/2026	174	L174	4705460,797	2120396,864	98	8		1,00
31/05/2026	175	L175	4705462,037	2120401,837	72	9		1,00
31/05/2026	177	L177	4705433,495	2120366,004	44	7		1,00
31/05/2026	181	L181	4705401,734	2120329,522	37	6		1,00
31/05/2026	182	L182	4705401,622	2120329,301	50	7		1,00
31/05/2026	183	L183	4705389,172	2120322,605	87	9		1,00
31/05/2026	186	L186	4705375,718	2120314,475	72	7		1,00
31/05/2026	189	L189	4705374,790	2120304,523	51	10		1,00
31/05/2026	203	L203	4705351,836	2120251,965	37	10		1,00
31/05/2026	211	L211	4705326,560	2120201,186	58	10		1,00
31/05/2026	212	L212	4705324,879	2120196,990	32	7		1,00
31/05/2026	213	L213	4705320,072	2120187,829	90	8		1,00
31/05/2026	220	L220	4705323,351	2120176,201	38	7		1,00
31/05/2026	221	L221	4705323,463	2120176,311	39	8		1,00
31/05/2026	227	L227	4705319,452	2120145,024	66	6		1,00
31/05/2026	235	L235	4705305,339	2120084,576	42	6		1,00
31/05/2026	239	L239	4705286,291	2120064,984	79	10		1,00
31/05/2026	240	L240	4705285,275	2120060,655	61	6		1,00
31/05/2026	246	L246	4705296,194	2120099,546	33	9		1,00
31/05/2026	249	L249	4705204,376	2119996,831	50	7		1,00
31/05/2026	250	L250	4705204,157	2119997,385	58	7		1,00
31/05/2026	251	L251	4705197,600	2119994,204	55	8		1,00
31/05/2026	253	L253	4705194,828	2119994,547	70	7		1,00
31/05/2026	255	L255	4705188,280	2119993,579	45	9		1,00
31/05/2026	260	L260	4705151,520	2119982,337	80	10		1,00
31/05/2026	267	L267	4704961,415	2120064,642	106	10		1,00
31/05/2026	268	L268	4704961,868	2120066,853	36	8		1,00
31/05/2026	269	L269	4704960,094	2120066,971	119	10		1,00
31/05/2026	270	L270	4704950,393	2120081,612	54	8		1,00
31/05/2026	272	L272	4704879,752	2120057,678	79	10		1,00
31/05/2026	273	L273	4704877,422	2120057,466	34	9		1,00
31/05/2026	275	L275	4704877,639	2120056,470	58	9		1,00
31/05/2026	276	L276	4704878,733	2120052,705	88	10		1,00
31/05/2026	279	L279	4704888,040	2119996,363	41	7		1,00
31/05/2026	281	L281	4704867,398	2119912,713	37	9		1,00

GOBIERNO DE CALDAS

FORMATO PREACTA

Tipo de Documento: Formato - Registro	
Codigo: F-EJO-12	
Version aprobada:	1
Pagina 1 de 1	

FECHA	1	6	2026	PREACTA N°	3	ELABORÓ	MAURICIO ANTONIO CORTES REINA	PÁGINA	1		1

NUMERO Y OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA No. 29112025-1755 OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS K0+100 - K2+540
CONTRATISTA	CONSORCIO HORIZONTE AZUL — INTERVENTORIA: ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A BIC

No.	60	ITEM DE PAGO	200.9P	DESCRIPCION	TALA DE ÁRBOL (ÁRBOL DE 5,0-10,0 M ALTURA (5 < h <= 10), DAP > 0,10 M). INCLUYE CORTE PARTE AÉREA Y RADICULAR, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL VEGETAL	UNID.	Und	UBICACIÓN	Tres Puertas - Santagueda, Caldas



Fecha	DIMENSIONES							Cantidad (Und)
	N° Arbol	ID árbol	Coordenadas Datum		CAP Cuadratico	Altura Total (m)	Observacion	
31/05/2026	283	L283	4704846,821	2119898,971	36	10		1,00
31/05/2026	287	L287	4704833,907	2119887,299	86	10		1,00
31/05/2026	292	L292	4704853,468	2119896,952	103	10		1,00
31/05/2026	293	L293	4704847,788	2119891,334	84	10		1,00
31/05/2026	296	L296	4704843,693	2119893,564	78	10		1,00
31/05/2026	298	L298	4704838,919	2119892,367	37	7		1,00
31/05/2026	299	L299	4704837,117	2119885,737	57	10		1,00
31/05/2026	300	L300	4704827,869	2119875,488	66	8		1,00
31/05/2026	302	L302	4704815,600	2119859,057	63	10		1,00
31/05/2026	303	L303	4704815,490	2119859,279	55	6		1,00
31/05/2026	316	L316	4704664,297	2119775,281	56	7		1,00
31/05/2026	323	L323	4704529,466	2119947,511	89	10		1,00
31/05/2026	324	L324	4704533,108	2119943,072	40	7		1,00
31/05/2026	325	L325	4704524,944	2119953,945	58	8		1,00
31/05/2026	326	L326	4704525,167	2119954,166	51	9		1,00
31/05/2026	329	L329	4704879,134	2119934,566	130	9		1,00

SUBTOTAL CONSOLIDADO DE LA ACTIVIDAD	98,00
TOTAL COBROS ANTERIORES	64,00
TOTAL ACUMULADO	162,00
TOTAL COBRO PRESENTE ACTA	98,00

ING. MANUEL FERNANDO SALAZAR
Residente de Obra
Mat. Profesional 17202-215678 CLD

ING. KAREN ANDREA MURCIA GARCIA
Residente de Interventoría
Mat. Profesional 15202-400597 BYC

ING. MAURICIO A. CORTES R.
Director de Obra
Mat. Profesional 63202-72533QND

DANIEL FERNANDO MORALES DOTTOR
Director de Interventoría
Mat. Profesional 15202-207372BYC

GOBIERNO DE CALDAS

FORMATO PREACTA

FECHA	1	6	2026	PREACTA N°	3	ELABORO	MAURICIO ANTONIO CORTES REINA	PÁGINA	1	DE	1

NUMERO Y OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA No. 2911/2025-1156 OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS K0+100 - K2+640		
CONTRATISTA	CONSORCIO HORIZONTE AZUL	INTERVENTORIA	ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A BIC

No.	61	ITEM DE PAGO	200.10P	DESCRIPCION	TALA DE ARBOL (ARBOL DE 10.0-15.0 M ALTURA (10 < h <= 15), DAP > 0.10 M), INCLUYE CORTE PARTE AÉREA Y RADICULAR, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL VEGETAL	UNID.	Und	UBICACIÓN	Tres Puertas - Santagueda, Caldas







Fecha	DIMENSIONES							Cantidad (Und)
	Nº Arbol	ID árbol	Coordenadas Datum		CAP 1 (cm)	Altura Total (m)	Observacion	
17/04/2026	19	L019	4705462.388	2120468.785	156	13		1.0
17/04/2026	22	L022	4705474.803	2120458.42	150	15		1.0
17/04/2026	23	L023	4705472.779	2120451.569	110	13		1.0
17/04/2026	24	L024	4705464.060	2120435.234	136	12		1.0
17/04/2026	29	L029	4705444.747	2120404.834	108	11		1.0
17/04/2026	30	L030	4705416.26	2120355.692	133	14		1.0
17/04/2026	33	L033	4705359.384	2120307.352	96	12		1.0
17/04/2026	35	L035	4705367.375	2120304.263	47	11		1.0
17/04/2026	41	L041	4705351.168	2120305.395	67	11		1.0
17/04/2026	42	L042	4705345.722	2120302.652	106	13		1.0
17/04/2026	56	L056	4705787.643	2120958.103	99	15		1.0
17/04/2026	59	L059	4705735.628	2120959.092	104	13		1.0
17/04/2026	77	L077	4705513.960	2120917.638	115	12		1.0
17/04/2026	80	L080	4705509.368	2120906.817	88	13		1.0
17/04/2026	83	L083	4705515.182	2120890.975	61	12		1.0
17/04/2026	85	L085	4705521.851	2120867.406	147	14	No se talá	-1.0
17/04/2026	86	L086	4705515.332	2120846.729	172	13		1.0
17/04/2026	87	L087	4705514.440	2120845.405	80	15		1.0
17/04/2026	88	L088	4705512.570	2120822.405	134	12		1.0
17/04/2026	94	L094	4705512.823	2120802.936	113	14		1.0
17/04/2026	98	L098	4705521.482	2120750.801	94	16		1.0
17/04/2026	114	L114	4705533.665	2120714.469	103	13		1.0
17/04/2026	117	L117	4705538.515	2120712.348	128	12		1.0
17/04/2026	118	L118	4705537.504	2120709.255	115	11		1.0
17/04/2026	122	L122	4705529.207	2120524.576	180	15		1.0
17/04/2026	123	L123	4705526.639	2120521.698	91	14		1.0
17/04/2026	126	L126	4705520.845	2120515.156	58	11		1.0
17/04/2026	128	L128	4705516.478	2120505.258	138	13		1.0
17/04/2026	130	L130	4705521.351	2120503.358	87	11		1.0
17/04/2026	132	L132	4705523.923	2120508.548	42	12		1.0
17/04/2026	133	L133	4705523.700	2120508.215	109	15		1.0
17/04/2026	136	L136	4705511.690	2120503.177	36	12		1.0
17/04/2026	138	L138	4705507.150	2120475.541	90	11		1.0
17/04/2026	142	L142	4705501.205	2120459.416	106	14		1.0
17/04/2026	149	L149	4705491.523	2120451.381	70	11		1.0
17/04/2026	150	L150	4705491.079	2120451.494	115	12		1.0
17/04/2026	152	L152	4705489.606	2120443.757	77	13		1.0
17/04/2026	154	L154	4705488.192	2120450.731	85	11		1.0
17/04/2026	155	L155	4705490.060	2120446.299	72	13		1.0
17/04/2026	158	L158	4705485.044	2120440.346	137	14		1.0
17/04/2026	161	L161	4705478.827	2120438.934	96	11		1.0
17/04/2026	162	L162	4705479.707	2120437.050	59	15		1.0
17/04/2026	164	L164	4705480.373	2120437.268	65	11		1.0
17/04/2026	166	L166	4705478.055	2120439.167	88	13		1.0
17/04/2026	167	L167	4705476.245	2120431.533	96	12		1.0
17/04/2026	171	L171	4705467.649	2120417.853	100	12		1.0
17/04/2026	173	L173	4705461.349	2120396.199	139	15		1.0
17/04/2026	176	L176	4705463.456	2120396.189	85	15		1.0
17/04/2026	178	L178	4705433.495	2120365.894	93	12		1.0
17/04/2026	180	L180	4705401.079	2120329.746	74	14		1.0
17/04/2026	185	L185	4705375.161	2120313.813	33	12		1.0
17/04/2026	187	L187	4705360.042	2120314.014	101	14		1.0
17/04/2026	188	L188	4705374.790	2120304.923	92	15		1.0
17/04/2026	208	L208	4705319.901	2120200.218	85	13		1.0
17/04/2026	209	L209	4705327.205	2120196.317	108	14		1.0
17/04/2026	215	L215	4705331.473	2120182.251	78	15		1.0
17/04/2026	222	L222	4705319.911	2120147.579	71	12		1.0
17/04/2026	223	L223	4705317.022	2120147.578	46	11		1.0
17/04/2026	234	L234	4705306.225	2120084.351	152	15		1.0

GOBIERNO DE CALDAS

FORMATO PREACTA

Tipo de Documento: Formato - Registro
Código: FUN-017
Versión aprobada: 1
PÁGINA 1 DE 1

FECHA	1	6	2026	PREACTA N°	3	ELABORÓ	MAURICIO ANTONIO CORTES REINA	PÁGINA	1	DE	1

NUMERO Y OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA No. 29112025-1755 OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS K0+100 - K2+640		
CONTRATISTA	CONSORCIO HORIZONTE AZUL	INTERVENTORIA	ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A BIC

No.	51	ITEM DE PAGO	200.10P	DESCRIPCION	TALA DE ARBOL (ARBOL DE 10.0-15.0 M ALTURA (10 < h <= 15), DAP > 0.10 M). INCLUYE CORTE PARTE AÉREA Y RADICULAR, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE MATERIAL VEGETAL	UNID.	Und	UBICACIÓN	Tres Puertas - Samaguca, Caldas



Fecha	DIMENSIONES							Cantidad (Und)
	N° Arbol	ID árbol	Coordenadas Datum		CAP 1 (cm)	Altura Total (m)	Observacion	
17/04/2026	236	L236	4706302,105	2120080,385	165	15		1,0
17/04/2026	237	L237	4705302,440	2120061,048	45	11		1,0
17/04/2026	238	L238	4705298,967	2120095,838	53	12		1,0
17/04/2026	245	L245	4705312,430	2120109,677	184	15		1,0
17/04/2026	247	L247	4706294,974	2120099,551	62	12		1,0
17/04/2026	252	L252	4706186,933	2119993,547	248	12		1,0
17/04/2026	254	L254	4706186,611	2119992,369	89	13		1,0
17/04/2026	256	L256	4706183,733	2119993,708	100	12		1,0
17/04/2026	257	L257	4706170,535	2119993,984	91	11		1,0
17/04/2026	261	L261	4706153,078	2119983,437	88	13		1,0
17/04/2026	264	L264	4706107,960	2119969,595	138	15		1,0
17/04/2026	271	L271	4704880,457	2120067,299	72	13		1,0
17/04/2026	274	L274	4704877,530	2120056,913	93	11		1,0
17/04/2026	284	L284	4704843,496	2119899,427	161	13		1,0
17/04/2026	285	L285	4704837,384	2119896,687	99	14		1,0
17/04/2026	288	L288	4704833,907	2119887,299	57	12		1,0
17/04/2026	289	L289	4704830,010	2119883,665	99	14		1,0
17/04/2026	291	L291	4704859,024	2119896,844	98	11		1,0
17/04/2026	294	L294	4704847,355	2119893,770	116	12		1,0
17/04/2026	295	L295	4704843,581	2119893,232	61	11		1,0
17/04/2026	297	L297	4704843,137	2119893,013	60	12		1,0
17/04/2026	301	L301	4704820,516	2119867,776	122	14		1,0
17/04/2026	304	L304	4704814,933	2119858,617	62	13		1,0
17/04/2026	306	L306	4704808,273	2119857,538	69	12		1,0
17/04/2026	307	L307	4704806,456	2119847,259	75	11		1,0
17/04/2026	310	L310	4704802,089	2119837,211	106	13		1,0
17/04/2026	318	L318	4704541,842	2119855,650	161	11		1,0
17/04/2026	319	L319	4704535,914	2119870,386	122	12		1,0
17/04/2026	320	L320	4704540,289	2119877,669	132	13		1,0
17/04/2026	327	L327	4704540,979	2119952,885	119	11		1,0

SUBTOTAL CONSOLIDADO DE LA ACTIVIDAD	87,00
TOTAL COBROS ANTERIORES	93,00
TOTAL ACUMULADO	180,00
TOTAL COBRO PRESENTE ACTA	87,00

ING. MANUEL FERNANDO SALAZAR
Residente de Obra
Mat. Profesional 17202-215678 CLD

ING. KAREN ANDREA MURCIA GARCIA
Residente de Interventoria
Mat. Profesional 15202-400597 BYC

ING. MAURICIO A. CORTES R.
Director de Obra
Mat. Profesional 63202-72583QND

DANIEL FERNANDO MORALES DOTTOR
Director de Interventoria
Mat. Profesional 15202-207372BYC

GOBIERNO DE CALDAS

FORMATO PREACTA

Tipo de Documento: Formato – Registro
Código: F-PLO-12
Versión aprobada: 1
Página 1 de 1

FECHA	1	6	2026	PREACTA N°	3	ELABORÓ	MAURICIO ANTONIO CORTES REINA	PÁGINA	1	DE	1

NUMERO Y OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA No 29112025-1755 OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS K0+100 - K2+540		
CONTRATISTA	CONSORCIO HORIZONTE AZUL	INTERVENTORIA	ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A BIC

No.	62	ITEM DE PAGO	200.11P	DESCRIPCION	TALA DE ÁRBOL (ÁRBOL DE 15.0-20.0 M ALTURA (15 < h <= 20), DAP > 0.10 M). INCLUYE CORTE PARTE AÉREA Y RADICULAR, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL VEGETAL	UNID.	Und	UBICACIÓN	Tres Puertas - Santagueda, Caldas





Fecha	DIMENSIONES							Cantidad (Und)
	N° Arbol	ID árbol	Coordenadas Datum		CAP Cuadratico	Altura Total (m)	Observacion	
30/04/2026	32	L032	4705360,17	2120309,340	154	18		1,0
30/04/2026	40	L040	4705353,163	2120304,944	334	17		1,0
30/04/2026	57	L057	4705746,500	2120959,710	163	16		1,0
30/04/2026	64	L064	4705704,110	2120954,575	688	18		1,0
30/04/2026	70	L070	4705637,783	2120954,738	199	18		1,0
30/04/2026	74	L074	4705546,198	2120935,093	333	17		1,0
30/04/2026	92	L092	4705512,276	2120804,819	236	20		1,0
30/04/2026	99	L099	4705531,436	2120744,013	136	17		1,0
30/04/2026	102	L102	4705531,744	2120737,928	315	20		1,0
30/04/2026	103	L103	4705531,618	2120734,389	111	18		1,0
30/04/2026	121	L121	4705528,565	2120530,658	120	17		1,0
30/04/2026	129	L129	4705520,153	2120508,783	97	16		1,0
30/04/2026	184	L184	4705377,710	2120313,360	60	16		1,0
30/04/2026	191	L191	4705373,342	2120303,091	226	18		1,0
30/04/2026	210	L210	4705329,206	2120197,304	47	17		1,0
30/04/2026	214	L214	4705328,612	2120187,794	128	16		1,0
30/04/2026	217	L217	4705328,921	2120182,479	119	16		1,0
30/04/2026	224	L224	4705317,913	2120148,348	143	16		1,0
30/04/2026	225	L225	4705316,985	2120138,507	252	17		1,0
30/04/2026	226	L226	4705319,452	2120145,024	248	19		1,0
30/04/2026	248	L248	4705281,538	2120068,966	502	18		1,0
30/04/2026	258	L258	4705161,076	2119986,390	107	16		1,0
30/04/2026	259	L259	4705156,968	2119985,301	245	17		1,0
30/04/2026	263	L263	4705117,812	2119984,909	141	18		1,0
30/04/2026	288	L288	4704829,013	2119683,890	155	16		1,0
30/04/2026	305	L305	4704809,276	2119658,641	162	16		1,0

SUBTOTAL CONSOLIDADO DE LA ACTIVIDAD	26,00
TOTAL COBROS ANTERIORES	171,00
TOTAL ACUMULADO	197,00
TOTAL COBRO PRESENTE ACTA	26,00

ING. MANJEL FERNANDO BALAZAR
Residente de Obra
Mat. Profesional 17202 215678 CLD

ING. KAREN ANDREA MURCIA GARCIA
Residente de Interventoría
Mat. Profesional 15202-400687 BYC

ING. MAURICIO A. CORTES R.
Director de Obra
Mat. Profesional 63202-275336CND

DANIEL FERNANDO MORALES DOTTOR
Director de Interventoría
Mat. Profesional 15202-207372DYC

GOBIERNO DE CALDAS


FORMATO PREACTA

Tipo de Documento: Formato - Registro
Código: F-SUP-12
Versión aprobada: 1
Página 1 de 1

FECHA	1	6	2026	PREACTA N°	3	ELABORÓ	MAURICIO ANTONIO CORTES REINA	PÁGINA	1	DE	1

NUMERO Y OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA No. 29112025-1755 OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS K0+100 - K2+540		
CONTRATISTA	CONSORCIO HORIZONTE AZUL	INTERVENTORIA	ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A BIC

No.	63	ITEM DE PAGO	200,12P	DESCRIPCION	TALA DE ÁRBOL (ÁRBOL DE > 20,0 M ALTURA, DAP > 0,10 M). INCLUYE CORTE PARTE AÉREA Y RADICULAR, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL VEGETAL	UNID.	Und	UBICACIÓN	Tres Puertas - Santagueda, Caldas

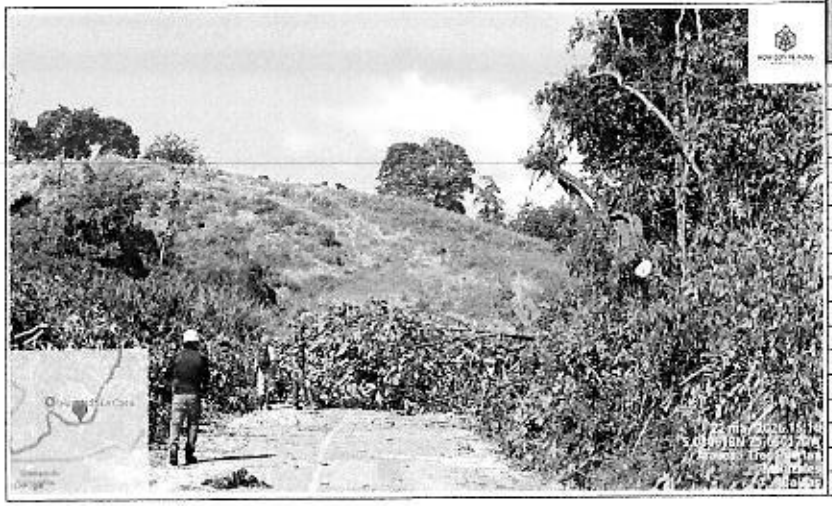

Fecha	DIMENSIONES							Cantidad (Und)
	N° Árbol	ID árbol	Coordenadas Datum		CAP 1 (cm)	Altura Total (m)	Observacion	
17/04/2026	89	L089	4705513	2120823	377	22		1
17/04/2026	190	L190	4705374	2120305	396	21		1

SUBTOTAL CONSOLIDADO DE LA ACTIVIDAD	2,00
TOTAL COBROS ANTERIORES	10,00
TOTAL ACUMULADO	12,00
TOTAL COBRO PRESENTE ACTA	2,00

ING. MANUEL FERNANDO SALAZAR
Residente de Obra
Mat. Profesional 17202-215678 CLD

ING. KAREN ANDREA MURCIA GARCIA
Residente de Interventoria
Mat. Profesional 15202-400597 BYC

ING. MAURICIO A. CORTES R.
Director de Obra
Mat. Profesional 63202-72533GND

DANIEL FERNANDO MORALES DOTTOR
Director de Interventoria
Mat. Profesional 15202-207372BYC

GOBIERNO DE CALDAS


FORMATO PREACTA

Tipo de Documento: Formato - Registro	
Código: F-PJO-17	
Versión aprobada:	1
	Página 1 de 1


FECHA	1	6	2026	PREACTA N°	3	ELABORÓ	MAURICIO ANTONIO CORTES REINA	PÁGINA	1	DE	1

NUMERO Y OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA No. 29112025-1755 OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS K0+100 - K2+540
CONTRATISTA	CONSORCIO HORIZONTE AZUL — INTERVENTORIA: ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A BIC

No.	65	ITEM DE PAGO	200.2.2	DESCRIPCION	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA	UNID.	m2	UBICACIÓN	Tres Puertas - Santagueda, Caldas

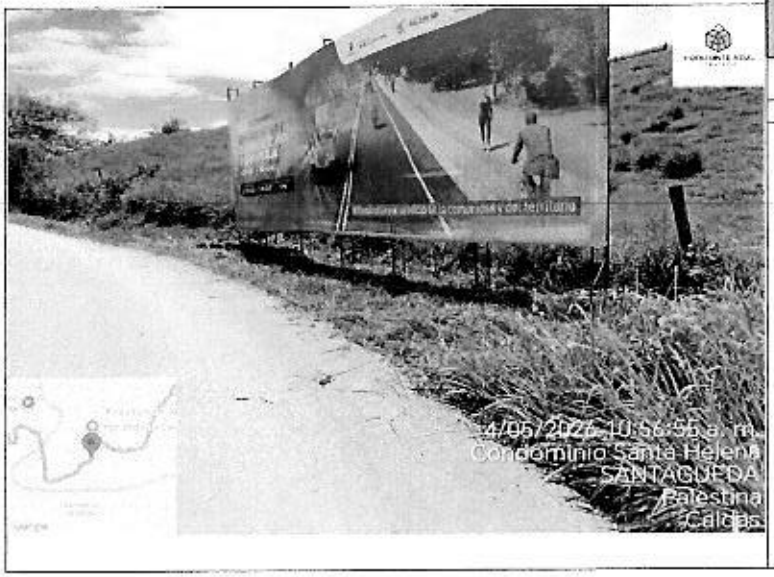

Fecha	DIMENSIONES						AREA (M2)
	UBICACIÓN			LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	
4/05/2026	K1+960	K1+976	VALLA DEL PROYECTO	15,50	3,70		57,35

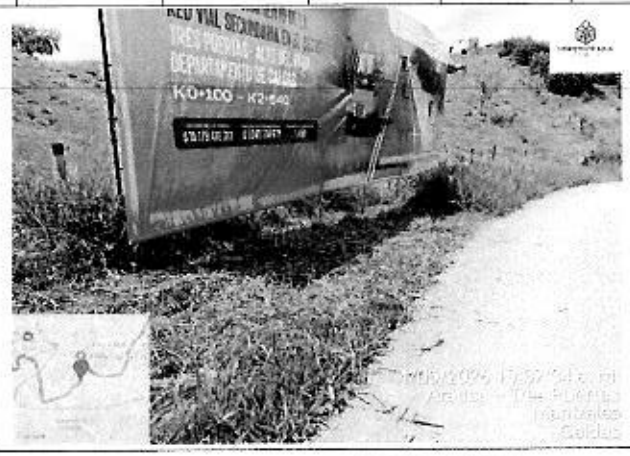

SUBTOTAL CONSOLIDADO DE LA ACTIVIDAD	57,35
TOTAL COBROS ANTERIORES	2.220,80
TOTAL ACUMULADO	2.278,20
TOTAL COBRO PRESENTE ACTA	57,40

ING. MANUEL FERNANDO SALAZAR
Residente de Obra
Mat. Profesional 17202-215678 CLO

ING. KAREN ANDREA MURCIA GARCIA
Residente de Interventoría
Mat. Profesional 15202-400597 BYC

ING. MAURICIO A. CORTES R.
Director de Obra
Mat. Profesional 83202 72533QND

DANIEL FERNANDO MORALES DOTTOR
Director de Interventoría
Mat. Profesional 15202-207372BYC

GOBIERNO DE CALDAS

FORMATO PREACTA

Tipo de Documento: Formato - Registro
Código: F-S-D-12
Versión aplicable: 1
Página 1 de 1

FECHA	1	6	2026	PREACTA N°	3	ELABORÓ	MAURICIO ANTONIO CORTES REINA	PÁGINA	1	DE	1

NUMERO Y OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA No. 20112025-1755 OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS KD+122 – K2+540		
CONTRATISTA	CONSORCIO HORIZONTE AZUL	INTERVENTORIA	ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S.BIC

No.	67	ITEM DE PAGO	221.1P	DESCRIPCION	MATERIAL MIXTO - (MATERIAL DE CANTERA + MATERIAL DE RIO SELECCIONADO)	UNID.	m3	UBICACIÓN	Tres Puertas - Santagueda, Caldas









Fecha	DIMENSIONES			LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	VOLUMEN (M3)
	UBICACIÓN						
31/05/2026	K2+155	TRANSVERSAL - TUBERIA ENCOLE	RELLENO INICIAL	0,40	2,25	0,60	0,54
31/05/2026	K2+156	TRANSVERSAL - TUBERIA ENCOLE	DESCUENTO TUBERIA	0,40	-0,32		-0,13
31/05/2026	K2+156	TRANSVERSAL - TUBERIA ENCOLE	MATERIAL MIXTO	0,40	2,25	0,25	0,23
31/05/2026	K2+155	TRANSVERSAL - TUBERIA CI-CD	MEJORAMIENTO SUBRASANTE	0,90	2,25	0,20	0,41
31/05/2026	K1+990	TRANSVERSAL - TUBERIA CI-CD	RELLENO INICIAL	16,30	1,55	0,60	16,14
31/05/2026	K1+990	TRANSVERSAL - TUBERIA CI-CD	DESCUENTO TUBERIA	16,30	-0,32		-5,18
31/05/2026	K1+990	TRANSVERSAL - TUBERIA CI-CD	MATERIAL MIXTO	16,30	1,65	0,25	6,72
31/05/2026	K1+990	TRANSVERSAL - TUBERIA CI-CD	MEJORAMIENTO SUBRASANTE	16,80	1,65	0,40	11,09
31/05/2026	K1+990	TRANSVERSAL - TUBERIA ALARGAMIENTO	RELLENO INICIAL	14,75	1,50	1,00	22,13
31/05/2026	K1+990	TRANSVERSAL - TUBERIA ALARGAMIENTO	DESCUENTO TUBERIA	14,75	-0,32		-4,89
31/05/2026	K1+990	TRANSVERSAL - TUBERIA ALARGAMIENTO	MATERIAL MIXTO	14,75	1,50	0,25	5,53
31/05/2026	K1+990	TRANSVERSAL - TUBERIA ALARGAMIENTO	MEJORAMIENTO SUBRASANTE	15,25	1,50	0,30	6,86
31/05/2026	K1+541	TRANSVERSAL - TUBERIA CI-CD	RELLENO INICIAL	10,75	1,60	0,63	10,16
31/05/2026	K1+541	TRANSVERSAL - TUBERIA CI-CD	DESCUENTO TUBERIA	10,75	-0,32		-2,42
31/05/2026	K1+541	TRANSVERSAL - TUBERIA CI-CD	MATERIAL MIXTO	10,75	1,60	0,25	4,09
31/05/2026	K1+353	TRANSVERSAL - TUBERIA CD	RELLENO INICIAL	4,00	1,60	0,60	5,40
31/05/2026	K1+353	TRANSVERSAL - TUBERIA CD	DESCUENTO TUBERIA	4,00	-0,32		-1,27
31/05/2026	K1+353	TRANSVERSAL - TUBERIA CD	MATERIAL MIXTO	4,00	1,50	0,25	1,90
31/05/2026	K1+266	BOX CULVERT	SUSTITUCIÓN MEJORAMIENTO SUBRASANTE	8,10	2,10	0,60	10,21
31/05/2026	K1+266	BOX CULVERT	LLENO LATERAL DERECHO	8,00	1,44	1,00	11,50
31/05/2026	K1+266	BOX CULVERT	LLENO LATERAL IZQUIERDO	8,00	1,43	1,00	11,44
31/05/2026	KD+822	TRANSVERSAL - TUBERIA CI	RELLENO INICIAL	7,25	1,90	0,80	11,02
31/05/2026	KD+822	TRANSVERSAL - TUBERIA CI	DESCUENTO TUBERIA	7,25	-0,32		-2,31
31/05/2026	KD+822	TRANSVERSAL - TUBERIA CI	MATERIAL MIXTO	7,25	1,90	0,25	3,44
31/05/2026	KD+690	TRANSVERSAL - TUBERIA CD-CI	RELLENO INICIAL	9,50	1,90	1,15	16,39
31/05/2026	KD+690	TRANSVERSAL - TUBERIA CD-CI	DESCUENTO TUBERIA	9,50	-0,32		-3,02
31/05/2026	KD+690	TRANSVERSAL - TUBERIA CD-CI	MATERIAL MIXTO	9,50	1,50	0,25	3,65
31/05/2026	KD+690	MURO EXISTENTE	LLENO	3,85	0,80	2,00	6,83
					SUBTOTAL CONSOLIDADO DE LA ACTIVIDAD		145,21
					TOTAL COBROS ANTERIORES		75,70
					TOTAL ACUMULADO		221,90
					TOTAL COBRO PRESENTE ACTA		145,20

ING. MANUEL FERNANDO SALAZAR
Residente de Obra
Mat. Profesional 17202-215670 CLD

ING. KAREN ANDREA MURCIA GARCIA
Residente de Interventoria
Mat. Profesional 15202-406697 BYC

ING. MAURICIO A. CORTES R
Director de Obra
Mat. Profesional 68202-72553QND

DANIEL FERNANDO MORALES DOTTOR
Director de Interventoria
Mat. Profesional 16202-207972BYC

GOBIERNO DE CALDAS

FORMATO PREACTA

Tipo de Documento: Formato - Preacta
Código: F-GJ-12
Versión aprobada: 1
Página 1 de 1

FECHA	1	05	2026	PREACTA N°	3	ELABORÓ	MAURICIO ANTONIO CORTES REINA	PÁGINA	1	DE	1

NUMERO Y OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA No. 2911/2025-1756 OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS K0+100 - K2+540		
CONTRATISTA	CONSORCIO HORIZONTE AZUL	INTERVENTORIA	ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A BIC

Ítem	67	ITEM DE PAGO	221.1P	DESCRIPCION	MATERIAL MIXTO - (MATERIAL DE CANTERA + MATERIAL DE RIO SELECCIONADO)	UNID.	m3	UBICACIÓN	Tres Puertas - Santagueda Caldas









Fecha	DIMENSIONES					VOLUMEN ACUMULADO (M3)
	ABSCISA	AREA (M2)	DISTANCIA (M)	VOLUMEN (M3)	OBSERVACIÓN	
31/05/2026	K1+596	0,82				
			2,03	1,67	Area Segun Cartera Topografica	1,67
	K1+598	0,85				
			2,00	1,72	Area Segun Cartera Topografica	3,39
	K1+600	0,87				
			2,00	1,73	Area Segun Cartera Topografica	5,12
	K1+602	0,86				
			2,00	1,69	Area Segun Cartera Topografica	6,81
	K1+604	0,83				
			2,00	1,76	Area Segun Cartera Topografica	8,57
	K1+606	0,93				
			2,00	1,92	Area Segun Cartera Topografica	10,49
	K1+608	0,99				
			2,00	1,96	Area Segun Cartera Topografica	12,45
	K1+610	0,97				
			2,00	1,82	Area Segun Cartera Topografica	14,27
	K1+612	0,85				
			2,00	1,57	Area Segun Cartera Topografica	15,84
	K1+614	0,72				
			2,00	1,42	Area Segun Cartera Topografica	17,26
	K1+616	0,70				
			2,00	1,36	Area Segun Cartera Topografica	18,62
	K1+618	0,66				
			2,00	1,18	Area Segun Cartera Topografica	19,80
	K1+620	0,52				
			2,00	0,95	Area Segun Cartera Topografica	20,75
	K1+622	0,43				
31/05/2026	K1+666	0,80				
			4,00	2,74	Area Segun Cartera Topografica	23,49
	K1+670	0,57				
			4,00	2,10	Area Segun Cartera Topografica	25,59
	K1+674	0,48				
			4,00	1,90	Area Segun Cartera Topografica	27,49
	K1+678	0,47				
			4,00	1,72	Area Segun Cartera Topografica	29,21
	K1+682	0,90				
			4,00	2,12	Area Segun Cartera Topografica	31,33
	K1+686	0,67				
			4,00	2,64	Area Segun Cartera Topografica	33,97
	K1+690	0,65				
			4,00	2,72	Area Segun Cartera Topografica	36,69
	K1+694	0,71				
			4,00	2,68	Area Segun Cartera Topografica	39,37
	K1+696	0,63				
			2,00	1,35	Area Segun Cartera Topografica	40,72
	K1+700	0,72				
			4,00	3,38	Area Segun Cartera Topografica	44,09
	K1+704	0,66				
			4,00	4,04	Area Segun Cartera Topografica	48,12
	K1+708	1,06				
			2,00	2,10	Area Segun Cartera Topografica	50,22
	K1+710	1,04				
			4,00	4,80	Area Segun Cartera Topografica	55,02
	K1+714	1,36				
			4,00	5,48	Area Segun Cartera Topografica	60,50
	K1+718	1,36				
			2,00	2,65	Area Segun Cartera Topografica	63,15
	K1+720	1,30				
			4,00	4,56	Area Segun Cartera Topografica	67,74
	K1+724	0,98				
			4,00	4,80	Area Segun Cartera Topografica	72,54
	K1+728	1,42				
			2,00	2,90	Area Segun Cartera Topografica	75,44
	K1+730	1,48				
			4,00	5,64	Area Segun Cartera Topografica	81,08
	K1+734	1,54				
			4,00	5,06	Area Segun Cartera Topografica	86,14
	K1+738	1,19				
			2,00	2,36	Area Segun Cartera Topografica	88,50
	K1+740	1,17				
			2,00	2,44	Area Segun Cartera Topografica	90,94
	K1+742	1,27				
			3,00	3,82	Area Segun Cartera Topografica	94,86
	K1+745	1,34				
			5,00	6,45	Area Segun Cartera Topografica	101,31
	K1+750	1,24				
			4,00	4,98	Area Segun Cartera Topografica	106,29
	K1+754	1,25				
			4,00	4,58	Area Segun Cartera Topografica	110,87
	K1+758	1,04				
			6,00	6,21	Area Segun Cartera Topografica	117,08
	K1+764	1,03				
			4,00	4,12	Area Segun Cartera Topografica	121,20
	K1+768	1,03				
			4,00	3,84	Area Segun Cartera Topografica	125,04
	K1+772	0,89				
			4,00	2,88	Area Segun Cartera Topografica	127,92
	K1+776	0,55				

GOBIERNO DE CALDAS

FORMATO PREACTA

Tipo de Documento: Formato - Registro
Código: F-SUP-13
Versión vigente: 1
Página 1 de 1

FECHA	1	06	2026	PREACTA N°	3	ELABORÓ	MAURICIO ANTONIO CORTES REINA	PÁGINA	1	DE	1

NUMERO Y OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA No. 29112025-1755 OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS K0+000 - K2+540		
CONTRATISTA	CONSORCIO HORIZONTE AZUL	INTERVENTORIA	ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A BIC

No.	07	ITEM DE PAGO	221.1P	DESCRIPCION	MATERIAL MIXTO - (MATERIAL DE CANTERA + MATERIAL DE RIO SELECCIONADO)	UNID.	m3	UBICACIÓN	Tres Puertas - Sensaguela Caldas







Fecha	DIMENSIONES					VOLUMEN ACUMULADO (M3)
	ABSCISA	AREA (M2)	DISTANCIA (M)	VOLUMEN (M3)	OBSERVACIÓN	
31/05/2026	K1+855	0,46				
			5,00	2,33	Area Según Cartera Topografica	130,24
	K1+860	0,47				
			5,00	4,23	Area Según Cartera Topografica	134,47
	K1+865	1,22				
			5,00	6,55	Area Según Cartera Topografica	141,02
	K1+870	1,40				
			5,00	8,25	Area Según Cartera Topografica	149,27
	K1+875	1,80				
			5,00	8,40	Area Según Cartera Topografica	156,87
	K1+880	1,86				
			5,00	8,20	Area Según Cartera Topografica	167,87
	K1+885	1,82				
			5,00	9,80	Area Según Cartera Topografica	177,87
	K1+890	2,10				
			5,00	8,85	Area Según Cartera Topografica	186,52
	K1+895	1,44				
			5,00	7,33	Area Según Cartera Topografica	193,84
	K1+900	1,49				
			5,00	6,63	Area Según Cartera Topografica	200,47
	K1+905	1,16				
			5,00	5,95	Area Según Cartera Topografica	206,42
	K1+910	1,22				
			5,00	5,83	Area Según Cartera Topografica	212,24
	K1+915	1,11				
			5,00	5,80	Area Según Cartera Topografica	218,04
	K1+920	1,21				
			5,00	6,43	Area Según Cartera Topografica	224,47
	K1+925	1,38				
			5,00	7,45	Area Según Cartera Topografica	231,92
	K1+930	1,62				
			5,00	10,18	Area Según Cartera Topografica	242,09
	K1+935	2,45				
			5,00	12,15	Area Según Cartera Topografica	254,24
	K1+940	2,41				
			5,00	13,98	Area Según Cartera Topografica	268,22
	K1+945	3,18				
			5,00	22,45	Area Según Cartera Topografica	290,67
	K1+950	5,80				
			5,00	24,05	Area Según Cartera Topografica	314,69
	K1+955	3,81				
			5,00	30,38	Area Según Cartera Topografica	345,07
	K1+960	8,34				
			5,00	43,18	Area Según Cartera Topografica	388,24
	K1+965	8,93				
			5,00	44,50	Area Según Cartera Topografica	432,74
	K1+970	8,87				
			5,00	46,98	Area Según Cartera Topografica	479,72
	K1+975	9,82				
			5,00	60,43	Area Según Cartera Topografica	540,14
	K1+980	14,25				
			5,00	69,08	Area Según Cartera Topografica	609,22
	K1+985	13,38				
			5,00	60,85	Area Según Cartera Topografica	670,07
	K1+990	10,96				
			5,00	52,86	Area Según Cartera Topografica	722,94
	K1+995	10,19				
			5,00	46,13	Area Según Cartera Topografica	769,07
	K2+000	8,29				
			5,00	40,30	Area Según Cartera Topografica	809,37
	K2+005	7,86				
			5,00	34,18	Area Según Cartera Topografica	843,54
	K2+010	5,81				
			5,00	22,98	Area Según Cartera Topografica	866,52
	K2+015	3,38				
			5,00	8,45	Area Según Cartera Topografica	874,97
	K2+020	0,00				

GOBIERNO DE CALDAS

FORMATO PREACTA

FECHA	1	09	2026	PREACTA N°	3	ELABORÓ	MAURICIO ANTONIO CORTES REINA	PAGINA	1	DE	1

NUMERO Y OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA No. 2311/2025-1755 OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS K0+100 - K2+540
CONTRATISTA	CONSORCIO HORIZOVTE AZUL
INTERVENTORIA	ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A BIC

No.	57	ITEM DE PAGO	221.1P	DESCRIPCION	MATERIAL MIXTO - (MATERIAL DE CANTERA + MATERIAL DE RIO SELECCIONADO)	UNID.	m3	UBICACIÓN	Tres Puertas - Santagueda, Caldas







Fecha	DIMENSIONES					VOLUMEN ACUMULADO (M3)
	ABSCISA	AREA (M2)	DISTANCIA (M)	VOLUMEN (M3)	OBSERVACIÓN	
31/05/2026	K2+095	0,68				
			5,00	5,73	Area Segun Cartera Topografica	890,69
	K2+100	1,61				
			5,00	8,23	Area Segun Cartera Topografica	898,92
	K2+105	1,68				
			5,00	8,00	Area Segun Cartera Topografica	906,92
	K2+110	1,52				
			5,00	7,48	Area Segun Cartera Topografica	914,39
	K2+115	1,47				
			5,00	7,43	Area Segun Cartera Topografica	921,82
	K2+120	1,50				
			5,00	6,38	Area Segun Cartera Topografica	928,19
	K2+125	1,05				
			5,00	4,48	Area Segun Cartera Topografica	932,67
	K2+130	0,74				
			5,00	4,30	Area Segun Cartera Topografica	936,97
	K2+135	0,96				
			5,00	4,84	Area Segun Cartera Topografica	941,84
	K2+140	0,97				
			5,00	4,80	Area Segun Cartera Topografica	946,64
	K2+145	0,95				
			5,00	4,93	Area Segun Cartera Topografica	951,57
	K2+150	1,02				
			5,00	4,90	Area Segun Cartera Topografica	956,47
	K2+155	0,94				
			5,00	4,18	Area Segun Cartera Topografica	960,64
	K2+160	0,73				
			5,00	4,08	Area Segun Cartera Topografica	964,72
	K2+165	0,90				
			5,00	4,23	Area Segun Cartera Topografica	968,94
	K2+170	0,79				
			5,00	4,13	Area Segun Cartera Topografica	973,07
	K2+175	0,86				
			5,00	4,03	Area Segun Cartera Topografica	977,09
	K2+180	0,75				
			5,00	4,18	Area Segun Cartera Topografica	981,27
	K2+185	0,92				
			5,00	5,45	Area Segun Cartera Topografica	986,72
	K2+190	1,26				
			5,00	7,55	Area Segun Cartera Topografica	994,27
	K2+195	1,76				
			5,00	7,18	Area Segun Cartera Topografica	1.001,44
	K2+200	1,11				
			5,00	4,83	Area Segun Cartera Topografica	1.006,27
	K2+205	0,82				
			5,00	4,45	Area Segun Cartera Topografica	1.010,72
	K2+210	0,96				
			5,00	5,08	Area Segun Cartera Topografica	1.015,79
	K2+215	1,07				
			5,00	4,83	Area Segun Cartera Topografica	1.020,62
	K2+220	0,86				
			5,00	4,55	Area Segun Cartera Topografica	1.025,17
	K2+225	0,96				
			5,00	4,80	Area Segun Cartera Topografica	1.029,97
	K2+230	0,96				
			5,00	5,33	Area Segun Cartera Topografica	1.035,29
	K2+235	1,17				
			5,00	4,93	Area Segun Cartera Topografica	1.040,22
	K2+240	0,80				
			5,00	2,00	Area Segun Cartera Topografica	1.042,22
	K2+245	0,00				

GOBIERNO DE CALDAS

FORMATO PREACTA

FECHA	1 / 05 / 2026	PREACTA N°	3	ELABORÓ	MAURICIO ANTONIO CORTES REINA	PÁGINA	1 DE 1

NUMERO Y OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA No. 2311202S-1755 OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS K0+100 - K2+940
CONTRATISTA	CONSORCIO HORIZONTE AZUL
INTERVENTORIA	ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A BIC

No.	07	ITEM DE PAGO	221.1P	DESCRIPCION	MATERIAL MIXTO - (MATERIAL DE CANTERA + MATERIAL DE RIO SELECCIONADO)	UNID.	m3	UBICACIÓN	Tres Puertas - Santagueda, Caldas



Fecha	DIMENSIONES					VOLUMEN ACUMULADO (M3)
	ABSCISA	AREA (M2)	DISTANCIA (M)	VOLUMEN (M3)	OBSERVACIÓN	
31/05/2026	K2+325	1,54				
			5,00	9,25	Area Segun Cartera Topografica	1.041,47
	K2+330	2,16				
			5,00	10,33	Area Segun Cartera Topografica	1.051,79
	K2+335	1,97				
			5,00	13,60	Area Segun Cartera Topografica	1.065,39
	K2+340	3,47				
			5,00	18,35	Area Segun Cartera Topografica	1.083,74
	K2+345	3,87				
			5,00	19,43	Area Segun Cartera Topografica	1.103,17
	K2+350	3,90				
			5,00	20,40	Area Segun Cartera Topografica	1.123,57
	K2+355	4,26				
			5,00	20,58	Area Segun Cartera Topografica	1.144,14
	K2+360	3,97				
			5,00	18,75	Area Segun Cartera Topografica	1.162,89
	K2+365	3,53				
			5,00	15,85	Area Segun Cartera Topografica	1.178,74
	K2+370	2,81				
			5,00	13,83	Area Segun Cartera Topografica	1.192,57
	K2+375	2,84				
			5,00	11,88	Area Segun Cartera Topografica	1.204,24
	K2+380	2,11				
			5,00	9,39	Area Segun Cartera Topografica	1.213,57
	K2+385	1,62				
			5,00	6,13	Area Segun Cartera Topografica	1.219,69
	K2+390	0,83				

SUBTOTAL CONSOLIDADO DE LA ACTIVIDAD	1.219,69
TOTAL COBROS ANTERIORES	221,90
TOTAL ACUMULADO	1.441,60
TOTAL COBRO PRESENTE ACTA	1.219,70

ING. MANUEL FERNANDO SALAZAR
Residente de Obra
Mat. Profesional 17202-215876 CLD

ING. KAREN ANDREA MURCIA GARCIA
Residente de Interventoria
Mat. Profesional 15202-400597 BYC

ING. MAURICIO A. CORTES R
Director de Obra
Mat. Profesional 63202-72533CND

DANIEL FERNANDO MORALES DOTTOR
Director de Interventoria
Mat. Profesional 15202-297372BYC

GOBIERNO DE CALDAS

FORMATO PREACTA

Tipo de Documento: Formato - Registro
Código: PR-GCO-10
Versión aprobada: 1
Página 1 de 1

FECHA	1	9	2026	PREACTA Nº	3	ELABORÓ	MAURICIO ANTONIO CORTES REINA	PÁGINA	1	DE	1

NÚMERO Y OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA No. 29112025-1755 OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS K0+100 - K2+540		
CONTRATISTA	CONSORCIO HORIZONTE AZUL	INTERVENTORIA	ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A BIC

No.	69	ITEM DE PAGO	465 3P	DESCRIPCION	CORTE PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	UNID.	ml	UBICACIÓN	Tres Puertas - Santagueca, Caldas

Fecha	DIMENSIONES						LONGITUD (M)
	UBICACIÓN			LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	
31/05/2026	TRASVERSAL	K1+600	K1+613	13,40			13,40
31/05/2026	TRASVERSAL	K1+541	K1+541	11,80			11,80
31/05/2026	TRASVERSAL	K1+266	K1+266	13,20			13,20
31/05/2026	TRASVERSAL	K0+690	K0+690	12,20			12,20





SUBTOTAL CONSOLIDADO DE LA ACTIVIDAD	50,60
TOTAL COBROS ANTERIORES	1.812,40
TOTAL ACUMULADO	1.863,00
TOTAL COBRO PRESENTE ACTA	50,60

ING. MANUEL FERNANDO SALAZAR
Residente de Obra
Mat. Profesional 17202-215678 CLD

ING. KAREN ANDREA MURCIA GARCIA
Residente de Interventoría
Mat. Profesional 15202-400597 BYC

ING. MAURICIO A. CORTES R
Director de Obra
Mat. Profesional 63202-72533CND

DANIEL FERNANDO MORALES DOTTOR
Director de Interventoría
Mat. Profesional 15202-207372BYC

GOBIERNO DE CALDAS

FORMATO PREACTA

Tipo de Documento: Formato - Registro
Código: F-EJO-12
Versión aprobada: 1
Página 1 de 1

FECHA	1	6	2026	PREACTA N°	3	ELABORÓ	MAURICIO ANTONIO CORTES REINA	PÁGINA	1	DE	1

NUMERO Y OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA No. 29112025-1755 OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS KD+100 - K2+540		
CONTRATISTA	CONSORCIO HORIZONTE AZUL	INTERVENTORIA	ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A BIC

No.	4	ITEM DE PAGO	201.7	DESCRIPCION	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	UNID.	m3	UBICACIÓN	Tres Puertas - Santagueda, Caldas





Fecha	DIMENSIONES					VOLUMEN (M3)
	UBICACIÓN			LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	
31/05/2026	K0+690	TRANSVERSAL EXISTENTE	ENCOLE	5,00	0,25	1,30	1,63
31/05/2026	K0+690	TUBERIA EXISTENTE 24"	DESCUENTO ENCOLE	0,25	-0,48		-0,12
31/05/2026	K0+690	TRANSVERSAL EXISTENTE	CABEZOTE ENCOLE	1,50	0,25	0,40	0,15
31/05/2026	K0+690	TRANSVERSAL EXISTENTE	PISO ENCOLE	1,00	1,00	0,25	0,25
31/05/2026	K0+690	MURO EXISTENTE	DESCOLE	1,10	1,10	0,60	0,73
31/05/2026	K0+690	TUBERIA EXISTENTE 24"	DESCUENTO DESCOLE	0,60	-0,48		-0,29
31/05/2026	K1+266	BOX CULVERT EXISTENTE	LOSA INFERIOR	5,00	1,60	0,40	3,20
31/05/2026	K1+266	BOX CULVERT EXISTENTE	LATERAL DERECHO	4,00	0,30	1,00	1,20
31/05/2026	K1+266	BOX CULVERT EXISTENTE	LATERAL IZQUIERDO	4,00	0,30	1,00	1,20
31/05/2026	K1+266	BOX CULVERT EXISTENTE	LOSA SUPERIOR	4,00	1,60	0,30	1,92
31/05/2026	K1+266	BOX CULVERT EXISTENTE	ALETA DERECHA - DESCOLE	1,00	0,30	1,30	0,39
31/05/2026	K1+266	BOX CULVERT EXISTENTE	ALETA IZQUIERDA - DESCOLE	1,00	0,30	1,30	0,39
31/05/2026	K1+266	BOX CULVERT EXISTENTE	CABEZOTE DESCOLE	1,60	0,30	0,50	0,24
31/05/2026	K1+353	TRANSVERSAL EXISTENTE	DESCOLE	1,50	0,45	2,00	1,35
31/05/2026	K1+353	TUBERIA EXISTENTE 24"	DESCUENTO DESCOLE	0,45	-0,48		-0,22
31/05/2026	K1+353	TRANSVERSAL EXISTENTE	ENCOLE	5,00	0,25	1,30	1,63
31/05/2026	K1+353	TUBERIA EXISTENTE 24"	DESCUENTO ENCOLE	0,25	-0,48		-0,12
31/05/2026	K1+353	TRANSVERSAL EXISTENTE	PISO ENCOLE	1,00	1,00	0,25	0,25
31/05/2026	K1+541	TRANSVERSAL EXISTENTE	DESCOLE	1,50	0,45	2,00	1,35
31/05/2026	K1+541	TUBERIA EXISTENTE 24"	DESCUENTO DESCOLE	0,45	-0,48		-0,22
31/05/2026	K1+541	TRANSVERSAL EXISTENTE	ENCOLE	5,00	0,25	1,30	1,63
31/05/2026	K1+541	TUBERIA EXISTENTE 24"	DESCUENTO ENCOLE	0,25	-0,48		-0,12
31/05/2026	K1+541	TRANSVERSAL EXISTENTE	PISO ENCOLE	1,00	1,00	0,25	0,25
31/05/2026	K1+990	TRANSVERSAL EXISTENTE	DESCOLE	1,50	0,45	2,00	1,35

GOBIERNO DE CALDAS

FORMATO PREACTA

Tipo de Documento: Formato - Registro
Código: F-EXO-12
Versión aprobada: 1
Página 1 de 1

FECHA	1	6	2026	PREACTA N°	3	ELABORÓ	MAURICIO ANTONIO CORTES REINA	PÁGINA	1	DE	1

NUMERO Y OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA No. 29112025-1755 OBJETO. MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAIRA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS KO+100 - K2+540		
CONTRATISTA	CONSORCIO HORIZONTE AZUL	INTERVENTORIA	ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A BIC

No.	4	ITEM DE PAGO	201 7	DESCRIPCION	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	UNID.	m3	UBICACIÓN	Tres Puertas - Santagueda, Caldas



Fecha	UBICACIÓN			DIMENSIONES			VOLUMEN (M3)
				LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	
31/05/2026	K1+990	TUBERIA EXISTENTE 24"	DESCUENTO DESCOLE	0,45	-0,48		-0,22
31/05/2026	K1+990	TRANSVERSAL EXISTENTE	ENCOLE	5,00	0,25	1,30	1,63
31/05/2026	K1+990	TUBERIA EXISTENTE 24"	DESCUENTO ENCOLE	0,25	-0,48		-0,12
31/05/2026	K1+990	TRANSVERSAL EXISTENTE	CABEZOTE ENCOLE	1,50	0,60	0,40	0,36
31/05/2026	K1+990	TRANSVERSAL EXISTENTE	PISO ENCOLE	1,00	1,00	0,25	0,25
31/05/2026	K1+096	TRANSVERSAL EXISTENTE - DESCUENTO ITEM INCORRECTO ACTA 2	TUBERIA 24"	8,31	-0,20		-1,66
31/05/2026	K0+906	TRANSVERSAL EXISTENTE - DESCUENTO ITEM INCORRECTO ACTA 2	TUBERIA 24"	8,62	-0,20		-1,72
31/05/2026	K0+647	TRANSVERSAL EXISTENTE - DESCUENTO ITEM INCORRECTO ACTA 2	TUBERIA 24"	7,50	-0,20		-1,50

SUBTOTAL CONSOLIDADO DE LA ACTIVIDAD	16,05
TOTAL COBROS ANTERIORES	15,00
TOTAL ACUMULADO	30,00
TOTAL COBRO PRESENTE ACTA	15,00

ING. MANUEL FERNANDO SALAZAR
Residente de Obra
Mat. Profesional 17202-215678 CLD

ING. KAREN ANDREA MURCIA GARCIA
Residente de Interventoría
Mat. Profesional 15202-400597 BYC

ING. MAURICIO A. CORTES R.
Director de Obra
Mat. Profesional 63202-72533QNO

DANIEL FERNANDO MORALES DOTTOR
Director de Interventoría
Mat. Profesional 15202-207372BYC

GOBIERNO DE CALDAS

FORMATO PREACTA

FECHA	1	06	2026	PREACTA N°	3	ELABORÓ	MAURICIO ANTONIO CORTES REINA	PÁGINA	1	DE	1

NUMERO Y OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA No. 2911-2025-1755 OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES FUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS K0+100 - K2+540
CONTRATISTA	CONSORCIO HORIZONTE AZUL — INTERVENTORIA: ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. BIC

No.	5	ITEM DE PAGO	201.5	DESCRIPCION	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RIGIDOS Y FLEXIBLES	UNID.	m2	UBICACIÓN	Tres Puertas - Santagueda, Caldas



Fecha	DIMENSIONES						ÁREA (M2)
	UBICACIÓN			LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	
31/05/2026	TRASVERSAL	K0+690	K0+690	8,10	1,50		8,15
31/05/2026	BOX CULVERT	K1+266	CD	3,30	6,30		20,79
31/05/2026	TRASVERSAL	K1+541	K1+541	5,90	1,50		8,85
31/05/2026	TRASVERSAL	K1+990	K1+990	8,70	1,50		10,05

SUBTOTAL CONSOLIDADO DE LA ACTIVIDAD	48,84
TOTAL COBROS ANTERIORES	2.322,70
TOTAL ACUMULADO	2.371,50
TOTAL COBRO PRESENTE ACTA	48,80

ING. MANUEL FERNANDO SALAZAR
Residente de Obra
Mat. Profesional 17202-215678 CLD

ING. KAREN ANDREA MURCIA GARCIA
Residente de Interventoria
Mat. Profesional 15202-400697 BYC

ING. MAURICIO A. CORTES R.
Director de Obra
Mat. Profesional 68202-72533OND

DANIEL FERNANDO MORALES DOTTOR
Director de Interventoria
Mat. Profesional 15202-207372BYC

GOBIERNO DE CALDAS

FORMATO PREACTA

Tipo de Documento: Formato
Código: FF-JO-12
Versión aprobada
Página 1 de 1

FECHA	1	6	2026	PREACTA N°	3	ELABORÓ	MAURICIO ANTONIO CORTES REINA	PÁGINA	1	DE	1

NUMERO Y OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA No. 29112025-1755 OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS KD+100 - KD+540		
CONTRATISTA	CONSORCIO HORIZONTE AZUL	INTERVENTORIA	ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A BIC

No.	9	ITEM DE PAGO	330 2 2	DESCRIPCION	SUB-BASE GRANULAR CLASE B	UNID.	m3	UBICACIÓN	Tres Puertas - Santagueda, Caldas





Fecha	DIMENSIONES UBICACIÓN			LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	VOLUMEN (M3)
31/05/2026	K2+155	TRANSVERSAL - TUBERIA ENCOLE	CIMENTACIÓN	3,90	2,25	0,15	0,90
31/05/2026	K2+155	TRANSVERSAL - TUBERIA ENCOLE	ATRAQUE	3,40	2,25	0,45	0,41
31/05/2026	K2+155	TRANSVERSAL - TUBERIA ENCOLE	DESCUENTO TUBERIA	0,40	-0,32		-0,13
31/05/2026	K2+155	TRANSVERSAL - TUBERIA ENCOLE	SUB-BASE	0,40	2,25	0,25	0,23
31/05/2026	K1+990	TRANSVERSAL - TUBERIA CI-CD	CIMENTACIÓN	32,05	1,65	0,15	7,90
31/05/2026	K1+990	TRANSVERSAL - TUBERIA CI-CD	ATRAQUE	31,05	1,65	0,45	23,05
31/05/2026	K1+990	TRANSVERSAL - TUBERIA CI-CD	DESCUENTO TUBERIA	31,05	-0,32		-9,87
31/05/2026	K1+990	TRANSVERSAL - TUBERIA CI-CD	SUB-BASE	31,05	1,65	0,25	12,81
31/05/2026	K1+541	TRANSVERSAL - TUBERIA CI-CD	CIMENTACIÓN	12,75	1,50	0,15	2,87
31/05/2026	K1+541	TRANSVERSAL - TUBERIA CI-CD	ATRAQUE	12,25	1,50	0,45	8,27
31/05/2026	K1+541	TRANSVERSAL - TUBERIA CI-CD	DESCUENTO TUBERIA	12,25	-0,32		-3,90
31/05/2026	K1+541	TRANSVERSAL - TUBERIA CI-CD	SUB-BASE	12,25	1,50	0,25	4,59
31/05/2026	K1+353	TRANSVERSAL - TUBERIA CI	CIMENTACIÓN	4,50	1,50	0,15	1,01
31/05/2026	K1+353	TRANSVERSAL - TUBERIA CI	ATRAQUE	4,00	1,50	0,45	2,70
31/05/2026	K1+353	TRANSVERSAL - TUBERIA CI	DESCUENTO TUBERIA	4,00	-0,32		-1,27
31/05/2026	K1+353	TRANSVERSAL - TUBERIA CI	SUB-BASE	4,00	1,50	0,25	1,50
31/05/2026	K1+266	BOX CULVERT	SUSTITUCIÓN	8,10	2,10	0,10	1,70
31/05/2026	K0+822	TRANSVERSAL - TUBERIA CI	CIMENTACIÓN	7,75	1,90	0,15	2,21
31/05/2026	K0+822	TRANSVERSAL - TUBERIA CI	ATRAQUE	7,25	1,90	0,45	6,20
31/05/2026	K0+822	TRANSVERSAL - TUBERIA CI	DESCUENTO TUBERIA	7,25	-0,32		-2,31
31/05/2026	K0+822	TRANSVERSAL - TUBERIA CI	SUB-BASE	7,25	1,90	0,25	3,44
31/05/2026	K0+690	TRANSVERSAL - TUBERIA CD-CI	CIMENTACIÓN	12,50	1,50	0,15	2,81
31/05/2026	K0+690	TRANSVERSAL - TUBERIA CD-CI	ATRAQUE	9,00	1,50	0,45	6,08
31/05/2026	K0+690	TRANSVERSAL - TUBERIA CD-CI	DESCUENTO TUBERIA	9,00	-0,32		-2,60
31/05/2026	K0+690	TRANSVERSAL - TUBERIA CD-CI	SUB-BASE	9,00	1,50	0,25	3,38
31/05/2026	K0+647	TRANSVERSAL - TUSERIA CD-CI	CIMENTACIÓN	3,50	1,50	0,15	0,79

SUBTOTAL CONSOLIDADO DE LA ACTIVIDAD	71,94
TOTAL COBROS ANTERIORES	54,70
TOTAL ACUMULADO	126,60
TOTAL COBRO PRESENTE ACTA	71,90

ING. MANUEL FERNANDO SALAZAR
Residente de Obra
Mat. Profesional

ING. KAREN ANDREA MURCIA GARCIA
Residente de Interventoría
Mat. Profesional 15202-400697 BYC

ING. MAURICIO A. CORTES R
Director de Obra
Mat. Profesional 83202-72533QND

DANIEL FERNANDO MORALES DOTTOR
Director de Interventoría
Mat. Profesional 15202-2073728YC

GOBIERNO DE CALDAS

FORMATO PREACTA

Fecha Documento Formato: Proyecto
Código: F-ADM-10
Versión vigente: 1
Página 1 de 1

FECHA	1	06	2026	PREACTA Nº	3	ELABORÓ	MAURICIO ANTONIO CORTES REINA	PÁGINA	1	DE	1

NUMERO Y OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA No. 29112025-1795 OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PASO EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS K0+000 - K2+540		
CONTRATISTA	CONSORCIO HORIZONTE AZUL	INTERVENTORÍA	ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. BIC

No.	11	ITEM DE PAGO	600.1.1	DESCRIPCION	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	UNID.	m3	UBICACIÓN	Tres Puertas - Santagueda, Caldas







Fecha	DIVISIONES						VOLUMEN (M3)
	UBICACIÓN			LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	
31/05/2026	TRANSVERSAL (TIERRA 50%, ROCA 50%)	TUBERIA	K2+155	0,93	2,25	1,58	1,60
31/05/2026	TRANSVERSAL (TIERRA 50%, ROCA 50%)	ENCOLE	K2+155	2,25	3,45	2,97	11,52
31/05/2026	TRANSVERSAL (TIERRA 70%, ROCA 30%)	TUBERIA	K1+950	16,90	1,65	1,78	34,54
31/05/2026	PROLONGACION (TIERRA 70%, ROCA 30%)	TUBERIA	K1+990	14,75	1,50	2,33	36,09
31/05/2026	TUBERIA EXISTENTE (TIERRA 70%, ROCA 30%)	DESCUENTO	K1+990	7,84	-0,20		-1,10
31/05/2026	ESTRUCTURA EXISTENTE (TIERRA 70%, ROCA 30%)	DESCUENTO	K1+990	1,50	0,45	-2,00	-0,96
				0,45	0,48		0,15
31/05/2026	TRANSVERSAL (TIERRA 70%, ROCA 30%)	TUBERIA	K1+541	12,75	1,50	1,65	32,23
31/05/2026	TUBERIA EXISTENTE (TIERRA 70%, ROCA 30%)	DESCUENTO	K1+541	7,34	-0,20		-1,03
31/05/2026	ESTRUCTURA EXISTENTE (TIERRA 70%, ROCA 30%)	DESCUENTO	K1+541	1,50	0,45	-2,00	-0,95
				0,45	0,48		0,15
31/05/2026	TRANSVERSAL (TIERRA 50%, ROCA 50%)	TUBERIA - CI	K1+353	4,50	1,50	1,93	8,62
31/05/2026	TUBERIA EXISTENTE (TIERRA 50%, ROCA 50%)	DESCUENTO CD-CI	K1+353	12,69	-0,20		-1,27
31/05/2026	ESTRUCTURA EXISTENTE (TIERRA 70%, ROCA 30%)	DESCUENTO	K1+353	1,50	0,45	-2,00	-0,68
				0,45	0,48		0,11
31/05/2026	BOX CULVERT (TIERRA 70%, ROCA 30%)	CD	K1+266	9,80	4,37	3,43	94,06
31/05/2026	BOX CULVERT EXISTENTE (TIERRA 70%, ROCA 30%)	LOSA INFERIOR	K1+266 DESCUENTO - CD	5,80	1,60	-0,49	-2,24
31/05/2026	BOX CULVERT EXISTENTE (TIERRA 70%, ROCA 30%)	LATERAL DERECHO	K1+266 DESCUENTO - CD	4,80	0,30	-1,00	-0,84
31/05/2026	BOX CULVERT EXISTENTE (TIERRA 70%, ROCA 30%)	LATERAL IZQUIERDO	K1+266 DESCUENTO - CD	4,80	0,30	-1,00	-0,84
31/05/2026	BOX CULVERT EXISTENTE (TIERRA 70%, ROCA 30%)	LOSA SUPERIOR	K1+266 DESCUENTO - CD	4,00	1,60	-0,30	-1,34
31/05/2026	BOX CULVERT EXISTENTE (TIERRA 70%, ROCA 30%)	ALETA DERECHA - DESCOLE	K1+266 DESCUENTO - CD	1,00	0,30	-1,30	-0,27
31/05/2026	BOX CULVERT EXISTENTE (TIERRA 70%, ROCA 30%)	ALETA IZQUIERDA - DESCOLE	K1+266 DESCUENTO - CD	1,00	0,30	-1,30	-0,27
31/05/2026	BOX CULVERT EXISTENTE (TIERRA 70%, ROCA 30%)	CABEZOTE DESCOLE	K1+266 DESCUENTO - CD	1,60	0,30	-0,50	-0,17
31/05/2026	TRANSVERSAL (TIERRA 70%, ROCA 30%)	TUBERIA CI	K0+622	7,75	2,00	1,68	26,74
31/05/2026	TRANSVERSAL (TIERRA 70%, ROCA 30%)	TUBERIA	K0+690	9,50	1,50	2,18	21,75
31/05/2026	TUBERIA EXISTENTE (TIERRA 70%, ROCA 30%)	DESCUENTO	K0+690	8,85	-0,20		-1,21
31/05/2026	ESTRUCTURA EXISTENTE (TIERRA 70%, ROCA 30%)	DESCUENTO	K0+690	1,50	0,45	-2,00	-0,96
				0,45	0,48		0,15
31/05/2026	LOCALIZACIÓN (TIERRA 80%, ROCA 20%)	TUBERIA GAS DER	K1+541	7,60	0,90	0,90	4,93
31/05/2026	LOCALIZACIÓN (TIERRA 80%, ROCA 20%)	TUBERIA GAS IZQ	K1+541	8,06	1,20	1,20	7,26
31/05/2026	LOCALIZACIÓN (TIERRA 80%, ROCA 20%)	TUBERIA GAS IZQ	K0+690	4,68	1,20	0,70	3,22
31/05/2026	LOCALIZACIÓN (TIERRA 50%, ROCA 20%)	TUBERIA GAS DER	K0+690	3,03	1,90	0,70	2,75
31/05/2026	LOCALIZACIÓN (TIERRA 50%, ROCA 20%)	TUBERIA GAS IZQ	K1+303	7,03	0,80	0,90	4,93
31/05/2026	LOCALIZACIÓN (TIERRA 80% ROCA 20%)	TUBERIA GAS DER	K1+303	2,90	0,80	0,60	1,67
31/05/2026	EXCAVACIÓN PARA DEMOLICIÓN MURO EXISTENTE (TIERRA 70%, ROCA 30%)	INSTALACIÓN TUBERIA	K0+690	3,85	0,90	2,69	4,66
31/05/2026	DESCUENTO POR MAYOR VALOR PAGO EN EXCAVACIONES POR ESTRUCTURA EXISTENTE (TIERRA 70%, ROCA 30%)		K1+096	1,50	0,45	-2,00	-0,96
				0,45	0,48		0,15
31/05/2026	DESCUENTO POR MAYOR VALOR PAGO EN EXCAVACIONES POR ESTRUCTURA EXISTENTE (TIERRA 70%, ROCA 30%)		K0+936	1,50	0,45	-2,00	-0,95
				0,45	0,48		0,15
31/05/2026	DESCUENTO POR MAYOR VALOR PAGO EN EXCAVACIONES POR ESTRUCTURA EXISTENTE (TIERRA 70%, ROCA 30%)		K0+947	1,50	0,45	-2,00	-0,95
				0,45	0,48		0,15

*El volumen de excavacion para las OT K1+096, K1+541, K1+266 y K0+690 se calcula con un porcentaje de excavacion en roca de 30% y material corrido del 70% acorde a lo observado en obra
*El volumen de excavacion para las OT K2+155 y K1+353 se calcula con un porcentaje de excavacion en roca del 50% y material corrido del 50% acorde a lo observado en obra, requiriendo el uso de martillo neumatico y cuña hidraulica, en el descole de la OT K2+ 55 el porcentaje disminuye
*El volumen de excavacion para la localizacion de tuberia de acueducto y gas se estima con un porcentaje de excavacion en roca del 20%

SUBTOTAL CONSOLIDADO DE LA ACTIVIDAD	282,18
TOTAL COBROS ANTERIORES	865,70
TOTAL ACUMULADO	1.117,90
TOTAL COBRO PRESENTE ACTA	282,20

ING. MANUEL FERNANDO SALAZAR
Residente de Obra
Mat. Profesional 17202-215878 CLD

ING. ANDREA MURCIA GARCIA
Residente de Interventoria
Mat. Profesional: 63202-400597 BYC

ING. MAURICIO A. CORTES R
Director de Obra
Mat. Profesional: 63202-73503QHO

DANIEL FERNANDO MORALES DOTTOR
Director de Interventoria
Mat. Profesional: 15202-207372BYC

GOBIERNO DE CALDAS

FORMATO PREACTA

Tipo de Documento: Formato - Registro
Código: F-GEL-13
Versión aprobada: 1
Página 1 de 1

FECHA	1	05	2026	PREACTA Nº	3	ELABORÓ	MAURICIO ANTONIO CORTES REINA	PÁGINA	1	DE	1

NUMERO Y OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA No. 2512025-1755 OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS KD+100 - K2+540		
CONTRATISTA	CONSORCIO HORIZONTE AZUL	INTERVENTORIA	ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A BIC

No.	11	ITEM DE PAGO	600.1.1	DESCRIPCION	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	UNID.	m3	UBICACIÓN	Tres Puertas - Santagueda, Caldas









Fecha	DIMENSIONES					VOLUMEN ACUMULADO (M3)
	ABSCISA	AREA (M2)	DISTANCIA (M)	VOLUMEN (M3)	OBSERVACIÓN	
31/05/2026	K1+596	0,82				
			2,00	1,67	Area Según Cartera Topografica	1,67
	K1+598	0,85				
			2,00	1,72	Area Según Cartera Topografica	3,39
	K1+600	0,87				
			2,00	1,73	Area Según Cartera Topografica	5,12
	K1+602	0,86				
			2,00	1,69	Area Según Cartera Topografica	6,81
	K1+604	0,83				
			2,00	1,76	Area Según Cartera Topografica	8,57
	K1+606	0,93				
			2,00	1,92	Area Según Cartera Topografica	10,49
	K1+608	0,99				
			2,00	1,96	Area Según Cartera Topografica	12,45
	K1+610	0,97				
			2,00	1,82	Area Según Cartera Topografica	14,27
	K1+612	0,85				
			2,00	1,57	Area Según Cartera Topografica	15,84
	K1+614	0,72				
			2,00	1,42	Area Según Cartera Topografica	17,26
	K1+616	0,70				
			2,00	1,36	Area Según Cartera Topografica	18,62
	K1+618	0,66				
			2,00	1,18	Area Según Cartera Topografica	19,80
	K1+620	0,53				
			2,00	0,95	Area Según Cartera Topografica	20,75
	K1+622	0,43				
31/05/2026	K1+666	0,80				
			4,00	2,74	Area Según Cartera Topografica	23,49
	K1+670	0,57				
			4,00	2,10	Area Según Cartera Topografica	25,59
	K1+674	0,48				
			4,00	1,90	Area Según Cartera Topografica	27,49
	K1+678	0,47				
			4,00	1,72	Area Según Cartera Topografica	29,21
	K1+682	0,39				
			4,00	2,12	Area Según Cartera Topografica	31,33
	K1+686	0,87				
			4,00	2,64	Area Según Cartera Topografica	33,97
	K1+690	0,65				
			4,00	2,72	Area Según Cartera Topografica	36,69
	K1+694	0,71				
			4,00	2,68	Area Según Cartera Topografica	39,37
	K1+698	0,63				
			2,00	1,35	Area Según Cartera Topografica	40,72
	K1+700	0,72				
			4,00	3,36	Area Según Cartera Topografica	44,08
	K1+704	0,96				
			4,00	4,04	Area Según Cartera Topografica	48,12
	K1+708	1,06				
			2,00	2,10	Area Según Cartera Topografica	50,22
	K1+710	1,04				
			4,00	4,80	Area Según Cartera Topografica	55,02
	K1+714	1,36				
			4,00	5,48	Area Según Cartera Topografica	60,50
	K1+718	1,38				
			2,00	2,68	Area Según Cartera Topografica	63,18
	K1+720	1,30				
			4,00	4,56	Area Según Cartera Topografica	67,74
	K1+724	0,98				
			4,00	4,80	Area Según Cartera Topografica	72,54
	K1+728	1,42				
			2,00	2,90	Area Según Cartera Topografica	75,44
	K1+730	1,48				
			4,00	5,64	Area Según Cartera Topografica	81,08
	K1+734	1,34				
			4,00	5,06	Area Según Cartera Topografica	86,14
	K1+738	1,19				
			2,00	2,36	Area Según Cartera Topografica	88,50
	K1+740	1,17				
			2,00	2,44	Area Según Cartera Topografica	90,94
	K1+742	1,27				
			3,00	3,92	Area Según Cartera Topografica	94,86
	K1+745	1,34				
			5,00	6,45	Area Según Cartera Topografica	101,31
	K1+750	1,24				
			4,00	4,98	Area Según Cartera Topografica	106,29
	K1+754	1,25				
			4,00	4,58	Area Según Cartera Topografica	110,87
	K1+758	1,04				
			6,00	6,21	Area Según Cartera Topografica	117,08
	K1+764	1,03				
			4,00	4,12	Area Según Cartera Topografica	121,20
	K1+768	1,03				
			4,00	3,84	Area Según Cartera Topografica	125,04
	K1+772	0,89				
			4,00	2,88	Area Según Cartera Topografica	127,92
	K1+776	0,55				

GOBIERNO DE CALDAS

FORMATO PREACTA

Tipo de Documento: Formato - Preacta
Código: F-P-GA-12
Versión aprobada: 1
Página 1 de 1

FECHA	1	06	2026	PREACTA Nº	3	ELABORÓ	MAURICIO ANTONIO CORTES REINA	PÁGINA	1	DE	1

NUMERO Y OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA No. 2911/2025-1755 OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS K2+100 - K2+540		
CONTRATISTA	CONSORCIO HORIZONTE AZUL	INTERVENTORIA	ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A BIC

No.	11	ITEN DE PAGO	000 1 1	DESCRIPCION	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	UNID.	m3	UBICACIÓN	Tres Puertas - Santagueda Caldas







Fecha	DIMENSIONES					VOLUMEN ACUMULADO (M3)
	ABSCISA	AREA (M2)	DISTANCIA (M)	VOLUMEN (M3)	OBSERVACIÓN	
31/03/2026	K1+855	0,46				
			5,00	2,33	Area Según Cartera Topografica	150,24
	K1+860	0,47				
			5,00	4,23	Area Según Cartera Topografica	134,47
	K1+865	1,22				
			5,00	6,55	Area Según Cartera Topografica	141,02
	K1+870	1,40				
			5,00	8,25	Area Según Cartera Topografica	149,27
	K1+875	1,90				
			5,00	9,40	Area Según Cartera Topografica	158,67
	K1+880	1,86				
			5,00	9,20	Area Según Cartera Topografica	167,87
	K1+885	1,82				
			5,00	9,80	Area Según Cartera Topografica	177,67
	K1+890	2,10				
			5,00	8,85	Area Según Cartera Topografica	186,52
	K1+895	1,44				
			5,00	7,33	Area Según Cartera Topografica	193,84
	K1+900	1,49				
			5,00	6,63	Area Según Cartera Topografica	200,47
	K1+905	1,16				
			5,00	5,95	Area Según Cartera Topografica	206,42
	K1+910	1,22				
			5,00	5,83	Area Según Cartera Topografica	212,24
	K1+915	1,11				
			5,00	5,80	Area Según Cartera Topografica	218,04
	K1+920	1,21				
			5,00	6,43	Area Según Cartera Topografica	224,47
	K1+925	1,36				
			5,00	7,45	Area Según Cartera Topografica	231,92
	K1+930	1,82				
			5,00	10,18	Area Según Cartera Topografica	242,09
	K1+935	2,45				
			5,00	12,15	Area Según Cartera Topografica	254,24
	K1+940	2,41				
			5,00	13,98	Area Según Cartera Topografica	268,22
	K1+945	3,18				
			5,00	22,45	Area Según Cartera Topografica	290,67
	K1+950	5,80				
			5,00	24,03	Area Según Cartera Topografica	314,69
	K1+955	3,81				
			5,00	30,38	Area Según Cartera Topografica	345,07
	K1+960	8,34				
			5,00	43,18	Area Según Cartera Topografica	388,24
	K1+965	8,93				
			5,00	44,50	Area Según Cartera Topografica	432,74
	K1+970	8,07				
			5,00	46,98	Area Según Cartera Topografica	479,72
	K1+975	8,92				
			5,00	60,43	Area Según Cartera Topografica	540,14
	K1+980	14,25				
			5,00	69,08	Area Según Cartera Topografica	609,22
	K1+985	13,38				
			5,00	60,85	Area Según Cartera Topografica	670,07
	K1+990	10,98				
			5,00	52,65	Area Según Cartera Topografica	722,94
	K1+995	10,19				
			5,00	46,13	Area Según Cartera Topografica	769,07
	K2+000	8,28				
			5,00	40,30	Area Según Cartera Topografica	809,37
	K2+005	7,98				
			5,00	34,16	Area Según Cartera Topografica	843,54
	K2+010	5,81				
			5,00	22,99	Area Según Cartera Topografica	866,52
	K2+015	3,38				
			5,00	5,45	Area Según Cartera Topografica	874,97
	K2+020	0,00				

GOBIERNO DE CALDAS

FORMATO PREACTA

FECHA	1	06	2026	PREACTA N°	3	ELABORÓ	MAURICIO ANTONIO CORTES REINA	PÁGINA	1	DE	1

NUMERO Y OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA No 29112025-1755 OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS KD+100 - K2+540
CONTRATISTA	CONSORCIO HORIZONTE AZUL — INTERVENTORIA: ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A BIC

No.	11	ITEM DE PAGO	903.1.1	DESCRIPCION	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	UNID.	m3	UBICACIÓN	Tres Puertas - Santagueda, Caldas







Fecha	DIMENSIONES					VOLUMEN ACUMULADO (M3)
	ABSCISA	AREA (M2)	DISTANCIA (M)	VOLUMEN (M3)	OBSERVACIÓN	
31/05/2026	K2+095	0,88				
			5,00	5,73	Area Segun Cartera Topografica	890,69
	K2+100	1,61				
			5,00	8,23	Area Segun Cartera Topografica	898,92
	K2+105	1,68				
			5,00	8,00	Area Segun Cartera Topografica	906,92
	K2+110	1,52				
			5,00	7,48	Area Segun Cartera Topografica	914,39
	K2+115	1,47				
			5,00	7,43	Area Segun Cartera Topografica	921,82
	K2+120	1,50				
			5,00	6,36	Area Segun Cartera Topografica	928,19
	K2+125	1,05				
			5,00	4,48	Area Segun Cartera Topografica	932,67
	K2+130	0,74				
			5,00	4,30	Area Según Cartera Topografica	936,97
	K2+135	0,98				
			5,00	4,88	Area Segun Cartera Topografica	941,84
	K2+140	0,97				
			5,00	4,80	Area Segun Cartera Topografica	946,64
	K2+145	0,95				
			5,00	4,93	Area Segun Cartera Topografica	951,57
	K2+150	1,02				
			5,00	4,90	Area Segun Cartera Topografica	956,47
	K2+155	0,94				
			5,00	4,18	Area Segun Cartera Topografica	960,64
	K2+160	0,73				
			5,00	4,08	Area Segun Cartera Topografica	964,72
	K2+165	0,90				
			5,00	4,23	Area Segun Cartera Topografica	968,94
	K2+170	0,79				
			5,00	4,13	Area Segun Cartera Topografica	973,07
	K2+175	0,86				
			5,00	4,05	Area Segun Cartera Topografica	977,09
	K2+180	0,75				
			5,00	4,18	Area Segun Cartera Topografica	981,27
	K2+185	0,92				
			5,00	5,45	Area Segun Cartera Topografica	986,72
	K2+190	1,26				
			5,00	7,55	Area Segun Cartera Topografica	994,27
	K2+195	1,76				
			5,00	7,18	Area Segun Cartera Topografica	001,44
	K2+200	1,11				
			5,00	4,83	Area Segun Cartera Topografica	006,27
	K2+205	0,82				
			5,00	4,45	Area Segun Cartera Topografica	1.000,72
	K2+210	0,96				
			5,00	5,08	Area Segun Cartera Topografica	1.005,79
	K2+215	1,07				
			5,00	4,83	Area Segun Cartera Topografica	1.010,62
	K2+220	0,86				
			5,00	4,55	Area Segun Cartera Topografica	1.015,17
	K2+225	0,96				
			5,00	4,80	Area Segun Cartera Topografica	1.019,97
	K2+230	0,96				
			5,00	5,33	Area Segun Cartera Topografica	1.025,29
	K2+235	1,17				
			5,00	4,90	Area Segun Cartera Topografica	1.030,22
	K2+240	0,80				
			5,00	2,00	Area Segun Cartera Topografica	1.032,22
	K2+245	0,00				

GOBIERNO DE CALDAS

FORMATO PREACTA

Tipo de Documento Formato - Registro
Código: F-EJN-12
Versión aplicada: 1
Página 1 de 1

FECHA	1	09	2025	PREACTA Nº	3	ELABORÓ	MAURICIO ANTONIO CORTES REINA	PÁGINA	1	DE	1

NUMERO Y OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA No. 2511260S-1759 OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS KB+100 - K2+540		
CONTRATISTA	CONSORCIO HORIZONTE AZUL	INTERVENTORIA	ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A BIC

No.	11	ITEM DE PAGO	600,1.1	DESCRIPCION	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	UNID.	m3	UBICACIÓN	Tres Puertas - Santagueda, Caldas



Fecha	DIMENSIONES					VOLUMEN ACUMULADO (M3)
	ABSCISA	AREA (M2)	DISTANCIA (M)	VOLUMEN (M3)	OBSERVACIÓN	
31/05/2330	K2+325	1,54				
			5,00	9,25	Area Segun Cartera Topografica	1.041,47
	K2+330	2,16				
			5,00	10,33	Area Segun Cartera Topografica	1.351,79
	K2+335	1,87				
			5,00	13,60	Area Segun Cartera Topografica	1.365,39
	K2+340	3,47				
			5,00	18,35	Area Segun Cartera Topografica	1.383,74
	K2+345	3,87				
			5,00	19,43	Area Segun Cartera Topografica	1.103,17
	K2+350	3,90				
			5,00	20,40	Area Segun Cartera Topografica	1.123,57
	K2+355	4,26				
			5,00	20,58	Area Segun Cartera Topografica	1.144,14
	K2+360	3,97				
			5,00	18,75	Area Segun Cartera Topografica	1.162,89
	K2+365	3,53				
			5,00	15,85	Area Segun Cartera Topografica	1.178,74
	K2+370	2,81				
			5,00	13,63	Area Segun Cartera Topografica	1.192,37
	K2+375	2,64				
			5,00	11,88	Area Segun Cartera Topografica	1.204,24
	K2+380	2,11				
			5,00	9,33	Area Segun Cartera Topografica	1.213,57
	K2+385	1,62				
			5,00	6,15	Area Segun Cartera Topografica	1.219,69
	K2+390	3,83				

SUBTOTAL CONSOLIDADO DE LA ACTIVIDAD	1.219,69
TOTAL COBROS ANTERIORES	1.117,90
TOTAL ACUMULADO	2.337,60
TOTAL COBRO PRESENTE ACTA	1.219,70

ING. MANUEL FERNANDO SALAZAR
Residente de Obra
Mat. Profesional 17202-215676 CLD

ING. KAREN ANDREA MURCIA GARCIA
Residente de Interventoria
Mat. Profesional 15202-400597 BYC

ING. MAURICIO A. CORTES R.
Director de Obra
Mat. Profesional 68202-72939CND

DANIEL FERNANDO MORALES DOTTOR
Director de Interventoria
Mat. Profesional 15202-207372BYC

GOBIERNO DE CALDAS

FORMATO PREACTA

Tipo de Documento: Formato - Registro
Código: F-C-O-13
Versión aplicable: 1
Página 1 de 1

FECHA	1	6	2026	PREACTA Nº	3	ELABORÓ	MAURICIO ANTONIO CORTES REINA	PÁGINA	1	DE	1

NÚMERO Y OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA No 28112025-1755 OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS K0+100 - K2+540		
CONTRATISTA	CONSORCIO HORIZONTE AZUL	INTERVENTORIA	ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A SIC

No.	12	ITEM DE PAGO	600.2.1	DESCRIPCION	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO	UNID.	m3	UBICACION	Tres Puertas - Barragueda, Caldas



Fecha	DIMENSIONES						VOLUMEN (M3)
	UBICACIÓN			LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	
31/05/2026	TRANSVERSAL (TIERRA 50%, ROCA 50%)	TUBERIA	K2+155	0,90	2,20	1,65	1,60
31/05/2026	TRANSVERSAL (TIERRA 50%, ROCA 50%)	ENCOLE	K2+156	2,20	3,45	2,97	11,52
31/05/2026	TRANSVERSAL (TIERRA 70%, ROCA 30%)	TUBERIA	K1+990	16,00	1,65	1,78	14,80
31/05/2026	PROLONGACION (TIERRA 70%, ROCA 30%)	TUBERIA	K1+990	14,75	1,50	2,33	15,47
31/05/2026	TUBERIA EXISTENTE (TIERRA 70%, ROCA 30%)	DESCUENTO	K1+990	7,84	-0,20		-0,47
31/05/2026	ESTRUCTURA EXISTENTE (TIERRA 70%, ROCA 30%)	DESCUENTO	K1+990	1,50	0,45	-2,00	-0,41
				0,45	0,45		0,07
31/05/2026	TRANSVERSAL (TIERRA 70%, ROCA 30%)	TUBERIA	K1+541	12,75	1,50	1,65	9,03
31/05/2026	TUBERIA EXISTENTE (TIERRA 70%, ROCA 30%)	DESCUENTO	K1+541	7,34	-0,20		-0,44
31/05/2026	ESTRUCTURA EXISTENTE (TIERRA 70%, ROCA 30%)	DESCUENTO	K1+541	1,50	0,45	-2,00	-0,41
				0,45	0,45		0,07
31/05/2026	TRANSVERSAL (TIERRA 50%, ROCA 50%)	TUBERIA - CI	K1+353	4,50	1,50	1,93	6,52
31/05/2026	TUBERIA EXISTENTE (TIERRA 50%, ROCA 50%)	DESCUENTO CD-CI	K1+353	12,09	-0,20		-1,27
31/05/2026	ESTRUCTURA EXISTENTE (TIERRA 70%, ROCA 30%)	DESCUENTO	K1+353	1,50	0,45	-2,00	-0,68
				0,45	0,45		0,11
31/05/2026	BOX CULVERT (TIERRA 70%, ROCA 30%)	CD	K1+266	9,00	4,37	3,43	40,44
31/05/2026	BOX CULVERT EXISTENTE (TIERRA 70%, ROCA 30%)	LOSA INFERIOR	K1+266 DESCUENTO - CD	6,00	1,60	-0,40	-0,96
31/05/2026	BOX CULVERT EXISTENTE (TIERRA 70%, ROCA 30%)	LATERAL DERECHO	K1+266 DESCUENTO - CD	4,00	0,30	-1,00	-0,36
31/05/2026	BOX CULVERT EXISTENTE (TIERRA 70%, ROCA 30%)	LATERAL IZQUIERDO	K1+266 DESCUENTO - CD	4,00	0,30	-1,00	-0,36
31/05/2026	BOX CULVERT EXISTENTE (TIERRA 70%, ROCA 30%)	LOSA SUPERIOR	K1+266 DESCUENTO - CD	4,00	1,60	-0,30	-0,58
31/05/2026	BOX CULVERT EXISTENTE (TIERRA 70%, ROCA 30%)	ALETA DERECHA - DESCOLE	K1+266 DESCUENTO - CD	1,00	0,30	-1,30	-0,12
31/05/2026	BOX CULVERT EXISTENTE (TIERRA 70%, ROCA 30%)	ALETA IZQUIERDA - DESCOLE	K1+266 DESCUENTO - CD	1,00	0,30	-1,30	-0,12
31/05/2026	BOX CULVERT EXISTENTE (TIERRA 70%, ROCA 30%)	CABEZOTE DESCOLE	K1+266 DESCUENTO - CD	1,00	0,30	-0,50	-0,07
31/05/2026	TRANSVERSAL (TIERRA 70%, ROCA 30%)	TUBERIA	K0+822	7,75	2,03	1,88	8,59
31/05/2026	TRANSVERSAL (TIERRA 70%, ROCA 30%)	TUBERIA	K0+690	9,50	1,50	2,19	9,32
31/05/2026	TUBERIA EXISTENTE (TIERRA 70%, ROCA 30%)	DESCUENTO	K0+690	8,95	-0,20		-0,52
31/05/2026	ESTRUCTURA EXISTENTE (TIERRA 70%, ROCA 30%)	DESCUENTO	K0+690	1,50	0,45	-2,00	-0,41
				0,45	0,45		0,07
31/05/2026	LOCALIZACIÓN (TIERRA 80%, ROCA 20%)	TUBERIA GAS DER	K1+541	7,60	0,90	0,90	1,23
31/05/2026	LOCALIZACIÓN (TIERRA 80%, ROCA 20%)	TUBERIA GAS IZQ	K1+541	6,05	1,25	1,20	1,82
31/05/2026	LOCALIZACIÓN (TIERRA 80%, ROCA 20%)	TUBERIA GAS IZQ	K0+690	4,80	1,25	0,70	0,84
31/05/2026	LOCALIZACIÓN (TIERRA 80%, ROCA 20%)	TUBERIA GAS DER	K0+690	3,00	1,65	0,70	0,69
31/05/2026	LOCALIZACIÓN (TIERRA 80%, ROCA 20%)	TUBERIA GAS IZQ	K1+353	7,00	0,90	0,90	1,01
31/05/2026	LOCALIZACIÓN (TIERRA 80%, ROCA 20%)	TUBERIA GAS DER	K1+353	2,90	0,90	0,90	0,42
31/05/2026	EXCAVACIÓN PARA DEMOLICIÓN MURO EXISTENTE (TIERRA 70%, ROCA 30%)	INSTALACIÓN TUBERIA	K0+690	3,85	0,90	2,00	2,08
31/05/2026	DESCUENTO POR MAYOR VALOR PAGO EN EXCAVACIONES POR ESTRUCTURA EXISTENTE (TIERRA 70%, ROCA 30%)	K1+096		1,50	0,45	-2,00	-0,41
				0,45	0,45		0,07
31/05/2026	DESCUENTO POR MAYOR VALOR PAGO EN EXCAVACIONES POR ESTRUCTURA EXISTENTE (TIERRA 70%, ROCA 30%)	K0+906		1,50	0,45	-2,00	-0,41
				0,45	0,45		0,07
31/05/2026	DESCUENTO POR MAYOR VALOR PAGO EN EXCAVACIONES POR ESTRUCTURA EXISTENTE (TIERRA 70%, ROCA 30%)	K0+647		1,50	0,45	-2,00	-0,41
				0,45	0,45		0,07

*El volumen de excavacion para las OT K1+923, K1+541, K1+266 y K0+690 se calcula con un porcentaje de excavacion en roca del 30% y material comun del 70% acorde a lo observado en obra
*El volumen de excavacion para las OT K2+155 y K1+353 se calcula con un porcentaje de excavacion en roca del 50% y material comun del 50% acorde a lo observado en obra, requiriendo el uso de martillos neumaticos y cuña hidraulica, en el desarrollo de la OT K2+155 el porcentaje disminuye
*El volumen de excavacion para la instalacion de tuberia de acueducto y gas se estima con un porcentaje de excavación en roca del 20%

SUBTOTAL CONSOLIDADO DE LA ACTIVIDAD	118,26
TOTAL COBROS ANTERIORES	52,10
TOTAL ACUMULADO	170,40
TOTAL COBRO PRESENTE ACTA	118,30

ING. MANUEL FERNANDO SALAZAR
Residente de Obra
Mat. Profesional 17202-215676 CLO

ING. KAREN ANDREA MURCIA GARCIA
Residente de Interventoria
Mat. Profesional 15202-400597 BYC

ING. MAURICIO A. CORTES R.
Director de Obra
Mat. Profesional 63202-725930NO

DANIEL FERNANDO MORALES DOTTOR
Director de Interventoria
Mat. Profesional 15202-207372BYC

GOBIERNO DE CALDAS

FORMATO PREACTA

FECHA	1	6	2026	PREACTA N°	3	ELABORÓ	MAURICIO ANTONIO CORTES REINA	PÁGINA	1	DE	1

NUMERO Y OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA No 29112025-1755 OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS KM 100 - K2+540
CONTRATISTA	CONSORCIO HORIZONTE AZUL
INTERVENTORIA	ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A BIC

No.	13	ITEM DE PAGO	610.1	DESCRIPCION	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	UNID.	m3	UBICACIÓN	Tres Puertas - Santagueda, Caldas



Fecha	DIMENSIONES						VOLUMEN (M3)
	UBICACIÓN			LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	
31/05/2026	BOX CULVERT	LLENO LATERAL IZQUIERDO	K1+266	8.00	1.38	1.66	20.13
31/05/2026	BOX CULVERT	LLENO LATERAL DERECHO	K1+266	8.00	1.07	1.65	15.81



SUBTOTAL CONSOLIDADO DE LA ACTIVIDAD	35,94
TOTAL COBROS ANTERIORES	0,00
TOTAL ACUMULADO	35,90
TOTAL COBRO PRESENTE ACTA	35,90

ING. MANUEL FERNANDO SALAZAR
Residente de Obra
Mat. Profesional 17302-211578 CLD

ING. KAREN ANDREA MUNCIA GARCIA
Residente de Interventoria
Mat. Profesional 15202-406597 EYC

ING. MAURICIO A. CORTES R.
Director de Obra
Mat. Profesional 63202-72533DND

DANIEL FERNANDO MORALES DOTTOR
Director de Interventoria
Mat. Profesional 15202-207372DYC

GOBIERNO DE CALDAS

FORMATO PREACTA

Tipo de Documento: Formato - Registro
Código: R-EJO-13
Versión aprobada: 1
Página 1 de 1

FECHA	1	6	2026	PREACTA N°	3	ELABORÓ	MAURICIO ANTONIO CORTES REINA	PÁGINA	1	DE	1

NUMERO Y OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA No. 29112025-1755 OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS K0+100 - K21+540		
CONTRATISTA	CONSORCIO HORIZONTE AZUL	INTERVENTORÍA	ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A BIC

No.	72	ITEM DE PAGO	200,13P	DESCRIPCION	RESCATE Y TRASLADO DE LA FLORA EPÍFITA VASCULAR EN VEDA NACIONAL	UNID.	Und	UBICACIÓN	Tres Puertas - Santagueda Caldas









Fecha	DIMENSIONES						Cantidad (Und)
	N° Forofito	ID árbol	Coordenadas Datum		Especie Forofito	Epifitas vasculares	
31/05/2026	1	L086	4705515,332	2120846,729	Aegiphila integrifolia (Jacq.) B.D.Jacks.	30	30
31/05/2026	2	L084	4705513,661	2120844,966	Alouea montana (Sw.) R.Rohde	32	32
31/05/2026	3	E108	4705517,971	2120840,966	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	31	31
31/05/2026	4	E109	4705515,683	2120845,731	Aegiphila integrifolia (Jacq.) B.D.Jacks.	30	30
31/05/2026	5	E110	4705518,218	2120847,160	Aegiphila integrifolia (Jacq.) B.D.Jacks.	20	20
31/05/2026	6	J056	4705521,661	2120869,931	Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken	33	33
31/05/2026	7	J057	4705522,406	2120867,606	Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken	43	43
31/05/2026	8	E114	4705519,744	2120867,728	Aegiphila integrifolia (Jacq.) B.D.Jacks.	25	25
31/05/2026	9	L116	4705537,257	2120703,062	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	18	18
31/05/2026	10	L117	4705538,146	2120703,611	Cupania americana L.	22	22
31/05/2026	11	E119	4705505,125	2120468,692	Aegiphila integrifolia (Jacq.) B.D.Jacks.	20	20
31/05/2026	12	E120	4705504,685	2120469,357	Cupania americana L.	45	45
31/05/2026	13	E121	4705507,228	2120467,577	Cupania americana L.	46	46
31/05/2026	14	L139	4705497,780	2120462,638	Vernonanthura patens (Kunth) H.Rob.	11	11
31/05/2026	15	L140	4705500,669	2120463,843	Nectandra acutifolia (Ruiz & Pav.) Mez	35	35
31/05/2026	16	L141	4705499,115	2120463,517	Trichilia pallida Sw.	41	41
31/05/2026	17	L143	4705498,876	2120459,426	Persea americana Mill.	22	22
31/05/2026	18	E128	4705497,542	2120458,657	Trichilia pallida Sw.	40	40
31/05/2026	19	L144	4705495,651	2120457,227	Alouea montana (Sw.) R.Rohde	3	3
31/05/2026	20	L146	4705492,112	2120459,696	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3	3
31/05/2026	21	L147	4705491,642	2120453,482	Persea americana Mill.	21	21
31/05/2026	22	L156	4705488,629	2120448,959	Aegiphila integrifolia (Jacq.) B.D.Jacks.	56	56
31/05/2026	23	E134	4705487,292	2120447,638	Aegiphila integrifolia (Jacq.) B.D.Jacks.	3	3
31/05/2026	24	E135	4705487,182	2120447,749	Aegiphila integrifolia (Jacq.) B.D.Jacks.	8	8
31/05/2026	25	E136	4705483,128	2120432,943	Aegiphila integrifolia (Jacq.) B.D.Jacks.	15	15
31/05/2026	26	E141	4705462,363	2120400,287	Cupania americana L.	20	20
31/05/2026	27	880	4705464,109	2120399,144	Alouea montana (Sw.) R.Rohde	59	59

SUBTOTAL CONSOLIDADO DE LA ACTIVIDAD	732,00
TOTAL COBROS ANTERIORES	0,00
TOTAL ACUMULADO	732,00
TOTAL COBRO PRESENTE ACTA	732,00

ING. MANUEL FERNANDO RAIA AR
Residente de Obra
Mat. Profesional 17202-215678 CLD

ING. KAREN ANDREA MURCIA GARCIA
Residente de Interventoría
Mat. Profesional 15202-400597 BYC

ING. MAURICIO A. CORTES R.
Director de Obra
Mat. Profesional 68202-72533GND

DANIEL FERNANDO MORALES DOTOR
Director de Interventoría
Mat. Profesional 15202-207372BYC

GOBIERNO DE CALDAS

FORMATO PREACTA

FECHA	1	6	2026	PREACTA N°	8	ELABORÓ	MAURICIO ANTONIO CORTES REINA	PÁGINA	1	DE	1

NUMERO Y OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA No. 2911/2025-1705 OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS. K0+100 - K2+540
CONTRATISTA	CONSORCIO HORIZONTE AZUL — INTERVENTORÍA: ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A BIC

No.	73	ITEM DE PAGO	308 14P	DESCRIPCION	AHUYENTAMIENTO, RESCATE Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE PRESENTE EN LOS ÁRBOLES AISLADOS DEL PROYECTO VÍA TRES PUERTAS - LA ROCHELA BAJO EL PROTOCOLO DE MANEJO Y CONTINGENCIA DE FAUNA SILVESTRE SOLICITADO EN LA RESOLUCIÓN DE CORPOCALDAS No 2026-0544	UNID.	GI	UBICACIÓN	Tres Puertas - Santaguaca, Caldas





Fecha	DIMENSIONES		CANTIDAD (GL)
	UBICACIÓN	CANTIDAD (GL)	
	K0+ 100 AL K2+540		
27/05/2026	AHUYENTAMIENTO, RESCATE Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE PRESENTE EN LOS ÁRBOLES AISLADOS DEL PROYECTO VÍA TRES PUERTAS - LA ROCHELA BAJO EL PROTOCOLO DE MANEJO Y CONTINGENCIA DE FAUNA SILVESTRE SOLICITADO EN LA RESOLUCIÓN DE CORPOCALDAS No 2026-0544	1,00	1,00



SUBTOTAL CONSOLIDADO DE LA ACTIVIDAD	1,00
TOTAL COBROS ANTERIORES	0,00
TOTAL ACUMULADO	1,00
TOTAL COBRO PRESENTE ACTA	1,00

ING. MANUEL FERNANDO GALAZAR
Residente de Obra
Mat. Profesional 17202-215678 CLD

ING. KAREN ANDREA MURCIA GARCIA
Residente de Interventoría
Mat. Profesional 15202-406587 BYC

ING. MAURICIO A. CORTES R.
Director de Obra
Mat. Profesional 63202-72533QNO

DANIEL FERNANDO MORALES DOTTOR
Director de Interventoría
Mat. Profesional 15202-207372BYC

PRESUPUESTO PMT " MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS K0+100 - K2+540 "

GOBIERNO DE CALDAS

ACTA PMT No.3

DURACIÓN	12 Meses
Frentes	2,0

CONTRATISTA: CONSORCIO HORIZONTE AZUL
INTERVENTORÍA: ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A BIC
CONTRATO DE OBRA: 2911/2025-1755
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 05122025-1755

VALOR DEL CONTRATO INICIAL: $ 15.379.416.313,50
VALOR DEL CONTRATO ACTUAL: $ 15.379.416.313,50
VALOR PROVISIÓN PMT INICIAL: $ 139.618.680,00
VALOR PROVISIÓN PMT ACTUAL: $ 139.618.680,00

PERIODO: may-25
VALOR PMT PRESENTE MES: $ 11.920.205,00
VALOR ACUMULADO PMT: $ 43.285.876,00

CONDICIONES INICIALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA		VALORES ACUMULADOS	
PERSONAL	CANTIDAD	SALARIO	FACTOR PRESTACIONAL	DEDICACION	TIEMPO MESES	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
PALETEROS	4,00	$ 2.576.535,00		100%	12	$ 123.673.680,00	48	$ 123.673.680,00	4,00	$ 10.306.140,00	12,00	$ 35.040.876,00
SEÑALES Y DISPOSITIVOS												
ITEM		UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	Sectores de cierre	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
SEÑAL VERTICAL SIO-02 (INICIO DE OBRA)		UND	$ 140.000,00	2,0		$ 280.000,00	2,00	$ 280.000,00	0,00	$ -	2,00	$ 280.000,00
SEÑAL VERTICAL SIO-03 (FIN DE OBRA)		UND	$ 140.000,00	2,0		$ 280.000,00	2,00	$ 280.000,00	0,00	$ -	2,00	$ 280.000,00
SEÑAL VERTICAL SPO-01 (TRABAJOS EN LA VIA)		UND	$ 120.000,00	4,0		$ 480.000,00	4,00	$ 480.000,00	0,00	$ -	4,00	$ 480.000,00
SEÑAL VERTICAL SPO-05 ANGOSTAMIENTO LA DERECHA		UND	$ 120.000,00	2,0		$ 240.000,00	2,00	$ 240.000,00	0,00	$ -	2,00	$ 240.000,00
SEÑAL VERTICAL SPO-06 ANGOSTAMIENTO LA IZQUIERDA		UND	$ 120.000,00	2,0		$ 240.000,00	2,00	$ 240.000,00	0,00	$ -	2,00	$ 240.000,00
SEÑAL VERTICAL SPO-03 AUXILIAR DE TRÁNSITO		UND	$ 120.000,00	4,0		$ 480.000,00	4,00	$ 480.000,00	0,00	$ -	4,00	$ 480.000,00
SEÑAL VERTICAL SPO-02 (MAQUINARIA EN LA VIA)		UND	$ 120.000,00	4,0		$ 480.000,00	4,00	$ 480.000,00	0,00	$ -	4,00	$ 480.000,00
SEÑAL BARRICADA		UND	$ 400.000,00	4,0		$ 1.600.000,00	4,00	$ 1.600.000,00	0,00	$ -	4,00	$ 1.600.000,00
SEÑAL BOMBONES		UND	$ 35.000,00	300,0		$ 10.500.000,00	300,00	$ 10.500.000,00	40,00	$ 1.400.000,00	80,00	$ 2.800.000,00
SEÑALIZACION CON CINTA DE DEMARCACION		MTS	$ 450,00	900,0		$ 405.000,00	900,00	$ 405.000,00	475,70	$ 214.065,00	900,00	$ 405.000,00
APROXIMACION OBRA EN LA VÍA		UND	$ 160.000,00	2,0		$ 320.000,00	2,00	$ 320.000,00	0,00	$ -	2,00	$ 320.000,00
DESVIO		UND	$ 160.000,00	4,0		$ 640.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 640.000,00
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS SEÑALIZACIÓN FRENTE						$ 15.945.000,00		$ 15.305.000,00		$ 1.614.065,00		$ 8.245.000,00
TOTAL PMT						$ 139.618.680,00	TOTAL PMT	$ 138.978.680,00	TOTAL PMT ACTA No.	$ 11.920.205,00	ACUMULADO PMT	$ 43.285.876,00

Firma
JORGE RICARDO GUTIERREZ
Secretaria de Infraestructura
Ordenador del Gasto

Firma
ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A BIC
Interventoría

Firma
CONSORCIO HORIZONTE AZUL
Contratista

Firma
JORGE HERNAN NEIRA DIAZ
Supervisor

GOBIERNO DE CALDAS


FORMATO PREACTA

Tipo de Documento: Formato
Código: F-4.0-13
Versión aprobada: 1
Página 1 de 1


FECHA	1	06	20	PREACTA Nº	3	ELABORÓ	MAURICIO ANTONIO CORTES ROA	PÁGINA	1	DE	1

NUMERO Y OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA No. 2911-2025-1735 OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS K0+100 - K2+540		
CONTRATISTA	CONSORCIO HORIZONTE AZUL	INTERVENTORIA	ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A BIC

No.	1	ITEM DE PAGO		DESCRIPCION	PALETERAS	UNID.	UNI	UBICACIÓN	Tres Puertas - Barragueco, Caldas

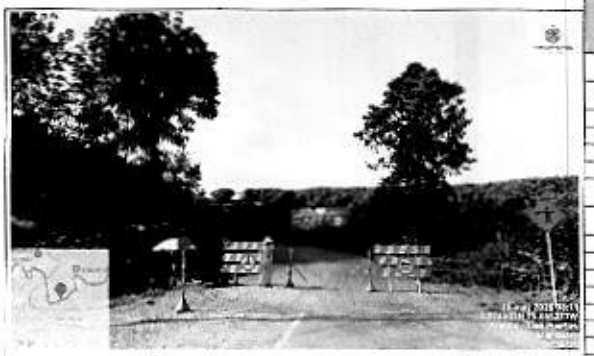



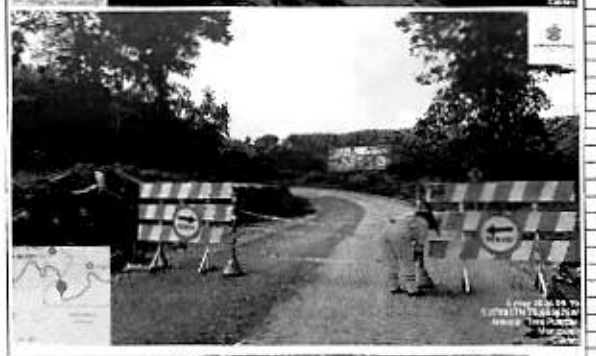



Fecha	DIMENSIONES				TOTAL (UND)
	UBICACIÓN	FRENTES	CANTIDAD	MES	
1/05/2026 31/05/2026	Corte Pavimento, Demolicion Pavimento, Excavacion y Base Ancho K1+100 al K2+540, construccion CT, Topografia	1,00	4,00	1,00	4,00

SUBTOTAL CONSOLIDADO DE LA ACTIVIDAD	4,00
TOTAL COBROS ANTERIORES	5,80
TOTAL ACUMULADO	9,80
TOTAL COBRO PRESENTE ACTA	4,00

ING. MANUEL FERNANDO SALAZAR
Residente de Obra
Mat. Profesional 17302-216578 CLD

ING. KAREN ANDREA MURCIA GARCIA
Residente de Interventoría
Mat. Profesional 15202-400597 BYC

ING. MAURICIO A. CORTES R.
Director de Obra
Mat. Profesional 68202-72533CND

DANIEL FERNANDO MORALES OSTIOS
Director de Interventoría
Mat. Profesional 15202-207372BYC

GOBIERNO DE CALDAS

FORMATO PREACTA

FECHA	1	6	2026	PREACTA Nº	3	ELABORO	MAURICIO ANTONIO CORTES REINA	PÁGINA	1	DE	1

NUMERO Y OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA No. 29112025-1755 OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS K0+100 - K2+540		
CONTRATISTA	CONASORCO HORIZONTE AZUL	INTERVENTORIA	ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A BIC

No.	10	ITEM DE PAGO		DESCRIPCION	DELINEADORES TUBULARES	UNID.	UND	UBICACIÓN	Tres Puertas - Santagueda, Caldas







Fecha	DIMENSIONES UBICACIÓN	CANTIDAD UND)			CANTIDAD UND)
31/05/2026	K1+266 BOX	20,00			20,00
	K1+900 EXPLANACION	20,00			40,00

SUBTOTAL CONSOLIDADO DE LA ACTIVIDAD	40,00
TOTAL COBROS ANTERIORES	40,00
TOTAL ACUMULADO	80,00
TOTAL COBRO PRESENTE ACTA	40,00

ING. MANUEL FERNANDO SALAZAR
Residente de Obra
Mat. Profesional 17202-215678 CLD

ING. KAREN ANDREA MURCIA GARCIA
Residente de Interventoria
Mat. Profesional 15202-406597 BYC

ING. MAURICIO A. CORTES R.
Director de Obra
Mat. Profesional 63202-72533GND

DANIEL FERNANDO MORALES COTTOR
Director de Interventoria
Mat. Profesional 15202-237372BYC

GOBIERNO DE CALDAS

FORMATO PREACTA

Página 1 de 1

FECHA	1	6	2026	PREACTA N°	3	ELABORÓ	MAURICIO ANTONIO CORTES REINA	PÁGINA	1	DE	1

NUMERO Y OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA No. 2911/2025-1755 OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS: K0+100 - K2+540		
CONTRATISTA	CONASORCO HORIZONTE AZUL	INTERVENTORIA	ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A BIC

No.	11	ITEM DE PAGO		DESCRIPCION	CINTA DE DEMARACION	UNID.	M	UBICACIÓN	Tres Puertas - Santagueda, Caldas



Fecha	DIMENSIONES				LONGITUD (M)
	UBICACIÓN	LONGITUD (M)	LINEAS	CARRIL	
31/05/2026	K0+143,00	6,70	3,00	CI	20,10
	K0+208,00	10,90	2,00	CD	21,80
	K0+459,00	10,00	2,00	CD	20,00
	K0+553,00	5,15	2,00	CD	10,30
	K0+642,00	9,00	2,00	CD	18,00
	K0+680,00	11,50	2,00	CI	23,00
	K0+812,00	6,20	2,00	CI	12,40
	K0+818,00	10,80	3,00	CI	32,40
	K0+812,00	4,20	3,00	CD	12,60
	K0+895,00	14,20	2,00	CI	28,40
	K0+900,00	7,50	2,00	CD	15,00
	K0+995,00	5,90	2,00	CD	11,80
	K1+019,00	2,70	3,00	CD	8,10
	K1+082,00	22,10	2,00	CI	44,20
	K1+255,00	12,65	2,00	CD	25,30
	K1+258,25	3,25	3,00	CD	9,75
	K1+270,70	12,45	2,00	CD	24,90
	K1+297,70	27,00	2,00	CD	54,00
	K1+363,00	6,50	2,00	CI	13,00
	K1+535,00	17,80	2,00	CD	35,60
	K1+535,00	19,60	2,00	CI	35,00









SUBTOTAL CONSOLIDADO DE LA ACTIVIDAD	475,65
TOTAL COBROS ANTERIORES	424,30
TOTAL ACUMULADO	900,00
TOTAL COBRO PRESENTE ACTA	475,70

ING. MANUEL FERNANDO SALAZAR
Residente de Obra
Mat. Profesional 17220-216678 CLD

ING. KAREN ANDREA MURCIA GARCIA
Residente de Interventoria
Mat. Profesional 15202-400567 BYC

ING. MAURICIO A. CORTES R.
Director de Obra
Mat. Profesional 63202-72533QND

DANIEL FERNANDO MORALES DOTTOR
Director de Interventoria
Mat. Profesional 15202-207372BYC

Gobierno de CALDAS

GOBERNACIÓN DE CALDAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO
VERSIÓN
PÁGINA 1 de 1
FECHA 01/08/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS — MUNICIPIO: MANIZALES — ACTA No 3 (Numerar de manera consecutiva) — POR CANTIDADES DE OBRA X — POR CONTRATO ADICIONAL (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No 20112025-1755 (Indique número y año)

OBJETO:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS KM100 - K2+540

CONTRATISTA: CONSORCIO HORIZONTE ATIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 05122025-1755 — INTERVENTOR: ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S.

PLAZO INICIAL: 12 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/01/2026 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (Incluido IVA) (A): $ 15.178.416.313,53 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) (C=A+B): $ 15.178.416.313,53

PLAZO ACUMULADO: 12 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 22/01/2027 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): $

No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN GR.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR CANTIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR VALOR	PRESENTES +/-	PRESENTES CANTIDAD	PRESENTES VALOR	EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA CANTIDAD	EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA VALOR	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANTIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS VALOR
				CAPÍTULO 1. ACTIVIDADES PRELIMINARES													
1.1	210.1.1			EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	24558	$ 27.748,50	$ 681.447.663,00	9320,00	$ 258.616.020,00			$ 0,00	0,00	$ -	9.320,00	$ 258.616.020,00
1.2	210.2.1			EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	6139	$ 53.615,40	$ 329.549.457,60	2330,00	$ 124.937.872,00			$ 0,00	0,00	$ -	2.330,00	$ 124.937.872,00
1.3	220.1P			TERRAPLENES CONFORMADOS CON SUELO (MATERIAL SELECCIONADO PARA RELLENO)	m3	3314	$ 45.500,00	$ 178.087.000,00	9911,00	$ 450.950.500,00			$ 0,00	0,00	$ -	9.911,00	$ 450.950.500,00
1.4	201.7			DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	m3	191	$ 287.172,60	$ 54.849.966,60	191,00	$ 54.849.966,60			$ 0,00	0,00	$ -	191,00	$ 54.849.966,60
1.5	201.5			DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RIGIDOS Y FLEXIBLES	m2	15068	$ 15.600,00	$ 250.972.800,00	5169,00	$ 80.636.400,00			$ 0,00		$ -	5.169,00	$ 80.636.400,00
				CAPÍTULO 2. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO													
2.1	450.2P			MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (Compra de mezcla)	m3	2079	$ 1.163.500,00	$ 2.418.916.500,00	2025,00	$ 2.356.057.500,00			$ 0,00	0,00	$ -	2.025,00	$ 2.356.057.500,00
2.2	420.2			RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-57	m2	20618	$ 5.550,00	$ 120.615.300,00	22997,00	$ 134.532.450,00			$ 0,00	0,00	$ -	22.997,00	$ 134.532.450,00
2.3	330.2.1			BASE GRANULAR CLASE B	m3	5624	$ 204.852,70	$ 1.131.606.314,80	6615,00	$ 1.334.615.340,50			$ 0,00	0,00	$ -	6.615,00	$ 1.334.615.340,50
2.4	320.2.2			SUB-BASE GRANULAR CLASE B	m3	5998	$ 175.125,60	$ 1.049.002.344,00	4045,00	$ 708.383.052,00			$ 0,00	0,00	$ -	4.045,00	$ 708.383.052,00
2.5	311.1			AFIRMADO	m3	3474	$ 97.490,00	$ 338.698.260,00	0,00	$ 0,00			$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -
				CAPÍTULO 3. ESTRUCTURAS DE DRENAJE													
3.1	600.1.1			EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	3418	$ 114.400,00	$ 391.019.200,00	4132,00	$ 472.700.800,00			$ 0,00	0,00	$ -	4.132,00	$ 472.700.800,00
3.1	600.2.1			EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO	m3	856	$ 195.270,40	$ 166.956.192,00	856,00	$ 166.956.192,00			$ 0,00	0,00	$ -	856,00	$ 166.956.192,00

2

GOBERNACIÓN DE CALDAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO
VERSIÓN
FECHA

FECHA: 01/04/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS | MUNICIPIO: MANIZALES | ACTA No.: 3 (Numerar de manera consecutiva) | POR CANTIDADES DE OBRA: X | POR CONTRATO ADICIONAL: (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No: 2811/2025-1755 (Indique número y año)

OBJETO:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS. KD+100 - KD+540

CONTRATISTA: CONSORCIO HORIZONTE AZUL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 05122025-1756 | INTERVENTOR: ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S.

PLAZO INICIAL: 12 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25/01/2026 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (Incluido IVA) ($): $ 15.179.410.313,50 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) (5)+(6): $ 15.179.410.313,50

PLAZO ACUMULADO: 12 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 22/01/2027 (Incluidas las suspensiones. Indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) ($): $ -

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR		PRESENTES						
		GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+/-	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
3.3	610.1			RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	m3	308	$ 131.982,50	$ 40.650.610,00	308,00	$ 40.650.610,00			$ 0,00	0,00	$ -	308,00	$ 40.650.610,00
3.4	201.15			REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS	m	93	$ 215.312,50	$ 20.024.062,50	93,00	$ 20.024.062,50			$ 0,00	0,00	$ -	93,00	$ 20.024.062,50
3.5	630.1.3.2			CONCRETO DE RESISTENCIA 28MPa - COMPRA DE MEZCLA	m3	69	$ 1.029.442,70	$ 70.002.103,60	69,00	$ 70.002.103,60			$ 0,00	0,00	$ -	69,00	$ 70.002.103,60
3.6	630.1.4.2			CONCRETO DE RESISTENCIA 21MPa - COMPRA DE MEZCLA	m3	377	$ 1.109.132,70	$ 418.143.027,90	377,00	$ 418.143.027,90			$ 0,00	0,00	$ -	377,00	$ 418.143.027,90
3.7	630.1.6			CONCRETO DE RESISTENCIA14MPa - MEZCLA IN SITU	m3	6	$ 640.074,50	$ 3.840.447,00	6,00	$ 3.840.447,00			$ 0,00	0,00	$ -	6,00	$ 3.840.447,00
3.8	640.1			ACERO DE REFUERZO fy = 4200MPa	kg	29969	$ 8.395,40	$ 251.601.742,60	29969,00	$ 251.601.742,60			$ 0,00	0,00	$ -	29.969,00	$ 251.601.742,60
3.9	311.1			AFIRMADO	m3	7	$ 87.490,00	$ 612.430,00	7,00	$ 612.430,00			$ 0,00	0,00	$ -	7,00	$ 612.430,00
3.1	663.1			TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC NORMA NTC-5055, DE DIÁMETRO INTERNO 900 mm	m	134	$ 1.280.464,60	$ 171.582.256,40	134,00	$ 171.582.256,40			$ 0,00	0,00	$ -	134,00	$ 171.582.256,40
3.11	663.1.2			TUBERÍA DE PVC 4" PARA FILTROS	m	2463	$ 34.160,10	$ 84.136.326,30	2463,00	$ 84.136.326,30			$ 0,00	0,00	$ -	2.463,00	$ 84.136.326,30
3.12	673.1.1			GEOTEXTIL TIPO NT 2500	m2	12580	$ 7.482,80	$ 94.133.624,00	12580,00	$ 94.133.624,00			$ 0,00	0,00	$ -	12.580,00	$ 94.133.624,00
3.13	673.2			MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3	3507	$ 132.600,00	$ 465.028.200,00	3507,00	$ 465.028.200,00			$ 0,00	0,00	$ -	3.507,00	$ 465.028.200,00
3.14	601.6*			JUNTA DE CONSTRUCCIÓN CINTA PVC	m	23	$ 73.972,60	$ 1.701.369,50	23,00	$ 1.701.369,50			$ 0,00	0,00	$ -	23,00	$ 1.701.369,50
3.15	670.5			DISIPADORES DE ENERGIA Y SEDIMENTADORES DE CONCRETO CICLOPEO (Analizado para un concreto ciclopeo de 17 MPA)	m3	139	$ 602.635,60	$ 83.766.376,20	139,00	$ 83.766.376,20			$ 0,00	0,00	$ -	139,00	$ 83.766.376,20
				CAPÍTULO 4. OBRAS DE ESTABILIZACION CON MUROS EN CONCRETO REFORZADO													

Gobernación de CALDAS

GOBERNACIÓN DE CALDAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO
VERSIÓN
PÁGINA

FECHA: 07/08/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS **MUNICIPIO:** MANIZALES ACTA No.: 3 (Numerar de manera consecutiva) POR CANTIDADES DE OBRA: X POR CONTRATO ADICIONAL: (Indicar No. y Fecha)

CONTRATO No.: 2911/2025-1755 (Indicar número y año)

OBJETO:

MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS K2+100 - K2+540

CONTRATISTA: CONSORCIO HORIZONTE AZUL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 0912/2025-1756 INTERVENTOR: ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.B.C.

PLAZO INICIAL: 12 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/01/2026 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL incluido IVA (B): $ 15.179.418.313,60 (Mayor contrato principal)

VALOR ADICIONES incluido (IVA) (B): $ -

VALOR ACUMULADO incluido IVA (C=A+B): $ 15.179.418.313,60

PLAZO ACUMULADO: 12 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 23/01/2027 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR		PRESENTES						
		GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+/-	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
4.1	600.1.1			EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	1786	$ 114.400,00	$ 204.318.400,00	1786,00	$ 204.318.400,00			$ 0,00	0,00	$ -	1.786,00	$ 204.318.400,00
4.2	600.2.1			EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO	m3	446	$ 195.270,40	$ 87.090.598,40	446,00	$ 87.090.598,40			$ 0,00	0,00	$ -	446,00	$ 87.090.598,40
4.3	610.1			RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	m3	1435	$ 131.982,50	$ 189.394.887,50	1435,00	$ 189.394.887,50			$ 0,00	0,00	$ -	1.435,00	$ 189.394.887,50
4.4	630.1.3.2			CONCRETO DE RESISTENCIA 28MPa - COMPRA DE MEZCLA	m3	952	$ 1.029.442,70	$ 1.010.912.731,40	1044,00	$ 1.074.738.178,80			$ 0,00	0,00	$ -	1.044,00	$ 1.074.738.178,80
4.5	630.1.6			CONCRETO DE RESISTENCIA14MPa - MEZCLA IN SITU	m3	54	$ 640.074,50	$ 34.564.023,00	54,00	$ 34.564.023,00			$ 0,00	0,00	$ -	54,00	$ 34.564.023,00
4.6	640.1			ACERO DE REFUERZO fy = 4200MPa	kg	86630	$ 8.395,40	$ 726.453.962,00	91843,00	$ 771.068.722,20			$ 0,00	0,00	$ -	91.843,00	$ 771.068.722,20
4.7	673.2			MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3	287	$ 132.600,00	$ 38.056.200,00	287,00	$ 38.056.200,00			$ 0,00	0,00	$ -	287,00	$ 38.056.200,00
4.8	680.1.2.1			TUBERÍA DE PVC 3"	m	836	$ 32.658,60	$ 27.367.906,80	838,00	$ 27.367.906,80			$ 0,00	0,00	$ -	838,00	$ 27.367.906,80
4.9	680.1.2			TUBERÍA DE PVC 4" PARA FILTROS	m	474	$ 34.160,10	$ 16.191.887,40	474,00	$ 16.191.887,40			$ 0,00	0,00	$ -	474,00	$ 16.191.887,40
4.10	601.5P			JUNTA DE CONSTRUCCIÓN CINTA PVC	m	357	$ 79.972,60	$ 28.408.218,20	357,00	$ 28.408.218,20			$ 0,00	0,00	$ -	357,00	$ 28.408.218,20
4.11	673.1.1			GEOTEXTIL TIPO NT 2500	m2	2349	$ 7.482,80	$ 17.577.097,20	2349,00	$ 17.577.097,20			$ 0,00	0,00	$ -	2.349,00	$ 17.577.097,20
				CAPÍTULO 5. OBRAS DE ESTABILIZACION CON MUROS EN GAVIONES													
5.1	600.1.1			EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	379	$ 114.400,00	$ 43.357.600,00	379,00	$ 43.357.600,00			$ 0,00	0,00	$ -	379,00	$ 43.357.600,00
5.2	600.2.1			EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO	m3	95	$ 195.270,40	$ 18.550.688,00	95,00	$ 18.550.688,00			$ 0,00	0,00	$ -	95,00	$ 18.550.688,00
5.3	610.1			RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	m3	58	$ 131.982,50	$ 7.654.985,00	58,00	$ 7.654.985,00			$ 0,00	0,00	$ -	58,00	$ 7.654.985,00

Gobierno de CALDAS

GOBERNACIÓN DE CALDAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO
VERSIÓN
PAGINA

FECHA: 01/06/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS — MUNICIPIO: MANIZALES — ACTA No. 3 (Numerar de manera consecutiva) — POR CANTIDADES DE OBRA: X — POR CONTRATO ADICIONAL: (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No: 2611.2025-1755 (Indique número y año)

OBJETO:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS K0+100 - K2+640

CONTRATISTA: CONSORCIO HORIZONTE AZUL

CONTRATO de INTERVENTORÍA No.: 0512.2025-1756 — INTERVENTOR: ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S.

PLAZO INICIAL: 12 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/01/2026 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponde con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (Incluido IVA) (A): $ 15.179.416.313,50 (Mayor contrato principal)
VALOR ACUMULADO (Incluye IVA) (C=A+B): $ 15.179.416.313,50

PLAZO ACUMULADO: 12 MESES (En meses según las prórrogas y/o suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 22/01/2027 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE ESTABILIZACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): $

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN GR.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR CANTIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR VALOR	MODIFICACIONES: PRESENTES +/-	PRESENTES CANTIDAD	PRESENTES VALOR	EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA CANTIDAD	EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA VALOR	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANTIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS VALOR
5.4	630.1 4.2			CONCRETO DE RESISTENCIA 21MPa - COMPRA DE MEZCLA	m3	43	$ 1.109.132,70	$ 47.692.706,10	43,00	$ 47.692.706,10			$ 0,00	0,00	$ -	43,00	$ 47.692.706,10
5.5	673.2			MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3	47	$ 132.600,00	$ 6.232.200,00	47,00	$ 6.232.200,00			$ 0,00	0,00	$ -	47,00	$ 6.232.200,00
5.6	663.1 2.1			TUBERÍA DE PVC 3"	m	75	$ 32.658,60	$ 2.449.395,00	75,00	$ 2.449.395,00			$ 0,00	0,00	$ -	75,00	$ 2.449.395,00
5.7	673.1 2P			GEOTEXTIL TIPO NT 1600	m2	411	$ 8.952,10	$ 3.642.323,10	411,00	$ 3.642.323,10			$ 0,00	0,00	$ -	411,00	$ 3.642.323,10
5.8	681.1			GAVIONES O COLCHOGAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO TIPO 1, RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO) (analizado para gavion de vol 2m3 (2 modulo de cada de 1 mt x 1mt x 1mt)	m3	465	$ 352.523,60	$ 164.961.044,80	468,00	$ 164.961.044,80			$ 0,00	0,00	$ -	465,00	$ 164.961.044,80
5.9	640.2			MALLA DE REFUERZO fy = 420 Mpa	kg	1217	$ 9.259,90	$ 11.269.298,30	1217,00	$ 11.269.298,30			$ 0,00	0,00	$ -	1.217,00	$ 11.269.298,30
5.10	311.1			AFIRMADO	m3	90	$ 87.490,00	$ 7.874.100,00	90,00	$ 7.874.100,00			$ 0,00	0,00	$ -	90,00	$ 7.874.100,00
				CAPÍTULO 6. BEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL													
6.1	700.1			LÍNEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRÍO	m	9760	$ 3.616,60	$ 35.298.016,00	9760,00	$ 35.298.016,00			$ 0,00	0,00	$ -	9.760,00	$ 35.298.016,00
6.2	700.3			MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	m2	19	$ 52.698,10	$ 1.001.263,90	19,00	$ 1.001.263,90			$ 0,00	0,00	$ -	19,00	$ 1.001.263,90
6.3	701.1.1			TACHA REFLECTIVA CON ADHESIVO BITUMINOSO Y/O TERMOPLÁSTICO	u	1220	$ 12.916,50	$ 15.756.910,00	1220,00	$ 15.756.910,00			$ 0,00	0,00	$ -	1.220,00	$ 15.756.910,00
6.4	710.1.1			SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR, SP Y/O SI, DIMENSIONES 75x75CM CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV	u	35	$ 1.216.226,40	$ 42.567.889,00	35,00	$ 42.567.889,00			$ 0,00	0,00	$ -	35,00	$ 42.567.889,00
6.5	710.1.5			SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SP-75 DIMENSIONES 75x90CM CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV	u	11	$ 968.081,90	$ 10.648.680,90	11,00	$ 10.648.680,90			$ 0,00	0,00	$ -	11,00	$ 10.648.680,90

Gobernación de CALDAS

GOBERNACIÓN DE CALDAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO
VERSIÓN
PÁGINA

FECHA: 01/08/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS **MUNICIPIO:** MANIZALES **ACTA No.** 3 (numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA X

POR CONTRATO ADICIONAL (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No: 20112026-1756 (Indique número y año)

OBJETO:
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS KD+100 - K2+540

CONTRATISTA: CONSORCIO HORIZONTE ACA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 05122026-1756 INTERVENTOR: ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S.

PLAZO INICIAL: 12 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/01/2026 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN (Indique la suspensión que corresponde con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (Incluido IVA) (A): $ 10.179.419.313,50 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) (C=A+B): $ 10.179.419.313,50

PLAZO ACUMULADO: 12 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 22/01/2027 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): $

No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN GR.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR CANTIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR VALOR	MODIFICACIONES PRESENTES +/-	MODIFICACIONES PRESENTES CANTIDAD	MODIFICACIONES PRESENTES VALOR	EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA CANTIDAD	EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA VALOR	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANTIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS VALOR
				CAPÍTULO 7. URBANISMO													
7.1	672.4			BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO BORDILLO DE 0.15Mx0.4M DE ÁREA	m	2440	$ 78.175,50	$ 190.748.220,00	2440,00	$ 190.748.220,00			$ 0,00	0,00	$ -	2.440,00	$ 190.748.220,00
7.2	500.1.1			PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO	m3	659	$ 1.049.749,00	$ 691.125.591,00	659,00	$ 691.125.591,00			$ 0,00	0,00	$ -	659,00	$ 691.125.591,00
7.3	320.2.2			SUB-BASE GRANULAR CLASE B	m3	573	$ 175.125,60	$ 100.346.968,80	573,00	$ 100.346.968,80			$ 0,00	0,00	$ -	573,00	$ 100.346.968,80
7.4	632.1.3P			BARANDA PEATONAL SEGÚN DISEÑO	m	584	$ 801.292,79	$ 467.954.936,80	584,00	$ 467.954.936,80			$ 0,00	0,00	$ -	584,00	$ 467.954.936,80
7.5	510.1P			LOSETA TÁCTIL GUÍA PREFABRICADA EN CONCRETO DE 0.40x0.40x0.06	m2	967	$ 114.376,60	$ 110.602.172,20	967,00	$ 110.602.172,20			$ 0,00	0,00	$ -	967,00	$ 110.602.172,20
				CAPÍTULO 8. TRANSPORTES													
8.1	900.2.1			TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3 - Km	1117371	$ 1.610,40	$ 1.687.677.188,40	424077,00	$ 640.525.900,80			$ 0,00	0,00	$ -	424.077,00	$ 640.525.900,80
				ITEMS NO PREVISTOS													
NP1	200.7P			AHUYENTAMIENTO, RESCATE Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE EN 2.44 KILÓMETROS DE LA VÍA TRES PUERTAS - LA ROCHELA	GI	0	$ 33.972.120,00	$ -	1,00	$ 33.972.120,00			$ 0,00	0,00	$ -	1,00	$ 33.972.120,00
NP2	200.8P			TALA DE ARBOL (ARBOL DE 1.0-5.00 M ALTURA) (1 < h <= 5) , DAP > 0,10 MT, INCLUYE CORTE PARTE AÉREA Y RADICULAR, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL VEGETAL	m3	0	$ 572.728,00	$ -	46,00	$ 26.345.488,00	+	7,00	$ 4.009.096,00	0,00	$ -	53,00	$ 30.354.584,00

GOBERNACIÓN DE CALDAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO
VERSIÓN
PÁGINA

FECHA: 21/08/2026 (DÍA / MES / AÑO)

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS — MUNICIPIO: MANIZALES — ACTA No: 3 (Numerar de manera consecutiva) — POR CANTIDADES DE OBRA X — POR CONTRATO ADICIONAL (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No.: 20112025-1755 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS KD+100 - K2+540

CONTRATISTA: CONSORCIO HORIZONTE AZUL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 05122025-1756 — INTERVENTOR: ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S.

PLAZO INICIAL: 12 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/01/2026 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (Incluido IVA) (A): $ 15.179.416.313,50 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) (C=A+B): $ 15.179.416.313,50

PLAZO ACUMULADO: 12 MESES (En meses según las prorrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 22/01/2027 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): $ -

No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR		PRESENTES						
		GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+/-	CANTIDAD	VALOR		CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
NP3	200.9P			TALA DE ÁRBOL (ÁRBOL DE 5,0-10,0 M ALTURA (5 < h <= 10), DAP > 0,10 M). INCLUYE CORTE PARTE AÉREA Y RADICULAR, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL VEGETAL	m3	0	$ 977.728,00	$ -	191,00	$ 187.848.048,00			$ 0,00		0,00	$ -	191,00	$ 187.848.048,00
NP4	200.10P			TALA DE ÁRBOL (ÁRBOL DE 10,0-15,0 M ALTURA (10 < h <= 15), DAP > 0,10 M). INCLUYE CORTE PARTE AÉREA Y RADICULAR, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL VEGETAL	m3	0	$ 1.299.827,00	$ -	194,00	$ 252.166.438,00			$ 0,00		0,00	$ -	194,00	$ 252.166.438,00
NP5	200.11P			TALA DE ÁRBOL (ÁRBOL DE 15,0-20,0 M ALTURA (15 < h <= 20), DAP > 0,10 M). INCLUYE CORTE PARTE AÉREA Y RADICULAR, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL VEGETAL	m3	0	$ 1.819.712,00	$ -	205,00	$ 373.040.960,00			$ 0,00		0,00	$ -	205,00	$ 373.040.960,00
NP6	200.12P			TALA DE ÁRBOL (ÁRBOL DE > 20,0 M ALTURA, DAP > 0,10 M). INCLUYE CORTE PARTE AÉREA Y RADICULAR, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL VEGETAL	m3	0	$ 3.498.535,00	$ -	15,00	$ 52.478.025,00			$ 0,00		0,00	$ -	15,00	$ 52.478.025,00
NP7	200.1.16			REMOCION DE CERCAS DE ALAMBRE	ml	0	$ 7.154,00	$ -	2700,40	$ 19.319.681,60			$ 0,00		0,00	$ -	2.700,40	$ 19.319.681,60
NP8	200.2.2			DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA	m2	0	$ 4.842,00	$ -	2400,00	$ 11.620.800,00			$ 0,00		0,00	$ -	2.400,00	$ 11.620.800,00
NP9	800.1			CERCA DE ALAMBRE DE PUAS CON POSTES DE MADERA (GUADUA, 5 HILOS)	ml	0	$ 31.230,00	$ -	508,35	$ 15.875.907,90			$ 0,00		0,00	$ -	508,35	$ 15.875.907,90
NP10	221.1P			MATERIAL MIXTO - (MATERIAL DE CANTERA + MATERIAL DE RIO SELECCIONADO)	m3	0	$ 169.089,00	$ -	2711,00	$ 458.355.779,00			$ 0,00		0,00	$ -	2.711,00	$ 458.355.779,00
NP11	230.10			GEOMALLA PARA REFUERZO DE CAPAS GRANULARES (Analizado para GEOMALLA BIAXIAL EN POLIÉSTER DE ALTA TENACIDAD - FORGRID BX 30)	m2	0	$ 17.624,00	$ -	4514,00	$ 79.554.736,00			$ 0,00		0,00	$ -	4.514,00	$ 79.554.736,00
NP12	465.3P			CORTE PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	ml	0	$ 18.443,00	$ -	2379,00	$ 43.875.897,00			$ 0,00		0,00	$ -	2.379,00	$ 43.875.897,00
NP13	330.2.1			BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE II	m3	0	$ 237.619,00	$ -	876,50	$ 208.273.053,50			$ 0,00		0,00	$ -	876,50	$ 208.273.053,50

4

Gobierno de CALDAS

GOBERNACIÓN DE CALDAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO:
VERSIÓN:
PAGINA:
FECHA: 01/08/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS **MUNICIPIO:** MANIZALES ACTA No.: 3 (Numerar de manera consecutiva) POR CANTIDADES DE OBRA: X POR CONTRATO ADICIONAL: (Indique No. y fecha)

CONTRATO No: 2611/2025-1755 (Indique número y año)

OBJETO:

MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS Km100 - K3+543

CONTRATISTA: CONSORCIO HORIZONTE AZUL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 0512/2025-1709 INTERVENTOR: ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. SIC

PLAZO INICIAL: 12 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/01/2026 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 15.179.416.313,50 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 15.179.416.313,50

PLAZO ACUMULADO: 12 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 23/01/2027 (Incluidas las suspensiones. Indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ -

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN GRL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR CANTIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR VALOR	MODIFICACIONES PRESENTES +/-	MODIFICACIONES PRESENTES CANTIDAD	MODIFICACIONES PRESENTES VALOR	EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA CANTIDAD	EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA VALOR	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANTIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS VALOR
NP14	450 10P			MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA BACHEO TIPO MDC-19	m3	0	$ 1.339.010,00	$ -	121,53	$ 162.729.885,30	-	67,984	$ (91.031.235,60)	0,00	$ -	53,55	$ 71.695.629,50
NP15				RESCATE Y TRASLADO DE LA FLORA EPIFITA VASCULAR EN VEDA NACIONAL	Uno	0	$ 81.789,00	$ -			+	734,00	$ 60.033.126,00	0,00	$ -	734,00	$ 60.033.126,00
NP16				AHUYENTAMIENTO, RESCATE Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE PRESENTE EN LOS ÁRBOLES AISLADOS DEL PROYECTO VIA TRES PUERTAS - LA ROCHELA BAJO EL PROTOCOLO DE MANEJO Y CONTINGENCIA DE FAUNA SILVESTRE SOLICITADO EN LA RESOLUCIÓN DE CORPOCALDAS No 2026-0544	GL	0	$ 26.988.962,00	$ -			+	1,00	$ 26.988.962,00	0,00	$ -	1,00	$ 26.988.962,00
				AJUSTE AL PESO						$ 155,50			$ 71,80				$ 227,40
				VALOR TOTAL OBRA				$ 14.861.949.633,50		$ 14.861.949.633,50			$ 0,00		$ -		$ 14.861.949.633,50
				VALOR AIU (Incluye PMT - PASA) (NO MODIFICABLE)				$ 317.466.680,00		$ 317.466.680,00			$ -		$ -		$ 317.466.680,00
				VALOR TOTAL				**$ 15.179.416.313,50**		**$ 15.179.416.313,50**			$ 0,00		$ -		**$ 15.179.416.313,50**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio).

LA MODIFICACION No. 3 DE CANTIDADES DE OBRA, SURGEN POR LA NECESIDAD DE REALIZAR UNA MAYOR CANTIDAD DE OBRA PARA LOS ITEMS DE RTALA DE ARBOLES, Y LA INCLUSION DE ACTIVIDADES ACORDE A REQUERIMIENTO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL COSPOCALDAS ACORDE A LA RESOLUCION No. 2026-0544

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el supervisión con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firma:
Nombre: MAURICIO ANTONIO CORTES ELENA
Director de Obra
Contratista
Matrícula Profesional No.: 66202-72533CND

Firma:
Nombre: DANIEL FERNANDO MORALES DOTTOR
Director de Obra
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 15202-207372PC

Firma:
Nombre: JORGE HERNÁN NEIRA DÍAZ
Supervisora del contrato
Secretaría de Infraestructura
Matrícula Profesional No.: 17202-30690 CLD

JSma

Gobierno de CALDAS

GOBERNACIÓN DE CALDAS
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE FIJACIÓN DE ITEMS NO PREVISTOS

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-10-FR-4		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	-	DE	1

FECHA: 15 (Día) 5 (Mes) 26 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GOBERNACIÓN DE CALDAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** _____ **ACTA No:** 02

CONTRATO No. 29112025-1755

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS K0+100 - K2+540

CARRETERA: TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS **SECTOR:** _____

CONTRATISTA: CONSORCIO HORIZONTE AZUL

INTERVENTOR: ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A BIC **CTO No.** 05122025-1756

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA: _____ (Día) _____ (Mes) _____ (Año)

FECHA DE INICIACIÓN: 23 (Día) 1 (Mes) 2026 (Año) **VALOR INICIAL:** $ 15.179.416.313,00

FECHA DE SUSPENSIÓN: _____ (Día) _____ (Mes) _____ (Año) **FECHA DE REANUDACIÓN:** _____ (Día) _____ (Mes) _____ (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO: 22 (Día) 1 (Mes) 2026 (Año) **VALOR ACUMULADO:** $ 15.179.416.313,00

A.I.U : 30% **A** 25% **I** _____ **U** 5%

Se establecen los precios que se resumen a continuación:

ITEM	GRUPO DE AJUSTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD APROX	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
200,13P		RESCATE Y TRASLADO DE LA FLORA EPÍFITA VASCULAR EN VEDA NACIONAL	Und	732,00	$ 81.789,00	$ 59.869.548,00
200,14P		AHUYENTAMIENTO, RESCATE Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE PRESENTE EN LOS ÁRBOLES AISLADOS DEL PROYECTO VÍA TRES PUERTAS - LA ROCHELA BAJO EL PROTOCOLO DE MANEJO Y CONTINGENCIA DE FAUNA SILVESTRE SOLICITADO EN LA RESOLUCIÓN DE CORPOCALDAS No 2026-0544	GL	1,00	$ 26.988.962,00	$ 26.988.962,00

NOTAS :

1. Para los contratos pactados con ajustes, los precios unitarios correspondientes a los ítem no previstos están referidos al origen del contrato (Io) y se han fijado tomando como base los costos vigentes en el mercado.
2. Para los contratos pactados sin ajustes, se tomarán los costos vigentes en el mercado al momento del estudio de la solicitud.
3. Hacen parte de la presente Acta de Fijación de precios no previstos los documentos relacionados en el instructivo MINFRA-IN-10 del presente formato .
4. Es responsabilidad del Contratista la presentación de los ítems no previstos, con los documentos anexos que permitan verificar su utilización y justificación, manteniendo los precios aprobados en desarrollo del contrato.
5. Es responsabilidad de la Interventoría el análisis del precio unitario y la justificación técnica, económica y jurídica presentada al Instituto, recomendando su aprobación por parte de la Entidad.
6. La presente Acta se suscribe por el Director Territorial y el Jefe de la Unidad Ejecutora, con base en el concepto de aprobación emitido por la Interventoría.

OBSERVACIONES: _____

Firma
Nombre: LUIS ALBERTO MEZA GALEANO
Representante Legal o su Apoderado
Contratista
Matricula No.: 17202-08167 CLD

Firma
Nombre: JONATHAN ANDRES SAVIRIA CONTRERAS
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matricula No.: 25202-193762 CND

Firma
Nombre: JORGE HERNAN NEIRA DIAZ
Supervisor Gobernación de Caldas
Matricula No. : 17202-30596 CLD
(Suscribe según su competencia)

JSNB

Firma
Nombre: JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA
Secretario de Infraestructura
Matricula No. :
(Suscribe según su competencia funcional)

Original: Archivo Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copia: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección Estudios e Innovación.

REGRESAR A INDICE

GOBERNACIÓN DE CALDAS

MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS K0+100 - K2+540

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO	[illegible]
VERSIÓN	2023
PÁGINA	

HORIZONTE AZUL

CONTRATO No. 2511220-1750 FECHA:

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS K0+100 - K2+540

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA: CONSORCIO HORIZONTE AZUL

INTERVENTOR: ALIANZA INTERSAL DE PROYECTOS SAS BIC CONTRATO No. FECHA:

FECHA DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATO: / / (Día) (Mes) (Año)

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	GRUPO DE AJUSTE	UNIDAD	CANTIDAD
200,13P	RESCATE Y TRASLADO DE LA FLORA EPÍFITA VASCULAR EN VEDA NACIONAL		UND	

I. EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
	HERRAMIENTA MENOR (HACHA, MACHETE, ESCALERA, PALIN, RASTRILLO, MANILAS, ARNÉS, LÍNEA DE VIDA, CASCOS, TRAJE APICOLA, BOTAS, GUANTES, ETC)		$ 38.473,00	1,5%	$ 577,00
	CAMIONETA DE ESTACAS 4X4		$ 44.885,00	0,0	$ 5.611,00
				SUBTOTAL $	$ 6.188,00

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
	ELEMENTOS DE RESCATE (CANASTA)	GL	2.500,000	$ 4,00	$ 825,00
	INFORME	Und	1,000	$ 2.795,00	$ 2.795,00
	AMARRAS ECOLOGICA (TELA TRIPA DE POLLO)	m	0,054	$ 3.833,00	$ 104,00
	PLACAS DE MARCAJE	UND	1,000	$ 300,00	$ 300,00
	FERTILIZANTE FOLIAR "NUTRIFLEX"	kg	0,700	$ 37.300,00	$ 9.690,00
	OSMOCOTE (ABONO ORQUIDEAS) 500 GR	Und	0,040	$ 35.800,00	$ 1.432,00
	FORMONAS DE ESTIMULACION	ML	4,000	$ 300,00	$ 1.200,00
	AGUA	lt	20,000	$ 105,37	$ 2.107,00
				SUBTOTAL $	$ 18.263,00

III. TRANSPORTES

CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	CANTIDAD * DISTANCIA (1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
							$ -
						SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES (%)	JR. TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
	PROFESIONAL BIOLOGO	$ 200.000,00	165	$ 330.000,00	16,00	$ 20.625,00
	CUADRILLA AYUDANTE	$ 94.900,00	165	$ 175.585,00	16,00	$ 10.973,00
	PROFESIONAL SIG	$ 200.000,00	165	$ 330.000,00	48,00	$ 6.875,00
					SUBTOTAL $	$ 38.473,00
					TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 62.914,00

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	25%	$ 15.729,00
IMPREVISTOS	0%	$ -
UTILIDAD	5%	$ 3.146,00
	SUBTOTAL $	$ 18.875,00
	Precio Unitario Total Aproximado al Peso $	$ 81.789,00

Firma:
Nombre: LUIS ALBERTO MEZA GALEANO
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula No. : 1720208167 CLD

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA:

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma:
Nombre: JOHN JAIRO [illegible] CONTRERAS
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula No. : 25202-193762 CND

REGRESAR A INDICE

GOBERNACION DE CALDAS

MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS KD+100 - K21+540

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO	FR-APU-1	
VERSIÓN	2021	
PAGINA		

HORIZONTE AZUL

CONTRATO No. 2911230S-1755 FECHA:

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS KD+100 - K21+540

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA: CONSORCIO HORIZONTE AZUL

INTERVENTOR: ALIANZA INTERGAL DE PROYECTOS SAS. BIC CONTRATO No. FECHA:

FECHA DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATO: / / (Día) (Mes) (Año)

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	GRUPO DE AJUSTE	UNIDAD	CANTIDAD
200,14P	AHUYENTAMIENTO, RESCATE Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE PRESENTE EN LOS ÁRBOLES AISLADOS DEL PROYECTO VÍA TRES PUERTAS - LA ROCHELA BAJO EL PROTOCOLO DE MANEJO Y CONTINGENCIA DE FAUNA SILVESTRE SOLICITADO EN LA RESOLUCIÓN DE CORPOCALDAS No 2026-0544		GL	

I. EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
	HERRAMIENTA MENOR (HACHA, MAC-ETE, ESCALERA, PALÍN, RASTRILLO, MANILAS, ARNÉS, LÍNEA DE VIDA, CASCOS, TRAJE APICOLA, BOTAS, GUANTES, ETC.)		$ 17.160.000,00	1,5%	$ 257.400,00
	DISPOSITIVOS AUDITIVOS/VISUALES (ESPANTA-PAJAROS, CINTAS, ETC.)	GL	$ 35.700,00	9,100	$ 345.582,00
	ELEMENTOS DE RESCATE (JAULAS, REDES)	GL	$ 47.600,00	9,100	$ 460.799,00
				SUBTOTAL $	$ 1.063.781,00

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
	CINTAS DE SEÑALIZACIÓN/BALIZAMIENTO (500 ML)	RLL	4,0	$ 38.675,00	$ 153.626,00
					$ -
				SUBTOTAL $	$ 153.626,00

III. TRANSPORTES

CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	CANTIDAD * DISTANCIA (1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
	TRANSPORTE PERSONAL Y EQUIPOS	GL	0,79			$ 3.000.000,00	$ 2.383.333,00
							$ -
						SUBTOTAL $	$ 2.383.333,00

IV. MANO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES (%)	JR. TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
	PROFESIONAL BIOLOGO (2)	$ 400.000,00	165	$ 860.000,00	0,05	$ 8.580.000,00
	PROFESIONAL VETERINARIO (2)	$ 400.000,00	165	$ 860.000,00	0,05	$ 8.580.000,00
					SUBTOTAL $	$ 17.160.000,00
					TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 20.760.740,00

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	25%	$ 5.190.185,00
IMPREVISTOS	0%	$ -
UTILIDAD	5%	$ 1.038.037,00
	SUBTOTAL $	$ 6.228.222,00
	Precio Unitario Total Aproximado al Peso $	$ 26.988.962,00

Firma

Nombre: LUIS ALBERTO MEZA GALEANO

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matrícula No. : 1720208167 CLC

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA:

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma

Nombre: [illegible]

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matrícula No. 25202-193762 CND

GOBIERNO DE CALDAS	INFORME DE INTERVENTORIA/SUPERVISION CONTRATO	Código: FO-FT-02-005 Versión: 07 Fecha de modificación: 19/01/2016

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
INFORME DE SUPERVISION 03 PARCIAL

CONTRATO	29112025-1755	RADICADO JURID. NRO:		29112025-1755	
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS K0+100 - K2+540				
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO HORIZONTE AZUL				
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JORGE HERNAN NEIRA DIAZ				
NOMBRE DEL INTERVENTOR	ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A BIC				
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	DOCE (12) MESES A PARTIR DE LA ACTA DE INICIO			MODIFICATORIO 0	-
VALOR DEL CONTRATO INCLUIDO A.U (34%)	$ 15.179.416.313,5	PORCENTAJE AU %	30		
VALOR TOTAL	$ 15.179.416.313,5				

OBRA CIVIL CONTRATADA CONTRATO INICIAL				DIFER.	OBRA EJECUTADA		
DESCRIPCION	CANT.	VALOR	PESO %	%	CANT.	VALOR	PESO %
EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	24558,00	$ 681.447.663,00	4,49%	-4,49%	0,00	0,00	0,00%
EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	6139,00	$ 328.549.457,60	2,16%	-2,16%	0,00	0,00	0,00%
TERRAPLENES CONFORMADOS CON SUELO (MATERIAL SELECCIONADO PARA RELLENO)	3914,00	$ 178.087.000,00	1,17%	-1,17%	0,00	0,00	0,00%
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	191,00	$ 54.849.966,60	0,36%	-0,30%	30,00	8.615.178,00	0,06%
DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RIGIDOS Y FLEXIBLES	16066,00	$ 250.972.800,00	1,65%	-1,40%	2.371,50	36.995.400,00	0,25%
MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 - COMPRA DE MEZCLA	2079,00	$ 2.418.916.500,00	15,94%	-15,94%	0,00	0,00	0,00%
RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-57	20618,00	$ 120.615.300,00	0,79%	-0,79%	0,00	0,00	0,00%
BASE GRANULAR CLASE B	5524,00	$ 1.131.608.314,80	7,45%	-7,45%	0,00	0,00	0,00%
SUB-BASE GRANULAR CLASE B	5990,00	$ 1.049.002.344,00	6,91%	-6,76%	126,60	22.170.901,00	0,15%
AFIRMADO	3874,00	$ 338.936.260,00	2,23%	-2,23%	0,00	0,00	0,00%
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	3418,00	$ 397.019.200,00	2,56%	-0,78%	2.337,60	257.421.440,00	1,60%
EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO	855,00	$ 166.956.192,00	1,10%	-0,88%	170,40	33.274.076,00	0,22%
RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	308,00	$ 40.650.610,00	0,27%	-0,24%	35,90	4.736.172,00	0,03%
REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS	93,00	$ 20.024.062,50	0,13%	-0,04%	63,90	13.756.469,00	0,09%
CONCRETO DE RESISTENCIA 28MPa - COMPRA DE MEZCLA	66,00	$ 70.002.103,60	0,46%	-0,35%	16,60	17.068.749,00	0,11%
CONCRETO DE RESISTENCIA 21MPa - COMPRA DE MEZCLA	377,00	$ 418.143.027,90	2,75%	-2,73%	3,10	3.438.311,00	0,02%
CONCRETO DE RESISTENCIA14MPa - MEZCLA IN SITU	6,00	$ 3.840.447,00	0,03%	-0,02%	1,10	704.082,00	0,00%
ACERO DE REFUERZO fy = 4200MPa	29969,00	$ 251.601.742,60	1,66%	-1,52%	2.376,10	19.948.310,00	0,13%
AFIRMADO	7,00	$ 612.430,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%
TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC NORMA NTC-5055, DE DIÁMETRO INTERNO 900 mm	134,00	$ 171.582.256,40	1,13%	0,00%	131,20	167.996.956,00	1,15%
TUBERÍA DE PVC 4" PARA FILTROS	2463,00	$ 84.136.326,30	0,55%	-0,55%	16,00	546.562,00	0,00%
GEOTEXTIL TIPO NT 2500	12580,00	$ 94.133.624,00	0,62%	-0,62%	56,00	419.037,00	0,00%
MATERIAL GRANULAR DRENANTE	3587,00	$ 466.029.200,00	3,00%	-3,00%	11,00	1.577.940,00	0,01%
JUNTA DE CONSTRUCCIÓN CINTA PVC	23,00	$ 1.701.369,80	0,01%	0,00%	16,00	1.183.562,00	0,01%

GOBIERNO DE CALDAS	INFORME DE INTERVENTORIA/SUPERVISION CONTRATO	Código: FO-FT-02-005 Versión: 07 Fecha de modificación: 19/01/2016

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
INFORME DE SUPERVISION 03 PARCIAL

CONTRATO	29112025-1755	RADICADO JURID. NRO:		29112025-1756	
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS K0+100 - K2+340				
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO HORIZONTE AZUL				
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JORGE HERNAN NEIRA DIAZ				
NOMBRE DEL INTERVENTOR	ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A BIC				
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	DOCE (12) MESES A PARTIR DE LA ACTA DE INICIO			MODIFICATORIO 0	-
VALOR DEL CONTRATO INCLUIDO A.U (34%)	$ 15.179.416.313,5	PORCENTAJE AU %	30		
VALOR TOTAL	$ 15.179.416.313,5				

OBRA CIVIL CONTRATADA CONTRATO INICIAL				DIFER.	OBRA EJECUTADA		
DESCRIPCION	**CANT.**	**VALOR**	**PESO %**	**%**	**CANT.**	**VALOR**	**PESO %**
DISIPADORES DE ENERGIA Y SEDIMENTADORES DE CONCRETO CICLOPEO	139,00	$ 83.766.376,20	0,55%	-0,55%	0,00	0,00	0,00%
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	1786,00	$ 204.318.400,00	1,35%	-1,35%	0,00	0,00	0,00%
EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO	446,00	$ 87.090.598,40	0,57%	-0,57%	0,00	0,00	0,00%
RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	1435,00	$ 189.394.887,50	1,25%	-1,25%	0,00	0,00	0,00%
CONCRETO DE RESISTENCIA 28MPa - COMPRA DE MEZCLA	982,00	$ 1.010.912.731,40	6,66%	-6,66%	0,00	0,00	0,00%
CONCRETO DE RESISTENCIA14MPa - MEZCLA IN SITU	54,00	$ 34.564.023,00	0,23%	-0,23%	0,00	0,00	0,00%
ACERO DE REFUERZO fy = 420MPa	88530,00	$ 726.453.962,00	4,79%	-4,79%	0,00	0,00	0,00%
MATERIAL GRANULAR DRENANTE	267,00	$ 38.056.200,00	0,25%	-0,25%	0,00	0,00	0,00%
TUBERÍA DE PVC 3"	838,00	$ 27.367.906,80	0,18%	-0,18%	0,00	0,00	0,00%
TUBERÍA DE PVC 4" PARA FILTROS	474,00	$ 16.191.887,40	0,11%	-0,11%	0,00	0,00	0,00%
JUNTA DE CONSTRUCCIÓN CINTA PVC	357,00	$ 26.408.216,20	0,17%	-0,17%	0,00	0,00	0,00%
GEOTEXTIL TIPO NT 2500	2349,00	$ 17.577.097,20	0,12%	-0,12%	0,00	0,00	0,00%
EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	379,00	$ 43.357.600,00	0,29%	-0,29%	0,00	0,00	0,00%
EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO	95,00	$ 18.550.688,00	0,12%	-0,12%	0,00	0,00	0,00%
RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	36,00	$ 7.604.960,00	0,05%	-0,05%	0,00	0,00	0,00%
CONCRETO DE RESISTENCIA 21MPa - COMPRA DE MEZCLA	43,00	$ 47.692.706,10	0,31%	-0,31%	0,00	0,00	0,00%
MATERIAL GRANULAR DRENANTE	47,00	$ 6.232.200,00	0,04%	-0,04%	0,00	0,00	0,00%
TUBERÍA DE PVC 3"	75,00	$ 2.449.395,00	0,02%	-0,02%	0,00	0,00	0,00%
GEOTEXTIL TIPO NT 1600	411,00	$ 3.642.323,10	0,02%	-0,02%	0,00	0,00	0,00%
GAVIONES O COLCHOGAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO ESTILO 1: RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO)	468,00	$ 164.981.044,80	1,09%	-1,09%	0,00	0,00	0,00%
MALLA DE REFUERZO fy = 420 MPa	1217,00	$ 11.269.298,30	0,07%	-0,07%	0,00	0,00	0,00%
AFIRMADO	90,00	$ 7.874.100,00	0,05%	-0,05%	0,00	0,00	0,00%

GOBIERNO DE CALDAS	INFORME DE INTERVENTORIA/SUPERVISION CONTRATO	Código: FO-FT-02-005 Versión: 07 Fecha de modificación: 19/01/2016

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
INFORME DE SUPERVISION 03 PARCIAL

CONTRATO	29112025-1755	RADICADO JURID. NRO:		29112025-1755	
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS KO+100 - K21+540				
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO HORIZONTE AZUL				
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JORGE HERNAN NEIRA DIAZ				
NOMBRE DEL INTERVENTOR	ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A BIC				
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	DOCE (12) MESES A PARTIR DE LA ACTA DE INICIO			MODIFICATORIO 0	-
VALOR DEL CONTRATO INCLUIDO A.U (34%)	$ 15.179.416.313,5	PORCENTAJE AU %	30		
VALOR TOTAL	$ 15.179.416.313,5				

OBRA CIVIL CONTRATADA CONTRATO INICIAL				DIFER.	OBRA EJECUTADA		
DESCRIPCION	**CANT.**	**VALOR**	**PESO %**	**%**	**CANT.**	**VALOR**	**PESO %**
LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	9760,00	$ 35.298.016,00	0,23%	-0,23%	0,00	0,00	0,00%
MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	19,00	$ 1.001.263,90	0,01%	-0,01%	0,00	0,00	0,00%
TACHA REFLECTIVA CON ADHESIVO BITUMINOSO Y/O TERMOPLÁSTICO	1220,00	$ 15.756.910,00	0,10%	-0,10%	0,00	0,00	0,00%
SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR, SP Y/O SI, DIIMENSIONES 75x75CM CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV	35,00	$ 42.567.889,00	0,28%	-0,28%	0,00	0,00	0,00%
SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SP-75 DIMENSIONES 75x60CM CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV	11,00	$ 10.648.680,90	0,07%	-0,07%	0,00	0,00	0,00%
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO. BORDILLO DE 0.15Mx0.4M DE ÁREA	2440,00	$ 190.748.220,00	1,26%	-1,26%	0,00	0,00	0,00%
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO	659,00	$ 691.125.591,00	4,55%	-4,55%	0,00	0,00	0,00%
SUB-BASE GRANULAR CLASE B	573,00	$ 100.346.958,80	0,66%	-0,66%	0,00	0,00	0,00%
BARANDA PEATONAL SEGÚN DISEÑO	584,00	$ 467.954.936,80	3,08%	-3,08%	0,00	0,00	0,00%
LOSETA TÁCTIL GUÍA PREFABRICADA EN CONCRETO DE 0.40x0.40x0.06	967,00	$ 110.602.172,20	0,73%	-0,73%	0,00	0,00	0,00%
TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	1117371,00	$ 1.687.677.158,40	11,12%	-11,12%	0,00	0,00	0,00%
ITEM NO PREVISTOS							
AHUYENTAMIENTO, RESCATE Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE EN 2,44 KILÓMETROS DE LA VÍA TRES PUERTAS - LA ROCHELA	0,00	$ 0,00	0,00%	0,23%	1,00	33.972.120,00	0,23%
TALA DE ARBOL (ARBOL DE 1,0-5,00 M ALTURA (1 < h <= 5) , DAP > 0,10 M). INCLUYE CORTE PARTE AÉREA Y RADICULAR, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL VEGETAL	0,00	$ 0,00	0,00%	0,20%	53,00	30.354.584,00	0,20%
TALA DE ÁRBOL (ÁRBOL DE 5,0-10,0 M ALTURA (5 < h <= 10), DAP > 0,10 M). INCLUYE CORTE PARTE AÉREA Y RADICULAR, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL VEGETAL	0,00	$ 0,00	0,00%	0,96%	162,00	142.191.936,00	0,96%
TALA DE ARBOL (ARBOL DE 10,0-15,0 M ALTURA (10 < h <= 15), DAP > 0,10 M). INCLUYE CORTE PARTE AÉREA Y RADICULAR, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL VEGETAL	0,00	$ 0,00	0,00%	1,57%	180,00	233.968.860,00	1,57%
TALA DE ÁRBOL (ÁRBOL DE 15,0-20,0 M ALTURA (15 < h <= 20), DAP > 0,10 M). INCLUYE CORTE PARTE AÉREA Y RADICULAR, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL VEGETAL	0,00	$ 0,00	0,00%	2,41%	197,00	358.483.264,00	2,41%

GOBIERNO DE CALDAS	INFORME DE INTERVENTORIA/SUPERVISION CONTRATO	Código: FO-FT-02-005 Versión: 07 Fecha de modificación: 19/01/2016

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
INFORME DE SUPERVISION 03 PARCIAL

CONTRATO	29112025-1755	RADICADO JURID. NRO.		29112025-1755	
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS K0+160 - K21+540				
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO HORIZONTE AZUL				
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JORGE HERNAN NEIRA DIAZ				
NOMBRE DEL INTERVENTOR	ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A BIC				
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	DOCE (12) MESES A PARTIR DE LA ACTA DE INICIO			MODIFICATORIO 0	-
VALOR DEL CONTRATO INCLUIDO A.U (34%)	$ 15.179.416.313,5	PORCENTAJE AU %	30		
VALOR TOTAL	$ 15.179.416.313,5				

OBRA CIVIL CONTRATADA CONTRATO INICIAL				DIFER.	OBRA EJECUTADA		
DESCRIPCION	**CANT.**	**VALOR**	**PESO %**	**%**	**CANT.**	**VALOR**	**PESO %**
TALA DE ÁRBOL (ÁRBOL DE > 20,0 M ALTURA, DAP > 0,10 M). INCLUYE CORTE PARTE AÉREA Y RADICULAR, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL VEGETAL	0,00	$ 0,00	0,00%	0,28%	12,00	41.982.420,00	0,28%
REMOCION DE CERCAS DE ALAMBRE	0,00	$ 0,00	0,00%	0,06%	1.288,80	9.220.075,00	0,06%
DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA	0,00	$ 0,00	0,00%	0,07%	2.278,20	11.031.045,00	0,07%
CERCA DE ALAMBRE DE PUAS CON POSTES DE MADERA (GUADUA, 5 HILOS)	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%
MATERIAL MIXTO - (MATERIAL DE CANTERA + MATERIAL DE RIO SELECCIONADO)	0,00	$ 0,00	0,00%	1,65%	1.441,60	244.479.502,00	1,65%
GEOMALLA PARA REFUERZO DE CAPAS GRANULARES (Analizado para GEOMALLA BIAXIAL EN POLIÉSTER DE ALTA TENACIDAD - FORGRID BX 30)	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%
CORTE PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	0,00	$ 0,00	0,00%	0,23%	1.863,00	34.359.309,00	0,23%
BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE B	0,00	$ 0,00	0,00%	1,40%	876,50	208.273.054,00	1,40%
MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA BACHEO TIPO MDC-19	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%
RESCATE Y TRASLADO DE LA FLORA EPÍFITA VASCULAR EN VEDA NACIONAL	0,00	$ 0,00	0,00%	0,40%	732,00	59.869.548,00	0,40%
AHUYENTAMIENTO, RESCATE Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE PRESENTE EN LOS ÁRBOLES AISLADOS DEL PROYECTO VÍA TRES PUERTAS - LA ROCHELA BAJO EL PROTOCOLO DE MANEJO Y CONTINGENCIA DE FAUNA SILVESTRE SOLICITADO EN LA RESOLUCIÓN DE CORPOCALDAS No 2026-0544	0,00	$ 0,00	0,00%	0,18%	1,00	26.988.962,00	0,18%
VALOR COSTO DIRECTO		**$ 14.861.949.633,50**				**$ 2.035.051.823,00**	**13,41%**
VALOR PGIO (Incluye PMT - PAGA) (INMODIFICABLE)		**$ 317.466.680,00**				**$ 43.285.876,00**	**0,29%**
VALOR TOTAL		**$ 15.179.416.313,50**				**$ 2.078.337.699,00**	**13,69%**

INFORMACIÓN DE CONTRATO	
CONTRATISTA	CONSORCIO HORIZONTE AZUL
VALOR DEL CONTRATO	$ 15.179.416.313,50
VALOR ADICIONAL	$ 0
VALOR TOTAL	$ 15.179.416.313,50
PLAZO INICIAL	DOCE (12) MESES A PARTIR DE LA ACTA DE INICIO
FECHA INICIACION	23/01/2026
FECHA TERMINACION	22/01/2027

INTERVENTORIA/SUPERVISION
LA INTERVENTORIA EXTERNA ES EJECUTADA POR ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A BIC. LA SUPERVISION ESTA A CARGO DEL ING. JORGE HERNAN NEIRA DIAZ, PROFESIONAL UNIVERSITARIO, ADSCRITO A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

GOBIERNO DE CALDAS	INFORME DE INTERVENTORIA/SUPERVISION CONTRATO	Código: FO-FT-02-005 Versión: 07 Fecha de modificación: 19/01/2016

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
INFORME DE SUPERVISION 03 PARCIAL

CONTRATO	29112025-1755	RADICADO JURID. NRO:		29112025-1755	
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS KO+100 - K21+540				
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO HORIZONTE AZUL				
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JORGE HERNAN NEIRA DIAZ				
NOMBRE DEL INTERVENTOR	ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A BIC				
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	DOCE (12) MESES A PARTIR DE LA ACTA DE INICIO			MODIFICATORIO 0	-
VALOR DEL CONTRATO INCLUIDO A.U (34%)	$ 15.179.416.313,5	PORCENTAJE AU %	30		
VALOR TOTAL	$ 15.179.416.313,5				

OBRA CIVIL CONTRATADA CONTRATO INICIAL				DIFER.	OBRA EJECUTADA		
DESCRIPCION	**CANT.**	**VALOR**	**PESO %**	**%**	**CANT.**	**VALOR**	**PESO %**

ACTIVIDADES REALIZADAS

DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES TALES COMO; DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDOS Y FLEXIBLE; EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR PARA CAJEOS; EXCAVACIONES EN MATERIALCOMUN Y ROCA PARA CONSTRUCCION DE OBRAS TRANSVERSALES, ACTIVIDADES AMBIENTALES COMO AHUYENTAMIENTOS, RESCATE Y TRASLADO DE EPIFITAS, TALA DE ARBOLES, ADEMAS DE LA INSTALACION DE TUBERIA DE 36", LLENOS CON SUBBASE Y MATERIAL MIXTO. , CON UNA INVERSION TOTAL DE $ 2,078,337,699 EQUIVALNETES AL 13,69% DE EJECUCION DEL CONTRATO INCLUIDA UN AU DEL 30% (ADMINISTRACION: 25% - U: 5%)

ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A BIC
Interventor Externo

GOBIERNO DE CALDAS	INFORME DE INTERVENTORIA/SUPERVISION 03 PARCIAL AL CONTRATO DE OBRA 29112025-1755	Código: FO-FT-02-005 Versión: 07 Fecha de Modificación: 19/01/2018

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

FECHA
lunes, 1 de junio de 2026

ACTA NRO. 02 PARCIAL — **INFORME AMBIENTAL DE INTERVENTORIA/SUPERVISION**

CONTRATO	29112025-1756	CONSULTORIA		OBRA:	X
Nro. CONTRATO RADICADO:	29112025-1755				

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS K0+100 - K2+540
CONTRATISTA:	CONSORCIO HORIZONTE AZUL
SUPERVISOR	JORGE HERNAN NEIRA DIAZ
INTERVENTOR EXTERNO	ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A BIC

PREGUNTAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El personal que labora en la obra utiliza uniformes y equipos de protección personal	X			
Los vehículos que transportan los sobrantes y escombros de construcción cuentan con el distintivo en las puertas laterales donde se indica el nombre de contratista, la entidad contratante y la obra para la cual labora	X			
La vía en el sector donde se realizan las obras se encuentran libres de escombros	X			
Se acumulan escombros, sobrantes de excavación y materiales en zonas verdes o sobre las cunetas.	X			
Los escombros de construcción permanecen en la obra por más de 24 horas	X			
Se cubren los materiales almacenados temporalmente con un material impermeable	X			
Existe un cerramiento con malla fina sintética o doble cinta reflectiva para los materiales almacenados temporalmente en la obra	X			
Se lleva a cabo una recolección periódica de basuras y desperdicios	X			
Existe un cerramiento del frente de la obra con malla fina sintética o cinta reflectiva	X			
La obra cuenta con valla publicitaria	X			
Se instalaron vallas informativas al transito vehicular 100 metros antes de la llegada a la obra	X			
La disolución de la liga asfáltica se realiza con calentadores portátiles que utilicen gas como combustible o por el contrario debidamente adecuados con resistencias eléctricas			X	
En la obra se realizan quemas a cielo abierto		X		
Se mezclan concretos en plataformas metálicas o geotextil			X	
Las baterías de las máquinas son reemplazadas en un taller autorizado	X			
El cambio de aceites se realiza en la obra		X		
Se utilizan compresores neumáticos para la limpieza de la superficie de la obra		X		
El establecimiento de la maquinaria o el almacenamiento de combustibles se realizo en zonas públicas		X		
Las labores de reparación y mantenimiento de maquinaria se realiza en centros autorizados	X			
Se usan baños portátiles			X	
Se entrega volantes informativos para la comunidad			X	
Se tiene el manual de mínimas implicaciones ambientales en la obra			X	
Se afectan corredores de fauna nativa		X		
Se afecta el hábitat de fauna y flora propia de la región		X		
Se hace control de emisión de gases a equipos mecánicos utilizados en obra			X	
Se hace control a la posible quema de desechos de materiales provenientes de la obra	X			
Se hace control en vaciados de concreto (esparcimiento de partículas de cemento)			X	
Se hace control de desechos tóxicos que puedan generar contaminación del aire			X	
Se hace control de desechos orgánicos que puedan producir CO2 por descomposición			X	
se requiere concesión de aguas para aprovechamiento en la obra		X		
Se alteran los valores escénicos de la unidad paisajística de la región		X		

OBSERVACIONES:

ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A BIC
Interventor Externo
