Factura Electrónica de Venta 4024

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764101751115 de 19/11/2025 - 19/11/2027 autoriza 4,001 a 8,000

Actividad Económica Principal 3312
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	22/12/2025 16:38
Fecha de Vencimiento	22/12/2025 16:38
Fecha de Validación	22/12/2025 16:38
Forma de Pago	Crédito
Medio de Pago	Transferencia Débito Bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	SRT SOLUCIONES INTEGRALES SAS
Nombre Comercial	SRT SOLUCIONES INTEGRALES SAS
NIT	901189763
Obligación	IVA
Email	administrativo@srt-sas.com
Teléfono	3133399335
Dirección Fiscal	CR 111 A 145 87 TO 8 AP 402, BOGOTA, D.C., (BOGOTA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	CLUB MILITAR
Nombre Comercial	
NIT	860016951
Obligación	IVA
Email	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Teléfono	2611593
Dirección	AK 50 15-80
Ciudad, Depart.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	CM-255-2025 1. ESTUFAS INDUSTRIALES REF. 36651	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYE LIMPIEZA PROFUNDA DE QUEMADORES Y VÁLVULAS, VERIFICACIÓN DE FUGAS DE GAS, AJUSTE DE FLAMA, REVISIÓN DE ENCENDEDORES, LIMPIEZA DE INYECTORES, Y CHEQUEO GENERAL DE LA ESTRUCTURA Y CONEXIONES	1.0	EA	$1,415,966.39	IVA 19%	$1,415,966.39	$1,685,000.00
2	ESTUFA REF.3656	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYE LIMPIEZA PROFUNDA DE QUEMADORES Y VÁLVULAS, VERIFICACIÓN DE FUGAS DE GAS, AJUSTE DE FLAMA, REVISIÓN DE ENCENDEDORES, LIMPIEZA DE INYECTORES, Y CHEQUEO GENERAL DE LA ESTRUCTURA Y CONEXIONES	1.0	EA	$1,176,470.59	IVA 19%	$1,176,470.59	$1,400,000.00
3	ESTUFA REF. 36650	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYE LIMPIEZA PROFUNDA DE QUEMADORES Y VÁLVULAS, VERIFICACIÓN DE FUGAS DE GAS, AJUSTE DE FLAMA, REVISIÓN DE ENCENDEDORES, LIMPIEZA DE INYECTORES, Y CHEQUEO GENERAL DE LA ESTRUCTURA Y CONEXIONES	1.0	EA	$1,025,210.08	IVA 19%	$1,025,210.08	$1,219,999.99

CUFE: fcb032939b1b2157958aa5750963f5a2143fe6a90c8b69089a70b86192639740d72490d953fe3b5c1c69d384d5a1b5bc

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

Factura Electrónica de Venta 4024

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764101751115 de 19/11/2025 - 19/11/2027 autoriza 4,001 a 8,000

Actividad Económica Principal 3312
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	22/12/2025 16:38
Fecha de Vencimiento	22/12/2025 16:38
Fecha de Validación	22/12/2025 16:38
Forma de Pago	Crédito
Medio de Pago	Transferencia Débito Bancaria
Moneda	COP

4	ESTUFA REF. 3628	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYE LIMPIEZA PROFUNDA DE QUEMADORES Y VÁLVULAS, VERIFICACIÓN DE FUGAS DE GAS, AJUSTE DE FLAMA, REVISIÓN DE ENCENDEDORES, LIMPIEZA DE INYECTORES, Y CHEQUEO GENERAL DE LA ESTRUCTURA Y CONEXIONES	1.0	EA	$1,193,277.31	IVA 19%	$1,193,277.31	$1,420,000.00
5	ESTUFA REF. 36653	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYE LIMPIEZA PROFUNDA DE QUEMADORES Y VÁLVULAS, VERIFICACIÓN DE FUGAS DE GAS, AJUSTE DE FLAMA, REVISIÓN DE ENCENDEDORES, LIMPIEZA DE INYECTORES, Y CHEQUEO GENERAL DE LA ESTRUCTURA Y CONEXIONES	1.0	EA	$1,420,168.07	IVA 19%	$1,420,168.07	$1,690,000.00
6	ESTUFA REF. 156630	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYE LIMPIEZA PROFUNDA DE QUEMADORES Y VÁLVULAS, VERIFICACIÓN DE FUGAS DE GAS, AJUSTE DE FLAMA, REVISIÓN DE ENCENDEDORES, LIMPIEZA DE INYECTORES, Y CHEQUEO GENERAL DE LA ESTRUCTURA Y CONEXIONES	1.0	EA	$857,142.86	IVA 19%	$857,142.86	$1,020,000.00
7	4. PARRILLAS ASADORAS REF. 3644	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYE LIMPIEZA LIMPIEZA PROFUNDA DE LA PARRILLA, QUEMADORES Y DEFLECTORES DE CALOR, ELIMINANDO RESIDUOS DE GRASA Y ALIMENTOS. TAMBIÉN, LA REALIZACIÓN DE VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE VÁLVULAS DE GAS O RESISTENCIAS ELÉCTRICAS, TERMOSTATOS Y CONTROLES DE TEMPERATURA. ADICIONALMENTE, UNA INSPECCIÓN DE LAS CONEXIONES DE GAS, SISTEMAS DE IGNICIÓN (SI APLICA) Y LA BANDEJA RECOGE-GRASAS, GARANTIZANDO UNA DISTRIBUCIÓN UNIFORME DEL CALOR Y UN FUNCIONAMIENTO SEGURO Y EFICIENTE.	1.0	EA	$1,254,621.85	IVA 19%	$1,254,621.85	$1,493,000.00

Factura Electrónica de Venta 4024

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764101751115 de 19/11/2025 - 19/11/2027 autoriza 4,001 a 8,000

Actividad Económica Principal 3312
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	22/12/2025 16:38
Fecha de Vencimiento	22/12/2025 16:38
Fecha de Validación	22/12/2025 16:38
Forma de Pago	Crédito
Medio de Pago	Transferencia Débito Bancaria
Moneda	COP

8	3. PLANCHAS INDUSTRIALES (GAS/ELECTRICA) REF. 1835	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYE LIMPIEZA PROFUNDA DE LA SUPERFICIE DE COCCIÓN Y COMPONENTES DE CALENTAMIENTO (RESISTENCIAS O QUEMADORES), ADEMÁS DE LA VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE TERMOSTATOS Y CONTROLES DE TEMPERATURA. SE REALIZA UNA INSPECCIÓN DETALLADA DE LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS O DE GAS, SISTEMAS DE IGNICIÓN (SI APLICA) Y LA BANDEJA DE GOTEO, GARANTIZANDO UNA OPERACIÓN EFICIENTE Y PREVINIENDO FALLAS FUTURAS.	1.0	EA	$694,957.98	IVA 19%	$694,957.98	$827,000.00
9	3. PLANCHAS INDUSTRIALES (GAS/ELECTRICA) COCINA PRINCIPAL S/N	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYE LIMPIEZA PROFUNDA DE LA SUPERFICIE DE COCCIÓN Y COMPONENTES DE CALENTAMIENTO (RESISTENCIAS O QUEMADORES), ADEMÁS DE LA VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE TERMOSTATOS Y CONTROLES DE TEMPERATURA. SE REALIZA UNA INSPECCIÓN DETALLADA DE LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS O DE GAS, SISTEMAS DE IGNICIÓN (SI APLICA) Y LA BANDEJA DE GOTEO, GARANTIZANDO UNA OPERACIÓN EFICIENTE Y PREVINIENDO FALLAS FUTURAS.	1.0	EA	$936,134.45	IVA 19%	$936,134.45	$1,114,000.00
10	3. PLANCHAS INDUSTRIALES (GAS/ELECTRICA) REF. 3652	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYE LIMPIEZA PROFUNDA DE LA SUPERFICIE DE COCCIÓN Y COMPONENTES DE CALENTAMIENTO (RESISTENCIAS O QUEMADORES), ADEMÁS DE LA VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE TERMOSTATOS Y CONTROLES DE TEMPERATURA. SE REALIZA UNA INSPECCIÓN DETALLADA DE LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS O DE GAS, SISTEMAS DE IGNICIÓN (SI APLICA) Y LA BANDEJA DE GOTEO, GARANTIZANDO UNA OPERACIÓN EFICIENTE Y PREVINIENDO FALLAS FUTURAS.	1.0	EA	$591,596.64	IVA 19%	$591,596.64	$704,000.00

Factura Electrónica de Venta 4024

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764101751115 de 19/11/2025 - 19/11/2027 autoriza 4,001 a 8,000

Actividad Económica Principal 3312
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	22/12/2025 16:38
Fecha de Vencimiento	22/12/2025 16:38
Fecha de Validación	22/12/2025 16:38
Forma de Pago	Crédito
Medio de Pago	Transferencia Débito Bancaria
Moneda	COP

11	3. PLANCHAS INDUSTRIALES (GAS/ELECTRICA) COCINA EMPLEADOS S/N	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYE LIMPIEZA PROFUNDA DE LA SUPERFICIE DE COCCIÓN Y COMPONENTES DE CALENTAMIENTO (RESISTENCIAS O QUEMADORES), ADEMÁS DE LA VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE TERMOSTATOS Y CONTROLES DE TEMPERATURA. SE REALIZA UNA INSPECCIÓN DETALLADA DE LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS O DE GAS, SISTEMAS DE IGNICIÓN (SI APLICA) Y LA BANDEJA DE GOTEO, GARANTIZANDO UNA OPERACIÓN EFICIENTE Y PREVINIENDO FALLAS FUTURAS.	1.0	EA	$742,016.81	IVA 19%	$742,016.81	$883,000.00
12	8. HORNOS COMBI WESTON REF. 3956	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYE LIMPIEZA PROFUNDA DE RESISTENCIAS, VENTILADORES (SI APLICA) Y EL INTERIOR DEL HORNO, ELIMINANDO RESIDUOS QUE AFECTAN EL RENDIMIENTO. LA REALIZACIÓN DE VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE TERMOSTATOS, CONTROLES DE TEMPERATURA Y EL TEMPORIZADOR ES CLAVE PARA UNA COCCIÓN PRECISA. ADEMÁS, SE INSPECCIONAN LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS Y LOS SELLOS DE LA PUERTA.	1.0	EA	$1,277,310.92	IVA 19%	$1,277,310.92	$1,519,999.99
13	8. HORNOS COMBI WESTON 3631	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYE LIMPIEZA PROFUNDA DE RESISTENCIAS, VENTILADORES (SI APLICA) Y EL INTERIOR DEL HORNO, ELIMINANDO RESIDUOS QUE AFECTAN EL RENDIMIENTO. LA REALIZACIÓN DE VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE TERMOSTATOS, CONTROLES DE TEMPERATURA Y EL TEMPORIZADOR ES CLAVE PARA UNA COCCIÓN PRECISA. ADEMÁS, SE INSPECCIONAN LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS Y LOS SELLOS DE LA PUERTA.	1.0	EA	$1,655,462.19	IVA 19%	$1,655,462.19	$1,970,000.01

Factura Electrónica de Venta 4024

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764101751115 de 19/11/2025 - 19/11/2027 autoriza 4,001 a 8,000

Actividad Económica Principal 3312
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	22/12/2025 16:38
Fecha de Vencimiento	22/12/2025 16:38
Fecha de Validación	22/12/2025 16:38
Forma de Pago	Crédito
Medio de Pago	Transferencia Débito Bancaria
Moneda	COP

14	2. FREIDORAS INDUSTRIALES REF. 1844	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYE LIMPIEZA PROFUNDA DE LA TINA Y LOS COMPONENTES DE CALENTAMIENTO (QUEMADORES O RESISTENCIAS), ASÍ COMO LA VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE TERMOSTATOS Y CONTROLES. REALIZAMOS UNA INSPECCIÓN DETALLADA DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD Y DE DRENAJE PARA PREVENIR FALLAS Y GARANTIZAR LA EFICIENCIA.	1.0	EA	$1,106,722.69	IVA 19%	$1,106,722.69	$1,317,000.00
15	2. FREIDORAS INDUSTRIALES REF. 36566	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYE LIMPIEZA PROFUNDA DE LA TINA Y LOS COMPONENTES DE CALENTAMIENTO (QUEMADORES O RESISTENCIAS), ASÍ COMO LA VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE TERMOSTATOS Y CONTROLES. REALIZAMOS UNA INSPECCIÓN DETALLADA DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD Y DE DRENAJE PARA PREVENIR FALLAS Y GARANTIZAR LA EFICIENCIA.	1.0	EA	$991,596.64	IVA 19%	$991,596.64	$1,180,000.00
16	2. FREIDORAS INDUSTRIALES REF. 140831	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYE LIMPIEZA PROFUNDA DE LA TINA Y LOS COMPONENTES DE CALENTAMIENTO (QUEMADORES O RESISTENCIAS), ASÍ COMO LA VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE TERMOSTATOS Y CONTROLES. REALIZAMOS UNA INSPECCIÓN DETALLADA DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD Y DE DRENAJE PARA PREVENIR FALLAS Y GARANTIZAR LA EFICIENCIA.	1.0	EA	$1,003,361.35	IVA 19%	$1,003,361.35	$1,194,000.01

Factura Electrónica de Venta 4024

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764101751115 de 19/11/2025 - 19/11/2027 autoriza 4,001 a 8,000

Actividad Económica Principal 3312
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	22/12/2025 16:38
Fecha de Vencimiento	22/12/2025 16:38
Fecha de Validación	22/12/2025 16:38
Forma de Pago	Crédito
Medio de Pago	Transferencia Débito Bancaria
Moneda	COP

17	2. FREIDORAS INDUSTRIALES REF. 1637	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYE LIMPIEZA PROFUNDA DE LA TINA Y LOS COMPONENTES DE CALENTAMIENTO (QUEMADORES O RESISTENCIAS), ASÍ COMO LA VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE TERMOSTATOS Y CONTROLES. REALIZAMOS UNA INSPECCIÓN DETALLADA DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD Y DE DRENAJE PARA PREVENIR FALLAS Y GARANTIZAR LA EFICIENCIA.	1.0	EA	$1,455,462.18	IVA 19%	$1,455,462.18	$1,731,999.99
18	RESISTENCIAS ITEM 77	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS CALEFACTORES (RESISTENCIAS)	5.0	EA	$243,704.54	IVA 19%	$1,218,522.70	$1,450,042.01
19	2. FREIDORAS INDUSTRIALES REF. 1848	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYE LIMPIEZA PROFUNDA DE LA TINA Y LOS COMPONENTES DE CALENTAMIENTO (QUEMADORES O RESISTENCIAS), ASÍ COMO LA VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE TERMOSTATOS Y CONTROLES. REALIZAMOS UNA INSPECCIÓN DETALLADA DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD Y DE DRENAJE PARA PREVENIR FALLAS Y GARANTIZAR LA EFICIENCIA.	1.0	EA	$732,773.11	IVA 19%	$732,773.11	$872,000.00

19

Subtotal	$20,748,774.81
IVA 19%	$3,942,267.19
RETE FUENTE	-$829,950.99
RETE ICA	-$200,433.16
RETE IVA	-$591,340.08
Total a Pagar	$23,069,317.77

#$15-10-00-000;CM-255-2025;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#$

Unidades de medida: EA = cada

Factura Electrónica de Venta 4024

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764101751115 de 19/11/2025 - 19/11/2027 autoriza 4,001 a 8,000

Actividad Económica Principal 3312
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	22/12/2025 16:38
Fecha de Vencimiento	22/12/2025 16:38
Fecha de Validación	22/12/2025 16:38
Forma de Pago	Crédito
Medio de Pago	Transferencia Débito Bancaria
Moneda	COP

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: fcb032939b1b2157958aa5750963f5a2143fe6a90c8b69089a70b86192639740d72490d953fe3b5c1c69d384d5a1b5bc

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

11 DE DICIEMBRE DE 2025

INFORME TÉCNICO DE MANTENIMIENTO			
CLUB MILITAR			
NIT:	860016951	**CUIDAD:**	BOGOTA D.C.
CONTRATO:	CM-255-2025		
SUPERVISOR DEL CONTRATO: (RA) ROBINZON ORJUELA ZAPATA			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE COCINA DEL CLUB MILITAR.			

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE:
SUMINISTRO E INSTALACION

EQUIPO: ESTUFA REF. 36651

- ✓ **UBICACIÓN: PAPIPA**

ANÁLISIS TÉCNICO
ESTUFA REF. 36651

Durante la inspección técnica realizada a la estufa industrial se determinó la necesidad de ejecutar actividades de limpieza general, mantenimiento preventivo, calibración de los sistemas de control, aplicación de pintura en la bandeja, regulación del flujo a través de los filtros y la realización de pruebas de fugas, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento, prolongar la vida útil del equipo y asegurar el cumplimiento de los estándares de seguridad y operatividad establecidos.

→ Aplicamos los productos desengrasantes industriales certificados.
→ Retiramos los residuos con paños, cepillos y herramientas adecuadas.
→ Secamos completamente.
→ Equipo en funcionamiento.

11 DE DICIEMBRE DE 2025

1. ESTUFAS INDUSTRIALES REF. 36651		
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**PRECIO OFERTADO CON IVA INCLUIDO**
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYE LIMPIEZA PROFUNDA DE QUEMADORES Y VÁLVULAS, VERIFICACIÓN DE FUGAS DE GAS, AJUSTE DE FLAMA, REVISIÓN DE ENCENDEDORES, LIMPIEZA DE INYECTORES, Y CHEQUEO GENERAL DE LA ESTRUCTURA Y CONEXIONES	$ 300.000,00
2	SERVICIO DE DIAGNÓSTICO DE FALLAS	$ 100.000,00
3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE QUEMADORES	$ 110.000,00
4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INYECTORES DE GAS	$ 60.000,00
5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE GAS	$ 70.000,00
6	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGULADORES DE PRESIÓN DE GAS	$ 350.000,00
8	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PILOTOS	$ 90.000,00
9	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERAS Y TUBERÍAS DE GAS	$ 220.000,00
12	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATOS	$ 120.000,00
13	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERILLAS Y CONTROLES	$ 30.000,00
14	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSORES DE TEMPERATURA	$ 130.000,00
20	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO INTERNO	$ 30.000,00
21	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTORES	$ 75.000,00
		$ 1.685.000,00

11 DE DICIEMBRE DE 2025

REGISTRO FOTOGRAFICO



















11 DE DICIEMBRE DE 2025







EQUIPO: ESTUFA REF. 3656

- ✓ **UBICACIÓN: PAIPA**
- ✓

ANÁLISIS TÉCNICO
ESTUFA REF. 3656

Durante la inspección técnica realizada a la estufa industrial mixta de seis puestos con parrilla y plancha, se identificó la necesidad de llevar a cabo labores de limpieza general, regulación de la calidad del aire, sustitución de perillas, ejecución de mantenimiento preventivo, calibración de los sistemas de control, aplicación de pintura en la bandeja, ajuste del paso de filtros y realización de pruebas de fugas, con el propósito de garantizar la operatividad segura, la eficiencia en el desempeño y la prolongación de la vida útil del equipo conforme a los estándares técnicos establecidos.

→ Aplicamos los productos desengrasantes industriales certificados.
→ Retiramos los residuos con paños, cepillos y herramientas adecuadas.
→ Usamos hidrolavadora
→ Secamos completamente.
→ Equipo en funcionamiento.


11 DE DICIEMBRE DE 2025

ESTUFA REF.3656		
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**PRECIO OFERTADO CON IVA INCLUIDO**
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYE LIMPIEZA PROFUNDA DE QUEMADORES Y VÁLVULAS, VERIFICACIÓN DE FUGAS DE GAS, AJUSTE DE FLAMA, REVISIÓN DE ENCENDEDORES, LIMPIEZA DE INYECTORES, Y CHEQUEO GENERAL DE LA ESTRUCTURA Y CONEXIONES	$ 300.000,00
3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE QUEMADORES	$ 110.000,00
4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INYECTORES DE GAS	$ 60.000,00
5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE GAS	$ 70.000,00
6	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGULADORES DE PRESIÓN DE GAS	$ 350.000,00
7	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOPARES/TERMOCUPLAS	$ 80.000,00
9	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERAS Y TUBERÍAS DE GAS	$ 220.000,00
10	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCENDEDORES/BUJÍAS DE CHISPA	$ 50.000,00
13	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERILLAS Y CONTROLES	$ 30.000,00
19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS INTERNAS	$ 100.000,00
20	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO INTERNO	$ 30.000,00
		$ 1.400.000,00

REGISTRO FOTOGRAFICO





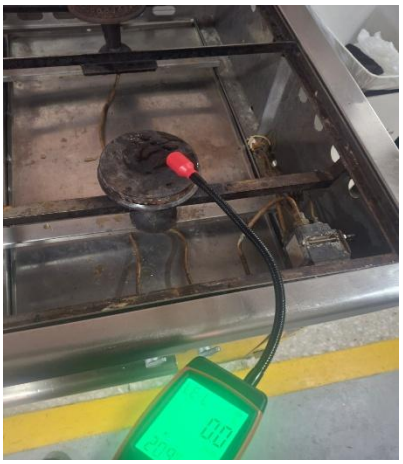

11 DE DICIEMBRE DE 2025








EQUIPO: ESTUFA REF. 36650

- ✓ **UBICACIÓN: PAIPA**

ANÁLISIS TÉCNICO
ESTUFA REF. 36650

Durante la inspección técnica realizada a la estufa industrial mixta con parrilla y plancha, se evidenció la necesidad de ejecutar labores de limpieza general, regulación de la calidad del aire, reemplazo de fistos, aplicación de mantenimiento preventivo, calibración de los sistemas de control, ajuste del paso de filtros, mantenimiento en las flautas con fijación del panel horizontal y la realización de pruebas de fugas, con el objetivo de garantizar la seguridad operativa, optimizar el desempeño del equipo y asegurar el cumplimiento de los estándares técnicos establecidos.

→ Aplicamos los productos desengrasantes industriales certificados.
→ Retiramos los residuos con paños, cepillos y herramientas adecuadas.
→ Secamos completamente.
→ Equipo en funcionamiento.

11 DE DICIEMBRE DE 2025

ESTUFA REF. 36650		
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**PRECIO OFERTADO CON IVA INCLUIDO**
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYE LIMPIEZA PROFUNDA DE QUEMADORES Y VÁLVULAS, VERIFICACIÓN DE FUGAS DE GAS, AJUSTE DE FLAMA, REVISIÓN DE ENCENDEDORES, LIMPIEZA DE INYECTORES, Y CHEQUEO GENERAL DE LA ESTRUCTURA Y CONEXIONES	$ 300.000,00
2	SERVICIO DE DIAGNÓSTICO DE FALLAS	$ 100.000,00
3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE QUEMADORES	$ 110.000,00
4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INYECTORES DE GAS	$ 60.000,00
6	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGULADORES DE PRESIÓN DE GAS	$ 350.000,00
9	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERAS Y TUBERÍAS DE GAS	$ 220.000,00
10	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCENDEDORES/BUJÍAS DE CHISPA	$ 50.000,00
13	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERILLAS Y CONTROLES	$ 30.000,00
		$ 1.220.000,00

REGISTRO FOTOGRAFICO



11 DE DICIEMBRE DE 2025





EQUIPO:ESTUFA REF. 36653

- ✓ **UBICACIÓN: PAIPA**



ANÁLISIS TÉCNICO
ESTUFA REF. 36653

Durante la inspección técnica realizada a la estufa se evidenció la necesidad de efectuar una limpieza general profunda debido a la acumulación de residuos, el reemplazo de la tornillería en los cuatro quemadores principales por encontrarse deteriorada, la instalación de nuevas perillas de control para garantizar un adecuado manejo del flujo de gas y la ejecución de ajustes generales en los mecanismos de encendido y regulación, con el fin de asegurar el correcto funcionamiento, la eficiencia y la seguridad del equipo

→ Aplicamos los productos desengrasantes industriales certificados.
→ Retiramos los residuos con paños, cepillos y herramientas adecuadas.
→ Usamos hidrolavadora
→ Secamos completamente.
→ Equipo en funcionamiento.

11 DE DICIEMBRE DE 2025



ESTUFA REF. 36653		
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**PRECIO OFERTADO CON IVA INCLUIDO**
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYE LIMPIEZA PROFUNDA DE QUEMADORES Y VÁLVULAS, VERIFICACIÓN DE FUGAS DE GAS, AJUSTE DE FLAMA, REVISIÓN DE ENCENDEDORES, LIMPIEZA DE INYECTORES, Y CHEQUEO GENERAL DE LA ESTRUCTURA Y CONEXIONES	$ 300.000,00
2	SERVICIO DE DIAGNÓSTICO DE FALLAS	$ 100.000,00
3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE QUEMADORES	$ 110.000,00
6	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGULADORES DE PRESIÓN DE GAS	$ 350.000,00
9	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERAS Y TUBERÍAS DE GAS	$ 220.000,00
12	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATOS	$ 120.000,00
17	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BISAGRAS DE PUERTAS	$ 120.000,00
18	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUES/JUNTAS DE PUERTAS	$ 240.000,00
19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS INTERNAS	$ 100.000,00
20	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO INTERNO	$ 30.000,00
		$ 1.690.000,00

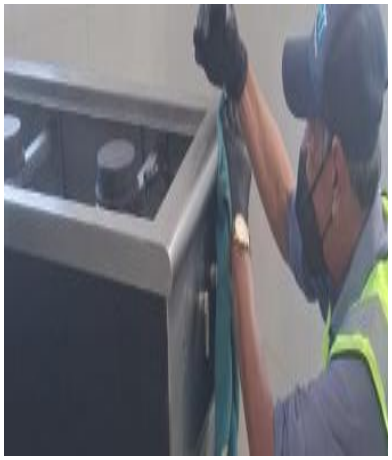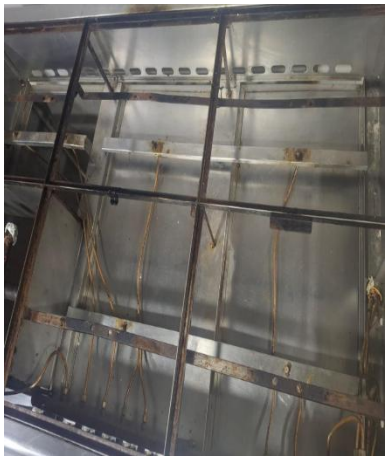11 DE DICIEMBRE DE 2025





EQUIPO:ESTUFA REF. 3628

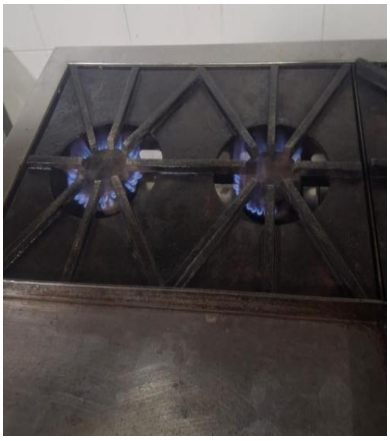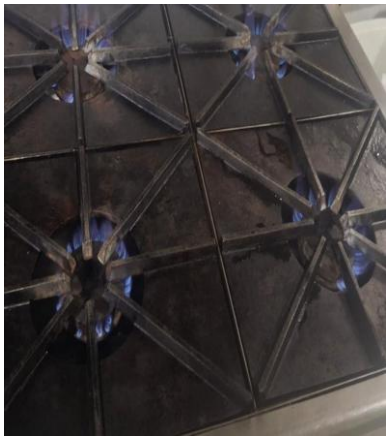- ✓ **UBICACIÓN: PAIPA**

ANÁLISIS TÉCNICO
ESTUFA REF. 3628

Durante la inspección técnica realizada a la estufa se evidenció la necesidad de ejecutar una limpieza general profunda para garantizar condiciones óptimas de operación, efectuar la calibración de los inyectores con el fin de asegurar una correcta dosificación del gas, destapar los quemadores para restablecer el flujo uniforme de la combustión, implementar un control de calidad del aire que permita mantener parámetros adecuados de seguridad y eficiencia, así como realizar la regulación del paso de gas para optimizar el rendimiento del equipo y prevenir riesgos asociados al uso


- → Aplicamos los productos desengrasantes industriales certificados.
- → Retiramos los residuos con paños, cepillos y herramientas adecuadas.
- → Secamos completamente.
- → Equipo en funcionamiento.

11 DE DICIEMBRE DE 2025

ESTUFA REF. 3628		
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**PRECIO OFERTADO CON IVA INCLUIDO**
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYE LIMPIEZA PROFUNDA DE QUEMADORES Y VÁLVULAS, VERIFICACIÓN DE FUGAS DE GAS, AJUSTE DE FLAMA, REVISIÓN DE ENCENDEDORES, LIMPIEZA DE INYECTORES, Y CHEQUEO GENERAL DE LA ESTRUCTURA Y CONEXIONES	$ 300.000,00
2	SERVICIO DE DIAGNÓSTICO DE FALLAS	$ 100.000,00
3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE QUEMADORES	$ 110.000,00
4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INYECTORES DE GAS	$ 60.000,00
6	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGULADORES DE PRESIÓN DE GAS	$ 350.000,00
9	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERAS Y TUBERÍAS DE GAS	$ 220.000,00
12	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATOS	$ 120.000,00
14	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSORES DE TEMPERATURA	$ 130.000,00
20	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO INTERNO	$ 30.000,00
		$ 1.420.000,00


REGISTRO FOTOGRAFICO



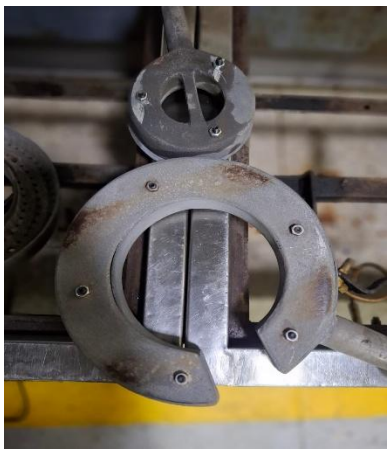



11 DE DICIEMBRE DE 2025

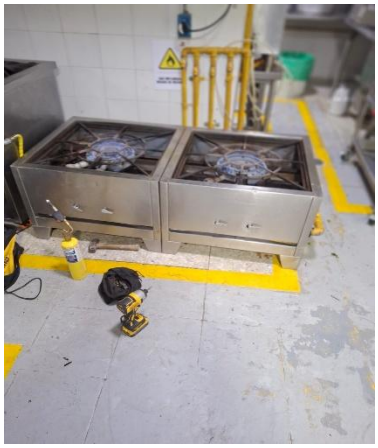




EQUIPO:ESTUFA REF. 15630

- ✓ **UBICACIÓN: PAIPA**

ANÁLISIS TÉCNICO
ESTUFA REF. 15630

Durante la inspección técnica realizada a la estufa se evidenció la necesidad de ejecutar una limpieza general profunda para garantizar condiciones óptimas de operación, efectuar la calibración de los inyectores con el fin de asegurar una correcta dosificación del gas, cambio de fistos ayude a restablecer el flujo uniforme de la combustión, implementar un control de calidad del aire que permita mantener parámetros adecuados de seguridad y eficiencia, así como realizar la regulación del paso de gas para optimizar el rendimiento del equipo y prevenir riesgos asociados al uso

→ Aplicamos los productos desengrasantes industriales certificados.
→ Retiramos los residuos con paños, cepillos y herramientas adecuadas.
→ Secamos completamente.

11 DE DICIEMBRE DE 2025

ESTUFA REF. 156630		
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**PRECIO OFERTADO CON IVA INCLUIDO**
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYE LIMPIEZA PROFUNDA DE QUEMADORES Y VÁLVULAS, VERIFICACIÓN DE FUGAS DE GAS, AJUSTE DE FLAMA, REVISIÓN DE ENCENDEDORES, LIMPIEZA DE INYECTORES, Y CHEQUEO GENERAL DE LA ESTRUCTURA Y CONEXIONES	$ 300.000,00
2	SERVICIO DE DIAGNÓSTICO DE FALLAS	$ 100.000,00
3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE QUEMADORES	$ 110.000,00
4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INYECTORES DE GAS	$ 60.000,00
5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE GAS	$ 70.000,00
6	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGULADORES DE PRESIÓN DE GAS	$ 350.000,00
20	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO INTERNO	$ 30.000,00
		$ 1.020.000,00

REGISTRO FOTOGRAFICO









11 DE DICIEMBRE DE 2025

RECOMENDACIÓN

Para garantizar el funcionamiento seguro y eficiente de las estufas industriales, se recomienda realizar mantenimiento preventivo trimestral que incluya la verificación del termostato y su calibración periódica, inspección de resistencias, limpieza de filtros y superficies con desengrasantes industriales, revisión del nivel y calidad del aceite, y comprobación del estado de controles y luces piloto; adicionalmente, debe ejecutarse una limpieza profunda mensual desmontando partes removibles para su desinfección, asegurando el secado completo antes de reconectar el equipo, evitando sobrecargas de producto o aceite, capacitando al personal en uso seguro

EQUIPO: PARRILLA INDUSTRIAL REF. 3644

- ✓ **UBICACIÓN BOGOTÁ**

ANÁLISIS TÉCNICO
PRILLA INDUSTRIAL REF. 3644

Durante la inspección técnica realizada a la parrilla se evidenció la necesidad de efectuar una limpieza general para garantizar condiciones óptimas de operación, instalar perillas nuevas que permitan un adecuado control del equipo, realizar procesos de regulación y calibración de los sistemas de combustión, implementar un control de calidad del aire con el fin de mantener parámetros seguros y eficientes, así como ejecutar pruebas de fugas para verificar la hermeticidad de las conexiones y asegurar el correcto funcionamiento del sistema.

11 DE DICIEMBRE DE 2025

4. PARRILLAS ASADORAS REF. 3644		
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA IVA INCLUIDO**
66	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYE LIMPIEZA LIMPIEZA PROFUNDA DE LA PARRILLA, QUEMADORES Y DEFLECTORES DE CALOR, ELIMINANDO RESIDUOS DE GRASA Y ALIMENTOS. TAMBIÉN, LA REALIZACIÓN DE VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE VÁLVULAS DE GAS O RESISTENCIAS ELÉCTRICAS, TERMOSTATOS Y CONTROLES DE TEMPERATURA. ADICIONALMENTE, UNA INSPECCIÓN DE LAS CONEXIONES DE GAS, SISTEMAS DE IGNICIÓN (SI APLICA) Y LA BANDEJA RECOGE-GRASAS, GARANTIZANDO UNA DISTRIBUCIÓN UNIFORME DEL CALOR Y UN FUNCIONAMIENTO SEGURO Y EFICIENTE.	$ 520.000,00
67	SERVICIO DE DIAGNÓSTICO DE FALLAS	$ 100.000,00
70	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGULADORES DE PRESIÓN DE GAS	$ 320.000,00
72	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PILOTOS	$ 100.000,00
73	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INYECTORES DE GAS	$ 68.000,00
76	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERAS Y TUBERÍAS DE GAS	$ 220.000,00
80	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO INTERNO	$ 40.000,00
81	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTORES Y CONTROLES ELÉCTRICOS	$ 90.000,00
86	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERILLAS Y CONTROLES	$ 35.000,00
		$ 1.493.000,00

TRABAJOS REALIZADOS

Ventilación inicial: Abrir extractores/ventanas para disipar gases residuales.
Verificación de riesgos: Revisar ausencia de llamas, olores intensos a gas y temperaturas seguras.
Revisión de herramientas: Preparamos manómetros, detector de fugas, juego de llaves, cepillos, aspirador, paños, desengrasante y calibradores.
Limpieza general de la parrilla
Desmontaje controlado: Retiramos las parrillas, quemadores, difusores, bandejas y perillas antiguas.
Desengrase profundo: Aplicamos desengrasante en superficies y componentes.
Limpieza de conductos: Aspiramos y cepillamos los mezcladores.
Lavado y secado: Enjuagamos las piezas desmontables.
Instalación de perillas nuevas
Compatibilidad: Confirmar diámetro del eje, tipo de acople y rango de giro.
Montaje: Colocamos las perillas en sus ejes, aseguramos los tornillos de fijación
Regulación y calibración de los sistemas de combustión
Encendido controlado: Restablecemos el gas, purgamos la línea.
Ajuste de aire primario: Regulamos las compuertas hasta obtener llama azul estable y sin amarillos.
Presión de gas: Medimos con manómetro en línea; ajustamos los reguladores al valor nominal.


11 DE DICIEMBRE DE 2025

REGISTRO FOTOGRAFICO







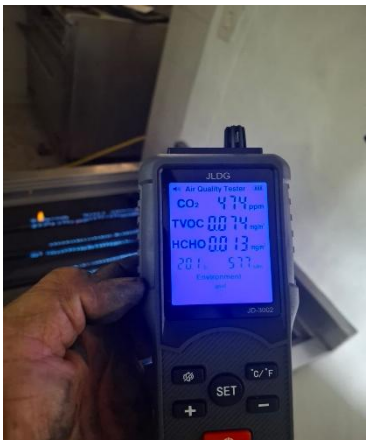



11 DE DICIEMBRE DE 2025

RECOMENDACIÓN Para garantizar la operación segura y eficiente de una parrilla industrial, se recomienda realizar mantenimiento preventivo cada tres meses, consistente en la limpieza profunda de quemadores, difusores y superficies de combustión para evitar acumulación de residuos, la verificación y calibración de presiones de gas y mezclas aire–combustible, la inspección de conexiones y válvulas mediante pruebas de hermeticidad, así como la revisión del sistema de ventilación y control de emisiones para mantener parámetros dentro de rangos normativos; todas estas actividades deben ser ejecutadas exclusivamente por personal técnico capacitado,

EQUIPO: FREIDORA REF. 1848

- ✓ **UBICACIÓN: PAIPA**

ANÁLISIS TÉCNICO

Durante la inspección técnica realizada a la parrilla se determinó la necesidad de ejecutar una limpieza general de los componentes de combustión y superficies de trabajo, implementar un programa de mantenimiento preventivo orientado a preservar la eficiencia operativa del equipo, efectuar la calibración de la válvula Rhoberson para garantizar un suministro de gas estable y seguro, así como realizar la revisión integral de la calidad del gas


TRABAJOS REALIZADOS

- → Limpieza general: Desmontamos las parrillas/quemadores, desengrasamos, limpiamos el venturis y difusores.
- → Mantenimiento preventivo: Inspeccionamos las conexiones, válvulas y reguladores; ajustamos la tornillería.
- → Calibración de válvula Rhoberson: Medimos la presión, ajustamos y verificamos estabilidad de suministro.
- → Revisión de calidad del gas: Registramos CO, CO_2 y O_2, confirmamos los parámetros dentro de rango y corregir mezcla aire–gas.
- → Pruebas de fugas: Aplicamos la solución espumante y detector portátil; corregimos.

11 DE DICIEMBRE DE 2025

2. FREIDORAS INDUSTRIALES REF. 1848		
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA IVA INCLUIDO**
22	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYE LIMPIEZA PROFUNDA DE LA TINA Y LOS COMPONENTES DE CALENTAMIENTO (QUEMADORES O RESISTENCIAS), ASÍ COMO LA VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE TERMOSTATOS Y CONTROLES. REALIZAMOS UNA INSPECCIÓN DETALLADA DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD Y DE DRENAJE PARA PREVENIR FALLAS Y GARANTIZAR LA EFICIENCIA.	$ 350.000,00
23	SERVICIO DE DIAGNÓSTICO DE FALLAS	$ 100.000,00
24	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE QUEMADORES	$ 147.000,00
25	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE GAS	$ 65.000,00
32	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERAS Y TUBERÍAS DE GAS	$ 210.000,00
		$ 872.000,00

REGISTRO FOTOGRAFICO

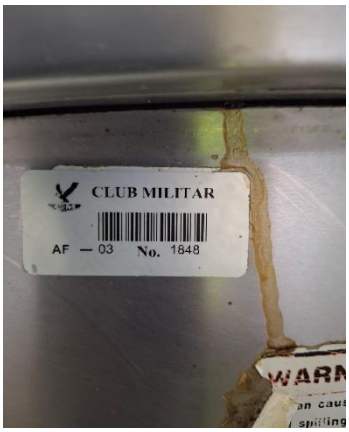




EQUIPO: FREIDORA REF. 1844

- ✓ **UBICACIÓN: PAIPA**

→ Limpieza general: Desmontamos las parrillas/quemadores, desengrasamos, limpiamos el venturis y difusores.
→ Mantenimiento preventivo: Inspeccionamos las conexiones, válvulas y reguladores; ajustamos la tornillería.
→ Calibración de válvula Rhoberson: Medimos la presión, ajustamos y verificamos estabilidad de suministro.
→ Revisión de calidad del gas: Registramos CO, CO_2 y O_2, confirmamos los parámetros dentro de rango y corregir mezcla aire–gas.


→ Pruebas de fugas: Aplicamos la solución espumante y detector portátil; corregimos.

Durante la inspección técnica realizada a la parrilla se identificó la necesidad de ejecutar una limpieza general de los componentes de combustión y superficies de trabajo, implementar un mantenimiento preventivo orientado a preservar la eficiencia y seguridad del equipo, realizar la revisión y calibración de la válvula principal para garantizar un suministro de gas estable, efectuar el arreglo del sistema de chispero con el fin de asegurar un encendido confiable, y llevar a cabo la limpieza junto con el control de calidad del aire

2. FREIDORAS INDUSTRIALES REF. 1844		
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA IVA INCLUIDO**
22	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYE LIMPIEZA PROFUNDA DE LA TINA Y LOS COMPONENTES DE CALENTAMIENTO (QUEMADORES O RESISTENCIAS), ASÍ COMO LA VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE TERMOSTATOS Y CONTROLES. REALIZAMOS UNA INSPECCIÓN DETALLADA DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD Y DE DRENAJE PARA PREVENIR FALLAS Y GARANTIZAR LA EFICIENCIA.	$ 350.000,00
23	SERVICIO DE DIAGNÓSTICO DE FALLAS	$ 100.000,00
24	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE QUEMADORES	$ 147.000,00
25	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE GAS	$ 65.000,00
26	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGULADORES DE PRESIÓN DE GAS	$ 380.000,00
28	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PILOTOS	$ 100.000,00
35	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSORES DE TEMPERATURA	$ 105.000,00
44	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUES/JUNTAS	$ 70.000,00
		$ 1.317.000,00

REGISTRO FOTOGRAFICO



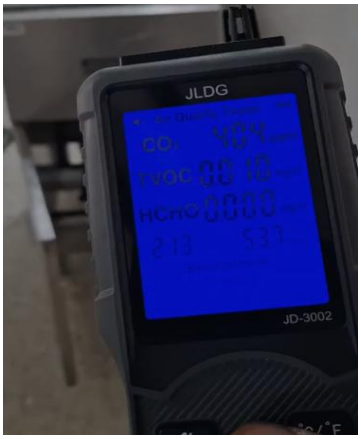



11 DE DICIEMBRE DE 2025





EQUIPO: FREIDORA REF. 3637

- ✓ **UBICACIÓN: PAIPA**

→ Limpieza general: Desmontamos las parrillas/quemadores, desengrasamos, limpiamos el venturis y difusores.
→ Mantenimiento preventivo: Inspeccionamos las conexiones, válvulas y reguladores; ajustamos la tornillería.
→ Calibración de válvula Rhoberson: Medimos la presión, ajustamos y verificamos estabilidad de suministro.
→ Revisión de calidad del gas: Registramos CO, CO_2 y O_2, confirmamos los parámetros dentro de rango y corregir mezcla aire–gas.
→ Pruebas de fugas: Aplicamos la solución espumante y detector portátil; corregimos.

11 DE DICIEMBRE DE 2025

2. FREIDORAS INDUSTRIALES REF. 3637		
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA IVA INCLUIDO**
22	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYE LIMPIEZA PROFUNDA DE LA TINA Y LOS COMPONENTES DE CALENTAMIENTO (QUEMADORES O RESISTENCIAS), ASÍ COMO LA VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE TERMOSTATOS Y CONTROLES. REALIZAMOS UNA INSPECCIÓN DETALLADA DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD Y DE DRENAJE PARA PREVENIR FALLAS Y GARANTIZAR LA EFICIENCIA.	$ 350.000,00
23	SERVICIO DE DIAGNÓSTICO DE FALLAS	$ 100.000,00
25	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE GAS	$ 65.000,00
24	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE QUEMADORES	$ 147.000,00
26	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGULADORES DE PRESIÓN DE GAS	$ 380.000,00
28	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PILOTOS	$ 100.000,00
32	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERAS Y TUBERÍAS DE GAS	$ 210.000,00
34	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATOS	$ 190.000,00
40	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE DRENAJE	$ 160.000,00
41	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERILLAS Y CONTROLES	$ 30.000,00
		$ 1.732.000,00





11 DE DICIEMBRE DE 2025






EQUIPO: FREIDORA REF. 140831

- ✓ **UBICACIÓN: PAIPA**

D Durante la inspección técnica realizada a la freidora se evidenció la necesidad de llevar a cabo una limpieza general de los componentes de combustión y superficies de trabajo, implementar un programa de mantenimiento preventivo orientado a preservar la eficiencia operativa del equipo, efectuar la calibración de la válvula Rhoberson para garantizar un suministro de gas estable y seguro, así como realizar una revisión integral de la calidad del gas con el propósito de verificar el cumplimiento de los parámetros establecidos por la normativa vigente y asegurar condiciones óptimas de funcionamiento bajo estándares técnicos de seguridad y confiabilidad.

- → Limpieza general: Desmontamos las parrillas/quemadores, desengrasamos, limpiamos el venturis y difusores.
- → Mantenimiento preventivo: Inspeccionamos las conexiones, válvulas y reguladores; ajustamos la tornillería.
- → Calibración de válvula Rhoberson: Medimos la presión, ajustamos y verificamos estabilidad de suministro.
- → Revisión de calidad del gas: Registramos CO, CO_2 y O_2, confirmamos los parámetros dentro de rango y corregir mezcla aire–gas.
- → Pruebas de fugas: Aplicamos la solución espumante y detector portátil; corregimos.

11 DE DICIEMBRE DE 2025

2. FREIDORAS INDUSTRIALES REF. 140831		
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA IVA INCLUIDO**
22	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYE LIMPIEZA PROFUNDA DE LA TINA Y LOS COMPONENTES DE CALENTAMIENTO (QUEMADORES O RESISTENCIAS), ASÍ COMO LA VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE TERMOSTATOS Y CONTROLES. REALIZAMOS UNA INSPECCIÓN DETALLADA DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD Y DE DRENAJE PARA PREVENIR FALLAS Y GARANTIZAR LA EFICIENCIA.	$ 350.000,00
23	SERVICIO DE DIAGNÓSTICO DE FALLAS	$ 100.000,00
24	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE QUEMADORES	$ 147.000,00
25	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE GAS	$ 65.000,00
28	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PILOTOS	$ 100.000,00
32	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERAS Y TUBERÍAS DE GAS	$ 210.000,00
36	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO INTERNO	$ 30.000,00
38	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLES	$ 32.000,00
40	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE DRENAJE	$ 160.000,00
		$ 1.194.000,00

REGISTRO FOTOGRAFICO







11 DE DICIEMBRE DE 2025






EQUIPO: FREIDORA REF. 36566

- ✓ **UBICACIÓN: PAIPA**

→ Limpieza general: Desmontamos las parrillas/quemadores, desengrasamos, limpiamos el venturis y difusores.

→ Mantenimiento preventivo: Inspeccionamos las conexiones, válvulas y reguladores; ajustamos la tornillería.

→ Calibración de válvula Rhoberson: Medimos la presión, ajustamos y verificamos estabilidad de suministro.

→ Revisión de calidad del gas: Registramos CO, CO_2 y O_2, confirmamos los parámetros dentro de rango y corregir mezcla aire–gas.

→ Pruebas de fugas: Aplicamos la solución espumante y detector portátil; corregimos.

11 DE DICIEMBRE DE 2025

2. FREIDORAS INDUSTRIALES REF. 36566		
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA IVA INCLUIDO**
22	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYE LIMPIEZA PROFUNDA DE LA TINA Y LOS COMPONENTES DE CALENTAMIENTO (QUEMADORES O RESISTENCIAS), ASÍ COMO LA VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE TERMOSTATOS Y CONTROLES. REALIZAMOS UNA INSPECCIÓN DETALLADA DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD Y DE DRENAJE PARA PREVENIR FALLAS Y GARANTIZAR LA EFICIENCIA.	$ 350.000,00
23	SERVICIO DE DIAGNÓSTICO DE FALLAS	$ 100.000,00
25	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE GAS	$ 65.000,00
26	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGULADORES DE PRESIÓN DE GAS	$ 380.000,00
28	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PILOTOS	$ 100.000,00
29	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INYECTORES DE GAS	$ 55.000,00
30	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCENDEDORES/BUJÍAS DE CHISPA	$ 50.000,00
37	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTORES Y CONTROLES ELÉCTRICOS	$ 80.000,00
		$ 1.180.000,00

REGISTRO FOTOGRAFICO






11 DE DICIEMBRE DE 2025



RECOMENDACIONES:

Para garantizar la operación segura y eficiente de las freidoras industriales, se recomienda establecer un programa de mantenimiento preventivo con una periodicidad de tres meses, que incluya la limpieza profunda de resistencias, depósitos y sistemas de filtrado, la verificación de conexiones eléctricas y controles de temperatura, así como la inspección de válvulas y dispositivos de seguridad; adicionalmente, se debe asegurar que la manipulación, operación y ejecución de dichas actividades sea realizada exclusivamente por personal autorizado y técnicamente capacitado

EQUIPO: HORNO REF. 3631

- ✓ **UBICACIÓN: PAIPA**

Durante la inspección técnica realizada al horno se evidenció la necesidad de ejecutar un mantenimiento preventivo integral que contemple la realización de pruebas de fugas para garantizar la hermeticidad del sistema, la limpieza de inyectores y flautas con el fin de asegurar una adecuada distribución del gas, la calibración y regulación de los parámetros de combustión para mantener condiciones óptimas de operación, así como la fijación y ajuste del panel de control para garantizar la estabilidad mecánica y la confiabilidad en la operación del equipo

- → **Pruebas de fugas:** Aplicamos la solución espumante y usamos detector portátil en uniones, válvulas y racores;
- → **Limpieza de inyectores y flautas:** Desmontamos, desengrasamos, limpiamos orificios y conducto.
- → **Calibración y regulación:** Medimos la presión de gas y ajustamos reguladores; afinamos la mezcla aire–gas.
- → **Fijación del panel de control:** Revisamos los soportes, conectores y tornillería; asegurar el panel y validar integridad de cableado y mandos.

→ **Verificación funcional:** Encendido controlado, comprobamos la estabilidad de llama, respuesta de controles y temperaturas.

8. HORNOS COMBI WESTON 3631		
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA IVA INCLUIDO**
153	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYE LIMPIEZA PROFUNDA DE RESISTENCIAS, VENTILADORES (SI APLICA) Y EL INTERIOR DEL HORNO, ELIMINANDO RESIDUOS QUE AFECTAN EL RENDIMIENTO. LA REALIZACIÓN DE VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE TERMOSTATOS, CONTROLES DE TEMPERATURA Y EL TEMPORIZADOR ES CLAVE PARA UNA COCCIÓN PRECISA. ADEMÁS, SE INSPECCIONAN LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS Y LOS SELLOS DE LA PUERTA.	$ 420.000,00
154	SERVICIO DE DIAGNÓSTICO DE FALLAS	$ 200.000,00
158	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROVÁLVULAS DE ENTRADA DE AGUA	$ 550.000,00
168	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS INTERNAS	$ 320.000,00
169	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE AGUA (CARTUCHO DE REPUESTO)	$ 480.000,00
		$ 1.970.000,00

REGISTRO FOTOGRAFICO








11 DE DICIEMBRE DE 2025

EQUIPO: HORNO REF. 3956

- ✓ **UBICACIÓN: PAIPA**

Durante la inspección técnica realizada al horno se evidenció la necesidad de ejecutar un mantenimiento preventivo integral que contemple la realización de pruebas de fugas para garantizar la hermeticidad del sistema, desobstrucción del desague con el fin de asegurar una adecuada distribución del gas, la calibración y regulación de los parámetros de combustión para mantener condiciones óptimas de operación, así como la fijación y ajuste del panel de control para garantizar la estabilidad mecánica y la confiabilidad en la operación del equipo

- → **Pruebas de fugas:** Aplicamos la solución espumante y usamos detector portátil en uniones, válvulas y racores;
- → **Limpieza de inyectores y flautas:** Desmontamos, desengrasamos, limpiamos orificios y conducto.
- → **Desobstrucción del desague.**
- → **Fijación del panel de control:** Revisamos los soportes, conectores y tornillería; asegurar el panel y validar integridad de cableado y mandos.
- → **Verificación funcional:** Encendido controlado, comprobamos la estabilidad de llama, respuesta de controles y temperaturas.

8. HORNOS COMBI WESTON REF. 3956		
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA IVA INCLUIDO**
153	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYE LIMPIEZA PROFUNDA DE RESISTENCIAS, VENTILADORES (SI APLICA) Y EL INTERIOR DEL HORNO, ELIMINANDO RESIDUOS QUE AFECTAN EL RENDIMIENTO. LA REALIZACIÓN DE VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE TERMOSTATOS, CONTROLES DE TEMPERATURA Y EL TEMPORIZADOR ES CLAVE PARA UNA COCCIÓN PRECISA. ADEMÁS, SE INSPECCIONAN LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS Y LOS SELLOS DE LA PUERTA.	$ 420.000,00
154	SERVICIO DE DIAGNÓSTICO DE FALLAS	$ 200.000,00
155	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS CALEFACTORES	$ 900.000,00
		$ 1.520.000,00

11 DE DICIEMBRE DE 2025

→ **REGISTRO FOTOGRAFICO**







EQUIPO: PLANCHA REF. S/N

✓ **UBICACIÓN: PAIPA**

Durante la inspección técnica realizada a la plancha se evidenció la necesidad de ejecutar un mantenimiento preventivo integral que contemple la realización de pruebas de fugas para garantizar la hermeticidad del sistema, con el fin de asegurar una adecuada distribución del gas, la calibración y regulación de los parámetros de combustión para mantener condiciones óptimas de operación

→ **Pruebas de fugas:** Aplicamos la solución espumante y usamos detector portátil en uniones, válvulas y racores;

→ **Cambio de valvulas:** Desmontamos, desengrasamos, limpiamos realizamos el cabio de las partes

→ **Cambio de perillas:** Se cambia las perillas de la plancha

→ **Verificación funcional:** Encendido controlado, comprobamos la estabilidad de llama, respuesta de controles y temperaturas.

11 DE DICIEMBRE DE 2025

3. PLANCHAS INDUSTRIALES (GAS/ELECTRICA) COCINA EMPLEADOS S/N		
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA IVA INCLUIDO**
45	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYE LIMPIEZA PROFUNDA DE LA SUPERFICIE DE COCCIÓN Y COMPONENTES DE CALENTAMIENTO (RESISTENCIAS O QUEMADORES), ADEMÁS DE LA VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE TERMOSTATOS Y CONTROLES DE TEMPERATURA. SE REALIZA UNA INSPECCIÓN DETALLADA DE LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS O DE GAS, SISTEMAS DE IGNICIÓN (SI APLICA) Y LA BANDEJA DE GOTEO, GARANTIZANDO UNA OPERACIÓN EFICIENTE Y PREVINIENDO FALLAS FUTURAS.	$ 390.000,00
46	SERVICIO DE DIAGNÓSTICO DE FALLAS	$ 100.000,00
48	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE GAS	$ 72.000,00
52	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INYECTORES DE GAS	$ 55.000,00
53	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCENDEDORES/BUJÍAS DE CHISPA	$ 42.000,00
59	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO INTERNO	$ 35.000,00
60	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTORES Y CONTROLES ELÉCTRICOS	$ 72.000,00
61	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLES	$ 35.000,00
63	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERILLAS Y CONTROLES	$ 32.000,00
64	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATAS Y SOPORTES	$ 50.000,00
		$ 883.000,00

REGISTRO FOTOGRAFICO





11 DE DICIEMBRE DE 2025





EQUIPO: PLANCHA REF. 3652

- ✓ **UBICACIÓN: PAIPA**

Durante la inspección técnica realizada a la plancha se evidenció la necesidad de efectuar una limpieza integral de sus componentes, llevar a cabo un mantenimiento general orientado a preservar la eficiencia operativa del equipo, realizar la regulación de la calidad del aire para garantizar parámetros seguros y estables en el proceso de combustión, así como ejecutar la limpieza de los filtros con el fin de asegurar un adecuado flujo de aire

- → **Limpieza integral:** Desmontamos componentes y realizamos desengrase y limpieza completa de la plancha.
- → **Mantenimiento general:** Inspeccionamos, ajustamos fijaciones y reemplazamos piezas desgastadas.
- → **Regulación de aire:** Ajustamos ventilación y parámetros para estabilidad y seguridad de combustión.
- → **Limpieza de filtros:** Retiramos, lavamos, secamos y reinstalamos los filtros, verificando el flujo de aire.
- → **Verificación final:** Probamos operación, confirmamos ausencia de fugas y registramos conformidad técnica.


11 DE DICIEMBRE DE 2025

3. PLANCHAS INDUSTRIALES (GAS/ELECTRICA) REF. 3652		
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA IVA INCLUIDO**
45	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYE LIMPIEZA PROFUNDA DE LA SUPERFICIE DE COCCIÓN Y COMPONENTES DE CALENTAMIENTO (RESISTENCIAS O QUEMADORES), ADEMÁS DE LA VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE TERMOSTATOS Y CONTROLES DE TEMPERATURA. SE REALIZA UNA INSPECCIÓN DETALLADA DE LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS O DE GAS, SISTEMAS DE IGNICIÓN (SI APLICA) Y LA BANDEJA DE GOTEO, GARANTIZANDO UNA OPERACIÓN EFICIENTE Y PREVINIENDO FALLAS FUTURAS.	$ 390.000,00
46	SERVICIO DE DIAGNÓSTICO DE FALLAS	$ 100.000,00
47	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE QUEMADORES	$ 110.000,00
60	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTORES Y CONTROLES ELÉCTRICOS	$ 72.000,00
63	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERILLAS Y CONTROLES	$ 32.000,00
		$ 704.000,00

REGISTRO FOTOGRAFICO



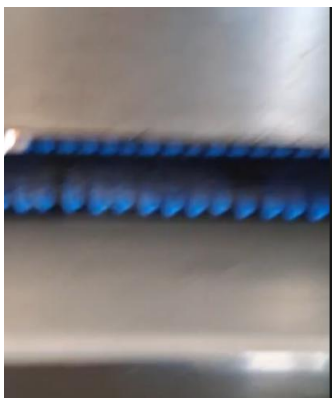


11 DE DICIEMBRE DE 2025

EQUIPO: PLANCHA REF. S/N COCINA PRINCIPAL

- ✓ **UBICACIÓN: PAIPA**

Durante la inspección técnica realizada a la plancha se evidenció la necesidad de ejecutar una limpieza integral de sus componentes, instalar seis perillas nuevas para garantizar un adecuado control operativo, realizar el cambio de válvulas con el fin de asegurar la hermeticidad y confiabilidad del sistema, efectuar la calibración del flujo de gas

- ✓ Limpieza realizada: Desmontamos componentes y efectuamos la limpieza integral de la plancha.
- → Instalación de perillas: Instalamos 6 perillas nuevas y verificamos su correcto funcionamiento.
- → Cambio de válvulas: Reemplazamos válvulas y confirmamos hermeticidad del sistema.
- → Calibración de gas: Ajustamos y calibramos el flujo de gas según especificación.
- → Regulación de aire: Regulamos mezcla aire–gas y la calidad de aire del entorno.
- → Limpieza de filtros: Retiramos, limpiamos y reinstalamos los filtros, comprobando el caudal.
- → Verificación final: Probamos encendido y estabilidad de llama; registramos conformidad técnica.

3. PLANCHAS INDUSTRIALES (GAS/ELECTRICA) COCINA PRINCIPAL S/N		
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA IVA INCLUIDO**
45	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYE LIMPIEZA PROFUNDA DE LA SUPERFICIE DE COCCIÓN Y COMPONENTES DE CALENTAMIENTO (RESISTENCIAS O QUEMADORES), ADEMÁS DE LA VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE TERMOSTATOS Y CONTROLES DE TEMPERATURA. SE REALIZA UNA INSPECCIÓN DETALLADA DE LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS O DE GAS, SISTEMAS DE IGNICIÓN (SI APLICA) Y LA BANDEJA DE GOTEO, GARANTIZANDO UNA OPERACIÓN EFICIENTE Y PREVINIENDO FALLAS FUTURAS.	$ 390.000,00
46	SERVICIO DE DIAGNÓSTICO DE FALLAS	$ 100.000,00
47	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE QUEMADORES	$ 110.000,00
48	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE GAS	$ 72.000,00
55	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERAS Y TUBERÍAS DE GAS	$ 160.000,00
56	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS CALEFACTORES (RESISTENCIAS)	$ 250.000,00
63	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERILLAS Y CONTROLES	$ 32.000,00
		$ 1.114.000,00

11 DE DICIEMBRE DE 2025

REGISTRO FOTOGRAFICO





EQUIPO: PLANCHA REF. 1835

- ✓ **UBICACIÓN: PAIPA**

Durante la inspección técnica realizada a la plancha se determinó la necesidad de efectuar una limpieza integral de sus componentes, llevar a cabo la calibración del flujo de gas para garantizar un suministro estable y seguro, realizar la revisión de la calidad del aire con el fin de mantener parámetros adecuados de combustión, así como proceder al arreglo de la base y a la fijación de los soportes estructurales

- ✓ **Limpieza realizada:** Desmontamos y limpiamos integralmente la plancha y sus componentes.
- ✓ **Calibración de gas:** Ajustamos y calibramos el flujo de gas según especificaciones del equipo.
- ✓ **Calidad de aire verificada:** Medimos parámetros de combustión y confirmamos que quedaron dentro de rango.
- ✓ **Base y soportes corregidos:** Reparamos la base y fijamos soportes, asegurando estabilidad estructural.
- ✓ **Verificación final:** Probamos operación, confirmamos ausencia de fugas y registramos conformidad técnica.

11 DE DICIEMBRE DE 2025

3. PLANCHAS INDUSTRIALES (GAS/ELECTRICA) REF. 1835		
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA IVA INCLUIDO**
45	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYE LIMPIEZA PROFUNDA DE LA SUPERFICIE DE COCCIÓN Y COMPONENTES DE CALENTAMIENTO (RESISTENCIAS O QUEMADORES), ADEMÁS DE LA VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE TERMOSTATOS Y CONTROLES DE TEMPERATURA. SE REALIZA UNA INSPECCIÓN DETALLADA DE LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS O DE GAS, SISTEMAS DE IGNICIÓN (SI APLICA) Y LA BANDEJA DE GOTEO, GARANTIZANDO UNA OPERACIÓN EFICIENTE Y PREVINIENDO FALLAS FUTURAS.	$ 390.000,00
46	SERVICIO DE DIAGNÓSTICO DE FALLAS	$ 100.000,00
50	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOPARES/TERMOCUPLAS	$ 85.000,00
57	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATOS	$ 150.000,00
59	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO INTERNO	$ 35.000,00
61	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLES	$ 35.000,00
63	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERILLAS Y CONTROLES	$ 32.000,00
		$ 827.000,00

REGISTRO FOTOGRAFICO









11 DE DICIEMBRE DE 2025

RECOMENDACIONES: Para garantizar la operación segura y eficiente de las planchas industriales se recomienda establecer un programa de mantenimiento preventivo con una periodicidad de tres meses, que incluya la limpieza integral de superficies y componentes de combustión, la verificación de conexiones y sistemas de regulación de gas y aire, así como la inspección y ajuste de soportes y elementos estructurales; adicionalmente, se debe asegurar que tanto la operación cotidiana como las labores de mantenimiento sean realizadas únicamente por personal calificado y autorizado

RESISTENCIAS			
77	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS CALEFACTORES (RESISTENCIAS)	$ 290.000,00	5
		$ 1.450.000,00	

FELIPE RODRIGUEZ T.
GERENTE OPERATIVO
CEL.3125898982

CONTROL DE TRABAJO N° 02286

CLIENTE:	GAMA DE SERVICIO	TIPO DE SERVICIO	CLASIFICACION DEL SERVICIO
FECHA: Dic 12-2025	INDUSTRIAL | |	PROGRAMADO | |	PREVENTIVO | |
TELEFONO:	LOCATIVO | |	EMERGENCIA | |	CORRECTIVO | |
CIUDAD:	REFRIGERACION | |		PREDICTIVO | |

MANO DE OBRA

PERSONAL	DOCUMENTO

MATERIALES UTILIZADOS

UBICACIÓN: Cocina principal	TRABAJO TERMINADO	SI | | NO | |
EQUIPO: Freidora 36566		
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:		

Limpieza
Calibracion valvula principal
Cambio Flanche de thermopila
Regulacion calidad del aire

OBSERVACIONES

RECOMENDACIONES:

ENTREGADO POR SRT SOLUCIONES INTEGRALES SAS.	

CONTROL DE TRABAJO N° 02283

CLIENTE:	GAMA DE SERVICIO	TIPO DE SERVICIO	CLASIFICACION DEL SERVICIO
FECHA: Diciembre 12-2025	INDUSTRIAL | |	PROGRAMADO | |	PREVENTIVO | |
TELEFONO:	LOCATIVO | |	EMERGENCIA | |	CORRECTIVO | |
CIUDAD:	REFRIGERACION | |		PREDICTIVO | |

MANO DE OBRA

PERSONAL	DOCUMENTO

MATERIALES UTILIZADOS

UBICACIÓN: Cocina principal	TRABAJO TERMINADO	SI | | NO | |
EQUIPO: Freidora 140831		
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:		

Limpieza,
Calibracion Valvula principal
Arreglo piloto
Regulacion y limpieza de inyectores.
Control y calibracion calidad del aire

OBSERVACIONES

RECOMENDACIONES:

ENTREGADO POR SRT SOLUCIONES INTEGRALES SAS.	

CONTROL DE TRABAJO N° 02281

CLIENTE:	GAMA DE SERVICIO	TIPO DE SERVICIO	CLASIFICACION DEL SERVICIO
FECHA: Dic 12 2025	INDUSTRIAL | |	PROGRAMADO | |	PREVENTIVO | |
TELEFONO:	LOCATIVO | |	EMERGENCIA | |	CORRECTIVO | |
CIUDAD:	REFRIGERACION | |		PREDICTIVO | |

MANO DE OBRA

PERSONAL	DOCUMENTO

MATERIALES UTILIZADOS

UBICACIÓN:	TRABAJO TERMINADO	SI | | NO | |
EQUIPO: Freidora 3637		
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:		

Limpieza
Revisión general

OBSERVACIONES

RECOMENDACIONES:
Nota: pendiente cambio thermostato y thermopila

ENTREGADO POR SRT SOLUCIONES INTEGRALES SAS.	

CONTROL DE TRABAJO N° 02276

CLIENTE:	GAMA DE SERVICIO	TIPO DE SERVICIO	CLASIFICACION DEL SERVICIO
FECHA: Dic 12-2025	INDUSTRIAL | |	PROGRAMADO | |	PREVENTIVO | |
TELEFONO:	LOCATIVO | |	EMERGENCIA | |	CORRECTIVO | |
CIUDAD:	REFRIGERACION | |		PREDICTIVO | |

MANO DE OBRA

PERSONAL	DOCUMENTO

MATERIALES UTILIZADOS

UBICACIÓN:	TRABAJO TERMINADO	SI | | NO | |
EQUIPO: Horno panadería 3631		

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

Prueba de fugas
Limpieza de inyectores y flautas
Calibración
Regulación
Fijacion panel frontal

OBSERVACIONES

RECOMENDACIONES:

ENTREGADO POR SRT SOLUCIONES INTEGRALES SAS.	

CONTROL DE TRABAJO N° 02285

CLIENTE:	GAMA DE SERVICIO	TIPO DE SERVICIO	CLASIFICACION DEL SERVICIO
FECHA: Dic 12-2025	INDUSTRIAL | |	PROGRAMADO | |	PREVENTIVO | |
TELEFONO:	LOCATIVO | |	EMERGENCIA | |	CORRECTIVO | |
CIUDAD:	REFRIGERACION | |		PREDICTIVO | |

MANO DE OBRA

PERSONAL	DOCUMENTO

MATERIALES UTILIZADOS

UBICACIÓN: Cocina principal — TRABAJO TERMINADO | SI | | NO | |

EQUIPO: Horno combi 3956

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

Revision
Desobstruccion desague

OBSERVACIONES

RECOMENDACIONES:
Pendiente seguimiento fuga

ENTREGADO POR SRT SOLUCIONES INTEGRALES SAS.

CONTROL DE TRABAJO N° 02289

CLIENTE:	GAMA DE SERVICIO	TIPO DE SERVICIO	CLASIFICACION DEL SERVICIO
FECHA: Dic 10 - 2025	INDUSTRIAL | |	PROGRAMADO | |	PREVENTIVO | |
TELEFONO:	LOCATIVO | |	EMERGENCIA | |	CORRECTIVO | |
CIUDAD: Paipa	REFRIGERACION | |		PREDICTIVO | |

MANO DE OBRA

PERSONAL	DOCUMENTO

MATERIALES UTILIZADOS

UBICACIÓN: Cocina empleados - paipa	TRABAJO TERMINADO	SI | | NO | |
EQUIPO: plancha sin i.d.		

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

Limpieza general
Calibración
Regulación paso calidad aire.
cambio Válvula
Cambio perillas

OBSERVACIONES

RECOMENDACIONES:

ENTREGADO POR SRT SOLUCIONES INTEGRALES SAS.	

CONTROL DE TRABAJO N° 02283

CLIENTE:	GAMA DE SERVICIO	TIPO DE SERVICIO	CLASIFICACION DEL SERVICIO
FECHA: Dic - 11 - 2025	INDUSTRIAL | |	PROGRAMADO | |	PREVENTIVO | |
TELEFONO:	LOCATIVO | |	EMERGENCIA | |	CORRECTIVO | |
CIUDAD:	REFRIGERACION | |		PREDICTIVO | |

MANO DE OBRA

PERSONAL	DOCUMENTO

MATERIALES UTILIZADOS

UBICACIÓN:	TRABAJO TERMINADO	SI | | NO | |
EQUIPO: Freidora 1844 Joserrago		

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

mantenimiento general
Revisión Valvula principal
Arreglo chispero
Limpieza
Control calidad del aire

OBSERVACIONES

RECOMENDACIONES:

ENTREGADO POR SRT SOLUCIONES INTEGRALES SAS.	

CONTROL DE TRABAJO N° 02282

CLIENTE:	GAMA DE SERVICIO	TIPO DE SERVICIO	CLASIFICACION DEL SERVICIO
FECHA: Dic 11 2025	INDUSTRIAL | |	PROGRAMADO | |	PREVENTIVO | |
TELEFONO:	LOCATIVO | |	EMERGENCIA | |	CORRECTIVO | |
CIUDAD:	REFRIGERACION | |		PREDICTIVO | |

MANO DE OBRA

PERSONAL	DOCUMENTO

MATERIALES UTILIZADOS

UBICACIÓN:	TRABAJO TERMINADO	SI | | NO | |
EQUIPO: freidora 1848		
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:		

limpieza general
mantenimiento
Calibración válvula robershov.
Revision Calidad del aire.

OBSERVACIONES

RECOMENDACIONES:

ENTREGADO POR SRT SOLUCIONES INTEGRALES SAS.	

CONTROL DE TRABAJO N° 02284

CLIENTE:	GAMA DE SERVICIO	TIPO DE SERVICIO	CLASIFICACION DEL SERVICIO
FECHA: Dic 11 2025	INDUSTRIAL | |	PROGRAMADO | |	PREVENTIVO | |
TELEFONO:	LOCATIVO | |	EMERGENCIA | |	CORRECTIVO | |
CIUDAD:	REFRIGERACION | |		PREDICTIVO | |

MANO DE OBRA

PERSONAL	DOCUMENTO

MATERIALES UTILIZADOS

UBICACIÓN:	TRABAJO TERMINADO	SI | | NO | |
EQUIPO: Parrilla 3644		
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:		

Instalacion Perillas
Arreglo Flautas
Regulacion y calibracion
Control calidad del aire
Prueba Fugas.

OBSERVACIONES

RECOMENDACIONES:

ENTREGADO POR SRT SOLUCIONES INTEGRALES SAS.	

CONTROL DE TRABAJO N° 02289

CLIENTE:	GAMA DE SERVICIO	TIPO DE SERVICIO	CLASIFICACION DEL SERVICIO
FECHA: Dic 12-2025	INDUSTRIAL | |	PROGRAMADO | |	PREVENTIVO | |
TELEFONO:	LOCATIVO | |	EMERGENCIA | |	CORRECTIVO | |
CIUDAD:	REFRIGERACION | |		PREDICTIVO | |

MANO DE OBRA

PERSONAL	DOCUMENTO

MATERIALES UTILIZADOS

UBICACIÓN: Cocina principal	TRABAJO TERMINADO | SI | | NO | |
EQUIPO: Estufa 156630	
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:	

Limpieza
Cambio Fistos
Regulacion de flujo de gas
Prueba calidad del aire

OBSERVACIONES

RECOMENDACIONES:

ENTREGADO POR SRT SOLUCIONES INTEGRALES SAS.	

CONTROL DE TRABAJO N° 02282

CLIENTE:	GAMA DE SERVICIO	TIPO DE SERVICIO	CLASIFICACION DEL SERVICIO
FECHA: Diciembre 12-025	INDUSTRIAL | |	PROGRAMADO | |	PREVENTIVO | |
TELEFONO:	LOCATIVO | |	EMERGENCIA | |	CORRECTIVO | |
CIUDAD:	REFRIGERACION | |		PREDICTIVO | |

MANO DE OBRA

PERSONAL	DOCUMENTO

MATERIALES UTILIZADOS

UBICACIÓN: Cocina principal	TRABAJO TERMINADO	SI | | NO | |
EQUIPO: Estufa 3628		
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:		

Limpieza
Calibracion de inyectores
Destapar quemadores
Control calidad del aire
Regulacion paso de gas

OBSERVACIONES

RECOMENDACIONES:

ENTREGADO POR SRT SOLUCIONES INTEGRALES SAS.	

CONTROL DE TRABAJO N° 02290

CLIENTE:	GAMA DE SERVICIO	TIPO DE SERVICIO	CLASIFICACION DEL SERVICIO
FECHA: Dic 11 2025	INDUSTRIAL | |	PROGRAMADO | |	PREVENTIVO | |
TELEFONO:	LOCATIVO | |	EMERGENCIA | |	CORRECTIVO | |
CIUDAD:	REFRIGERACION | |		PREDICTIVO | |

MANO DE OBRA

PERSONAL	DOCUMENTO

MATERIALES UTILIZADOS

UBICACIÓN: Cocina principal	TRABAJO TERMINADO	SI | | NO | |
EQUIPO: Estufa 36653		
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:		

Limpieza general
Cambio tornilleria de 4 quemadores
Instalacion 1 perilla
Ajuste general

OBSERVACIONES

RECOMENDACIONES:

ENTREGADO POR SRT SOLUCIONES INTEGRALES SAS.	

CONTROL DE TRABAJO N° 02288

CLIENTE:	GAMA DE SERVICIO	TIPO DE SERVICIO	CLASIFICACION DEL SERVICIO
FECHA: Dic - 11- 2025	INDUSTRIAL | |	PROGRAMADO | |	PREVENTIVO | |
TELEFONO:	LOCATIVO | |	EMERGENCIA | |	CORRECTIVO | |
CIUDAD:	REFRIGERACION | |		PREDICTIVO | |

MANO DE OBRA

PERSONAL	DOCUMENTO

MATERIALES UTILIZADOS

UBICACIÓN:	TRABAJO TERMINADO	SI | | NO | |
EQUIPO: Estufa mixta 36650		
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:		

Limpieza general
calibracion
cambio fistos
Regulacion, calidad del aire
mantenimiento flautas
Fijacion panel frontal

OBSERVACIONES

RECOMENDACIONES:

ENTREGADO POR SRT SOLUCIONES INTEGRALES SAS.	

CONTROL DE TRABAJO N° 02287

CLIENTE:	GAMA DE SERVICIO	TIPO DE SERVICIO	CLASIFICACION DEL SERVICIO
FECHA: Diciembre-10-2025	INDUSTRIAL | |	PROGRAMADO | |	PREVENTIVO | |
TELEFONO:	LOCATIVO | |	EMERGENCIA | |	CORRECTIVO | |
CIUDAD:	REFRIGERACION | |		PREDICTIVO | |

MANO DE OBRA

PERSONAL	DOCUMENTO

MATERIALES UTILIZADOS

UBICACIÓN:	TRABAJO TERMINADO	SI | | NO | |
EQUIPO: Estufa mixta 3656		
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:		

Estufa 6 puestos + parrilla plancha
limpieza general
mantenimiento
calibracion
Regulacion calidad aire
Limpieza Ejitos
Cambio perillas

OBSERVACIONES

RECOMENDACIONES:

ENTREGADO POR SRT SOLUCIONES INTEGRALES SAS.	

CONTROL DE TRABAJO N° 02285

CLIENTE:	GAMA DE SERVICIO	TIPO DE SERVICIO	CLASIFICACION DEL SERVICIO
FECHA: Dic 10-2025	INDUSTRIAL | |	PROGRAMADO | |	PREVENTIVO | |
TELEFONO:	LOCATIVO | |	EMERGENCIA | |	CORRECTIVO | |
CIUDAD:	REFRIGERACION | |		PREDICTIVO | |

MANO DE OBRA

PERSONAL	DOCUMENTO

MATERIALES UTILIZADOS

UBICACIÓN:	TRABAJO TERMINADO	SI | | NO | |
EQUIPO: Estufa panaderia 36651		
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:		

limpieza general
mantenimiento
calibracion
Pintura bandeja
Regulacion paso Rijtos
prueba de fugas

OBSERVACIONES

RECOMENDACIONES:

ENTREGADO POR SRT SOLUCIONES INTEGRALES SAS.	

CONTROL DE TRABAJO N° 02286

CLIENTE:	GAMA DE SERVICIO	TIPO DE SERVICIO	CLASIFICACION DEL SERVICIO
FECHA: Dic-11-2025	INDUSTRIAL | |	PROGRAMADO | |	PREVENTIVO | |
TELEFONO:	LOCATIVO | |	EMERGENCIA | |	CORRECTIVO | |
CIUDAD:	REFRIGERACION | |		PREDICTIVO | |

MANO DE OBRA

PERSONAL	DOCUMENTO

MATERIALES UTILIZADOS

UBICACIÓN:	TRABAJO TERMINADO	SI | | NO | |
EQUIPO: Plancha 3652		
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:		

Limpieza general
Calibración
Regulación calidad del aire
Limpieza de filtros

OBSERVACIONES

RECOMENDACIONES:

ENTREGADO POR SRT SOLUCIONES INTEGRALES SAS.	

SRT
Soluciones Integrales sas

CONTROL DE TRABAJO N° 02284

CLIENTE:	GAMA DE SERVICIO	TIPO DE SERVICIO	CLASIFICACION DEL SERVICIO
FECHA: Diciembre 12-2021	INDUSTRIAL | |	PROGRAMADO | |	PREVENTIVO | |
TELEFONO:	LOCATIVO | |	EMERGENCIA | |	CORRECTIVO | |
CIUDAD:	REFRIGERACION | |		PREDICTIVO | |

MANO DE OBRA

PERSONAL	DOCUMENTO

MATERIALES UTILIZADOS

UBICACIÓN: Cocina principal	TRABAJO TERMINADO	SI | | NO | |
EQUIPO: plancha		
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:		

Limpieza
Instalacion de 6 perillas
Cambio 2 válvulas
Calibración de flujo de gas
Regulacion calidad de aire

OBSERVACIONES

RECOMENDACIONES:

ENTREGADO POR SRT SOLUCIONES INTEGRALES SAS.	

CONTROL DE TRABAJO N° 02288

CLIENTE:	GAMA DE SERVICIO	TIPO DE SERVICIO	CLASIFICACION DEL SERVICIO
FECHA: Dic 12-2025	INDUSTRIAL | |	PROGRAMADO | |	PREVENTIVO | |
TELEFONO:	LOCATIVO | |	EMERGENCIA | |	CORRECTIVO | |
CIUDAD:	REFRIGERACION | |		PREDICTIVO | |

MANO DE OBRA

PERSONAL	DOCUMENTO

MATERIALES UTILIZADOS

UBICACIÓN: Cocina principal	TRABAJO TERMINADO	SI | | NO | |
EQUIPO: plancha 1835		
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:		

Limpieza
Calibracion de flujo de gas
Revision calidad del aire
Arreglo de base, enderezar soportes

OBSERVACIONES

RECOMENDACIONES:

ENTREGADO POR SRT SOLUCIONES INTEGRALES SAS.	

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

250160-T



JEISSON ALEXANDER
CAMACHO RINCON
C.C. 1016019708
RES. INSCRIPCION 1011 DEL 16/11/2018
CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

258000 277218

Scanned by TapScanner

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901189763-1	SRT SOLUCIONES INTEGRALES SAS	CR 111A 145 87 TO 8 AP 402	6015834530	administrativo@srt-sas.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	12/12/2025	92338034	$3.259.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	138.400	0		0		0	0	0	0	138.400	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	228.000	0		0		0	0	0	0	228.000	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	72.000	0		0		0	0	0	0	72.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1
230301	Porvenir	800224808-8	1.173.000	0	0	0	0	0	0		1.173.000	5
231001	Colfondos	800227940-6	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	352.000	0	0	0	0	0	0		352.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	287.800				287.800	0	0	287.800			2.878	287.800	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	495.400	0	0	495.400	8

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901189763-1	SRT SOLUCIONES INTEGRALES SAS		CR 111A 145 87 TO 8 AP 402	6015834530	administrativo@srt-sas.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	12/12/2025	92338034	$3.259.200	

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	495.400	495.400
Pensión	4	1.980.600	1.980.600
Riesgos Laborales	1	287.800	287.800
CCF	1	495.400	495.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	3.259.200	3.259.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**		**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**
NI	901189763-1	SRT SOLUCIONES INTEGRALES SAS		CR 111A 145 87 TO 8 AP 402	6015834530	administrativo@srt-sas.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					8	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2025-12	2025-11	E	12/12/2025	92338034	$3.259.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Estudiante**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario Afiliado**	**Voluntario Aportante**	**Fondo pensional de solidaridad**	**Fondo pensional de subsistencia**	**Cód. EPS**	**IBC EPS**	**Cotización / Valor UPC**	**Cód. ARL**	**IBC ARL**	**Clase de Riesgo**	**Cotización**	**Código CCF**	**IBC CCF**	**Aporte CCF**	**IBC otros parafiscales**	**Aporte SENA**	**Aporte ICBF**	**Aporte ESAP**	**Aporte MEN**
1	CC	1019019342	RODRIGUEZ TAVERA MARIA ALEJANDRA	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	1083028485	CHARRIS TORRES RHONAL DAVID	1	0			S	X																230301	1.260.000	201.600	0	0	0	0	EPS002	1.260.000	50.400	14-11	1.260.000	5	87.700	CCF24	1.260.000	50.400	0	0	0	0	0
3	CC	1233892807	CARDENAS LARA LINA XIMENA	1	0			S																	230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS017	1.800.000	72.000	14-11	1.800.000	1	9.400	CCF24	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
4	CC	52048488	TAVERA GAITAN MARIA DEL PILAR	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
5	CC	1018497386	RODRIGUEZ TAVERA ANGEL ENRIQUE	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
6	CC	1019081761	RODRIGUEZ TAVERA EDGAR FELIPE	1	0			S																	231001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
7	CC	1014306944	LOPEZ MONDRAGON BRAYAN FARID	1	0			S																	25-14	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS002	2.200.000	88.000	14-11	2.200.000	5	153.200	CCF24	2.200.000	88.000	0	0	0	0	0
8	CC	1019065765	RODRIGUEZ TAVERA LEIDY CATALINA	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1329408898EF0807

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JEISSON ALEXANDER CAMACHO RINCON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1016019708 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 250160-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo**, MARÍA DEL PILAR TAVERA GAITÁN,** identificada con c.c. **52'048.488** de Bogotá, en mi condición de Representante Legal de **SRT SOLUCIONES INTEGRALES SAS** identificada con NIT: 901.189.763-1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), **cuando a ello hubiere lugar**, pagados por la compañía durante los últimos seis (06) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de la presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, **JEISSON ALEXANDER CAMACHO RINCON**, identificado con c,c, **1.016'019.708** de Bogotá, y con tarjeta profesional N° T.P 250160-T de la Junta Central De Contadores de Colombia en mi condición de Contador Público de SRT SOLUCIONES INTEGRALAS SAS identificada con NIT: 901.189.763-1 debidamente inscrita en la cámara de comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), **cuando a ello hubiere lugar**, pagados por la compañía durante los últimos seis (06) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de la presentación de la propuesta, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de los dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

Nota: Para certificar el pago de los aportes correspondientes a los sistemas de seguridad social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24. Así mismo, en el caso de pago correspondiente a los aportes parafiscales se deberá tener en cuenta el plazo estipulado para tal efecto por el artículo 10 de la ley 21 de 1982, reglamento por el Decreto 1464 de 2005 y por el Decreto 1670 de 2007.

Dado en Bogotá D.C, a los 30 días del mes de octubre de 2025

MARIA DEL PILAR TAVERA GAITAN
Representante Legal
SRT SOLUCIONES INTEGRALES SAS
NIT: 901.189.763-1

JEISSON CAMACHO RINCON
C.C: 1.016'019.708 Bogotá
Contador Público
T.P: 250160-T

CERTIFICACION DE EXONERACION PAGO DE APORTES

Yo, **JEISSON ALEXANDER CAMACHO RINCON**, identificado con c,c, **1.016'019.708** de Bogotá, y con tarjeta profesional N° T.P 250160-T de la Junta Central De Contadores de Colombia en mi condición de Contador Público de **SRT SOLUCIONES INTEGRALAS SAS** identificada con NIT: 901.189.763-1 debidamente inscrita en la cámara de comercio de Bogotá.

Certifico que nuestra empresa se Encuentra Exonerada del pago de los aportes para fiscales a favor del servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) de acuerdo al artículo 25 de la Ley 1607 de 2012, posterior derogación por el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, que adiciona el artículo 114-1 del Estatuto Tributario.

«Estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.»

Dado en Bogotá D.C, a los 30 días del mes de octubre de 2025

MARIA DEL PILAR TAVERA GAITAN
Representante Legal
SRT SOLUCIONES INTEGRALES SAS
NIT: 901.189.763-1

JEISSON CAMACHO RINCON
C.C: 1.016'019.708 Bogotá
Contador Público
T.P: 250160-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.016.019.708

CAMACHO RINCON
APELLIDOS

JEISSON ALEXANDER
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 03-AGO-1989
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.71 ESTATURA
A+ G.S. RH
M SEXO

13-AGO-2007 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-1500109-47163962-M-1016019708-20071014 00494 07287O 02 239004581

CLUB MILITAR	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: LA-M02-F51 Versión: 6 Fecha: 26/11/2018 Página 1 de 2

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato No. CM-255-2025		FECHA:	11/10/2025
OBJETO CONTRACTUAL:			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE COCINA DEL CLUB MILITAR			
CONTRATISTA: **MARIA DEL PILAR TAVERA**			
NIT/CC/CE: : 901189763			

TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA AL CLUB MILITAR

FECHA:	**22/12/2025**	HORA:		ENTREGA PARCIAL No.:	
				ENTREGA UNICA :	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA	DIRECCION :	**Cra 50 No. 15-80**		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CLUB MILITAR	JT(RA) ROBINSON ORJUELA ZAPATA	JEFE AREA MANTENIMIENTO CM	Supervisor Contrato No. CM-255-2025
CONTRATISTA	MARIA DEL PILAR TAVERA	CONTRATISTA	Representante legal SRT SOLUCIONES INTEGRALES SAS

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	**CONTRATO 255-2025**
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	**CLUB MILITAR**

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION DEL SERVICIO RECIBIDO	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
FAC 4010	FREIDORAS INDUSTRIALES: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMBIO DE REPUESTOS	**5**	**6,295,000.00**	**6,295,000.00**
	PARRILLA ASADORA	**1**	**1,493,000.00**	**1,493,000.00**
	HORNO COMBI	**2**	**3,490,000.00**	**3,490,000.00**
	MARMITA BAÑO DE MARÍA PLAZA CAFÉ SEDE PRINCIPAL	**1**	**1,450,042.01**	**1,450,042.01**
	ESTUFAS Y PLANCHAS	**10**	**11,962,999.99**	**11,962,999.99**
		VALOR SIN I.V.A		**20,718,774.81**
		VALOR I.V.A		**3,972,267.19**
		VALOR TOTAL		**24,691,042.00**

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *COLOCAR UNA* ***X*** *A LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO:		ANEXO DEL CONTRATO No.____:		FICHA TECNICA :		ESPECIFICACIONES TECNICAS:				
NORMA TECNICA:		**CUAL? :**								

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :*COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	
MEDIO AUDIVISUAL		X	

DATOS DEL RECIBO

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	**X**							

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CONTRATISTA	MARIA DEL PILAR TAVERA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	MARÍA DEL PILAR TAVERA GAMÁN
CLUB MILITAR	JT(RA) ROBINSON ORJUELA ZAPATA	JEFE AREA MANTENIMIENTO CM	Supervisor Contrato No. CM-255-2025	NOMBRE Y APELLIDOS

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

Actividad Económica Principal 3312
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta 3125

Representación Gráfica

Tipo de Documento	Nota Crédito
Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	29/12/2025 09:55
Fecha de Vencimiento	29/12/2025 09:55
Fecha de Validación	29/12/2025 09:56
Forma de Pago	Crédito
Medio de Pago	Transferencia Débito Bancaria
Moneda	COP
Factura Asociada	4024
Fecha Generación CUFE	22/12/2025 16:38

CUFE: fcb032939b1b2157958aa5750963f5a2143fe6a90c8b69089a70b86192639740d72490d953fe3b5c1c69d384d5a1b5bc

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	SRT SOLUCIONES INTEGRALES SAS
Nombre Comercial	SRT SOLUCIONES INTEGRALES SAS
NIT	901189763
Obligación	IVA
Email	administrativo@srt-sas.com
Teléfono	3133399335
Dirección Fiscal	CR 111 A 145 87 TO 8 AP 402, BOGOTA, D.C., (BOGOTA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	CLUB MILITAR
Nombre Comercial	
NIT	860016951
Obligación	IVA
Email	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Teléfono	2611593
Dirección	AK 50 15-80
Ciudad, Depart.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	CM-255-2025 1. ESTUFAS INDUSTRIALES REF. 36651	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYE LIMPIEZA PROFUNDA DE QUEMADORES Y VÁLVULAS, VERIFICACIÓN DE FUGAS DE GAS, AJUSTE DE FLAMA, REVISIÓN DE ENCENDEDORES, LIMPIEZA DE INYECTORES, Y CHEQUEO GENERAL DE LA ESTRUCTURA Y CONEXIONES	1	EA	$1.00	IVA 19%	$1.00	$1.00

1

Subtotal	$1.00
IVA 19%	$0.00
RETE FUENTE	-$0.00
RETE ICA	-$0.00
RETE IVA	-$0.00
TOTAL	$1.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUDE: 173119e1f77cd3422a1688447a54812fdeb0668b2281fb6c6d6bf9c00dc636cddd6d7deac1069a2bb9ac6a0d830e9841

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

INFORME DE SUPERVISION No. 2

ID Seven: 3487

Bogota, DC. diciembre de 2025

AL : Señor (a)

EDGARDO MUÑOZ CHEGWIN

Jefe Oficina Asesora Juridica - Contratacion

E. S. D

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. **2** ,del Contrato No. 255 de,2025 correspondiente al período diciembre-2025 : de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO NO:	CTO 255 2025 CLUB MILITAR
CDP/CRP:	MTO EQ COCINA SERVICIO RODRIGUEZ TECNICOS SAS CONT 255-2025 CDP 51425 02/07/25 CRP 86725 06/10/25
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE COCINA DEL CLUB MILITAR.
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	SERVICIO RODRIGUEZ TECNICOS SAS NIT /CEDULA: 901189763
FECHA SUSCRIPCION :	3 de octubre de 2025
VALOR DEL CONTRATO :	OCHENTA MILLONES DE PESOS M/C ($ 80.000.000.00), INCLUIDO TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS Y DEMAS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR
FORMA DE PAGO:	El Club Militar se obliga a cancelar el valor del contrato que se derive de la presente contratación en pesos colombianos en la Ciudad de Bogotá D.C. EL CLUB MILITAR pagará al contratista el valor del contrato resultante de la siguiente forma: PAGOS PARCIALES: equivalentes al valor de los servicios o bienes que se vayan prestando y que hayan sido recibidos a satisfacción por el supervisor el contrato, el pago se hará dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la recepción de los bienes, previo cumplimiento de los siguientes requisitos

	1. Acta de inicio. 2. Informe de recibo parcial a satisfacción de los servicios contratados por parte del CLUB MILITAR, debidamente suscrito por el supervisor del Contrato y el contratista, en el que se indica el valor a cancelar. 3. Acta de recibo a satisfacción parcial por parte del supervisor del contrato. 4. Situación de Recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación Cupo PAC). 5. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 6. Verificación por parte del CLUB MILITAR que el contratista acredite que se encuentre al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar. El pago se realizará dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación de la factura, según programación de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y asignación de turno correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 Derecho a Turno se le asignará el respectivo turno de pago. Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o, si recibidos son devueltos por inconsistencias tales como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, el CLUB MILITAR, se obliga a cancelar la factura de acuerdo con la nueva asignación de turno, si aplica, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado. PARÁGRAFO PRIMERO: el pago se realizará a través de la cuenta de ahorros y/o corriente que disponga el CONTRATISTA acorde con la certificación expedida por la Entidad financiera aportada por el CONTRATISTA. PARÁGRAFO SEGUNDO: el CLUB MILITAR no reconocerá pagos sobre mantenimiento o elementos que no formen parte del objeto contractual y su correspondiente alcance técnico. PARÁGRAFO TERCERO - FACTURA ELECTRÓNICA: en caso de que el CONTRATISTA se encuentra obligado a facturar electrónicamente deberá aportar factura electrónica de acuerdo a lo establecido por la DIAN, el cual será un requisito para el pago del respectivo contrato. Todas las facturas electrónicas para su reconocimiento

	tributario deberán ser validadas previo a su expedición, por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o por un proveedor autorizado por esta. La factura electrónica solo se entenderá expedida cuando sea validada por el proveedor autorizado. NOTA: factura electrónica sin validación previa, en estos casos, la factura se entenderá expedida con la entrega al adquiriente y deberá ser enviada a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o proveedor autorizado para su validación dentro de las 48 horas siguientes, contadas a partir del momento en que se solucionen los problemas tecnológicos. NOMBRE BENEFICIARIO: SRT SOLUCIONES INTEGRALES SAS BANCO: BCSC TIPO DE CUENTA: AHORROS NUMERO DE CUENTA: 24086081117
LUGAR DE ENTREGA:	Bogota, DC.
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES:	VALOR ADICIONAL : $ - PRORROGA:
SUPERVISIOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	80370360 ROBINSON ORJUELA ZAPATA

2.OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE COCINA DEL CLUB MILITAR

FREIDORAS INDUSTRIALES: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMBIO DE REPUESTOS 5


PARRILLA ASADORA 1

HORNO COMBI 2

MARMITA BAÑO DE MARÍA PLAZA CAFÉ SEDE PRINCIPAL 1

ESTUFAS Y PLANCHAS 10

GRAFICO DEL % DE EJECUCION

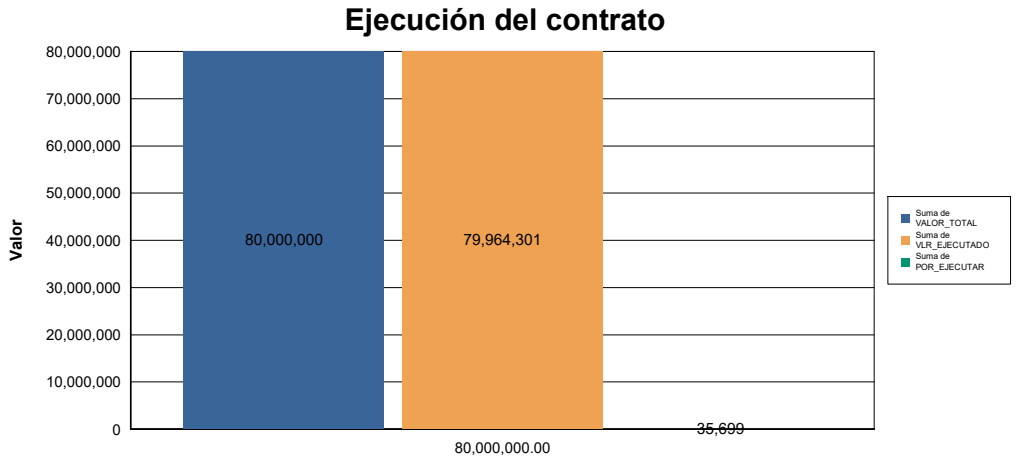

Valor Inicial:	**80,000,000.00**	**% Ejecutado**
Valor Ejecutado:	**79,964,300.62**	**99.96**
Saldo por Ejecutar:	**35,699.38**	

SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS DEL TRAMITE:

1. Presentó la documentación respectiva para el pago No. 2
2. El contratista dió cumplimiento al los servicios profesionales objeto del contrato a satisfacción verificado por esta supervisión correspondiente al periodo No. 2
3. El contratista presenta el Informe de Gestión de fecha diciembre de 2025.
4. Presenta los documentos soporte para pago como son: certificación de aportes de Seguridad Social y Parafiscales, pago de la EPS.

3. NO HAY NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN

El contratista ha dado cumplimiento a los servicios pactados y a su objeto contractual como lo indica el estudio previo y se encuentra en etapa de ejecución.

4.CONTROL DE PAGOS

Haciendo un seguimiento Contable, se diligencia el cuadro control de pagos y saldos del contrato del cual soy supervisor(a)

VALOR TOTAL CONTRATO:	80,000,000.00

PAGOS

FACTURA	ORDEN	FECHA	VALOR PAGO
TOTAL PAGADO			
SALDO			

SERVICIOS/BIENES RECIBIDOS

T.O OC	ORDEN DE SERVICIO	AÑO	MES	REMISION SEVEN	FACTURA PROEEVOR	VALOR
2238	ORDEN COMPRA SERVICIOS CM 255-2025 MTO EQ COCINA	2025	12	0		55,308,958.81
2354	MTO EQ COCINA SERVICIO RODRIGUEZ TECNICOS SAS CONT 255-2025 CDP 51425 02/07/25 CRP 86725	2025	12	0		24,655,341.81
						79,964,300.62

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES:

5.OBSERVACION

El supervisor del contrato No.255 de 2025 , recomienda realizar el pago de la cuenta de cobro y/o factura de fecha de diciembre de 2025 , anexando los documentos soportes para el correspondiente pago.

Informe de supervision numero: **2**

DETALLE DE FACTURAS A PAGAR

Factura Electrónica de Venta 4024

Cordialmente,

ROBINSON ORJUELA ZAPATA

SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO No.255 de2025
