	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-06
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA	23/02/2025

FECHA DE REUNIÓN :	13/03/2026	**ACTA No.**	**4**
HORA DE INICIO:	9:00 a.m.	**HORA FINALIZACIÓN:**	**10:00 a.m**
LUGAR DE REUNIÓN:	CORREDOR FERREO ZIPAQUIRÁ - NEMOCÓN		
DEPENDENCIA:	INFRAESTRUCUTRA - ICCU		

OBJETO DE LA REUNIÓN

SEGUIMIENTO DEL PROGRESO AL DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA No. ICCU - 1646 - 2025

Se da inicio a la reunión a las 9:00 donde el ingeniero Cristian Mejia informa acerca del documento PAGA, el cual sera socializado por parte del ICCU el dia lunes 16 de marzo del 2026 a las 10 A.M.; ademas, informa acerca del tema de tala y poda, donde el ingeniero Javier Linares muestra la inquietud acerca de los permisos necesarios, los cuales pueden retrasar el proyecto, inquietud que el ingeniero Cristian Mejia aclara que no va a afectar realmente.

Se informa sobre el avance del proyecto de 916m donde el inventario que se ha venido realizando se encuentran gran numero de traviesas en mal estado.Ademas se manifiesta al contratista sobre el comunicado enviado el 11 de marzo del 2026 con consecutivo CE-VYR-020 acerca de los retrasos presentados durante las anteriores semanas. El ingeniero Sergio Lozano da respuesta a este oficio en la reunion, donde informa que ya se encuentra en el sitio el subcontratista haciendo verificacion de la documentacion junto al ingeniero Duvan Montenegro, quienes daran inicio a las actividades el dia lunes 16 de marzo del 2026 con un total de 12 personas. Ademas, el ingeniero Sergio Lozano manifiesta la informacion recolectada en el inventario de pasos a nivel, donde se evidencian un total de 58 pasos a nivel donde hay 1 critico, que seria el paso a nivel La esmeralda, el cual fue vistado en el recorrido realizado el 24 de febrero del 2026. Tambien hace la anotacion acerca de este paso a nivel, el cual despues de haber revisado los pasos a nivel mediante Google Earth, en el año 2013 era inexistente. El ingeniero Sergio Lozano ademas, informa acerca de un punto de inundacion, el cual sera sometido a inspeccion para dar inicio a la actividad de elaboracion de cunetas en tierra para mitigar este riesgo. Se plantea la entrega de este informe por parte del inventario de los pasos a nivel en el transcurso de la siguiente semana.

El ingeniero Cristian Mejia, pregunta al contratista acerca del tema de la contratación de mano de obra del municipio, el cual se encuentra en las clausulas del contrato de obra y en el pliego de condiciones, ademas, solicita al contratista presentar el No Previsto de la topografía junto a los otros items a lo que el ingeniero Javier Montenegro responde que el dia de hoy 13 de marzo del 2026 en horas de la tarde sera enviado a la interventoria.

El ingeniero Javier Linares Manifiesta al ICCU acerca de la problematica de la regularizacion de los pasos a nivel el cual se sale del alcance del contrato de obra, problematica que el ingeniero Sergio Lozano confirma

Se definen los periodos de los informes mensuales.

CONCLUSIONES

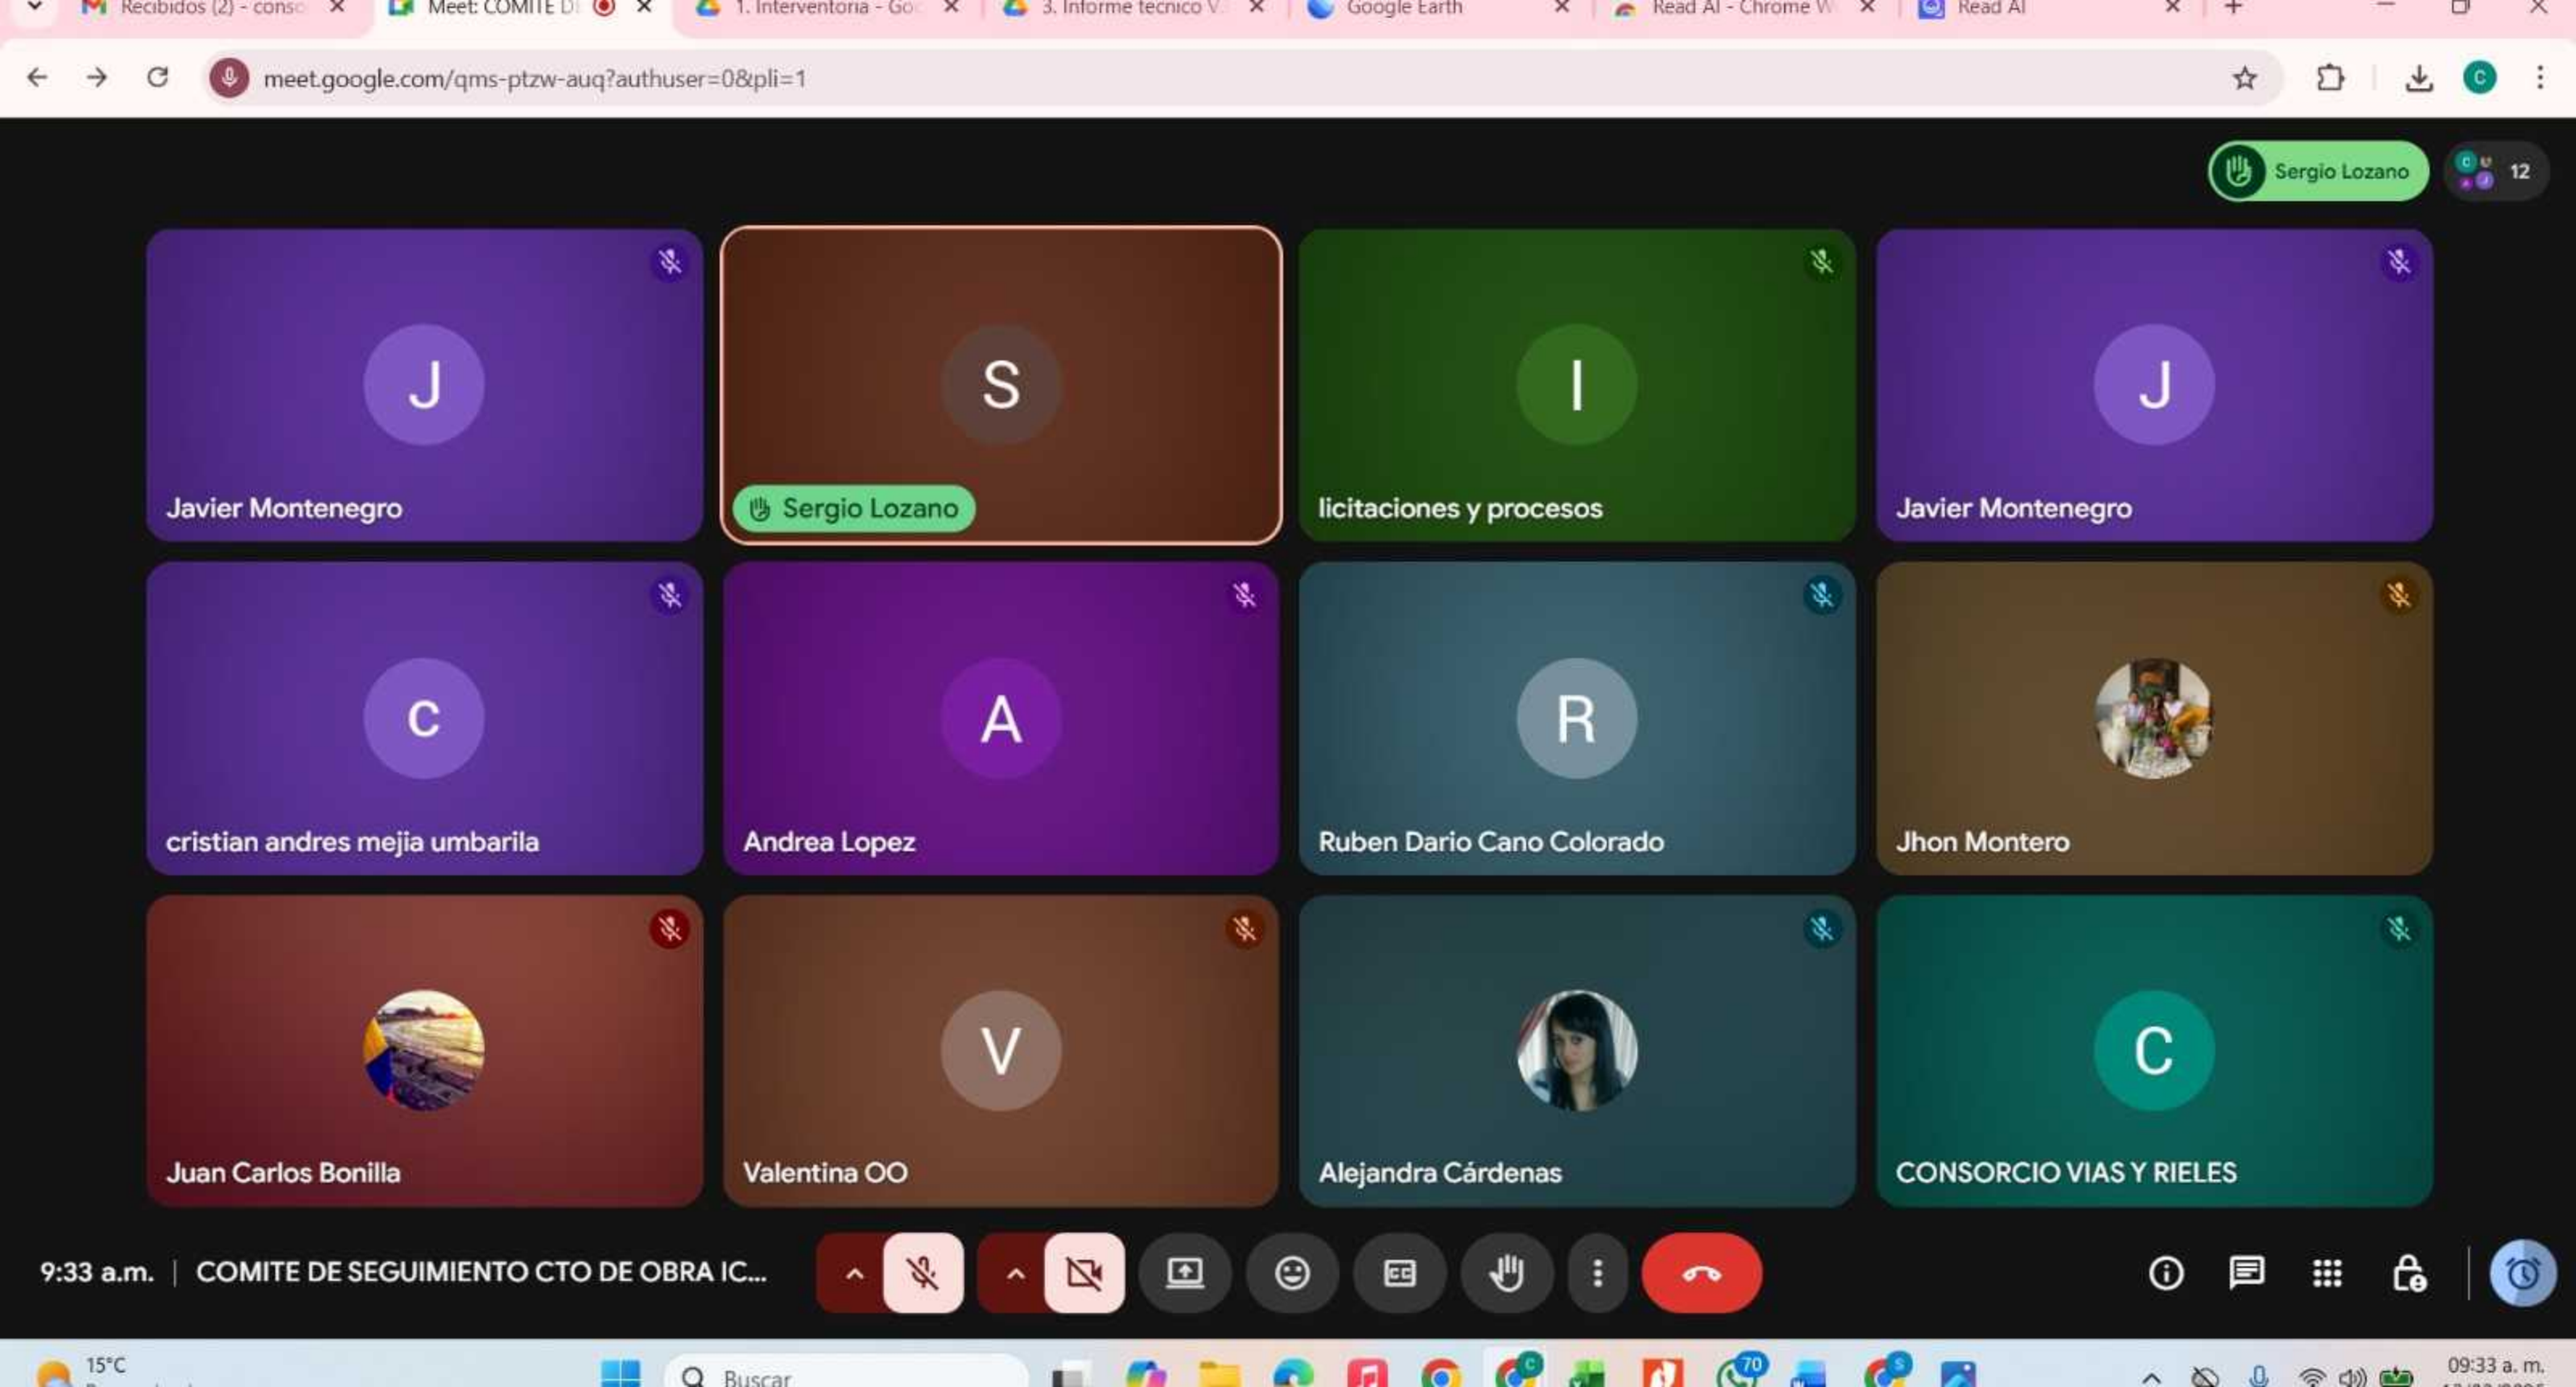
INICIO DE ACTIVIDADES DEL SUBCONTRATISTA EL DIA LUNES 16 DE MARZO.
CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES DEL LIMPIEZA, EXCAVACIÓN Y DESCARNE.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
ENTREGA NP TOPOGRAFIA POR PARTE DEL CONTRATISTA	13/03/2026
INICIO DE ACTIVIDADES POR PARTE DEL SUBCONTRATISTA	16/03/2026
SOCIALIZACION DOCUMENTO PAGA	16/03/2026
ENTREGA DEL INVENTARIO DE PASOS A NIVEL	20/03/2026

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA
EDWIN JAVIER LINARES	consorcioviasyrieles@gmail.com	
JAVIER MONTENEGRO	javier.mc@grupoymc.com	
SERGIO ANDRES LOZANO NIÑO	utinfraferrea@gmail.com	
ANA TERESA RANGEL	consorcioviasyrieles@gmail.com	
CRISTIAN MEJIA	cristian.mejia@cundinamarca.gov.co	
JUAN CARLOS BONILLA	jcabonilla@gmail.com	
SANTIAGO MOSCOSO MUÑOZ	santiagomoscosomunoz@gmail.com	
ANDREA LOPEZ	coordinacionhse.prociving@gmail.com	
RUBEN DARIO CANO	residenteutnemocon@gmail.com	
LUIS FERNANDO TRIANA LOPEZ	consorcioviasyrieles@gmail.com	


Recibidos (2) - conso
Meet: COMITE DI
1. Interventoria - Go
3. Informe tecnico V
Google Earth
Read AI - Chrome W
Read AI
meet.google.com/qms-ptzw-auq?authuser=0&pli=1
Sergio Lozano
12
J
Javier Montenegro
S
Sergio Lozano
I
licitaciones y procesos
J
Javier Montenegro
C
cristian andres mejia umbarila
A
Andrea Lopez
R
Ruben Dario Cano Colorado
Jhon Montero
Juan Carlos Bonilla
V
Valentina OO
Alejandra Cárdenas
C
CONSORCIO VIAS Y RIELES
9:33 a.m. | COMITE DE SEGUIMIENTO CTO DE OBRA IC...
15°C
Buscar
09:33 a. m.
