PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA DE 28 DE JULIO DEL 2026

INFORME ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 042-2026

ING.
CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ FRANCO
SUPERVISORA CONTRATO 042-2026
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUERTO SALGAR E.S.P.S

OBJETO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, EL CUAL INCLUYE REPARACIONES, SUMINISTRO DE REPUESTOS, MANO DE OBRA, Y DEMÁS, DE LOS VEHÍCULOS DE TENENCIA Y USO DE LA EMPRESA DE SERIVICIOS PUBLICOS DE PUERTO SALGAR CUNDINAMARCA

De acuerdo con el objeto del contrato de prestación de servicios 042-2026, me permito relacionar las actividades realizadas en el periodo correspondiente del 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2026.

Actividades detallas realizadas en el vehículo compactador

A continuación, se relacionan de manera detallada las actividades de mantenimiento preventivo ejecutadas en el vehículo compactador ODT 272, junto con su respectivo soporte fotográfico:

3. Servicio de soldadura en la caja compactadora

Durante el periodo reportado se realizó el servicio de soldadura en las perforaciones existentes del piso de la caja compactadora, con el fin de recuperar la integridad estructural de la estructura y garantizar el adecuado funcionamiento del vehículo.

Evidencia Fotográfica:



4. Suministro e instalación de empaques perimetrales

Durante el periodo reportado se realizó el suministro e instalación de los empaques perimetrales de la compuerta trasera, incluyendo todos los elementos necesarios para su correcta instalación, garantizando un adecuado sellado de la compuerta.

Evidencia Fotográfica:

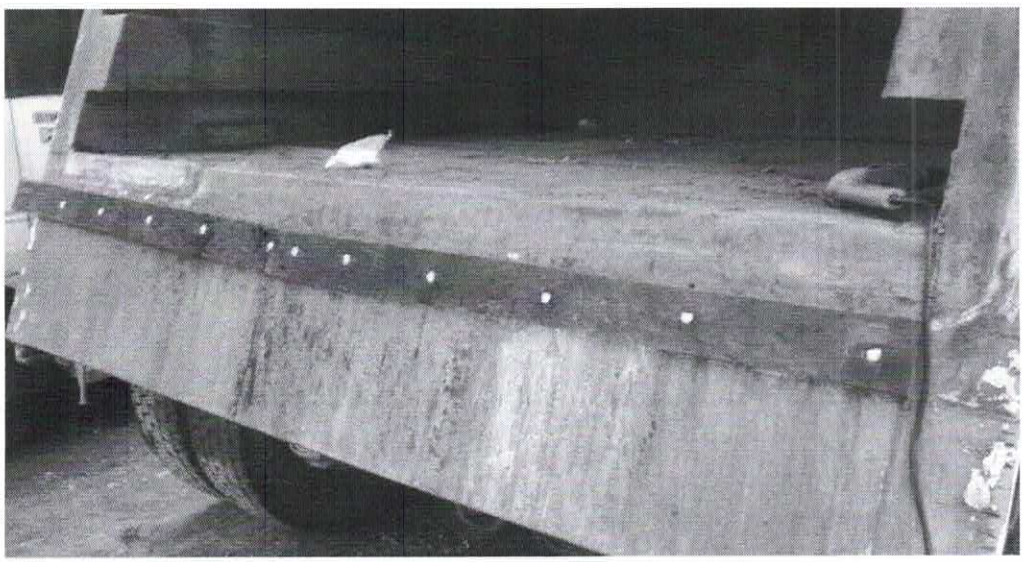

6. Reparación de arranque y corrección eléctrica

Durante el periodo reportado se realizó el servicio de reparación del arranque, el cual incluyó la revisión eléctrica y la corrección de un corto eléctrico detectado, garantizando el correcto funcionamiento del sistema de encendido del vehículo.

Evidencia Fotográfica:



7. Reparación del mando de cambios

Durante el periodo reportado se realizó el servicio de reparación del mando de cambios, incluyendo el suministro e instalación de la manguera de aire del multiplicador de cambios para garantizar su correcto funcionamiento.

Evidencia Fotográfica:



8. Mantenimiento del sistema de muelles traseros

Durante el periodo reportado se realizó el servicio de desmonte y montaje de los muelles traseros, incluyendo el cambio de graseras, centrales, bujes y pasadores de los muelles traseros.

Evidencia Fotográfica:



9. Suministro e instalación de cruceta de cardán

Durante el periodo reportado se realizó el suministro e instalación de la cruceta de cardán del vehículo, garantizando el adecuado funcionamiento del sistema de transmisión.

Evidencia Fotográfica:



11. Suministro e instalación de manguera hidráulica

Durante el periodo reportado se realizó el suministro e instalación de la manguera hidráulica requerida para el correcto funcionamiento del sistema hidráulico del vehículo.

Evidencia Fotográfica:

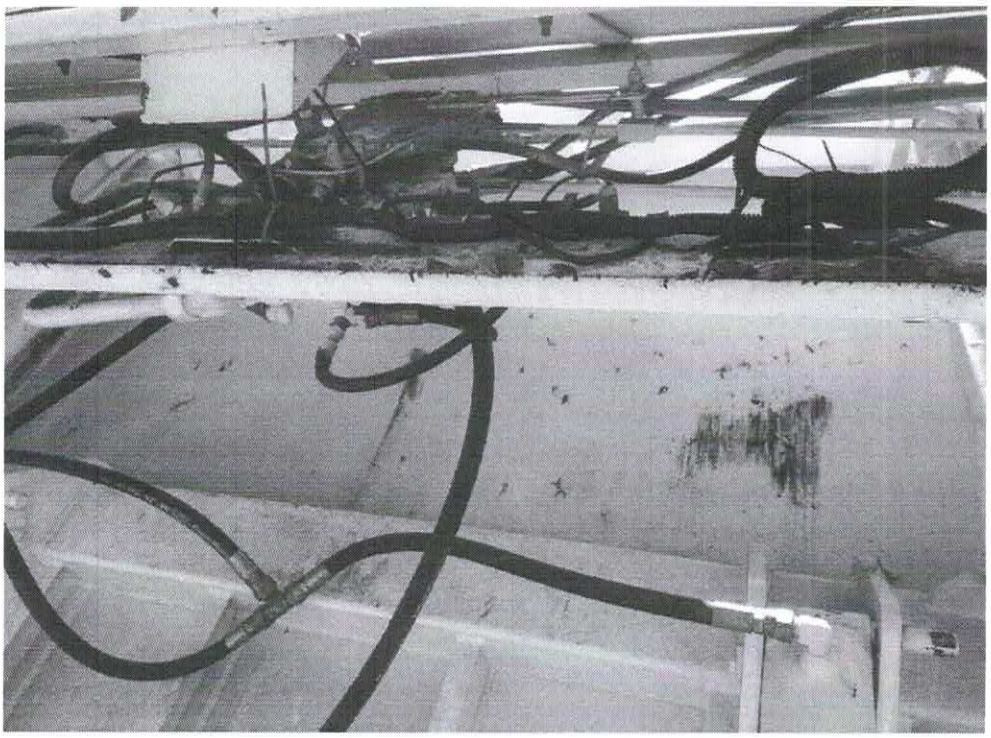

19. Suministro e instalación de alarma de reversa

Durante el periodo reportado se realizó el suministro e instalación de la alarma de reversa, fortaleciendo las condiciones de seguridad durante las maniobras de reversa del vehículo.

Evidencia Fotográfica:



20. Suministro e instalación de espejos retrovisores

Durante el periodo reportado se realizó el suministro e instalación de los espejos retrovisores del vehículo compactador, garantizando una adecuada visibilidad para la operación.

Evidencia Fotográfica:



22. Servicio de reconstrucción de muelles trasero izquierdo y derecho

Durante el periodo reportado se realizó el servicio de reconstrucción de los muelles trasero izquierdo y derecho, recuperando sus condiciones de funcionamiento y capacidad de carga.

Evidencia Fotográfica:

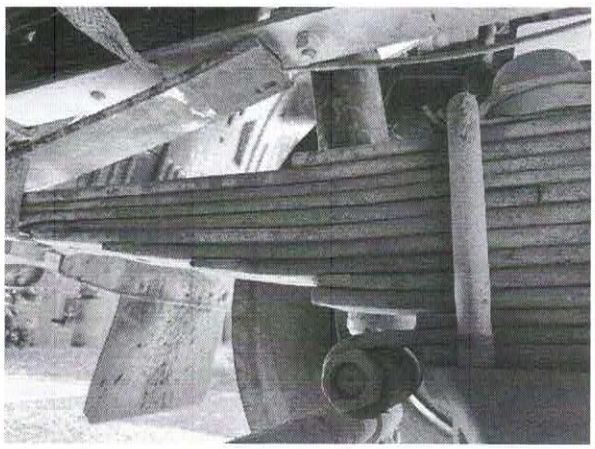

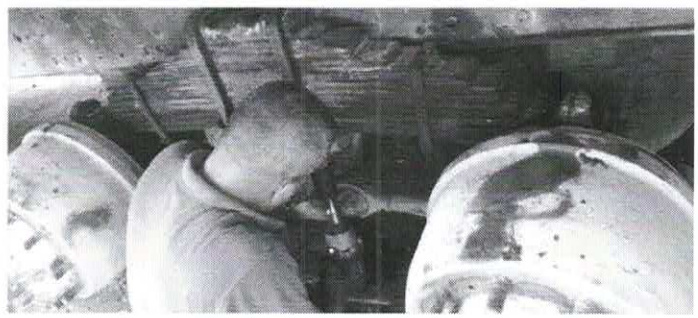

23. Servicio de soldadura de caja compactadora parte trasera

Durante el periodo reportado se realizó el servicio de soldadura en la parte trasera de la caja compactadora debido al daño presentado en el espacio de recolección, garantizando la recuperación de su estructura.

Evidencia Fotográfica:



24. Servicio de reparación de clutch

Durante el periodo reportado se realizó el servicio de reparación del clutch del vehículo, garantizando el correcto funcionamiento del sistema de transmisió

Evidencia Fotográfica:



25. Servicio de scanner compactador para revisión de fallas generales

Durante el periodo reportado se realizó el escáner del vehículo compactador con el fin de identificar y diagnosticar fallas generales presentes en sus sistemas electrónicos.

Evidencia Fotográfica:



26. Servicio de reconstrucción de hausing muelle delantero y central

Durante el periodo reportado se realizó el servicio de reconstrucción del housing del muelle delantero y central, garantizando el adecuado funcionamiento del sistema de suspensión.

Evidencia Fotográfica:



27. Suministro e instalación de baterías 1250 MAC

Durante el periodo reportado se realizó el suministro e instalación de baterías 1250 MAC, garantizando el correcto funcionamiento del sistema eléctrico y de arranque del vehículo.

Evidencia Fotográfica:

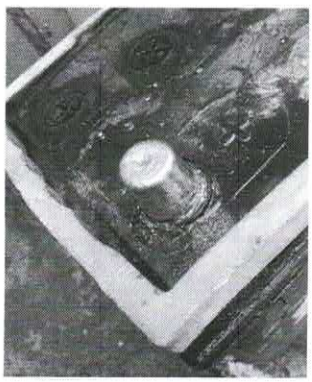

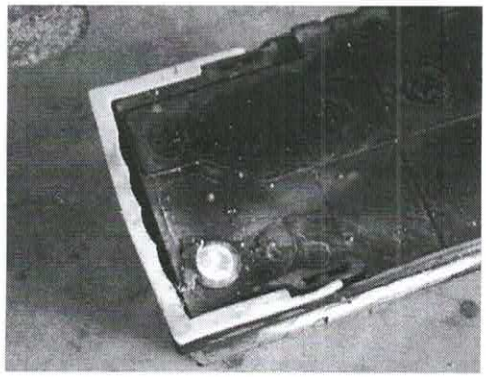

28. Diagnóstico eléctrico general a la instalación de alta

Durante el periodo reportado se realizó el diagnóstico eléctrico general de la instalación de luces altas del vehículo, con el fin de identificar posibles fallas y definir las acciones correctivas que sean requeridas.

Evidencia Fotográfica:



29. Suministro e instalación de hoja para muelles delanteros (nuevas)

Durante el periodo reportado se realizó el suministro e instalación de hojas nuevas para los muelles delanteros, mejorando el desempeño y la capacidad de carga del sistema de suspensión.

Evidencia Fotográfica:

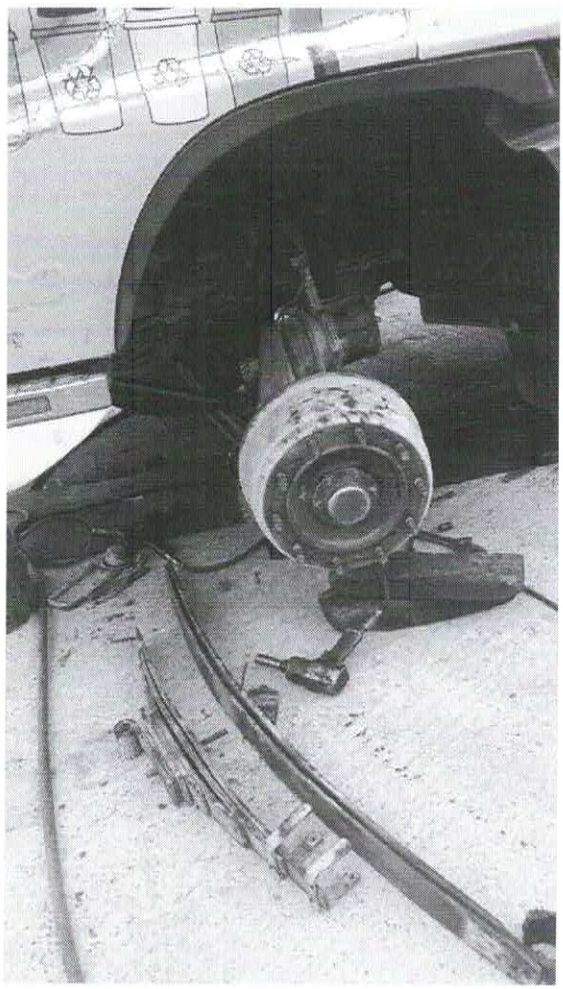

A continuación, se relacionan las actividades del contrato

1. El contratista deberá suministrar e instalar repuestos nuevos o que cumplan con lo requerido en calidad y durabilidad, el supervisor designado por la Empresa realizará la verificación periódica de su cumplimiento.

Se realizó el suministro e instalación de repuestos y elementos requeridos para el mantenimiento y reparación del vehículo compactador ODT 272, incluyendo baterías, cruceta de cardán, mangueras hidráulicas, empaques perimetrales, alarma de reversa, espejos retrovisores y demás componentes necesarios para mejorar las condiciones de funcionamiento del vehículo.

2. Disponer de todos los medios requeridos para ejecutar el contrato de manera idónea y en cumplimiento de la propuesta contratada.

Se dispuso del personal, herramientas, equipos e insumos necesarios para la ejecución de las actividades de mantenimiento, reparación y adecuación requeridas para el vehículo compactador ODT 272.

3. Garantizar la aplicación de equipos electrónicos y máquinas especializadas con el fin de verificar el estado y realizar los diagnósticos técnicos del vehículo.

Se realizaron actividades de diagnóstico técnico mediante equipos especializados, incluyendo escaneo del vehículo y revisión del sistema eléctrico, con el fin de identificar posibles fallas y establecer las acciones requeridas.

4. Suministro de materiales, repuestos e insumos de primera calidad y en concordancia con los criterios de eficiencia, resistencia, duración, economía, calidad, certificación, garantía, etc.

Se suministraron los materiales, repuestos e insumos requeridos para las actividades ejecutadas, teniendo en cuenta las condiciones necesarias de funcionamiento, resistencia y durabilidad del vehículo compactador ODT 272.

5. Atender los requerimientos realizados por el supervisor que la empresa designe e informar por escrito.

Se atendieron los requerimientos, observaciones y solicitudes realizadas por el supervisor durante el desarrollo de las actividades contractuales.

6. Tener centralizado los mantenimientos básicos que son (sincronización, alineación, balanceo, cambio de aceite).

Se realizaron actividades de mantenimiento y reparación requeridas para el vehículo compactador ODT 272, de acuerdo con las necesidades identificadas durante la ejecución contractual.

7. El contratista se compromete a velar por la seguridad y custodia del vehículo y sus accesorios cuando se encuentren bajo su responsabilidad.

Se garantizó el adecuado manejo, cuidado y custodia del vehículo compactador y sus componentes durante el tiempo en que permaneció bajo responsabilidad del contratista para la ejecución de las actividades contratadas.

8. Los vehículos deben permanecer dentro de las instalaciones del taller.

El vehículo permaneció dentro de las instalaciones del taller durante la ejecución de los trabajos de mantenimiento y reparación requeridos.

9. Garantizar la confidencialidad y privacidad de la información que por razón del contrato deba manejar.

Se garantizó el manejo adecuado y reservado de la información relacionada con la ejecución del contrato.

10. Garantizar la calidad en los resultados de los análisis realizados.

Se realizaron las revisiones, diagnósticos y verificaciones técnicas correspondientes de acuerdo con las actividades requeridas para determinar las condiciones del vehículo.

11. Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto del contrato, en las fechas acordadas con el supervisor.

Las actividades fueron coordinadas y ejecutadas conforme a los requerimientos establecidos y los tiempos acordados con el supervisor del contrato.

12. Presentar las facturas de control detalladas con sus respectivos soportes, registro fotográfico, cuenta de cobro y factura electrónica.

Se entregaron los soportes correspondientes de las actividades ejecutadas, incluyendo registro fotográfico, informe de actividades, cuenta de cobro y factura electrónica conforme a los requisitos establecidos.

13. Acreditar durante la ejecución del contrato el pago de aportes al sistema de seguridad social integral.

Se dio cumplimiento al pago de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social integral del periodo.

14. Entregar la información que se genere o sea solicitada con ocasión a la ejecución del contrato.

La información requerida durante la ejecución del contrato fue suministrada oportunamente conforme a las solicitudes realizadas por el supervisor.

15. En ningún caso la Empresa responderá por obligaciones laborales provenientes de la ejecución del presente contrato.

Las obligaciones derivadas de la ejecución contractual fueron asumidas conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

16. Ejecutar el contrato dentro de los parámetros legales establecidos generando información confiable, clara, oportuna y veraz.

Las actividades fueron ejecutadas conforme a los parámetros técnicos y contractuales establecidos, suministrando información clara y oportuna relacionada con la ejecución.

17. Entregar los bienes y servicios adquiridos con la calidad adecuada según la propuesta presentada.

Los bienes, repuestos y servicios requeridos fueron suministrados y ejecutados conforme a las condiciones establecidas en la propuesta contractual.

18. Que los bienes y servicios suministrados sean de excelente calidad.

Los repuestos, materiales y servicios suministrados fueron seleccionados y ejecutados conforme a los requerimientos necesarios para las actividades de mantenimiento y reparación del vehículo.

19. Iniciar la ejecución del suministro de bienes y servicios a partir de la firma del acta de iniciación del contrato.

Las actividades se desarrollaron conforme a lo establecido en el acta de inicio del contrato.

20. Suscribir con el supervisor las actas de conformidad y dar cumplimiento a lo pactado.

Se realizaron los documentos y soportes requeridos para la verificación y seguimiento de las actividades ejecutadas.

21. Mantener los precios de los bienes y servicios contratados y ofrecidos.

Se mantuvieron las condiciones económicas establecidas para los bienes y servicios contratados durante la ejecución contractual.

22. Atender las observaciones del interventor y/o supervisor y demás actividades relacionadas con el objeto contratado.

Se atendieron las observaciones y requerimientos realizados por el supervisor relacionados con las actividades de mantenimiento, reparación y suministro ejecutadas en el vehículo compactador ODT 272.

ATENTAMENTE,

Vladimir Angulo V.

VLADIMIR ANGULO VIRGUEZ
CONTRATISTA
