AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL


CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024

FECHA	DD	7	MM	7	A	26	ACTA No.	3	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	2

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTÁ (VF)				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024	NIT O C.C.	901.901.506-1	CONTRATO N°	24001269 H4 DE 2024
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER-AEROPUERTO	NIT O C.C.	901.902.218-8	CONTRATO N°	24001358 H3 DE 2024

CAPÍTULO	1	ITEM	1.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALIZACION HORIZONTAL (según normativa FAA P-620) - EN PISTA	UNID.	M2	UBICACIÓN	AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO

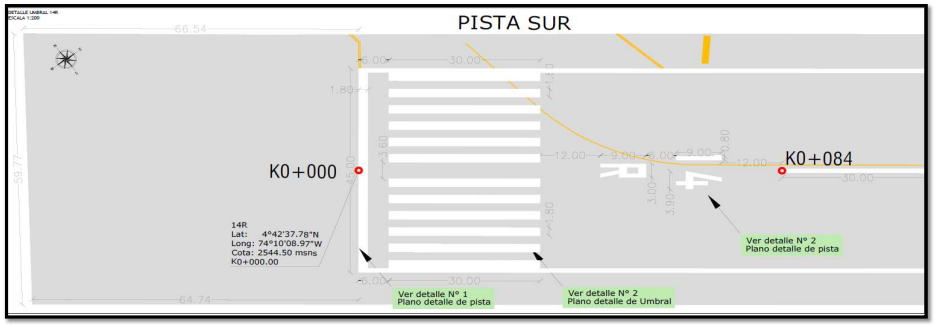

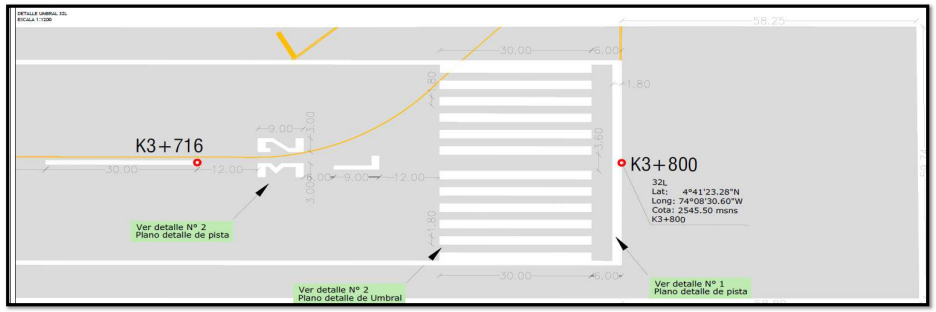

Descripción	Espesor(m)	Long (m)	Ancho (m)	Cant.	Area total
CANTIDAD CONTRACTUAL (ACTA MOD N°2)					**111.967,10**
CANTIDADES A EJECUTAR CONTEMPLADAS PARA SEÑALIZACION PISTA NORTE					
UMBRAL	N/A	30,00	1,80	24,00	1.296,00
BORDE TRANSVERSAL	N/A	43,20	1,80	2,00	155,52
BORDE TRANSVERSAL CICLO 2	N/A	43,20	1,80	2,00	155,52
ZONA DE CONTACTO	N/A	22,50	1,80	20,00	810,00
VISADA	N/A	60,00	10,00	1,00	600,00
VISADA ciclo 2	N/A	60,00	10,00	1,00	600,00
EJE	N/A	30,00	0,90	73,00	1.971,00
EJE ciclo 2	N/A	30,00	0,90	53,00	1.431,00
LETRAS Y NUMEROS (CABECERAS) 14 L 32 R	N/A	1,00	81,90	1,00	81,90
				SUB TOTAL PISTA NORTE	**7.100,94**
CANTIDADES A EJECUTAR CONTEMPLADAS PARA SEÑALIZACION PISTA SUR					
UMBRAL	N/A	30,00	1,80	24,00	1.296,00
BORDE TRANSVERSAL	N/A	43,20	1,80	2,00	155,52
BORDE TRANSVERSAL CICLO 2	N/A	43,20	1,80	2,00	155,52
ZONA DE CONTACTO	N/A	22,50	1,80	20,00	810,00
VISADA	N/A	60,00	10,00	1,00	600,00
VISADA ciclo 2	N/A	60,00	10,00	1,00	600,00

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL


AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL


CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024


FECHA	DD	7	MM	7	A	26	ACTA No.	3	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	2

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTÁ (VF)				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024	NIT O C.C.	901.901.506-1	CONTRATO N°	24001269 H4 DE 2024
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER-AEROPUERTO	NIT O C.C.	901.902.218-8	CONTRATO N°	24001358 H3 DE 2024

CAPÍTULO	1	ITEM	1.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALIZACION HORIZONTAL (según normativa FAA P-620) - EN PISTA	UNID.	M2	UBICACIÓN	AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO

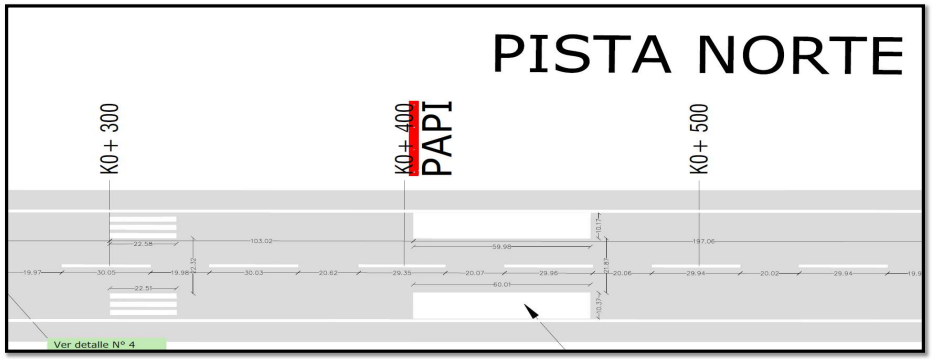

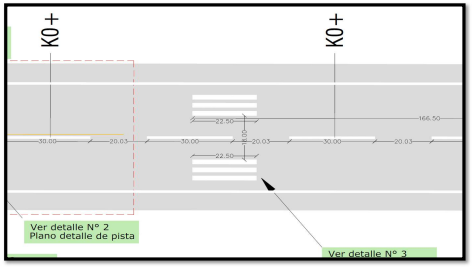

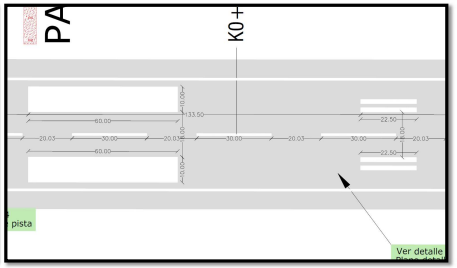

EJE	N/A	30,00	0,90	73,00	1.971,00
EJE ciclo 2	N/A	30,00	0,90	53,00	1.431,00
LETRAS Y NUMEROS (CABECERAS) 14 L 32 R	N/A	1,00	81,90	1,00	81,90
LETRAS Y NUMEROS (CABECERAS) 14 L 32 R (RETOQUES)	N/A	1,00	68,52	1,00	68,52
				SUB TOTAL PISTA NORTE	7.169,46

CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR	126.237,50
CANTIDAD CONTRACTUAL	111.967,10
CANTIDAD A AUMENTAR	14.270,40

REGISTRO FOTOGRAFICO





Sub-Total	14.270,40
TOTAL	14.270,40

ELABORO	APROBO

Residente de Obra: _____
Ing . Luis Felipe Vallejo

Director de Obra: _____
Ing . Yessica Andrea Ortiz

Residente de interventoria: _____
Ing . Wilmer Riaño

Director de interventoria: _____
Ing. Juan David Aldana

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL


AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL


CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024

FECHA	DD	7	MM	7	A	26	ACTA No.	3	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTÁ (VF)				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024	NIT O C.C.	901.901.506-1	CONTRATO N°	24001269 H4 DE 2024
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER-AEROPUERTO	NIT O C.C.	901.902.218-8	CONTRATO N°	24001358 H3 DE 2024

CAPÍTULO	1	ITEM	1.5 NP	BORRADO SEÑALIZACION EXISTENTE LINEA CONTINUA HASTA 20 CMS DE ANCHO	UNID.	ML	UBICACIÓN	AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO

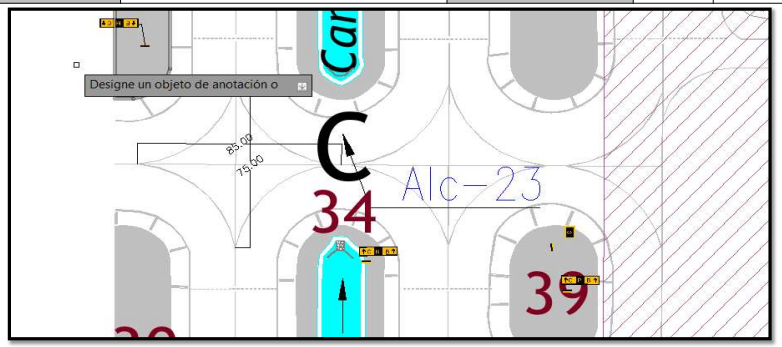

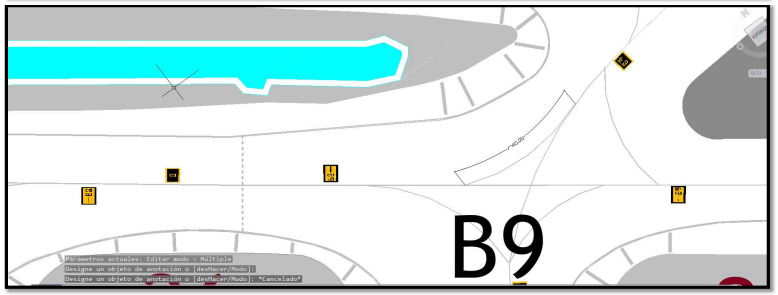


Descripción	Espesor(m)	Long (m)	Ancho (m)	Cant.	Area total
CANTIDADES A EJECUTAR CALLES DE RODAJE					
INTERSECCION CALLE M CON C	N/A	85,00	N/A	1,00	85,00
INTERSECCION CALLE M CON C	N/A	75,00	N/A	1,00	75,00
INTERSECCION CALLE B CON B9	N/A	40,00	N/A	1,00	40,00
				SUB TOTAL PISTA NORTE	200,00

CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR	200,00
CANTIDAD CONTRACTUAL	-
CANTIDAD A AUMENTAR	200,00

REGISTRO FOTOGRAFICO



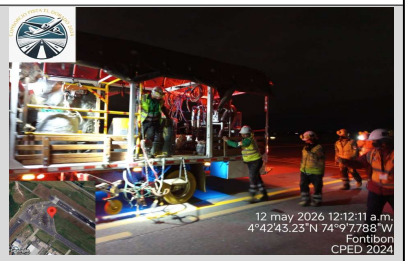

Sub-Total	200,00
TOTAL	200,00

ELABORO	APROBO

Residente de Obra: _____
Ing . Luis Felipe Vallejo

Director de Obra: _____
Ing . Yessica Andrea Ortiz

Residente de interventoria: _____
Ing . Wilmer Riaño

Director de interventoria: _____
Ing. Juan David Aldana

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL


AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL


CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024

FECHA	DD	7	MM	7	A	26	ACTA No.	3	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	2

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTÁ (VF)				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024	NIT O C.C.	901.901.506-1	CONTRATO N°	24001269 H4 DE 2024
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER-AEROPUERTO	NIT O C.C.	901.902.218-8	CONTRATO N°	24001358 H3 DE 2024

CAPÍTULO	1	ITEM	1.6 NP	BORRADO SEÑALIZACION EXISTENTE PINTURA EN LLANA	UNID.	M2	UBICACIÓN	AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO



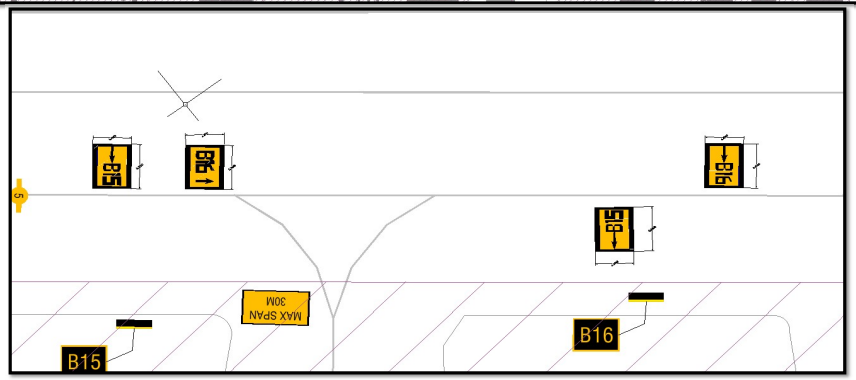

Descripción	Espesor(m)	Long (m)	Ancho (m)	Cant.	Area total
CANTIDADES A EJECUTAR CALLES DE RODAJE					
SEÑALES CALLE BRAVO ENTRE B11 Y B16	N/A	5,30	4,30	8,00	182,32
INTERSECCION B 11 CON B	N/A	4,20	4,21	1,00	17,68
				SUB TOTAL PISTA NORTE	200,00
			CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR		200,00
			CANTIDAD CONTRACTUAL		-
			CANTIDAD A AUMENTAR		200,00

REGISTRO FOTOGRAFICO





Sub-Total	200,00
TOTAL	200,00

ELABORO	APROBO
Residente de Obra: _____ Ing . Luis Felipe Vallejo	Director de Obra: _____ Ing . Yessica Andrea Ortiz
Residente de interventoria: _____ Ing . Wilmer Riaño	Director de interventoria: _____ Ing. Juan David Aldana

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL


CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024

FECHA	DD	7	MM	7	A	26	ACTA No.	3	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	2

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTÁ (VF)				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024	NIT O C.C.	901.901.506-1	CONTRATO N°	24001269 H4 DE 2024
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER-AEROPUERTO	NIT O C.C.	901.902.218-8	CONTRATO N°	24001358 H3 DE 2024

CAPÍTULO	1	ITEM	1.7 NP	BORRADO SEÑALIZACION EXISTENTE CON PINTURA LINEA CONTINUA HASTA 20 CMS DE ANCHO(CON TONALIDAD SEMEJANTE AL PAVIMENTO EXISTENTE)	UNID.	ML	UBICACIÓN	AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO

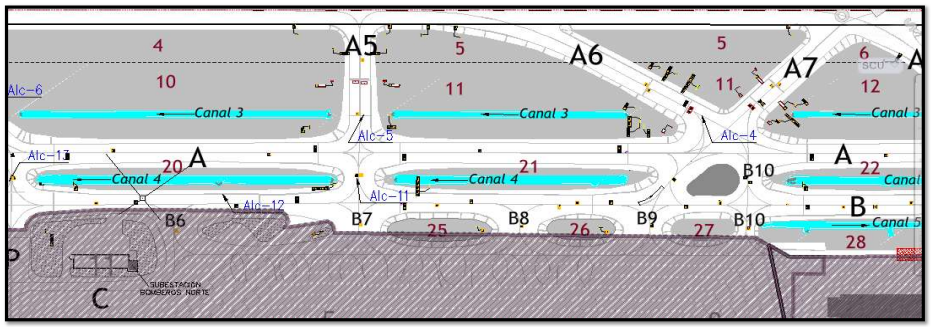

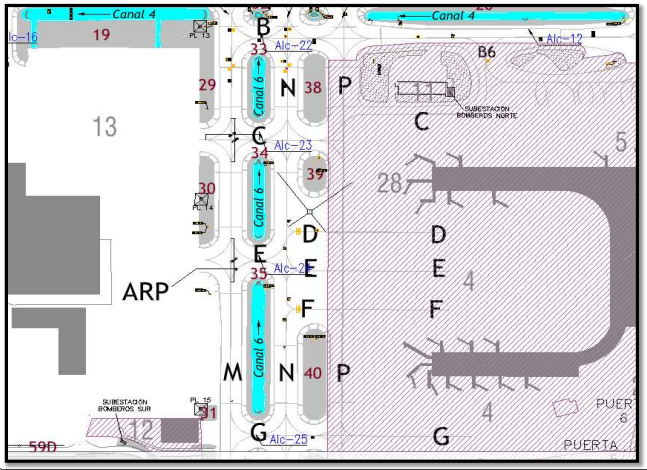

Descripción	Espesor(m)	Long (m)	Ancho (m)	Cant.	Area total
CANTIDADES A EJECUTAR CALLES DE RODAJE					
INTERSECCION CALLE M CON B	N/A	25,00	N/A	1,00	25,00
INTERSECCION CALLE M CON C	N/A	50,00	N/A	1,00	50,00
INTERSECCION CALLE M CON E	N/A	40,00	N/A	1,00	40,00
INTERSECCION CALLE M CON G	N/A	30,00	N/A	1,00	30,00
SEÑALES CALLE B CON B7	N/A	50,00	N/A	1,00	50,00
SEÑALES CALLE B CON B8	N/A	45,00	N/A	1,00	45,00
SEÑALES CALLE B CON B9	N/A	75,00	N/A	1,00	75,00
SEÑALES CALLE B CON B10	N/A	85,00	N/A	1,00	85,00
				SUB TOTAL PISTA NORTE	400,00

CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR	400,00
CANTIDAD CONTRACTUAL	-
CANTIDAD A AUMENTAR	400,00

REGISTRO FOTOGRAFICO





Sub-Total	400,00
TOTAL	400,00

ELABORO	APROBO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024

FECHA	DD	7	MM	7	A	26	ACTA No.	3	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	2

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTÁ (VF)**			
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	**NIT O C.C.**	899.999.059-3	
CONTRATISTA	CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024	**NIT O C.C.**	901.901.506-1	**CONTRATO N°** 24001269 H4 DE 2024
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER-AEROPUERTO	**NIT O C.C.**	901.902.218-8	**CONTRATO N°** 24001358 H3 DE 2024

CAPÍTULO	**1**	**ITEM**	1.7 NP	BORRADO SEÑALIZACION EXISTENTE CON PINTURA LINEA CONTINUA HASTA 20 CMS DE ANCHO(CON TONALIDAD SEMEJANTE AL PAVIMENTO EXISTENTE)	**UNID.**	**ML**	**UBICACIÓN**	**AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO**

Residente de Obra: _____
Ing . Luis Felipe Vallejo

Director de Obra: _____
Ing . Yessica Andrea Ortiz

Residente de interventoria: _____
Ing . Wilmer Riaño

Director de interventoria: _____
Ing. Juan David Aldana

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL


AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL


CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024

FECHA	DD	7	MM	7	A	26	ACTA No.	3	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	2

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTÁ (VF)				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024	NIT O C.C.	901.901.506-1	CONTRATO N°	24001269 H4 DE 2024
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER-AEROPUERTO	NIT O C.C.	901.902.218-8	CONTRATO N°	24001358 H3 DE 2024

CAPÍTULO	2	ITEM	2.4	DESCONTAMINACIÓN POR CAUCHO CON HIDROLAVADO	UNID.	M2	UBICACIÓN	AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO

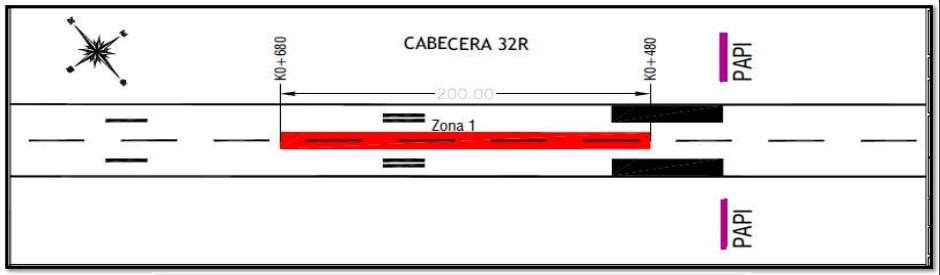

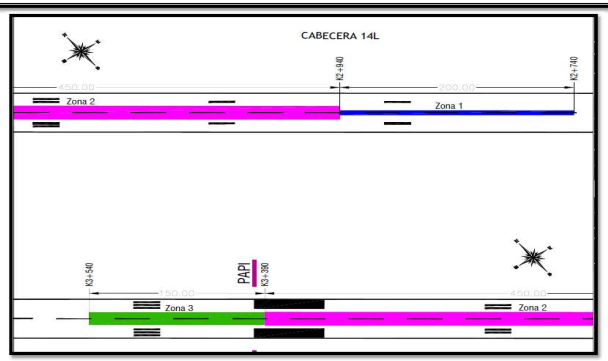

Descripción	Espesor(m)	Long (m)	Ancho (m)	Cant.	Area total
CANTIDAD CONTRACTUAL (ACTA MOD N°2)					**198.415,18**
CANTIDADES A EJECUTAR CONTEMPLADAS PARA PISTA NORTE					
LINEAS DE EJE	N/A	30,00	0,90	64,00	1.728,00
K0+480 A K0+680	N/A	200,00	6,00	1,00	1.200,00
K2+740 A K2+940	N/A	200,00	6,00	1,00	1.200,00
K2+940 A K3+090	N/A	150,00	17,00	1,00	2.550,00
K3+090 A K3+390	N/A	300,00	17,00	1,00	5.100,00
				TOTAL PISTA NORTE	**11.778,00**
CANTIDADES A EJECUTAR CONTEMPLADAS PARA PISTA SUR					
K0+470 - K0+620	N/A	150,00	14,00	1,00	2.100,00
K2+760 - K2+860	N/A	100,00	8,00	1,00	800,00
K2+860 - K2+930	N/A	70,00	10,00	1,00	700,00
K2+930 - K3+130	N/A	200,00	16,00	1,00	3.200,00
K3+130 - K3+330	N/A	200,00	16,00	1,00	3.200,00
K3+484 - K3+600	N/A	116,00	9,00	1,00	1.044,00
K3+400 - K3+484	N/A	84,00	4,30	1,00	361,20
				TOTAL PISTA SUR	**11.405,20**

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL


AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024

FECHA	DD	7	MM	7	A	26	ACTA No.	3	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	2

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTÁ (VF)				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024	NIT O C.C.	901.901.506-1	CONTRATO N°	24001269 H4 DE 2024
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER-AEROPUERTO	NIT O C.C.	901.902.218-8	CONTRATO N°	24001358 H3 DE 2024

CAPÍTULO	2	ITEM	2.4	DESCONTAMINACIÓN POR CAUCHO CON HIDROLAVADO	UNID.	M2	UBICACIÓN	AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO

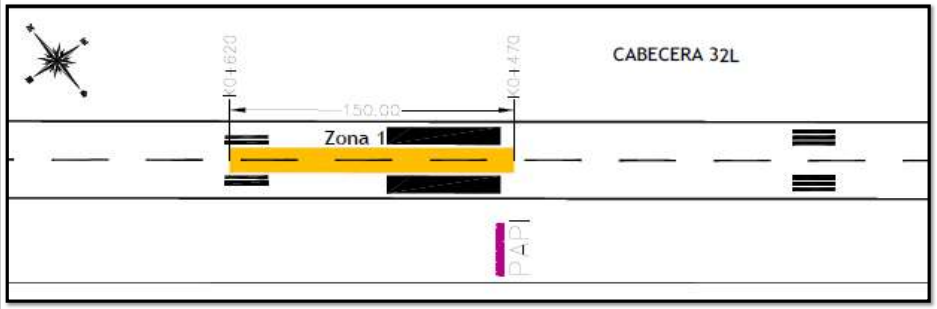

CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR	221.598,38
CANTIDAD CONTRACTUAL	198.415,18
CANTIDAD A AUMENTAR	23.183,20

REGISTRO FOTOGRAFICO





Sub-Total	23.183,20
TOTAL	23.183,20

ELABORO	APROBO
Residente de Obra: Ing . Luis Felipe Vallejo	Residente de interventoria: Ing . Wilmer Riaño
Director de Obra: Ing . Yessica Andrea Ortiz	Director de interventoria: Ing. Juan David Aldana


AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

FECHA	DD	7	MM	7	A	26	ACTA No.	3	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	3

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTÁ (VF)				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024	NIT O C.C.	901.901.506-1	CONTRATO N°	24001269 H4 DE 2024
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER-AEROPUERTO	NIT O C.C.	901.902.218-8	CONTRATO N°	24001358 H3 DE 2024

CAPÍTULO	4	ITEM	4.1	ACTIVIDADES DE ROCERÍA Y/O CORTE DE CESPED DE TODAS LAS ZONAS VERDES DE SEGURIDAD DE LAS PISTAS, CALLES DE RODAJE, CABECERAS, SECTORES DE BORDES DE PISTA, ÁREA VERDE EN UBICACIONES COMO PAPIS, ALS, ILS, RVR, ANTENAS, SEÑALES INDICADORAS DE VIENTO, Y OTROS EQUIPOS DE ZONA DE SEGURIDAD. (INCLUYE RECOLECCIÓN, TRASPORTE, RETIRO DE BASURAS Y DISPOSICIÓN FINAL).	UNID.	M2	UBICACIÓN	AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO

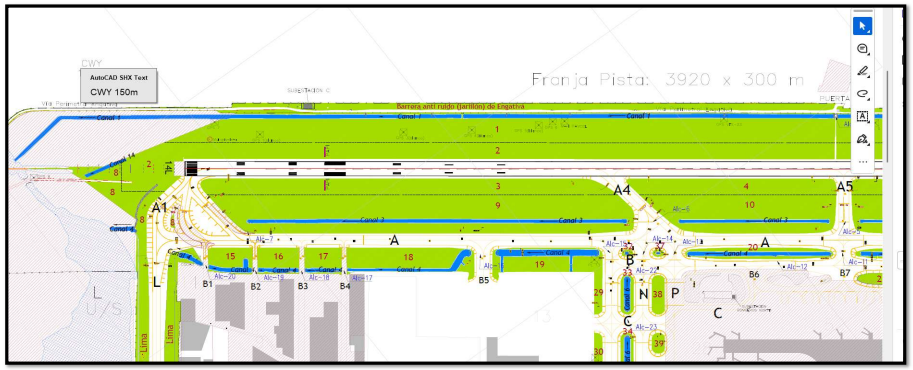

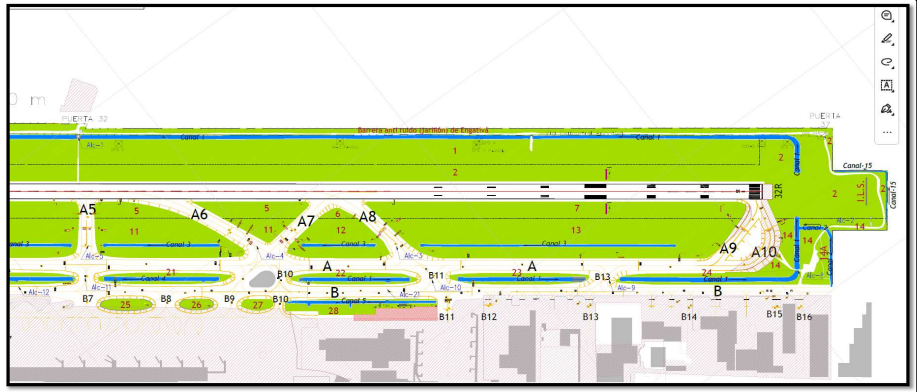

Descripción	Espesor(m)	Area (m2)	Ancho (m)	Cant. Ciclos	Area total
CANTIDAD CONTRACTUAL (ACTA MOD N°2)					33.447.051,81
CANTIDAD A EJECUTAR					
ZONA 2		271140,69		4,00	1.084.562,76
ZONA 3		57473,56		4,00	229.894,25
ZONA 4		29129,67		4,00	116.518,69
ZONA 5		23046,98		4,00	92.187,93
ZONA 6		1998,47		4,00	7.993,90
ZONA 7		51884,14		4,00	207.536,54
ZONA 8		19495,75		3,00	58.487,26
ZONA 9		122361,80		3,00	367.085,39
ZONA 10		53128,62		3,00	159.385,85
ZONA 11		45945,91		3,00	137.837,73
ZONA 12		23394,87		3,00	70.184,61
ZONA 13		100399,78		3,00	301.199,34
ZONA 14		18782,27		3,00	56.346,81
ZONA 15		7428,95		3,00	22.286,86
ZONA 16		7741,05		3,00	23.223,14
ZONA 17		6891,62		3,00	20.674,87
ZONA 18		21874,92		3,00	65.624,75
ZONA 19		15801,23		3,00	47.403,68
ZONA 20		6836,11		3,00	20.508,32
ZONA 21		6172,71		3,00	18.518,13
ZONA 22		6038,57		3,00	18.115,70
ZONA 23		6236,68		3,00	18.710,03
ZONA 24		9125,21		3,00	27.375,62
ZONA 25		4290,52		3,00	12.871,56
ZONA 26		2641,09		3,00	7.923,27
ZONA 27		2518,37		3,00	7.555,10
ZONA 28		10078,27		3,00	30.234,80
ZONA 29		2930,44		3,00	8.791,31
ZONA 30		3455,65		3,00	10.366,94
ZONA 31		758,59		3,00	2.275,76
ZONA 32		381,57		3,00	1.144,70
ZONA 33		2046,70		3,00	6.140,10

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL


AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL


CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024

FECHA	DD	7	MM	7	A	26	ACTA No.	3	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	2

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTÁ (VF)				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024	NIT O C.C.	901.901.506-1	CONTRATO N°	24001269 H4 DE 2024
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER-AEROPUERTO	NIT O C.C.	901.902.218-8	CONTRATO N°	24001358 H3 DE 2024

CAPÍTULO	4	ITEM	4.1	ACTIVIDADES DE ROCERÍA Y/O CORTE DE CESPED DE TODAS LAS ZONAS VERDES DE SEGURIDAD DE LAS PISTAS, CALLES DE RODAJE, CABECERAS, SECTORES DE BORDES DE PISTA, ÁREA VERDE EN UBICACIONES COMO PAPIS, ALS, ILS, RVR, ANTENAS, SEÑALES INDICADORAS DE VIENTO, Y OTROS EQUIPOS DE ZONA DE SEGURIDAD. (INCLUYE RECOLECCIÓN, TRASPORTE, RETIRO DE BASURAS Y DISPOSICIÓN FINAL).	UNID.	M2	UBICACIÓN	AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO	

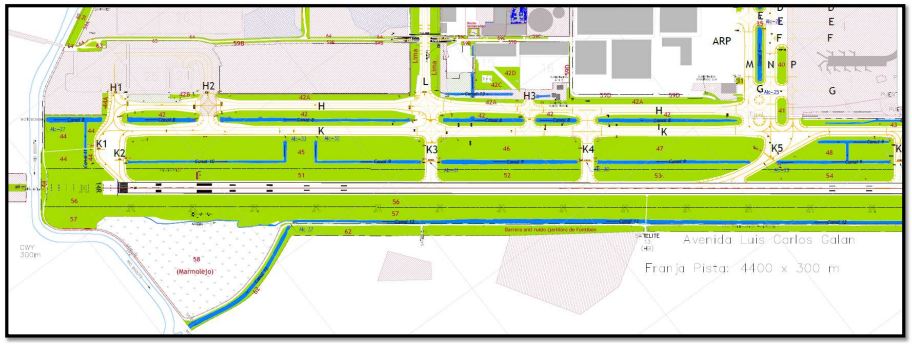

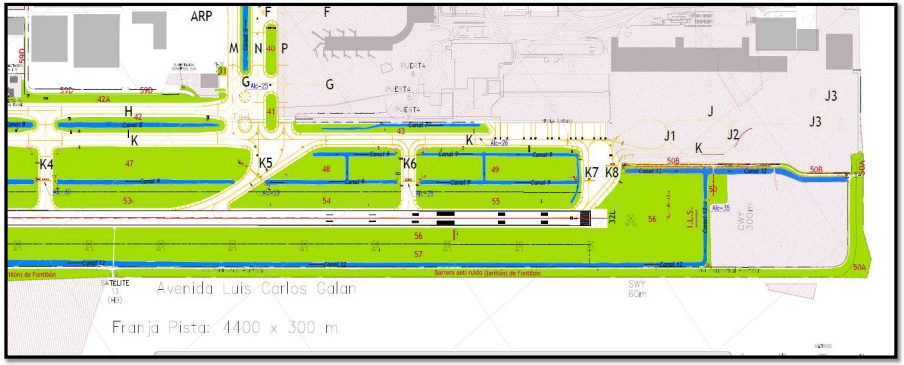

ZONA 34		2576,58		3,00	7.729,74
ZONA 35		4071,31		3,00	12.213,92
ZONA 37		413,02		3,00	1.239,06
ZONA 38		4042,08		3,00	12.126,25
ZONA 39		2014,16		3,00	6.042,47
ZONA 40		5501,81		3,00	16.505,43
ZONA 41		3781,97		3,00	11.345,91
ZONA 42		79142,29		3,00	237.426,87
ZONA 42A		42045,62		3,00	126.136,85
ZONA 42B		1709,98		3,00	5.129,94
ZONA 43		15285,27		3,00	45.855,82
ZONA 44		44506,59		3,00	133.519,77
ZONA 44A		2119,95		3,00	6.359,85
ZONA 45		142991,72		3,00	428.975,16
ZONA 46		68051,03		3,00	204.153,10
ZONA 47		81113,96		3,00	243.341,89
ZONA 48		44844,53		3,00	134.533,58
ZONA 49		62465,96		3,00	187.397,88
ALS SUR		17341,81		3,00	52.025,44
ALS NORTE		4582,13		3,00	13.746,38
LIMA HOTEL		49549,57		3,00	148.648,70
ZONA 51		59773,10		4,00	239.092,40
ZONA 52		28624,71		4,00	114.498,86
ZONA 53		25237,58		4,00	100.950,32
ZONA 54		28358,54		4,00	113.434,17
ZONA 55		27802,92		4,00	111.211,68
ZONA 56		326942,65		4,00	1.307.770,60
				TOTAL AREA	7.280.377,74

CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR	40.727.429,55
CANTIDAD CONTRACTUAL	33.447.051,81
CANTIDAD A AUMENTAR	7.280.377,74

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024


FECHA	DD	7	MM	7	A	26	ACTA No.	3	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTÁ (VF)			
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3	
CONTRATISTA	CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024	NIT O C.C.	901.901.506-1	CONTRATO N° 24001269 H4 DE 2024
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER-AEROPUERTO	NIT O C.C.	901.902.218-8	CONTRATO N° 24001358 H3 DE 2024

CAPÍTULO	4	ITEM	4.1	ACTIVIDADES DE ROCERÍA Y/O CORTE DE CESPED DE TODAS LAS ZONAS VERDES DE SEGURIDAD DE LAS PISTAS, CALLES DE RODAJE, CABECERAS, SECTORES DE BORDES DE PISTA, ÁREA VERDE EN UBICACIONES COMO PAPIS, ALS, ILS, RVR, ANTENAS, SEÑALES INDICADORAS DE VIENTO, Y OTROS EQUIPOS DE ZONA DE SEGURIDAD. (INCLUYE RECOLECCIÓN, TRASPORTE, RETIRO DE BASURAS Y DISPOSICIÓN FINAL).	UNID.	M2	UBICACIÓN	AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO

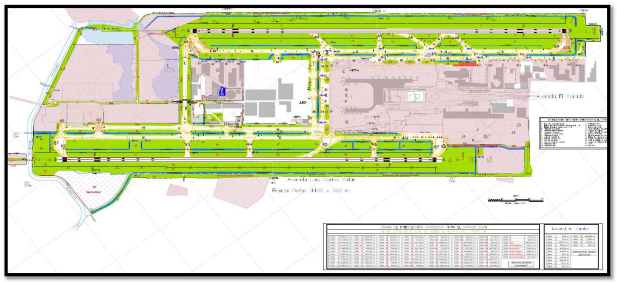

REGISTRO FOTOGRAFICO

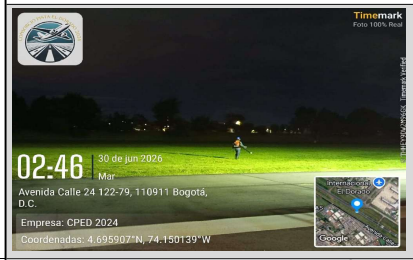



Sub-Total	7.280.377,74
TOTAL	7.280.377,74

ELABORO	APROBO

Residente de Obra: _____
Ing . Luis Felipe Vallejo

Director de Obra: _____
Ing . Yessica Andrea Ortiz

Residente de interventoria: _____
Ing . Wilmer Riaño

Director de interventoria: _____
Ing. Juan David Aldana

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024

FECHA	DD	7	MM	7	A	26	ACTA No.	3	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	2

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTÁ (VF)				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024	NIT O C.C.	901.901.506-1	CONTRATO N°	24001269 H4 DE 2024
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER-AEROPUERTO	NIT O C.C.	901.902.218-8	CONTRATO N°	24001358 H3 DE 2024

CAPÍTULO	4	ITEM	4.2	ACTIVIDADES DE ROCERÍA Y/O CORTE DE CESPED DE TODAS LAS ZONAS VERDES, ENTRE LAS ZONAS DE SEGURIDAD Y LAS ZONAS PERIMETRALES DEL AEROPUERTO (CERRAMIENTOS), INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A BARRERAS DE RUIDO, DEPRIMIDO VIAL, TALUDES, CANALES, BORDES DE VÍAS DE SERVICIO (INCLUYE BARRIDO, RETIRO DE BASURAS Y DISPOSICIÓN FINAL).	UNID.	M2	UBICACIÓN	AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO

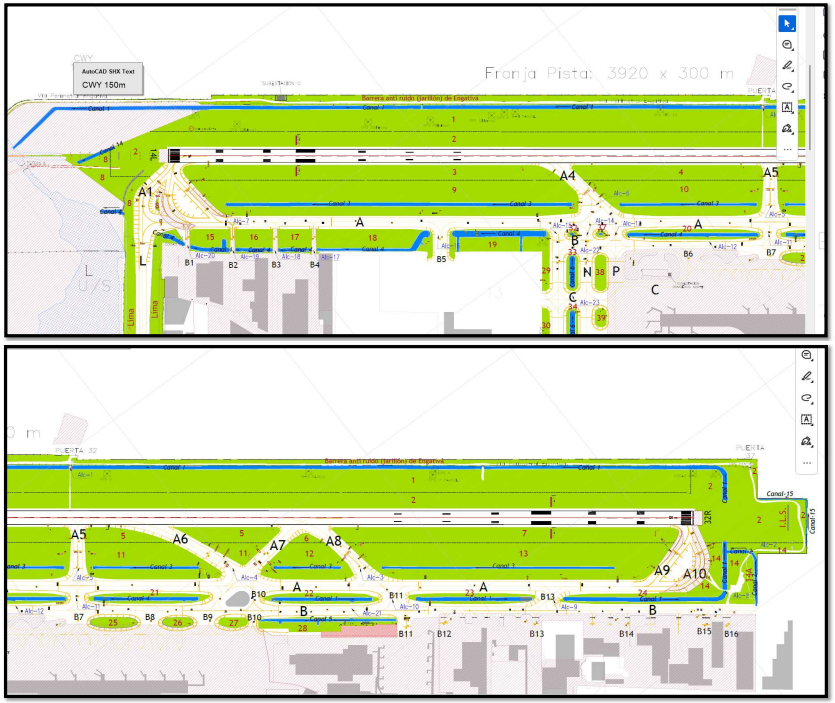

Descripción	Espesor(m)	Area (m2)	Ancho (m)	Cant. Ciclos	Area total
CANTIDAD CONTRACTUAL (ACTA MOD N°2)					**17.676.688,78**
CANTIDAD A EJECUTAR					
ZONA 1		284154,17		3,00	852.462,51
ZONA 14A		7882,31		3,00	23.646,93
ZONA 42C		8182,22		3,00	24.546,66
ZONA 42D		5282,36		3,00	15.847,09
ZONA LOTE HB		59465,66		3,00	178.396,98
ZONA 50		10566,33		3,00	31.699,00
ZONA 50A		12496,02		3,00	37.488,06
ZONA 50B		6404,12		3,00	19.212,36
ZONA 57		226621,89		3,00	679.865,67
ZONA 58		201082,04		1,00	201.082,04
ZONA 59		5510,23		3,00	16.530,69
ZONA 59A		127,97		3,00	383,90
ZONA 59B		6033,73		3,00	18.101,20
ZONA 59C		2932,26		3,00	8.796,78
ZONA 59D		2625,25		3,00	7.875,74
ZONA 60		24075,51		3,00	72.226,52
ZONA 60A		884,52		3,00	2.653,55
ZONA 61		16828,03		3,00	50.484,08
ZONA 61A		1326,12		3,00	3.978,35
ZONA 62		30727,75		3,00	92.183,26
ZONA 63		2309,89		3,00	6.929,67

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024

FECHA	DD	7	MM	7	A	26	ACTA No.	3	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	2

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTÁ (VF)				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024	NIT O C.C.	901.901.506-1	CONTRATO N°	24001269 H4 DE 2024
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER-AEROPUERTO	NIT O C.C.	901.902.218-8	CONTRATO N°	24001358 H3 DE 2024

CAPÍTULO	4	ITEM	4.2	ACTIVIDADES DE ROCERÍA Y/O CORTE DE CESPED DE TODAS LAS ZONAS VERDES, ENTRE LAS ZONAS DE SEGURIDAD Y LAS ZONAS PERIMETRALES DEL AEROPUERTO (CERRAMIENTOS), INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A BARRERAS DE RUIDO, DEPRIMIDO VIAL, TALUDES, CANALES, BORDES DE VÍAS DE SERVICIO (INCLUYE BARRIDO, RETIRO DE BASURAS Y DISPOSICIÓN FINAL).	UNID.	M2	UBICACIÓN	AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO	

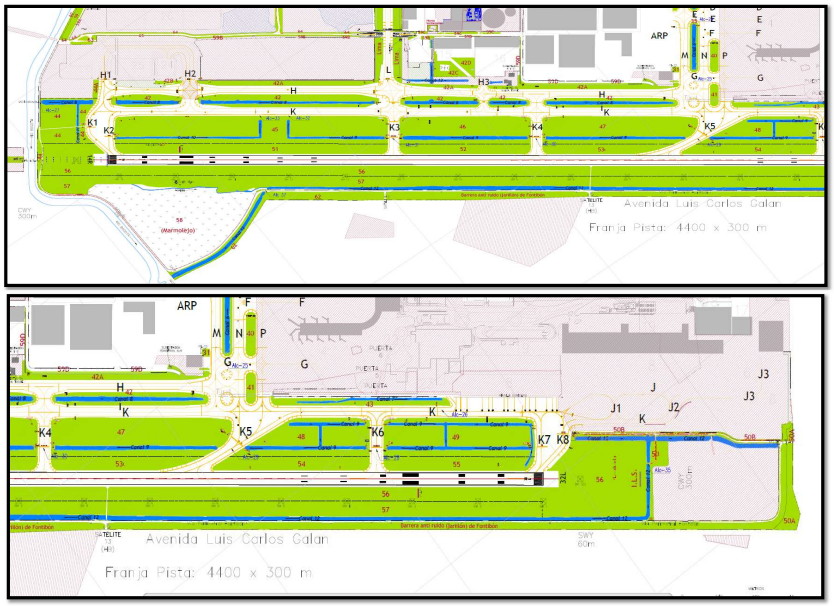

ZONA 64		6116,19		3,00	18.348,58
ZONA 65		954,63		3,00	2.863,89
ZONA 66		18147,30		3,00	54.441,90
J ENGATIVA		68940,77		3,00	206.822,31
J. FONTIBON		113405,48		3,00	340.216,45
INCINERADOR		851,18		3,00	2.553,53
				TOTAL AREA	2.969.637,69
			CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR		20.646.326,47
			CANTIDAD CONTRACTUAL		17.676.688,78
			CANTIDAD A AUMENTAR		2.969.637,69

REGISTRO FOTOGRAFICO





Sub-Total	2.969.637,69
TOTAL	2.969.637,69

ELABORO	APROBO

Residente de Obra: _____
Ing . Luis Felipe Vallejo

Director de Obra: _____
Ing . Yessica Andrea Ortiz

Residente de interventoria: _____
Ing . Wilmer Riaño

Director de interventoria: _____
Ing. Juan David Aldana

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024

FECHA	DD	7	MM	7	A	26	ACTA No.	3	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTÁ (VF)			
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3	
CONTRATISTA	CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024	NIT O C.C.	901.901.506-1	CONTRATO N° 24001269 H4 DE 2024
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER-AEROPUERTO	NIT O C.C.	901.902.218-8	CONTRATO N° 24001358 H3 DE 2024

CAPÍTULO	4	ITEM	4.4	TALA, CARGUE Y RETIRO DE ÁRBOLES DE ALTURA NO MAYOR A 20 M Y DIÁMETROS MENORES A 0.40 M. INCLUYE TROZADO, CHIPIADO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL RESULTANTE.	UNID.	UND	UBICACIÓN	AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO







Foto 1. Vista general del individuo | Foto 2. Vista detalle del individuo


Foto 3. Vista general del individuo | Foto 4. Vista detalle del individuo


Foto 5. Vista general del individuo | Foto 6. Vista detalle del individuo


Foto 7. Vista general del individuo volcado | Foto 8. Vista detalle del individuo


Foto 17. Vista general del individuo | Foto 18. Vista detalle del individuo



Descripcion	Espesor(m)	Long (m)	Ancho (m)	Cant.	Cantidad total
CANTIDAD CONTRACTUAL (ACTA MOD N°2)	N/A	N/A	N/A		60,00
CANTIDAD A EJECUTAR					
4,1046-acacia negra -Acacia decurrens-Perimetro Fontibón	N/A	N/A	N/A	1,00	1,00
NN2-acacia negra -Acacia decurrens-Perimetro Fontibón	N/A	N/A	N/A	1,00	1,00
NN3-acacia negra -Acacia decurrens-Perimetro Fontibón	N/A	N/A	N/A	1,00	1,00
NN4-acacia negra -Acacia decurrens-Perimetro Fontibón	N/A	N/A	N/A	1,00	1,00
5585-acacia negra -Acacia decurrens-Perimetro Fontibón HB	N/A	N/A	N/A	1,00	1,00
263-Sauco -Sambucus nigra-Jarillón de Engativá	N/A	N/A	N/A	1,00	1,00
E.M 995-Acacia Dealbata-Acacia Dealbata-entre Mallas	N/A	N/A	N/A	1,00	1,00
E.M 992-Acacia Dealbata-Acacia Dealbata-entre Mallas	N/A	N/A	N/A	1,00	1,00
E.M 995-Acacia Dealbata-Acacia Dealbata-entre Mallas	N/A	N/A	N/A	1,00	1,00
E.M 992-Acacia Dealbata-Acacia Dealbata-entre Mallas	N/A	N/A	N/A	1,00	1,00
E.M 982-Acacia Dealbata-Acacia Dealbata-entre Mallas	N/A	N/A	N/A	1,00	1,00
E.M 979-Acacia Dealbata-Acacia Dealbata-entre Mallas	N/A	N/A	N/A	1,00	1,00
E.M 978-Acacia Dealbata-Acacia Dealbata-entre Mallas	N/A	N/A	N/A	1,00	1,00
3,519-Pino Cipres--Perimetro Engativá	N/A	N/A	N/A	1,00	1,00
				TOTAL AREA	14,00

CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR	74,00
CANTIDAD CONTRACTUAL	60,00
CANTIDAD A AUMENTAR	14,00

REGISTRO FOTOGRAFICO



Sub-Total	14,00
TOTAL	14,00

ELABORO	APROBO

Residente de Obra: _____ Ing . Luis Felipe Vallejo

Director de Obra: _____ Ing . Yessica Andrea Ortiz

Residente de interventoria: _____ Ing . Wilmer Riaño

Director de interventoria: _____ Ing. Juan David Aldana

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024

FECHA	DD	7	MM	7	A	26	ACTA No.	3	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTÁ (VF)				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024	NIT O C.C.	901.901.506-1	CONTRATO N°	24001269 H4 DE 2024
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER-AEROPUERTO	NIT O C.C.	901.902.218-8	CONTRATO N°	24001358 H3 DE 2024

CAPÍTULO	8	ITEM	8.1	REMOCIÓN DE MATERIALES SEDIMENTADOS, RECONFORMACIÓN DE PENDIENTES, LIMPIEZA DE LODOS Y ARENAS, CONTROL DE VEGETACIÓN DE CANALES DE DRENAJE, ENCOLES Y DESCOLES. (INCLUYE MATERIALES PARA RECONFORMACIÓN, Y RETIRO DE BASURAS, SEDIMENTOS Y DISPOSICIÓN FINAL - RECONFORMACION DE TALUDES	UNID.	ML	UBICACIÓN	AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO

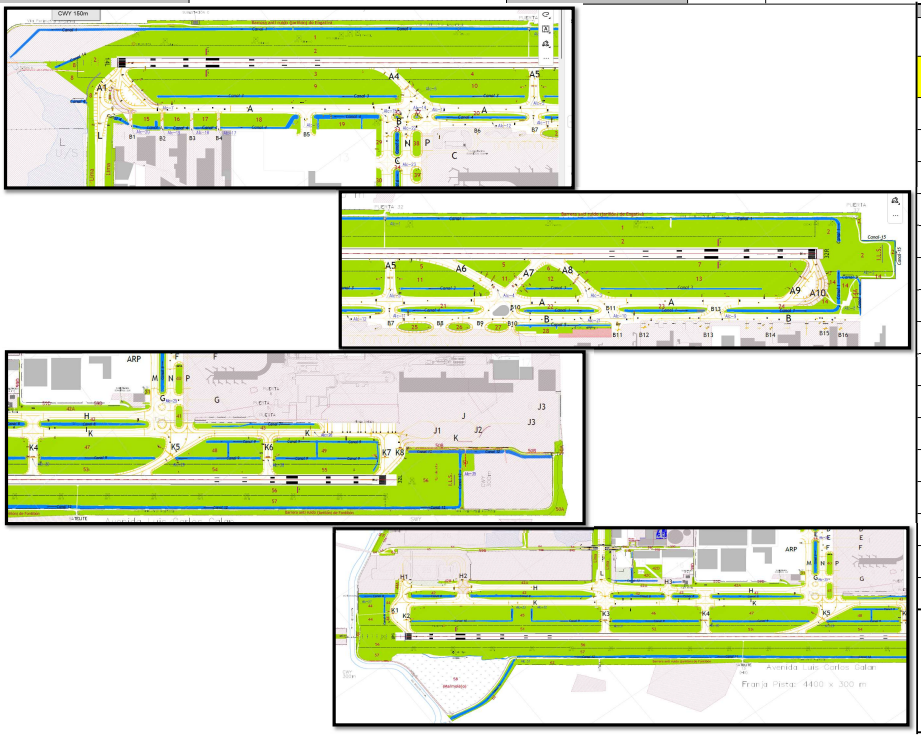

Descripción	Espesor(m)	Long (m)	Ancho (m)	Cant. Ciclos	Longitud total
CANTIDAD CONTRACTUAL (ACTA MOD N°2)					239.489,00
CANTIDAD A EJECUTAR					
CANAL 1		5240,00		2,00	10.480,00
CANAL 2		241,90		2,00	483,80
CANAL 3		2805,18		2,00	5.610,35
CANAL 4		2083,16		2,00	4.166,32
CANAL 5		443,16		2,00	886,32
CANAL 6		483,70		2,00	967,39
CANAL 7		562,10		2,00	1.124,20
CANAL 8		2357,04		2,00	4.714,08
CANAL 9		3856,05		2,00	7.712,10
CANAL 10		725,52		2,00	1.451,04
CANAL 11		190,20		2,00	380,40
CANAL 12		4354,69		2,00	8.709,39
CANAL 13		42,80		2,00	85,60
CANAL 14		128,24		2,00	256,48
CANAL 15		296,81		2,00	593,61
				TOTAL AREA	47.621,08

CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR	287.110,08
CANTIDAD CONTRACTUAL	239.489,00
CANTIDAD A AUMENTAR	47.621,08

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024

FECHA	DD	7	MM	7	A	26	ACTA No.	3	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	2

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTÁ (VF)				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024	NIT O C.C.	901.901.506-1	CONTRATO N°	24001269 H4 DE 2024
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER-AEROPUERTO	NIT O C.C.	901.902.218-8	CONTRATO N°	24001358 H3 DE 2024


CAPÍTULO	8	ITEM	8.1	REMOCIÓN DE MATERIALES SEDIMENTADOS, RECONFORMACIÓN DE PENDIENTES, LIMPIEZA DE LODOS Y ARENAS, CONTROL DE VEGETACIÓN DE CANALES DE DRENAJE, ENCOLES Y DESCOLES. (INCLUYE MATERIALES PARA RECONFORMACIÓN, Y RETIRO DE BASURAS, SEDIMENTOS Y DISPOSICIÓN FINAL - RECONFORMACION DE TALUDES	UNID.	ML	UBICACIÓN	AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO



Longitud de Canales

CANAL 1	5240 ml		CANAL 12	4354.694 ml	
CANAL 2	241.9 ml		CANAL 13	42.802 ml	
CANAL 3	2805.177 ml		CANAL 14	128.241 ml	
CANAL 4	2083.16 ml		CANAL 15	296.8 ml	
CANAL 5	443.158 ml				
CANAL 6	483.695 ml		LONGITUD TOTAL CANALES		
CANAL 7	562.1 ml		23810.537 ML		
CANAL 8	2357.04 ml				
CANAL 9	3856.05 ml				
CANAL 10	725.52 ml				
CANAL 11	190.2 ml				

REGISTRO FOTOGRAFICO







Sub-Total	47.621,08
TOTAL	47.621,08

ELABORO	APROBO

Residente de Obra: _____
Ing . Luis Felipe Vallejo

Director de Obra: _____
Ing . Yessica Andrea Ortiz

Residente de interventoria: _____
Ing . Wilmer Riaño

Director de interventoria: _____
Ing. Juan David Aldana

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024

FECHA	DD	7	MM	7	A	26	ACTA No.	3	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	2

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTÁ (VF)				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024	NIT O C.C.	901.901.506-1	CONTRATO N°	24001269 H4 DE 2024
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER-AEROPUERTO	NIT O C.C.	901.902.218-8	CONTRATO N°	24001358 H3 DE 2024

CAPÍTULO	8	ITEM	8.2	REMOCIÓN DE MATERIALES SEDIMENTADOS, RECONFORMACIÓN DE PENDIENTES, LIMPIEZA DE LODOS Y ARENAS, CONTROL DE VEGETACIÓN DE CUNETA DE DRENAJE EN PERIMETRALES, ENCOLES Y DESCOLES, RECONFORMACION DE TALUDES (INCLUYE MATERIALES PARA RECONFORMACIÓN, Y RETIRO DE BASURAS, SEDIMENTOS Y DISPOSICIÓN FINAL.	UNID.	ML	UBICACIÓN	AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO

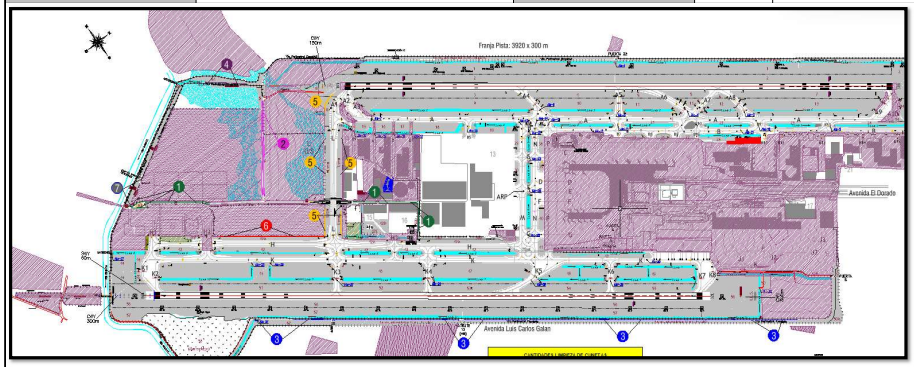

Descripción	Espesor(m)	Long (m)	Ancho (m)	Cant. Ciclos	Longitud total
CANTIDAD CONTRACTUAL (ACTA MOD N°2)					41.044,00
CANTIDAD A EJECUTAR					
SECTOR 1		2576,52		2,00	5.153,03
SECTOR 2		1256,20		1,00	1.256,20
SECTOR 3		3685,00		1,00	3.685,00
SECTOR 4		290,00		1,00	290,00
SECTOR 5		1547,55		1,00	1.547,55
SECTOR 6		764,42		1,00	764,42
SECTOR 7		233,80		1,00	233,80
				TOTAL AREA	12.930,00

CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR	53.974,00
CANTIDAD CONTRACTUAL	41.044,00
CANTIDAD A AUMENTAR	12.930,00

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL


AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024

FECHA	DD	7	MM	7	A	26	ACTA No.	3	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	2

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTÁ (VF)				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024	NIT O C.C.	901.901.506-1	CONTRATO N°	24001269 H4 DE 2024
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER-AEROPUERTO	NIT O C.C.	901.902.218-8	CONTRATO N°	24001358 H3 DE 2024

CAPÍTULO	8	ITEM	8.2	DESCRIPCIÓN	UNID.	ML	UBICACIÓN	AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO
				REMOCIÓN DE MATERIALES SEDIMENTADOS, RECONFORMACIÓN DE PENDIENTES, LIMPIEZA DE LODOS Y ARENAS, CONTROL DE VEGETACIÓN DE CUNETA DE DRENAJE EN PERIMETRALES, ENCOLES Y DESCOLES, RECONFORMACION DE TALUDES (INCLUYE MATERIALES PARA RECONFORMACIÓN, Y RETIRO DE BASURAS, SEDIMENTOS Y DISPOSICIÓN FINAL.				

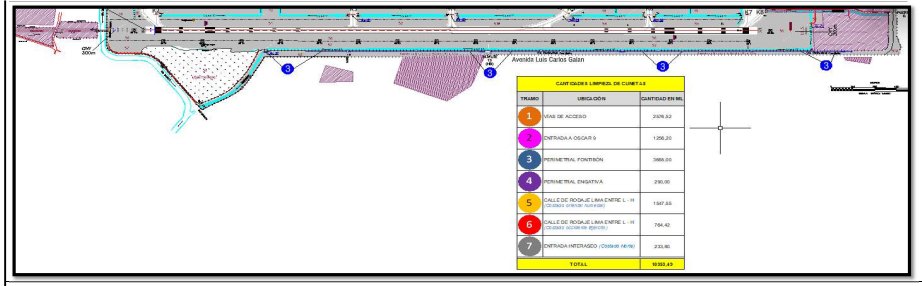

REGISTRO FOTOGRAFICO





Sub-Total	12.930,00
TOTAL	12.930,00

ELABORO	APROBO

Residente de Obra: _____
Ing . Luis Felipe Vallejo

Director de Obra: _____
Ing . Yessica Andrea Ortiz

Residente de interventoria: _____
Ing . Wilmer Riaño

Director de interventoria: _____
Ing. Juan David Aldana

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024

FECHA	DD	7	MM	7	A	26	ACTA No.	3	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTÁ (VF)			
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3	
CONTRATISTA	CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024	NIT O C.C.	901.901.506-1	CONTRATO N° 24001269 H4 DE 2024
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER-AEROPUERTO	NIT O C.C.	901.902.218-8	CONTRATO N° 24001358 H3 DE 2024

CAPÍTULO	8	ITEM	8.3 NP	EXCAVACION MANUAL Y CONFORMACIÓN PARA OBRAS DE ARTE(CUNETAS,DISIPADORES DE ENERGIA, BADEN,ETC), DISPOSICION DE MATERIAL (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 8 KM)	UNID.	ML	UBICACIÓN	AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO

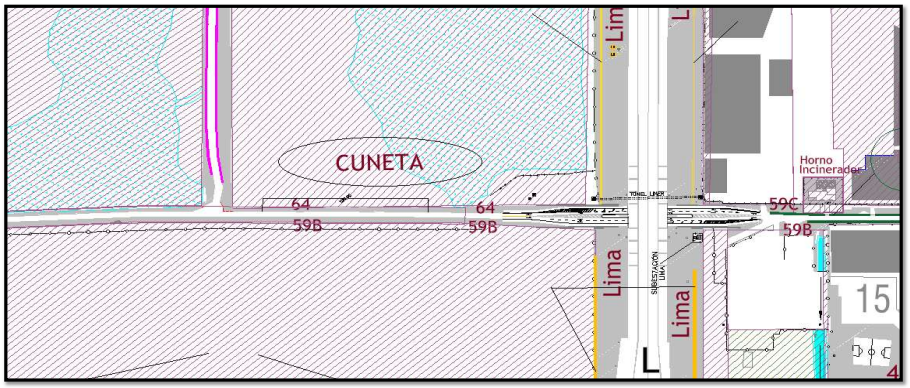

Descripción	Espesor(m)	Long (m)	Ancho (m)	Cant.	Longitud total
CANTIDAD A EJECUTAR					
CUNETA VIA PAVIMENTADA ENTRE DEPRIMIDO LIMA Y ACCESO A OSCAR 9		150,00		1,00	150,00
				TOTAL AREA	150,00
			CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR		150,00
			CANTIDAD CONTRACTUAL		-
			CANTIDAD A AUMENTAR		150,00

REGISTRO FOTOGRAFICO



Sub-Total	150,00
TOTAL	150,00

ELABORO	APROBO

Residente de Obra: _____
Ing . Luis Felipe Vallejo

Director de Obra: _____
Ing . Yessica Andrea Ortiz

Residente de interventoria: _____
Ing . Wilmer Riaño

Director de interventoria: _____
Ing. Juan David Aldana

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024

FECHA	DD	7	MM	7	A	26	ACTA No.	3	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTÁ (VF)			
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3	
CONTRATISTA	CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024	NIT O C.C.	901.901.506-1	CONTRATO N° 24001269 H4 DE 2024
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER-AEROPUERTO	NIT O C.C.	901.902.218-8	CONTRATO N° 24001358 H3 DE 2024

CAPÍTULO	8	ITEM	8.4 NP	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 3000 PSI GRAVA COMUN PARA CUNETA TIPO L REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA ANCHO 0,8 A 1M CON BORDILLO DE 0,2 M";CONCRETO PREPARADO EN SITIO"	UNID.	ML	UBICACIÓN	AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO

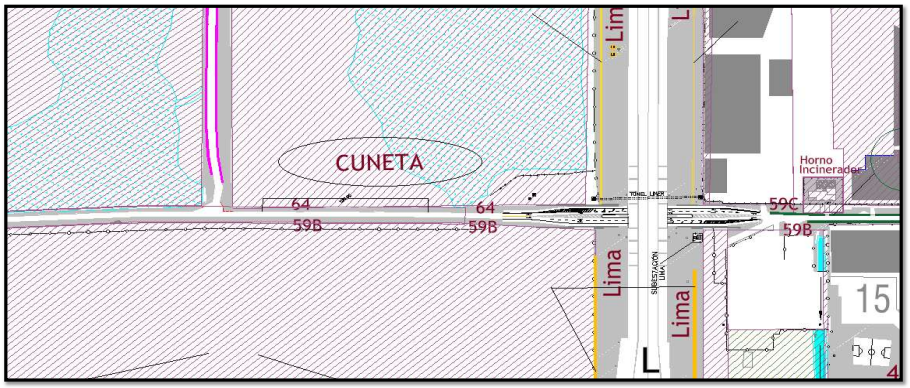

Descripción	Espesor(m)	Long (m)	Ancho (m)	Cant.	Longitud total
CANTIDAD A EJECUTAR					
CUNETA VIA PAVIMENTADA ENTRE DEPRIMIDO LIMA Y ACCESO A OSCAR 9		150,00		1,00	150,00
				TOTAL AREA	150,00
			CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR		150,00
			CANTIDAD CONTRACTUAL		-
			CANTIDAD A AUMENTAR		150,00

REGISTRO FOTOGRAFICO



Sub-Total	150,00
TOTAL	150,00

ELABORO	APROBO

Residente de Obra: _____
Ing . Luis Felipe Vallejo

Director de Obra: _____
Ing . Yessica Andrea Ortiz

Residente de interventoria: _____
Ing . Wilmer Riaño

Director de interventoria: _____
Ing. Juan David Aldana


AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

FECHA	DD	7	MM	7	A	26	ACTA No.	3	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTÁ (VF)				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024	NIT O C.C.	901.901.506-1	CONTRATO N°	24001269 H4 DE 2024
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER-AEROPUERTO	NIT O C.C.	901.902.218-8	CONTRATO N°	24001358 H3 DE 2024

CAPÍTULO	9	ITEM	9.7 NP	DESMONTE DE CERRAMIENTO EXISTENTE HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 2,5 M; INCLUYE (TUBERIA GALVANIZADA, PLATINAS,MALLA ESLABONADA,ANGULOS Y ALAMBRE DE PUAS) Y TRASLADO HASTA CAMPAMENTO.	UNID.	ML	UBICACIÓN	AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO

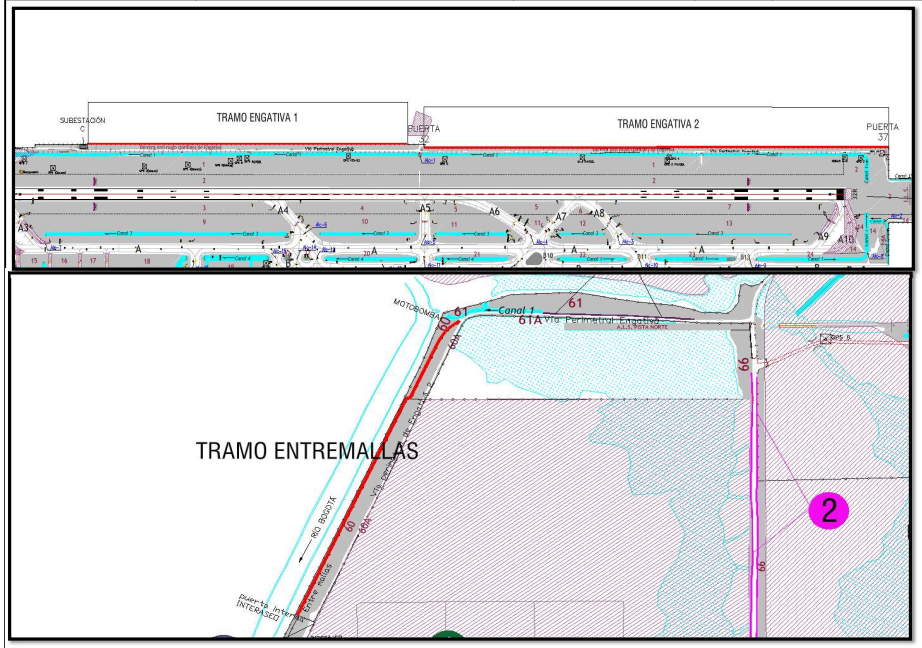

Descripción	Espesor(m)	Long (m)	Ancho (m)	Cant.	Longitud total
CANTIDAD A EJECUTAR					
TRAMO ENGATIVA 1 - PUNTOS ENTRE SUBESTACION C Y SATELITE 32		615,00		1,00	615,00
TRAMO ENGATIVA 2 - PUNTOS ENTRE SATELITE 32 Y SATELITE 37		547,50		1,00	547,50
TRAMO ENTRE MALLAS - DESDE INTERASEO HASTA MOTOBOMBA CANAL 1		975,00		1,00	975,00
CABECERA 32 R		756,00		1,00	756,00
CAMPAMENTO		106,50		1,00	106,50
				TOTAL AREA	3.000,00

CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR	3.000,00
CANTIDAD CONTRACTUAL	-
CANTIDAD A AUMENTAR	3.000,00

REGISTRO FOTOGRAFICO





Sub-Total	3.000,00
TOTAL	3.000,00

ELABORO	APROBO

Residente de Obra: _____
Ing . Luis Felipe Vallejo

Director de Obra: _____
Ing . Yessica Andrea Ortiz

Residente de interventoria: _____
Ing . Wilmer Riaño

Director de interventoria: _____
Ing. Juan David Aldana

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL


AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024

FECHA	DD	7	MM	7	A	26	ACTA No.	3	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTÁ (VF)				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024	NIT O C.C.	901.901.506-1	CONTRATO N°	24001269 H4 DE 2024
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER-AEROPUERTO	NIT O C.C.	901.902.218-8	CONTRATO N°	24001358 H3 DE 2024

CAPÍTULO	9	ITEM	9.8 NP	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ESLABONADA RECUBIERTA EN PVC PARA REEMPLAZO EN TRAMOS DETERIORADOS A UNA ALTURA, NO INCLUYE DESMONTE DE MALLA Y ELEMENTOS EXISTENTES. INCLUYE MALLA ESLABONADA, ANGULO DE 1-1/4" Y PLATINA DE SUJECION.	UNID.	M2	UBICACIÓN	AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO

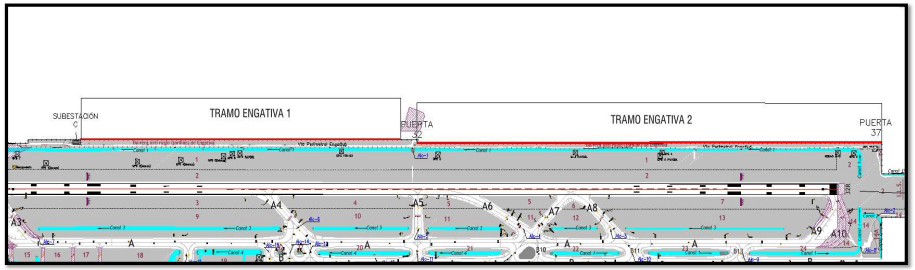

Descripción	Espesor(m)	Long (m)	Alto (m)	Cant.	Longitud total
CANTIDAD A EJECUTAR					
TRAMO ENGATIVA 1 - PUNTOS ENTRE SUBESTACION C Y SATELITE 32		615,00	2,00	1,00	1.230,00
TRAMO ENGATIVA 2 - PUNTOS ENTRE SATELITE 32 Y SATELITE 37		547,50	2,00	1,00	1.095,00
				TOTAL AREA	2.325,00
				CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR	2.325,00
				CANTIDAD CONTRACTUAL	-
				CANTIDAD A AUMENTAR	2.325,00

REGISTRO FOTOGRAFICO





Sub-Total	2.325,00
TOTAL	2.325,00

ELABORO	APROBO

Residente de Obra: _____
Ing . Luis Felipe Vallejo

Director de Obra: _____
Ing . Yessica Andrea Ortiz

Residente de interventoria: _____
Ing . Wilmer Riaño

Director de interventoria: _____
Ing. Juan David Aldana

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL


AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL


CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024

FECHA	DD	7	MM	7	A	26	ACTA No.	3	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTÁ (VF)				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024	NIT O C.C.	901.901.506-1	CONTRATO N°	24001269 H4 DE 2024
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER-AEROPUERTO	NIT O C.C.	901.902.218-8	CONTRATO N°	24001358 H3 DE 2024

CAPÍTULO	9	ITEM	9.9 NP	CONTINUACION VERTICAL A CERRAMIENTO EXISTENTE PARA ALTURA REQUERIDA MAYOR O IGUAL A 5M. INCLUYE CORTE A TUBERIA EXISTENTE, COMPLEMENTO EN TUBERIA GALVANIZADA DE 2", ANGULO, PLATINA,MALLA ESLABONADA, ALAMBRE DE PUAS PARA EMPALME Y SOLDADURA.	UNID.	ML	UBICACIÓN	AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO

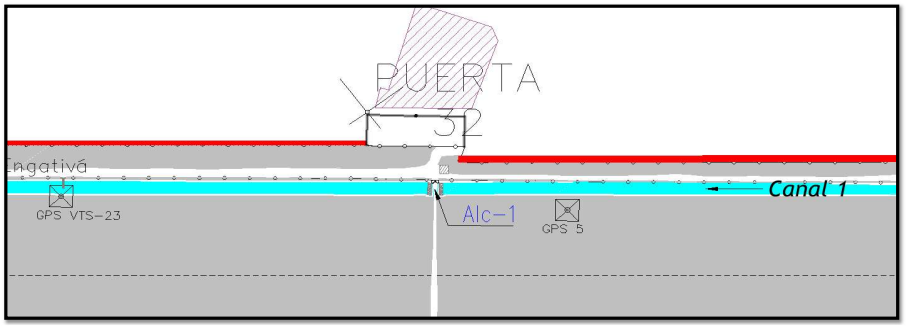



Descripción	Espesor(m)	Long (m)	Alto (m)	Cant.	Longitud total
CANTIDAD A EJECUTAR					
TRAMO ENGATIVA PUERTA SATELITE 32		85,00		1,00	85,00
TRAMO FONTIBON REPARACIONES POR CAIDAS ARBOLES		165,00		1,00	165,00
				TOTAL AREA	250,00
			CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR		250,00
			CANTIDAD CONTRACTUAL		-
			CANTIDAD A AUMENTAR		250,00

REGISTRO FOTOGRAFICO





Sub-Total	250,00
TOTAL	250,00

ELABORO	APROBO
Residente de Obra: Ing . Luis Felipe Vallejo	Director de Obra: Ing . Yessica Andrea Ortiz
Residente de interventoria: Ing . Wilmer Riaño	Director de interventoria: Ing. Juan David Aldana

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024

FECHA	DD	7	MM	7	A	26	ACTA No.	3	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTÁ (VF)			
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3	
CONTRATISTA	CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024	NIT O C.C.	901.901.506-1	CONTRATO N° 24001269 H4 DE 2024
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER-AEROPUERTO	NIT O C.C.	901.902.218-8	CONTRATO N° 24001358 H3 DE 2024

CAPÍTULO	9	ITEM	9.10 NP	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA; PARA CERRAMIENTOS A UNA ALTURA MAXIMO 2.5 M (INCLUYE LA PINTURA PARA TUBERIA, ANGULOS Y MALLA).	UNID.	ML	UBICACIÓN	AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO



Descripción	Espesor(m)	Long (m)	Alto (m)	Cant.	Longitud total
CANTIDAD A EJECUTAR					
TRAMO ENGATIVA - CERRAMIENTO INTERNO ENTRE SUBESTACION C Y PUERTA 37		3300,00		1,00	3.300,00
				TOTAL AREA	3.300,00
			CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR		3.300,00
			CANTIDAD CONTRACTUAL		-
			CANTIDAD A AUMENTAR		3.300,00

REGISTRO FOTOGRAFICO





Sub-Total	3.300,00
TOTAL	3.300,00

ELABORO	APROBO

Residente de Obra: _____
Ing . Luis Felipe Vallejo

Director de Obra: _____
Ing . Yessica Andrea Ortiz

Residente de interventoria: _____
Ing . Wilmer Riaño

Director de interventoria: _____
Ing. Juan David Aldana

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024

FECHA	DD	7	MM	7	A	26	ACTA No.	3	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTÁ (VF)				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024	NIT O C.C.	901.901.506-1	CONTRATO N°	24001269 H4 DE 2024
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER-AEROPUERTO	NIT O C.C.	901.902.218-8	CONTRATO N°	24001358 H3 DE 2024

CAPÍTULO	9	ITEM	9.11 NP	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS PARA CERRAMIENTO 1:4 e=HASTA 0,03 PARA CERRAMIENTO 1 CARA "INCLUYE FILOS Y DILATACIONES" DE 10 CM A 0,60 CM	UNID.	ML	UBICACIÓN	AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO



Descripción	Espesor(m)	Long (m)	Alto (m)	Cant.	Longitud total
CANTIDAD A EJECUTAR					
TRAMO ENGATIVA - CERRAMIENTO EXTERNO ENTRE SUBESTACION C Y PUERTA 37		500,00		1,00	500,00
				TOTAL AREA	500,00

CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR	500,00
CANTIDAD CONTRACTUAL	-
CANTIDAD A AUMENTAR	500,00

REGISTRO FOTOGRAFICO





Sub-Total	500,00
TOTAL	500,00

ELABORO	APROBO

Residente de Obra: _____
Ing . Luis Felipe Vallejo

Director de Obra: _____
Ing . Yessica Andrea Ortiz

Residente de interventoria: _____
Ing . Wilmer Riaño

Director de interventoria: _____
Ing. Juan David Aldana

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL


CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024

FECHA	DD	7	MM	7	A	26	ACTA No.	3	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTÁ (VF)				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024	NIT O C.C.	901.901.506-1	CONTRATO N°	24001269 H4 DE 2024
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER-AEROPUERTO	NIT O C.C.	901.902.218-8	CONTRATO N°	24001358 H3 DE 2024

CAPÍTULO	10	ITEM	10.1	LIMPIEZA DE MALEZA Y VEGETACIÓN DE LOS BORDES DE LAS VÍAS PERIMETRALES Y DE ACCESO (INCLUYE EL EQUIPO, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL A SITIO AUTORIZADO)	UNID.	ML	UBICACIÓN	AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO

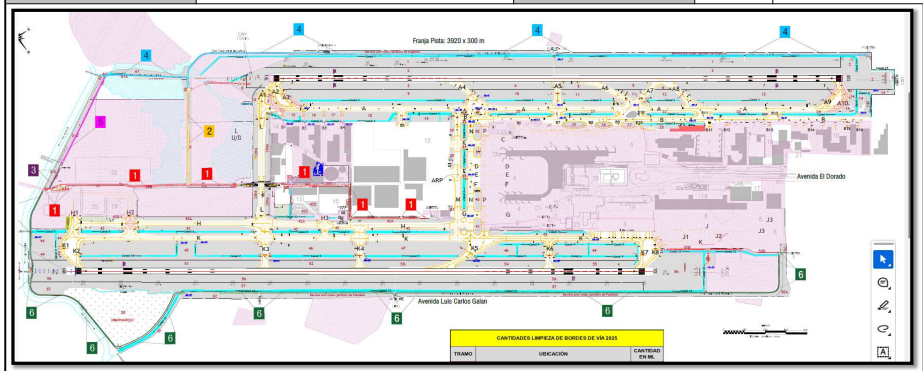

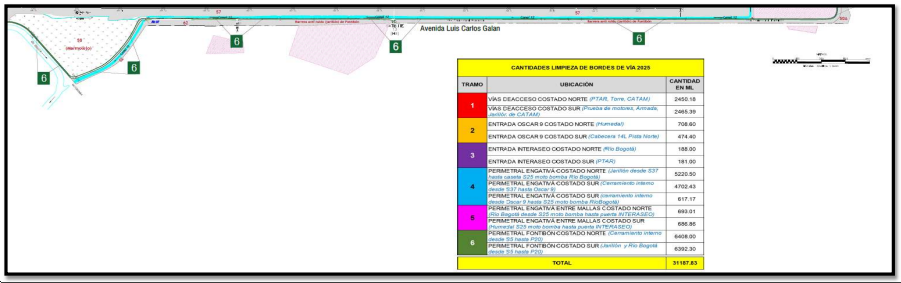

Descripción	Espesor(m)	Long (m)	Ancho (m)	Cant. Ciclos	Longitud total
CANTIDAD CONTRACTUAL (ACTA MOD N°2)					152.100,00
CANTIDAD A EJECUTAR					
SECTOR 4: PERIMETRAL ENGATIVÁ COSTADO NORTE (Jarillón desde S37 hasta caseta S25 moto bomba Río Bogotá)		5220,50		1,00	5.220,50
SECTOR 4: PERIMETRAL ENGATIVÁ COSTADO SUR (Cerramiento interno desde S37 hasta Oscar 9)		4702,40		1,00	4.702,40
SECTOR 6: PERIMETRAL FONTIBÓN COSTADO NORTE (Cerramiento interno desde S5 hasta P20)		6408,00		1,00	6.408,00
SECTOR 6: PERIMETRAL FONTIBÓN COSTADO SUR (Jarillón y Río Bogotá desde S5 hasta P20)		6392,30		1,00	6.392,30
				TOTAL AREA	22.723,20

CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR	174.823,20
CANTIDAD CONTRACTUAL	152.100,00
CANTIDAD A AUMENTAR	22.723,20

REGISTRO FOTOGRAFICO



Sub-Total	22.723,20
TOTAL	22.723,20

ELABORO	APROBO
Residente de Obra: Ing . Luis Felipe Vallejo	Director de Obra: Ing . Yessica Andrea Ortiz
Residente de interventoria: Ing . Wilmer Riaño	Director de interventoria: Ing. Juan David Aldana


AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

FECHA	DD	7	MM	7	A	26	ACTA No.	3	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTÁ (VF)				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024	NIT O C.C.	901.901.506-1	CONTRATO N°	24001269 H4 DE 2024
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER-AEROPUERTO	NIT O C.C.	901.902.218-8	CONTRATO N°	24001358 H3 DE 2024

CAPÍTULO	10	ITEM	10.3 NP	REVEGETALIZACION DE MUROS EN TIERRA ARMADA	UNID.	M2	UBICACIÓN	AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO

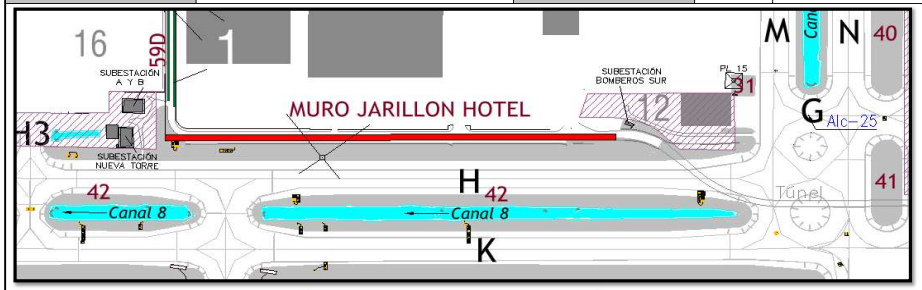

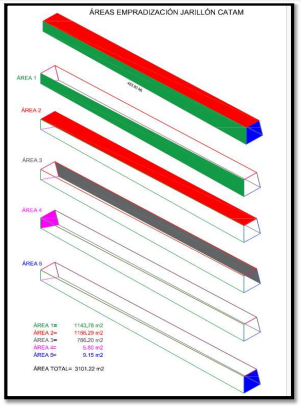

Descripción	Espesor(m)	Area (m2)	Alto (m)	Cant.	Longitud total
CANTIDAD A EJECUTAR					
AREA 1		1143,78		1,00	1.143,78
AREA 2		1156,29		1,00	1.156,29
AREA 3		786,20		1,00	786,20
AREA 4		5,80		1,00	5,80
AREA 5		9,15		1,00	9,15
AJUSTE		0,78		1,00	0,78
				TOTAL AREA	3.102,00
			CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR		3.102,00
			CANTIDAD CONTRACTUAL		-
			CANTIDAD A AUMENTAR		3.102,00

REGISTRO FOTOGRAFICO





Sub-Total	3.102,00
TOTAL	3.102,00

ELABORO	APROBO
Residente de Obra: Ing . Luis Felipe Vallejo	Director de Obra: Ing . Yessica Andrea Ortiz
Residente de interventoria: Ing . Wilmer Riaño	Director de interventoria: Ing. Juan David Aldana


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL


AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL


FECHA	DD	7	MM	7	A	26	ACTA No.	3	ELABORO	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTÁ (VF)				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024	NIT O C.C.	901.901.506-1	CONTRATO N°	24001269 H4 DE 2024
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER-AEROPUERTO	NIT O C.C.	901.902.218-8	CONTRATO N°	24001358 H3 DE 2024

CAPÍTULO	10	ITEM	10.4 NP	LIMPIEZA DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL EN VÍAS PERIMETRALES Y DE ACCESO	UNID.	UND	UBICACIÓN	AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO







Descripción	Espesor(m)	Long (m)	Alto (m)	Cant.	Cantidad total
CANTIDAD A EJECUTAR					
VIA PERIMETRAL ENGATIVA				17,00	17,00
VIA PERIMETRAL FONTIBON				44,00	44,00
VIAS DE ACCESO				25,00	25,00
OTRA SEÑALES				14,00	14,00
				TOTAL AREA	100,00

CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR	100,00
CANTIDAD CONTRACTUAL	-
CANTIDAD A AUMENTAR	100,00

REGISTRO FOTOGRAFICO





Sub-Total	100,00
TOTAL	100,00

ELABORO	APROBO

Residente de Obra: _____
Ing . Luis Felipe Vallejo

Director de Obra: _____
Ing . Yessica Andrea Ortiz

Residente de interventoria: _____
Ing . Wilmer Riaño

Director de interventoria: _____
Ing. Juan David Aldana

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL


AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024

FECHA	DD	7	MM	7	A	26	ACTA No.	3	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTÁ (VF)				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024	NIT O C.C.	901.901.506-1	CONTRATO N°	24001269 H4 DE 2024
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER-AEROPUERTO	NIT O C.C.	901.902.218-8	CONTRATO N°	24001358 H3 DE 2024

CAPÍTULO	10	ITEM	10.5 NP	LIMPIEZA DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL EN VÍAS PERIMETRALES Y DE ACCESO; DEFENSA METALICA	UNID.	ML	UBICACIÓN	AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO

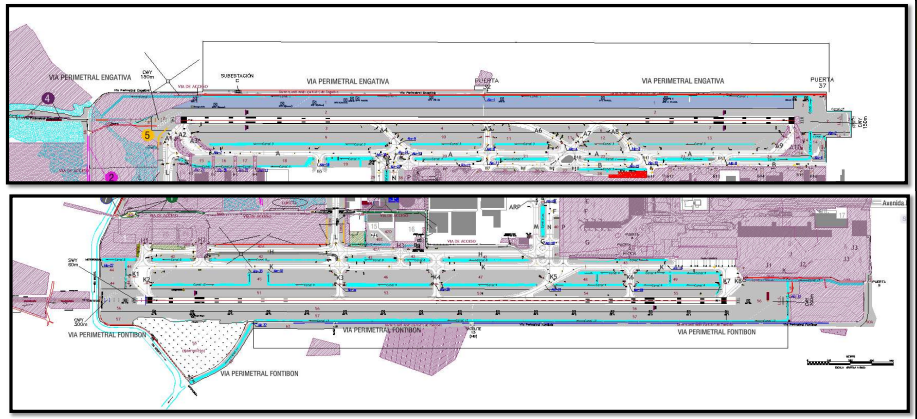

Descripción	Espesor(m)	Long (m)	Ancho (m)	Cant. Ciclos	Longitud total
CANTIDAD A EJECUTAR					
VIA PERIMETRAL ENGATIVA		95,00		2,00	190,00
VIA PERIMETRAL FONTIBON		55,00		2,00	110,00
				TOTAL AREA	300,00

CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR	300,00
CANTIDAD CONTRACTUAL	-
CANTIDAD A AUMENTAR	300,00

REGISTRO FOTOGRAFICO





Sub-Total	300,00
TOTAL	300,00

ELABORO	APROBO

Residente de Obra: _____
Ing . Luis Felipe Vallejo

Director de Obra: _____
Ing . Yessica Andrea Ortiz

Residente de interventoria: _____
Ing . Wilmer Riaño

Director de interventoria: _____
Ing. Juan David Aldana

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL


AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL


CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024

FECHA	DD	7	MM	7	A	26	ACTA No.	3	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTÁ (VF)				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024	NIT O C.C.	901.901.506-1	CONTRATO N°	24001269 H4 DE 2024
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER-AEROPUERTO	NIT O C.C.	901.902.218-8	CONTRATO N°	24001358 H3 DE 2024

CAPÍTULO	10	ITEM	10.6 NP	PERFILADO MECANICO DE MORTERO Y/ O CONCRETO DETERIORADO DE SOBREESPESOR PARA MANTENIMIENTO EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO (PANTALLAS, MUROS,COLUMNAS,CUNETAS,CANALES,VIGAS, ANDENES Y SIMILARES)	UNID.	M2	UBICACIÓN	AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO

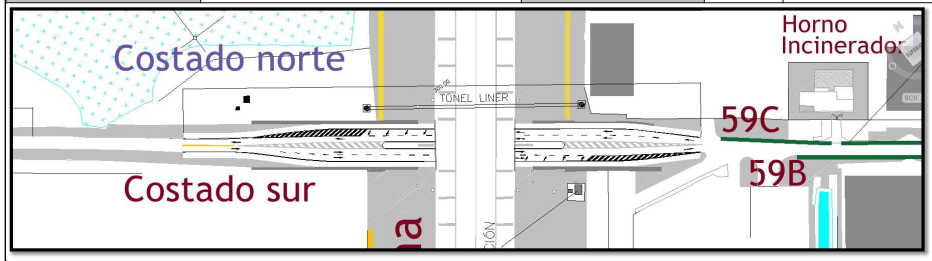

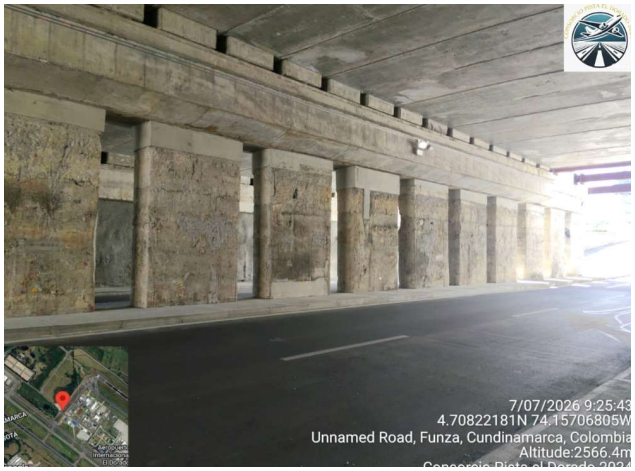

Descripción	Espesor(m)	Long (m)	Alto (m)	Cant.	Longitud total
CANTIDAD A EJECUTAR					
AREA MURO COSTADO NORTE TRAMO 1		54,50	2,90	1,00	158,05
AREA MURO COSTADO NORTE TRAMO 2		29,00	4,90	1,00	142,10
AREA MURO COSTADO NORTE TRAMO 3		64,50	4,00	1,00	258,00
AREA MURO COSTADO NORTE TRAMO 4		69,40	4,30	1,00	298,42
AREA MURO COSTADO SUR TRAMO 1		53,70	2,95	1,00	158,42
AREA MURO COSTADO SUR TRAMO 2		29,80	4,90	1,00	146,02
AREA MURO COSTADO SUR TRAMO 3		64,60	4,00	1,00	258,40
AREA MURO COSTADO SUR TRAMO 4		68,50	4,30	1,00	294,55
TRAMOS ADICIONALES ENTRE VIGAS CABEZAL Y CUNETAS		112,15	1,00	2,00	224,30
PANTALLAS		6,64	4,70	18,00	561,74
				TOTAL AREA	2.500,00
			CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR		2.500,00
			CANTIDAD CONTRACTUAL		-
			CANTIDAD A AUMENTAR		2.500,00

REGISTRO FOTOGRAFICO





Sub-Total	2.500,00
TOTAL	2.500,00

ELABORO	APROBO

Residente de Obra: _____ Ing . Luis Felipe Vallejo

Director de Obra: _____ Ing . Yessica Andrea Ortiz

Residente de interventoria: _____ Ing . Wilmer Riaño

Director de interventoria: _____ Ing. Juan David Aldana

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024

FECHA	DD	7	MM	7	A	26	ACTA No.	3	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTÁ (VF)			
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3	
CONTRATISTA	CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024	NIT O C.C.	901.901.506-1	CONTRATO N° 24001269 H4 DE 2024
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER-AEROPUERTO	NIT O C.C.	901.902.218-8	CONTRATO N° 24001358 H3 DE 2024

CAPÍTULO	10	ITEM	10.7 NP	LIMPIEZA Y LAVADO PARA RETIRO DE IMPUREZAS EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO (PANTALLAS, MUROS,COLUMNAS,CUNETAS,CANALES,VIGAS,ANDENES Y SIMILARES).	UNID.	M2	UBICACIÓN	AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO






Descripción	Espesor(m)	Long (m)	Alto (m)	Cant.	Longitud total
CANTIDAD A EJECUTAR					
AREA MURO COSTADO NORTE TRAMO 1		54,50	2,90	1,00	158,05
AREA MURO COSTADO NORTE TRAMO 2		29,00	4,90	1,00	142,10
AREA MURO COSTADO NORTE TRAMO 3		64,50	4,00	1,00	258,00
AREA MURO COSTADO NORTE TRAMO 4		69,40	4,30	1,00	298,42
AREA MURO COSTADO SUR TRAMO 1		53,70	2,95	1,00	158,42
AREA MURO COSTADO SUR TRAMO 2		29,80	4,90	1,00	146,02
AREA MURO COSTADO SUR TRAMO 3		64,60	4,00	1,00	258,40
AREA MURO COSTADO SUR TRAMO 4		68,50	4,30	1,00	294,55
TRAMOS ADICIONALES ENTRE VIGAS CABEZAL Y CUNETAS		112,15	1,00	2,00	224,30
PANTALLAS		6,64	4,70	18,00	561,74
				TOTAL AREA	2.500,00

CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR	2.500,00
CANTIDAD CONTRACTUAL	-
CANTIDAD A AUMENTAR	2.500,00

REGISTRO FOTOGRAFICO





Sub-Total	2.500,00
TOTAL	2.500,00

ELABORO	APROBO
Residente de Obra: Ing . Luis Felipe Vallejo	Residente de interventoria: Ing . Wilmer Riaño
Director de Obra: Ing . Yessica Andrea Ortiz	Director de interventoria: Ing. Juan David Aldana

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL


AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024

FECHA	DD	7	MM	7	A	26	ACTA No.	3	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTÁ (VF)				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024	NIT O C.C.	901.901.506-1	CONTRATO N°	24001269 H4 DE 2024
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER-AEROPUERTO	NIT O C.C.	901.902.218-8	CONTRATO N°	24001358 H3 DE 2024


CAPÍTULO	10	ITEM	10.8 NP	PICADO Y SELLADO CON MORTERO DE ALTA RESISTENCIA DE ZONAS PARA MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS CONCRETO REFORZADO (PANTALLAS ,MUROS, COLUMNAS, CUNETAS, CANALES, VIGAS, ANDENES Y SIMILARES).	UNID.	M2	UBICACIÓN	AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO





Descripción	Espesor(m)	Long (m)	Alto (m)	Cant.	Longitud total
CANTIDAD A EJECUTAR					
AREA MURO COSTADO NORTE		29,97	3,36	1,00	100,70
AREA MURO COSTADO SUR		30,15	3,36	1,00	101,30
PANTALLAS		6,60	4,68	9,00	277,99
				TOTAL AREA	480,00
			CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR		480,00
			CANTIDAD CONTRACTUAL		-
			CANTIDAD A AUMENTAR		480,00

REGISTRO FOTOGRAFICO





Sub-Total	480,00
TOTAL	480,00

ELABORO	APROBO
Residente de Obra: Ing . Luis Felipe Vallejo	Director de Obra: Ing . Yessica Andrea Ortiz
Residente de interventoria: Ing . Wilmer Riaño	Director de interventoria: Ing. Juan David Aldana

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL


AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024

FECHA	DD	7	MM	7	A	26	ACTA No.	3	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTÁ (VF)				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024	NIT O C.C.	901.901.506-1	CONTRATO N°	24001269 H4 DE 2024
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER-AEROPUERTO	NIT O C.C.	901.902.218-8	CONTRATO N°	24001358 H3 DE 2024

CAPÍTULO	10	ITEM	10.9 NP	SUMINISTRO E INSTALACION DE PAÑETE DE ALTA RESISTENCIA CON ESPESOR HASTA MAXIMO 5 CMS (INCLUYE PUENTE DE ADHERENCIA) PARA MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS CONCRETO REFORZADO (PANTALLAS,MUROS,COLUMAS,CUNETAS,CANALES,VIGAS,ANDENES Y SIMILARES.	UNID.	M2	UBICACIÓN	AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO

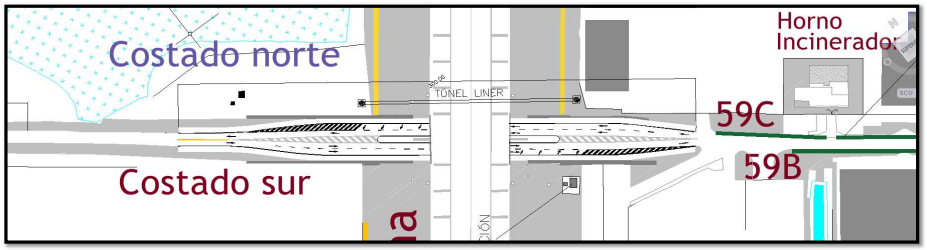

Descripción	Espesor(m)	Long (m)	Alto (m)	Cant.	Longitud total
CANTIDAD A EJECUTAR					
AREA MURO COSTADO NORTE		62,51	3,50	1,00	218,79
AREA MURO COSTADO SUR		64,35	3,50	1,00	225,23
PANTALLAS		6,60	4,68	18,00	555,98
				TOTAL AREA	1.000,00

CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR	1.000,00
CANTIDAD CONTRACTUAL	-
CANTIDAD A AUMENTAR	1.000,00





REGISTRO FOTOGRAFICO





Sub-Total	1.000,00
TOTAL	1.000,00

ELABORO	APROBO

Residente de Obra: Ing . Luis Felipe Vallejo

Director de Obra: Ing . Yessica Andrea Ortiz

Residente de interventoria: Ing . Wilmer Riaño

Director de interventoria: Ing. Juan David Aldana

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL


AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024

FECHA	DD	7	MM	7	A	26	ACTA No.	3	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTÁ (VF)				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024	NIT O C.C.	901.901.506-1	CONTRATO N°	24001269 H4 DE 2024
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER-AEROPUERTO	NIT O C.C.	901.902.218-8	CONTRATO N°	24001358 H3 DE 2024

CAPÍTULO	10	ITEM	10.10 NP	DESMONTE, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE DEMOLICION DE PISAMALLA EN LUGAR AUTORIZADO DENTRO DEL AEROPUERTO.	UNID.	ML	UBICACIÓN	AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO







Descripción	Espesor(m)	Long (m)	Ancho (m)	Cant. Ciclos	Longitud total
CANTIDAD A EJECUTAR					
CERRAMIENTO VIA PERIMETRAL ENGATIVA		1000,00		1,00	1.000,00
				TOTAL AREA	1.000,00

CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR	1.000,00
CANTIDAD CONTRACTUAL	-
CANTIDAD A AUMENTAR	1.000,00

REGISTRO FOTOGRAFICO





Sub-Total	1.000,00
TOTAL	1.000,00

ELABORO	APROBO

Residente de Obra: _____
Ing . Luis Felipe Vallejo

Director de Obra: _____
Ing . Yessica Andrea Ortiz

Residente de interventoria: _____
Ing . Wilmer Riaño

Director de interventoria: _____
Ing. Juan David Aldana

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024

FECHA	DD	7	MM	7	A	26	ACTA No.	3	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTÁ (VF)				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024	NIT O C.C.	901.901.506-1	CONTRATO N°	24001269 H4 DE 2024
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER-AEROPUERTO	NIT O C.C.	901.902.218-8	CONTRATO N°	24001358 H3 DE 2024

CAPÍTULO	10	ITEM	10.11 NP	SUMINISTRO E INSTALACION DE HITOS PLASTICOS EN ZONA AIRE INCLUYE EXCAVACION, VACIADO DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA ESTRUCTURA DE SOPORTE; PERFORACION Y ANCLAJE DE ESTRUCTURA PLASTICA A BASE DE SOPORTE EN CONCRETO Y RELLENO EN MATERIAL COMUN.	UNID.	UND	UBICACIÓN	AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO

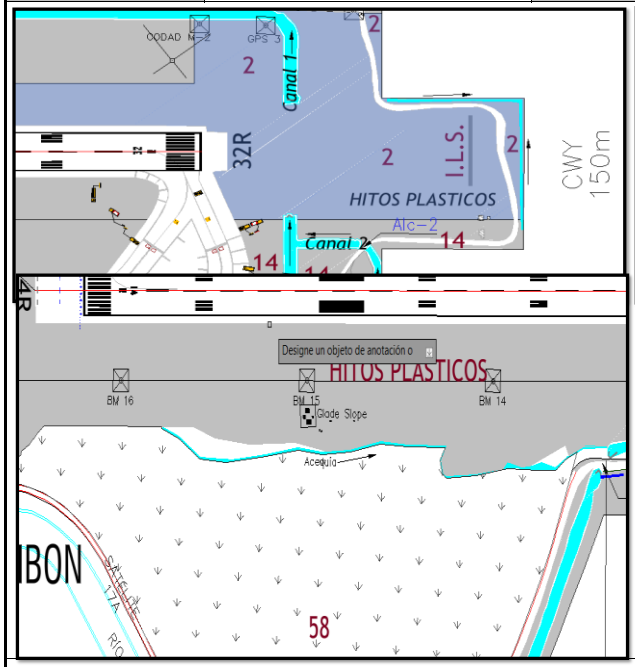





Descripción	Espesor(m)	Long (m)	Alto (m)	Cant.	Cantidad total
CANTIDAD A EJECUTAR					
HITOS PLASTICOS PARA ILS 14L				45,00	45,00
HITOS PLASTICOS PARA ILS 14R				40,00	40,00
HITOS PLASTICOS PARA Localizador 32R				40,00	40,00
HITOS PLASTICOS PARA Localizador 32L				60,00	60,00
HITOS PLASTICOS PARA ZONAS Mojones localizador 32R-32L				19,00	19,00
HITOS PLASTICOS PARA Mojones de topografía lado aire				96,00	96,00
				TOTAL AREA	300,00

CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR	300,00
CANTIDAD CONTRACTUAL	-
CANTIDAD A AUMENTAR	300,00

REGISTRO FOTOGRAFICO





Sub-Total	300,00
TOTAL	300,00

ELABORO	APROBO

Residente de Obra: _____
Ing . Luis Felipe Vallejo

Director de Obra: _____
Ing . Yessica Andrea Ortiz

Residente de interventoria: _____
Ing . Wilmer Riaño

Director de interventoria: _____
Ing. Juan David Aldana


AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

FECHA	DD	7	MM	7	A	26	ACTA No.	3	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTÁ (VF)				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024	NIT O C.C.	901.901.506-1	CONTRATO N°	24001269 H4 DE 2024
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER-AEROPUERTO	NIT O C.C.	901.902.218-8	CONTRATO N°	24001358 H3 DE 2024

CAPÍTULO	11	ITEM	11.4	EQUIPO DE CONTINGENCIA PARA EVENTUALIDADES Y CORRECTIVOS 24 HORAS INCLUYE PERSONAL Y EQUIPOS. (VER ESPECIFICACIÓN TÉCNICA)	UNID.	DIA	UBICACIÓN	AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO

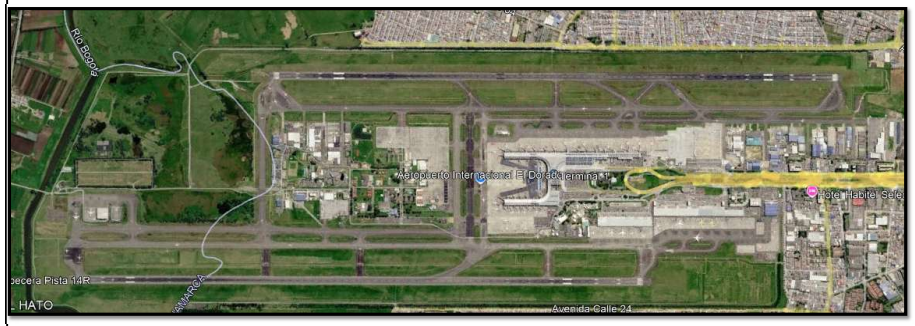

Descripción/período	Inicio	fin	Ancho (m)	Cant. Días	Cantidad total
CANTIDAD CONTRACTUAL (ACTA MOD N°2)					556,00
CANTIDAD A EJECUTAR					
PERIODO DE 09/08/2026 HASTA 15/08/2026	9/08/2026	15/08/2026	N/A	7,00	7,00
PERIODO DE 16/08/2026 HASTA 15/09/2026	16/08/2026	15/09/2026	N/A	31,00	31,00
PERIODO DE 16/09/2026 HASTA 15/10/2026	16/09/2026	15/10/2026	N/A	30,00	30,00
PERIODO DE 16/10/2026 HASTA 15/11/2026	16/10/2026	15/11/2026	N/A	31,00	31,00
PERIODO DE 16/11/2026 HASTA 15/12/2026	16/11/2026	15/12/2026	N/A	30,00	30,00
PERIODO DE 16/12/2026 HASTA 18/12/2026	16/12/2026	18/12/2026	N/A	3,00	3,00
				TOTAL AREA	132,00
			CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR		688,00
			CANTIDAD CONTRACTUAL		556,00
			CANTIDAD A AUMENTAR		132,00





REGISTRO FOTOGRAFICO





Sub-Total	132,00
TOTAL	132,00

ELABORO	APROBO

Residente de Obra: _____
Ing . Luis Felipe Vallejo

Director de Obra: _____
Ing . Yessica Andrea Ortiz

Residente de interventoria: _____
Ing . Wilmer Riaño

Director de interventoria: _____
Ing. Juan David Aldana

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL


CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024

FECHA	DD	7	MM	7	A	26	ACTA No.	3	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTÁ (VF)				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024	NIT O C.C.	901.901.506-1	CONTRATO N°	24001269 H4 DE 2024
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER-AEROPUERTO	NIT O C.C.	901.902.218-8	CONTRATO N°	24001358 H3 DE 2024

CAPÍTULO	10	ITEM	12.2 NP	DEMOLICION MECANICA DE ESTRUCTURAS MENORES EN CONCRETO REFORZADO Y NO REFORZADO (VIGAS, ANDENES Y ESCALERAS EN PRIMER NIVEL) INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL	UNID.	M3	UBICACIÓN	AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO







Descripción	Long (m)	Volumen (m3)	Alto (m)	Cant.	Longitud total
CANTIDAD A EJECUTAR					
CABECERA 32 R PISTA NORTE		3,00		1,00	3,00
ZONAS DE SEGURIDAD / FRANJAS DE PISTA NORTE COSTADO NORTE		3,00		1,00	3,00
ZONAS DE SEGURIDAD / FRANJAS DE PISTA NORTE COSTADO SUR ENTRE CALLES ALPHA 1 A ALPHA 10		3,00		1,00	3,00
ZONAS DE SEGURIDAD / FRANJAS DE PISTA SUR COSTADO NORTE		3,00		1,00	3,00
ZONAS DE SEGURIDAD / FRANJAS DE PISTA SUR COSTADO SUR ENTRE CALLES KILO 1 A K8		3,00		1,00	3,00
				TOTAL AREA	15,00
			CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR		15,00
			CANTIDAD CONTRACTUAL		-
			CANTIDAD A AUMENTAR		15,00

REGISTRO FOTOGRAFICO





Sub-Total	15,00
TOTAL	15,00

ELABORO	APROBO

Residente de Obra: _____
Ing . Luis Felipe Vallejo

Director de Obra: _____
Ing . Yessica Andrea Ortiz

Residente de interventoria: _____
Ing . Wilmer Riaño

Director de interventoria: _____
Ing. Juan David Aldana

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL


AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FECHA	DD	7	MM	7	A	26	ACTA No.	3	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	2


OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTÁ (VF)**			
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	**NIT O C.C.**	899.999.059-3	
CONTRATISTA	CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024	**NIT O C.C.**	901.901.506-1	**CONTRATO N°** 24001269 H4 DE 2024
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER-AEROPUERTO	**NIT O C.C.**	901.902.218-8	**CONTRATO N°** 24001358 H3 DE 2024

CAPÍTULO	13	ITEM	13,1	DESINSECTACIÓN (Insecticida para Rastreros y Voladores)	UNID.	M2	UBICACIÓN	AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO
















Descripción	Espesor(m)	Long (m)	Ancho (m)	Cant. Ciclos	Area total
CANTIDAD CONTRACTUAL (ACTA MOD N°2)					**154.048,82**
CANTIDAD A EJECUTAR					
Canal 9	N/A	3856,05	1,00	3,00	11.568,15
Canal 10	N/A	725,53	1,00	3,00	2.176,59
Canal 12	N/A	4354,69	1,00	3,00	13.064,07
Perimetro Fontibón	N/A	402,00	1,00	3,00	1.206,00
Zona 63,64,65	N/A	150,00	1,00	3,00	450,00
Perimetro Engativá	N/A	210,00	1,00	3,00	630,00
Acopio Hierro Calle Lima	N/A	873,27	1,00	3,00	2.619,81
Calle Lima	N/A	120,00	1,00	3,00	360,00
Deprimido CATAM	N/A	100,00	1,00	3,00	300,00
Sub Estación AB	N/A	1575,00	1,00	3,00	4.725,00
Sub Estación C	N/A	468,00	1,00	3,00	1.404,00
Sub Estación Calle Lima	N/A	445,00	1,00	3,00	1.335,00

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024

FECHA	DD	7	MM	7	A	26	ACTA No.	3	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	2

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTÁ (VF)				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024	NIT O C.C.	901.901.506-1	CONTRATO N°	24001269 H4 DE 2024
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER-AEROPUERTO	NIT O C.C.	901.902.218-8	CONTRATO N°	24001358 H3 DE 2024

CAPÍTULO	13	ITEM	13,1	DESINSECTACIÓN (Insecticida para Rastreros y Voladores)	UNID.	M2	UBICACIÓN	AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO	
Sub Estación D					N/A	916,00	1,00	3,00	2.748,00
Sub Estación CATAM					N/A	320,00	1,00	3,00	960,00
Sub Estación Nueva Torreo Control					N/A	1575,00	1,00	3,00	4.725,00
								TOTAL	48.271,62
								CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR	202.320,44
								CANTIDAD CONTRACTUAL	154.048,82
								CANTIDAD A AUMENTAR	48.271,62

SUBESTACION DEPRIMIDO CATAM

ADO	Observaciones
TRINA 2,5)	Desinsectación en un area de 320 m2



Localización	Químico - Aplicación de producto unidad de medida m2
Localizada sobre el jarillon perimetral Fontibón	134
Localizada sobre el jarillon perimetral Fontibón	
Localizada sobre el jarillon perimetral Fontibón	134
Localizada sobre el jarillon perimetral Fontibón	
Localizada en el borde Canal 12- Zona 56	134
Localizada en el borde Canal 12- Zona 56	


Localización	Químico - Aplicación de producto unidad de medida m2
Localizada sobre el jarillon perimetral Engativa	52,5
Localizada sobre el jarillon perimetral Engativa	52,5
Localizada sobre el jarillon perimetral Engativa	52,5
Localizada sobre el jarillon perimetral Engativa	52,5

CALLE LIMA


Observaciones
Desinsectación en una area de 120 m2 de la Calle de Rodaje Lima entre A y H, adyacentes a la malla perimetral del CAMPO AEREO DEL EJERCITO – GENERAL JOSE JOAQUIN MATALLANA BERMUDEZ - costado oriental de la Calle de Rodaje Lima

Observaciones
Desinsectación en un área de 873.27m2, en el centro de acopio de la calle rodaje lima, donde se encuentra almacenado el material de construcción.

7	562,1	VECTO BAC
8	2357,04	VECTO BAC
9	3856,05	VECTO BAC
10	725,52	VECTO BAC
11	190,2	VECTO BAC
12	4354,694	VECTO BAC



REGISTRO FOTOGRAFICO







Sub-Total	48.271,62
TOTAL	48.271,62

ELABORO	APROBO

Residente de Obra: _____
Ing . Luis Felipe Vallejo

Director de Obra: _____
Ing . Yessica Andrea Ortiz

Residente de interventoria: _____
Ing . Wilmer Riaño

Director de interventoria: _____
Ing. Juan David Aldana

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024

FECHA	DD	7	MM	7	A	26	ACTA No.	3	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	2

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTÁ (VF)				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024	NIT O C.C.	901.901.506-1	CONTRATO N°	24001269 H4 DE 2024
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER-AEROPUERTO	NIT O C.C.	901.902.218-8	CONTRATO N°	24001358 H3 DE 2024

CAPÍTULO	13	ITEM	13.2	DESINSECTACIÓN M_Pasivo (Instalación y/o monitoreo de mamparas)	UNID.	UND	UBICACIÓN	AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO

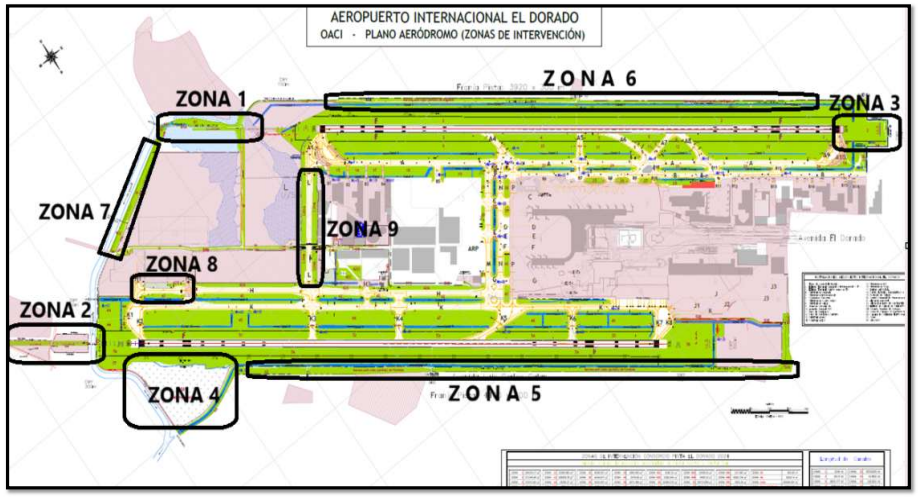

Descripción	Espesor(m)	Long (m)	unidad (und por zona)	Cant. Ciclos	Cantidad total
CANTIDAD CONTRACTUAL (ACTA MOD N°2)					805,00
CANTIDAD A EJECUTAR					
ZONA 1 - ALS Norte (Quincena 1)	N/A	N/A	4,00	3,00	12,00
ZONA 2 - ALS Sur (Quincena 1)	N/A	N/A	2,00	3,00	6,00
ZONA 3 - ILS Norte (Quincena 1)	N/A	N/A	1,00	3,00	3,00
ZONA 4 - Zona de Nivelación (Quincena 1)	N/A	N/A	4,00	3,00	12,00
ZONA 5 - Perimetro Fontibón (Quincena 1)	N/A	N/A	6,00	3,00	18,00
ZONA 6 - Perimetro Engativá (Quincena 1)	N/A	N/A	7,00	3,00	21,00
ZONA 7 - Entre Mallas (Quincena 1)	N/A	N/A	4,00	3,00	12,00
ZONA 8 - Inter Aseo ECA (Quincena 1)	N/A	N/A	4,00	3,00	12,00
ZONA 9 - Calle Lima (Quincena 1)	N/A	N/A	2,00	3,00	6,00
ZONA 1 - ALS Norte (Quincena 2)	N/A	N/A	4,00	3,00	12,00
ZONA 2 - ALS Sur (Quincena 2)	N/A	N/A	2,00	3,00	6,00
ZONA 3 - ILS Norte (Quincena 2)	N/A	N/A	1,00	3,00	3,00
ZONA 4 - Zona de Nivelación (Quincena 2)	N/A	N/A	4,00	3,00	12,00
ZONA 5 - Perimetro Fontibón (Quincena 2)	N/A	N/A	6,00	3,00	18,00
ZONA 6 - Perimetro Engativá (Quincena 2)	N/A	N/A	7,00	3,00	21,00
ZONA 7 - Entre Mallas (Quincena 2)	N/A	N/A	4,00	3,00	12,00
ZONA 8 - Inter Aseo ECA (Quincena 2)	N/A	N/A	4,00	3,00	12,00
ZONA 9 - Calle Lima (Quincena 2)	N/A	N/A	2,00	3,00	6,00
				TOTAL	204,00

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FECHA	DD	7	MM	7	A	26	ACTA No.	3	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	2

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTÁ (VF)				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024	NIT O C.C.	901.901.506-1	CONTRATO N°	24001269 H4 DE 2024
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER-AEROPUERTO	NIT O C.C.	901.902.218-8	CONTRATO N°	24001358 H3 DE 2024

CAPÍTULO	13	ITEM	13.2	DESINSECTACIÓN M_Pasivo (Instalación y/o monitoreo de mamparas)	UNID.	UND	UBICACIÓN	AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO



CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR	1.009,00
CANTIDAD CONTRACTUAL	805,00
CANTIDAD A AUMENTAR	204,00

REGISTRO FOTOGRAFICO





Sub-Total	204,00
TOTAL	204,00

ELABORO	APROBO

Residente de Obra: _____
Ing . Luis Felipe Vallejo

Director de Obra: _____
Ing . Yessica Andrea Ortiz

Residente de interventoria: _____
Ing . Wilmer Riaño

Director de interventoria: _____
Ing. Juan David Aldana

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024

FECHA	DD	7	MM	7	A	26	ACTA No.	3	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	2

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTÁ (VF)				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024	NIT O C.C.	901.901.506-1	CONTRATO N°	24001269 H4 DE 2024
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER-AEROPUERTO	NIT O C.C.	901.902.218-8	CONTRATO N°	24001358 H3 DE 2024

CAPÍTULO	13	ITEM	13.3	LARVICIDA Aplicación en canales	UNID.	ML	UBICACIÓN	AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO

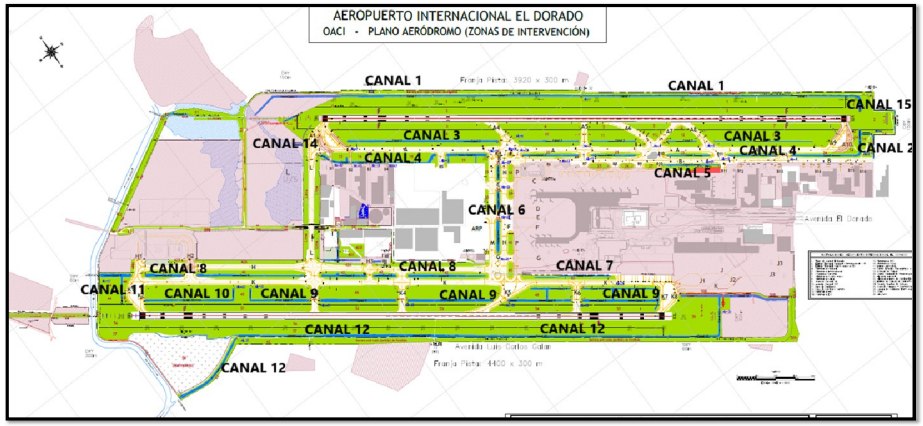

Descripción	Espesor(m)	Long (m)	Ancho (m)	Cant. Ciclos	Longitud total
CANTIDAD CONTRACTUAL (ACTA MOD N°2)					**214.715,42**
CANTIDAD A EJECUTAR					
Canal 1	N/A	5240,01	N/A	1,00	5.240,01
Canal 3	N/A	2805,18	N/A	1,00	2.805,18
Canal 4	N/A	2083,16	N/A	1,00	2.083,16
Canal 5	N/A	443,16	N/A	2,00	886,32
Canal 6	N/A	483,70	N/A	2,00	967,39
Canal 7	N/A	562,08	N/A	1,00	562,08
Canal 8	N/A	2357,04	N/A	1,00	2.357,04
Canal 9	N/A	3856,05	N/A	1,00	3.856,05
Canal 10	N/A	725,52	N/A	1,00	725,52
Canal 11	N/A	190,20	N/A	2,00	380,40
Canal 12	N/A	4354,69	N/A	1,00	4.354,69
Canal 2	N/A	241,90	N/A	1,00	241,90
Canal 14	N/A	128,24	N/A	1,00	128,24
Canal 15	N/A	296,80	N/A	1,00	296,80
ACEQUIA	N/A	414,91	N/A	1,00	414,91
				TOTAL	**25.299,69**
			CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR		**240.015,11**
			CANTIDAD CONTRACTUAL		**214.715,42**
			CANTIDAD A AUMENTAR		**25.299,69**

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024

FECHA	DD	7	MM	7	A	26	ACTA No.	3	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	2

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTÁ (VF)				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024	NIT O C.C.	901.901.506-1	CONTRATO N°	24001269 H4 DE 2024
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER-AEROPUERTO	NIT O C.C.	901.902.218-8	CONTRATO N°	24001358 H3 DE 2024

CAPÍTULO	13	ITEM	13.3	LARVICIDA Aplicación en canales	UNID.	ML	UBICACIÓN	AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO

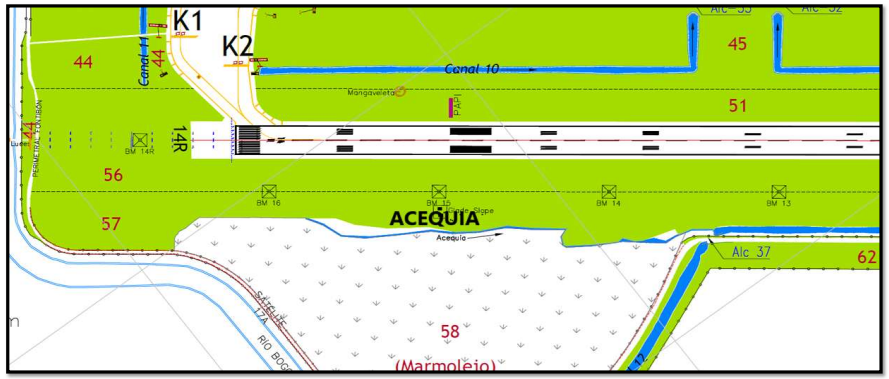

REGISTRO FOTOGRAFICO





Sub-Total	25.299,69
TOTAL	25.299,69

ELABORO	APROBO

Residente de Obra: _____
Ing . Luis Felipe Vallejo

Director de Obra: _____
Ing . Yessica Andrea Ortiz

Residente de interventoria: _____
Ing . Wilmer Riaño

Director de interventoria: _____
Ing. Juan David Aldana

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024

FECHA	DD	7	MM	7	A	26	ACTA No.	3	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTÁ (VF)				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO PISTA EL DORADO 2024	NIT O C.C.	901.901.506-1	CONTRATO N°	24001269 H4 DE 2024
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER-AEROPUERTO	NIT O C.C.	901.902.218-8	CONTRATO N°	24001358 H3 DE 2024

CAPÍTULO	14	ITEM	14.3	INSUMOS, EQUIPOS Y PERSONAL PARA EL CONTROL TOPOGRAFICO DE LA OBRA INCLUYE ESTACIÓN TOTAL, NIVEL Y DEMAS. A TODO COSTO, CALIBRADOS Y CERTIFICADOS (incluye 1 topografo y 2 cadenero)	UNID.	MES	UBICACIÓN	AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO

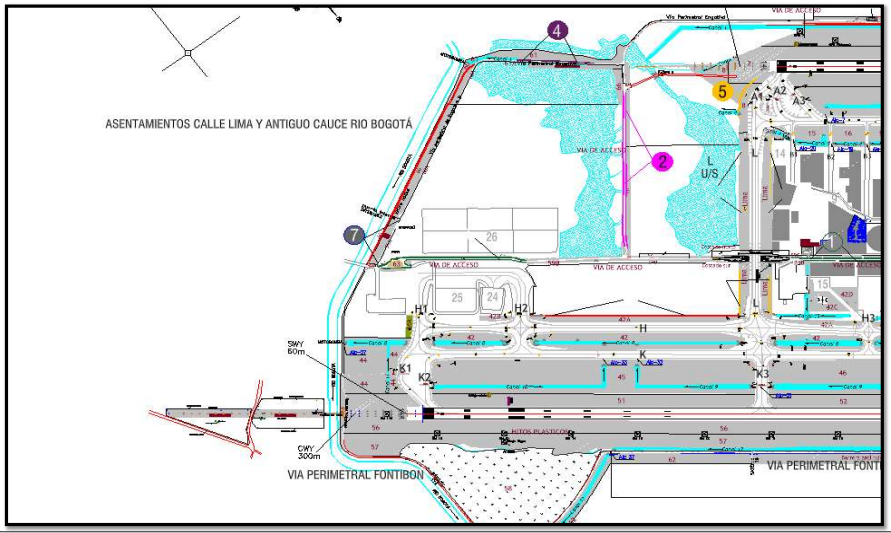

Descripción	Long (m)	Volumen (m3)	Alto (m)	Cant. (mes)	Longitud total
CANTIDAD A EJECUTAR					
MES DE NOVIEMBRE DE 2026				1,00	1,00
MES DE DICIEMBRE DE 2026				1,00	1,00
				TOTAL AREA	2,00

CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR	2,00
CANTIDAD CONTRACTUAL	-
CANTIDAD A AUMENTAR	2,00

REGISTRO FOTOGRAFICO



Sub-Total	2,00
TOTAL	2,00

ELABORO	APROBO

Residente de Obra: _____
Ing . Luis Felipe Vallejo

Director de Obra: _____
Ing . Yessica Andrea Ortiz

Residente de interventoria: _____
Ing . Wilmer Riaño

Director de interventoria: _____
Ing. Juan David Aldana
