I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ACTA:

NUMERO DE ACTA ENTREGA DE ESPACIOS: 23

ÁREA:	*DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS*		**PROCESO:**	*24001240 H4-2024*	
TEMA DE LA REUNIÓN:	*ALEROS INTERNOS EN POLICARBONATO: MODULO 02.*				
LUGAR:	*AEROPUERTO ALFREDO VASQUEZ COBO. TERMINAL DE PASAJEROS.*				
FECHA:	*23/01/2026*	**HORA INICIO:**	*07:30am*	**HORA FINAL:**	*08:40am*

II. OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Realizar la entrega a la Interventoría, de los trabajos de mantenimiento, sobre el suministro e instalación de aleros en policarbonato, sobre el módulo 02 . Con base en el Ítem contractual 2.1, como el traslado e instalación de láminas de policarbonato existentes en buen estado, validados por medio de BMA (ítems: BMA10, BMA11 y BMA12).

III. AGENDA:

Orden del Día:

1. Verificación de asistentes.
2. Recorrido en zonas de entrega y recibo.
3. Ubicación del espacio a entregar (liberación).
4. Comentarios generales.

IV. TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN:

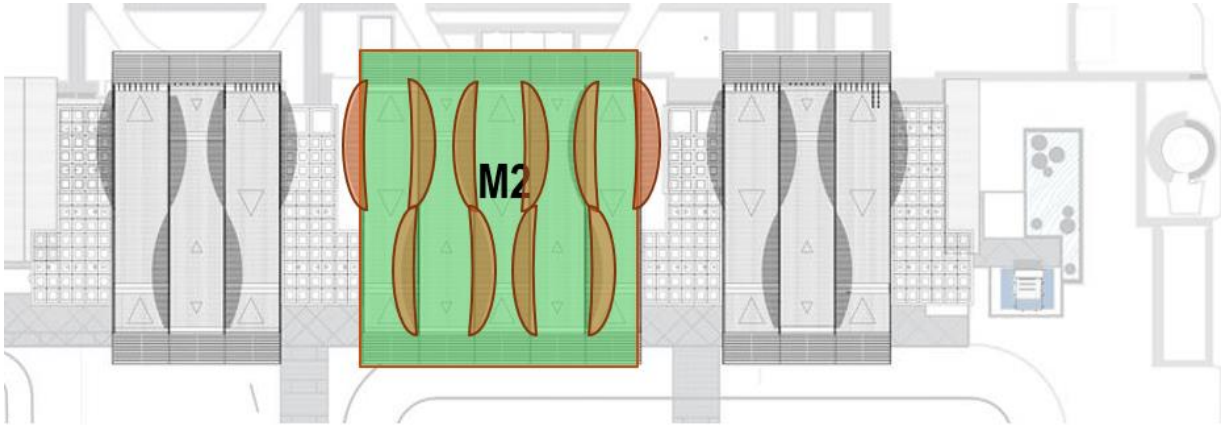
1. Verificación de asistentes.

Se verifica la asistencia de cada uno de los participantes y/o representantes de los Contratistas de Obra y de la Interventoría de Obra.

2. Recorrido en zona de entrega y recibo.

Se realizo recorrido previo en zonas de cubierta intervenidas, donde se revisan las zonas que fueron objeto de intervención: Limpieza con jabón neutro y desengrasante en estructura metálica de soporte. Así mismo, la limpieza de realizo con hidro lavadora y con herramienta menor como son: escobas, cepillos, estopas, etc. La inspección con Interventoría se realizó por medio de recorrido a nivel superior de cubiertas, donde verificadas las condiciones de aseo y limpieza de la estructura y zonas aledañas, se realiza la verificación de los elementos instalados. Se identifican las áreas donde se instaló material nuevo de Policarbonato con buenas condiciones de apariencia y estado, conforme a los Ítems creados por medio de BMA.

3. Ubicación del espacio a entregar (liberación).





Cubiertas Terminal: Aleros en Policarbonato Módulo 02

4. Comentarios generales.

Se reciben los aleros de cubiertas en Policarbonato a satisfacción, se planteará la posibilidad de realizar un segundo ciclo de limpieza de estas cubiertas, para el mes de marzo, previo a la entrega general del contrato.

- **Firmas**: Para constancia se firma en las ciudades de Leticia a los 23 días del mes de enero del año 2026, por los asistentes, se adjunta a la presente acta, lista de asistencia.

 José Manuel Rincón. Residente de Obra	 Cesar Augusto Gutiérrez. Residente de Interventoría		
NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO DEL CONTRATISTA	NOMBRE Y FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA	NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO ADMINISTRACION AEROPUERTO	

Nombre completo	Cargo	Firma
JORGE MORENO	DIRECTOR DE OBRA	
JULIO CHAPARRO FONSECA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
CESAR GUTIERREZ	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO IMGA	
JOSE MANUEL RINCON	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO LA SABANA	
