ALIANZA MUNDIAL S.A.S.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA - S.I.F

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

FORMATO	**MEMORIAS DE CALCULO**

FECHA	**DD**	30	**MM**	5	**AA**	2026	**CORTE N°**	3	**ELABORÓ**	Jose Antonio Rodriguez	


OBJETO DEL CONTRATO	PP - OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS DE ENCUENTRO Y ESPARCIMIENTO (PARQUES) DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO				
INTERVENTOR	COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S. BIC	**NIT O C.C.**	**901,256,066-3**	**CONTRATO N°**	**4600106226 de 2025**
CONTRATISTA	ALIANZA MUNDIAL S.A.S	**NIT O C.C.**	**900.153.859-0**	**CONTRATO N°**	**4600106254 de 2025**

CAPÍTULO	9	**ITEM**	**9.7**	Suministro, transporte e instalación de JUEGO INFANTIL BALANCÍN TIPO DONA fabricada con eje 1020 1-1/2" redondo, tornillo ce 8.8 m12 1.75x40 tuerca galv. 8.8 m12 1.75, arandela galv. m12 wasa galv. m12, soporte caucho red diam. 10cm x 6cm alto tuerca galv 8.8 m10 1.5, tornillo cc Bristol 8.8 m10 1.5x70, arandela galv. m10wasa galv. m10 tornillo button inox. 8.8 m8 1.25x25, remache pop 5/32" x 1/2", lamina caucho/neopreno 120cm cal 1/8", arandela galv 5/32", pin chaveta de 5/32 x 12, lamina hr. 6 mm galvanizada en caliente lamina hr 4.5 mm galvanizada en caliente, tubería galvanizada tipo acueducto 4" x 3 mm esp. tubería galvanizada tipo acueducto 1-1/2" x 3 mm esp., expansiones mecánicas 1/2" x 3" - Garantizar el cumplimiento de la normativa en 1176 para parques infantiles y certificación iso 9001 vigente. Según planos de detalles.	**UNID.**	un	**UBICACIÓN**	POBLADO

Detalles y/o Registro Fotográfico





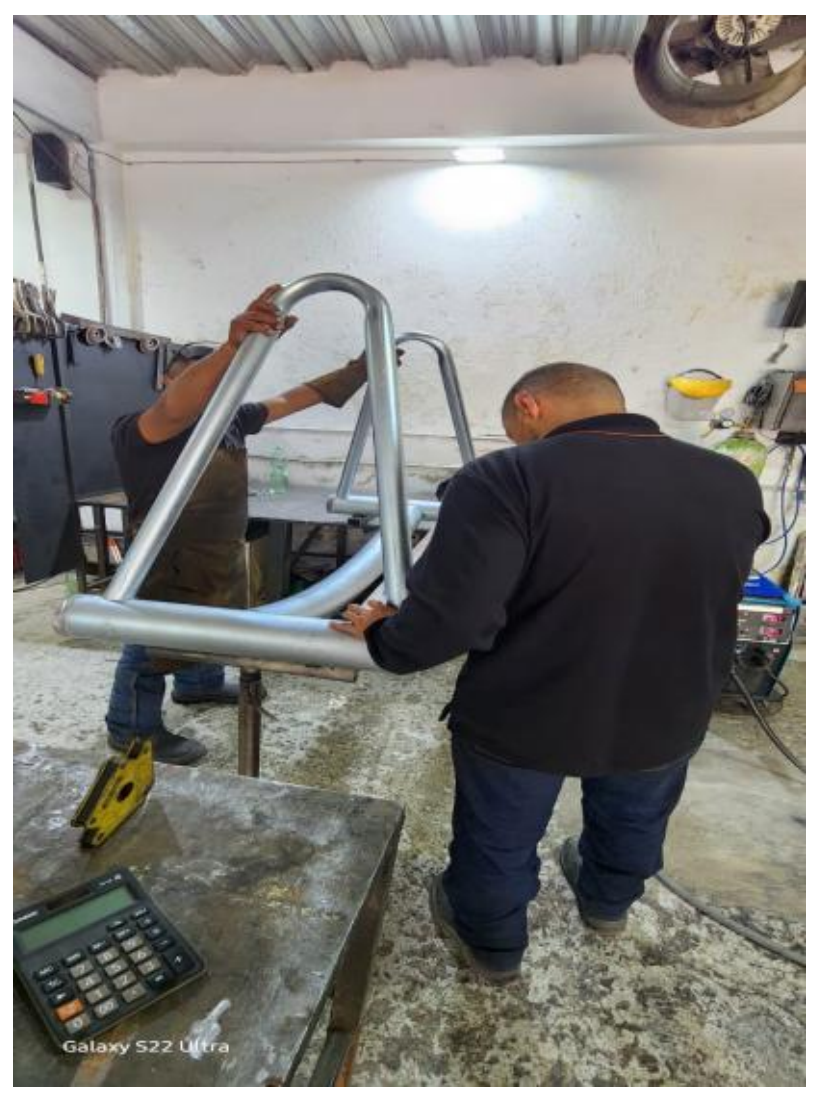

FRENTE/ABSCISA	**Dimensiones / Cantidades** Cantidad			**Medida Total**
Parque Recreativo Pasivo Los Naranjos - CRA 21 # 5 SUR - 19	2			2,00
Parque Recreativo Pasivo Urb Parques de Villa Carlota - CL 16A # 43B - 162	2			2,00
	Total			**4,00**

Residente de Obra Jose Antonio Rodriguez G.
ALIANZA MUNDIAL SAS

Residente de Interventoría Diego Mauricio Cortés O
COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS. BIC.
