ALIANZA MUNDIAL S.A.S.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA - S.I.F

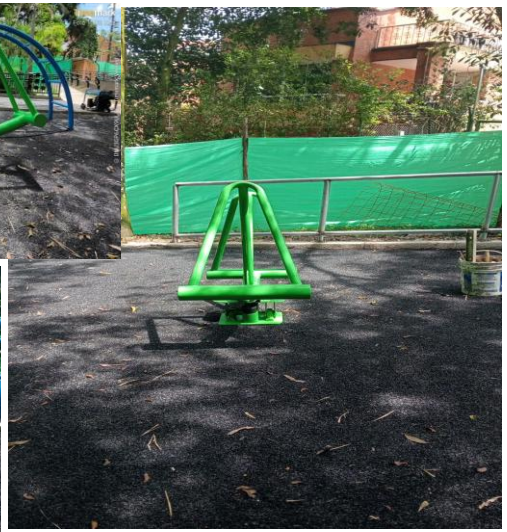
Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO

FECHA	DD	30	MM	5	AA	2026	CORTE N°	3	ELABORÓ	Jose Antonio Rodriguez

OBJETO DEL CONTRATO	PP - OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS DE ENCUENTRO Y ESPARCIMIENTO (PARQUES) DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO				
INTERVENTOR	COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S. BIC	NIT O C.C.	901,256,066-3	CONTRATO N°	4600106226 de 2025
CONTRATISTA	ALIANZA MUNDIAL S.A.S	NIT O C.C.	900.153.859-0	CONTRATO N°	4600106254 de 2025

CAPÍTULO	9	ITEM	9.8	Suministro, transporte e instalación de JUEGO INFANTIL BALANCÍN DE PÍE, fabricada en tornillo ce m 14 x 2 x 60, wasa galv. 9/16", tuerca galv. 8.8 m14 2, arandela galv. 9/16", lamina inox. prep. (304) cal 20 4x8, remache pop inox 3.2 x 8, tubo metálico 4" galvanizado en caliente, tubería galvanizada tipo acueducto de 1-1/2 redondo calibre 14 galvanizado en caliente, tubería galvanizada tipo red 2" x 3 mm esp. galvanizado en caliente, expansión 3/8" x 3", tornillo ce 8.8 m8 1.25x25, wasa galv m8, tuerca galv 8.8 m8 1.25, arandela galv m8remache pop inox 3.2 x 8, chumacera ref. ucp206 30mm, eje nylon diámetro 2" anillo ajuste separador, lamina caucho/neopreno 120cm cal 1/8", tubería galvanizada tipo acueducto red 1" x 2 mm esp. galvanizado en caliente, lamina hr. 4.5mm 4x8 galvanizado en caliente, lamina hr 6mm 4x8 galvanizado en caliente - Garantizar el cumplimiento de la normativa en 1176 para parques infantiles y certificación iso 9001 vigente. Según planos de detalles.	UNID.	un	UBICACIÓN	POBLADO

Detalles y/o Registro Fotográfico	FRENTE/ABSCISA	Dimensiones / Cantidades			Medida Total
		Cantidad			
   	Parque Recreativo Pasivo Los Naranjos - CRA 21 # 5 SUR - 19	1			1,00
	Total				1,00

Residente de Obra Jose Antonio Rodriguez G.
ALIANZA MUNDIAL SAS

Residente de Interventoría Diego Mauricio Cortés O
COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS. BIC.
