
## *Acta de Socialización.*

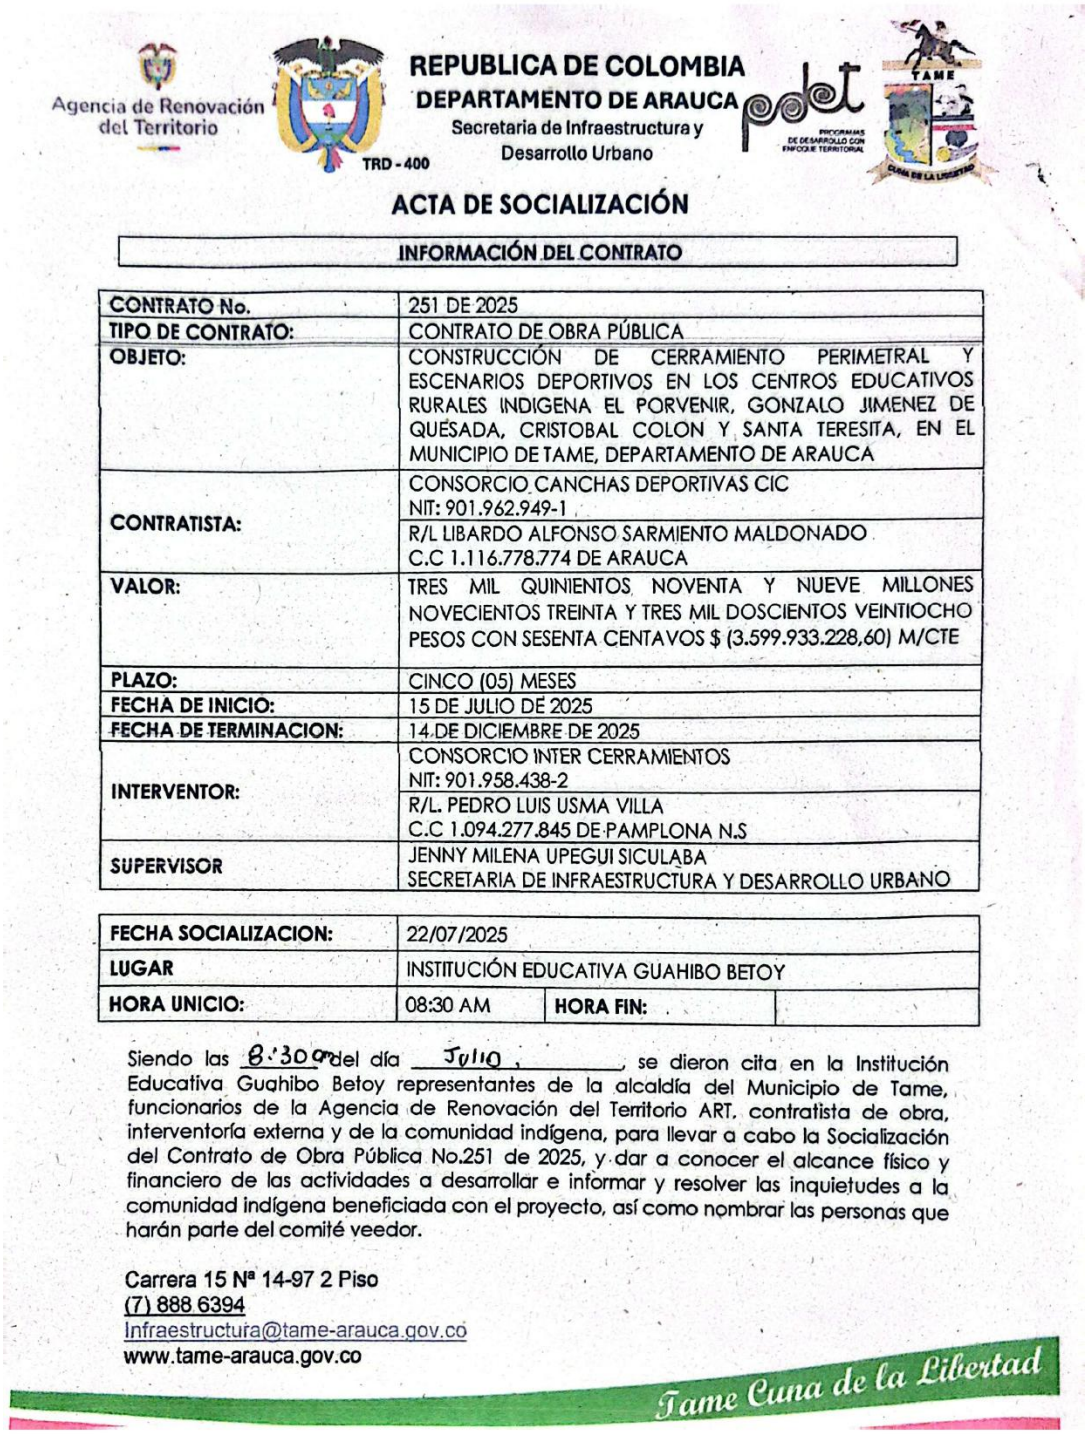

Agencia de Renovación del Territorio

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano

TRD - 400

**ACTA DE SOCIALIZACIÓN**

**INFORMACIÓN DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No.** | 251 DE 2025 |
| **TIPO DE CONTRATO:** | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA |
| **OBJETO:** | CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES INDIGENA EL PORVENIR, GONZALO JIMENEZ DE QUESADA, CRISTOBAL COLON Y SANTA TERESITA, EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC<br>NIT: 901.962.949-1<br>R/L LIBARDO ALFONSO SARMIENTO MALDONADO<br>C.C 1.116.778.774 DE ARAUCA |
| **VALOR:** | TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON SESENTA CENTAVOS $ (3.599.933.228,60) M/CTE |
| **PLAZO:** | CINCO (05) MESES |
| **FECHA DE INICIO:** | 15 DE JULIO DE 2025 |
| **FECHA DE TERMINACION:** | 14 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS<br>NIT: 901.958.438-2<br>R/L. PEDRO LUIS USMA VILLA<br>C.C 1.094.277.845 DE PAMPLONA N.S |
| **SUPERVISOR** | JENNY MILENA UPEGUI SICULABA<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA SOCIALIZACION:** | 22/07/2025 | | |
| **LUGAR** | INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUAHIBO BETOY | | |
| **HORA UNICIO:** | 08:30 AM | **HORA FIN:** | |

Siendo las 8:30 a.m del día Julio, se dieron cita en la Institución Educativa Guahibo Betoy representantes de la alcaldía del Municipio de Tame, funcionarios de la Agencia de Renovación del Territorio ART, contratista de obra, interventoría externa y de la comunidad indígena, para llevar a cabo la Socialización del Contrato de Obra Pública No.251 de 2025, y dar a conocer el alcance físico y financiero de las actividades a desarrollar e informar y resolver las inquietudes a la comunidad indígena beneficiada con el proyecto, así como nombrar las personas que harán parte del comité veedor.

Carrera 15 Nª 14-97 2 Piso
(7) 888 6394
Infraestructura@tame-arauca.gov.co
www.tame-arauca.gov.co

*Tame Cuna de la Libertad*

Powered by CamScanner

Agencia de Renovación del Territorio

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano

TRD - 400

| NOMBRE | CEDULA | REPRESENTACIÓN |
|---|---|---|
| Jenny Milena Yepez | 53139327 | Secretaria Infraestructura |
| Angel Ubaldo Molina | 88031958 | Oficina A. Planeación |
| Pedro Luis Usma Villa | 1094277845. | Interventoria externa |
| Libardo A Sarmiento P | 1.116.778744 | Consorcio Canchas Deportivas |
| Edgar A Erazo | 98290315 | Instalación Ed. Betoy |
| Victor Rodríguez R | 92528187 | Coordinador ART-Arauca |

La lista de Asistencia completa de los asistentes a la reunión se anexa como parte integral de la presente acta.

**OBJETIVO**

Socialización del alcance y actividades del contrato de Obra Pública No.251 de 2025, específicamente la construcción de canchas múltiples y cerramiento perimetral de los centros educativos indígena El porvenir, Gonzalo Jiménez de Quesada, Cristóbal Colón y Santa Teresita.

**ORDEN DEL DIA**

**La reunión se desarrolló dentro del siguiente orden del día:**

1. Presentación de los asistentes a la reunión y saludo de la entidad contratante.
2. Presentación de la firma contratista de obra y contratista de Interventoría.
3. Exposición del alcance técnico y financiero del contrato y descripción de las actividades a desarrollar.
4. Intervención de la firma contratista, presentación de su plan de trabajo.
5. Intervención de la Interventoría, presentación de su plan de trabajo.
6. Explicación de las funciones y compromisos que debe cumplir el comité veedor.
7. Conformación de la veeduría ciudadana y nombramiento del representante del comité veedor.
8. Intervención de la comunidad



Powered by CamScanner

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA**

El desarrollo del orden del día fue el siguiente:

1. **Presentación de los asistentes a la reunión y saludo de la entidad contratante.**

Toma la palabra el Ingeniero Víctor Bohórquez Coordinador de la ART – Arauca quien agradece a las comunidades indígenas su asistencia y enaltece la labor que realizan en beneficio de sus comunidades; a su vez, recuerda que gracias al Gobierno del Cambio se hacen posible este tipo de inversiones en sectores que requieren mejorar su calidad de vida.

Seguidamente interviene el Ing. Wilbert Rincón Secretario de educación Municipal del Municipio de Tame, presenta un saludo de parte del señor alcalde Miguel Bastos agradeciendo al grupo de la ART que estos recursos tan importantes llegaran a estas comunidades.

El ingeniero Valentín Molina Jefe de la oficina asesora de planeación hace su intervención exaltando la labor que realizan las entidades del estado en favor de las comunidades indígenas en esta oportunidad a la ART, a su vez invita seguir trabajando en pro del beneficio de esta población.

La supervisora del Contrato de Obra e Interventoría la Ing. Jenny Upegui agradece la participación activa de toda la comunidad e invita a los contratistas a realizar una obra de calidad y en los tiempos estipulados para ello.

Finalmente toma la palabra el señor René Delgado representante de ASOCIACIÓN DE CABILDOS Y AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA "ASCATIDAR" agradece el inicio de este importante proyecto que traerá beneficio a la comunidad educativa y comunidad en general residente en los resguardos Julieros, Velasqueros, Roqueros y Genareros.

2. **Presentación de la firma contratista de obra y contratista de Interventoría.**

Se presenta el Ing. Pedro Luis Usma Villa Representante Legal del CONSORCIO INTERCERRAMIENTOS y Libardo Sarmiento Maldonado Representante Legal del CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC.




Powered by CamScanner

**3. Exposición del alcance técnico y financiero del contrato y descripción de las actividades a desarrollar.**

El señor Libardo Sarmiento en representación del CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVA CIC inicia explicando las generalidades del proyecto así:

Problema: Déficit de infraestructura educativa y deportiva en las sedes educativas indígenas Cristóbal Colon, Santa Teresita, Gonzalo Jiménez de Quesada y El Porvenir del municipio de Tame – Arauca

Alcance: Construcción de cerramiento perimetral y escenarios deportivos en cuatro (4) escuelas indígenas de la zona rural del municipio de Tame.

ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

En cada una de las escuelas indígenas Porvenir, Gonzalo Jiménez, Cristóbal Colón y Santa Teresita, se plantean los siguientes capítulos:

CERRAMIENTO PERIMETRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

- PRELIMINARES
- ESTRUCTURAS EN CONCRETO
- MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURAS METÁLICAS

**CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIPLE**

- PRELIMINARES
- ESTRUCTURAS EN CONCRETO
- ACABADOS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS
- INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
- INSTALACIONES ELECTRICAS

**CERRAMIENTO PERIMETRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS**

Se expone que se contempla la construcción de un aproximado de 227 ml de cerramiento perimetral en la escuela el porvenir del Resguardo Julieros, 342 ml en la escuela Gonzalo Jiménez de Quesada Resguardo Velasqueros, 395.00 ml en la escuela Cristóbal Colon Resguardo Genareros y 281.20 ml en la escuela Santa Teresita Resguardo Roqueros, para un total de 1.245,2 ml de cerramiento en malla eslabonada cal 12, el



Powered by CamScanner

cual cuenta con muro en ladrillo a la vista, columnetas en concreto de 3000 psi, vigas de cimentación y zapatas en concreto de 3000 psi, como se muestra a continuación:

**CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIPLE**

La alternativa de solución contempla la construcción de cuatro canchas múltiples de 672 m2 cada una (32m de largo por 21m de ancho), las cuales serán construidas en placas de concreto de 3000 psi de 0.10 m de espesor con malla electrosoldada 5 mm y estarán equipadas con porterías múltiples metálicas con tablero metálico antivandálico, además de su respectiva demarcación para disciplinas de baloncesto, voleibol y futbol de salón como se evidencia a continuación.

**GRADERIAS DE CANCHA MULTIPLE**

Estas canchas estarán equipadas con una (1) gradería construida en concreto de 3000 psi en un área de 29.40 m2 (12,25 m de largo por 2,40 m de ancho), la cual contará con los respectivos mecanismos de integración para personas con movilidad reducida

**SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE CANCHA MULTIPLE**

La iluminación de la cancha estará a cargo de 8 reflectores de 400 W solar fotovoltaico, ubicados en las esquinas sobre postes en concreto, los cuales contarán con sus respectivos paneles solares fotovoltaicos de 40 w y su sistema de puesta a Tierra.

4. Intervención de la firma contratista, presentación de su plan de trabajo.

El señor Libardo Sarmiento en representación de la firma contratista de obra expone el plan de trabajo que será distribuido en los 5 meses de ejecución del trabajo.

| CENTRO EDUCATIVO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | | MES 4 | MES 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EL PORVENIR | | | | | | |
| GONZALO JIMENEZ DE QUESADA | | | | | | |
| CRISTOBAL COLÓN | | | | | | |
| SANTA TERESITA | | | | | | |

El contratista deja claro que dependiendo de las condiciones climáticas se podría iniciar en un menor tiempo los centros educativos El porvenir y Gonzalo Jiménez de Quesada.

5. Intervención de la Interventoría, presentación de su plan de trabajo.



Powered by CamScanner
