0016.26 – TUN - GTC

Bogotá, 07 de julio de 2026

Ingeniero
RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO
Director de Obra
CONSORCIO DC 2025
Bogotá

Asunto: Contrato de Obra No. 622 de 2024 "EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." **- Respuesta comunicado OF.CDC 012 – Concepto de No Objeción Informe Gestión Ambiental Final – V2**

Respetado Ingeniero,

Una vez revisado el Informe de Gestión Ambiental Final V2 remitido mediante oficio OF.CDC 012 el 07 de julio de 2026, se evidencia que se ajustan observaciones realizadas por a interventoría en la mesa de trabajo realizada el 02/072026, cumpliendo con los requerimientos mínimos contractuales y normativos del contrato de obra, por lo tanto, se genera la NO OBJECION del documento por parte de esta interventoría.

De acuerdo con lo anterior, se aclara que en tal caso que la entidad contratante y/o Autoridad Ambiental Competente tengan alguna observación y/o requerimiento adicional, esta se remitirá al contratista para que pueda ser atendida con prontitud.

Sin otro en particular,

Cordialmente,

CARLOS FERNANDO FERNANDEZ AMORTEGUI
Director de interventoría VELNEC S.A.

Copia: Profesionales de apoyo a la Supervisión FDLT – Ingeniero Diego Caballero ;Valentina Martinez.: Contrato No. 689 de 2024

INFORME FINAL AMBIENTAL

CONSORCIO DC 2025

CONTRATO No. FDLT622 – 2025

ALCALDIA LOCAL DE TUNJUELITO

OBJETO DEL PROYECTO:

“EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/ O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”


BOGOTÁ D.C

26 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2025

CONTROL DE VERSIONES

VERSIÓN	FECHA	DESCRICIÓN
1	01/02/2026	Emisión del documento
2	03/07/2026	Subsanación observaciones interventoría – Mesa de trabajo

CONTROL DE FIRMAS

	CARGO	NOMBRE	FECHA	FIRMA
Elaboró	Especialista Ambiental y SST	Sonia Liliana Torres Cruz	01/02/2026	
Revisó	Director de obra	Rafael Eduardo Álzate Moreno	01/02/2026	
Aprobó	Residente Interventoría Ambiental	Claudia Beltrán	07/07/2026	

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 7
2. OBJETIVOS 8
   2.1. Objetivo General 8
   2.2. Objetivos Específicos 8
3. RESUMEN EJECUTIVO 9
4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 10
   4.1. LOCALIZACIÓN 10
   4.2. INFORMACIÓN DEL PROYECTO 12
   4.3. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS EJECUTADAS 13
   4.4. FRENTES DE OBRA INTERVENIDOS 14
5. PLAN DE ACCIÓN 14
   5.1. COMPONENTE A. CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES FICHA A. 15
      5.1.1. PERSONAL REQUERIDO DURANTE EL PROYECTO 15
      5.1.2. COMUNICADOS ENVIADOS Y RECIBIDOS 17
      5.1.3. COMITÉS Y REUNIONES AMBIENTALES 25
      5.1.4. SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL 27
      5.1.5. PERMISOS Y LICENCIAS 33
   5.2. COMPONENTE B. MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS 43
      5.2.1. Programa B1. Manejo Ambiental de campamentos fijos y/o temporales y centros de acopio 43
      5.2.2. Programa B2. Manejo de materiales de construcción 53
   ✓ REGISTRO FOTOGRAFICO 62
   5.3. MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS 64

- ✓ **REGISTRO FOTOGRAFICO** 65

5.4. Programa B3. Manejo integral de residuos solidos 67

5.4.1. Residuos Convencionales – Puntos Ecológicos 67

5.4.2. RESPEL – BOLSAS DE CEMENTO 71

5.5. Manejo de residuos de construcción y demolición 74

5.5.1. Programa B4. Control de emisiones atmosféricas 85

5.5.2. Programa B5. Manejo integral de cuerpos de agua 91

5.6. COMPONENTE C. MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO 105

5.6.1. Componente C. Manejo De La Vegetación 105

5.6.2. Programa C2. Manejo de fauna 115

6. CIERRES AMBIENTALES 116

7. CONCLUSIONES 118

Índice de Tablas

Tabla 1. Ubicación CIV viales a intervenidos 11
Tabla 2. Información Contrato de Obra 12
Tabla 3. información Contrato de Interventoría 13
Tabla 4. Trazabilidad de documentos ambientales 14
Tabla 5. Grupo Ambiental y SST contractual 15
Tabla 6. Personal BOAL 17
Tabla 7. Comunicados enviados por el contratista 21
Tabla 8. Comunicados recibidos por la interventoría 24
Tabla 9. Trazabilidad de reuniones o comités ambientales 26
Tabla 10. Capacitaciones ambientales 28
Tabla 11. Trazabilidad Aprobación de Informes Ambientales 32
Tabla 12. Indicadores Componente A: Cumplimiento a las obligaciones ambientales y SST 38
Tabla 13. Calificación Ambiental y SST durante la ejecución del contrato 42
Tabla 14. Campamentos Implementados 45

Tabla 15. Indicadores Componente B; Programa B1. Manejo Ambiental de Campamentos fijos y/o temporales y centros de acopio 46
Tabla 16. Proveedores utilizados durante la ejecución del contrato 53
Tabla 17. Densidades utilizadas durante la ejecución del contrato 54
Tabla 18. Materiales de Construcción adquiridos 55
Tabla 19. Trazabilidad de materiales por CIV intervenido 56
Tabla 20. Materiales de Construcción adquiridos en planta de aprovechamiento 61
Tabla 21. Indicadores Componente B; Programa B2. Manejo de materiales de construcción 62
Tabla 22. Cantidades generadas y Gestores utilizados en el periodo 74
Tabla 23. indicadores Componente B; Programa B3. Manejo Integral de Residuos Solidos 79
Tabla 24. Indicadores Programa B3 83
Tabla 25. Volquetas utilizadas en la ejecución del contrato 86
Tabla 26. Indicadores Componente B; Programa B4. Control de Emisiones Atmosféricas 87
Tabla 27. Trazabilidad de sumideros protegidos durante la ejecución del contrato 91
Tabla 28. Indicadores Componente B; Programa B5. Manejo Integral de cuerpos de agua 92
Tabla 29. Trazabilidad de individuos arbóreos protegidos durante la ejecución del contrato 105
Tabla 29. Resultados de la verificación en campo. 110
Tabla 31. Indicadores Componente C; Manejo de la vegetación y paisajismo 115
Tabla 32. Indicadores C2 Manejo de Fauna 116
Tabla 33. Cierres Ambientales 117

Índice de Ilustraciones

Ilustración 1. Localización localidad Tunjuelito 12
Ilustración 2. Radicado de PIN AMBIENTAL 34
Ilustración 3. Radicado de PIN AMBIENTAL 34
Ilustración 4. Especies Dominantes 35
Ilustración 5. Tratamientos silviculturales autorizados 36
Ilustración 6. Registro fotográfico actividades de tala 106
Ilustración 7. Recolección de residuos vegetales 107
Ilustración 8. Estado inicial antes de intervención 111
Ilustración 9. Afectación durante la intervención 112
Ilustración 10. Recuperación y empradización de la zona verde afectada 113
Ilustración 11. Estado inicial antes de intervención 114
Ilustración 12. Afectación durante la intervención 114
Ilustración 13. Recuperación y empradización de la zona verde afectada 115

índice de Graficas

Grafica 1. Desempeño Ambiental y SST 42
Grafica 2. Trazabilidad de materiales 57
Grafica 3. Materiales adquiridos en Plantas de Aprovechamiento 61
Grafica 4. Cantidad de material revalorizado 84
Grafica 5. Cantidad de residuos generados 84
Grafica 6. Cantidad de Sumideros por Frente de obra 91
Grafica 7. Cantidad de Individuos arbóreos por Frente de obra 105

1. INTRODUCCIÓN

El CONSORCIO DC 2025 fue contratado para la ejecución del Contrato de Obra No. 622 de 2024, cuyo objeto fue: *"EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C"*. Durante la ejecución contractual se implementaron de manera integral las actividades contempladas en las fichas de manejo del Programa de Implementación del Plan de Manejo Ambiental – PIPMA, con el fin de prevenir, mitigar y controlar los impactos ambientales derivados de las actividades constructivas desarrolladas en el proyecto.

El presente documento corresponde a la liquidación del componente ambiental del contrato, en el cual se consolida la gestión ambiental ejecutada durante todo el periodo contractual comprendido entre el 26 de diciembre de 2024 y el 10 de noviembre de 2025, incluyendo las actividades desarrolladas en la etapa de construcción y las acciones de movilidad requeridas por la Alcaldía Local de Tunjuelito, las cuales se ejecutaron en cumplimiento de la normatividad ambiental vigente aplicable.

Para efectos de la liquidación, la gestión ambiental se estructuró y ejecutó a partir de los siguientes componentes:

- Componente A: Manejo para el cumplimiento de requisitos y obligaciones ambientales y de seguridad y salud en el trabajo (A&SST).
- Componente B: Manejo ambiental en la ejecución de las actividades constructivas, el cual incluyó:
    - B1: Manejo ambiental de campamentos fijos y/o móviles y centros de acopio.
    - B2: Manejo de materiales de construcción.
    - B3: Manejo integral de residuos sólidos.
    - B4: Control de emisiones atmosféricas.
    - B5: Manejo integral de cuerpos de agua, sumideros y obras hidráulicas.
- Componente C: Manejo de la vegetación, paisajismo y fauna silvestre, que comprendió:
    - C1: Manejo de la vegetación y paisajismo.
    - C2: Manejo de fauna silvestre.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

- Ejecutar las actividades constructivas correspondientes al Contrato de Obra No. 622 de 2024, cuyo objeto fue *"EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."*, garantizando la correcta implementación del componente ambiental durante todo el periodo contractual.

- Consolidar, mediante el presente documento de liquidación, la totalidad de las actividades ejecutadas durante la etapa de construcción y las acciones de movilidad asociadas al contrato, correspondientes al componente ambiental, desarrolladas durante el periodo comprendido entre el 26 de diciembre de 2024 y el 10 de noviembre de 2025.

2.2. Objetivos Específicos

- Dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente aplicable al proyecto, promoviendo una interacción responsable con el entorno y la implementación de medidas de control orientadas a garantizar ambientes de trabajo saludables y seguros para los trabajadores y para la población del área de influencia directa e indirecta.

- Verificar y consolidar el estado final de cumplimiento de las obligaciones correspondientes al Componente Ambiental del contrato, con base en el seguimiento realizado durante la ejecución contractual.

- Evidenciar la implementación y cumplimiento de las fichas de manejo ambiental del PIPMA, conforme a lo aprobado por la interventoría y la entidad contratante.

- Diseñar, implementar y ejecutar las medidas necesarias para el manejo ambiental de las actividades constructivas, orientadas a la prevención, mitigación y control de los impactos ambientales asociados al desarrollo del contrato.

3. RESUMEN EJECUTIVO

El presente documento corresponde a la liquidación del componente ambiental del Contrato de Obra No. 622 de 2024, ejecutado por el CONSORCIO DC 2025, cuyo objeto fue *"EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C"*. Durante el periodo contractual comprendido entre el 26 de diciembre de 2024 y el 10 de noviembre de 2025, el contratista desarrolló de manera continua las actividades de conservación, mantenimiento y rehabilitación de la malla vial local e intermedia, así como las acciones de movilidad requeridas por la Alcaldía Local de Tunjuelito, garantizando en todo momento la implementación efectiva del componente ambiental conforme a lo establecido en el Plan de Implementación del Plan de Manejo Ambiental – PIPMA, el Programa de Manejo Ambiental de Residuos de Construcción y Demolición – PMARCD y la normatividad ambiental vigente aplicable al proyecto.

La gestión ambiental se ejecutó de forma transversal a todas las actividades constructivas, contemplando el manejo ambiental de campamentos fijos y móviles, el adecuado almacenamiento y uso de materiales de construcción, la protección de zonas verdes y elementos del espacio público, el control de cuerpos de agua y sumideros, así como la implementación de medidas para la prevención y control de emisiones atmosféricas y material particulado.

De igual forma, se realizó la gestión integral de los residuos de construcción y demolición generados durante la ejecución del contrato, garantizando su clasificación, almacenamiento temporal, transporte, aprovechamiento, revalorización y disposición final a través de gestores debidamente autorizados, con el correspondiente soporte documental y trazabilidad, en cumplimiento de los lineamientos establecidos por la autoridad ambiental y la entidad contratante.

El seguimiento ambiental permanente, realizado mediante visitas de campo, registros fotográficos, actas, informes mensuales y comunicaciones oficiales con la interventoría, permitió verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales contractuales y la oportuna implementación de medidas preventivas, mitigatorias y correctivas frente a los impactos ambientales asociados a la ejecución del proyecto.

Como resultado del cierre de las actividades y de la consolidación de la información ambiental generada durante toda la ejecución contractual, se concluye que el CONSORCIO DC 2025 dio cumplimiento a las obligaciones ambientales establecidas, no evidenciándose requerimientos pendientes por parte de la autoridad ambiental ni de la interventoría, razón por la cual se emite concepto técnico favorable para la liquidación del componente ambiental del contrato.

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El Contrato de Obra No. 622 de 2024 tuvo como finalidad la ejecución de actividades de conservación, mantenimiento y rehabilitación de la malla vial local e intermedia, así como del espacio público asociado, en la localidad de Tunjuelito, en la ciudad de Bogotá D.C. Las actividades desarrolladas comprendieron intervenciones sobre la infraestructura vial existente, orientadas a mejorar las condiciones de movilidad, seguridad vial y funcionalidad del espacio público, atendiendo las necesidades identificadas por el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito – FDLT**.**

La ejecución del proyecto se desarrolló de manera progresiva durante el periodo contractual, conforme a la programación aprobada y a los resultados obtenidos en la etapa previa de diagnóstico y priorización, lo que permitió definir los tramos viales a intervenir de acuerdo con criterios técnicos, operativos y presupuestales, garantizando en todo momento el cumplimiento de las obligaciones contractuales y ambientales.

4.1. LOCALIZACIÓN

Las actividades de conservación, mantenimiento y rehabilitación de la malla vial local e intermedia y del espacio público asociado se ejecutaron en diferentes tramos ubicados dentro de la localidad de Tunjuelito, los cuales fueron identificados mediante los Códigos de Identificación Vial – CIV, de acuerdo con la programación establecida por el FDLT y avalada por la interventoría.

Los tramos viales intervenidos durante la ejecución del contrato correspondieron a los siguientes CIV:

- CIV 6000547
- CIV 6001042
- CIV 6000587
- CIV 6000897
- CIV 6001045
- CIV 6000751
- CIV 6000760
- CIV 6001827
- CIV 6001648

- CIV 6001672
- CIV 6001008
- CIV 6000775
- CIV 6001105

Es importante precisar que el orden de los CIV relacionados no corresponde necesariamente a la secuencia de intervención durante la ejecución del contrato. El Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito – FDLT contó con la facultad de definir y priorizar los segmentos viales a intervenir, con base en los resultados de la etapa previa y las necesidades identificadas en el territorio.

En este sentido, la tabla presentada diferencia los segmentos viales que hicieron parte del objeto inicial del contrato, de aquellos que fueron intervenidos posteriormente por priorización de la Alcaldía Local de Tunjuelito, previo acuerdo con el supervisor y con el aval de la interventoría, sin afectar el objeto contractual ni el cumplimiento de las obligaciones establecidas.

6000022	6000538	6000891	6001329	6001563
6000033	6000547	6000898	6001331	6001578
6000036	6000556	6000899	6001333	6001589
6000038	6000576	6000902	6001342	6001641
6000049	6000577	6000930	6001345	6001642
6000051	6000588	6000941	6001353	6001663
6000064	6000597	6000946	6001357	6001679
6000071	6000633	6000947	6001361	6001696
6000075	6000648	6000949	6001363	6001707
6000088	6000669	6000951	6001364	6001743
6000102	6000674	6000959	6001369	6001749
6000121	6000675	6000979	6001371	6001752
6000131	6000683	6000980	6001373	6001753
6000146	6000696	6000981	6001374	6001768
6000147	6000697	6000987	6001377	6001800
6000156	6000734	6000988	6001379	6001816
6000164	6000737	6000991	6001384	6001827
6000176	6000751	6000992	6001385	6001842
6000181	6000758	6000996	6001386	6001858
6000192	6000760	6000997	6001389	6001862
6000193	6000761	6000998	6001399	6001939
6000220	6000770	6001030	6001403	6002010
6000373	6000772	6001132	6001405	6002038
6000377	6000781	6001193	6001408	6002069
6000409	6000782	6001200	6001412	6002083
6000437	6000789	6001244	6001422	6002089
6000442	6000790	6001270	6001429	6002111
6000446	6000796	6001275	6001430	6002130
6000461	6000816	6001280	6001439	6002133
6000478	6000821	6001284	6001440	15001628
6000485	6000835	6001315	6001457	18002365
6000501	6000863	6001320	6001497	18004227
000505	6000865	6001323	6001550	
6000506	6000882	6001325	6001562	

Tabla 1. Ubicación CIV viales a intervenidos

La localización general del proyecto dentro de la localidad de Tunjuelito se presenta en la Ilustración 1, la cual permite identificar el área de influencia de las intervenciones realizadas.



Ilustración 1. Localización localidad Tunjuelito

Fuente: https://osgis.co/cual_es_mi_upl/

4.2. INFORMACIÓN DEL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 622 de 2024	
Contratista	Consorcio DC 2025
NIT	901.893.060-1
Fecha de Inicio	26 de Diciembre de 2024
Periodo fase preliminar	2 meses
Fecha de terminación inicial	25 de Agosto del 2025
Fecha de terminación prorroga 1 (2 meses 15 días)	10 de Noviembre de 2025
Plazo de ejecución inicial	8 Meses
Plazo de ejecución total (más prorroga)	10 meses 15 días
Valor Total del Contrato de obra (con adición)	1´580.340.624
Director de Obra	Rafael Álzate
Profesional Ambiental	Sonia Liliana Torres Cruz
Profesional Forestal	Leidy Acosta

Tabla 2. Información Contrato de Obra

CONTRATO DE INTERVENTORÍA PÚBLICA No. 689 de 2024	
Contratista Interventoría	Velnec S.A
NIT	800.028.455-1
Fecha de Inicio	26 de Diciembre de 2024
Periodo fase preliminar	2 meses
Fecha de terminación inicial	25 de Agosto del 2025
Fecha de terminación prorroga 1 (2 meses 15 días)	10 de Noviembre de 2025
Plazo de ejecución inicial	8 Meses
Plazo de ejecución total (más prorroga)	10 meses 15 días
Valor Total del Contrato de obra (con adición)	677.917.912
Profesional Ambiental	Claudia Beltrán

Tabla 3. información Contrato de Interventoría

4.3. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS EJECUTADAS

Durante la ejecución del Contrato de Obra No. 622 de 2024, el CONSORCIO DC 2025 desarrolló actividades constructivas y ambientales en los siguientes trece (13) segmentos viales, identificados mediante los Códigos de Identificación Vial – CIV:

CIV 6000547, CIV 6001042, CIV 6000587, CIV 6000897, CIV 6001045, CIV 6000751, CIV 6000760, CIV 6001827, CIV 6001648, CIV 6001672, CIV 6001008, CIV 6000775 y CIV 6001105.

En cada uno de estos segmentos viales se ejecutaron de manera integral las actividades correspondientes al alcance contractual, conforme a la programación aprobada, a las especificaciones técnicas establecidas y a los lineamientos ambientales definidos en el Plan de Implementación del Plan de Manejo Ambiental – PIPMA.

De manera previa al inicio de las actividades de obra, se realizó el cerramiento y delimitación de los frentes de intervención, con el propósito de garantizar la seguridad de los trabajadores, peatones y usuarios del espacio público, así como el adecuado control del área intervenida. De forma paralela, se implementaron medidas de protección de sumideros, orientadas a prevenir el ingreso de material particulado, residuos y sedimentos a los sistemas de drenaje existentes.

Así mismo, en los tramos donde se identificó presencia de vegetación, se llevaron a cabo actividades de protección de individuos arbóreos, mediante la instalación de señalización, barreras físicas y demás medidas preventivas necesarias, con el fin de evitar afectaciones a la cobertura vegetal existente durante el desarrollo de las actividades constructivas.

En cuanto a las labores de obra civil, se ejecutó la demolición del pavimento flexible existente, seguida de actividades de excavación mecánica y excavación manual, según las condiciones particulares de cada segmento vial y la presencia de redes, elementos superficiales o restricciones técnicas. Posteriormente, se realizaron trabajos de relleno y compactación, así como la nivelación y compactación de la subrasante, garantizando las condiciones estructurales requeridas para la conformación de la nueva estructura vial.

De igual forma, se llevó a cabo la instalación de geotextil reforzado tejido, la instalación de geoceldas y subbase granular, y finalmente la instalación de la carpeta asfáltica, permitiendo la rehabilitación, recuperación funcional y puesta en servicio de los segmentos viales intervenidos, en cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato.

Todas las actividades fueron ejecutadas bajo seguimiento ambiental permanente, asegurando la implementación de las medidas de manejo ambiental establecidas, sin evidenciarse afectaciones ambientales adicionales ni incumplimientos asociados a la ejecución de los trece (13) segmentos viales intervenidos.

4.4. FRENTES DE OBRA INTERVENIDOS

En el marco de la ejecución contractual, se intervinieron un total de trece (13) frentes de obra, identificados mediante los siguientes Códigos de Identificación Vial – CIV:

CIV 6000547, CIV 6001042, CIV 6000587, CIV 6000897, CIV 6001045, CIV 6000751, CIV 6000760, CIV 6001827, CIV 6001648, CIV 6001672, CIV 6001008, CIV 6000775 y CIV 6001105.

5. PLAN DE ACCIÓN

A continuación, se presenta el seguimiento realizado a las fichas de Manejo Ambiental PIPMA.

Asunto	Versión	Fecha de radicación	Estado
Revisión del documento PIPMA	1	20/01/2025	Se radica versión 1 PIPMA para verificación por parte de Interventoría – observado por Interventoría mediante oficio 0010.25 -TUN-GTC del 22 de enero de 2025.
Remisión del PMA RCD	1	27/01/2025	Rta OF. CDC 025 CONCEPTO FAVORABLE PMARCD
Aprobación documento PIPMA	3	06/02/2025	0029.25 -TUN-GTC - Rta OF. CDC041- CONCEPTO FAVORABLE PIPMA

Tabla 4. Trazabilidad de documentos ambientales

5.1. COMPONENTE A. CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES FICHA A.

5.1.1. PERSONAL REQUERIDO DURANTE EL PROYECTO

Para la ejecución del proyecto *"EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."*, el CONSORCIO DC 2025 dispuso del personal ambiental y forestal requerido, el cual fue debidamente aprobado por la interventoría y vinculado durante la ejecución contractual, garantizando la atención oportuna de las obligaciones ambientales del contrato.

El grupo ambiental y de seguridad y salud en el trabajo estuvo conformado por los siguientes profesionales, quienes cumplieron con los porcentajes de dedicación establecidos y desarrollaron sus funciones conforme a los lineamientos contractuales:

PERSONAL	DEDICACIÓN	NOMBRE	FECHA DE VINCULACIÓN	OFICIO
ESPECIALISTA AMBIENTAL Y SST	50%	Sonia Liliana Torres Cruz	01/04/2025	0134.25 - TUN – GTC
PROFESIONAL FORESTAL	10%	Leidy Constanza Acosta	21/02/2025	OF.CDC 078-25-02-2025

Tabla 5. Grupo Ambiental y SST contractual

Los profesionales dan cumplimiento al porcentaje de dedicación, realizando las siguientes actividades:

Durante la ejecución del contrato, los profesionales designados cumplieron de manera efectiva con las actividades asociadas al componente ambiental, entre las cuales se destacan:

- Elaboración, actualización y consolidación de la documentación ambiental contractual, incluyendo informes, registros, actas y soportes requeridos.
- Seguimiento y acompañamiento en campo a las actividades desarrolladas en los diferentes frentes de obra, verificando la correcta implementación de las medidas de manejo ambiental.

- Seguimiento a la generación, manejo y disposición de los Residuos de Construcción y Demolición – RCD, conforme al PMARCD aprobado.
- Acompañamiento y verificación de las condiciones ambientales de campamentos, centros de acopio y unidades sanitarias, garantizando el cumplimiento de los requisitos ambientales y sanitarios.
- Verificación del cumplimiento del cronograma ambiental del contrato, asegurando la ejecución oportuna de las actividades programadas.

Adicionalmente, durante la ejecución contractual se contó con el personal mínimo de planilla requerido, conformado por personal de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente (SSTMA) y el residente forestal, lo cual permitió garantizar una gestión ambiental continua y articulada con las actividades constructivas.

Como resultado del seguimiento realizado, se concluye que el personal ambiental y forestal dispuesto por el contratista dio cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ficha A del PIPMA, no evidenciándose incumplimientos asociados a la asignación, dedicación o desempeño del recurso humano requerido para el componente ambiental, lo cual respalda el cumplimiento satisfactorio de este componente al cierre del contrato.

Durante la ejecución del Contrato de Obra No. 622 de 2024, el CONSORCIO DC 2025 contó de manera permanente con una Brigada de Orden y Aseo (BOAL), asignada de acuerdo con los segmentos viales intervenidos, con el propósito de garantizar el adecuado manejo del entorno durante el desarrollo de las actividades constructivas.

La Brigada de Orden y Aseo desempeñó un papel fundamental en la implementación de las medidas de manejo ambiental, contribuyendo al control del orden, la limpieza y el adecuado almacenamiento de materiales y residuos en los frentes de obra, así como a la prevención de impactos negativos sobre el espacio público y las áreas aledañas a las zonas de intervención.

En este sentido, el personal BOAL permaneció presente durante la ejecución de las actividades en los diferentes frentes de obra, conforme a la programación establecida y a las necesidades operativas del proyecto, garantizando el cumplimiento de las obligaciones ambientales y operativas del contrato. La relación del personal que conformó la Brigada de Orden y Aseo se presenta en la siguiente tabla, la cual constituye soporte del cumplimiento de este requerimiento durante la ejecución contractual.

EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C del CONSORCIO DC 2025			
NOMBRE	**No. CÉDULA**	**CARGO**	**FECHA INGRESO**
María Fernanda Piñeros Peñuela	1.000.861.850	BOAL	10/03//2025
Cristian Andrés Romero Cruz	1.005.851.914	BOAL	11/04/2025
Adriana Cristina Garzon	52.751.798	BOAL	05/05/2025
Juan Jairo Urango Urango	1.039.092.461	BOAL	01/06/2025
Claudia Patricia Pulido	52.542.851	BOAL	15/07/2025
Glady Eliana Duran Pulido	52.231.790	BOAL	15/07/2025
Steven David Cardenas Chima	1.100.687.777	BOAL	22/07/2025
Scarleth Natalia Pulido	52.751.798	BOAL	15/07/2025
Kelis Johana Del Toro Aviles	1.023.009.410	BOAL	04/08/2025
Jesús Manuel Sierra Rey	1.007.411.530	BOAL	10/08/2025

Tabla 6. Personal BOAL

5.1.2. COMUNICADOS ENVIADOS Y RECIBIDOS

ENVIADOS POR EL CONTRATISTA CONSORCIO DC			
No. CONSECUTIVO	**ASUNTO**	**DESTINO**	**FECHA**
OF.CDC 14	PLAN PIPMA	Velnec S.A	20/01/2025
OF.CDC 25	PMARCD	Velnec S. A	27/01/2025
OF.CDC 41	PLAN PIPMA V3	Velnec S. A	06/02/2025
OF.CDC 043	RESPUESTA A SU COMUNICADO 0031.25 – TUN – GTC. “SOLICITUD INVENTARIO FORESTAL DE SEGMENTOS PRIORIZADOS”.	Velnec S.A	07/02/2025
OF.CDC 066	ALCANCE INVENTARIO SUMIDEROS CIVS. 6000751, 6000760, 6001827Y 6000547.	Velnec S. A	19/02/2025
OF.CDC 067	REMISIÓN RESPUESTA SECRETARIA DE AMBIENTE.	Velnec S. A	19/02/2025
OF.CDC 068	INFORME DIAGNOSTICO PRELIMINAR V2	Velnec S. A	20/02/2025
OF.CDC 069	SOLICITUD APROBACIÓN CAMBIO PROFESIONAL FORESTAL	Velnec S. A	20/02/2025
OF.CDC 070	RESPUESTA COMUNICADO OF.CDC 070 – OBSERVACIONES INFORME AMBIENTAL 1.	Velnec S. A	21//02/2025

ENVIADOS POR EL CONTRATISTA CONSORCIO DC			
No. CONSECUTIVO	**ASUNTO**	**DESTINO**	**FECHA**
OF.CDC 072	INGRESO – PROFESIONAL FORESTAL PERSONAL PLANTILLA MÍNIMA CONTRATO DE OBRA.	Velnec S. A	21/02/2025
OF.CDC 078	INFORME VERIFICACIÓN FORESTAL	Velnec S. A	25/02/2025
OF.CDC 082	ALCANCE A OFICIO OF.CDC 070-20.02.2025 AJUSTE INFORME AMBIENTAL 1	Velnec S. A	28/02/2025
OF.CDC 089	REMITIR INFORME 2 AMBIENTAL	Velnec S. A	04/03/2025
OF.CDC 090	INFORME ACTUALIZACION RESOLUCIÓN NO. 01964 DE 2024 NOVEDADES SOBRE EL ARBOLADO – FEBRERO DE 2025	Velnec S. A	04/03/2025
OF.CDC 096	RESPUESTA A SU COMUNICADO NO 0058.25 – TUN - GTC: SOLICITUD ENTREGA DOCUMENTACIÓN AL PROVEEDOR DE BAÑOS PORTÁTILES.	Velnec S. A	05/03/2025
OF.CDC 108	INVENTARIO DE SUMIDERO CIV 6001042	Velnec S. A	12/03/2025
OF.CDC 112	ALCANCE AL COMUNICADO OF.CDC 108 DEL 12.03.2025 - INVENTARIO DE SUMIDEROS CIV 6001042	Velnec S. A	13/03/2025
OF.CDC 113	PROVEEDOR DE UNIDADES SANITARIAS DEL CTO.	Velnec S. A	13.03.2025
OF.CDC 120	DOCUMENTOS SOLICITUD DE PERMISO SDA CIV 6001167	Velnec S. A	18/03/2025
OF.CDC.130	RESPUESTA COMUNICADO 0084.25 – TUN – GTC – INFORME SST 2 – V3	Velnec S. A	26.03.2025
OF.CDC.144	INVENTARIO SUMIDEROS ALEDAÑOS CIVS. 600897, 6000587	Velnec S. A	02/04/2025
OF.CDC.153	RESPUESTA A SU COMUNICADO NO 0098.25 – TUN – GTC – LLAMADO DE ATENCIÓN AFECTACIÓN VEGETACIÓN CIV 6000547	Velnec S. A	07/04/2025
OF.CDC.154	REMISIÓN FICHAS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO AMBIENTAL Y SST – MES DE MARZO 2025	Velnec S. A	08/04/2025
OF.CDC.155	ALCANCE AL COMUNICADO DE INTERVENTORÍA NO. 0119.25 – TUN – GTC	Velnec S. A	08/04/2025
OF.CDC.157	INVENTARIO SUMIDEROS COMPONENTE AMBIENTAL	Velnec S. A	09/04/2025
OF.CDC.158	CERTIFICADOS DE NO GENERACIÓN DE RCD	Velnec S. A	10/05/2025
OF.CDC.162	PMA-RCD MARZO 2025	Velnec S. A	11/05/2025
OF.CDC.163	SOCIALIZACIÓN PRESTAMO BAÑO SAN VICENTE	Velnec S. A	14/04/2025
OF.CDC.169	ALCANCE OFICIO OF.CDC 158-10.04.2025 NO GENERACIÓN RCD	Velnec S. A	24/04/2025
OF.CDC.170	PMA-RCD MARZO 2025 V2	Velnec S. A	24/04/2025
OF.CDC 171	SOPORTE EQUIPO PERSONAL PARA ACTIVIDAD DE TALA DE ARBOLES CIV 6000547	Velnec S. A	24/04/2025
OF.CDC.172	INFORME MENSUAL AMBIENTAL NO. 3 - V2	Velnec S. A	24/04/2025
OF.CDC.174	INFORME MENSUAL AMBIENTAL NO. 4	Velnec S. A	25/04/2025
OF.CDC 184	FOAC32 - FICHAS EVALUACION Y SEGUIMIENTO ABRIL 2025	Velnec S. A	02/05/2025
OF.CDC 185	INFORME MENSUAL AMBIENTAL NO. 4 V3	Velnec S. A	02/02/2025
OF.CDC 192	INFORME DE GESTIÓN TRATAMIENTO SILVICULTURAL – NUEVO MUZU CIV 6000547.	Velnec S. A	13/05/2025
OF.CDC 196	PMARCD - ABRIL 2025	Velnec S. A	15/05/2025

ENVIADOS POR EL CONTRATISTA CONSORCIO DC			
No. CONSECUTIVO	**ASUNTO**	**DESTINO**	**FECHA**
OF.CDC.206	RESPUESTA SOLICITUD INFORME DE PROYECCIÓN DE INSTALACIÓN DE ASFALTO A PARTIR DE GCR	Velnec S. A	21/05/2025
OF.CDC.207	ACCIONES CORRECTIVAS SUMIDEROS CIV 6001042	Velnec S. A	23/05/2025
OF.CDC.208	PMARCD - ABRIL 2025 V2	Velnec S. A	23/05/2025
OF.CDC 212	INFORME DE GESTIÓN TRATAMIENTO SILVICULTURAL – NUEVO MUZU CIV 6000547. V2	Velnec S. A	26/05/2025
OF.CDC 214	FOAC32 - FICHAS EVALUACION Y SEGUIMIENTO MAYO 2025	Velnec S. A	26/05/2025
OF.CDC 215	INFORME MENSUAL AMBIENTAL NO. 5	Velnec S. A	26/05/2025
OF.CDC 220	INVENTARIO DE SUMIDEROS COMPONENTE AMBIENTAL NUEVO MUZU	Velnec S. A	28/05/2025
OF.CDC 221	INVENTARIO DE SUMIDEROS COMPONENTE AMBIENTAL EL CARMEN	Velnec S. A	28/05/2025
OF.CDC 225	INFORME MENSUAL AMBIENTAL NO. 5 V2	Velnec S. A	30/05/2025
OF.CDC 228	INVENTARIO DE SUMIDEROS COMPONENTE AMBIENTAL SAMORE	Velnec S. A	04/06/2025
OF.CDC 231	ALCANCE FOAC 18 - SEGUIMIENTO APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA MODIFICADA CON GRANO DE CAUCHO RECICLADO - INFORME MENSUAL AMBIENTAL NO 5 V2	Velnec S. A	06/06/2025
OF.CDC 235	PMARCD - MAYO 2025	Velnec S. A	09/06/2025
OF.CDC 237	SOLICITUD DE REUBICACIÓN DE 03 CONTENEDORES – SECTOR NUEVO MUZÚ	EMPRESA LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P. – LIME	12/06/2025
OF.CDC 238	NOTIFICACION DE SOLICITUD A EMPRESA LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P. – LIME	Velnec S. A	12/06/2025
OF.CDC 240	PMARCD - MAYO 2025 V2	Velnec S. A	13/06/2025
OF.CDC 252	INFORME MENSUAL AMBIENTAL No. 6	Velnec S. A	25/06/2025
OF.CDC 256	FOAC32 - FICHAS EVALUACION Y SEGUIMIENTO SSTA JUNIO 2025	Velnec S. A	1/07/2025
OF.CDC 261	INFORME MENSUAL AMBIENTAL No. 6 V2	Velnec S. A	03/07/2025
OF.CDC 263	ALCANCE AL COMUNICADO 0221.25 – TUN - GTC - Llamado de atención acopio inadecuado de materiales y residuos frente de obra Nuevo Muzu.	Velnec S. A	07/072025
OF.CDC 266	INVENTARIO DE SUMIDEROS COMPONENTE AMBIENTAL ABRAHAM LINCOLN	Velnec S. A	16/07/2025
OF.CDC 269	PMARCD - JUNIO 2025	Velnec S. A	21/07/2025
OF.CDC 271	PRESENTACIÓN BAÑO FEMENINO - ABRAHAM LINCOLN	Velnec S. A	22/07/2025
OF.CDC 274	INFORME MENSUAL AMBIENTAL No. 7	Velnec S. A	25/07/2025
OF.CDC 278	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES SILVICULTURALES AUTORIZADAS	Velnec S. A	28/072025
OF.CDC 286	FOAC32 - FICHAS EVALUACION Y SEGUIMIENTO SSTA JULIO 2025	Velnec S. A	04/08/2025
OF.CDC 287	SOLICITUD USUARIO PARA ACTUALIZACIÓN DE TRATAMIENTO SILVICULTURALES EJECUTADOS EN DESARROLLO DEL PROYECTO EN EL SIGAU	Velnec S. A	05/08/2025
OF.CDC 288	REMISIÓN INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES SILVICULTURALES Y ANEXOS	Velnec S. A	05/08/2025

ENVIADOS POR EL CONTRATISTA CONSORCIO DC			
No. CONSECUTIVO	**ASUNTO**	**DESTINO**	**FECHA**
OF.CDC 292	ACTIVIDADES AMBIENTALES-FORESTALES NO AUTORIZADAS	Velnec S. A	07/08/2025
OF.CDC 294	RESIDUOS CIV 6001045 EL CARMEN	Velnec S. A	15/08/2025
OF.CDC 295	PMARCD JULIO 2025	Velnec S. A	15/08/2025
OF.CDC 300	ZONA VERDE NUEVO MUZU	Velnec S. A	22/08/2025
OF.CDC 303	INFORME MENSUAL AMBIENTAL No. 8	Velnec S. A	25/08/2025
OF.CDC 313	FOAC32 - FICHAS EVALUACION Y SEGUIMIENTO SSTA JULIO 2025	Velnec S. A	30/08/2025
OF.CDC 314	INFORME MENSUAL AMBIENTAL No. 8 V2	Velnec S. A	30/08/2025
OF.CDC 317	Inventario de Sumideros Componente Ambiental - Nuevo Muzu	Velnec S. A	06/09/2025
OF.CDC 321	SOLICITUD REUBICACIÓN DE CONTENEDORES NUEVO MUZU	EMPRESA LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P. – LIME	09/09/2025
OF.CDC 322	NOTIFICACION DE SOLICITUD A EMPRESA LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P. – LIME	Velnec S. A	09/09/2025
OF.CDC 324	PMARCD JULIO 2025 V3	Velnec S. A	09/09/2025
OF.CDC 326	ACCIONES CORRECTIVAS NUEVO MUZU	Velnec S. A	11/09/2025
OF.CDC 333	PMARCD AGOSTO 2025	Velnec S. A	18/09/2025
OF.CDC 334	CIERRE AMBIENTAL ABRAHAM LINCOLN	Velnec S. A	18/09/2025
OF.CDC 335	REITERACIÓN REUBICACIÓN DE CONTENEDORES NUEVO MUZU	EMPRESA LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P. – LIME	18/09/2025
OF.CDC 336	NOTIFICACIÓN REITERACIÓN SOLICITUD REALIZADA A LA EMPRESA LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P. – LIME	Velnec S. A	18/09/2025
OF.CDC 341	DOCUMENTOS PROVEEDOR - RESTAURACIÓN ZONA VERDE	Velnec S. A	23/09/2025
OF.CDC 343	PMARCD AGOSTO V2	Velnec S. A	24/09/2025
OF.CDC 345	INFORME MENSUAL AMBIENTAL No. 9	Velnec S. A	25/09/2025
OF.CDC 348	INVENTARIO DE SUMIDEROS COMPONENTE AMBIENTAL EL CARMEN	Velnec S. A	30/09/2025
OF.CDC 349	FOAC32 - FICHAS EVALUACION Y SEGUIMIENTO SSTA SEPTIEMBRE 2025	Velnec S. A	30/09/2025
OF.CDC 354	Remisión de informe final de ejecución de actividades silviculturales y anexos.	Velnec S. A	15/10/2025
OF.CDC 358	FOAC18 - SEGUIMIENTO APLICACION MEZCLA ASFALTICA MODIFICADA SEPTIEMBRE	Velnec S. A	16/10/2025
OF.CDC 362	Respuesta al comunicado N.º 0319.25-TUN-GTC – Observaciones al Informe Final de Tratamiento Silvicultural – Resolución 1964 de 2024.	Velnec S. A	21/10/2025
OF.CDC 364	PMARCD - SEPTIEMBRE 2025	Velnec S. A	24/10/2025

ENVIADOS POR EL CONTRATISTA CONSORCIO DC			
No. CONSECUTIVO	**ASUNTO**	**DESTINO**	**FECHA**
OF.CDC 370	INFORME MENSUAL AMBIENTAL No. 10	Velnec S. A	31/10/2025
OF.CDC 373	FOAC32 - FICHAS EVALUACION Y SEGUIMIENTO SSTA OCTUBRE 2025	Velnec S. A	05/11/2025
OF.CDC 379	Entrega de actualización SIGAU – Resolución No. 01964 de 2024	Velnec S. A	05/11/2025
OF.CDC 387	FOAC32 - FICHAS EVALUACION Y SEGUIMIENTO SSTA NOVIEMBRE 2025	Velnec S. A	01/12/2025
OF.CDC 391	PMARCD – OCTUBRE 2025	Velnec S. A	10/12/2025
OF.CDC 395	INFORME MENSUAL No. 11 Y PMARCD NOV 2025	Velnec S. A	28/12/2025
OF.CDC 396	GCR COMPILADO	Velnec S. A	31/12/2025

Tabla 7. Comunicados enviados por el contratista

RECIBIDOS POR LA INTERVENTORIA VELNEC S. A			
No. CONSECUTIVO	**ASUNTO**	**DESTINO**	**FECHA**
0010.25 – TUN - GTC	OBSERVACIONES AL DOCUMENTO PIPMA	CONSORCIO DC 2025	22/01/2025
0014.25 - TUN – GTC	RESPUESTA OFICIO OF.CFC.025 CONCEPTO PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (V1)	CONSORCIO DC 2025	27/01/2025
0024.25 - TUN – GTC	REITERACIÓN SUBSANACIÓN PIPMA	CONSORCIO DC 2025	03/02/2025
0029.25 – TUN - GTC	RTA OF. CDC041- CONCEPTO FAVORABLE PIPMA	CONSORCIO DC 2025	06/02/2025
0030.25 – TUN - GTC	NOTIFICACION METODOLOGIA DE CALIFICACION LABORES AMBIENTALES Y SST	CONSORCIO DC 2025	06/02/2025
0031.25 – TUN - GTC	SOLICITUD INVENTARIO FORESTAL DE SEGMENTOS PRIORIZADOS.	CONSORCIO DC 2025	06/02/2025
0036.25 - TUN – GTC	RTA COMUNICADO OF.CDC 043.	CONSORCIO DC 2025	07/02/2025
0040.25 – TUN - GTC	SOLICITUD INFORMACIÓN ESTADO DE CONCEPTO SILVICULLTURAL ANTE LA SDA	FDLT	11/02/2025
0041.25 - TUN – GTC	ALCANCE AL COMUNICADO 0036.25 - TUN – GTC INVENTARIO FORESTAL.	CONSORCIO DC 2025	12/02/2025
0045.25 – TUN - GTC	ALCANCE AL COMUNICADO 00.41-TUN-GTC-TRATAMIENTO SILVICULTURAL AUTORIZADO BAJO RESOLUCIÓN 1964 DE 2024.	CONSORCIO DC 2025	14/02/2025
0057.25 – TUN - GTC	Alcance comunicado 0031.25-TUN-GTC - Reiteración solicitud entrega inventario forestal segmentos priorizados	CONSORCIO DC 2025	24/02/2025
0063.25 – TUN - GTC	RESPUESTA COMUNICADO OF.CDC 067 – SOLICITUD REMISIÓN DOCUMENTOS PARA INICIAR TRAMITE DE PERMISOS AMBIENTALES EN EL CIV 6002089.	CONSORCIO DC 2025	28/02/2025
0064.25 – TUN - GTC	RESPUESTA OFICIO OF.CDC 082 - APROBACIÓN INFORME AMBIENTAL N°1 (V2).	CONSORCIO DC 2025	28/02/2025

RECIBIDOS POR LA INTERVENTORIA VELNEC S. A			
No. CONSECUTIVO	**ASUNTO**	**DESTINO**	**FECHA**
0069.25 – TUN - GTC	Respuesta oficio OF.CDC 0096.25 – Aprobación proveedor baños portátiles	CONSORCIO DC 2025	05.03.2025
0070.25 – TUN - GTC	Respuesta comunicada OF.CDC 089 – observaciones informe ambiental y forestal No 2.	CONSORCIO DC 2025	05.03.2025
0077.25 – TUN - GTC	Respuesta comunicada OF.CDC 106 – observaciones informe ambiental y forestal No 2 – V2.	CONSORCIO DC 2025	13.03.2025
0082.25 - TUN - GTC	Respuesta comunicado OF.CDC.113 – Aprobación proveedor baños portátiles y gestor de residuos líquidos domiciliarios	CONSORCIO DC 2025	17.03.2025
0122.25 – TUN - GTC	Respuesta comunicado 0077.25 – TUN – GTC – Informe mensual ambiental No. 2 - V2	CONSORCIO DC 2025	19.03.2025
0087.25 – TUN - GTC	Respuesta oficio OF.CDC.122 – Aprobación informe ambiental No. 2 (V3)	CONSORCIO DC 2025	20.03.2025
0098.25 – TUN - GTC	Llamado de atención afectación vegetación y zonas verdes CIV6000547	CONSORCIO DC 2025	28.03.2025
0102.25 – TUN - GTC	REITERACIÓN SOLICITUD INVENTARIO AMBIENTAL INICIAL DE SUMIDEROS CIV 6000587 – CIV 6000897.	CONSORCIO DC 2025	01/04/2025
0106.25 – TUN - GTC	Remisión Documentación trámite de manejo silvicultural en CIV 6001167.	CONSORCIO DC 2025	02/04/2025
0107.25 – TUN - GTC	Remisión fichas de evaluación y calificación de desempeño ambiental y SST – mes de marzo 2025	CONSORCIO DC 2025	02/04/2025
0111.25 – TUN - GTC	Reiteración entrega Informe Ambiental de Obra No 3	CONSORCIO DC 2025	03/04/2025
0111.25 – TUN - GTC	Respuesta oficio OF.CDC 147 – Concepto informe ambiental de obra N°3 V1.	CONSORCIO DC 2025	04/04/2025
0119.25 – TUN - GTC	Respuesta OF.CDC 153 - Llamado de atención afectación zonas verdes CIV 6000547.	CONSORCIO DC 2025	07/04/2025
0124.25 – TUN - GTC	Respuesta OF.CDC 155 – compensación zonas verdes CIV 6000547.	CONSORCIO DC 2025	08/04/2025
0131.25 – TUN - GTC	Remisión certificados de no generación de RCD – PIN-GEN-26829.	FDLT	10/04/2025
0132.25 – TUN - GTC	Respuesta comunicado OF.CDC 121 – observaciones reporte mensual PMARCD – PIN-GEN 26829 de marzo 2025.	CONSORCIO DC 2025	14/04/2025
0143.25 – TUN - GTC	Notificación novedades arbolado tratamiento silvicultural bajo resolución 1964 de 2024.	CONSORCIO DC 2025	23/04/2025
0147.25 – TUN - GTC	Respuesta comunicado OF.CDC 170 – aprobación reporte mensual PMARCD –PIN-GEN 26829 de marzo 2025.	CONSORCIO DC 2025	25/04/2025
0149.25 – TUN - GTC	Alcance comunicado 111.25 -TUN-GTC – Aprobación informe ambiental de obra N°3 V2.	CONSORCIO DC 2025	25/04/2025
0153.25 – TUN - GTC	Solicitud remisión Informe de gestión tratamiento silvicultural – Nuevo Muzu CIV 6000547.	CONSORCIO DC 2025	28/04/2025
0166.25 – TUN - GTC	Respuesta comunicado OF.CDC 183 – observaciones informe ambiental y forestal N° 4 – V2.	CONSORCIO DC 2025	02/05/2025
0168.25 – TUN - GTC	Alcance comunicado OF.CDC 185 – Aprobación informe ambiental de obra N°4 V3	CONSORCIO DC 2025	05/05/2025
0173.25 – TUN - GTC	Solicitud informe de proyección de instalación de asfalto a partir de GCR	CONSORCIO DC 2025	09/05/2025
0174.25 – TUN - GTC	Llamado de atención manejo de sumideros CIV 6001042	CONSORCIO DC 2025	12/05/2025

RECIBIDOS POR LA INTERVENTORIA VELNEC S. A			
No. CONSECUTIVO	**ASUNTO**	**DESTINO**	**FECHA**
0175.25 – TUN - GTC	Respuesta comunicado OF.CDC 192 – observaciones informe tratamiento silvicultural individuos arbóreos N°34 y N°35 – Resolución 1964 de 2024.	CONSORCIO DC 2025	16/05/2025
0176.25 – TUN - GTC	Observaciones informe de actualización del inventario forestal de la resolución 1964 de 2024.	CONSORCIO DC 2025	16/05/2025
0178.25 – TUN - GTC	Respuesta Observaciones al PMRCD Abril 2025	CONSORCIO DC 2025	19/05/2025
0183.25 – TUN - GTC	Alcance comunicado 0174.25 – TUN - GTC – Reiteración entrega de informe de acciones correctivas, llamado de atención manejo de sumideros CIV 6001042.	CONSORCIO DC 2025	23/05/2025
0186.25 – TUN - GTC	Aprobación reporte mensual PMARCD –PIN-GEN 26829 de abril 2025.	CONSORCIO DC 2025	24/5/2025
0190.25 – TUN - GTC	CONCEPTO INFORME TRATAMIENTO SILVICULTURAL CIV 6000547	CONSORCIO DC 2025	26/05/2025
0192.25 – TUN - GTC	Observaciones informe ambiental y forestal N° 5 – V1	CONSORCIO DC 2025	28/052025
0208.25 – TUN - GTC	Observaciones informe Programa de Manejo Ambiental de Residuos de Construcción y Demolición – PMARCD– Mayo 2025	CONSORCIO DC 2025	10/06/2025
210.25 – TUN - GTC	Aprobación reporte mensual PMARCD – PIN-GEN 26829 de mayo 2025.	CONSORCIO DC 2025	17/06/2025
219.25 – TUN - GTC	observaciones informe ambiental y forestal N° 6 – V1	CONSORCIO DC 2025	28/06/2025
220.25 – TUN - GTC	Remisión fichas de evaluación y calificación de desempeño ambiental y SST – mes de junio 2025	CONSORCIO DC 2025	01/07/2025
221.25 – TUN - GTC	Llamado de atención acopio inadecuado de materiales y residuos en frente de obra Nuevo Muzu.	CONSORCIO DC 2025	02/07/2025
229.25 – TUN - GTC	Aprobación informe ambiental de obra N°6 V2.	CONSORCIO DC 2025	07/07/2025
237.25 – TUN - GTC	aprobación reporte mensual PMARCD –PIN-GEN 26829 de junio 2025.	CONSORCIO DC 2025	22/07/2025
249.25 – TUN - GTC	Remisión fichas de evaluación y calificación de desempeño ambiental y SST – mes de julio 2025	CONSORCIO DC 2025	04/08/2025
250.25 – TUN - GTC	Aprobación informe ambiental de obra N°7 V2.	CONSORCIO DC 2025	04/08/2025
250.25 – TUN - GTC	CONCEPTO INFORME TRATAMIENTO SILVICULTURAL – NUEVO MUZU	CONSORCIO DC 2025	05/08/2025
278.25 – TUN - GTC	Aprobación Informe Ambiental de Obra No. 8 V2	CONSORCIO DC 2025	30/082025
280.25 – TUN - GTC	Solicitud remisión reporte del Programa de Manejo Ambiental de Residuos de Construcción y Demolición – PMARCD – Julio 2025	CONSORCIO DC 2025	01/09/2025
289.25 – TUN - GTC	aprobación reporte mensual PMARCD – PIN-GEN 26829 de julio 2025.	CONSORCIO DC 2025	09/09/2025
292.25 – TUN - GTC	Llamado de atención incumplimiento al Programa de Manejo Ambiental de Obra	CONSORCIO DC 2025	09/09/2025
296.25 – TUN - GTC	Solicitud cierre ambiental – frente de obra Abraham Lincoln	CONSORCIO DC 2025	15/09/2025
298.25 – TUN - GTC	Solicitud restablecimiento de zonas verdes y ejecución de tratamientos silviculturales – frente de obra Nuevo Muzu	CONSORCIO DC 2025	23/09/2025
302.25 – TUN - GTC	Observaciones informe Programa de Manejo Ambiental de Residuos de Construcción y Demolición PMARCD Agosto 2025	CONSORCIO DC 2025	24/09/2025
303.25 – TUN - GTC	aprobación reporte mensual PMARCD – PIN-GEN 26829 de agosto 2025.	CONSORCIO DC 2025	25/09/2025

RECIBIDOS POR LA INTERVENTORIA VELNEC S. A			
No. CONSECUTIVO	**ASUNTO**	**DESTINO**	**FECHA**
308.25 – TUN - GTC	Remisión fichas de evaluación y calificación de desempeño ambiental y SST – mes de septiembre 2025	CONSORCIO DC 2025	29/09/2025
311.25 – TUN - GTC	Remisión respuesta de la SDA pago compensación tratamiento silvicultural Resolución 1964 de 2024.	CONSORCIO DC 2025	02/10/2025
314.25 – TUN - GTC	Respuesta comunicado OF.CDC 345 – Aprobación informe ambiental de obra N°9 V1.	CONSORCIO DC 2025	02/10/2025
323.25 – TUN - GTC	Respuesta comunicado OF.CDC 362 – CONCEPTO INFORME FINAL TRATAMIENTO SILVICULTURAL	CONSORCIO DC 2025	21/10/2025
326.25 – TUN - GTC	aprobación reporte mensual PMARCD – PIN-GEN 26829 de septiembre 2025	CONSORCIO DC 2025	28/10/2025
329.25 – TUN - GTC	Alcance A Comunicado 306.25-Tun-Gtc - Aprobación Np´S 35 - 36. Cto 622 De 2024	CONSORCIO DC 2025	28/10/2025
338.25 – TUN - GTC	Remisión fichas de evaluación y calificación de desempeño ambiental y SST – mes de octubre 2025	CONSORCIO DC 2025	31/10/2025
345.25 – TUN - GTC	Remisión fichas de evaluación y calificación de desempeño ambiental y SST – mes de noviembre 2025	CONSORCIO DC 2025	11/11/2025
346.25 – TUN - GTC	SOLICITUD ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA LA LIQUIDACION AMBIENTAL Y SST DE OBRA	CONSORCIO DC 2025	12/11/2025
347.25 – TUN - GTC	SOLICITUD CIERRE AMBIENTAL EN NUEVO MUZU Y EL CARMEN.	CONSORCIO DC 2025	12/11/2025
357.25 – TUN - GTC.	SOLICITUD ENTREGA DE PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION Y CIERRE DE PIN 26829.	CONSORCIO DC 2025	05/12/2025
359.25 – TUN - GTC	Respuesta comunicado OF.CDC 370 – Aprobación informe ambiental de obra N°10 V1.	CONSORCIO DC 2025	15/12/2025
363.25 – TUN - GTC	Respuesta comunicado OF.CDC 391 – Aprobación Programa de Manejo Ambiental de Residuos de Construcción y Demolición OCTUBRE 2025 – PIN 26829.	CONSORCIO DC 2025	22/12/2025
366.25 – TUN - GTC	Aprobación Programa de Manejo Ambiental de Residuos de Construcción y Demolición NOVIEMBRE 2025 – PIN 26829	CONSORCIO DC 2025	19/01/2026

Tabla 8. Comunicados recibidos por la interventoría

5.1.3. COMITÉS Y REUNIONES AMBIENTALES

TEMA	FECHA	PARTICIPANTES
Revisión Documento PMARCD	24/01/2025	Profesionales ambientales de Contratista e Interventoría
Comité Integral	26/02/2025	Profesionales de contratista, interventoría y Entidad
Comité Integral	11/03/2025	Profesionales de contratista, interventoría y Entidad
Comité Integral	21/03/2025	Profesionales de contratista, interventoría y Entidad
Comité Integral	23/02/2025	Profesionales de contratista, interventoría y Entidad
Comité Integral	8/04/2025	Profesionales de contratista, interventoría y Entidad
Recorrido de Obra	10/04/2025	Profesionales de contratista, interventoría
Comité Integral	15/04/2025	Profesionales de contratista, interventoría y Entidad
Mesa de Trabajo	23/04/2025	Profesionales de contratista, interventoría
Recorrido de Obra	24/04//2025	Profesionales de contratista, interventoría
Comité Integral	29/04/2025	Profesionales de contratista, interventoría y Entidad
Mesa de Trabajo en la Alcaldía	6/05/2025	Profesionales de contratista, interventoría y Entidad
Comité Integral	7/05/2025	Profesionales de contratista, interventoría y Entidad
Recorrido de Obra	9/05/2025	Profesionales de contratista, interventoría
Recorrido de Obra	13/05/2025	Profesionales de contratista, interventoría
Comité Integral	20/05/2025	Profesionales de contratista, interventoría y Entidad
Mesa de trabajo Ambiental	21/05/2025	Profesionales de contratista, interventoría
Recorrido de Obra Forestal	26/05/2025	Profesionales de contratista, interventoría
Recorrido de Obra	27/05/2025	Profesionales de contratista, interventoría
Recorrido de Obra	27/05/2025	Profesionales de contratista, interventoría
Comité Integral	4/06/2025	Profesionales de contratista, interventoría y Entidad
Recorrido de Obra	10/06/2025	Profesionales de contratista, interventoría
Comité Integral	10/06/2025	Profesionales de contratista, interventoría y Entidad
Comité Integral	17/06/2025	Profesionales de contratista, interventoría y Entidad

Comité Integral	8/07/2025	Profesionales de contratista, interventoría y Entidad
Recorrido de Obra	8/07/2025	Profesionales de contratista, interventoría
Comité integral	16/07/2025	Profesionales de contratista, interventoría y Entidad
Comité Integral	23/07/2025	Profesionales de contratista, interventoría y Entidad
Recorrido de Obra	23/07/2025	Profesionales de contratista, interventoría
Mesa de Trabajo	4/08/2025	Profesionales de contratista, interventoría
Recorrido de Obra	5/08/2025	Profesionales de contratista, interventoría
Comité Integral	13/08/2025	Profesionales de contratista, interventoría y Entidad
Comité Integral	20/08/2025	Profesionales de contratista, interventoría y Entidad
Comité Integral	27/08/2025	Profesionales de contratista, interventoría y Entidad
Mesa de Trabajo	28/08/2025	Profesionales de contratista, interventoría
Comité Integral	3/09/2025	Profesionales de contratista, interventoría y Entidad
Comité Integral	10/09/2025	Profesionales de contratista, interventoría y Entidad
Recorrido de Obra	15/09/2025	Profesionales de contratista, interventoría
Comité Integral	18/082025	Profesionales de contratista, interventoría y Entidad
Comité Integral	24/09/2025	Profesionales de contratista, interventoría y Entidad
Recorrido de Obra	6/10/2025	Profesionales de contratista, interventoría
Comité Integral	10/10/2025	Profesionales de contratista, interventoría y Entidad
Comité Integral	15/10/2025	Profesionales de contratista, interventoría y Entidad
Comité Integral	22/10/2025	Profesionales de contratista, interventoría y Entidad
Comité Integral	29/10/2025	Profesionales de contratista, interventoría y Entidad
Recorrido de Obra	10/11/2025	Profesionales de contratista, interventoría

Tabla 9. Trazabilidad de reuniones o comités ambientales

5.1.4. SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL

En el marco de la ejecución del Contrato de Obra No. 622 de 2024, el CONSORCIO DC 2025 dio cumplimiento a las actividades programadas para el Componente A – Cumplimiento de las obligaciones ambientales, conforme a lo establecido en el cronograma ambiental aprobado, el cual se adjunta como Anexo 1 – Cronograma de Actividades.

El seguimiento permanente a dicho cronograma permitió verificar la ejecución oportuna de las actividades ambientales planificadas, sin evidenciarse retrasos o incumplimientos que afectaran el desarrollo del componente ambiental durante la vigencia contractual.

Así mismo, como parte del fortalecimiento de la gestión ambiental y del cumplimiento de las obligaciones contractuales, se realizaron capacitaciones ambientales dirigidas al personal vinculado al proyecto, las cuales abordaron temas relacionados con el manejo ambiental en obra, la correcta gestión de residuos, la protección del entorno y el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente. La Tabla No. 10 presenta el detalle de las capacitaciones realizadas, incluyendo los temas abordados y la cantidad de personal participante, constituyéndose en soporte del proceso de sensibilización y formación ambiental implementado.

CONSORCIO DC 2025	**"EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C**	BOGOTÁ Alcaldía Local de Tunjuelito	
CAPACITACIONES COMPONENTE AMBIENTAL	**TEMAS**	**FECHA**	**No. PARTICIPANTES**
1	Charla sobre el PIPMA aprobado para el Contrato	10/03/2025	**11**
2	Charla cuidado y protección a individuos arbóreos y sumideros, aseo a andenes y vías colindantes al proyecto	10 – Abril – 2025	**9**
3	Charla de orden, aseo y limpieza, uso adecuado de unidad sanitaria móvil	15 – Abril – 2025	**8**
4	Socialización de clasificación de los residuos ordinarios, clasificación en las canecas de diferentes colores y la separación de los mismos	18 – Abril - 2025	**7**
5	Clasificación de residuos convencionales, uso adecuado del punto ecológico	21 – Abril - 2025	**5**
6	Capacitación de la importancia de los cerramientos e implementación del PMT	05 – Mayo - 2025	**9**
7	Clasificación de los residuos convencionales	12 – Mayo – 2025	**7**

CONSORCIO DC 2025	"EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C	BOGOTÁ Alcaldía Local de Tunjuelito	
CAPACITACIONES COMPONENTE AMBIENTAL	**TEMAS**	**FECHA**	**No. PARTICIPANTES**
8	Capacitación sobre normas de manejo de transito	16 – Mayo – 2025	**9**
9	Manejo y disposición de los residuos generados en las diferentes actividades como su respectiva clasificación	21 – Mayo - 2025	**7**
10	Capacitación en protección de sumideros y/o cuerpos de agua	05 – Junio - 2025	**6**
11	Capacitación en manejo de flora	05 – Junio - 2025	**6**
12	Capacitación del PMARCD	12 – Junio – 2025	**8**
13	Capacitación en mitigación de partículas en suspensión y protección para el ambiente y el trabajador	19 – Junio - 2025	**9**
14	Capacitación en Plan de Manejo Ambiental, manejo de materiales, acopios y disposición.	04 – Julio - 2025	**8**
15	Capacitación en buenas prácticas de separación en la fuente	10 – Julio - 2025	**4**
16	Capacitación en control de emisiones de polvo y ruido	22 – Julio – 2025	**4**
17	Capacitación en Inducción de Plan de Manejo Ambiental	04 – Agosto - 2025	**6**
18	Capacitación en Manejo de Sustancias químicas	08 – Agosto - 2025	**5**
19	Capacitación en reforestación, recuperación y cuidado de zonas verdes	15 – Agosto – 2025	**7**
20	Capacitación en normatividad ambiental vigente	19 – Agosto – 2025	**5**
21	Capacitación en orden y aseo en los frentes de obra	21 – Agosto – 2025	**10**
22	Capacitación en manejo de campamentos y acopios	02 – Septiembre - 2025	**7**
23	Capacitación en Residuos de Construcción y Demolición PMARCD	04 – Septiembre - 2025	**10**
24	Capacitación en Implementación de medidas para controlar las emisiones atmosféricas	09 – Septiembre – 2025	**9**
25	Capacitación en verificación eficaz de mantenimiento de sumideros, mantenimiento de individuos arbóreos	16 – Septiembre – 2025	**5**
26	Segregación, Almacenamiento y Transporte de RCD	02 – Octubre - 2025	**4**
27	Medidas Preventivas para la intervención de cobertura vegetal	09 – Octubre - 2025	**5**
28	Responsabilidad Ambiental Individual y Colectiva	01 – Noviembre - 2025	**4**
29	Uso eficiente y ahorro del agua en obra	05 – Noviembre - 2025	**5**

Tabla 10. Capacitaciones ambientales

✓ REGISTRO FOTOGRÁFICO


































01/11/2025 08:16am
Bogotá
Colombia


05/11/2025 08:24am
Bogotá
Colombia





TRAZABILIDAD DE APROBACIONES DE INFORMES AMBIENTALES			
No. CONSECUTIVO ENVIADO	**ASUNTO**	**No. CONSECUTIVO APROBACIÓN**	**FECHA**
OF.CDC 082	Informe Ambiental No. 1 V2	0064.25 – TUN - GTC:	28/02/2025
OF.CDC 122	Informe Ambiental No. 2 V3	0087.25 – TUN - GTC	20/03/2025
OF.CDC 172	Informe Ambiental No. 3 V2	0149.25 – TUN - GTC	25/04/2025
OF.CDC 185	Informe Ambiental No. 4 V3	0168.25 – TUN - GTC	05/05/2025
OF.CDC 225	Informe Ambiental No. 5 V2	0202.25 – TUN - GTC	30/05/2025
OF.CDC 261	Informe Ambiental No. 6 V2	0229.25 – TUN - GTC	07/07/2025
OF.CDC 274	Informe Ambiental No. 7 V2	0250.25 – TUN - GTC	04/08/2025
OF.CDC 314	Informe Ambiental No. 8 V2	0278.25 – TUN - GTC	30/08/2025
OF.CDC 345	Informe Ambiental No. 9 V1	0314.25 – TUN - GTC	02/10/2025
OF.CDC 370	Informe Ambiental No. 10 V1	0359.25 – TUN - GTC	15/12/2025
OF.CDC 392	Informe Ambiental No. 11 V1		

Tabla 11. Trazabilidad Aprobación de Informes Ambientales

5.1.5. PERMISOS Y LICENCIAS

Para el desarrollo del Contrato de Obra No. 622 de 2024, el CONSORCIO DC 2025 dio cumplimiento a los requerimientos asociados a permisos, autorizaciones y licencias ambientales aplicables al proyecto, conforme a lo establecido en el Programa de Implementación del Plan de Manejo Ambiental – PIPMA aprobado por la interventoría y la entidad contratante.

Dentro del PIPMA se incluyó de manera detallada la información general de la obra, así como los requerimientos ambientales asociados a la ejecución de las actividades constructivas, entre los cuales se destacan el manejo integral de los Residuos de Construcción y Demolición – RCD**,** la identificación y control de los proveedores de materiales, y la definición de los gestores y sitios autorizados para el aprovechamiento, tratamiento y disposición final de dichos residuos.

Como parte del cumplimiento de las obligaciones ambientales, se realizó la verificación permanente de la vigencia y habilitación de los proveedores y gestores utilizados durante la ejecución del contrato, a través del Directorio de Proveedores de Materiales de Construcción, Sitios de Disposición Final, Aprovechamiento y Tratamiento de Residuos de Construcción y Demolición – RCD del IDU, garantizando que todos los actores involucrados contaran con los permisos y registros exigidos por la normativa vigente.

5.1.5.1. PIN AMBIENTAL

En la fase preliminar del contrato, y una vez aprobado el Plan de Manejo Ambiental de Residuos de Construcción y Demolición – PMA RCD por parte de la interventoría y la entidad contratante, se procedió a la apertura del PIN Ambiental No. 26829, el cual permitió realizar el reporte, seguimiento y control de la gestión de los RCD generados durante la ejecución contractual.

El PIN Ambiental constituyó una herramienta fundamental para garantizar la trazabilidad de los residuos, desde su generación en los frentes de obra hasta su aprovechamiento o disposición final, conforme a los lineamientos establecidos por la autoridad ambiental y el IDU. A través de este mecanismo se registraron de manera periódica las cantidades de residuos generados, transportados y gestionados, asegurando la transparencia y el cumplimiento de las obligaciones ambientales contractuales.

Los soportes correspondientes al radicado del PIN Ambiental se presentan en las Ilustraciones 2 y 3, los cuales hacen parte integral de la documentación ambiental del contrato y respaldan el cumplimiento de este requisito durante toda la ejecución del proyecto.



Ilustración 2. Radicado de PIN AMBIENTAL



Ilustración 3. Radicado de PIN AMBIENTAL

En consecuencia, se concluye que el CONSORCIO DC 2025 cumplió con los permisos y autorizaciones ambientales requeridos para el desarrollo del contrato, no evidenciándose observaciones ni requerimientos pendientes asociados a este componente al cierre de la ejecución contractual.

5.1.5.2. PERMISO SILVICULTURAL – RESOLUCIÓN 1964 DE 2024

Para la ejecución del Contrato de Obra No. 622 de 2024, el CONSORCIO DC 2025 dio cumplimiento a las obligaciones asociadas al Permiso Silvicultural otorgado mediante la Resolución No. 1964 de 2024, acto administrativo vigente para el proyecto, el cual autorizó la intervención de individuos arbóreos localizados en el área de influencia de las obras.

De acuerdo con lo establecido en la mencionada resolución y en el concepto técnico que la sustenta, se evaluaron un total de treinta y seis (36) individuos arbóreos, los cuales corresponden en su mayoría a la especie Holly liso, seguidos por individuos de Urapán y Jazmín de la China, tal como se evidencia en la Ilustración 4 – Especies dominantes.

Así mismo, la resolución autorizó la ejecución de quince (15) tratamientos integrales y diez (10) podas radiculares, lo que implicó que las actividades silviculturales se enfocaran en garantizar la sobrevivencia, estabilidad y permanencia de veinticinco (25) individuos arbóreos, así como el seguimiento a las talas autorizadas, conforme a lo indicado en la Ilustración 5 – Tratamientos silviculturales autorizados.

En cuanto a la localización de los individuos arbóreos evaluados, se estableció que treinta y tres (33) individuos se encuentran ubicados en la Diagonal 53 Sur con Carrera 61, mientras que los tres (3) individuos restantes se localizan en la Carrera 58 con Diagonal 51B Sur, de acuerdo con la información consignada en las fichas técnicas de registro.

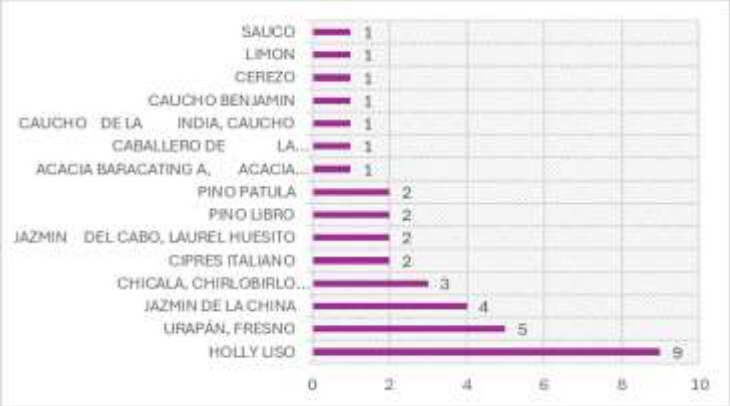


Ilustración 4. Especies Dominantes

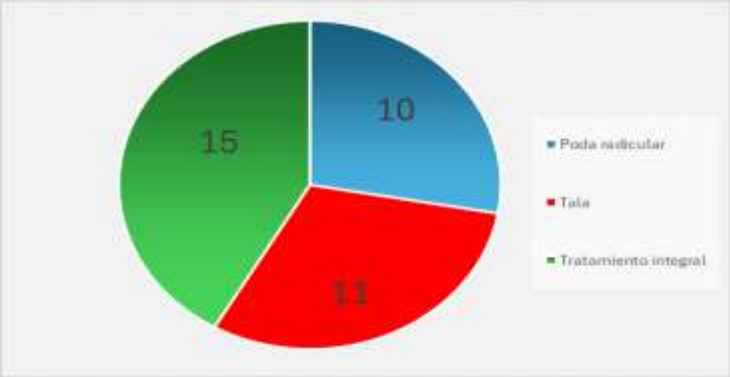


Ilustración 5. Tratamientos silviculturales autorizados

Cumplimiento de obligaciones y condiciones del permiso

Durante la ejecución contractual, el CONSORCIO DC 2025 dio cumplimiento a las obligaciones, condiciones y lineamientos establecidos en la Resolución 1964 de 2024, entre los cuales se destacan:

- **Cumplimiento de los requisitos técnicos:** Los tratamientos silviculturales fueron ejecutados conforme a lo establecido en el concepto técnico y por personal idóneo en silvicultura urbana, garantizando la correcta aplicación de las técnicas autorizadas.
- **Seguimiento y control:** Se atendieron las actividades de seguimiento y control por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA, permitiendo la verificación del cumplimiento de las condiciones impuestas en el permiso.
- **Compensación por tala:** Se dio cumplimiento a las obligaciones relacionadas con la compensación económica derivada de las talas autorizadas, conforme a los valores establecidos en el acto administrativo, los cuales superan los treinta y seis millones de pesos ($36.000.000 COP).
- **Plazo de ejecución:** Las actividades autorizadas se ejecutaron dentro del plazo establecido en la resolución, sin requerir prórrogas adicionales que afectaran el cumplimiento del permiso.
- **Socialización y cumplimiento normativo:** Se realizaron las socializaciones correspondientes con la comunidad previo a la ejecución de las actividades silviculturales y se garantizó el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable, incluyendo manejo de residuos, protección de flora silvestre y actualización de información en los sistemas correspondientes (SIGAU).

- **Rescate de flora silvestre en veda:** En caso de no evidenciar especies en veda (como orquídeas o bromelias), se dejó el respectivo soporte mediante registro fotográfico; de presentarse, se habría procedido conforme a los lineamientos de rescate y reubicación.
- **Documentación y reportes:** Se elaboraron y remitieron los informes técnicos requeridos, detallando los tratamientos ejecutados, las talas realizadas y la disposición del material vegetal, los cuales hacen parte integral de la documentación de cierre del componente forestal.

Ver Anexo 7 - Detalle el estado de los árboles conceptuados en la mencionada resolución

Actuaciones y comunicaciones relevantes

En el marco del seguimiento al permiso silvicultural, se recibió el comunicado No. 176.25 – TUN – GTC, mediante el cual la interventoría remitió oficio del Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito relacionado con la verificación de la supuesta ausencia de los individuos arbóreos No. 31 y 32. Al respecto, se informó que dichos individuos sí se encontraban localizados en la Diagonal 53 Sur No. 61C, información que fue remitida a la interventoría el 30 de mayo de 2025 para su revisión y escalamiento a la supervisión, dejando trazabilidad documental de la novedad presentada.

Adicionalmente, durante el mes de mayo de 2025 se remitió a la interventoría, mediante el oficio No. 192.25 – TUN – GTC, el informe correspondiente a la tala de dos (02) individuos arbóreos ubicados en el frente de obra Nuevo Muzú – CIV 6000547. Frente a este informe se recibieron observaciones por parte de la interventoría, las cuales fueron oportunamente subsanadas mediante el comunicado OF.CDC 212 del 26 de mayo de 2025.

Así mismo, el 24 de julio de 2025, el componente forestal del contratista ejecutó los tratamientos integrales de los individuos arbóreos No. 2, 3, 4, 6, 7 y 8, ubicados en el CIV 6000761 (PK 322185), realizando el corte y cicatrización de raíces y ramas conforme a las consideraciones técnicas definidas por la profesional forestal.

Posteriormente, el 26 de julio de 2025, se ejecutaron las talas de los individuos arbóreos No. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 23, en estricto cumplimiento de lo autorizado en la Resolución 1964 de 2024. El respectivo informe fue remitido el 05 de agosto de 2025 mediante el comunicado OF.CDC 288, el cual fue aprobado por la interventoría el mismo día a través del comunicado No. 257.25 – TUN – GTC.

Cierre del permiso silvicultural

Con base en la documentación, informes, comunicaciones y soportes técnicos generados durante la ejecución contractual, y conforme a lo detallado en el Anexo 12, mediante el contrato de obra

se ejecutaron las talas respectivas conforme a la Resolución 1964 de 2024, se concluye que el CONSORCIO DC 2025 dio cumplimiento a las obligaciones establecidas en el permiso silvicultural, no evidenciándose requerimientos pendientes asociados a este componente al cierre del contrato.

En el capitulo 5.6.1 se describen las actividades ejecutadas.

INDICADORES DEL COMPONENTE

INDICADOR	DESCRIPCION DEL INDICADOR	DATOS DEL INDICADOR	RESULTADOS DEL INDICADOR
No. de capacitaciones efectuadas en el mes / No. de capacitaciones programadas * 100	Se realiza verificación del cumplimiento de las capacitaciones programadas Vs las capacitaciones realizadas durante el mes	29/29	100%
No. de profesionales A&SST contratados / No. de profesionales A&SST requeridos *100	Verifica el No. del personal A&SST contratado Vs. El personal A&SST requerido en pliegos	2/2	100%
No. de permisos tramitados actualmente / No. Permisos necesarios para el contrato	Se realiza el trámite de los permisos necesarios para el inicio de los segmentos viales	1/1	100%

Tabla 12. Indicadores Componente A: Cumplimiento a las obligaciones ambientales y SST

El cumplimiento del desempeño ambiental se basa en los recorridos realizados en obra, la verificación de las condiciones ambientales, el control de los sitios de disposición final de los RCD, la señalización, la demarcación y los cerramientos de los frentes de obra, y demás actividades descritas en las fichas de seguimiento de labores ambientales y SST, diligenciamiento de formatos de cumplimento ambiental, evidencias en registros fotográficos y elaboración de informes del componente ambiental, a continuación se encuentra el consolidado de las calificaciones de desempeño ambiental y SST durante la ejecución del contrato

01 al 31 de Marzo del 2025			
ITEM	**COMPONENTE**	**VALOR PONDERADO**	**CALIFICACIÓN**
A	Cumplimientos obligaciones ambientales y SST contractuales	13%	13%
B	Manejo ambiental en la ejecución de actividades constructivas	35%	35%
C	Manejo de vegetación y paisajismo	8%	3%
D	Gestión en SST	39%	39%
E	Programa de señalización de seguridad	5%	5%
Calificación mensual		**100**	**95%**
01 al 30 de Abril del 2025			
ITEM	**COMPONENTE**	**VALOR PONDERADO**	**CALIFICACIÓN**
A	Cumplimientos obligaciones ambientales y SST contractuales	13%	13%
B	Manejo ambiental en la ejecución de actividades constructivas	35%	35%
C	Manejo de vegetación y paisajismo	8%	8%
D	Gestión en SST	39%	39%
E	Programa de señalización de seguridad	5%	5%
Calificación mensual		**100**	**100%**
01 al 11 de Mayo del 2025			
ITEM	**COMPONENTE**	**VALOR PONDERADO**	**CALIFICACIÓN**
A	Cumplimientos obligaciones ambientales y SST contractuales	13%	13%

B	Manejo ambiental en la ejecución de actividades constructivas	35%	35%
C	Manejo de vegetación y paisajismo	8%	8%
D	Gestión en SST	39%	34%
E	Programa de señalización de seguridad	5%	5%
Calificación mensual		**100**	**95%**
01 al 30 de Junio del 2025			
ITEM	**COMPONENTE**	**VALOR PONDERADO**	**CALIFICACIÓN**
A	Cumplimientos obligaciones ambientales y SST contractuales	13%	13%
B	Manejo ambiental en la ejecución de actividades constructivas	35%	35%
C	Manejo de vegetación y paisajismo	8%	8%
D	Gestión en SST	39%	34%
E	Programa de señalización de seguridad	5%	5%
Calificación mensual		**100**	**95%**
01 al 31 de Julio del 2025			
ITEM	**COMPONENTE**	**VALOR PONDERADO**	**CALIFICACIÓN**
A	Cumplimientos obligaciones ambientales y SST contractuales	13%	13%
B	Manejo ambiental en la ejecución de actividades constructivas	35%	35%
C	Manejo de vegetación y paisajismo	8%	8%
D	Gestión en SST	39%	30%
E	Programa de señalización de seguridad	5%	0%
Calificación mensual		**100**	**86%**
01 al 31 de Agosto del 2025			

ITEM	COMPONENTE	VALOR PONDERADO	CALIFICACIÓN
A	Cumplimientos obligaciones ambientales y SST contractuales	13%	12%
B	Manejo ambiental en la ejecución de actividades constructivas	35%	32%
C	Manejo de vegetación y paisajismo	8%	8%
D	Gestión en SST	39%	38%
E	Programa de señalización de seguridad	5%	5%
Calificación mensual		**100**	**95%**

01 al 30 de Septiembre del 2025


ITEM	COMPONENTE	VALOR PONDERADO	CALIFICACIÓN
A	Cumplimientos obligaciones ambientales y SST contractuales	13%	11%
B	Manejo ambiental en la ejecución de actividades constructivas	35%	26%
C	Manejo de vegetación y paisajismo	8%	6%
D	Gestión en SST	39%	38%
E	Programa de señalización de seguridad	5%	5%
Calificación mensual		**100**	**85,63%**

01 al 31 de Octubre del 2025

ITEM	COMPONENTE	VALOR PONDERADO	CALIFICACIÓN
A	Cumplimientos obligaciones ambientales y SST contractuales	13%	13%
B	Manejo ambiental en la ejecución de actividades constructivas	35%	35%
C	Manejo de vegetación y paisajismo	8%	8%
D	Gestión en SST	39%	39%

E	Programa de señalización de seguridad	5%	5%
Calificación mensual		**100**	**100%**
01 al 11 de Noviembre del 2025			
ITEM	**COMPONENTE**	**VALOR PONDERADO**	**CALIFICACIÓN**
A	Cumplimientos obligaciones ambientales y SST contractuales	13%	13%
B	Manejo ambiental en la ejecución de actividades constructivas	35%	35%
C	Manejo de vegetación y paisajismo	8%	8%
D	Gestión en SST	39%	39%
E	Programa de señalización de seguridad	5%	5%
Calificación mensual		**100**	**100%**
TOTAL, CALIFICACION DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO			**94,63**

Tabla 13. Calificación Ambiental y SST durante la ejecución del contrato

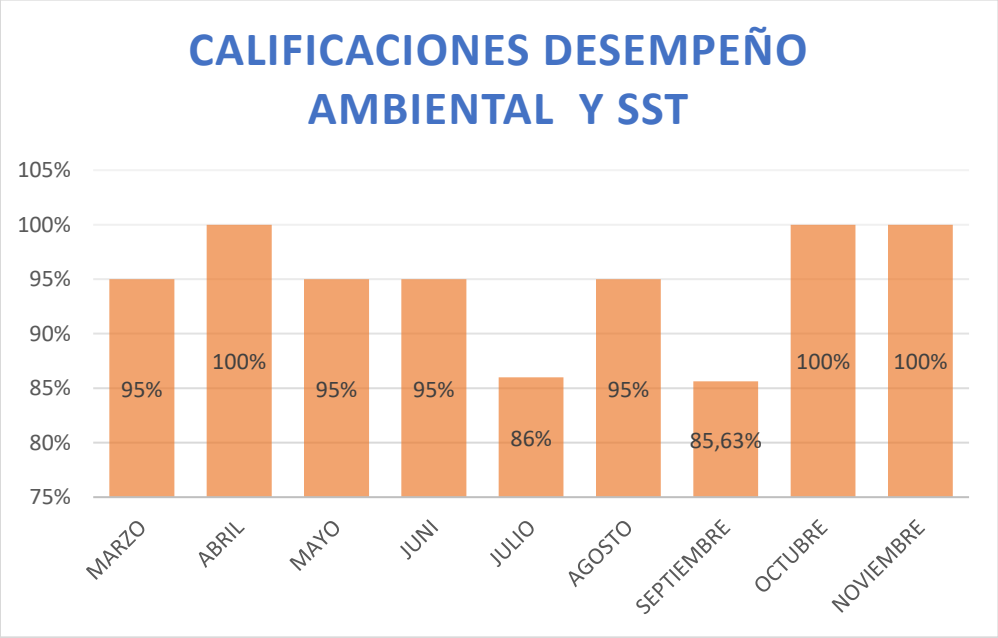

Grafica 1. Desempeño Ambiental y SST

5.2. COMPONENTE B. MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

5.2.1. Programa B1. Manejo Ambiental de campamentos fijos y/o temporales y centros de acopio

Para la ejecución del contrato se contó con campamentos temporales conformados por una carpa por frente de obra, la cual contaba con kit para derrames, kit para la atención de emergencias, punto ecológico, baño portátil y/o baño fijo

CONSORCIO DC 2025			BOGOTÁ Alcaldía Local de Tunjuelito			
"EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C						
FRENTE DE OBRA	**No de CAMPAMENTOS**		**UBICACIÓN**	**PERIODO IMPLEMENTACIÓN**	**No UNIDADES SANITRIAS IMPLEMENTADAS**	
	Fijos	**Móviles**			**Fijas**	**Móviles**
Frente de Obra San Vicente CIV 6000897 (1)	1		Carrera 32 No. 52F - 40	Marzo	1	1
Frente de Obra Nuevo Muzu CIV 6000587 (2)	1		Carrera 51B Sur Noo. 60F - 52	Marzo	1	1
Frente de Obra San Vicente CIV 6000897		1	Cra 32 entre calle 52 g sur y calle 52 f sur	Abril	1	
Frente de Obra Nuevo Muzu CIV 6000587		1	Diag 52 a sur entre Cra 60f y Cra 61	Abril		1
Frente de Obra San Vicente CIV 6001042 (3)	1		Cra 29 entre calle 53 a sur y calle 53 b sur	Abril		1
Frente de Obra Nuevo Muzu 6000547 (4)	1		Cra 61 entre diag 51 b sur y diag 52 sur	Abril	1	
Frente de Obra San Vicente CIV 6000897		1	Cra 32 entre calle 52 g sur y calle 52 f sur	Mayo	1	
Frente de Obra Nuevo Muzu CIV 6000587		1	Diag 52 a sur entre Cra 60f y Cra 61	Mayo		1

CONSORCIO DC 2025		BOGOTÁ Alcaldía Local de Tunjuelito				
"EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C						
FRENTE DE OBRA	**No de CAMPAMENTOS**		**UBICACIÓN**	**PERIODO IMPLEMENTACIÓN**	**No UNIDADES SANITRIAS IMPLEMENTADAS**	
	Fijos	**Móviles**			**Fijas**	**Móviles**
Frente de Obra San Vicente CIV 6001042	1		Cra 29 entre calle 53 a sur y calle 53 b sur	Mayo		1
Frente de Obra Nuevo Muzu 6000547	1		Cra 61 entre diag 51 b sur y diag 52 sur	Mayo	1	
Frente de Obra Nuevo Muzu CIV 6000587	1		Diag 52 a sur entre Cra 60f y Cra 61	Junio	1	
Frente de Obra El Carmen CIV 6001045 (5)	1	1	Cra 29 entre calle 53 a sur y calle 53 b sur	Junio	1	1
Frente de Obra Nuevo Muzu CIV 6000751, CIV 6000760 y CIV 6001827 (8)	1		Diag 52 a sur entre Cra 60f y Cra 61	Julio	1	
Frente de Obra El Carmen CIV 6001045	1	1	Cra 29 entre calle 53 a sur y calle 53 b sur	Julio	1	1
Frente de Obra Abraham Lincoln CIV 6001648 y CIV 6001672 (9)	1		CL 52 Sur entre Kr 11A y Kr 12	Julio	2	
Frente de Obra Nuevo Muzu CIV 6000751, CIV 6000760 y CIV 6001827	1		Diag 52 a sur entre Cra 60f y Cra 61	Agosto	1	
Frente de Obra Abraham Lincoln CIV 6001648 y CIV 6001672	1		CL 52 Sur entre Kr 11A y Kr 12	Agosto	1	1
Frente de Obra Nuevo Muzu CIV 6000751, CIV 6000760, CIV 6000775	1		Diag 52 a sur entre Cra 60f y Cra 61	Septiembre	1	

CONSORCIO DC 2025						
“EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C						
FRENTE DE OBRA	**No de CAMPAMENTOS**		**UBICACIÓN**	**PERIODO IMPLEMENTACIÓN**	**No UNIDADES SANITRIAS IMPLEMENTADAS**	
	Fijos	**Móviles**			**Fijas**	**Móviles**
Frente de Obra Abraham Lincoln CIV 6001648 y CIV 6001672	1		CL 52 Sur entre Kr 11A y Kr 12	Septiembre	1	1
Frente de Obra Samore CIV 6001008 (10)	1		Kr 26 entre CL 48B sur y CL 48a Sur	Septiembre		1
Frente de Obra Nuevo Muzu CIV 6000775	1		Kr 61g Entre Dg 53 Sur Y Dg 52b Sur	Octubre	1	
Frente de Obra El Carmen CIV 6001105 (11)	1		Dg 52b Sur Entre Kr 26 Y Kr 27	Octubre	1	1
Frente de Obra El Carmen CIV 6001105	1		Dg 52b Sur Entre Kr 26 Y Kr 27	Noviembre		1
Frente de Obra El Carmen CIV 6001105	1		Dg 52b Sur Entre Kr 26 Y Kr 27	Noviembre		1

Tabla 14. Campamentos Implementados

Durante la ejecución del contrato se instalaron en total nueve (9) campamentos, pese a que se intervinieron trece (13) CIV. Lo anterior se debió a que, en varios casos, un mismo campamento fue utilizado para atender simultáneamente dos o tres CIV, optimizando así la logística y el uso de los recursos en obra.

Cada campamento contó con la adecuación de espacios destinados tanto al almacenamiento de herramienta menor como de los insumos necesarios para la ejecución de las actividades, tales como: poli malla azul, alambre, puntilla, cinta de señalización reflectiva, bolsas, lonas, señalizadores tubulares, conos, entre otros elementos requeridos para la operación.

INDICADORES DEL COMPONENTE

INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	DATOS DEL INDICADOR	RESULTADOS DEL INDICADOR
No. De campamentos instalados / número de frentes de obra activos	Instalación de la infraestructura necesaria para el funcionamiento de campamentos, almacenes, patios y sitios temporales de acopio de materiales y/o escombros	9/13	69.23%
No. De campamentos señalizados / No. De campamentos instalados	Instalación de la señalización	9/9	100%
No. De Trabajadores en el periodo / No de Unidades Sanitarias	Instalación de la infraestructura necesaria para el funcionamiento de campamentos, almacenes, patios y sitios temporales de acopio de materiales y/o escombros	55/14	3,92 CUMPLE <=15

Tabla 15. Indicadores Componente B; Programa B1. Manejo Ambiental de Campamentos fijos y/o temporales y centros de acopio

✓ REGISTRO FOTOGRAFICO










26 mar 2025 12:42:58
Tunjuelito
Bogotá, D.C.


Tunjuelito
Bogotá


Parque Nuevo Muzu
Bogotá


Parque Nuevo Muzu
Bogotá


5/04/25, 10:49 AM
Parque Nuevo Muzu
Bogotá






10/04/25, 12:17 PM
Carrera 20 53A-37
Bogotá


13 may 2025 7:46:00 a. m.
#Consorcio DC 2025


Bogotá




9/06/25, 2:41 PM
Carrera 61 51B-4
Bogotá






10/06/25 10:22 AM
Bogotá






Brass




22/07/25, 10:47 AM
Calle 53B Sur 25-33
Bogotá


10:05










3/09/25, 1:07 PM
Carrera 10A 51-0
Bogotá




3 sep. 2025 10:47:26 a. m.
#Consorcio DC 2025




24 oct. 2025 9:58:12 a. m.
52B-41 Carrera 61c
Tunjuelito
Bogotá, D.C.
#Consorcio DC 2025





Adicionalmente, durante la ejecución del contrato se contó con un total de cincuenta y cinco (55) personas, para lo cual se dispusieron catorce (14) unidades sanitarias entre portátiles y fijas, dando cumplimiento a lo establecido en la normativa aplicable, que exige la disponibilidad de una (1) unidad sanitaria por cada quince (15) trabajadores.

En el Anexo 9 se encuentran cada uno de los certificados de los mantenimientos de las unidades sanitarias portátiles y los alquileres correspondientes de las unidades sanitarias fijas para cada uno de los meses de ejecución del contrato.

5.2.2. Programa B2. Manejo de materiales de construcción

✓ **PERMISOS DE LOS PROVEEDORES**

A continuación, se relacionan los proveedores de materiales de construcción utilizados, junto con sus respectivos permisos ambientales, y se presentan las cantidades de materiales ingresados durante la ejecución del contrato**.**

PROVEEDOR	PERMISO / PIN-PROV
Paviobras	Registro IDU 485
Granulados Reciclados de Colombia – GRECO	N/A
Constriturar LTDA.	RUCOM - 2024112629638
Asmincol SAS	RUCOM - 2023061524734
La Sacan	FLH-154
Cantera Villa Paula	RUCOM - 2023061524734
Polimix Cert.	Registro IDU No. 439
Concremack	Registro IDU No. 609
Sofan Ingenieria	Registro IDU No. 577
Doble A Ingeniería	Registro IDU No. 026
DEG Construcciones	RUCOM - 2023051924443

Tabla 16. Proveedores utilizados durante la ejecución del contrato

DENSIDADES POR GESTORES Y PROVEEDORES			
GESTORES			
NOMBRE	MATERIAL	DENSIDAD kg/m3	DENSIDAD DEFINIDA POR
Servicios Profesionales AIA	Asfalto	1568,42	Gestor
Cemex	Excavación	1465,33	Gestor
Maquinas Amarillas	Excavación	1282,70	Gestor
MAGIR	Excavación	1400,00	Gestor
SECAM JR EU	Mixtos	1568,31	Gestor
MAGIR	Excavación	1400,00	Gestor
Granulados Reciclados de Colombia - GRECO	Asfalto	1280,00	Gestor
Tratamientos Y Rellenos Ambientales De Colombia SAS ESP - TRACOL	Respel	1000	Gestor

PROVEEDORES			
NOMBRE	MATERIAL	DENSIDAD kg/m3	DENSIDAD DEFINIDA POR
Granulados Reciclados de Colombia - GRECO	Sub Base Granular Tipo B	1450,00	Proveedor
Constriturar LTDA	B200	1440,00	NSR-10
Constriturar LTDA	Triturado	1660,00	NSR-10
Asmincol SAS	Base Tipo A	1408,00	Proveedor
Asmincol SAS	Sub Base Granular Tipo B	1416,67	Proveedor
Asmincol SAS	Sub Base Granular Tipo PEA	1340,00	Proveedor
Cantera Villa Paula	B200	1440,00	NSR-10
Cantera Villa Paula	Triturado 3/4	1660,00	NSR-10
La Sacan	Triturado 3/4	1660,00	NSR-10
La Sacan	B200	1440,00	NSR-10
La Sacan	Arena	1440	NSR-10
Polimix	Concreto	2300,00	NSR-10
Concremack	Concreto	2300,00	NSR-10
Paviobras	Asfalto	1738-1740	Proveedor
Sofan Ingenieria	Asfalto	1659 - 1660	Proveedor
Doble A Ingeniería	MCCH-25	1659	Proveedor
Paviobras	MD-19	1670 – 1740	Proveedor
Paviobras	MCCH-25	1670 - 1740	Proveedor

Tabla 17. Densidades utilizadas durante la ejecución del contrato


TIPO DE MATERIAL	CLASIFICACIÓN	CANTIDAD		PIN AMBIENTAL	PROVEEDOR Y CERTIFICACIÓN	PERMISO MINERO
		M3	TON			
Material Pétreo	Sub Base Granular Tipo b	1588,83	2303,8	26495	Granulados Reciclados de Colombia - GRECO	N/A
	Triturado	99	155,1	17415	Constriturar LTDA	RUCOM - 2024112629638
	B200	258	371,52			
	Sub Base Granular Tipo b	590,6	809,28	22599	Asmincol SAS	RUCOM - 2023061524734
	Sub Base Tipo A	914,4	1412,25			
	Sub Base PEA	15	20,1			
	B200	330	777,6	Resolución 222 del 2010	La Sacan	FLH-154
	Triturado	105	167,7			
	Arena	30,0	43,20			
	B200	93	133,92	Resolución 1334 del 2002	Cantera Villa Paula	RUCOM - 2023061524734
	Triturado	20	33,2			
	Concreto	7	16,1	N/A	Polimix	Registro IDU No. 439
	Concreto	7	16,1	N/A	Concremack	Registro IDU No. 609
	Asfalto MD 19	392,805	677,42	N/A	Paviobras	Registro IDU No. 485
	Asfalto MD 19	102,6	170,32	N/A	Sofan Ingenieria	Registro IDU No. 577
	Asfalto MCCH-25	363,34	583,60	N/A	Paviobras	Registro IDU No. 485
	Asfalto MD-12	15,59	27,13	N/A	Paviobras	Registro IDU No. 485
	Asfalto MCCH-25	47,86	79,45	N/A	Doble A Ingeniería	Registro IDU No. 026
	Triturado	135,00	224,10	N/A	DEG Construcciones	RUCOM. 2023051924443
	B200	240,00	345,60	N/A	DEG Construcciones	RUCOM. 2023051924443
TOTAL		**5355,03**	**8367,49**			

Tabla 18. Materiales de Construcción adquiridos

Las cantidades generadas de materiales e indicadores reportados corresponden a la ejecución total del contrato.

PROVEEDOR	CANTIDAD (ton)	CIV INTERVENIDO
Granulados Reciclados de Colombia - GRECO	2303,8	6000897, 6001042, 6001045, 6001105, 6001648, 6001672, 6001008
Constriturar LTDA	526,62	6000897, 6000587, 6001045, 6001105
Asmincol SAS	2241,63	6000897, 6000587, 6000547, 6000751, 6000760, 6001827, 6000775
La Sacan	988,50	6000587, 6000547, 6000751, 6000760, 6001827
Cantera Villa Paula	167,12	6001042, 6001105
Polimix	16,1	6001042
Concremack	16,1	6001042
Paviobras	1288,15	6000897, 6001042, 6001045, 6001105, 6000751, 6000760, 6001827, 6000775, 6001648, 6007672, 6001008
Sofan Ingenieria	170,32	6000587, 6000547
Doble A Ingeniería	79,45	6001008
DEG Construcciones	569,70	6000751, 6000760
TOTAL	**8367,49**	

Tabla 19. Trazabilidad de materiales por CIV intervenido

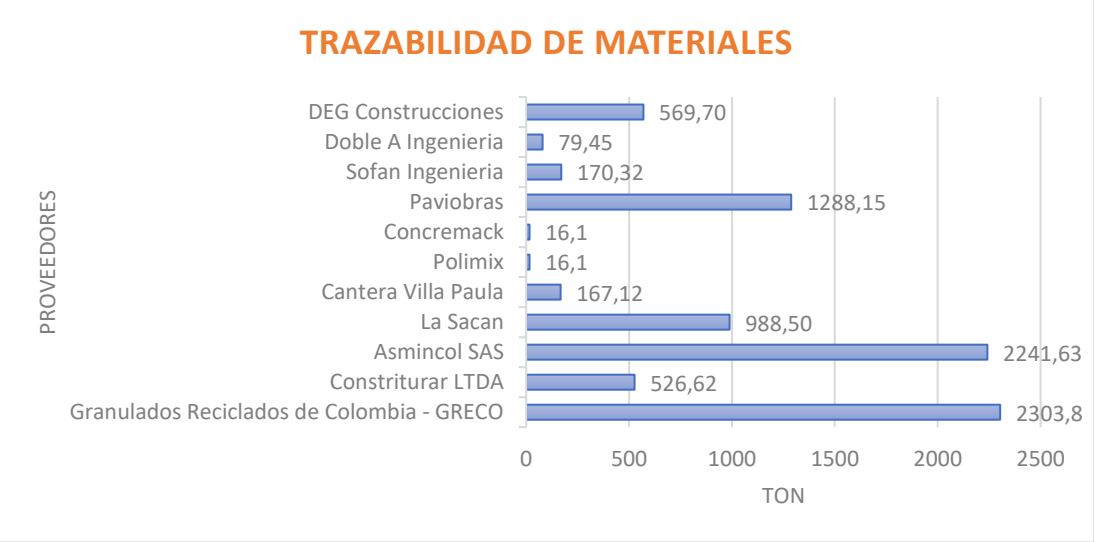

Grafica 2. Trazabilidad de materiales

✓ REGISTRO FOTOGRAFICO






















4 ago 2025 4:05:39 p. m.












#51A-53 Carrera 25
Tunjuelito
Bogotá, D.C
CONSORCIO DC 2025


#51A-53 Carrera 25
Tunjuelito
Bogotá, D.C
CONSORCIO DC 2025

- ✓ ***Cumplimiento instalación GCR***

El artículo 10 del Decreto Distrital 265 de 2016 establece que, a partir del 1 de julio de 2016, toda obra de infraestructura de transporte que se ejecute en el Distrito Capital y que adelante procesos constructivos con mezcla asfáltica**,** deberá prever el uso de materiales provenientes del aprovechamiento de llantas usadas**,** en las proporciones técnicas exigidas por el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU**.** Dicho uso deberá aplicarse sobre la totalidad del metro cuadrado de la mezcla asfáltica empleada en la obra**,** en un porcentaje no inferior al veinticinco por ciento (25%) del volumen total de la mezcla asfáltica utilizada en vías vehiculares, incluyendo troncales de tráfico mixto, malla vial arterial no troncal, malla vial intermedia y malla vial local**.**

Durante la ejecución del contrato se realizó la instalación de mezcla asfáltica modificada con grano de caucho**,** conforme a las actividades ejecutadas en los CIV 6001045, 6000751, 6000760, 6001827, 6001648, 6001672, 6000775 y 6001105**.** El formato FOAC18 – Seguimiento a la Aplicación de Mezcla Asfáltica Modificada con GCR, en el cual se evidencian las cantidades totales suministradas**,** se encuentra incluido en el Anexo 3 del presente documento.

Adicionalmente, se aclara que el contrato finalizó dando cumplimiento a un cuarenta y dos por ciento (42%) del volumen total de la mezcla asfáltica utilizada**,** superando el porcentaje mínimo exigido por la normativa vigente. Así mismo, se indica que el factor de compactación aplicado fue de 0,8507 y que, de acuerdo con la ficha técnica del material**,** el porcentaje de grano de caucho contenido en la mezcla instalada en obra corresponde al quince por ciento (15%)**.**


- ✓ ***Recirculación***

Durante la ejecución del contrato se realizó la adquisición 4545,43ton de material granular proveniente de plantas de aprovechamiento, teniendo en cuenta las actividades en cada uno de los CIV.

En el Anexo 4 – RCD se encuentra la carpeta Documentos Trazabilidad Materiales donde se puede ver el FOAC53 por mes relacionando el control de materiales y así mismo se encuentran los vales soporte de dicho ingreso a obra.

TIPO DE MATERIAL	CLASIFICACIÓN	CANTIDAD		PIN AMBIENTAL	PROVEEDOR Y CERTIFICACIÓN	PERMISO MINERO	FRENTE DE OBRA AL QUE INGRESO EL MATERIAL
		M3	TON				
Material Pétreo	Sub Base Granular Tipo b	1588,8	2303,8	26495	Granulados Reciclados de Colombia - GRECO	N/A	Nuevo Muzu, San Vicente, El Carmen, Abraham Lincoln, Samore
	Sub Base Tipo A	1004,4	1412,25	22599	Asmincol SAS	RUCOM - 2023061524734	Nuevo Muzu, San Vicente, Abraham Lincoln, Samore, El Carmen
	Sub Base Tipo B	590,6	809,28		Asmincol SAS		
	Sub Base Tipo PEA	15,0	20,10				
TOTAL		**3198,80**	**4545,43**				

Tabla 20. Materiales de Construcción adquiridos en planta de aprovechamiento

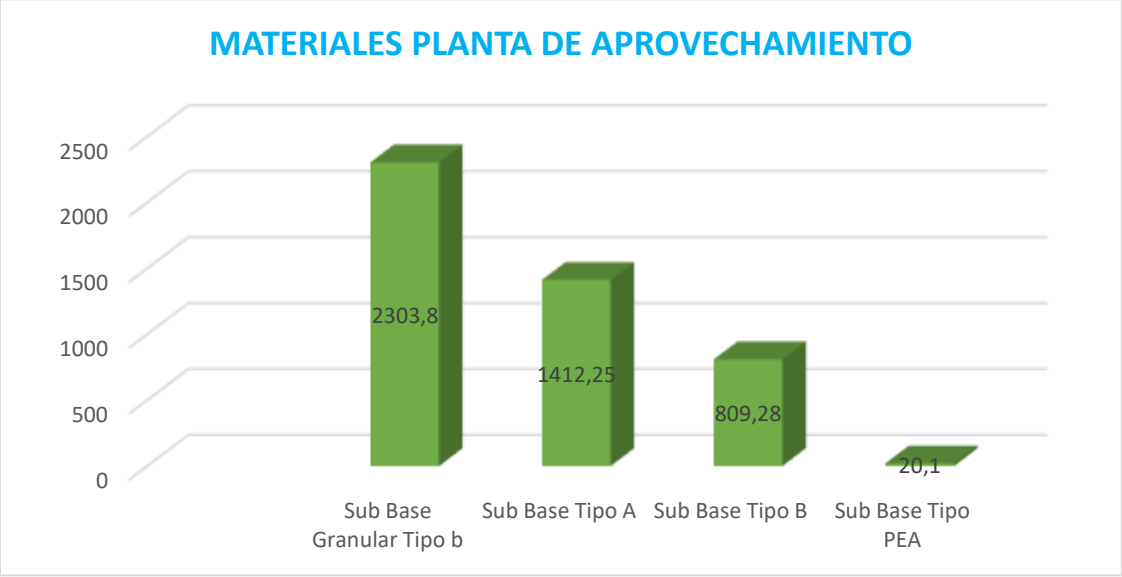

Grafica 3. Materiales adquiridos en Plantas de Aprovechamiento

INDICADORES DEL COMPONENTE

INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	DATOS DEL INDICADOR	RESULTADOS DEL INDICADOR
$\frac{No.\,acopios\ de\ materiales\ establecidos}{No.\,acopios\ de\ materiales\ autorizados}$	No de sitios de acopio de materiales de construcción aprobados en el frente de obra	$\frac{21}{21} * 100$	100%
$\frac{Ton\ material\ valorizado}{Ton\ material\ usado\ en\ obra}$	Material valorizado	$\frac{4545,43}{8367,49} * 100$	54,32%
$\frac{Ton\ material\ certificado}{Ton\ material\ usado}$	Presentación de certificados	$\frac{8367,49}{8367,49} * 100$	100%
$\frac{No.\,de\ proveedores\ autorizados}{No.\,proveedores\ usado}$	Presentación de certificados en el informe de calidad	$\frac{11}{11} * 100$	100%

Tabla 21. Indicadores Componente B; Programa B2. Manejo de materiales de construcción

✓ REGISTRO FOTOGRAFICO


























5.3. MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS

Durante la ejecución del contrato, los residuos fueron separados y clasificados, identificando de manera diferenciada los residuos especiales y peligrosos, tales como pinturas, grasas, lubricantes y demás sustancias químicas empleadas y/o generadas en el desarrollo de la obra.

El Contratista asumió la responsabilidad integral de los residuos, desde su generación hasta su disposición final, incluyendo las actividades de almacenamiento, transporte y entrega, coordinando estas labores con gestores autorizados por la Autoridad Ambiental Competente (AAC), quienes contaron con los permisos y autorizaciones ambientales vigentes. Los certificados de disposición final fueron aportados conforme a la normatividad aplicable.

En cumplimiento de la normativa ambiental, no se realizó vertimiento de residuos a las redes de alcantarillado ni su disposición directa sobre el suelo. Los residuos generados durante la ejecución del contrato fueron entregados a gestores autorizados para su disposición final.

La gestión y disposición final de los residuos peligrosos se efectuó de conformidad con lo establecido en el Decreto 4741 de 2005, mediante la contratación de empresas que contaban con licencias, permisos o autorizaciones ambientales vigentes para este tipo de manejo.

Adicionalmente, los contenedores vacíos que contuvieron sustancias químicas fueron recolectados, acopiados y almacenados de manera diferenciada, evitando su mezcla con residuos ordinarios. Estos residuos fueron caracterizados y entregados a un gestor autorizado, reduciendo riesgos para la salud humana y el ambiente y fortaleciendo el sistema de manejo integral de residuos peligrosos del proyecto.

Durante la ejecución del contrato se mantuvieron disponibles las fichas de seguridad y la señalización correspondiente de cada una de las sustancias químicas utilizadas, tal como se evidencia a continuación

✓ REGISTRO FOTOGRAFICO

























Anexo 11 – Fichas de seguridad de cada sustancia química utilizadas durante la ejecución del contrato.

5.4. Programa B3. Manejo integral de residuos solidos

5.4.1. Residuos Convencionales – Puntos Ecológicos

En los campamentos de los frentes de obra se dispuso de puntos ecológicos conformados por cuatro (4) canecas, de acuerdo con el código de colores establecido en la Resolución 2184 del 26 de diciembre de 2019, distribuidas de la siguiente manera:

Bolsa blanca: Material reciclable (cartón, papel, plástico y vidrio).
Bolsa verde: Residuos orgánicos
Bolsa negra: Material no aprovechable.
Bolsa roja: Residuos peligrosos.

Las acciones implementadas durante la ejecución de las actividades objeto del contrato fueron las siguientes:

1. Manejo adecuado de los residuos sólidos y los RCD: Se garantizó la instalación de puntos ecológicos en cada uno de los frentes de obra y se realizó la separación en la fuente, conforme a la normativa ambiental vigente.
2. Manejo adecuado de los residuos de excavación: Los residuos generados fueron trasladados a los sitios de almacenamiento temporal aprobados dentro de la zona del proyecto o, en su defecto, fueron transportados directamente a la escombrera o al sitio autorizado indicado, según correspondiera.

En consecuencia, se concluye que durante la ejecución del contrato se dio cumplimiento a los lineamientos establecidos en la Resolución 2184 de 2019 y a la normatividad ambiental aplicable en materia de manejo y disposición de residuos, garantizando una adecuada gestión ambiental y el control de los impactos asociados a las actividades desarrolladas.

✓ REGISTRO FOTOGRAFICO














16/09/25, 8:11 AM
Diagonal 52B Sur 27-6
Bogotá




22/07/25, 11:36 AM
Calle 52 Sur 11A-20
Bogotá




4/08/25, 9:18 AM
Carrera 11A 51-38
Bogotá


CARTELERA INFORMATIVA






2/09/25, 2:27 PM
Calle 52 Sur 11A-6
Bogotá







5.4.2. RESPEL – BOLSAS DE CEMENTO

De acuerdo con las actividades objeto del contrato, durante su ejecución se requirió de manera permanente el uso de cemento en obra. Las bolsas que contenían este producto fueron consideradas residuos peligrosos y, en consecuencia, fueron dispuestas en un sitio de disposición final autorizado por la Autoridad Ambiental Competente.

Durante el mes de noviembre, se realizó la disposición final de las bolsas de cemento y de los contenedores vacíos que se encontraban acopiados durante la ejecución del contrato. El Anexo 4 contiene el certificado de disposición final, en el cual se relacionan las cantidades generadas y el nombre técnico del residuo, conforme a la clasificación establecida por la planta gestora.

Es importante precisar que, dentro de dicha clasificación, no existe un residuo denominado específicamente como “bolsas de cemento”; por tal razón, se optó por la categoría más cercana y técnicamente aplicable, la cual comparte el código UN 3077 – Clase 9, de acuerdo con la normativa de las Naciones Unidas, lo que respalda su correcta identificación, manejo y disposición final.

En consecuencia, se concluye que la gestión y disposición final de este tipo de residuos se realizó en cumplimiento de la normatividad ambiental, garantizando un manejo adecuado y seguro durante la ejecución del contrato.

- ✓ **REGISTRO FOTOGRAFICO**










ACOPIO
BOLSAS DE
CEMENTO




ACOPIO
BOLSAS DE
CEMENTO


ACOPIO
BOLSAS DE
CEMENTO










1 nov. 2025 8:51:30 a. m.
61F-5 Diagonal 52b Sur
Tunjuelito
Bogotá, D.C
#Consorcio DC 2025


1 nov. 2025 9:08:13 a. m.
56a41 Diagonal 51a Sur
Tunjuelito
Bogotá
#Consorcio DC 2025



5.5. Manejo de residuos de construcción y demolición

Durante la ejecución del contrato se realizaron viajes de materiales provenientes de actividades de excavación en los CIV intervenidos, los cuales fueron transportados en volquetas doble troque, de acuerdo con las actividades objeto del contrato. A continuación, se relacionan las cantidades generadas, expresadas en metros cúbicos (m³) y toneladas (t), así como cada uno de los gestores utilizados para su manejo y disposición final.

PERIODO	TIPO DE RCD	CLASIFICACIÓN	CANTIDAD		PIN AMBIENTAL	GESTOR Y CERTIFICACIÓN
			M3	TON		
mar-25	Material de Excavación	Excavacion	120,3	169,97	Registro de Inscripción CAR 052	Servicios Profesionales AIA Cert. AIAS217 - 2025
	Material Petreo	Asfalto	15	23,53		
	Material de Excavación	Excavacion	255	327,09	8418	Maquinas Amarillas Cert. 603 - 2025
	Material de Excavación	Excavacion	1110	1554,00	11247000018	Manejo y Gestión Integral de Residuos Sólidos SAS ESP - MAGIR SAS Cert. 026
	Material de Excavación	Excavacion	15	34,50	9730	Ingeomineria SAS - San Antonio Cert SA-2504048
	Material de Excavación	Mixtos	90	141,15	Registro de Inscripción CAR 001	SECAM JR EU Cert. SEC-01523JR-2025
	TOTAL		**1605,30**	**2250,24**		

PERIODO		CLASIFICACIÓN	CANTIDAD		

	TIPO DE RCD		M3	TON	PIN AMBIENTAL	GESTOR Y CERTIFICACIÓN
abr-25	Material de Excavación	Excavacion	225	288,61	8418	Maquinas Amarillas
	Material de Excavación	Excavacion	45	65,94	22149	Cemex
	Material de Excavación	Excavacion	525	735,00	11247000018	Manejo y Gestión Integral de Residuos Sólidos SAS ESP - MAGIR SAS
	Residuos Petreos	Mixtos	195	305,81	Registro de Inscripción CAR 001	SECAM JR EU
	Material Petreo	Asfalto	38	59,6	Registro de Inscripción CAR 052	Servicios Profesionales AIA
	TOTAL		**1028,00**	**1454,960**		

PERIODO	TIPO DE RCD	CLASIFICACIÓN	CANTIDAD		PIN AMBIENTAL	GESTOR Y CERTIFICACIÓN
			M3	TON		
may-25	Material de Excavación	Excavacion	199,2	278,88	11247000018	Manejo y Gestión Integral de Residuos Sólidos SAS ESP - MAGIR SAS
	TOTAL		**199,20**	**278,880**		

PERIODO	TIPO DE RCD	CLASIFICACIÓN	CANTIDAD		PIN AMBIENTAL	GESTOR Y CERTIFICACIÓN
			M3	TON		
jun-25	Residuos Petreos	Mixtos	30	47,05	Registro de Inscripción CAR 001	SECAM JR EU Cert. SEC-01564JR-2025
	Material Petreo	Asfalto	30	38,4	26495	Granulados Reciclados de Colombia - GRECO Cert. GREVD A004170-253-2025
	Material de Excavación	Excavacion	624	873,60	11247000018	Manejo y Gestión Integral de Residuos Sólidos SAS ESP - MAGIR SAS Cert. 067
	TOTAL		**684,00**	**959,05**		

PERIODO		CLASIFICACIÓN	CANTIDAD		

	TIPO DE RCD		M3	TON	PIN AMBIENTAL	GESTOR Y CERTIFICACIÓN
jul-25	Material Petreo	Asfalto	117,00	149,76	26495	Granulados Reciclados de Colombia - GRECO Cert PBT VD A004170-263-2025
		Hetereogeneo	30,00	38,40		
		Asfalto	219,00	361,09	11247000018	Manejo y Gestión Integral de Residuos Sólidos SAS ESP - MAGIR SAS Cert. 053
		Concreto	15,00	24,73		
	Material de Excavacion	Excavacion	1418,05	1985,27		Manejo y Gestión Integral de Residuos Sólidos SAS ESP - MAGIR SAS Cert. 082
	TOTAL		**1799,05**	**2559,25**		

PERIODO	TIPO DE RCD	CLASIFICACIÓN	CANTIDAD		PIN AMBIENTAL	GESTOR Y CERTIFICACIÓN
			M3	TON		
ago-25	Material Petreo	Asfalto	90,00	115,20	26495	Granulados Reciclados de Colombia - GRECO Cert. PBT VD A004170-277-2025
		Asfalto	135,00	222,60		Manejo y Gestión Integral de Residuos Sólidos SAS ESP - MAGIR SAS Cert. 055
		Concreto	30,00	49,46		
	Material de Excavacion	Excavacion	795,00	1113		Manejo y Gestión Integral de Residuos Sólidos SAS ESP - MAGIR SAS Cert. 084
	TOTAL		**1050,00**	**1500,26**		

PERIODO	TIPO DE RCD	CLASIFICACIÓN	CANTIDAD		PIN AMBIENTAL	GESTOR Y CERTIFICACIÓN
			M3	TON		
sep-25	Material Petreo	Asfalto	14,65	24,16	11247000018	Manejo y Gestión Integral de Residuos Sólidos SAS ESP - MAGIR SAS Cert. 073
		Concreto	125,33	206,65		
	Material de Excavacion	Excavacion	737,35	1032,29		
		Excavacion	310,00	449,3		Manejo y Gestión Integral de Residuos Sólidos SAS ESP - MAGIR SAS Cert. 036
	TOTAL		**1187,33**	**1712,40**		

PERIODO	TIPO DE RCD	CLASIFICACIÓN	CANTIDAD		PIN AMBIENTAL	GESTOR Y CERTIFICACIÓN
			M3	TON		
oct-25	Material Petreo	Asfalto	120,00	153,60	26495	Granulados Reciclados de Colombia - GRECO Cert - PBT VD A004170-284-2025
		Concreto	15,00	19,20		
	Material de Excavacion	Excavacion	762,00	1256,041	11247000018	
	TOTAL		**897,00**	**1428,84**		

Tabla 22. Cantidades generadas y Gestores utilizados en el periodo

Durante la ejecución del contrato se alcanzó un porcentaje de aprovechamiento del (55,1%), resultado que fue obtenido a partir de la gestión adecuada de los residuos generados en las actividades desarrolladas. Este valor superó la meta mínima establecida, la cual indicaba que, al finalizar el contrato, el porcentaje de aprovechamiento debía ser superior al cuarenta por ciento (40%).

El cumplimiento de este indicador evidenció la implementación efectiva de las medidas de separación en la fuente, aprovechamiento y entrega de residuos a gestores autorizados, conforme a lo establecido en la normativa ambiental vigente.

En consecuencia, se concluye que el contrato dio cumplimiento a la meta de aprovechamiento de residuos, garantizando una gestión ambiental adecuada y contribuyendo a la reducción de los residuos dispuestos en sitios de disposición final.

Teniendo en cuenta que la apertura, cargue, reporte y cierra del PIN.GEN esta a cargo del Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito, mediante el comunicado OF.CDC 010-23.06.2026 entrega a la interventoría la documentación necesaria para el cierre ante la SDA conforme al articulo 32.15 del decreto 507 de 2023, la cual fue aprobada por la interventoría mediante comunicado 0013.26 – TUN – GTC del 23 de junio de 2026.

CANTIDADAES GENERADAS EN EL CONTRATO 622 DEL 2024

TIPO DE RESIDUO	Ton. RCD aprovechadas en obra	Ton. RCD entregadas a Receptor	Ton. RCD entregadas en punto limpio	Ton. RCD entregadas en planta de aprovechamient	Ton. RCD entregadas en sitio de disposición final	Total RCD
1. Residuos de Construcción y Demolición (RCD), susceptibles de aprovechamiento.	**0**	**0**	**0**	**1091,70**	**11052,18**	**12143,88**
1.1. Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos, y materiales pétreos producto de la excavación, entre otros.	0	0	0	0	10163,49	10163,49
1.2. Productos de cimentaciones y pilotajes: Arcillas, bentonitas y demás.	0	0	0	0	0	0
1.3. Pétreos: Hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfálticos, trozos de ladrillos, y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cemento y concretos hidráulicos, entre otros.	0	0	0	1091,70	888,69	1980,39
1.4. No pétreos: Vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, compuestos de madera, o cartón-yeso (draywall), entre otros.	0	0	0,00	0	0,00	0,00
2. Residuos de Construcción y Demolición (RCD), no susceptibles de aprovechamiento	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,2**	**0,2**
2.1. Los Contaminados con residuos peligrosos.	0	0	0	0	0,2	0,2
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.	0	0	0	0	0	0
2.3. Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.	0	0	0	0	0	0
TOTAL RCD (Toneladas)						**12144,08**

INDICADORES GLOBAL DEL CONTRATO 622 DEL 2024

No.	NOMBRE DEL INDICADOR	TONELADA (t)	INDICADOR / PORCENTAJE
1	Cantidad de RCD generado en obra (t) % (t total)	12.144,08	100,00%
2	Cantidad de RCD aprovechado en la obra (t) % (t aprovechadas/ t total)	0,00	0,00%
3	Cantidad de RCD entregado en punto limpio (t) % (t entregadas / t total)	0,00	0,00%
4	Cantidad de RCD entregado en planta de aprovechamiento de RCD (t) % (t entregadas / t total)	1.091,70	8,99%
5	Cantidad de RCD gestionado por receptor % (t entregadas / t total)	0,00	0,00%
6	Cantidad de RCD llevado a sitio de disposición final de RCD (t) % (t entregadas / t total)	11.052,38	91,01%
AVANCE META APROVECHAMIENTO $\frac{Cantidad\ de\ RCD\ entregado\ en\ planta\ de\ aprovechamiento\ de\ RCD}{Cantidad\ total\ de\ RCD\ del\ periodo\ menos\ material\ de\ excavación\ y\ sobrantes\ de\ adecueacion\ de\ terre}$		$\frac{1,091,70}{12144,08 - 10163,49}$	55,12%

Tabla 23. indicadores Componente B; Programa B3. Manejo Integral de Residuos Solidos

✓ REGISTRO FOTOGRÁFICO


















12/06/25, 8:29 AM
Diagonal 52B Sur 27-86
Bogotá




19 jun 2025 8:10:27 a.m.


22/07/25, 7:32 AM
Diagonal 53 Sur 61B-22-61B-48
Bogotá























INDICADORES DEL COMPONENTE

INDICADOR	DESCRIPCION DEL INDICADOR	CANTIDAD ACUMULADA	INDICADOR ACUMULADO
			%
Puntos ecológicos implementados / Frentes de obra activos	Puntos ecológicos instalados	23/23 unidad	100%
Cantidad de RCD (generada **en** obra (t)/ (t total)	Verifica la cantidad total de RCD generado en el periodo	$\frac{12144,08}{12144,08}$ toneladas	100%
Certificado de material revalorizado/ Cantidad de materiales que ingresan a obra t RECIRCULACIÓN	Verificar la cantidad de material de recirculación utilizado en obra	$\frac{4545,43}{8367,49}$ toneladas	54,32 %
Cantidad de RCD entregado en planta de aprovechamiento de RCD (t)/ (t entregadas/ t total)	Este indicador permite controlar el volumen de RCD entregado a plantas de aprovechamiento	$\frac{1091,70}{12144,08}$	8,99 %
Cantidad de RCD llevado a sitios de disposición final de RCD (t) (t entregadas / t total)	Este indicador permite hacer el seguimiento a las cantidades de RCD entregado para disposición final	$\frac{11052,38}{12144,08}$	91,01 %
Cantidad de RCD llevado a otros contratos IDU (t) (t entregadas en contrato IDU / t total)	Se lleva control del RCD entregado para reutilizar en otros contratos IDU	0	0
Cantidad de Respel generados (t) (RCD total)	Control de respel generado y certificado	0,2 / 0,2	100 %
META DE APROVECHAMIENTO TOTAL		$\frac{1,091,70}{12144,08-10,163,49}$ *100	55,12 %

Tabla 24. Indicadores Programa B3

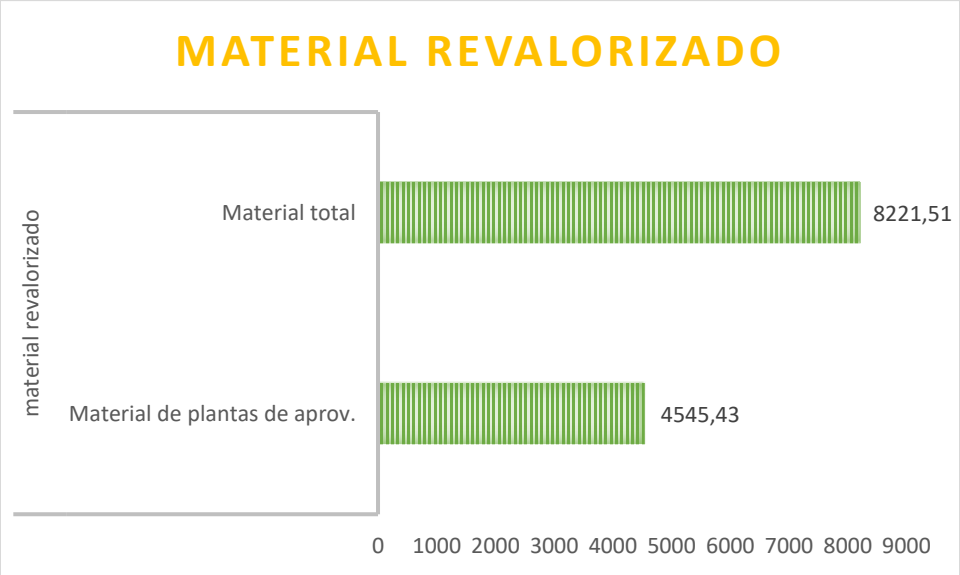

Grafica 4. Cantidad de material revalorizado

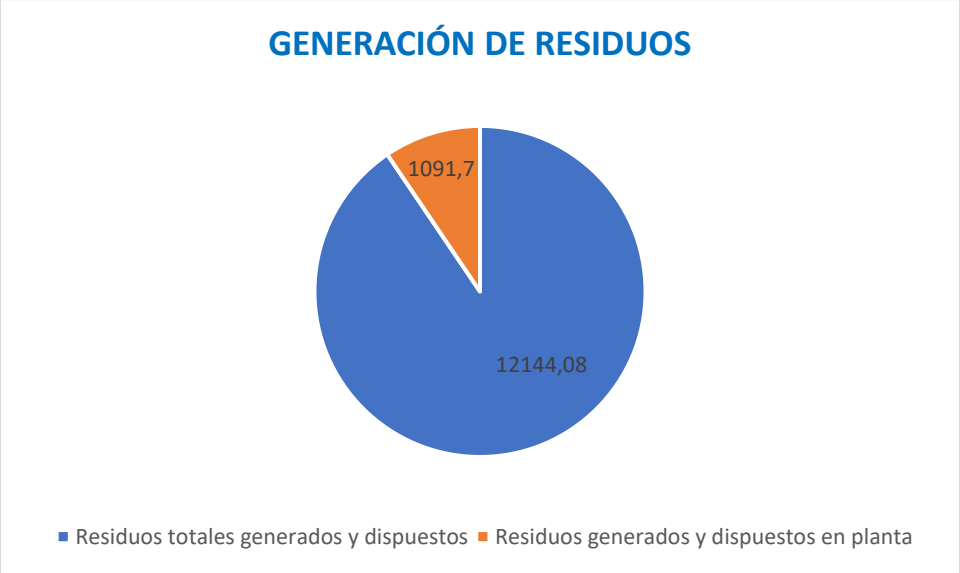

Grafica 5. Cantidad de residuos generados

5.5.1. Programa B4. Control de emisiones atmosféricas

Durante la ejecución del contrato se implementaron las siguientes actividades de control asociadas al transporte de materiales y residuos:

- ✓ Verificación de la revisión técnico-mecánica de los vehículos autorizados para el ingreso y transporte de materiales.
- ✓ Verificación del carpado de las volquetas que ingresaron y retiraron material en los diferentes frentes de obra activos.
- ✓ Limpieza de llantas de los vehículos utilizados durante la ejecución de las actividades.
- ✓ Jornadas de orden y aseo en las vías intervenidas.

Los vehículos tipo volqueta doble troque destinados al transporte de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) fueron carpados en su totalidad, con el fin de evitar la dispersión de material particulado al ambiente. Así mismo, se verificó la vigencia de la revisión técnico-mecánica de los vehículos que hicieron parte del contrato, control que se realizó en cada uno de los meses.

El Anexo 9 contiene la documentación de los vehículos utilizados durante la ejecución del contrato. A continuación, se presenta el listado de las volquetas empleadas, junto con su correspondiente PIN Ambiental.

En consecuencia, se concluye que las actividades de control implementadas permitieron dar cumplimiento a los lineamientos ambientales y operativos aplicables al transporte de materiales y RCD durante la ejecución del contrato.

"EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C							
PLACA	**TIPO DE VEHICULO**	**MODELO**	**PIN AMBIENTAL**	**SOAT**	**VIGENCIA**	**RTM**	**VIGENCIA**
DBB 045	VOLQUETA	1974	2071	90747987-611557998	11/03/2026	180164973	12/03/2026
SRM395	VOLQUETA	2007	3439	4308006359568000	01/24/2026	176501025	16/10/2025
TTO 152	VOLQUETA	2013	5107	89181533-610252878	21/09/2025	175777860	10/09/2025
SXS 806	VOLQUETA	2013	20876	88346795-600010796	11/06/2025	175996585	19/09/2025
SZX 882	VOLQUETA	2012	2700	89986336-600047244	9/12/2025	178856219	18/01/2026
SRO465	VOLQUETA	2008	6172	87804645-600008869	30/05/2025	174824829	30/07/2025
SWN 418	VOLQUETA	2007	3105	1508006110475000	28/02/2026	179886198	1/03/2026
TFT 870	VOLQUETA	2012	24649	15651502520100	19/02/2026	172707884	01/04/2025
UVM 572	VOLQUETA	2015	17433	8901134880601	22/12/2025	175282629	17/08/2025
WGU 928	VOLQUETA	2015	16231	90359744-600064058	1/02/21026	180090287	01/02/2026
UVM 573	VOLQUETA	2015	18485	88573576-600016547	10/07/2025	175478840	27/08/2025
UPS 399	VOLQUETA	2008	1805	89147429-610182342	9/09/2025	175785906	10/09/2025
SPV 659	VOLQUETA	2011	4034	3600047288	24/07/2026	175260514	16/08/2025
USC 504	VOLQUETA	2008	21848	89180795-610251393	20/09/2025	176232245	01/10/2025
TAL 534	VOLQUETA	2013	4776	89844168-610689448	16/11/2025	183358211	20/08/2026

Tabla 25. Volquetas utilizadas en la ejecución del contrato

1. Emisiones Provenientes de Vías

- Se realizó limpieza de las vías de acceso a los tramos de obra utilizados por los vehículos de carga y transporte, procurando la no generación de aportes de material particulado a las redes de alcantarillado y de partículas suspendidas a la atmósfera.
- Para tiempo seco (días de no lluvia) y dependiendo del tipo de suelo y condiciones de obra se realizó humectación del suelo por lo menos una vez al día mediante manguera para y minimizar las emisiones de partículas.

2. Emisiones Provenientes del Almacenamiento y Transporte de Materiales

- Se delimitaron y cubrieron las pilas de acopio de material con plásticos, lona o polisombra u otros elementos, que las proteja del viento para evitar el traslado de partículas hacia la comunidad
- En el transporte de material (arena, material de excavación, entre otros) se deberá cumplir con lo establecido en la normatividad vigente.

3. Medidas de Manejo de Ruido

- Se realiza una selección de equipos a intervenir en las diferentes fases de construcción, que garanticen una menor contaminación acústica sobre las zonas colindantes al Proyecto.
- Se notificó previamente a la comunidad y a cada núcleo institucional afectado la programación de operación de los equipos.
- Se controló los niveles sonoros de los vehículos, maquinaria y equipos utilizados, mediante la instalación de mecanismos de insonorización y mantenimiento adecuado (revisión tecno mecánica y de gases), garantizando así el cumplimiento de los estándares para emisión de ruido.

INDICADORES DEL COMPONENTE

INDICADOR	DESCRIPCION DEL INDICADOR	DATOS DEL INDICADOR	RESULTADOS DEL INDICADOR
No. de documentos de vehículos / No. de vehículos utilizados	Control de la Revisión Tecno - Mecánica de los vehículos que ingresen a la obra, verificación de la limpieza de las vías de ingreso a la obra, y el control del almacenamiento del material y residuos que pueden generar material particulado.	14/14	100%
No. de fuentes controladas / No. de fuentes identificadas	Producción de escombros de las diferentes actividades de obra. (Incluye transporte)	4/4	100%

Tabla 26. Indicadores Componente B; Programa B4. Control de Emisiones Atmosféricas

✓ REGISTRO FOTOGRÁFICO




















17/07/25, 1:05 PM
Diagonal 52B Sur 27-32
Bogotá


16 jun 2025 4:23:46 p.m.
52-40 Carrera 58
Tunjuelito
Bogotá
© consorcio DC 2025


15/07/25, 7:22 AM
Diagonal 53 Sur 61C-32
Bogotá




11/08/25, 8:33 AM
Carrera 61B 52B-12
Bogotá




3/09/25, 2:41 PM
Calle 52 Sur 11B-10--11B-54
Bogotá




Tunjuelito


Tunjuelito
Bogotá, D.C.


Tunjuelito
Bogotá,D.C.

5.5.2. Programa B5. Manejo integral de cuerpos de agua


Durante la ejecución del contrato se realizó la protección de los sumideros en cada uno de los CIV intervenidos, de acuerdo con el inventario inicial elaborado para cada CIV. Estas actividades se llevaron a cabo con el fin de prevenir el ingreso de sedimentos, residuos y materiales a la red de alcantarillado durante el desarrollo de las actividades contractuales.

El Anexo 5 contiene el formato FOAC50 – Manejo de Aguas, en el cual se registran las actividades ejecutadas en los CIV intervenidos y se documenta el cumplimiento de las medidas ambientales implementadas durante la ejecución del contrato.

A continuación, se presenta la trazabilidad de los sumideros protegidos durante la ejecución del contrato, como soporte del cumplimiento de las obligaciones ambientales establecidas.

SUMIDEROS PROTEGIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO		
FRENTE DE OBRA	**CIV**	**CANTIDAD**
Nuevo Muzu	6000547	5
	6000587	7
San Vicente	6000897	5
	6001042	5
El Carmen	6001045	8
	6001105	17
Nuevo Muzu	6000751	13
	6000760	
	6001827	
	6000775	6
Abraham Lincoln	6001672	19
	6001648	
Samore	6001008	8

Tabla 27. Trazabilidad de sumideros protegidos durante la ejecución del contrato

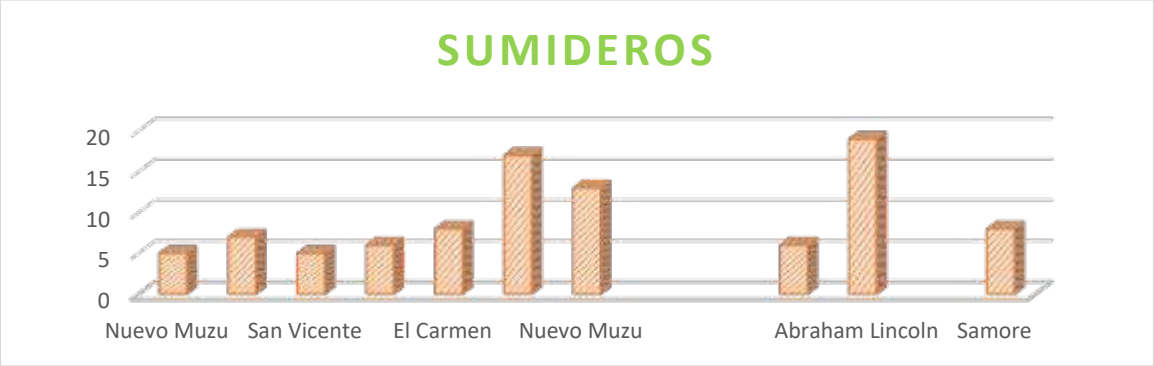

Grafica 6. Cantidad de Sumideros por Frente de obra

Durante la ejecución del contrato se contó con un total de cincuenta y cinco (55) personas, para lo cual se dispuso de catorce (14) unidades sanitarias, entre portátiles y fijas, dando cumplimiento a la normativa aplicable que establece la disponibilidad mínima de una (1) unidad sanitaria por cada quince (15) trabajadores.

El Anexo 9 contiene los certificados de mantenimiento de las unidades sanitarias portátiles, así como los soportes de alquiler de las unidades sanitarias fijas, correspondientes a cada uno de los meses de ejecución del contrato.

Adicionalmente, para el desarrollo de las actividades técnicas se requirió el uso de agua, la cual fue suministrada desde los campamentos fijos ubicados en los diferentes CIV, contando con la autorización correspondiente.

En el Anexo 9 se adjuntan los recibos del servicio público, como soporte del consumo de agua utilizado durante la ejecución del contrato.

En consecuencia, se concluye que el contrato dio cumplimiento a las disposiciones aplicables en materia de dotación de unidades sanitarias y uso del recurso hídrico, garantizando condiciones adecuadas de salubridad y manejo ambiental durante la ejecución de las actividades.

INDICADORES DEL COMPONENTE

INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	DATOS DEL INDICADOR	RESULTADO DEL INDICADOR
(No. de sumideros y/o pozos protegidos / No. total, de sumideros y pozos) *100	Cumplimiento de medidas de manejo hidráulico	94/94	100%
(No. de baños instalados en frentes de obra/ No. de baños requeridos en frente de obra) *100	Manejo de aguas	14/14	100%
No. De derrames controlados/No de derrames presentados	Manejo de suelo	0/0	No Aplica

Tabla 28. Indicadores Componente B; Programa B5. Manejo Integral de cuerpos de agua

✓ **REGISTRO FOTOGRAFICO**












13 abr 2025 9:26:02 a. m.
60F-49 Diagonal 51a Sur
Tunjuelito
Bogotá, D.C.
#Consorcio DC 2025




21/04/25, 9:23 AM
Calle 53A Sur 28-91
Bogotá


21/04/25, 9:22 AM
Calle 53A Sur 28-95
Bogotá




13/05/25, 10:39 AM
Bogotá








20/05/25, 1:30 PM
Calle 63B Sur 25-29
Bogotá


20/05/25, 12:30 PM
Carrera 32 52F-5
Bogotá


20/05/25, 12:09 PM
Calle 63B Sur 26-27
Bogotá


3 jun 2025 2:26:27 p.m.
315° NW
#Consorcio DC 2025
Número de índice: 243


55° NE
#Consorcio DC 2025




Diagonal 53 Sur 61C-32 - 61C-4
Bogotá




18 jun 2025 8:27:32 a. m.
27-94 Diagonal 52 B Sur
Bogotá, 110611
Colombia
#CONSORCIO DC 2025


10/06/25, 10:22 AM
Parque Nuevo Muzu
Bogotá


24/06/25, 11:16 AM
Carrera 27 53B-64
Bogotá


Bogotá
Colombia


Bogotá
Colombia






Brass




22/07/25, 10:47 AM
Calle 53B Sur 25-33
Bogotá


BANCO MIXTO




Carrera 12 52-02




Carrera 118 52-60


10:05











PRIMEROS AUXILIOS





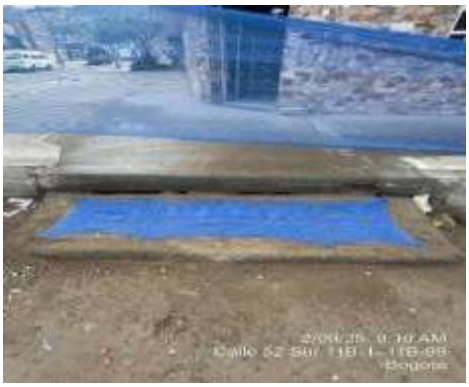








3/09/25, 1:07 PM
Carrera 10A 51-0
Bogotá


#Consorcio DC 2025


PARA CONTROLAR
DERRAME DE
SUSTANCIAS


CAMILLA DE EMERGENCIA
BOTIQUIN
PRIMEROS AUXILIOS














24 oct. 2025 9:58:12 a. m.
52B-41 Carrera 61c
Tunjuelito
Bogotá, D.C.
#Consorcio DC 2025


20 oct. 2025 2:50:03 p. m.
52B-41 Carrera 61c
Tunjuelito
Bogotá, D.C.
#Consorcio DC 2025






04/11/2025 10:38am




5.6. COMPONENTE C. MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO

5.6.1. Componente C. Manejo De La Vegetación

- ✓ Durante la ejecución del contrato se realizó protección de individuos arbóreos de los frentes de obras intervenidos
- ✓ Durante la ejecución del contrato no se generaron novedades o emergencia con individuos árboles en las diferentes jornadas desarrolladas.

INDIVIDUOS ARBOREOS PROTEGIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO		
FRENTE DE OBRA	**CIV**	**CANTIDAD**
Nuevo Muzu	6000547	5
	6000587	
San Vicente	6000897	1
	6001042	0
El Carmen	6001045	0
	6001105	0
Nuevo Muzu	6000751	27
	6000760	
	6001827	
	6000775	6
Abraham Lincoln	6001672	0
	6001648	
Samore	6001008	0

Tabla 29. Trazabilidad de individuos arbóreos protegidos durante la ejecución del contrato

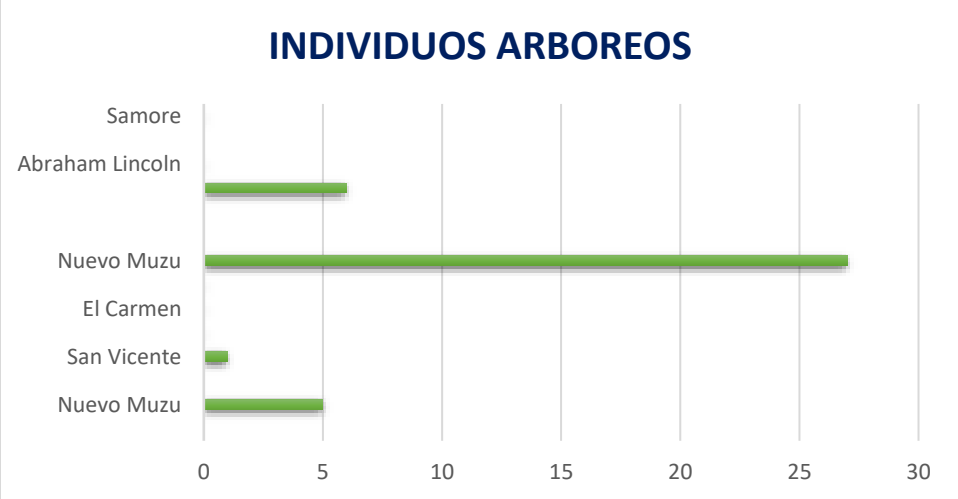

Grafica 7. Cantidad de Individuos arbóreos por Frente de obra

En el anexo 6 se encuentra el formato de registro de los individuos arbóreos protegidos

- **Tratamientos silviculturales ejecutados.**

Se ejecutaron 2 tratamientos silviculturales de tala a los árboles identificados con los No 34 y 35 en la Resolución 1964 de 2024, a continuación, se resumen las actividades ejecutadas.

Actividades realizadas:

1. **Inspección previa:** No se encontraron nidos ni aves en los árboles. Se hizo cerramiento del área.
2. **Ejecución:** Tala controlada de ramas y tronco, asegurando que no se afectara la infraestructura cercana. Los tocones quedaron a la altura exigida por la norma.
3. **Post-ejecución:** Limpieza del área, recolección y repique de residuos vegetales en tamaños no comerciales.

Disposición final: No se requiere salvoconducto para madera ya que los residuos no califican como productos forestales de transformación primaria.

Conclusión: La actividad se realizó sin novedades ni afectaciones ambientales reportadas.



Ilustración 6. Registro fotográfico actividades de tala



Ilustración 7. Recolección de residuos vegetales

En los frentes de obra intervenidos se evidencian 27 individuos arbóreos de influencia directa con las actividades objeto del contrato, encontrándose en los frentes de obra Nuevo Muzu en el CIV 6000751, CIV 6000760 y CIV 6001827, dichos individuos son protegidos y en el anexo 6 – uso de zonas verdes se registra cada individuo en el formato propuesto en el PIPMA. Adicionalmente, en este mismo frente de obra Nuevo Muzu se realiza tratamiento integral a los Individuos arbóreos 2,3,4,6,7 y 8, de acuerdo al inventario de individuos arbóreos inicialmente entregado teniendo en cuenta que ya se iniciaron labores técnicas.







El día 24 de julio el componente forestal del contratista realizo el tratamiento integral de los individuos arbóreos No. 2,3,4,6, 7 y 8 ubicados en el CIV 6000761 (PK 322185), donde se realizó corte y cicatrización de las raíces y ramas de cada individuo arbóreo de acuerdo a las consideraciones de la profesional forestal.

Adicionalmente, el día 26 de julio de 2025 se ejecutaron las talas de los individuos arbóreos No 9,10,11,12,13,14,15 y 23 conforme lo dictaminado en la resolución 1964 de 2024, el respectivo informe se entregó el día 05 de Agosto.

Se realizo verificación de la avifauna presente en los individuos arbóreos, donde se evidenció que no hay presencia de avistamiento de aves.





A continuación, se describe la vegetación presente en el frente de obra de Nuevo Muzu:

No ÁRBOL	NOMBRE COMÚN	LOCALIZACIÓN EXACTA DEL ÁRBOL	CONCEPTO TÉCNICO	ESTADO ACTUAL
1	SAUCO	DG 53 sur entre Cra 61 B y 61 C	Poda radicular	Ejecutado el 24/07/2025 y el 28/07/2025
2	HOLLY LISO	DG 53 sur entre Cra 61 B y 61 C	Tratamiento integral	Ejecutado el 24/07/2025 y el 28/07/2025
3	HOLLY LISO	DG 53 sur entre Cra 61 B y 61 C	Tratamiento integral	Ejecutado el 24/07/2025 y el 28/07/2025
4	HOLLY LISO	DG 53 sur entre Cra 61 B y 61 C	Tratamiento integral	Ejecutado el 24/07/2025 y el 28/07/2025
5	ACACIA	DG 53 sur entre Cra 61 B y 61 C	Tala	Talado por terceros
6	CEREZO	DG 53 sur entre Cra 61 B y 61 C	Tratamiento integral	Ejecutado el 24/07/2025 y el 28/07/2025
7	CHICALA	DG 53 sur entre Cra 61 B y 61 C	Tratamiento integral	Ejecutado el 24/07/2025 y el 28/07/2025
8	HOLLY LISO	DG 53 sur entre Cra 61 B y 61 C	Tratamiento integral	Ejecutado el 24/07/2025 y el 28/07/2025
9	URAPÁN, FRESNO	DG 53 sur entre Cra 61 B y 61 C	Tala	Ejecutado el 26/07/2026
10	URAPÁN, FRESNO	DG 53 sur entre Cra 61 B y 61 C	Tala	Ejecutado el 26/07/2026
11	URAPÁN, FRESNO	DG 53 sur entre Cra 61 B y 61 C	Tala	Ejecutado el 26/07/2026
12	URAPÁN, FRESNO	DG 53 sur entre Cra 61 B y 61 C	Tala	Ejecutado el 26/07/2026
13	URAPÁN, FRESNO	DG 53 sur entre Cra 61 B y 61 C	Tala	Ejecutado el 26/07/2026
14	CAUCHO BENJAMIN	DG 53 sur entre Cra 61 B y 61 C	Tala	Ejecutado el 26/07/2026
15	JAZMIN DEL CABO	DG 53 sur entre Cra 61 B y 61 C	Tala	Ejecutado el 26/07/2026
16	HOLLY LISO	DG 53 sur entre Cra 61 B y 61 C	Tratamiento integral	Ejecutado el 24/07/2025 y el 28/07/2025
17	HOLLY LISO	DG 53 sur entre Cra 61 C y 61 D	Tratamiento integral	Ejecutado el 24/07/2025 y el 28/07/2025
18	HOLLY LISO	DG 53 sur entre Cra 61 C y 61 D	Tratamiento integral	Ejecutado el 24/07/2025 y el 28/07/2025
19	HOLLY LISO	DG 53 sur entre Cra 61 C y 61 D	Tratamiento integral	Ejecutado el 24/07/2025 y el 28/07/2025
20	JAZMIN DE LA CHINA	DG 53 sur entre Cra 61 C y 61 D	Poda radicular	Ejecutado el 24/07/2025 y el 28/07/2025
21	JAZMIN DE LA CHINA	DG 53 sur entre Cra 61 D y 61F	Poda radicular	Ejecutado el 24/07/2025 y el 28/07/2025
22	JAZMIN DE LA CHINA	DG 53 sur entre Cra 61 D y 61F	Poda radicular	Ejecutado el 24/07/2025 y el 28/07/2025
23	JAZMIN DEL CABO, LAUREL HUESITO	DG 53 sur entre Cra 61 D y 61F	Tala	Ejecutado el 26/07/2026
24	JAZMIN DE LA CHINA	DG 53 sur entre Cra 61 D y 61F	Poda radicular	Ejecutado el 24/07/2025 y el 28/07/2025
25	CHICALA	DG 53 sur entre Cra 61 D y 61F	Tratamiento integral	Ejecutado el 24/07/2025 y el 28/07/2025
26	CHICALA	DG 53 sur entre Cra 61 D y 61F	Tratamiento integral	Ejecutado el 24/07/2025 y el 28/07/2025
27	CABALLERO DE LA NOCHE	DG 53 sur entre Cra 61 D y 61F	Tratamiento integral	Ejecutado el 24/07/2025 y el 28/07/2025

No ÁRBOL	NOMBRE COMÚN	LOCALIZACIÓN EXACTA DEL ÁRBOL	CONCEPTO TÉCNICO	ESTADO ACTUAL
28	HOLLY LISO	DG 53 sur entre Cra 61 D y 61F	Tratamiento integral	Talado por terceros
29	CIPRES ITALIANO	DG 53 sur entre Cra 61 D y 61F	Poda radicular	No se requirió tala – se ubica en materia
30	CIPRES ITALIANO	DG 53 sur entre Cra 61 D y 61F	Poda radicular	No se requirió tala – se ubica en materia
31	PINO LIBRO	DG 53 sur entre Cra 61 C y 61 D	Poda radicular	No se requirió tala – se ubica en materia
32	PINO LIBRO	DG 53 sur entre Cra 61 C y 61 D	Poda radicular	No se requirió tala – se ubica en materia
33	LIMON	DG 53 sur entre Cra 61 B y 61 C	Tratamiento integral	Ejecutado el 24/07/2025 y el 28/07/2025
34	PINO PATULA	Cra 61 entre Dg 51B y 52 Sur	Tala	Talado el 26/04/2025
35	PINO PATULA	Cra 61 entre Dg 51B y 52 Sur	Tala	Talado el 26/04/2025
36	CAUCHO DE LA INDIA,	Cra 61 entre Dg 52 A sur y 52 Sur	Poda radicular	Se ajusta la dirección de ubicación, está por fuera del CIV, por lo que no requiere ser intervenido.

Tabla 30. Resultados de la verificación en campo.

Durante la ejecución del contrato se ejecutaron en su totalidad las talas autorizadas, de conformidad con lo establecido en la Resolución 1964 de 2024. En atención a lo anterior, en el Anexo 12 se presenta el informe final del tratamiento silvicultural y la notificación de actualización de las talas en el aplicativo SIGAU del JBB.

USO DE ZONAS VERDES CIV 6000587

En el frente de obra Nuevo Muzú se evidenció la afectación de una zona verde como consecuencia del acopio inadecuado de material. Esta situación fue registrada en el Formato FOAC 51 – Uso de Zonas Verdes, en el cual se documentó el estado inicial del área y los impactos generados por la intervención indebida, específicamente por el almacenamiento de materiales sobre dicha zona.

Como parte de las acciones correctivas y con el objetivo de mitigar los impactos ambientales ocasionados, se procedió a realizar la recuperación del área afectada. Las labores de cierre ambiental se llevaron a cabo el día 20 de junio del presente año, consistiendo principalmente en la limpieza, retiro de los materiales acopiados y la restitución del área mediante el proceso de empradización (siembra de césped), logrando así la restauración completa del espacio intervenido.

A continuación, se presentan los registros fotográficos y evidencias correspondientes que demuestran el antes y el después de la intervención, dejando constancia de la recuperación satisfactoria de la zona verde afectada.

Nos permitimos adjuntar el certificado que respalda los materiales empleados en las actividades de recuperación de la zona verde intervenida. Cabe resaltar que dichos materiales fueron donados por el Vivero Ángel de Paz, quien de manera voluntaria y solidaria contribuyó con el suministro de tierra negra y un total de quince metros cuadrados (15 m²) de césped.

Esta donación fue fundamental para llevar a cabo la restauración del área afectada, permitiendo una intervención adecuada y conforme a los lineamientos ambientales establecidos para este tipo de espacios y con dicho aporte permitió mejorar las condiciones paisajísticas y ecológicas del entorno.

ESTADO INICIAL



Ilustración 8. Estado inicial antes de intervención

DURANTE LA INTERVENCIÓN



Ilustración 9. Afectación durante la intervención

GESTIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA ZONA VERDE





Ilustración 10. Recuperación y empradización de la zona verde afectada

USO DE ZONAS VERDES CIV 6000751

En el frente de obra Nuevo Muzú se evidenció la afectación de una zona verde como consecuencia del acopio inadecuado de material. Esta situación fue registrada en el Formato FOAC 51 – Uso de Zonas Verdes, en el cual se documentó el estado inicial del área y los impactos generados por la intervención indebida, específicamente por el almacenamiento de materiales sobre dicha zona.

Como parte de las acciones correctivas y con el objetivo de mitigar los impactos ambientales ocasionados, se procedió a realizar la recuperación del área afectada. Las labores de cierre ambiental se llevaron a cabo en el mes de Octubre, consistiendo principalmente en la limpieza, retiro de los materiales acopiados y la restitución del área mediante el proceso de empradización (siembra de césped), logrando así la restauración completa del espacio intervenido.

A continuación, se presentan los registros fotográficos y evidencias correspondientes que demuestran el antes y el después de la intervención, dejando constancia de la recuperación satisfactoria de la zona verde afectada.

En el *anexo 6* se adjuntan cámara de Comercio, cuenta de cobro y certificado de suministro de césped del establecimiento Espacios Naturales de donde fue adquirido el pasto para la recuperacion de la zona afecta en el frente de obra Nuevo Muzu.

ESTADO INICIAL




Ilustración 11. Estado inicial antes de intervención

DURANTE LA INTERVENCIÓN




Ilustración 12. Afectación durante la intervención

GESTIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA ZONA VERDE






Ilustración 13. Recuperación y empradización de la zona verde afectada

INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	DATOS DEL INDICADOR	RESULTADO DEL INDICADOR
(No. de árboles Protegidos / No. árboles totales del área de influencia) * 100	Tratamiento individuos arbóreos	39/39	100%
(No. de individuos arbóreos talados / No. individuos arbóreos con permiso de tala emitido por la SDA) *100	Tratamiento individuos arbóreos	10/11	91%
(Área de zonas verdes utilizadas / Área total de zona verde) *100	Protección de zonas verdes existentes	0/0	No aplica
(No. de individuos arbóreos plantados / No. de individuos arbóreos programados para plantar en el periodo) *100	Plantación de arborización	0/0	No Aplica

Tabla 31. Indicadores Componente C; Manejo de la vegetación y paisajismo

5.6.2. Programa C2. Manejo de fauna

Durante la ejecución del contrato se realizaron inspecciones y actividades de seguimiento ambiental en los CIV intervenidos, sin que se identificara la presencia de especies de fauna silvestre en las áreas de intervención.

Las actividades desarrolladas permitieron verificar que las obras se ejecutaron sin generar afectaciones sobre la fauna, garantizando el cumplimiento a las medidas de prevención y control ambientales y la normatividad ambiental vigente.

En consecuencia, se concluye que el componente de fauna no presentó novedades durante la ejecución del contrato, evidenciando una gestión ambiental adecuada y acorde con las obligaciones establecidas para la finalización del mismo.

INDICADORES DEL COMPONENTE

INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	DATOS DEL INDICADOR	RESULTADO DEL INDICADOR
No. animales rescatados / No. animales encontrados	Rescate de fauna	0/0	No Aplica

Tabla 32. Indicadores C2 Manejo de Fauna

6. CIERRES AMBIENTALES

La elaboración de los cierres ambientales consistió en el retiro de las protecciones instaladas (mallas o poli malla azul) sobre los individuos arbóreos, sumideros, rejillas y demás cuerpos de agua que fueron protegidos durante la ejecución del contrato. Estas protecciones se colocaron con el objetivo de evitar que los residuos afectaran la función principal de los sumideros, que es la recolección de aguas lluvias para prevenir inundaciones y taponamientos. Asimismo, la protección de los individuos arbóreos buscó prevenir daños a sus raíces, tallo, hojas y demás partes vitales.

Adicionalmente, se llevaron a cabo jornadas de aseo que incluyeron la limpieza de vías y el retiro de residuos de demolición, construcción y señalización en cada uno de los frentes de obra.

La correcta ejecución de los cierres ambientales fue verificada mediante visitas y recorridos de obra realizados conjuntamente con la interventoría.

Finalmente, una vez retirada la protección, se aseguró que las áreas intervenidas quedaran en igual o mejor estado que el encontrado originalmente, dado que, al finalizar la intervención, no debe persistir ningún tipo de afectación ambiental.

La tabla No. 33 presenta la cantidad de cierres ambientales realizados por período. Adicionalmente, en el Anexo 8**,** se encuentra un anexo independiente correspondiente a cada uno de los cierres ambientales ejecutados.

CIERRES AMBIENTALES			
PERIODO	**ITEM**	**CANTIDAD**	**CIV INTERVENIDO**

may-25	SUMIDEROS	5	6000897
	INDIVIDUOS ARBOREOS	1	
	SUMIDEROS	6	6001042
	SUMIDEROS	5	6000547
	INDIVIDUOS ARBOREOS	3	
jun-25	SUMIDEROS	7	6000587
	ZONA VERDE	1	
ago-25	SUMIDEROS	8	6001045
sep-25	SUMIDEROS	8	6001008
		19	6001672, 6001648
oct-25	SUMIDEROS	19	6000751, 6000760, 6001827, 6000775
	INDIVIDUOS ARBOREOS	22	
nov-25	SUMIDEROS	17	6001105


Tabla 33. Cierres Ambientales

7. CONCLUSIONES

- ✓ Durante la ejecución del contrato se contó con la presencia permanente de los profesionales requeridos para la gestión Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) en los frentes de obra, quienes garantizaron el cumplimiento de los procedimientos y lineamientos establecidos para el desarrollo adecuado de las actividades contractuales
- ✓ Se establecieron e implementaron lineamientos orientados a la preservación y conservación de las condiciones ambientales, con el fin de prevenir, controlar y mitigar los impactos que pudieron generarse como consecuencia del desarrollo del proyecto.
- ✓ Se verificó el cumplimiento de las medidas ambientales establecidas**,** mediante actividades de seguimiento, control y acompañamiento técnico durante la ejecución del contrato.
- ✓ En cada uno de los frentes de obra se garantizó la instalación de los campamentos y la disponibilidad de los insumos necesarios, asegurando condiciones adecuadas para la correcta ejecución de las actividades contractuales.
- ✓ Los individuos arbóreos identificados durante el período evaluado fueron protegidos, sin que se presentaran afectaciones a su estructura, estado fitosanitario o entorno inmediato**,** salvo aquellos autorizados para intervención.
- ✓ Se verificó de manera permanente la protección de los sumideros, y en los casos en que se identificó deterioro en las protecciones, estas fueron reemplazadas oportunamente**,** garantizando su adecuada funcionalidad.
- ✓ En los frentes de obra se utilizaron volquetas y maquinaria que contaban con PIN ambiental vigente, así como equipos autorizados y aprobados por la interventoría**,** cumpliendo con los requisitos técnicos, ambientales y operativos exigidos para hacer parte del contrato.
- ✓ Durante el período de ejecución del contrato y las actividades desarrolladas no se presentaron derrames con afectación ambiental**,** evidenciando un manejo adecuado de materiales, insumos y residuos.
- ✓ Las unidades sanitarias portátiles y fijas se mantuvieron disponibles de manera permanente para el personal femenino y masculino, cumpliendo con los criterios de salubridad y bienestar laboral.
- ✓ Se identificó como una oportunidad de mejora la necesidad de fortalecer los procesos de capacitación continua al personal**,** con el fin de promover e incentivar la separación de residuos en la fuente, tanto en los frentes de obra como en los entornos domésticos.
- ✓ Se ejecutaron las talas autorizadas y parcialmente los tratamientos integrales a los individuos arbóreos objeto de intervención, conforme al permiso ambiental otorgado mediante la Resolución 1964 de 2024 expedida por la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA)**.**

- ✓ De acuerdo con la finalización de las actividades técnicas, se realizaron los cierres ambientales en cada uno de los CIV intervenidos**,** garantizando que las áreas quedaran en condiciones iguales o mejores a las inicialmente encontradas.
- ✓ Se instaló mezcla asfáltica modificada con grano de caucho en los CIV 6001045, 6000751, 6000760, 6001827, 6001648, 6001672, 6000775 y 6001105**,** dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 442 de 2015, al promover el aprovechamiento de llantas usadas y su reincorporación en procesos productivos**,** contribuyendo a la gestión integral de este residuo.
- ✓ El uso de asfalto modificado en el marco del proyecto vial contribuyó a la reducción de impactos ambientales**,** fomentó la economía circular y aseguró una gestión responsable de las llantas usadas**,** en concordancia con los compromisos legales y de sostenibilidad aplicables.
- ✓ Se identificó la conveniencia de optimizar los procesos de tratamiento de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD)**,** con el fin de maximizar el aprovechamiento de los recursos disponibles y fortalecer el cumplimiento de las metas ambientales establecidas.
- ✓ Como resultado de la gestión ambiental implementada, el contrato finalizó con un cumplimiento del 54,32% en la meta de circularidad y del 55,12% en la meta de aprovechamiento**,** superando los valores mínimos exigidos por la normativa vigente, correspondiente a lo dispuesto en el Decreto 507 de 2023**.**
- ✓ Los Componentes D y E, correspondientes a la gestión en seguridad y salud en el trabajo y a la señalización de seguridad, respectivamente, fueron gestionados y reportados de manera independiente al componente ambiental, conforme a lo establecido contractualmente

CONSORCIO DC 2025
ORGANIGRAMA

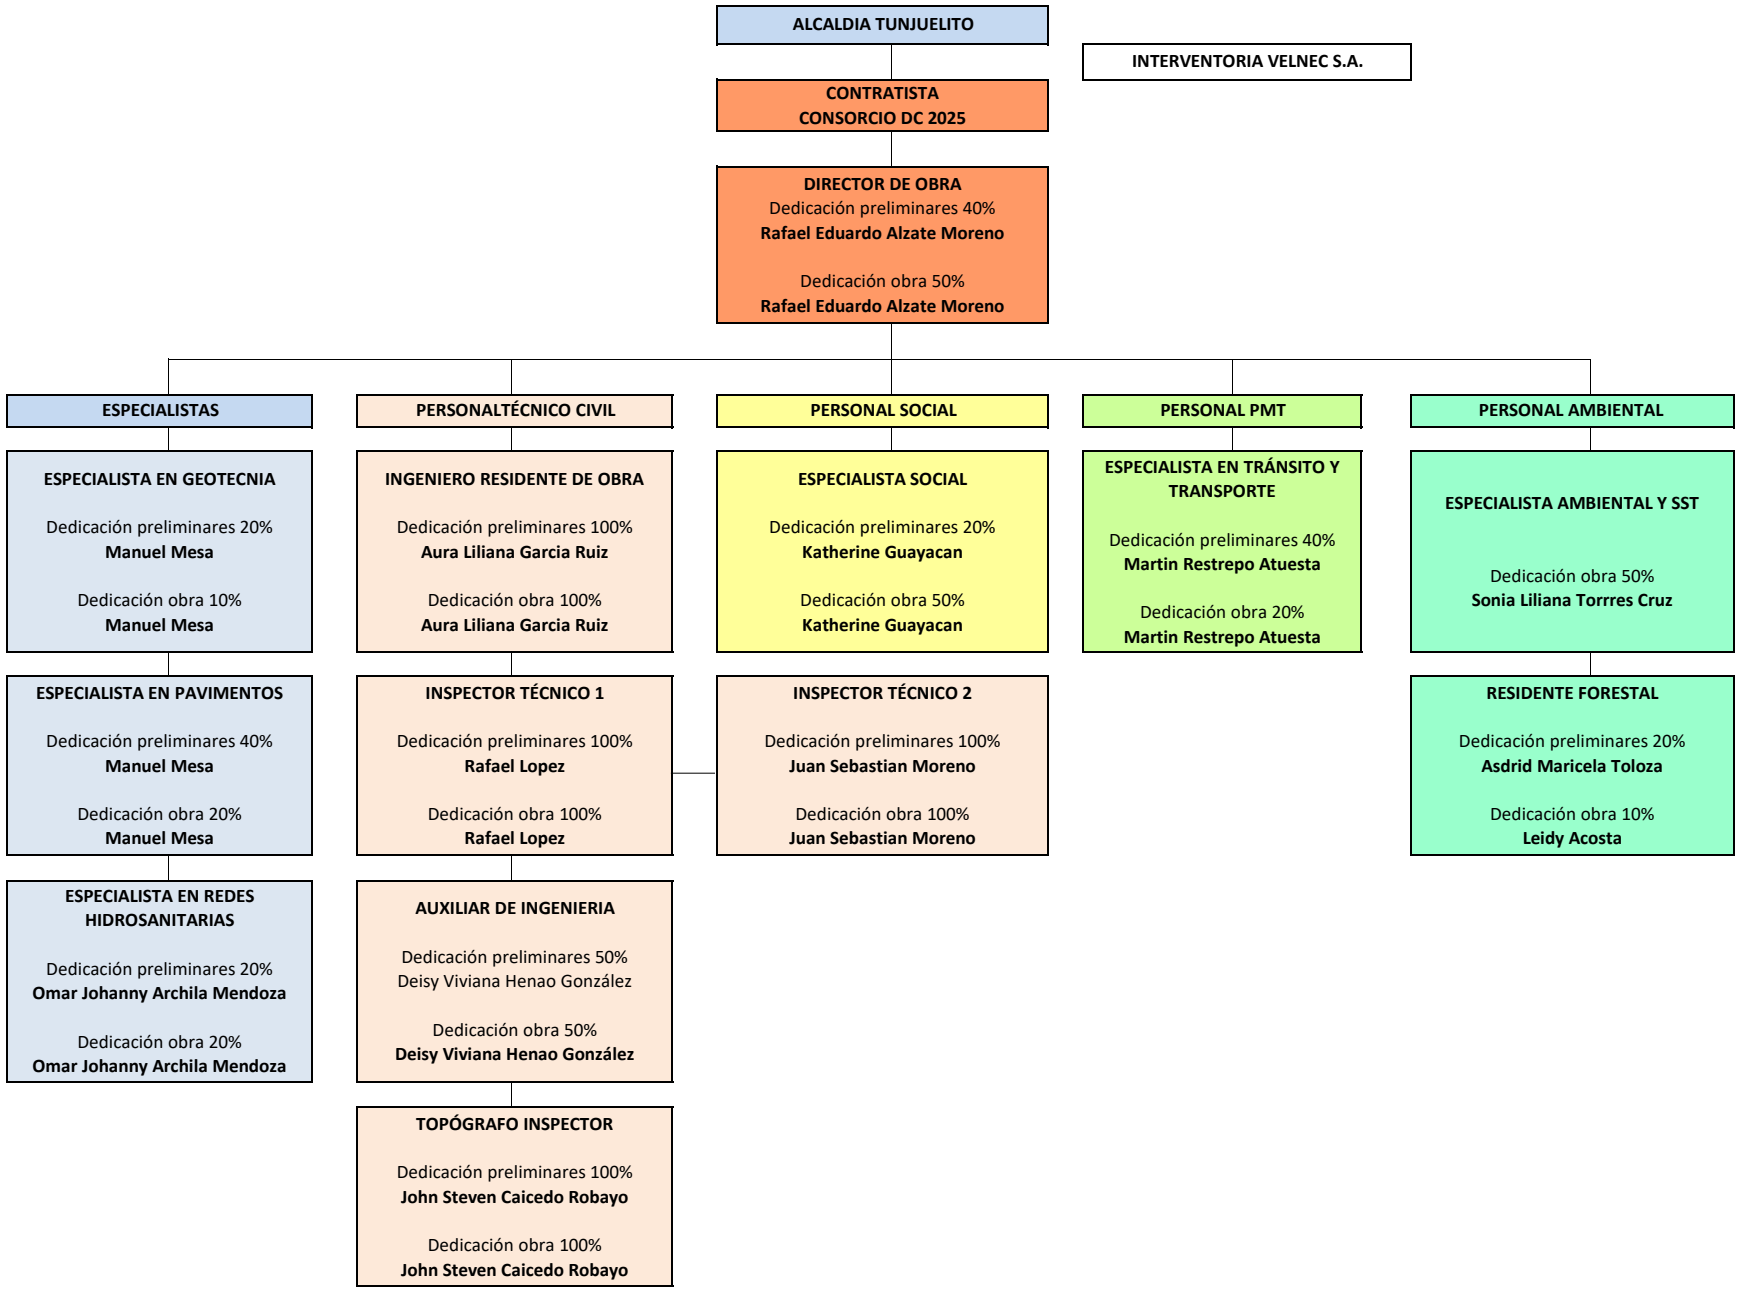

FORMATO		
REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-AC-84	Gestión Ambiental Calidad y SST	3

FECHA 10 (DD) 03 (MM) 2025 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL _____

DIRECCIÓN TECNICA _____

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA _____

CONTRATO No. 622 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/ O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

NOMBRE DEL PROFESIONAL JESSICA LORENA RAMIREZ

EMPRESA: CONSORCIO DC 2025

TIPO

INDUCCIÓN ☐ **CAPACITACIÓN** ☐ **ENTRENAMIENTO** ☐

CHARLA INFORMATIVA ☒ **OTRO** ☐ **¿Cuál?** _____

TEMA:

CHARLA SOBRE EL PIPMA APROBADO PARA EL CONTRATO

LUGAR DEL EVENTO _____

HORA DE INICIO: _____ **HORA DE TERMINACIÓN:** _____

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	John Steven Cisneros P	1017419015	topografo	DC 2025	
2	Jonathan Martinez	1012393061	Cadenero	DC 2025	
3	Rafael López	9.396.935	Ing. Residente	DC 2025	
4	David Eduardo D	1233911467	Ing. Obra	Concol	
5	Florentino Bernal	79533302	oficial	concol	
6	Jose [illegible]	4970666	operador	ingecon	
7	Samuel Garc[illegible]	79960981	Operador	Ingefe	
8	[illegible]	[illegible]			
9	[illegible]	[illegible]	oficial	imtech	
10	Juan Sebastian Moreno	1018494195	Ing Auxiliar	DC 2025	
11	[illegible]	1627727	oficial	DC 2025	
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

(Firma) Jessica Ramirez

(Nombre) _____

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC _____

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

(Firma) _____

(Nombre) _____

Residente Ambiental y/o SST Interventoría

LIC _____

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original:Dependencia responsable del contrato

1era copia : Interventor

2da copia: Contratista

Powered by CamScanner

FORMATO REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS			
CÓDIGO FO-AC-84	**PROCESO** Gestión Ambiental Calidad y SST	**VERSIÓN** 3	BOGOTÁ

FECHA 10 (DD) 04 (MM) 2025. (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN TECNICA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No. 622 del 2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/ O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

NOMBRE DEL PROFESIONAL SONIA LILIANA TORRES CRUZ

EMPRESA: CONSORCIO DC 2025

TIPO

INDUCCIÓN [ ] **CAPACITACIÓN** [ ] **ENTRENAMIENTO** [ ]

CHARLA INFORMATIVA [X] **OTRO** [ ] **¿Cuál?**

TEMA:

- Charla cuidado y protección a individuos arboreos y sumideros.
- Aseo a andenes y vías colindantes al proyecto.

LUGAR DEL EVENTO Frentes de obra San Vicente y Nuevo Muzu.

HORA DE INICIO: 7:400m. **HORA DE TERMINACIÓN:** 8:10am.

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	Jaisson Cavidas Rivadeneira	1069236388	operador	Ingetech.	
2	Carlos Garcia	1110560497	OF.	Ingetech	
3	Samuel Garcia.	79900484	Op	Ingetech.	
4	Brayan Ladino	8-472500	OF	Ingetech.	
5	Mauricio Cajas	5292994	op	Ingtech	
6	Luis David Fonseca	1049435853	Ayudante	Ingtech.	Luis David
7	Jose elizabeth martinez	1049134591	oficial	Ingtech.	
8	Jorge Murillo	79955251	OF	Ingetech.	
9	Katherine Gaspoch	1000226045	P Social	Consorcio DC.	Katherine GP.
10					
11					
12					

(Firma)

(Nombre) SONIA LILIANA TORRES CRUZ

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC 4359 del 08/09/2020

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

(Firma)

(Nombre) CLAUDIA BELTRAN

Residente Ambiental y/o SST Interventoria

LIC

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original Dependencia responsable del contrato

1era copia Interventor

2da copia Contratista

Scanned with CamScanner

FORMATO REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS			
CÓDIGO FO-AC-84	**PROCESO** Gestión Ambiental Calidad y SST	**VERSIÓN** 3	BOGOTÁ

FECHA 15 (DD) | 04 (MM) | 2025 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL _____

DIRECCIÓN TECNICA _____

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA _____

CONTRATO No. 622 del 2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/ O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

NOMBRE DEL PROFESIONAL: SONIA LILIANA TORRES CRUZ

EMPRESA: CONSORCIO DC 2025

TIPO

INDUCCIÓN [ ] CAPACITACIÓN [ ] ENTRENAMIENTO [ ]

CHARLA INFORMATIVA [x] OTRO [ ] ¿Cuál? _____

TEMA:

- Charla de orden aseo y limpieza.
- Uso adecuado de la unidad sanitaria movil.

LUGAR DEL EVENTO: Nuevo Muzu.

HORA DE INICIO: 11:10 am. HORA DE TERMINACIÓN: 11:30am.

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	Carlos Tellez	1144070697	Oficial	Infratech.	
2	EPP; Bustamante.	1143304991	Ayudante de	Infratech.	EPP;
3	Jose Murillo	1049552911	OF	Infratech.	
4	Jose Martinez	1073939551	OF	Infratech.	
5	Mauricio Cajo	52792944	oficial	Infratech.	
6	Samuel Garcia	1049004811	Op	Infratech	
7	Juan David Fernandez	1049935853	Ayudante	Infratech.	
8	Cristian Romero	1005851914	Boal	Contacto DC.	cristian
9					
10					
11					
12					

(Firma)

(Nombre) SONIA LILIANA TORRES CRUZ

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC 4359 del 08/09/2020

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

(Firma)

(Nombre) CLAUDIA BELTRAN

Residente Ambiental y/o SST Interventoría

LIC _____

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original Dependencia responsable del contrato

1era copia : Interventor

2da copia Contratista

Scanned with CamScanner

FORMATO REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS			
CÓDIGO FO-AC-84	**PROCESO** Gestión Ambiental Calidad y SST	**VERSIÓN** 3	BOGOTÁ

FECHA 15 (DD) 04 (MM) 2025 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL _____

DIRECCIÓN TECNICA _____

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA _____

CONTRATO No. 622 del 2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/ O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

NOMBRE DEL PROFESIONAL SONIA LILIANA TORRES CRUZ

EMPRESA: CONSORCIO DC 2025

TIPO

INDUCCIÓN ☐ **CAPACITACIÓN** ☐ **ENTRENAMIENTO** ☐

CHARLA INFORMATIVA ☒ **OTRO** ☐ **¿Cuál?** _____

TEMA:

-Socialización de clasificación de los residuos ordinarios, clasificación en los canecas de diferentes colores, la separación de los mismos.

LUGAR DEL EVENTO frentes de obra San Vicente y Nueva Meza.

HORA DE INICIO: 8:00am **HORA DE TERMINACIÓN:** 8:30am.

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑÍA	FIRMA
1	Carlos Tovar	77470691	Oficial	Ingtech	
2	Cristian Bustamante	1193109901	Ayudante	Ingtech	
3	Jose Martinez	1023934551	Oficial	Ingtech	
4	Mauricio Rojas	5292994	Oficial	Ingtech	
5	Samuel Gam	7170004211	Oficial	Ingtech	
6	Jose Murillo	1095522121	Oficial	Ingtech	
7	Maria Fernanda Piñeros	1000861580	Board	Consorcio DC	
8					
9					
10					
11					
12					

(Firma)

(Nombre) SONIA LILIANA TORRES CRUZ

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC 4359 del 08/09/2020

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

(Firma)

(Nombre) CLAUDIA BELTRAN

Residente Ambiental y/o SST Interventoría

LIC _____

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original Dependencia responsable del contrato

1era copia : Interventor

2da copia Contratista

Scanned with CamScanner

FORMATO REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS			
CÓDIGO FO-AC-84	**PROCESO** Gestión Ambiental Calidad y SST	**VERSIÓN** 3	BOGOTÁ

FECHA 21 (DD) 04 (MM) 2025 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL _____

DIRECCIÓN TECNICA _____

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA _____

CONTRATO No. **622 del 2024**

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/ O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÀ D.C."

NOMBRE DEL PROFESIONAL: SONIA LILIANA TORRES CRUZ

EMPRESA: CONSORCIO DC 2025

TIPO

INDUCCIÓN [ ] CAPACITACIÓN [ ] ENTRENAMIENTO [ ]

CHARLA INFORMATIVA [X] OTRO [ ] ¿Cuál? _____

TEMA:

Clasificación de Residuos convencionales.
Uso adecuado del punto ecológico.

LUGAR DEL EVENTO: San Vicente.

HORA DE INICIO: 9:00am. HORA DE TERMINACIÓN: 9:30am.

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	Florentino Becerra	79593502	Oficial	INGECOP	
2	Julia Martinez	19478243	Alu	INGECOP	
3	Ernesto Jimenez H	17651691	OP	Marcoy	
4	Jose L. Moreno	5750166	operador	Ingecop	
5	Maria Fernanda Piñeros	1000861580	Board	Consorcio DC	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

(Firma)

(Nombre) SONIA LILIANA TORRES CRUZ

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC 4359 del 08/09/2020

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

(Firma)

(Nombre) CLAUDIA BELTRAN

Residente Ambiental y/o SST Interventoria

LIC _____

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original Dependencia responsable del contrato

1era copia : Interventor

2da copia: Contratista

Scanned with CamScanner

FORMATO			
REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS			
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**	BOGOTÁ Alcaldía Local de Tunjuelito
FO-AC-84	Gestión Ambiental Calidad y SST	3	

FECHA 05 (DD) | 05 (MM) | 2025. (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN TECNICA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No. 622 del 2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/ O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

NOMBRE DEL PROFESIONAL SONIA LILIANA TORRES CRUZ

EMPRESA: CONSORCIO DC 2025

TIPO

INDUCCIÓN ☐ **CAPACITACIÓN** ☐ **ENTRENAMIENTO** ☐

CHARLA INFORMATIVA ☒ **OTRO** ☐ **¿Cuál?**

TEMA: Capacitación de la importancia de las herramientas e implementación del PMT.

LUGAR DEL EVENTO Nuevo Hotel.

HORA DE INICIO: 4:20am. **HORA DE TERMINACIÓN:** 4:40am.

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPANIA	FIRMA
1	Jose Martinez	1073534551	oficial	ingtech	Jose M
2	Samuel Garcia	79900484	Op	ingtech	
3	Carlos To	11470691	Oficial	ingtec	
4	Luis David Fernandez	1049935853	Ayudante	ingtech	
5	Mauricio Cipa	5292994	oficial	" "	
6	Jairson Estrada Nieves	1069230268	Operador	ingtech	
7	Edi bustamante	1193107991	Ayudante		
8	Jose Murillo	79455241	OF		
9	Cristian Ramos	1005851414	Boal	D.C	cristian
10					
11					
12					

(Firma)
(Nombre) SONIA LILIANA TORRES CRUZ
Residente Ambiental y/o SST Contratista
LIC 4359 del 08/09/2020
(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

(Firma)
(Nombre) CLAUDIA BELTRAN
Residente Ambiental y/o SST Interventoría
LIC
(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original: Dependencia responsable del contrato
1era copia: Interventor
2da copia: Contratista

Scanned with CamScanner

FORMATO REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS			
CÓDIGO FO-AC-84	**PROCESO** Gestión Ambiental Calidad y SST	**VERSIÓN** 3	BOGOTÁ Alcaldía Local de Tunjuelito

FECHA 12 (DD) 05 (MM) 2025 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN TECNICA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No. 622 del 2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/ O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

NOMBRE DEL PROFESIONAL SONIA LILIANA TORRES CRUZ

EMPRESA: CONSORCIO DC 2025

TIPO

INDUCCIÓN [ ] **CAPACITACIÓN** [ ] **ENTRENAMIENTO** [ ]

CHARLA INFORMATIVA [X] **OTRO** [ ] **¿Cuál?**

TEMA: Clasificación de los Residuos convencionales

LUGAR DEL EVENTO Nuevo Hotel.

HORA DE INICIO: 7:40am. **HORA DE TERMINACIÓN:** 11:55 am.

No.	NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	E. Di Vustamante	1149377401	Auxiliar	Ingetech.	EPP;
2	Jose Murillo	19953221	OF	Ingetech.	
3	Carlos Diaz	1.020.626.726	Ayudante	Ingetech.	
4	Cristian Romero	1005851914	Boal	D.C	Cristian
5	Wilmer Gomez	1.077.773.	Oficial	Ingetech	
6	Samuel Barco	1.090.409.481	Op	Ingetech	
7	Jose Martinez	1073545531	Oficial	ingetech	Jose M
8					
9					
10					
11					
12					

(Firma)
(Nombre) SONIA LILIANA TORRES CRUZ
Residente Ambiental y/o SST Contratista
LIC 4359 del 08/09/2020
(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

(Firma)
(Nombre) CLAUDIA BELTRAN
Residente Ambiental y/o SST Interventoria
LIC
(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original:Dependencia responsable del contrato
1era copia : Interventor
2da copia: Contratista

Scanned with CamScanner

FORMATO REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS			
CÓDIGO FO-AC-84	**PROCESO** Gestión Ambiental Calidad y SST	**VERSIÓN** 3	BOGOTÁ Alcaldía Local de Tunjuelito

FECHA 16 (DD) | 05 (MM) | 2025. (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN TECNICA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No. 622 del 2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/ O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

NOMBRE DEL PROFESIONAL SONIA LILIANA TORRES CRUZ

EMPRESA: CONSORCIO DC 2025

TIPO

INDUCCIÓN ☐ **CAPACITACIÓN** ☐ **ENTRENAMIENTO** ☐

CHARLA INFORMATIVA ☒ **OTRO** ☐ **¿Cuál?**

TEMA: Capacitación sobre normas de manejo de Tránsito.

LUGAR DEL EVENTO Nuevo Hitn.

HORA DE INICIO: 8:10am. **HORA DE TERMINACIÓN:** 8:30am.

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPANIA	FIRMA
1	Mauricio Cajas	5792944	prof	ingetec	
2	Fabian E. Rivera Ramos	1069230388	Operador	ingetech	Fabian E. Rivera
3	Jose Martinez	1073939551	Oficial	ingtech	Jose M
4	Carlos Ospina	7710609	Oficial	———	Carlos
5	Juan Garcia	79900891	Op	ingtech	Juan
6	Luis Fernando	1014455893	Ayudante	ingtech	Luis Fernando
7	Edi Bustamante	1143907901	Ayudante		Edi
8	Jose Murillo	19955221	Op		Jose
9	Cristian Ramirez	1005851914	Boal	D.C	Cristian
10					
11					
12					

(Firma)
(Nombre) SONIA LILIANA TORRES CRUZ
Residente Ambiental y/o SST Contratista
LIC 4359 del 08/09/2020
(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

(Firma)
(Nombre) CLAUDIA BELTRAN
Residente Ambiental y/o SST Interventoría
LIC
(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original: Dependencia responsable del contrato
1era copia : Interventor
2da copia: Contratista

Scanned with CamScanner

FORMATO REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS			
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**	BOGOTÁ Alcaldía Local de Tunjuelito
FO-AC-84	Gestión Ambiental Calidad y SST	3	

FECHA 21 (DD) 05 (MM) 2025. (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN TECNICA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No. 622 del 2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/ O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

NOMBRE DEL PROFESIONAL: SONIA LILIANA TORRES CRUZ

EMPRESA: CONSORCIO DC 2025

TIPO

INDUCCIÓN [ ] CAPACITACIÓN [ ] ENTRENAMIENTO [ ]

CHARLA INFORMATIVA [X] OTRO [ ] ¿Cuál? _____

TEMA:

Manejo y disposición de los residuos generados en las diferentes actividades como su respectiva clasificación.

LUGAR DEL EVENTO: San Vicente de Ferrer.

HORA DE INICIO: 8:00am. HORA DE TERMINACIÓN: 9:00am.

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	Florentino Bernal	79583302	Oficial	INECOP	Florentino Bernal
2	Jose Zabala	5632662	Ayuda	Ingeco	
3	David Arcinieg	79-506 695	Ayudante	INECOP	
4	Pedro Pablo Ruiz	11348096	Operador	INGECOP	
5	Jose b Morales	5970666	operador	ingecop	
6	Maria Fernanda Pinz	1000861580	Board	Consorcio DC	
7	Ernesto Jimenez M	13681681	Operador	Ingecop	
8					
9					
10					
11					
12					

(Firma)

(Nombre) SONIA LILIANA TORRES CRUZ

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC 4359 del 08/09/2020

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

(Firma)

(Nombre) CLAUDIA BELTRAN

Residente Ambiental y/o SST Interventoría

LIC _____

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original: Dependencia responsable del contrato

1era copia : Interventor

2da copia: Contratista

Scanned with CamScanner

FORMATO REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS			
CÓDIGO FO-AC-84	**PROCESO** Gestón Ambiental Calidad y SST	**VERSIÓN** 3	BOGOTÁ

FECHA 05 (DD) | 06 (MM) | 2025 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN TECNICA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No. 622 del 2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/ O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

NOMBRE DEL PROFESIONAL SONIA LILIANA TORRES CRUZ

EMPRESA: CONSORCIO DC 2025

TIPO

INDUCCIÓN ☐ **CAPACITACIÓN** ☒ **ENTRENAMIENTO** ☐

CHARLA INFORMATIVA ☐ **OTRO** ☐ **¿Cuál?**

TEMA: Capacitación en protección de sumideros y/o cuerpos de agua y capacitación en manejo de flora.

LUGAR DEL EVENTO Nuevo Muzu.

HORA DE INICIO: 11:00am. **HORA DE TERMINACIÓN:** 1:30am.

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	Jose Martinez	1072934551	oficial	imtech	Jose M
2	Hartley londoño	1023930687	Ayu.	Ingtech	
3	Vicente Vega	4255489	oficial		
4	Gladys Ducó	52231790	Boal	consoria D.	Gladys D
5	Patricia Pulido	52547251	Boal	consorcio DC	Patricia Pul
6	Vera Alvarez	1562774.	Oficial	mytech	
7					
8					
9					
10					
11					
12					

(Firma)

(Nombre) SONIA LILIANA TORRES CRUZ

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC 4359 del 08/09/2020

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

(Firma)

(Nombre) CLAUDIA BELTRAN

Residente Ambiental y/o SST Interventoría

LIC

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original Dependencia responsable del contrato

1era copia : Interventor

2da copia: Contratista

Scanned with CamScanner

FORMATO

REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-AC-84	Gestión Ambiental Calidad y SST	3

FECHA 12 (DD) 06 (MM) 2025 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN TECNICA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No. 622 del 2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/ O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

NOMBRE DEL PROFESIONAL SONIA LILIANA TORRES CRUZ

EMPRESA: CONSORCIO DC 2025

TIPO

INDUCCIÓN ☐ CAPACITACIÓN ☒ ENTRENAMIENTO ☐

CHARLA INFORMATIVA ☐ OTRO ☐ ¿Cuál? _____

TEMA:

Capacitacion del Programa de Manejo Ambiental de Residuos de Construcción y demolicion PMRCD.

LUGAR DEL EVENTO El Carmen.

HORA DE INICIO: 4:15am. **HORA DE TERMINACIÓN:** 4:45 am.

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	ADRIANA GARZÓN	52.751.798	AUX. TRANSITO	CONSORCIO DC	
2	Cristian Romero	1005851914	Boal	consorcio DC	
3	florentino Bonilla	79583302	Oficial	INGECOP	
4	Edwards Gamboa	79445677	OFICIAL	INGECOP	
5	Michael Alexander Ortiz	1019113156	Inspector	Ingecop	
6	JOSE [illegible]	5970666	[illegible]	ingecop	
7	pedro Pablo Pabon	11348096	operador	INGECOP	
8	Luis Martinez	7745024	[illegible]	INGECOP	
9					
10					
11					
12					

(Firma)

(Nombre) SONIA LILIANA TORRES CRUZ

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC 4359 del 08/09/2020

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

(Firma)

(Nombre) CLAUDIA BELTRAN

Residente Ambiental y/o SST Interventoría

LIC

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original:Dependencia responsable del contrato

1era copia : Interventor

2da copia: Contratista

Scanned with CamScanner

FORMATO REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS			
CÓDIGO FO-AC-84	**PROCESO** Gestión Ambiental Calidad y SST	**VERSIÓN** 3	BOGOTÁ

FECHA 19 (DD) 06 (MM) 2025 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN TECNICA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No. 622 del 2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/ O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

NOMBRE DEL PROFESIONAL: SONIA LILIANA TORRES CRUZ

EMPRESA: CONSORCIO DC 2025

TIPO

INDUCCIÓN ☐ CAPACITACIÓN ☒ ENTRENAMIENTO ☐

CHARLA INFORMATIVA ☐ OTRO ☐ ¿Cuál? _____

TEMA: Capacitación en mitigación de particulas en suspensión y protección para el ambiente y el trabajador.

LUGAR DEL EVENTO: El Carmen.

HORA DE INICIO: 8:30am. HORA DE TERMINACIÓN: 8:50am.

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	Steven cardenas	1100687777	Boal	consorcio Dc	
2	[illegible]	1030927461	Boal	consorcio	
3	Cristian Romero	1005851914	Boal	consorcio dc	cristian
4	Rodulfo Bates	16501320	Ayudante.	Ingecop.	
5	Florentino Bezna	79593302	Oficial	Ingecop	Florentino
6	Luis Martinez	79758263	Ayud	ING Cop	
7	[illegible]	79445677	OFC	ING Cop	
8	Yorguin Jimenez	1067727401	Operador	ingecop	
9	Miguel ortiz	1019113156	Inspector	Ingecop	
10					
11					
12					

(Firma) Sonia Torres C.

(Nombre) SONIA LILIANA TORRES CRUZ

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC 4359 del 08/09/2020

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

(Firma)

(Nombre) CLAUDIA BELTRAN

Residente Ambiental y/o SST Interventoria

LIC

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original:Dependencia responsable del contrato

1era copia : Interventor

2da copia: Contratista

Scanned with CamScanner

FORMATO REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS			
CÓDIGO FO-AC-84	**PROCESO** Gestión Ambiental Calidad y SST	**VERSIÓN** 3	BOGOTÁ

FECHA 04 (DD) | 07 (MM) | 2025 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN TECNICA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No. 622 del 2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/ O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

NOMBRE DEL PROFESIONAL SONIA LILIANA TORRES CRUZ

EMPRESA: CONSORCIO DC 2025

TIPO

INDUCCIÓN ☐ CAPACITACIÓN ☐ ENTRENAMIENTO ☐

CHARLA INFORMATIVA [X] OTRO ☐ ¿Cuál? _____

TEMA:

Plan de manejo Ambiental - Charla manejo de materiales - acopios y disposición.

LUGAR DEL EVENTO Nuevo Muzu.

HORA DE INICIO: 11:20 am. **HORA DE TERMINACIÓN:** 11:45 am.

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	Jaisson E. Ayala Alfaro	1069230399	operador	Ingetec	Jaisson E. Ayala
2	Samuel Garcia	799011484	operador	ingetec	Samuel
3	Jose Martinez	1073934591	oficial	ingetech	Jose M
4	eddy Bustamante	1193307901	Ayudante	ingetech	EPP:
5	Baltazar [illegible]	80472569	oficial	ingetech	
6	Mauricio Cajide	5292994	oficial	ingetech	
7	Katherine Grajales	1000726045	Practicante Social	DC 2025	Katherine GP
8	Juan Sebastian	1098994195	Inspector	Consorcio DC 2025	
9					
10					
11					
12					

(Firma) Sonia Torres C.

(Nombre) SONIA LILIANA TORRES CRUZ

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC 4359 del 08/09/2020

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

(Firma)

(Nombre) CLAUDIA BELTRAN

Residente Ambiental y/o SST Interventoría

LIC

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original Dependencia responsable del contrato

1era copia : Interventor

2da copia: Contratista

Scanned with CamScanner

FORMATO REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS			
CÓDIGO FO-AC-84	**PROCESO** Gestión Ambiental Calidad y SST	**VERSIÓN** 3	BOGOTÁ

FECHA 10 (DD) 09 (MM) 2025 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL _____

DIRECCIÓN TECNICA _____

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA _____

CONTRATO No. 622 del 2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/ O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

NOMBRE DEL PROFESIONAL SONIA LILIANA TORRES CRUZ

EMPRESA: CONSORCIO DC 2025

TIPO

INDUCCIÓN ☐ **CAPACITACIÓN** ☐ **ENTRENAMIENTO** ☐

CHARLA INFORMATIVA ☒ **OTRO** ☐ **¿Cuál?** _____

TEMA:

Buenas practicas de separación en la fuente.

LUGAR DEL EVENTO El Carmen.

HORA DE INICIO: 7:15am. **HORA DE TERMINACIÓN:** 7:50am.

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	Samuel Garcia.	79900458	Operador	ingeteet	
2	Jorge E. Rondon.	91627328	operador	ingeteet	
3	Mauricio Gil	5292794	op	" "	
4	JOSE MARTINEZ	1023934551	Oficial	" "	Jose M
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

(Firma) _____

(Nombre) SONIA LILIANA TORRES CRUZ

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC 4359 del 08/09/2020

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

(Firma) _____

(Nombre) CLAUDIA BELTRAN

Residente Ambiental y/o SST Interventoría

LIC _____

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original Dependencia responsable del contrato

1era copia : Interventor

2da copia: Contratista

Scanned with CamScanner

FORMATO REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS			
CÓDIGO FO-AC-84	**PROCESO** Gestión Ambiental Calidad y SST	**VERSIÓN** 3	BOGOTÁ

FECHA 22 (DD) | 04 (MM) | 2025 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL _____

DIRECCIÓN TECNICA _____

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA _____

CONTRATO No. 622 del 2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/ O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

NOMBRE DEL PROFESIONAL: SONIA LILIANA TORRES CRUZ

EMPRESA: CONSORCIO DC 2025

TIPO

INDUCCIÓN ☐ CAPACITACIÓN ☐ ENTRENAMIENTO ☐

CHARLA INFORMATIVA ☒ OTRO ☐ ¿Cuál? _____

TEMA:

Control de emisiones de polvo y ruido.

LUGAR DEL EVENTO: Abraham Lincoln

HORA DE INICIO: 8:00am. HORA DE TERMINACIÓN: 8:30am.

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	Pedro Pablo [illegible]	11348096	operador	INGECOP	
2	[illegible]	[illegible]	OFICIAL	INGECOP	
3	Luis [illegible]	49438215	[illegible]	INGECOP	
4	Florentino [illegible]	79585502	Oficios	INGECOP	Florentino
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

(Firma) _____

(Nombre) SONIA LILIANA TORRES CRUZ

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC 4359 del 08/09/2020

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

(Firma) _____

(Nombre) CLAUDIA BELTRAN

Residente Ambiental y/o SST Interventoría

LIC _____

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original: Dependencia responsable del contrato

1era copia : Interventor

2da copia: Contratista

Scanned with CamScanner

FORMATO REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS			
CÓDIGO FO-AC-84	PROCESO Gestión Ambiental Calidad y SST	VERSIÓN 3	BOGOTÁ

FECHA 04 (DD) 08 (MM) 2025 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL _____

DIRECCIÓN TECNICA _____

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA _____

CONTRATO No. 622 del 2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/ O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

NOMBRE DEL PROFESIONAL SONIA LILIANA TORRES CRUZ

EMPRESA: CONSORCIO DC 2025

TIPO

INDUCCIÓN ☐ CAPACITACIÓN ☐ ENTRENAMIENTO ☐

CHARLA INFORMATIVA ☑ OTRO ☐ ¿Cuál? _____

TEMA: Inducción PMA (Plan de Manejo Ambiental)

LUGAR DEL EVENTO Abraham Lincoln.

HORA DE INICIO: 9:00am **HORA DE TERMINACIÓN:** 9:30am

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	[illegible]	79445671	DFL	INGECAL	[illegible]
2	Pedro Pablo Goc	11948096	operador	INGECAP	[illegible]
3	Jhoruin. S	1.046545141	Ayudante	Ingecap	[illegible]
4	Michael Ortiz	1014113156	Inspector	Ingecap	[illegible]
5	Florentino Bern	79597302	Oficial	Ingecap	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	SISO.	Ingecap	[illegible]
7					
8					
9					
10					
11					
12					

(Firma) [illegible]

(Nombre) SONIA LILIANA TORRES CRUZ

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC 4359 del 06/09/2020

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

(Firma) _____

(Nombre) CLAUDIA BELTRAN

Residente Ambiental y/o SST Interventoría

LIC _____

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original Dependencia responsable del contrato

1era copia : Interventor

2da copia: Contratista

Scanned with CamScanner

FORMATO REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS			BOGOTÁ
CÓDIGO FO-AC-64	**PROCESO** Gestión Ambiental Calidad y SST	**VERSIÓN** 3	

FECHA 08 (DD) 08 (MM) 2025 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL _____

DIRECCIÓN TECNICA _____

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA _____

CONTRATO No. 622 del 2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/ O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

NOMBRE DEL PROFESIONAL SONIA LILIANA TORRES CRUZ

EMPRESA CONSORCIO DC 2025

TIPO

INDUCCIÓN ☐ CAPACITACIÓN ☐ ENTRENAMIENTO ☐

CHARLA INFORMATIVA ☒ OTRO ☐ ¿Cuál? _____

TEMA: Manejo de Sustancias quimicas.

LUGAR DEL EVENTO Nueva Muzu

HORA DE INICIO 7:30am **HORA DE TERMINACIÓN** 8:05am

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	Jhon Carlos N.	88204896	OP.		
2	Jose Martinez	1023934552	oficial	ingetech	
3	Hartley Lamonoso	1023930687	Ayud.	INGETECH	
4	Eddi Bustamante	1193306901	Ayud.	Ingetech	
5	Mauricio Coy	5292994	ofic	"	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

(Firma) Sonia Torres C.

(Nombre) SONIA LILIANA TORRES CRUZ

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC 4359 del 08/09/2020

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

(Firma) _____

(Nombre) CLAUDIA BELTRAN

Residente Ambiental y/o SST Interventoría

LIC _____

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original Dependencia responsable del contrato

1ers copia Interventor

2da copia Contratista

Scanned with CamScanner

FORMATO REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS			
CÓDIGO FO-AC-84	**PROCESO** Gestión Ambiental Calidad y SST	**VERSIÓN** 3	BOGOTÁ Alcaldía Local de Tunjuelito

FECHA 15 (DD) 05 (MM) 2025 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL _____

DIRECCIÓN TECNICA _____

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA _____

CONTRATO No. 622 del 2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/ O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

NOMBRE DEL PROFESIONAL: SONIA LILIANA TORRES CRUZ

EMPRESA: CONSORCIO DC 2025

TIPO

INDUCCIÓN ☐ CAPACITACIÓN ☐ ENTRENAMIENTO ☐

CHARLA INFORMATIVA ☒ OTRO ☐ ¿Cuál? _____

TEMA:

Reforestación, recuperación y cuidado de zonas verdes.

LUGAR DEL EVENTO: Abraham Lincoln.

HORA DE INICIO: 8:00am. HORA DE TERMINACIÓN: 8:30am

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	Pedro Pablo [illegible]	11348096	operador	INGECOP	
2	Luis Roa	7290677	oficial	INGECOP	
3	Luis Medina	79458203	"	INGECOP	
4	Florentino Ob[illegible]	79583302	oficial	INGECOP	
5	David Tarache	78-506695	Ayudante	Ingeco	
6	Jhonatan Sabos	1049345141	Ayudante	Ingecop	
7	Edwar [illegible]	79645677	OFICIAL	INGECOP	
8					
9					
10					
11					
12					

(Firma) _____

(Nombre) SONIA LILIANA TORRES CRUZ

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC 4359 del 08/09/2020

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

(Firma) _____

(Nombre) CLAUDIA BELTRAN

Residente Ambiental y/o SST Interventoría

LIC _____

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original: Dependencia responsable del contrato

1era copia : Interventor

2da copia: Contratista

Scanned with CamScanner

FORMATO REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS			
CÓDIGO FO-AC-84	**PROCESO** Gestión Ambiental Calidad y SST	**VERSIÓN** 3	BOGOTÁ

FECHA 19 (DD) 08 (MM) 2025 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL _____

DIRECCIÓN TECNICA _____

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA _____

CONTRATO No. 622 del 2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/ O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

NOMBRE DEL PROFESIONAL: SONIA LILIANA TORRES CRUZ

EMPRESA: CONSORCIO DC 2025

TIPO

INDUCCIÓN ☐ CAPACITACIÓN ☐ ENTRENAMIENTO ☐

CHARLA INFORMATIVA ☒ OTRO ☐ ¿Cuál? _____

TEMA:

Normatividad Ambiental Vigente.

LUGAR DEL EVENTO: Nuevo Muhl.

HORA DE INICIO: 10:00am. HORA DE TERMINACIÓN: 10:30am.

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑÍA	FIRMA
1	Jhon Carlos N.	88204896	OP.		
2	Jose Martinez	1078945551	Oficial	ingetech	
3	Samuel Garcia	79900484	OP.	ingetech	
4	Edgi Bustamante.	1193307901.	Ayudante.	Ingtech.	
5	Mauricio Cajas	5292944	op	"	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

(Firma) Sonia Torres C.

(Nombre) SONIA LILIANA TORRES CRUZ

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC 4359 del 08/09/2020

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

(Firma) _____

(Nombre) CLAUDIA BELTRAN

Residente Ambiental y/o SST Interventoría

LIC _____

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original:Dependencia responsable del contrato

1era copia : Interventor

2da copia: Contratista

Scanned with CamScanner

FORMATO REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS			
CÓDIGO FO-AC-84	**PROCESO** Gestión Ambiental Calidad y SST	**VERSIÓN** 3	BOGOTÁ

FECHA 21 (DD) 09 (MM) 2025 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN TECNICA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No. 622 del 2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/ O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

NOMBRE DEL PROFESIONAL: SONIA LILIANA TORRES CRUZ

EMPRESA: CONSORCIO DC 2025

TIPO

INDUCCIÓN [ ] CAPACITACIÓN [ ] ENTRENAMIENTO [ ]

CHARLA INFORMATIVA [X] OTRO [ ] ¿Cuál? _____

TEMA: Orden y aseo en los frentes de obra

LUGAR DEL EVENTO: Nuevo Muzu

HORA DE INICIO: 11:10am. HORA DE TERMINACIÓN: 11:30am.

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	Jaiver Gerardo Montero	1069726766	operador	Ingetec	
2	Samuel Garcia	79900695	operador	ingetec	
3	Gustavo Báez	1026262656	Reparador	ingetec	
4	Silvio Bayuz	1119837447	ayudante	ingetec	
5	Jose Martinez	1073934551	oficial	ingetec	
6	Eddi Betancourt	1193907901	Ayudante	Ingetech	
7	Baltazar L.	80477564	[illegible]	Ingetech	
8	Haetley Londoño	1023930687	Ayudante	Ingtech	
9	Ihan Carlos Nan	88204896	OP.	Ingtech	
10	Vicente vega	4255489	oficial	ingtech	
11					
12					

(Firma) Sonia Torres C.

(Nombre) SONIA LILIANA TORRES CRUZ

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC 4359 del 08/09/2020

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

(Firma)

(Nombre) CLAUDIA BELTRAN

Residente Ambiental y/o SST Interventoría

LIC

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original:Dependencia responsable del contrato

1era copia : Interventor

2da copia: Contratista

Scanned with CamScanner

FORMATO REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS			
CÓDIGO FO-AC-84	**PROCESO** Gestión Ambiental Calidad y SST	**VERSIÓN** 3	BOGOTÁ

FECHA 02 (DD) 09 (MM) 2024 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL _____

DIRECCIÓN TECNICA _____

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA _____

CONTRATO No. 622 del 2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/ O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

NOMBRE DEL PROFESIONAL: SONIA LILIANA TORRES CRUZ

EMPRESA: CONSORCIO DC 2025

TIPO

INDUCCIÓN [ ] CAPACITACIÓN [ ] ENTRENAMIENTO [ ]

CHARLA INFORMATIVA [X] OTRO [ ] ¿Cuál? _____

TEMA:

Manejo de campamentos y acopios.

LUGAR DEL EVENTO: Nuevo Muzu.

HORA DE INICIO: 8:00 am. HORA DE TERMINACIÓN: 8:15 am.

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑÍA	FIRMA
1	Jose Martinez	1023934551	oficial	ingetech	Jose M
2	EDDi Bus.	1193907901	ayudante	CONSORCIO DC 2025	EDDi
3	Silvio Rojas	1114837197	ayudante	ingetech	Silvio
4	[illegible]	1666276	SP	ingetech	[illegible]
5	Samuel Garcia	79900984	OP	ingetec	Samuel
6	[illegible]	80472504	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	Jaime E. Diaz	1049730388	SP	ingetec	Jaime E. Diaz
8					
9					
10					
11					
12					

(Firma) Sonia Torres C.

(Nombre) SONIA LILIANA TORRES CRUZ

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC 4359 del 08/09/2020

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

(Firma) _____

(Nombre) CLAUDIA BELTRAN

Residente Ambiental y/o SST Interventoría

LIC _____

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original: Dependencia responsable del contrato

1era copia : Interventor

2da copia: Contratista

Scanned with CamScanner

FORMATO REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS			
CÓDIGO FO-AC-84	**PROCESO** Gestión Ambiental Calidad y SST	**VERSIÓN** 3	BOGOTÁ Alcaldía Local de Tunjuelito

FECHA 04 (DD) 09 (MM) 2025 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL _____

DIRECCIÓN TECNICA _____

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA _____

CONTRATO No. 622 del 2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/ O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

NOMBRE DEL PROFESIONAL: SONIA LILIANA TORRES CRUZ

EMPRESA: CONSORCIO DC 2025

TIPO

INDUCCIÓN ☐ CAPACITACIÓN ☐ ENTRENAMIENTO ☐

CHARLA INFORMATIVA ☑ OTRO ☐ ¿Cuál? _____

TEMA:

Residuos de Construcción y demolición RMSRCD.

LUGAR DEL EVENTO C

HORA DE INICIO: 9:00 am HORA DE TERMINACIÓN: 9:35 am

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑÍA	FIRMA
1	JOSE MARTINEZ	1023934551	OFICIAL	ingetec#	JOSE M
2	BALTAZAR [illegible]	8647254	[illegible]	Ingetec	[illegible]
3	Samuel Garcia	79900921	Op [illegible]	ingetec.	[illegible]
4	Edgar Navarro	85469107	ayudante.		[illegible]
5	Silvio Rojas	1119837197	ayudante	ingetec	Silvio
6	Edi Bustamante	1193309901	ayudante	Ingtech,	[illegible]
7	[illegible]	1016026756	Apoyo Sig.	ingetec	[illegible]
8	HARTLEY LONDOÑO	1023930887	AYUDANTE	INGETECH	[illegible]
9	Jhon Naranjo	88204896	OP	ingetech	[illegible]
10	Victor Vega	4255489	OFICIAL	ingetech	[illegible]
11					
12					

(Firma) [illegible]

(Nombre) SONIA LILIANA TORRES CRUZ

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC 4359 del 08/09/2020

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

(Firma)

(Nombre) CLAUDIA BELTRAN

Residente Ambiental y/o SST Interventoría

LIC _____

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original: Dependencia responsable del contrato

1era copia : Interventor

2da copia: Contratista

Scanned with CamScanner

FORMATO REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS			BOGOTÁ
CÓDIGO FO-AC-84	**PROCESO** Gestión Ambiental Calidad y SST	**VERSIÓN** 3	

FECHA 09 (DD) 09 (MM) 2026, (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL _____

DIRECCIÓN TECNICA _____

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA _____

CONTRATO No. 622 del 2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/ O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

NOMBRE DEL PROFESIONAL: SONIA LILIANA TORRES CRUZ

EMPRESA: CONSORCIO DC 2025

TIPO

INDUCCIÓN ☐ CAPACITACIÓN ☐ ENTRENAMIENTO ☐

CHARLA INFORMATIVA ☒ OTRO ☐ ¿Cuál? _____

TEMA:

Implementación de medidas para controlar las emisiones atmosferas

LUGAR DEL EVENTO: Nuevo Muzu.

HORA DE INICIO: 1:00pm HORA DE TERMINACIÓN: 1:30pm

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	Samuel Garcia	79901284	Op.	ingetec	
2	Jaison C. Duarte R.	1069736388	op	ingetec	
3	Jhon Naranjo	88204896	O P	Ingetec	
4	Edgar Restrepo	1193897901	Ayudante	Ingetech	
5	Bellazmin B	80472504	oficial	ingetech	
6	Silvio Rojas	1114837197	ayudante	ingetech	
7	Jose Martinez	1023934551	OFICIAL	ingetech	
8	Vicente vega	4255 489	oficial	ingetech	
9	Carlos Mora	1066262426	operario	ingetech	
10					
11					
12					

(Firma) _____

(Nombre) SONIA LILIANA TORRES CRUZ

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC 4359 del 08/09/2020

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

(Firma) _____

(Nombre) CLAUDIA BELTRAN

Residente Ambiental y/o SST Interventoría

LIC _____

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original:Dependencia responsable del contrato

1era copia : Interventor

2da copia: Contratista

Scanned with CamScanner

FORMATO		
REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSION**
FO-AC-84	Gestión Ambiental Calidad y SST	3

FECHA 16 (DD) 09 (MM) 2025 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN TECNICA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No. 622 del 2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/ O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

NOMBRE DEL PROFESIONAL: SONIA LILIANA TORRES CRUZ

EMPRESA: CONSORCIO DC 2025

TIPO

INDUCCIÓN [ ] CAPACITACIÓN [ ] ENTRENAMIENTO [ ]

CHARLA INFORMATIVA [X] OTRO [ ] ¿Cuál? _____

TEMA:

Verificación eficaz de mantenimiento de sumideros, mantenimiento de individuos arboreos

LUGAR DEL EVENTO: Abraham Lincoln

HORA DE INICIO: 10 00am HORA DE TERMINACIÓN: 10 25am

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	Florentino Bernal	79583328	Oficial	Ingecop	
2	Luis Martinez	79438204	SyV	Ingecop	
3	Israel sandoval	82385603	oficial	ingecop	
4	Jose Zafra	5632662	Ayudante	Ingecop	
5	David Arciniegas	79506695	Ayudante	Ingecop	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

(Firma)

(Nombre) SONIA LILIANA TORRES CRUZ

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC 4359 del 08/09/2020

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

(Firma)

(Nombre) CLAUDIA BELTRAN

Residente Ambiental y/o SST Interventoria

LIC

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original: Dependencia responsable del contrato

1era copia: Interventor

2da copia: Contratista

Scanned with CamScanner

FORMATO REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS			
CÓDIGO FO-AC-84	PROCESO Gestión Ambiental Calidad y SST	VERSIÓN 3	BOGOTÁ

FECHA 09 (DD) | 10 (MM) | 2025 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL _____

DIRECCIÓN TECNICA _____

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA _____

CONTRATO No. 622 del 2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/ O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

NOMBRE DEL PROFESIONAL SONIA LILIANA TORRES CRUZ

EMPRESA CONSORCIO DC 2025

TIPO

INDUCCIÓN ☐ CAPACITACIÓN ☐ ENTRENAMIENTO ☐

CHARLA INFORMATIVA ☒ OTRO ☐ ¿Cuál? _____

TEMA:

Segregación, almacenamiento y Transporte de RCD.

LUGAR DEL EVENTO Nuevo Muzu.

HORA DE INICIO 9:10am. **HORA DE TERMINACIÓN** 9:30am.

No.	NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO	COMPAÑÍA	FIRMA
1	Jairo Cabrera.	7490984	Cp.	Inget.	
2	Silvia Rojas	1119831197	Ayudante	Ingetech.	Silvia
3	Edwar Bar	80872569	Oficial	Ingetech.	
4	Jose Martinez	1023934935	Oficial	Ingetech	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

(Firma) _____

(Nombre) SONIA LILIANA TORRES CRUZ

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC 4359 del 08/09/2020

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

(Firma) _____

(Nombre) CLAUDIA BELTRAN

Residente Ambiental y/o SST Interventoría

LIC _____

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original: Dependencia responsable del contrato

1era copia: Interventor

2da copia: Contratista

Scanned with CamScanner

FORMATO REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS			BOGOTÁ Alcaldía Local de Tunjuelito
CÓDIGO FO-AC-84	**PROCESO** Gestión Ambiental Calidad y SST	**VERSIÓN** 3	

FECHA 09 (DD) 10 (MM) 2025 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN TECNICA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No. 622 del 2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/ O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

NOMBRE DEL PROFESIONAL SONIA LILIANA TORRES CRUZ

EMPRESA: CONSORCIO DC 2025

TIPO

INDUCCIÓN ☐ **CAPACITACIÓN** ☐ **ENTRENAMIENTO** ☐

CHARLA INFORMATIVA ☒ **OTRO** ☐ **¿Cuál?**

TEMA: Medidas Preventivas para la Intervención de Cobertura Vegetal.

LUGAR DEL EVENTO Nuevo Mall.

HORA DE INICIO: 8:10 am **HORA DE TERMINACIÓN:** 8:25 am.

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	Baltazar B.	80425674	oficial	Ingetech	
2	Samuel Garcia	1119837197	operador	Ingetech	
3	Jose Martinez	1023934551	oficial	Ingetech	
4	Eddy Bustamante	1990000984	Ayudante		
5	Silvio Rojas	1119837197	ayudante	Ingetech	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

(Firma)

(Nombre) SONIA LILIANA TORRES CRUZ

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC 4359 del 08/09/2020

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

(Firma)

(Nombre) CLAUDIA BELTRAN

Residente Ambiental y/o SST Interventoría

LIC

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original: Dependencia responsable del contrato

1era copia : Interventor

2da copia: Contratista

Scanned with CamScanner

FORMATO REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS			BOGOTÁ Alcaldía Local de Tunjuelito
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**	
FO-AC-84	Gestión Ambiental Calidad y SST	3	

FECHA 01 (DD) 11 (MM) 2025 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL _____

DIRECCIÓN TECNICA _____

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA _____

CONTRATO No. 622 del 2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/ O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

NOMBRE DEL PROFESIONAL SONIA LILIANA TORRES CRUZ

EMPRESA: CONSORCIO DC 2025

TIPO

INDUCCIÓN ☐ **CAPACITACIÓN** ☐ **ENTRENAMIENTO** ☐

CHARLA INFORMATIVA ☒ **OTRO** ☐ **¿Cuál?** _____

TEMA:

Responsabilidad ambiental individual y colectiva

LUGAR DEL EVENTO Frente de obra El Carmen.

HORA DE INICIO: 8:00 am. **HORA DE TERMINACIÓN:** 8:30 am

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	Samuel Garcia.	1199000984	Ofp.	Ingecop	
2	Salvador B.	80.472.569	Oficial	Ingecop.	
3	JOSE MARTINEZ	1023934591	Oficial	Ingecop.	JOSE M.
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

(Firma) Sonia Torres C.

(Nombre) SONIA LILIANA TORRES CRUZ

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC 4359 del 08/09/2020

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

(Firma) _____

(Nombre) CLAUDIA BELTRAN

Residente Ambiental y/o SST Interventoría

LIC _____

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original: Dependencia responsable del contrato

1era copia : Interventor

2da copia: Contratista

Scanned with CamScanner

FORMATO		
REGISTRO INDUCCION CAPACITACION ENTRENAMIENTO Y CHARLAS		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-AC-84	Gestión Ambiental Calidad y SST	3

BOGOTÁ Alcaldía Local de Tunjuelito

FECHA 05 (DD) 11 (MM) 2025 (AAAA)

SUBDIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN TECNICA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO No. 622 del 2024

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/ O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

NOMBRE DEL PROFESIONAL SONIA LILIANA TORRES CRUZ

EMPRESA: CONSORCIO DC 2025

TIPO

INDUCCIÓN ☐ CAPACITACIÓN ☐ ENTRENAMIENTO ☐

CHARLA INFORMATIVA ☒ OTRO ☐ ¿Cuál? _____

TEMA:

Uso eficiente y ahorro del agua en obra.

LUGAR DEL EVENTO Frente de obra El Carmen.

HORA DE INICIO: 8:15 am **HORA DE TERMINACIÓN:** 8:45 am

No.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	COMPAÑIA	FIRMA
1	Pedro Pablo Pa...	11348.094	Operador	Ingecap	
2	Adrian Cacedo	1000134254.	Cobrero	Ingecap.	
3	[illegible]	1958 3302 1	Oficial	Ingecap.	
4	Alfredo Ortiz	1019113156	Inspector	Ingecap	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

(Firma) Sonia Torres C.

(Nombre) SONIA LILIANA TORRES CRUZ

Residente Ambiental y/o SST Contratista

LIC 4359 del 08/09/2020

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

(Firma)

(Nombre) CLAUDIA BELTRAN

Residente Ambiental y/o SST Interventoría

LIC

(número y fecha de expedición de la licencia SST, cuando aplique)

Original: Dependencia responsable del contrato

1era copia : Interventor

2da copia: Contratista

Scanned with CamScanner

CONSORCIO DC 2025	"EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/ O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL

CONTRATO DE OBRA No. 622-2024

ITEM	ACTIVIDADES	OBJECTO POBLACION	ACCION	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	TOTAL ACTIVIDADES	% de Cumplimeinto	RESPONSABLES
	PLANEAR													
1	ELABORACION DEL PIPMA	SUPERVISION E INTERVENTORIA	PROGRAMADO	1 1		1						1	100%	RESIDENTE AMBIENTAL
			EJECUTADO	1 1		1						1		
2	ELABORACION DE INFORMES MENSUALES	SUPERVISION E INTERVENTORIA	PROGRAMADO		1	1	1	1	1	1	1	7	100%	RESIDENTE AMBIENTAL
			EJECUTADO		1	1	1	1	1	1	1	7		
	ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS													
	MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN													
1	GESTIÓN Y VERIFICACION DE PROVEEDORES	N.A	PROGRAMADO		1 1 1 1	1						5	100%	RESIDENTE AMBIENTAL
			EJECUTADO		1 1 1 1	1						5		
2	INSPECCION VISUAL ACOPIO DE MATERIALES	Trabajadores de obra	PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1	6	100%	RESIDENTE AMBIENTAL Y/O INSPECTOR
			EJECUTADO			1	1	1	1	1	1	6		
3	REGISTRO INGRESO DE MATERIALES	Trabajadores de obra	PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1 1 1	7	100%	RESIDENTE AMBIENTAL Y/O INSPECTOR
			EJECUTADO			1	1	1	1	1	1 1 1	7		
	MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS													
1	DEFINICION DE AREAS PARA DISPOSICION TEMPORAL DE ESCOMBROS	Trabajadores de obra	PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1	6	100%	RESIDENTE AMBIENTAL
			EJECUTADO			1	1	1	1	1	1	6		
2	RETIRO DE ESCOMBROS Y REGISTRO	N.A	PROGRAMADO			1 1		1	1	1	1	7	100%	RESIDENTE AMBIENTAL Y/O INSPECTOR
			EJECUTADO			1		1	1	1	1	7		
3	ADECUACION DEL CAMPAMENTO PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	BOAL	PROGRAMADO			1 1		1	1	1	1	7	100%	RESIDENTE AMBIENTAL Y/O INSPECTOR
			EJECUTADO			1 1		1	1	1	1	7		
	CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS													
1	MANTENIMIENTO DE LA PROTECCION A LOS ACOPIOS DE MATERIALES	BOAL	PROGRAMADO			1		1	1	1	1	6	100%	RESIDENTE AMBIENTAL Y/O INSPECTOR
			EJECUTADO			1		1	1	1	1	6		
2	CONTROL DE MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y EQUIPOS	Vehiculos y maquinaria	PROGRAMADO			1		1	1	1	1	6	100%	RESIDENTE AMBIENTAL Y/O INSPECTOR
			EJECUTADO			1		1	1	1	1	6		
	MANEJO INTEGRAL DE CUERPOS DE AGUA													
1	INSPECCIÓN SUMIDEROS	N.A	PROGRAMADO		1 1	1		1	1	1	1	8	100%	RESIDENTE AMBIENTAL Y/O INSPECTOR
			EJECUTADO		1 1	1		1	1	1	1	8		
	SEÑALIZACIÓN													
1	INSTALACION DE SEÑALES PMT	N.A	PROGRAMADO			1		1	1	1	1	6	100%	RESIDENTE AMBIENTAL
			EJECUTADO			1		1	1	1	1	6		
2	VERIFICACION DE CERRAMIENTOS, SENDEROS Y MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACION	N.A	PROGRAMADO			1		1	1	1	1	6	100%	RESIDENTE AMBIENTAL
			EJECUTADO			1		1	1	1	1	6		
3	SEGUIMIENTO A LA SEÑALIZACION INTERNA DE OBRA	N.A	PROGRAMADO			1		1	1	1	1	6	100%	RESIDENTE AMBIENTAL
			EJECUTADO			1		1	1	1	1	6		
	MANEJO DE LA VEGETACION													
1	PROTECCION Y SEGUIMIENTO INDIVIDUOS ARBOREOS (cuando aplique)	N.A	PROGRAMADO				1	1	1	1	1	5	100%	RESIDENTE AMBIENTAL
			EJECUTADO				1	1	1	1	1	5		
	CAPACITACIONES													
	PLANEAR													
1	INDIUCCIÓN PMA	SUPERVISION E INTERVENTORIA	PROGRAMADO			1		1	1	1	1	6	100%	RESIDENTE AMBIENTAL
			EJECUTADO			1		1	1	1	1	6		
	ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS													
	MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN													
1	CAPACITACION DE CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS CONVENCIONALES	Trabajadores de obra	PROGRAMADO			1		1				2	100%	RESIDENTE AMBIENTAL Y/O INSPECTOR
			EJECUTADO			1		1				2		

CONSORCIO DC 2025	"EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/ O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL

CONTRATO DE OBRA No. 622-2024

ITEM	ACTIVIDADES	OBJECTO POBLACION	ACCION	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	TOTAL ACTIVIDADES	% de Cumplimeinto	RESPONSABLES
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS														
1	CAPACITACION DEL PG-RCD	Trabajadores de obra	PROGRAMADO				1		1			2	100%	RESIDENTE AMBIENTAL Y/O INSPECTOR
			EJECUTADO				1		1			2		
2	CAPACITACION EN MANEJO Y DISPOSICION DE LOS RESIDUOS GENERADOS	Trabajadores de obra	PROGRAMADO					1				1	100%	RESIDENTE AMBIENTAL Y/O INSPECTOR
			EJECUTADO					1				1		
CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS														
1	CAPACITACION EN MITIGACION DE PARTICULAS EN SUSPENSIÓN Y PROTECCION PARA EL AMBIENTE Y EL TRABAJADOR	Trabajadores de obra	PROGRAMADO						1			1	100%	RESIDENTE AMBIENTAL Y/O INSPECTOR
			EJECUTADO						1			1		
MANEJO INTEGRAL DE CUERPOS DE AGUA														
1	CAPACITACION EN PROTECCION DE CUERPOS DE AGUA Y SUMIDEROS	Trabajadores de obra	PROGRAMADO				1		1			2	100%	RESIDENTE AMBIENTAL Y/O INSPECTOR
			EJECUTADO				1		1			2		
SEÑALIZACIÓN														
1	CAPACITACION EN LA IMPORTANCIA DE LOS CERRAMIENTOS E IMPLEMENTACION DEL PMT	Trabajadores de obra	PROGRAMADO					1				1	100%	RESIDENTE AMBIENTAL
			EJECUTADO					1				1		
2	CAPACITACIÓN SOBRE NORMAS DE MANEJO DE TRÁNSITO	Trabajadores de obra	PROGRAMADO					1				1	100%	RESIDENTE AMBIENTAL
			EJECUTADO					1				1		
MANEJO DE LA VEGETACION														
1	CAPACITACION EN MANEJO DE FLORA (cuando aplique)	N.A	PROGRAMADO						1			1	100%	RESIDENTE AMBIENTAL
			EJECUTADO						1			1		
		PROGRAMADAS	**P**									**106**	**100%**	RESIDENTE AMBIENTAL
		EJECUTADAS	**E**									**106**		

ING. SONIA LILIANA TORRES CRUZ
ESPECIALISTA AMBIENTAL

FORMATO		
Seguimiento aplicación de mezcla asfaltica modificada con grano de caucho reciclado		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-AC-18	Prácticas Integrales de Gestión	2

Nº del Contrato Obra: 622 DE 2024 — CONSORCIO DC 2025

Objeto del Contrato: EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/ O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN

Nº del Contrato de Interventoría: 689 del 2024

Fecha de inicio del Contrato: 26/12/2024 — 10/11/2025

Pin del Contrato: 26829 — VELNEC S.A

PERIODO DE EJECUCION	DIRECCIÓN (TRAMO) DE LA INTERVENCIÓN (CL - KR- DG- TV)	DESDE (CL - KR- DG- TV)	HASTA (CL - KR- DG- TV)	CIV	CANTIDAD TOTAL MEZCLA ASFÁLTICA (M3)	CANTIDAD TOTAL DE MEZCLA ASFÁLTICA MODIFICADA INSTALADA (M3)	CANTIDAD TOTAL DE MEZCLA ASFÁLTICA MODIFICADA CERTIFICADA (M3)	% MEZCLA ASFÁLTICA MODIFICADA CON GCR	CANTIDAD TOTAL DE GCR UTILIZADO (KG)	PERIODO DE APLICACIÓN GCR	PROCEDENCIA DEL GCR	OBSERVACIONES
ene-25	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	N/A
feb-25	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	N/A
mar-25	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	N/A
abr-25	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	N/A
may-25	Cr. 29 entre 53 Sur y Calle 53 B sur	Cr 29 Clle 53 Sur	Cra 29 Calle 53B Sur	6001042	39,40	0	0	0	0	0	0	Mezcla Compacta, Factor de compactación 0,986
	Cr 61 entre Diagonal 59b sur y 52 sur	Cr. 61 Diiagonal 59 sur	Cr. 61 Diagonal 52 Sur	6000897	33,4	0	0	0	0	0	0	
	Cr. 61 entre Diag 52 sur y Diag 51B SUR	Cr. 61 Diagonal 52 sur	Cr. 61 Diagonal 51B Sur	6000547	37,2	0	0	0	0	0	0	
	Diag 52a sur entre Cr 60f y Cr 61	Diagonal 52 a Sur Cr. 60f	Diagonal 52 a Sur Cr. 61	6000587	42,9	0	0	0	0	0	0	
jun-25	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	N/A
jul-25	Diagonal 52B Sur entre carreras 27 y 28	Diagonal 52B Sur Cr 27	Diagonal 52B Sur Cr 28	6001045	67,8119	36,5141	42,93	54%	10753,5	Julio	Pavíobras	Mezcla compacta. Factor de compactación 0,8507. De acuerdo a la ficha tecnicala mezcla asfaltica modificada contiene el 15% de GCR
ago-25	Diagonal 53 Sur entre carreras 61D y 61F	Diagonal 53 Sur Carrera 61D	Diagonal 53 Sur entre Carrera 61F	6001827	56,55	30,45	41,729	54%	10453,5	Agosto	Pavíobras	Mezcla compacta. Factor de compactación 0,8507. De acuerdo a la ficha tecnicala mezcla asfaltica modificada contiene el 15% de GCR
sep-25	CL 52 Sur entre KR 11A y KR 12	Calle 52 Sur Kr 11A	Calle 52 Sur Kr 12	6001672	101,036	38,86	44,621	38%	11178	Septiembre	Pavíobras	Mezcla compacta. Factor de compactación 0,87. De acuerdo a la ficha tecnicala mezcla asfaltica modificada contiene el 15% de GCR
	CL 52 Sur entre KR 11A y KR 12	Calle 52 Sur Kr 11A	Calle 52 Sur Kr 12	6001648	81,8388	45,466	63,526	56%	15913,5	Septiembre	Pavíobras	Mezcla compacta. Factor de compactación 0,71. De acuerdo a la ficha tecnicala mezcla asfaltica modificada contiene el 15% de GCR
	Diagonal 53 Sur entre carreras 61B y 61D	Diagonal 53 Sur Carrera 61B	Diagonal 53 Sur entre Carrera 61D	6000751	55,8	27,900	32,233	50%	8074,5	Septiembre	Pavíobras	Mezcla compacta. Factor de compactación 0,865. De acuerdo a la ficha tecnicala mezcla asfaltica modificada contiene el 15% de GCR
	Diagonal 53 Sur entre carreras 61B y 61D	Diagonal 53 Sur Carrera 61B	Diagonal 53 Sur entre Carrera 61D	6000760	52,2	26,100	29,029	50%	7272	Septiembre	Pavíobras	Mezcla compacta. Factor de compactación 0,899. De acuerdo a la ficha tecnicala mezcla asfaltica modificada contiene el 15% de GCR
	Kr 26 entre CL 48B sur y CL 48a Sur	Kr 26 Calle 48B Sur	Kr 26 Calle 48a Sur	6001008	54,198	36,132	47,86	67%	11917,5	Septiembre	Doble A	Mezcla compacta. Factor de compactación 0,755. De acuerdo a la ficha tecnicala mezcla asfaltica modificada contiene el 15% de GCR
oct-25	Kr 61g Entre Dg 53 Sur Y Dg 52b Sur	Kr 61g Diagonal 53 Sur	Kr 61g Diagonal 52b Sur	6000775	83,2598	44,8322	63,94	54%	13188	Octubre	Pavíobras	Mezcla compacta. Factor de compactación 0,7013. De acuerdo a la ficha tecnicala mezcla asfaltica modificada contiene el 15% de GCR
nov-25	Diagonal 52B Sur Entre KR 26 Y KR 27	Diagonal 52B Sur KR 26	Diagonal 52B Sur KR 27	6001105	76,7858	41,3462	45,341	54%	10677	Noviembre	Pavíobras	Mezcla compacta. Factor de compactación 0,7013. De acuerdo a la ficha tecnicala mezcla asfaltica modificada contiene el 15% de GCR
TOTALES					**782,3803**	**327,6005**	**411,209**		**99427,5**			

Porcentaje de cumplimiento a la fecha : 42%

Firma Director de Obra — **Firma Director de Interventoría**

(57)(1) 7037007 - 7036993
Carrera 13ª No. 89-38 of. 414
Edificio Nippon Center
Bogotá D.C. – Colombia
(313) 534 5162
gerencia1@sofaningenieria.com
www.sofaningenieria.com

SOFÁN Ingeniería S.A.S

Mosquera, 10 de junio del 2025

CERTIFICACIÓN

Señores
CONSORCIO DC 2025
NIT: 901.893.060-1
CON: 622 del 2024
OBJETO: "EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/ O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."
PIN: 26829
PERIODO: MAYO DEL 2025

Por medio de la presente certificamos que la empresa **SOFAN INGENIERIA S.A.S** identificada con NIT. **800012888-7**, suministro a la empresa **CONSORCIO DC 2025** Identificada con el NIT. **901.893.060-1** los siguientes tipos de mezcla y cantidades relacionados en el siguiente cuadro:

FECHA	TIPO DE MEZCLA
	MD-19 (m3)
22/05/2025	48,02
29/05/2025	54,58
TOTAL	**102,6**

Cordialmente.

Ing. David Andrés Castellanos Villalobos
Gerente de Planta Asfalto

AFILIADO CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA

PAVIOBRAS SAS
NIT. 830.073.703-3

Bogotá, D.C., 12 DE JUNIO 2025.

CCM-71-25
Hoja 1 de 1

SEÑORES:
CONSORCIO DC 2025
BOGOTA

REF: CERTIFICACIÓN

Por medio de la presente, **PAVIOBRAS S.A.S.** (NIT 830.073.703-3) certifica que durante el período comprendido entre el **1 y el 31 de mayo de 2025**, suministró mezcla asfáltica, para **CONSORCIO DC 2025** (NIT 901.893.060-1) **Contrato No** 622 del 2024 **Objeto del Contrato**: "*Ejecutar a monto agotable por el sistema de precios unitarios, las actividades para la conservación y/o mantenimiento y/ o rehabilitación de la malla vial local e intermedia y espacio público asociado en la localidad de Tunjuelito de la ciudad de Bogotá D.C.*"

La mezcla asfáltica suministrada **cumple con las especificaciones técnicas** exigidas por el Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá (IDU), así como con los **estándares de calidad establecidos.**

MATERIAL	CANTIDAD (M3)
MD-19	52,50
TOTAL	52,50

Atentamente,

PAVIOBRAS SAS
LUIS ALBERTO CAMARGO TOBIAS
GERENTE GENERAL

Oficina: Avenida 15 No. 119-11 Of. 325 - Teléfono 2 15 50 67 Bogotá
Planta: Cra 17 A # 81 A 66 Sur Teléfonos: 3052936105 – 3054775618 Bogotá, Cundinamarca
E-mail: administrativo@paviobras.com.co

PAVIOBRAS SAS
NIT. 830.073.703-3

Bogotá, D.C., 01 DE AGOSTO 2025.

CCM-95-25
Hoja 1 de 1

SEÑORES:
CONSORCIO DC 2025
BOGOTA

REF: CERTIFICACIÓN

Por medio de la presente, **PAVIOBRAS S.A.S.** (NIT 830.073.703-3) certifica que durante el período comprendido entre el **1 y el 31 de Julio de 2025**, suministró mezcla asfáltica, para **CONSORCIO DC 2025** (NIT 901.893.060-1) **Contrato No** 622 del 2024 **Objeto del Contrato**: "*Ejecutar a monto agotable por el sistema de precios unitarios, las actividades para la conservación y/o mantenimiento y/ o rehabilitación de la malla vial local e intermedia y espacio público asociado en la localidad de Tunjuelito de la ciudad de Bogotá D.C.*"

La mezcla asfáltica suministrada **cumple con las especificaciones técnicas** exigidas por el Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá (IDU), así como con los **estándares de calidad establecidos.**

MATERIAL	CANTIDAD (M3)
MD-19	45,84
MCCH25-B	42,93
TOTAL	88,76

Atentamente,

PAVIOBRAS SAS
LUIS ALBERTO CAMARGO TOBIAS
GERENTE GENERAL

PAVIOBRAS S.A.S.

PAVIOBRAS SAS
NIT. 830.073.703-3

Bogotá, D.C., 09 DE SEPTIEMBRE 2025.

CCM-116-25
Hoja 1 de 1

SEÑORES:
CONSORCIO DC 2025
BOGOTA

REF: CERTIFICACIÓN

Por medio de la presente, **PAVIOBRAS S.A.S.** (NIT 830.073.703-3) certifica que durante el período comprendido entre el **1 y el 31 de Agosto de 2025**, suministró mezcla asfáltica, para **CONSORCIO DC 2025** (NIT 901.893.060-1) **Contrato No** 622 del 2024 **Objeto del Contrato**: "*Ejecutar a monto agotable por el sistema de precios unitarios, las actividades para la conservación y/o mantenimiento y/ o rehabilitación de la malla vial local e intermedia y espacio público asociado en la localidad de Tunjuelito de la ciudad de Bogotá D.C.*"

La mezcla asfáltica suministrada **cumple con las especificaciones técnicas** exigidas por el Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá (IDU), así como con los **estándares de calidad establecidos.**

MATERIAL	CANTIDAD (M3)
MD-19	29,05
MCCH25-B	41,73
TOTAL	70,78

Atentamente,

PAVIOBRAS SAS
LUIS ALBERTO CAMARGO TOBIAS
GERENTE GENERAL

PAVIOBRAS S.A.S.

PAVIOBRAS SAS
NIT. 830.073.703-3

Bogotá, D.C., 06 DE OCTUBRE 2025.

CCM-122-25
Hoja 1 de 1

SEÑORES:
CONSORCIO DC 2025
BOGOTA

REF: CERTIFICACIÓN

Por medio de la presente, **PAVIOBRAS S.A.S.** (NIT 830.073.703-3) certifica que durante el período comprendido entre el **1 y el 30 de Septiembre de 2025**, suministró mezcla asfáltica, para **CONSORCIO DC 2025** (NIT 901.893.060-1) **Contrato No** 622 del 2024 **Objeto del Contrato**: "*Ejecutar a monto agotable por el sistema de precios unitarios, las actividades para la conservación y/o mantenimiento y/ o rehabilitación de la malla vial local e intermedia y espacio público asociado en la localidad de Tunjuelito de la ciudad de Bogotá D.C.*"

La mezcla asfáltica suministrada **cumple con las especificaciones técnicas** exigidas por el Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá (IDU), así como con los **estándares de calidad establecidos.**

MATERIAL	CANTIDAD (M3)
MD-19	172,55
MD-12	15,59
TOTAL	188,14

Atentamente,

PAVIOBRAS SAS
LUIS ALBERTO CAMARGO TOBIAS
GERENTE GENERAL

PAVIOBRAS SAS
NIT. 830.073.703-3

Bogotá, D.C., 06 DE OCTUBRE 2025.

CCM-121-25
Hoja 1 de 1

SEÑORES:
CONSORCIO DC 2025
BOGOTA

REF: CERTIFICACIÓN

Por medio de la presente, **PAVIOBRAS S.A.S.** (NIT 830.073.703-3) certifica que durante el período comprendido entre el **1 y el 30 de Septiembre de 2025**, suministró mezcla asfáltica, para **CONSORCIO DC 2025** (NIT 901.893.060-1) **Contrato No** 622 del 2024 **Objeto del Contrato**: "*Ejecutar a monto agotable por el sistema de precios unitarios, las actividades para la conservación y/o mantenimiento y/ o rehabilitación de la malla vial local e intermedia y espacio público asociado en la localidad de Tunjuelito de la ciudad de Bogotá D.C.*"

La mezcla asfáltica suministrada **cumple con las especificaciones técnicas** exigidas por el Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá (IDU), así como con los **estándares de calidad establecidos.**

MATERIAL	CANTIDAD (M3)
MCCH25-B	169,41
TOTAL	**169,41**

Atentamente,

PAVIOBRAS SAS
LUIS ALBERTO CAMARGO TOBIAS
GERENTE GENERAL

Signature: bc2ea0c05bd5213f1dde8d4c2f2f5bf9cf312a86bb2ff3f4666d040bed248826

CER 25-4-10-346

CERTIFICACION SUMINISTRO MATERIALES

El suscrito, Felipe Atuesta Becerra, en representación de DOBLE A INGENIERIA SAS, empresa debidamente inscrita en el Directorio de Proveedores de materiales de construcción y servicios de disposición final de escombros del IDU con el número 302-09 para MEZCLAS ASFALTICAS certifica que:

DOBLE A INGENIERIA SAS, entregó las siguientes cantidades de MEZCLAS ASFALTICAS:

- Del 04 de septiembre de 2025: 47,86 M3 de MCCH-25A 2018 al [illegible] con Nit 900[illegible], para el Contrato de obra No. 622-2024 " EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

  Pin Ambiental: 26829

Los anteriores materiales fueron entregados al [illegible] en las instalaciones de **DOBLE A INGENIERIA S.A.S** ubicadas en el Municipio de Mosquera vereda de Balsillas.

La presente certificación se expide por solicitud del interesado con destino a INGECOP OBRAS CIVILES S.A.S – IP OBRA CONSORCIO DC 2025, el día 10 de octubre de 2025

FELIPE ATUESTA BECERRA

Signature: bc2ea0c05bd5213f1dde8d4c2f2f5bf9cf312a86bb2ff3f4666d040bed248826

IP Tiquete	IP Fecha	IP Hora	IP Cliente	IP Obra	IP Producto	IP Planta	IP m3
M-1208849	4-sep.-25	09:47	ESTUDIOS E INGENIERIA SAS	CONSORCIO DC 2025	MCCH-25A 2018	PA-03	16,02
M-1208851	4-sep.-25	09:21	ESTUDIOS E INGENIERIA SAS	CONSORCIO DC 2025	MCCH-25A 2018	PA-03	15,90
M-1208850	4-sep.-25	09:07	ESTUDIOS E INGENIERIA SAS	CONSORCIO DC 2025	MCCH-25A 2018	PA-03	15,94
							47,86

Etiquetas de fila	Suma de IP m3
PA-03	**47,86**
MCCH-25A 2018	47,86
Total general	**47,86**

PAVIOBRAS SAS
NIT. 830.073.703-3

Bogotá, D.C., 18 NOVIEMBRE 2025.

CCM-140-25
Hoja 1 de 1

SEÑORES:
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
BOGOTA

REF: CERTIFICACIÓN

Por medio de la presente, **PAVIOBRAS S.A.S.** (NIT 830.073.703-3) certifica que durante el período comprendido entre el **1 y el 31 de Octubre del 2025**, suministró mezcla asfáltica a **CONSORCIO DC 2025** (NIT 901.893.060-1), quien la destinó al **FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO** (NIT 899.999.061-9), para ser utilizada en la ejecución de la obra cuyo objeto es la:
"Ejecutar a monto agotable por el sistema de precios unitarios, las actividades para la conservación y/o mantenimiento y/ o rehabilitación de la malla vial local e intermedia y espacio público asociado".

La mezcla asfáltica suministrada **cumple con las especificaciones técnicas** exigidas por el Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá (IDU), así como con los **estándares de calidad establecidos.**

MATERIAL	CANTIDAD (M3)
MCCH25	56

Atentamente,

PAVIOBRAS SAS
LUIS ALBERTO CAMARGO TOBIAS
GERENTE GENERAL

Oficina: Avenida 15 No. 119-11 Of. 325 - Teléfono 2 15 50 67 Bogotá
Planta: Cra 17 A # 81 A 66 Sur Teléfonos: 3052936105 – 3054775618 Bogotá, Cundinamarca
E-mail: administrativo@paviobras.com.co

PAVIOBRAS SAS
NIT. 830.073.703-3

Bogotá, D.C., 18 NOVIEMBRE 2025.

CCM-141-25
Hoja 1 de 1

SEÑORES:
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
BOGOTA

REF: CERTIFICACIÓN

Por medio de la presente, **PAVIOBRAS S.A.S.** (NIT 830.073.703-3) certifica que durante el período comprendido entre el **1 y el 31 de Octubre del 2025**, suministró mezcla asfáltica a **CONSORCIO DC 2025** (NIT 901.893.060-1), quien la destinó al **FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO** (NIT 899.999.061-9), para ser utilizada en la ejecución de la obra cuyo objeto es la:
"Ejecutar a monto agotable por el sistema de precios unitarios, las actividades para la conservación y/o mantenimiento y/ o rehabilitación de la malla vial local e intermedia y espacio público asociado".

La mezcla asfáltica suministrada **cumple con las especificaciones técnicas** exigidas por el Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá (IDU), así como con los **estándares de calidad establecidos.**

MATERIAL	CANTIDAD (M3)
MD-19	**48,73**

Atentamente,

PAVIOBRAS SAS
LUIS ALBERTO CAMARGO TOBIAS
GERENTE GENERAL

Oficina: Avenida 15 No. 119-11 Of. 325 - Teléfono 2 15 50 67 Bogotá
Planta: Cra 17 A # 81 A 66 Sur Teléfonos: 3052936105 – 3054775618 Bogotá, Cundinamarca
E-mail: administrativo@paviobras.com.co

PAVIOBRAS SAS
NIT. 830.073.703-3

Bogotá, D.C., 18 NOVIEMBRE 2025.

CCM-142-25
Hoja 1 de 1

SEÑORES:
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
BOGOTA

REF: CERTIFICACIÓN

Por medio de la presente, **PAVIOBRAS S.A.S.** (NIT 830.073.703-3) certifica que durante el período comprendido entre el **1 y el 15 de Noviembre del 2025**, suministró mezcla asfáltica a **CONSORCIO DC 2025** (NIT 901.893.060-1), quien la destinó al **FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO** (NIT 899.999.061-9), para ser utilizada en la ejecución de la obra cuyo objeto es la:
"Ejecutar a monto agotable por el sistema de precios unitarios, las actividades para la conservación y/o mantenimiento y/ o rehabilitación de la malla vial local e intermedia y espacio público asociado".

La mezcla asfáltica suministrada **cumple con las especificaciones técnicas** exigidas por el Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá (IDU), así como con los **estándares de calidad establecidos.**

MATERIAL	CANTIDAD (M3)
MCCH25	45,34

Atentamente,

PAVIOBRAS SAS
LUIS ALBERTO CAMARGO TOBIAS
GERENTE GENERAL

Oficina: Avenida 15 No. 119-11 Of. 325 - Teléfono 2 15 50 67 Bogotá
Planta: Cra 17 A # 81 A 66 Sur Teléfonos: 3052936105 – 3054775618 Bogotá, Cundinamarca
E-mail: administrativo@paviobras.com.co

PAVIOBRAS SAS
NIT. 830.073.703-3

Bogotá, D.C., 18 NOVIEMBRE 2025.

CCM-143-25
Hoja 1 de 1

SEÑORES:
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
BOGOTA

REF: CERTIFICACIÓN

Por medio de la presente, **PAVIOBRAS S.A.S.** (NIT 830.073.703-3) certifica que durante el período comprendido entre el **1 y el 15 de Noviembre del 2025**, suministró mezcla asfáltica a **CONSORCIO DC 2025** (NIT 901.893.060-1), quien la destinó al **FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO** (NIT 899.999.061-9), para ser utilizada en la ejecución de la obra cuyo objeto es la:
"Ejecutar a monto agotable por el sistema de precios unitarios, las actividades para la conservación y/o mantenimiento y/ o rehabilitación de la malla vial local e intermedia y espacio público asociado".

La mezcla asfáltica suministrada **cumple con las especificaciones técnicas** exigidas por el Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá (IDU), así como con los **estándares de calidad establecidos.**

MATERIAL	CANTIDAD (M3)
MD-19	**44,14**

Atentamente,

PAVIOBRAS SAS
LUIS ALBERTO CAMARGO TOBIAS
GERENTE GENERAL

Oficina: Avenida 15 No. 119-11 Of. 325 - Teléfono 2 15 50 67 Bogotá
Planta: Cra 17 A # 81 A 66 Sur Teléfonos: 3052936105 – 3054775618 Bogotá, Cundinamarca
E-mail: administrativo@paviobras.com.co

0013.26 – TUN - GTC

Bogotá, 23 de junio de 2026

Ingeniero
RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO
Director de Obra
CONSORCIO DC 2025
Bogotá

Asunto: Contrato de Obra No. 622 de 2024 "EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." **-**
Respuesta comunicado OF.CDC 010 – Concepto de No Objeción Programa de Manejo Ambiental de Residuos de Construcción y Demolición – Cierre de PIN-GEN 26829

Respetado Ingeniero,

Una vez revisado el Programa de Manejo Ambiental de Residuos de Construcción y Demolición Final de Cierre de PIN-GEN remitido mediante oficio OF.CDC 010 el 23 de junio de 2026, se evidencia que se ajustan las cantidades de Residuos de Construcción y Demolición gestionados durante los meses de *septiembre 2026* y *octubre 2026*, y cumple con los requerimientos mínimos contractuales para solicitar el cierre del PIN-GEN 26829, por lo tanto, se genera la NO OBJECION del documento por parte de esta interventoría.

De acuerdo con lo anterior, se aclara que en tal caso que la entidad contratante y/o la Autoridad Ambiental Competente tengan alguna observación y/o requerimiento adicional, esta se remitirá al contratista para que pueda ser atendida con prontitud.

Sin otro en particular,

Cordialmente,

CARLOS FERNANDO FERNANDEZ AMORTEGUI
Director de interventoría VELNEC S.A.

Copia: Profesionales de apoyo a la Supervisión FDLT – Ingeniero Diego Caballero ;Valentina Martinez.: Contrato No. 689 de 2024

CONSORCIO DC 2025

NIT: 9 0 1 8 9 3 0 6 0 – 1

OF.CDC 010-23.06.2026

Tunjuelito, 23 de Junio de 2026

Señores:
VELNEC S.A.
DOC. PAOLA MARIA CRISTANCHO CHARRY
Representante legal de interventoría.
ING. CARLOS FERNANDEZ
Director de interventoría
Avenida Carrera 86 # 51 – 66, oficina 301
Bogotá D.C

REF: CONTRATO DE OBRA No. 622-2024

OBJETO: "EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/ O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

ASUNTO: PMA-RCD FINAL – CIERRE PIN AMBIENTAL

Respetados Señores:

Por medio de la presente y de acuerdo con la revisión para el cierre de las cantidades de RCD gestionadas para el contrato Contrato 522 del 2024, se remite el informe de cierre de PIN AMBIENTAL para solicitar el ajuste de información en la plataforma.

Agradezco la atención a la presente y quedo atento ante cualquier inquietud u observación.

Cordialmente,

CONSORCIO DC 2025
NIT: 9 0 1 8 9 3 0 6 0 - 1
Representante legal: RAFAEL EDUARDO ALZATE MORENO
C. C. No. 7.176.318 de Tunja

Calle 19 #43G-80 Apartamento 812 Medellín - Antioquia Celular: 3123799155

E-mail: consorciodc2025@gmail.com

Programa de Manejo Ambiental de Residuos de Construcción y Demolición – PMA RCD

CONSORCIO DC 2025

CONTRATO No. FDLT622 – 2024

PIN-GEN 26829

OBJETO DEL PROYECTO:

“EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/ O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”


BOGOTÁ D.C

26 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2025

CONTROL DE VERSIONES

VERSIÓN	FECHA	DESCRICIÓN
1	01/02/2026	Emisión del documento
2	23/06/2026	Emisión del documento V2

CONTROL DE FIRMAS

	CARGO	NOMBRE	FECHA	FIRMA
Elaboró	Especialista Ambiental y SST	Sonia Liliana Torres Cruz	23/06/2026	
Aprobó	Director de obra	Rafael Eduardo Álzate Moreno	23/06/2026	
Aprobado	**Residente Interventoría Ambiental**	**Claudia Beltrán**	23/06/2026	

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 5
2. ALCANCE 6
3. OBJETIVOS 7
   3.1. Objetivo General 7
   3.2. Objetivos Específicos 7
4. DEFINICIONES 8
5. DATOS CONTRACTUALES DEL PROYECTO 11
   5.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 12
6. MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS 14
   6.1. RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 15
   6.2. Manejo de materiales de construcción 25
7. REGISTRO FOTOGRÁFICO 32
8. CONCLUSIONES 38
9. ANEXOS 39

Índice de Tablas

Tabla 1. Información Contrato de Obra 11
Tabla 2. Información Contrato de Interventoría 11
Tabla 1. Ubicación CIV viales a intervenidos 13
Tabla 4. Gestores utilizados en el contrato 16
Tabla 5. Proveedores utilizados durante la ejecución del contrato 25
Tabla 6. Densidades utilizadas durante la ejecución del contrato 26
Tabla 7. Materiales de Construcción adquiridos 27
Tabla 8. Trazabilidad de materiales por CIV intervenido 28
Tabla 9. Materiales de Construcción adquiridos en planta de aprovechamiento 30
Tabla 10. Indicadores Manejo de Materiales de Construcción total Contrato 622 del 2024 31

Índice de Ilustraciones

Ilustración 1. Localización localidad Tunjuelito 14

Índice de Graficas

Grafica 1. Trazabilidad de materiales 28
Grafica 2. Materiales adquiridos en Plantas de Aprovechamiento 30

1. INTRODUCCIÓN

En el presente informe final se describieron las acciones, actividades y medidas ambientales implementadas durante la ejecución del Contrato No. 622 de 2024, cuyo objeto es ***"EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y DEL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C***.", en lo relacionado con la formulación, implementación y cierre del Programa de Manejo Ambiental de Residuos de Construcción y Demolición – PMARCD.

La descripción, aplicación y seguimiento de las medidas contempladas en el PMARCD permitieron desarrollar las actividades contractuales de manera controlada, garantizando la gestión integral de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD), así como la identificación, justificación y adopción de las acciones necesarias para dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente durante toda la ejecución del contrato.

Durante el desarrollo del proyecto se implementaron medidas orientadas a prevenir, minimizar y controlar los impactos ambientales, así como a reducir los volúmenes de RCD dispuestos en sitios de disposición final, priorizando el aprovechamiento, la reutilización y el tratamiento adecuado de los residuos generados. De igual forma, se aplicaron criterios técnicos para la clasificación de los RCD, la separación en la fuente, el almacenamiento temporal, el transporte autorizado y su entrega a gestores debidamente autorizados, garantizando una trazabilidad adecuada de cada uno de los flujos de residuos.

El Contrato contó con el PIN – GEN No. 26829, asignado por la Secretaría Distrital de Ambiente, el cual fue utilizado durante toda la ejecución contractual como mecanismo de identificación del proyecto ante la autoridad ambiental, los transportadores, los gestores de aprovechamiento y los sitios de disposición final de RCD. A través de este PIN se aseguró el adecuado registro, control y seguimiento de las actividades de generación, transporte, aprovechamiento y disposición de los residuos.

Finalmente, con la culminación de las actividades técnicas y administrativas del contrato, se procedió a la finalización del PMARCD, consolidando la información de seguimiento, los soportes documentales y los resultados obtenidos en materia de aprovechamiento y circularidad, los cuales evidencian el cumplimiento de las metas ambientales establecidas, permitiendo así el cierre ambiental y la liquidación del Contrato No. 622 de 2024, conforme a lo exigido por la normatividad vigente y los lineamientos de la autoridad ambiental competente.

2. ALCANCE

El Programa de Manejo Ambiental de Residuos de Construcción y Demolición – PMARCD del Contrato No. 622 de 2024, cuyo objeto es ***"EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y DEL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."***, definió y aplicó los procedimientos técnicos necesarios para la identificación, cuantificación y gestión de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) generados como resultado de las actividades desarrolladas durante la ejecución contractual.

El alcance del PMARCD comprendió la implementación de medidas orientadas a la minimización en la generación de residuos, así como su adecuada clasificación, separación en la fuente, almacenamiento temporal, transporte, aprovechamiento, tratamiento y disposición final, de conformidad con la normatividad ambiental vigente y los lineamientos establecidos por la autoridad ambiental competente.

Así mismo, el Programa permitió contribuir a la prevención, mitigación y compensación de los impactos ambientales asociados a la gestión de RCD, mediante la adopción de prácticas ambientales adecuadas que garantizaron el manejo integral de los residuos generados, asegurando su trazabilidad y control durante todas las etapas del proyecto.

Con la culminación de las actividades objeto del contrato, el PMARCD alcanzó su propósito, evidenciando el cumplimiento de las obligaciones ambientales, lo que permitió realizar el cierre ambiental del programa y la liquidación del Contrato No. 622 de 2024, sin registrarse incumplimientos en materia de gestión de Residuos de Construcción y Demolición.

3. OBJETIVOS

3.1. Objetivo General

Evidenciar la implementación y ejecución del Programa de Manejo Ambiental de Residuos de Construcción y Demolición – PMARCD, desarrollado en el marco del Contrato No. 622 de 2024, cuyo objeto es ***"EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y DEL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."*,** de conformidad con lo establecido en la normatividad ambiental vigente aplicable.

3.2. Objetivos Específicos

- Se dio cumplimiento a los lineamientos técnicos y normativos establecidos en la Resolución 1257 de 2021 y el Decreto Distrital 507 de 2023, relacionados con la gestión integral de los Residuos de Construcción y Demolición.

- Se garantizó la transparencia y trazabilidad de la gestión realizada para el manejo, transporte, aprovechamiento y disposición final de los residuos generados, mediante la correspondiente certificación por parte de gestores autorizados.

- Se aseguró la adecuada ejecución del Programa de Manejo Ambiental de Residuos de Construcción y Demolición – PMARCD durante el desarrollo de las actividades de obra, aplicando los procedimientos definidos y las medidas ambientales establecidas.

- Se realizó la entrega oportuna de la información reportada en los informes mensuales de seguimiento ambiental presentados durante la ejecución del contrato, consolidando los resultados para el cierre y liquidación contractual.

4. DEFINICIONES

Almacenamiento o acopio: De acuerdo con la resolución 1257 de 2021, es la ubicación temporal de los RCD en recipientes, contenedores, sitios de acopio temporal y/o depósitos para su recolección y transporte con fines de aprovechamiento o disposición final.

Aprovechamiento: Es el proceso mediante el cual, a través de la recuperación de los materiales provenientes de los residuos de construcción y demolición, se realiza sureincorporación al ciclo económico productivo en forma ambientalmente eficiente por medio de procesos como la reutilización y el reciclaje.

Centro de aprovechamiento de residuos de construcción y demolición (RCD): sitio autorizado para transformar los RCD aprovechables y producir materiales de construcción a través de plantas fijas y/o móviles.

Centro de transferencia de RCD: sitio autorizado para el acopio temporal de RCD con objetivo aprovechable y sin fines de transformación.

Certificados de incorporación de materiales de construcción valorizados: Documento electrónico autorizado por la Secretaría Distrital de Ambiente, mediante el cual el proveedor de elementos, insumos o materiales de construcción valorizados (MCV) soporta ante la autoridad ambiental competente y el generador, la incorporación de MCV a la obra.

Escombros: Todo residuo sólido sobrante de la actividad de construcción y remodelación (excavación, demolición de concretos rígidos y flexible), realización de obras civiles o de otras actividades conexas complementarias o análogas que no puedan ser usados nuevamente.

Generador: persona natural o jurídica que realiza actividades de demolición, excavación y construcción, generando RCD para ser aprovechados o dispuestos finalmente según sus características.

Gestor integral: persona natural o jurídica autorizada que realiza actividades de transporte, tratamiento, aprovechamiento y/o disposición final de RCD.

Grandes generadores: son los usuarios privados y públicos que generan RCD en volúmenes superiores a 1 m3 (metro cúbico mensual).

Material De Demolición: Son los residuos (concretos rígidos y flexibles) generados como producto de un proceso manual o mecánico de destrucción de estructuras, el cual puede ser reutilizado si cumple con ciertas características físicas.

Material De Excavación: Material orgánico (tierra negra) o inerte (concretos rígidos y flexibles), producto de un proceso manual o mecánico de excavación, el cual puede ser reutilizado si cumple con ciertas características físicas.

Material Reciclable: Material orgánico o inorgánico que tiene que ser transformado paraser nuevamente utilizado, como el mismo producto o en otro diferente.

Material Reutilizable: Material orgánico o inorgánico que se puede utilizar directamentesin ninguna transformación.

Planta móvil: maquinaria portátil disponible para realizar transformación de RCD en centros de aprovechamiento o en frentes de obra.

PIN: Número de identificación asignado por la Secretaría Distrital de Ambiente como resultado del registro efectuado por los generadores, Gestores de RCD, y proveedores, luego de cumplir con los requisitos mínimos exigidos

PIN-GEN: Número de identificación como generador de RCD otorgado por la Secretaría Distrital de Ambiente.

Programa de manejo ambiental de RCD (antes denominado Plan de gestión de RCD en la obra**):** Es el instrumento de gestión que contiene la información de la obra y de las actividades que se deben realizar para garantizar la gestión integral de los RCD generados.

Receptor: Persona natural o jurídica que, sin que la gestión de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) constituya su actividad principal, utiliza RCD para aprovechamiento como materia prima dentro de su proceso productivo a través de simbiosis industrial, ya sea en proyectos, obras o actividades de la misma persona o de otras personas dentro del territorio nacional, bajo las condiciones establecidas en esta resolución."

Reciclaje: proceso realizado por gestores especiales sobre los residuos generados, cuyo objeto es la transformación de estos en insumos para el sector de la construcción.

Recolección: Todas las actividades relacionadas con la recolección de residuos sólidos alinterior de la obra.

Reducción: estrategia de gestión que promueve el empleo mínimo y eficiente de los insumos de construcción, con miras a generar los menores volúmenes de residuos.

Residuos de construcción y demolición (RCD): todo residuo sólido sobrante de las actividades de demolición, excavación, construcción y/o reparación de las obras civiles o de otras actividades conexas.

Residuo peligroso: Es aquel que, por sus características infecciosas, tóxicas, explosivas, corrosivas, inflamables, volátiles, combustibles, radioactivas o reactivas y envases de estos, generan riesgo sobre la población, el ambiente, los bienes y la infraestructura.

Residuo Inorgánico: Son aquellos residuos que dentro de su estructura no cuenta con elementos como carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, por tal razón no son degradablesde forma biológica. Entre este grupo se encuentran los concretos rígido y flexible, plásticos,hierro.

Residuo Orgánico No Reciclable: Son aquellos que poseen una fácil descomposición biológica, dada sus características y composición. Pero que dado la baja producción y ninguna posibilidad de usarlos en la obra se considera no apropiado su reciclaje. En esta categoría se incluyen los residuos de comidas.

Residuo Orgánico Reciclable: Son aquellos que por su biodegradabilidad y composición permiten generar subproductos que pueden ser reutilizados dentro de la obra, así como fuera de ella. En el caso de este residuo hay que decir que dentro de la obra se pueden reutilizar, la tierra negra, la madera y el cespedón. Por fuera de la obra los residuos como cartón, papel, vidrio y aluminio se entregarán a empresas de reciclaje, para su recuperación.

Reutilización: acción de darle un siguiente uso a los residuos generados de las actividadesde demolición, excavación y construcción, para efectos de alargar su ciclo de vida.

Revalorización: estrategia de gestión dirigida hacia la caracterización química de los residuos, permitiendo así integrarlos al proceso a través de la repotencialización de sus componentes.

Simbiosis industrial: Estrategia colaborativa para el intercambio de flujos físicos de materiales, energía o agua y el compartir de servicios entre actores, para contribuir con el uso eficiente de recursos y la reducción de impactos ambientales de sistemas industriales.

Sobrante: Desperdicio o desecho de características sólidas.

Sitio de disposición final: lugar autorizado para recibir y acopiar de forma definitiva el material residual del aprovechamiento en las plantas y todo aquel RCD pétreo, que por suscaracterísticas físicas no pudo ser objeto de aprovechamiento.

Transportador: cualquier persona natural o jurídica que preste servicios de recolección y traslado de RCD desde puntos de generación, asumiendo la titularidad de los mismos.

5. DATOS CONTRACTUALES DEL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 622 de 2024	
Contratista	Consorcio DC 2025
NIT	901.893.060-1
Fecha de Inicio	26 de Diciembre de 2024
Periodo fase preliminar	2 meses
Fecha de terminación inicial	25 de Agosto del 2025
Fecha de terminación prorroga 1 (2 meses 15 días)	10 de Noviembre de 2025
Plazo de ejecución inicial	8 Meses
Plazo de ejecución total (más prorroga)	10 meses 15 días
Valor Total del Contrato de obra (con adición)	1´580.340.624

Tabla 1. Información Contrato de Obra

CONTRATO DE INTERVENTORÍA PÚBLICA No. 689 de 2024	
Contratista Interventoría	Velnec S.A
NIT	800.028.455-1
Fecha de Inicio	26 de Diciembre de 2024
Periodo fase preliminar	2 meses
Fecha de terminación inicial	25 de Agosto del 2025
Fecha de terminación prorroga 1 (2 meses 15 días)	10 de Noviembre de 2025
Plazo de ejecución inicial	8 Meses
Plazo de ejecución total (más prorroga)	10 meses 15 días
Valor Total del Contrato de obra (con adición)	677.917.912

Tabla 2. Información Contrato de Interventoría

5.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Las actividades de conservación, mantenimiento y rehabilitación de la malla vial local e intermedia y del espacio público asociado se ejecutaron en diferentes tramos ubicados dentro de la localidad de Tunjuelito, los cuales fueron identificados mediante los Códigos de Identificación Vial – CIV, de acuerdo con la programación establecida por el FDLT y avalada por la interventoría.

Los tramos viales intervenidos durante la ejecución del contrato correspondieron a los siguientes CIV:

- CIV 6000547
- CIV 6001042
- CIV 6000587
- CIV 6000897
- CIV 6001045
- CIV 6000751
- CIV 6000760
- CIV 6001827
- CIV 6001648
- CIV 6001672
- CIV 6001008
- CIV 6000775
- CIV 6001105

Es importante precisar que el orden de los CIV relacionados no corresponde necesariamente a la secuencia de intervención durante la ejecución del contrato. El Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito – FDLT contó con la facultad de definir y priorizar los segmentos viales a intervenir, con base en los resultados de la etapa previa y las necesidades identificadas en el territorio.

En este sentido, la tabla presentada diferencia los segmentos viales que hicieron parte del objeto inicial del contrato, de aquellos que fueron intervenidos posteriormente por priorización de la Alcaldía Local de Tunjuelito, previo acuerdo con el supervisor y con el aval de la interventoría, sin afectar el objeto contractual ni el cumplimiento de las obligaciones establecidas.

6000022	6000538	6000891	6001329	6001563
6000033	6000547	6000898	6001331	6001578
6000036	6000556	6000899	6001333	6001589
6000038	6000576	6000902	6001342	6001641
6000049	6000577	6000930	6001345	6001642
6000051	6000588	6000941	6001353	6001663
6000064	6000597	6000946	6001357	6001679
6000071	6000633	6000947	6001361	6001696
6000075	6000648	6000949	6001363	6001707
6000088	6000669	6000951	6001364	6001743
6000102	6000674	6000959	6001369	6001749
6000121	6000675	6000979	6001371	6001752
6000131	6000683	6000980	6001373	6001753
6000146	6000696	6000981	6001374	6001768
6000147	6000697	6000987	6001377	6001800
6000156	6000734	6000988	6001379	6001816
6000164	6000737	6000991	6001384	6001827
6000176	6000751	6000992	6001385	6001842
6000181	6000758	6000996	6001386	6001858
6000192	6000760	6000997	6001389	6001862
6000193	6000761	6000998	6001399	6001939
6000220	6000770	6001030	6001403	6002010
6000373	6000772	6001132	6001405	6002038
6000377	6000781	6001193	6001408	6002069
6000409	6000782	6001200	6001412	6002083
6000437	6000789	6001244	6001422	6002089
6000442	6000790	6001270	6001429	6002111
6000446	6000796	6001275	6001430	6002130
6000461	6000816	6001280	6001439	6002133
6000478	6000821	6001284	6001440	15001628
6000485	6000835	6001315	6001457	18002365
6000501	6000863	6001320	6001497	18004227
000505	6000865	6001323	6001550	
6000506	6000882	6001325	6001562	

Tabla 3. Ubicación CIV viales a intervenidos

La localización general del proyecto dentro de la localidad de Tunjuelito se presenta en la Ilustración 1, la cual permite identificar el área de influencia de las intervenciones realizadas.

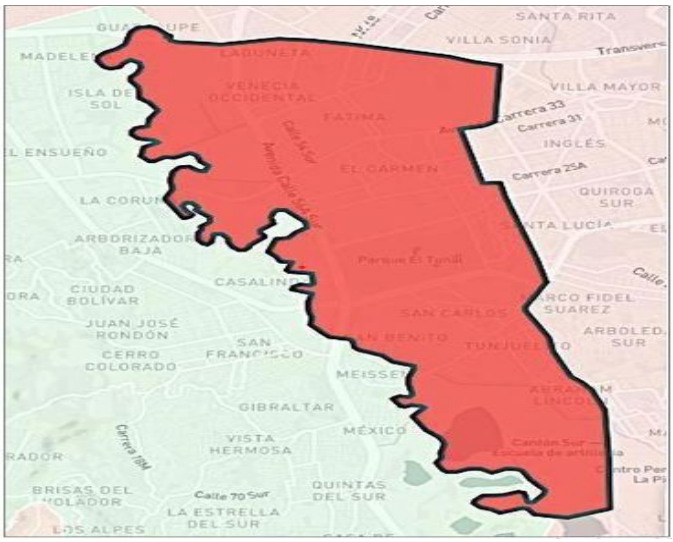


Ilustración 1. Localización localidad Tunjuelito

Fuente: https://osgis.co/cual_es_mi_upl/

6. MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

En cumplimiento de lo establecido en el Programa de Manejo Ambiental de Residuos de Construcción y Demolición – PMARCD y de conformidad con los lineamientos definidos en el Decreto Distrital 507 de 2023, durante la ejecución del Contrato No. 622 de 2024 se realizó la gestión ambiental de los materiales generados, garantizando el manejo adecuado de los Residuos de Construcción y Demolición – RCD.

De acuerdo con la normativa aplicable, la meta mínima de reutilización y/o aprovechamiento de materiales o RCD establecida para la ejecución contractual correspondía al **40%** del total de residuos generados. Dicha gestión se llevó a cabo mediante la entrega de los residuos a centros de tratamiento, aprovechamiento y disposición final debidamente autorizados, quienes emitieron los respectivos certificados de disposición y/o aprovechamiento**,** los cuales soportan la trazabilidad y cumplimiento de las obligaciones ambientales del contrato.

Para el desarrollo y seguimiento de las actividades ambientales, la entidad realizó la apertura del PIN-GEN, asignando como número de identificación de obra el PIN-GEN No. 26829, el cual fue utilizado durante toda la ejecución contractual para la identificación del proyecto ante la autoridad

ambiental, los gestores de RCD y los demás actores involucrados en la gestión integral de los residuos.

En consecuencia, el manejo ambiental de las actividades constructivas se ejecutó conforme a la normatividad vigente, permitiendo el cumplimiento de las metas de aprovechamiento y aportando a la adecuada finalización y liquidación ambiental del contrato.

6.1. RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

El manejo integral de los Residuos de Construcción y Demolición – RCD se fundamentó en el cumplimiento de lo establecido en la Resolución 1257 de 2021 y el Decreto Distrital 507 de 2023, así como en las normas que los modifican, adicionan o sustituyen, en concordancia con la Política Ambiental del Distrito Capital.

En este sentido, durante la ejecución del contrato se realizó el registro, control y seguimiento de los RCD generados en los diferentes frentes de obra, con el propósito de identificar y cuantificar los residuos producidos como resultado de las actividades de conservación, mantenimiento y rehabilitación de la malla vial local e intermedia y del espacio público asociado.

Las cantidades de RCD generadas y gestionadas fueron debidamente reportadas, manteniendo un control diario en obra y realizando el reporte mensual de las cantidades reales, a través de los formatos establecidos por el IDU y de los informes mensuales presentados a la interventoría, los cuales contaron con los respectivos soportes y certificaciones emitidos por los sitios autorizados de tratamiento, aprovechamiento y disposición final de RCD.

En consecuencia, la gestión de los residuos se desarrolló de manera sistemática y verificable, permitiendo consolidar la información necesaria para el cierre ambiental y la liquidación del contrato, en cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.

- ✓ **Gestores utilizados en el contrato**

No DE REGISTRO IDU	NOMBRE	CATEGORIA	PERMISO AMBIENTAL /VIGENCIA
467	Granulados Reciclados de Colombia – GRECO	Transformación, Aprovechamiento y Disposición Final	Comunicado No. 20242064523 de 24/07/2024
678	Servicios Profesionales AIA	Transformación, Aprovechamiento y Disposición Final	Comunicado 20242030458 del 02/05/2024
237 – 521	Cemex Colombia	Disposición Final	Resolución 1506 de 22/05/2006 y Resolución 01280 de 15/06/2017
421	Maquinas Amarillas	Disposición Final	Resolución 1480 de 04/12/2014 y Resolución 0228 del 07/03/2016
444	Manejo y Gestión Integral de Residuos Sólidos SAS ESP – MAGIR SAS	Disposición Final	Resolución DRSOA No. 11247000018 de 01/03/2024
654	Ingeomineria SAS – San Antonio	Disposición Final	Resolución 0836 del 16/07/2015 y Resolución 01110 del 12/09/2017
514	SECAM JR EU	Transformación, Aprovechamiento y Disposición Final	Comunicado No. 20242106607 de 16/12/2024
N/A	TRACOL SAS ESP	Disposición Final	Resolución 00620 del 29 de Diciembre del 1994 Resolución 1148 del 16 de Agosto del 2005

Tabla 4. Gestores utilizados en el contrato

En el anexo 04 se encuentran la documentación de cada uno de los gestores, donde se incluyen los permisos ambientales

- ✓ **Seguimiento de residuos.**

Durante la ejecución del contrato se realizaron viajes de materiales provenientes de actividades de excavación en los CIV intervenidos, los cuales fueron transportados en volquetas doble troque, de acuerdo con las actividades objeto del contrato.

- ✓ **<u>Residuos Peligrosos – Bolsas De Cemento y contenedores vacíos de sustancias químicas</u>**

De acuerdo con las actividades objeto del contrato, durante su ejecución se requirió de manera permanente el uso de cemento en obra. Las bolsas que contenían este producto fueron consideradas residuos peligrosos y, en consecuencia, fueron dispuestas en un sitio de disposición final autorizado por la Autoridad Ambiental Competente.

Durante el mes de noviembre, se realizó la disposición final de las bolsas de cemento y de los contenedores vacíos que se encontraban acopiados durante la ejecución del contrato. El Anexo 4 contiene el certificado de disposición final, en el cual se relacionan las cantidades generadas y el nombre técnico del residuo, conforme a la clasificación establecida por la planta gestora.

Es importante precisar que, dentro de dicha clasificación, no existe un residuo denominado específicamente como “bolsas de cemento”; por tal razón, se optó por la categoría más cercana y técnicamente aplicable, la cual comparte el código UN 3077 – Clase 9, de acuerdo con la normativa de las Naciones Unidas, lo que respalda su correcta identificación, manejo y disposición final.

En consecuencia, se concluye que la gestión y disposición final de este tipo de residuos se realizó en cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, garantizando un manejo adecuado y seguro durante la ejecución del contrato.

- ✓ **REGISTRO FOTOGRAFICO**










ACOPIO
BOLSAS DE
CEMENTO




ACOPIO
BOLSAS DE
CEMENTO


ACOPIO
BOLSAS DE
CEMENTO













Cabe aclarar que para la ejecución del contrato no se realizó aprovechamiento insitu, en el anexo 02 se adjunta certificación de no aprovechamiento firmado por el contratista y la interventoría y el formato V sin diligenciar con la respectiva firma.

A continuación, se relacionan las cantidades generadas, expresadas en metros cúbicos (m^3) y toneladas (t), así como cada uno de los gestores utilizados para su manejo y disposición final.

PERIODO	TIPO DE RCD	CLASIFICACIÓN	CANTIDAD		PIN AMBIENTAL	GESTOR Y CERTIFICACIÓN
			M3	TON		
mar-25	Material de Excavación	Excavacion	120,3	169,97	Registro de Inscripción CAR 052	Servicios Profesionales AIA Cert. AIAS217 - 2025
	Material Petreo	Asfalto	15	23,53		
	Material de Excavación	Excavacion	255	327,09	8418	Maquinas Amarillas Cert. 603 - 2025
	Material de Excavación	Excavacion	1110	1554,00	11247000018	Manejo y Gestión Integral de Residuos Sólidos SAS ESP - MAGIR SAS Cert. 026
	Material de Excavación	Excavacion	15	34,50	9730	Ingeomineria SAS - San Antonio Cert SA-2504048
	Material de Excavación	Mixtos	90	141,15	Registro de Inscripción CAR 001	SECAM JR EU Cert. SEC-01523JR-2025
	TOTAL		**1605,30**	**2250,24**		

PERIODO	TIPO DE RCD	CLASIFICACIÓN	CANTIDAD		PIN AMBIENTAL	GESTOR Y CERTIFICACIÓN
			M3	TON		
abr-25	Material de Excavación	Excavacion	225	288,61	8418	Maquinas Amarillas
	Material de Excavación	Excavacion	45	65,94	22149	Cemex
	Material de Excavación	Excavacion	525	735,00	11247000018	Manejo y Gestión Integral de Residuos Sólidos SAS ESP - MAGIR SAS
	Residuos Petreos	Mixtos	195	305,81	Registro de Inscripción CAR 001	SECAM JR EU
	Material Petreo	Asfalto	38	59,6	Registro de Inscripción CAR 052	Servicios Profesionales AIA
	TOTAL		**1028,00**	**1454,960**		

PERIODO	TIPO DE RCD	CLASIFICACIÓN	CANTIDAD		PIN AMBIENTAL	GESTOR Y CERTIFICACIÓN
			M3	TON		
may-25	Material de Excavación	Excavacion	199,2	278,88	11247000018	Manejo y Gestión Integral de Residuos Sólidos SAS ESP - MAGIR SAS
	TOTAL		**199,20**	**278,880**		

PERIODO	TIPO DE RCD	CLASIFICACIÓN	CANTIDAD		PIN AMBIENTAL	GESTOR Y CERTIFICACIÓN
			M3	TON		
jun-25	Residuos Petreos	Mixtos	30	47,05	Registro de Inscripción CAR 001	SECAM JR EU Cert. SEC-01564JR-2025
	Material Petreo	Asfalto	30	38,4	26495	Granulados Reciclados de Colombia - GRECO Cert. GREVD A004170-253-2025
	Material de Excavación	Excavacion	624	873,60	11247000018	Manejo y Gestión Integral de Residuos Sólidos SAS ESP - MAGIR SAS Cert. 067
	TOTAL		**684,00**	**959,05**		

PERIODO	TIPO DE RCD	CLASIFICACIÓN	CANTIDAD		PIN AMBIENTAL	GESTOR Y CERTIFICACIÓN
			M3	TON		
jul-25	Material Petreo	Asfalto	117,00	149,76	26495	Granulados Reciclados de Colombia - GRECO Cert PBT VD A004170-263-2025
		Hetereogeneo	30,00	38,40		
		Asfalto	219,00	361,09	11247000018	Manejo y Gestión Integral de Residuos Sólidos SAS ESP - MAGIR SAS Cert. 053
		Concreto	15,00	24,73		
	Material de Excavacion	Excavacion	1418,05	1985,27		Manejo y Gestión Integral de Residuos Sólidos SAS ESP - MAGIR SAS Cert. 082
	TOTAL		**1799,05**	**2559,25**		

PERIODO	TIPO DE RCD	CLASIFICACIÓN	CANTIDAD		PIN AMBIENTAL	GESTOR Y CERTIFICACIÓN
			M3	TON		
ago-25	Material Petreo	Asfalto	90,00	115,20	26495	Granulados Reciclados de Colombia - GRECO Cert. PBT VD A004170-277-2025
		Asfalto	135,00	222,60		Manejo y Gestión Integral de Residuos Sólidos SAS ESP - MAGIR SAS Cert. 055
		Concreto	30,00	49,46		
	Material de Excavacion	Excavacion	795,00	1113		Manejo y Gestión Integral de Residuos Sólidos SAS ESP - MAGIR SAS Cert. 084
	TOTAL		**1050,00**	**1500,26**		

PERIODO	TIPO DE RCD	CLASIFICACIÓN	CANTIDAD		PIN AMBIENTAL	GESTOR Y CERTIFICACIÓN
			M3	TON		
sep-25	Material Petreo	Asfalto	14,65	24,16	11247000018	Manejo y Gestión Integral de Residuos Sólidos SAS ESP - MAGIR SAS Cert. 073
		Concreto	125,33	206,65		
	Material de Excavacion	Excavacion	737,35	1032,29		
		Excavacion	310,00	449,3		Manejo y Gestión Integral de Residuos Sólidos SAS ESP - MAGIR SAS Cert. 036
	TOTAL		**1187,33**	**1712,40**		

PERIODO	TIPO DE RCD	CLASIFICACIÓN	CANTIDAD		PIN AMBIENTAL	GESTOR Y CERTIFICACIÓN
			M3	TON		
oct-25	Material Petreo	Asfalto	120,00	153,60	26495	Granulados Reciclados de Colombia - GRECO Cert - PBT VD A004170-284-2025
		Concreto	15,00	19,20		
	Material de Excavacion	Excavacion	762,00	1256,041	11247000018	
	TOTAL		**897,00**	**1428,84**		

Durante la ejecución del contrato se alcanzó un porcentaje de aprovechamiento del (55,1%), resultado que fue obtenido a partir de la gestión adecuada de los residuos generados en las actividades desarrolladas. Este valor superó la meta mínima establecida, la cual indicaba que, al finalizar el contrato, el porcentaje de aprovechamiento debía ser superior al cuarenta por ciento (40%).

El cumplimiento de este indicador evidenció la implementación efectiva de las medidas de separación en la fuente, aprovechamiento y entrega de residuos a gestores autorizados, conforme a lo establecido en la normativa ambiental vigente.

En consecuencia, se concluye que el contrato dio cumplimiento a la meta de aprovechamiento de residuos, garantizando una gestión ambiental adecuada y contribuyendo a la reducción de los residuos dispuestos en sitios de disposición final.

En el Anexo 01 se incluyó el anexo correspondiente al Decreto Distrital 507 de 2023, debidamente diligenciado y firmado de manera mensual, así como el consolidado acumulado total del contrato.

De igual forma, en dicho anexo se incorporaron las certificaciones emitidas de manera mensual por los gestores autorizados, las cuales soportan la gestión, el aprovechamiento y la disposición final de los Residuos de Construcción y Demolición – RCD generados durante la ejecución contractual.

Adicionalmente, se incluyó el Anexo X del Decreto Distrital 507 de 2023, correspondiente al cierre del PIN ambiental, teniendo en cuenta que el contrato finalizó y cumplió con los porcentajes mínimos de aprovechamiento y circularidad exigidos por la normatividad ambiental vigente, permitiendo así la finalización y liquidación ambiental del contrato sin observaciones.

CANTIDADAES GENERADAS EN EL CONTRATO 622 DEL 2024

TIPO DE RESIDUO	Ton. RCD aprovechadas en obra	Ton. RCD entregadas a Receptor	Ton. RCD entregadas en punto limpio	Ton. RCD entregadas en planta de aprovechamiento	Ton. RCD entregadas en sitio de disposición final	Total RCD
1. Residuos de Construcción y Demolición (RCD), susceptibles de aprovechamiento.	**0**	**0**	**0**	**1091,70**	**11052,18**	**12143,88**
1.1. Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos, y materiales pétreos producto de la excavación, entre otros.	0	0	0	0	10163,49	10163,49
1.2. Productos de cimentaciones y pilotajes: Arcillas, bentonitas y demás.	0	0	0	0	0	0
1.3. Pétreos: Hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfálticos, trozos de ladrillos, y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cemento y concretos hidráulicos, entre otros.	0	0	0	1091,70	888,69	1980,39
1.4. No pétreos: Vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, compuestos de madera, o cartón-yeso (draywall), entre otros.	0	0	0,00	0	0,00	0,00
2. Residuos de Construcción y Demolición (RCD), no susceptibles de aprovechamiento	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,2**	**0,2**
2.1. Los Contaminados con residuos peligrosos.	0	0	0	0	0,2	0,2
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.	0	0	0	0	0	0
2.3. Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.	0	0	0	0	0	0
TOTAL RCD (Toneladas)						**12144,08**

INDICADORES GLOBAL DEL CONTRATO 622 DEL 2024

No.	NOMBRE DEL INDICADOR	TONELADA (t)	INDICADOR / PORCENTAJE
1	Cantidad de RCD generado en obra (t) % (t total)	12.144,08	100,00%
2	Cantidad de RCD aprovechado en la obra (t) % (t aprovechadas/ t total)	0,00	0,00%
3	Cantidad de RCD entregado en punto limpio (t) % (t entregadas / t total)	0,00	0,00%
4	Cantidad de RCD entregado en planta de aprovechamiento de RCD (t) % (t entregadas / t total)	1.091,70	8,99%
5	Cantidad de RCD gestionado por receptor % (t entregadas / t total)	0,00	0,00%
6	Cantidad de RCD llevado a sitio de disposición final de RCD (t) % (t entregadas / t total)	11.052,38	91,01%
AVANCE META APROVECHAMIENTO $\frac{Cantidad\ de\ RCD\ entregado\ en\ planta\ de\ aprovechamiento\ de\ RCD}{Cantidad\ total\ de\ RCD\ del\ periodo\ menos\ material\ de\ excavación\ y\ sobrantes\ de\ adecueacion\ de\ terre}$		$\frac{1,091,70}{12144,08 - 10163,49}$	55,12%

6.2. Manejo de materiales de construcción

✓ **Seguimiento de materiales**

A continuación, se relacionan los proveedores de materiales de construcción utilizados, junto con sus respectivos permisos ambientales, y se presentan las cantidades de materiales ingresados durante la ejecución del contrato.

PROVEEDOR	PERMISO / PIN-PROV
Paviobras	Registro IDU 485
Granulados Reciclados de Colombia – GRECO	N/A
Constriturar LTDA.	RUCOM - 2024112629638
Asmincol SAS	RUCOM - 2023061524734
La Sacan	FLH-154
Cantera Villa Paula	RUCOM - 2023061524734
Polimix Cert.	Registro IDU No. 439
Concremack	Registro IDU No. 609
Sofan Ingenieria	Registro IDU No. 577
Doble A Ingeniería	Registro IDU No. 026
DEG Construcciones	RUCOM - 2023051924443

Tabla 5. Proveedores utilizados durante la ejecución del contrato

DENSIDADES POR GESTORES Y PROVEEDORES			
GESTORES			
NOMBRE	**MATERIAL**	**DENSIDAD kg/m3**	**DENSIDAD DEFINIDA POR**
Servicios Profesionales AIA	Asfalto	1568,42	Gestor
Cemex	Excavación	1465,33	Gestor
Maquinas Amarillas	Excavación	1282,70	Gestor
MAGIR	Excavación	1400,00	Gestor
SECAM JR EU	Mixtos	1568,31	Gestor
MAGIR	Excavación	1400,00	Gestor
Granulados Reciclados de Colombia - GRECO	Asfalto	1280,00	Gestor
Tratamientos Y Rellenos Ambientales De Colombia SAS ESP - TRACOL	Respel	1000	Gestor
PROVEEDORES			
NOMBRE	**MATERIAL**	**DENSIDAD kg/m3**	**DENSIDAD DEFINIDA POR**
Granulados Reciclados de Colombia - GRECO	Sub Base Granular Tipo B	1450,00	Proveedor
Constriturar LTDA	B200	1440,00	NSR-10
Constriturar LTDA	Triturado	1660,00	NSR-10
Asmincol SAS	Base Tipo A	1408,00	Proveedor
Asmincol SAS	Sub Base Granular Tipo B	1416,67	Proveedor
Asmincol SAS	Sub Base Granular Tipo PEA	1340,00	Proveedor
Cantera Villa Paula	B200	1440,00	NSR-10
Cantera Villa Paula	Triturado 3/4	1660,00	NSR-10
La Sacan	Triturado 3/4	1660,00	NSR-10
La Sacan	B200	1440,00	NSR-10
La Sacan	Arena	1440	NSR-10
Polimix	Concreto	2300,00	NSR-10
Concremack	Concreto	2300,00	NSR-10
Paviobras	Asfalto	1738-1740	Proveedor
Sofan Ingenieria	Asfalto	1659 - 1660	Proveedor
Doble A Ingeniería	MCCH-25	1659	Proveedor
Paviobras	MD-19	1670 – 1740	Proveedor
Paviobras	MCCH-25	1670 - 1740	Proveedor

Tabla 6. Densidades utilizadas durante la ejecución del contrato


TIPO DE MATERIAL	CLASIFICACIÓN	CANTIDAD		PIN AMBIENTAL	PROVEEDOR Y CERTIFICACIÓN	PERMISO MINERO
		M3	TON			
Material Pétreo	Sub Base Granular Tipo b	1588,83	2303,8	26495	Granulados Reciclados de Colombia - GRECO	N/A
	Triturado	99	155,1	17415	Constriturar LTDA	RUCOM - 2024112629638
	B200	258	371,52			
	Sub Base Granular Tipo b	590,6	809,28	22599	Asmincol SAS	RUCOM - 2023061524734
	Sub Base Tipo A	914,4	1412,25			
	Sub Base PEA	15	20,1			
	B200	330	777,6	Resolución 222 del 2010	La Sacan	FLH-154
	Triturado	105	167,7			
	Arena	30,0	43,20			
	B200	93	133,92	Resolución 1334 del 2002	Cantera Villa Paula	RUCOM - 2023061524734
	Triturado	20	33,2			
	Concreto	7	16,1	N/A	Polimix	Registro IDU No. 439
	Concreto	7	16,1	N/A	Concremack	Registro IDU No. 609
	Asfalto MD 19	392,805	677,42	N/A	Paviobras	Registro IDU No. 485
	Asfalto MD 19	102,6	170,32	N/A	Sofan Ingenieria	Registro IDU No. 577
	Asfalto MCCH-25	363,34	583,60	N/A	Paviobras	Registro IDU No. 485
	Asfalto MD-12	15,59	27,13	N/A	Paviobras	Registro IDU No. 485
	Asfalto MCCH-25	47,86	79,45	N/A	Doble A Ingeniería	Registro IDU No. 026
	Triturado	135,00	224,10	N/A	DEG Construcciones	RUCOM. 2023051924443
	B200	240,00	345,60	N/A	DEG Construcciones	RUCOM. 2023051924443
TOTAL		**5355,03**	**8367,49**			

Tabla 7. Materiales de Construcción adquiridos

Las cantidades generadas de materiales e indicadores reportados corresponden a la ejecución total del contrato.

PROVEEDOR	CANTIDAD (ton)	CIV INTERVENIDO
Granulados Reciclados de Colombia - GRECO	2303,8	6000897, 6001042, 6001045, 6001105, 6001648, 6001672, 6001008
Constriturar LTDA	526,62	6000897, 6000587, 6001045, 6001105
Asmincol SAS	2241,63	6000897, 6000587, 6000547, 6000751, 6000760, 6001827, 6000775
La Sacan	988,50	6000587, 6000547, 6000751, 6000760, 6001827
Cantera Villa Paula	167,12	6001042, 6001105
Polimix	16,1	6001042
Concremack	16,1	6001042
Paviobras	1288,15	6000897, 6001042, 6001045, 6001105, 6000751, 6000760, 6001827, 6000775, 6001648, 6007672, 6001008
Sofan Ingenieria	170,32	6000587, 6000547
Doble A Ingeniería	79,45	6001008
DEG Construcciones	569,70	6000751, 6000760
TOTAL	**8367,49**	

Tabla 8. Trazabilidad de materiales por CIV intervenido

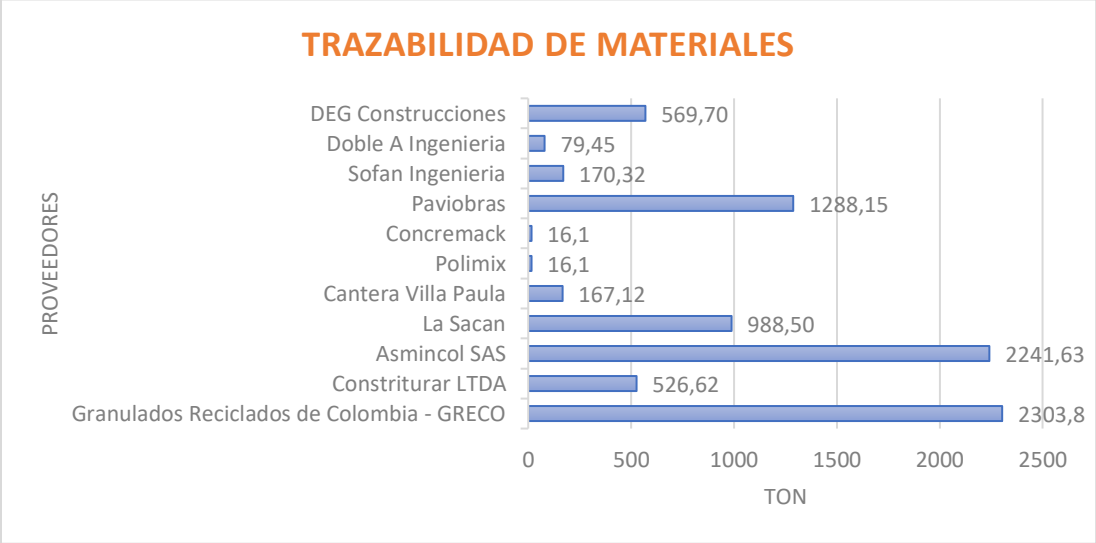

Grafica 1. Trazabilidad de materiales

- ✓ **Cumplimientos instalación GRC**

El artículo 10 del Decreto Distrital 265 de 2016 establece que, a partir del 1 de julio de 2016, toda obra de infraestructura de transporte que se ejecute en el Distrito Capital y que adelante procesos constructivos con mezcla asfáltica, deberá prever el uso de materiales provenientes del aprovechamiento de llantas usadas, en las proporciones técnicas exigidas por el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU. Dicho uso deberá aplicarse sobre la totalidad del metro cuadrado de la mezcla asfáltica empleada en la obra, en un porcentaje no inferior al veinticinco por ciento (25%) del volumen total de la mezcla asfáltica utilizada en vías vehiculares, incluyendo troncales de tráfico mixto, malla vial arterial no troncal, malla vial intermedia y malla vial local.

Durante la ejecución del contrato se realizó la instalación de mezcla asfáltica modificada con grano de caucho, conforme a las actividades ejecutadas en los CIV 6001045, 6000751, 6000760, 6001827, 6001648, 6001672, 6000775 y 6001105. El formato FOAC18 – Seguimiento a la Aplicación de Mezcla Asfáltica Modificada con GCR, en el cual se evidencian las cantidades totales suministradas, se encuentra incluido en el Anexo 3 del presente documento.

Adicionalmente, se aclara que el contrato finalizó dando cumplimiento a un cuarenta y dos por ciento (42%) del volumen total de la mezcla asfáltica utilizada, superando el porcentaje mínimo exigido por la normativa vigente. Así mismo, se indica que el factor de compactación aplicado fue de 0,8507 y que, de acuerdo con la ficha técnica del material, el porcentaje de grano de caucho contenido en la mezcla instalada en obra corresponde al quince por ciento (15%).


- ✓ **Recirculación**

Durante la ejecución del contrato se realizó la adquisición 4545,43ton de material granular proveniente de plantas de aprovechamiento, teniendo en cuenta las actividades en cada uno de los CIV.

En el Anexo 3 – Permisos Proveedores se encuentra la carpeta Documentos Trazabilidad Materiales donde se puede ver el FOAC53 por mes relacionando el control de materiales y así mismo se encuentran los vales soporte de dicho ingreso a obra.

TIPO DE MATERIAL	CLASIFICACIÓN	CANTIDAD		PIN AMBIENTAL	PROVEEDOR Y CERTIFICACIÓN	PERMISO MINERO	FRENTE DE OBRA AL QUE INGRESO EL MATERIAL
		M3	TON				
Material Pétreo	Sub Base Granular Tipo b	1588,8	2303,8	26495	Granulados Reciclados de Colombia - GRECO	N/A	Nuevo Muzu, San Vicente, El Carmen, Abraham Lincoln, Samore
	Sub Base Tipo A	1004,4	1412,25	22599	Asmincol SAS	RUCOM - 2023061524734	Nuevo Muzu, San Vicente, Abraham Lincoln, Samore, El Carmen
	Sub Base Tipo B	590,6	809,28		Asmincol SAS		
	Sub Base Tipo PEA	15,0	20,10				
TOTAL		**3198,80**	**4545,43**				

Tabla 9. Materiales de Construcción adquiridos en planta de aprovechamiento

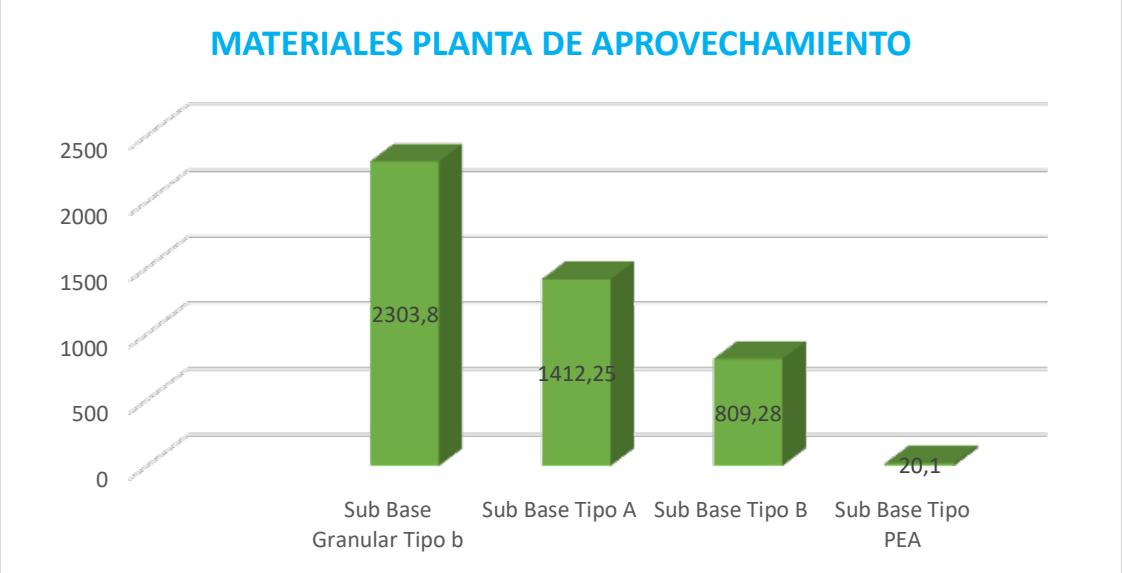

Grafica 2. Materiales adquiridos en Plantas de Aprovechamiento

INDICADORES GLOBAL ACUMULADO CONTRATO 622 DEL 2024

INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	DATOS DEL INDICADOR	RESULTADOS DEL INDICADOR
$\frac{Ton\ material\ valorizado\ proveniente\ de\ plata\ de\ aprovechamiento\ de\ rcd}{Ton\ material\ usado\ en\ obra\ total}$	Material valorizado	$\frac{4545{,}43}{8367{,}49} * 100$	54.32%

Tabla 10. Indicadores Manejo de Materiales de Construcción total Contrato 622 del 2024

A la fecha de finalización y corte del presente informe, el contrato alcanzó un porcentaje de circularidad del 54,32%, superando la meta mínima establecida, la cual correspondía a un valor superior al 23% al término de la ejecución contractual.

En consecuencia, el desempeño del proyecto en materia de economía circular y aprovechamiento de materiales se desarrolló de manera satisfactoria, evidenciando el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Decreto Distrital 507 de 2023 y permitiendo el cierre ambiental del contrato sin observaciones en este componente.

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO

A Continuación, se evidencia el registro fotográfico de la gestión ambiental realizada en obra durante la ejecución del contrato














5/04/25, 9:08 AM
Diagonal 61B Sur 60F-53
Bogotá




Parque Nuevo Muzo
Bogotá


17/06/25, 1:03 PM
Diagonal 52B Sur 27-22
Bogotá


18 jun 2025 4:23:46 p.m.
52-40 Carrera 5B
Tunjuelito
Bogotá
#Consorcio DC 2025


Diagonal 53 Sur 51C-32
Bogotá




11/08/25, 8:33 AM
Carrera 61B 82B-12
Bogotá




3/09/25, 2:41 PM
Calle 52 Sur 11B-10–11B-54
Bogotá




25 oct. 2025 12:01:41 p. m.
52B-6 Carrera 61B
Tunjuelito
Bogotá, D.C.
#Consorcio DC 2025


4 nov. 2025 2:18:03 p. m.
26-34 Diagonal 52 B Sur
Tunjuelito
Bogotá, D.C.
#Consorcio DC 2025


4 nov. 2025 1:32:45 p. m.
#25-40 Diagonal 52 B Sur
Tunjuelito
Bogotá, D.C.
#Consorcio DC 2025






Diagonal 52A Sur 60F-18
Bogotá








5 may 2025 3:01:32 p. m.


5 may 2025 11:27:57 a. m.


12/06/25, 8:29 AM
Diagonal 52B Sur 27-66
Bogotá




19 jun. 2025 8:10:27 a. m.
#Consorcio DC 2025


22/07/25, 7:32 AM
Diagonal 53 Sur 61B-22–61B-48
Bogotá


19/07/25, 8:24 AM
Carrera 61B 52B-12
Bogotá


22/07/25, 9:00 AM
Carrera 61B 52B-59
Bogotá


Diagonal 53 Sur 61B-22
Bogotá


21/08/25, 1:29 PM
Diagonal 53 Sur 61D-22
Bogotá


26/08/25, 8:48 AM
Carrera 26 48A-28
Bogotá


HITACHI
26/08/25, 11:53 AM
Carrera 26 48A-18
Bogotá









8. CONCLUSIONES

- ✓ Durante la ejecución del contrato se contó con el personal profesional requerido para la gestión ambiental, lo cual permitió garantizar el adecuado cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Programa de Manejo Ambiental de Residuos de Construcción y Demolición – PMARCD

- ✓ Se aplicaron de manera efectiva los procedimientos técnicos y ambientales definidos, asegurando la minimización de los impactos ambientales asociados a las actividades constructivas y al cargue, transporte y manejo de los Residuos de Construcción y Demolición – RCD

- ✓ En los diferentes frentes de obra se utilizaron volquetas que contaban con PIN ambiental vigente, así como maquinaria autorizada y aprobada por la interventoría, verificando el cumplimiento de los requisitos técnicos y ambientales exigidos para su vinculación al contrato.

- ✓ Durante el desarrollo de las actividades contractuales no se presentaron derrames de tipo ambiental, evidenciando un manejo adecuado de los materiales, insumos y residuos generados.

- ✓ Las jornadas de orden y aseo fueron ejecutadas de manera sistemática antes y después de cada jornada de trabajo, contribuyendo al control de impactos y al mantenimiento de condiciones ambientales adecuadas en los frentes de obra

- ✓ La planificación, los mecanismos de control y las actividades de seguimiento ambiental implementadas resultaron adecuadas y efectivas para prevenir, mitigar y controlar posibles impactos ambientales derivados de la ejecución del contrato.

- ✓ Como resultado de la gestión ambiental desarrollada, el contrato alcanzó valores globales del 54.32% en la meta de circularidad y del 55,1% en la meta de aprovechamiento de RCD, superando ampliamente las metas mínimas establecidas en el Decreto Distrital 507 de 2023, correspondientes al 23% de circularidad y 40% de aprovechamiento.

- ✓ En consecuencia, el PMARCD fue ejecutado de manera satisfactoria, permitiendo la finalización y liquidación ambiental del contrato en cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y de los compromisos adquiridos con la autoridad ambiental.

9. ANEXOS

1. TABLA 507 + CERTIFICACIONES DE RCD + FOAC 18
2. APROVECHAMIENTO IN SITU
3. MATERIALES
4. PERMISOS DE GESTORES
5. DOCUMENTOS DE TRAZABILIDAD VALES + FOAC 55 + EXCEL DE TRAZABILIDAD
6. DOCUMENTOS DE TRAZABILIDAD MATERIALES VALES + FOAC 53 + EXCEL DE TRAZABILIDAD

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS MANAS
NIT: 900.459.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel. 7023048/60/65

Res. 1480 de 2014 de la ANLA

Remision N: RM-164573
Fecha: 2025-03-19 09:55:53
Cajero: Luis
Placa: SXS806 PIN Volqueta: 0
CLIENTE: EFECTIVO
Recibo No. 0 N.V. 0
Obra: GENERAL
Viaje: DOBLE- EXCAVACION HUMEDA, CAPA VEGETAL, TIERRA NEGRA
Mts: 15.0
TOTAL: ..... $ 150.000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS MANAS
NIT: 900.459.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel. 7023048/60/65

Res. 1480 de 2014 de la ANLA

Remision N: RM-164594
Fecha: 2025-03-19 09:32:33
Cajero: Luis
Placa: SZX882 PIN Volqueta: 2700
CLIENTE: EFECTIVO
Recibo No. 0 N.V. 0
Obra: GENERAL
Viaje: DOBLE- EXCAVACION HUMEDA, CAPA VEGETAL, TIERRA NEGRA
Mts: 15.0
TOTAL: ..... $ 150.000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS MANAS
NIT: 900.459.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel. 7023048/60/65

Res. 1480 de 2014 de la ANLA

Remisión N: RM-164647
Fecha: 2025-03-19 10:35:43
Cajero: Luis
Placa: D88045 PIN Volqueta: 2071
CLIENTE: EFECTIVO
Recibo No. 0 N.V. 0
Obra: GENERAL
Viaje: DOBLE- EXCAVACION HUMEDA, CAPA VEGETAL, TIERRA NEGRA
Mts: 15.0
TOTAL: ..... $ 150.000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS MANAS
NIT: 900.459.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel. 7023048/60/65

Res. 1480 de 2014 de la ANLA

Remision N: RM-164600
Fecha: 2025-03-19 14:50:33
Cajero: Luis
Placa: SXS806 PIN Volqueta: 0
CLIENTE: EFECTIVO
Recibo No. 0 N.V. 0
Obra: GENERAL
Viaje: DOBLE- EXCAVACION HUMEDA, CAPA VEGETAL, TIERRA NEGRA
Mts: 15.0
TOTAL: ..... $ 150.000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS MANAS
NIT: 900.459.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel.
7023048/60/65

Res. 1480 de 2014 de la ANLA

Remisión N: RM-164855
Fecha: 2025-03-19 15:52:48
Cajero: Luis
Placa: DBB045 PIN Volqueta: 2071
CLIENTE: EFECTIVO
Recibo No. 0 N.V: 1
Obra: GENERAL
Viaje: DOBLE- EXCAVACIÓN HUMEDA, CAPA VEGETAL, TIERRA NEGRA
Mts: 15,0
TOTAL: ..... $ 150.000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS MANAS
NIT: 900.459.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel.
7023048/60/65

Res. 1480 de 2014 de la ANLA

Remisión N: RM-165012
Fecha: 2025-03-20 11:04:51
Cajero: Luis
Placa: DBB045 PIN Volqueta: 2071
CLIENTE: EFECTIVO
Recibo No. 0 N.V: 2
Obra: GENERAL
Viaje: DOBLE- EXCAVACIÓN HUMEDA, CAPA VEGETAL, TIERRA NEGRA
Mts: 15,0
TOTAL: ..... $ 150.000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS MANAS
NIT: 900.459.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel.
7023048/60/65

Res. 1480 de 2014 de la ANLA

Remisión N: RM-165036
Fecha: 2025-03-20 11:40:20
Cajero: Luis
Placa: SZX982 PIN Volqueta: 2700
CLIENTE: EFECTIVO
Recibo No. 0 N.V: 1
Obra: GENERAL
Viaje: DOBLE- EXCAVACIÓN HUMEDA, CAPA VEGETAL, TIERRA NEGRA
Mts: 15,0
TOTAL: ..... $ 150.000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS MANAS
NIT: 900.459.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel.
7023048/60/65

Res. 1480 de 2014 de la ANLA

Remisión N: RM-165156
Fecha: 2025-03-20 14:49:12
Cajero: Luis
Placa: DBB045 PIN Volqueta: 2071
CLIENTE: EFECTIVO
Recibo No. 0 N.V: 3
Obra: GENERAL
Viaje: DOBLE- EXCAVACIÓN HUMEDA, CAPA VEGETAL, TIERRA NEGRA
Mts: 15,0
TOTAL: ..... $ 150.000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS MANAS
NIT: 900.459.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel.
7023048/60/65

Res. 1480 de 2014 de la ANLA

Remisión N: RM-165221
Fecha: 2025-03-20 16:27:41
Cajero: Luis
Placa: SXS808 PIN Volqueta: 0
CLIENTE: EFECTIVO
Recibo No. 0 N.V: 2
Obra: GENERAL
Viaje: DOBLE- EXCAVACIÓN HUMEDA, CAPA VEGETAL, TIERRA NEGRA
Mts: 15,0
TOTAL: ..... $ 150.000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS MANAS
NIT: 900.459.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel.
7023048/60/65

Res. 1480 de 2014 de la ANLA

Remisión N: RM-165230
Fecha: 2025-03-20 16:35:57
Cajero: Luis
Placa: SRO465 PIN Volqueta: 0
CLIENTE: EFECTIVO
Recibo No. 0 N.V: 9
Obra: GENERAL
Viaje: DOBLE- EXCAVACION TIERRA, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 15,0
TOTAL: ..... $ 100.000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

Powered by CamScanner

SECAM J.R. S.A.S
NIT. 830.507.163-0

RECIBIDO

SECAM JR
NIT: 830.507.163-0
GESTOR RCDS REGISTRO CAR-00
RES.0472-2017 MIN AMBIENTE
DESARROLLO - CEL: 314 459838

Recibo Número: 1877

Placa: SXS806
Bruto: 31390
Tara: 10960
Neto: 20420
Precio: 0
Entrada: 18/03/2025 9:33:27 a. m.
Salida: 18/03/2025 9:38:20 a. m.
Empresa: INGECOP OBRA CIVILES
Producto: MIXTOS
Conductor: EDWIN
Origen: TUNJUELITO
Nota:

SECAM J.R. S.A.S
NIT. 830.507.163-0

RECIBIDO

SECAM JR
NIT: 830.507.163-0
GESTOR RCDS REGISTRO CAR-00
RES.0472-2017 MIN AMBIENTE
DESARROLLO - CEL: 314 459838

Recibo Número: 1881

Placa: TTO152
Bruto: 30540
Tara: 11330
Neto: 19210
Precio: 0
Entrada: 18/03/2025 11:14:34 a. m.
Salida: 18/03/2025 11:23:48 a. m.
Empresa: INGECOP OBRA CIVILES
Producto: MIXTOS
Conductor: ROMER AYALA
Origen: TUJUELO
Nota:

SECAM J.R. S.A.S
NIT. 830.507.163-0

RECIBIDO

SECAM JR
NIT: 830.507.163-0
GESTOR RCDS REGISTRO CAR-00
RES.0472-2017 MIN AMBIENTE
DESARROLLO - CEL: 314 459838

Recibo Número: 1882

Placa: SXS806
Bruto: 32420
Tara: 11450
Neto: 20970
Precio: 0
Entrada: 18/03/2025 11:42:56 a. m.
Salida: 18/03/2025 11:51:39 a. m.
Empresa: INGECOP OBRA CIVILES
Producto: MIXTOS
Conductor: EDWIN
Origen: TUNJUELITO
Nota:

SECAM J.R. S.A.S
NIT. 830.507.163-0

RECIBIDO

SECAM JR
NIT: 830.507.163-0
GESTOR RCDS REGISTRO CAR-00
RES.0472-2017 MIN AMBIENTE
DESARROLLO - CEL: 314 459838

Recibo Número: 1887

Placa: TTO152
Bruto: 32700
Tara: 11100
Neto: 21600
Precio: 0
Entrada: 18/03/2025 2:56:35 p. m.
Salida: 18/03/2025 3:15:40 p. m.
Empresa: INGECOP OBRA CIVILES
Producto: MIXTOS
Conductor: ROMER AYALA
Origen: TUJUELO
Nota:

SECAM J.R. S.A.S
NIT. 830.507.163-0

RECIBIDO

SECAM JR
NIT: 830.507.163-0
GESTOR RCDS REGISTRO CAR-00
RES.0472-2017 MIN AMBIENTE
DESARROLLO - CEL: 314 459838

Recibo Número: 1888

Placa: SXS806
Bruto: 32710
Tara: 11230
Neto: 21480
Precio: 0
Entrada: 18/03/2025 2:58:50 p. m.
Salida: 18/03/2025 4:19:34 p. m.
Empresa: INGECOP OBRA CIVILES
Producto: MIXTOS
Conductor: EDWIN
Origen: TUNJUELITO
Nota:

SECAM J.R. S.A.S

NIT. 830.507.163-0

RECIBIDO

SECAM JR

NIT: 830.507.163-0

GESTOR RCDS REGISTRO CAR-01

RES.0472-2017 MIN AMBIENTE

Recibo Número: 2004

Placa: SZA552

Bruto: 0

Tara: 0

Neto: 0

Precio: 0

15 m3

Entrada: 22/03/2025 10:50:35 a. m.

Salida: 22/03/2025 10:50:40 a. m.

Empresa: INGECOP OBRA CIVILES

Producto: MIXTOS

Conductor: ALEXANDER

Origen: TUNJUELO

Nota:

Jeisson Ropas.

Bascula Electronica Sistematizada

A.I.A SAS - ALTAR STONES SAS

GESTOR RCD'S REGISTRO CAR: 52

CEL 3102390140 - 3028494813

Entrada de Producto No. 6687

Fecha de Ingreso : 2025-03-10 2:47:09 PM
Fecha de Salida : 2025-03-10 2:57:34 PM

SWN418

Peso de Entrada : 36520 Kg
Peso de Salida : 11810 Kg
Peso Neto : 24710 Kg

Precio : $0
Proveedor : CONSORCIO TUNJUELITO
Nit :
Producto : RECEBO
Conductor : VARIOS
Cedula :
Origen : AIA
Destino :
Remision :
Precinto : 15
Pesado por : ALTAR STONES
Obs.: $ 75.000

Jeisson Ropas

Bascula Electronica Sistematizada

A.I.A SAS - ALTAR STONES SAS

GESTOR RCD'S REGISTRO CAR: 52

CEL 3102390140 - 3028494813

Entrada de Producto No. 6711

Fecha de Ingreso : 2025-03-11 9:30:50 AM
Fecha de Salida : 2025-03-11 9:40:16 AM

SWN418

Peso de Entrada : 31480 Kg
Peso de Salida : 11920 Kg
Peso Neto : 19560 Kg

Precio : $0
Proveedor : CONSORCIO TUNJUELO
Nit :
Producto : ASFALTO
Conductor : VARIOS
Cedula :
Origen : AIA
Destino :
Remision :
Precinto : 15
Pesado por : ALTAR STONES

Scanned with CamScanner

Jesson Lopez.
3102390140

Bascula Electronica Sistematizada
AIA SAS - ALTAR STONES SAS
GESTOR RCD'S REGISTRO CAR 52
CEL 3102390140 - 3028494813

Entrada de Producto No **6856**

Fecha de Ingreso : 2025-03-20 2:40:01 PM
Fecha de Salida : 2025-03-20 2:52:51 PM

SWN418

Peso de Entrada	35600	Kg
Peso de Salida	11990	Kg
Peso Neto	23610	Kg

Precio : $0
Proveedor : CONSORCIO TUNJUELITO
Nit :
Producto : RECEBO
Conductor : VARIOS
Cedula :
Origen : AIA
Destino :
Remision :
Precinto : 18
Pesado por : ALTAR STONES

Jesson Lopez.
3102390140

Bascula Electronica Sistematizada
AIA SAS - ALTAR STONES SAS
GESTOR RCD'S REGISTRO CAR 52
CEL 3102390140 - 3028494813

Entrada de Producto No **6852**

Fecha de Ingreso : 2025-03-20 10:39:18 AM
Fecha de Salida : 2025-03-20 10:56:00 AM

SWN418

Peso de Entrada	36770	Kg
Peso de Salida	12010	Kg
Peso Neto	24760	Kg

Precio : $0
Proveedor : CONSORCIO TUNJUELITO
Nit :
Producto : RECEBO
Conductor : VARIOS
Cedula :
Origen :
Destino :
Remision :
Precinto : 18,80
Pesado por : ALTAR STONES

Jesson Lopez.
3102390140

Bascula Electronica Sistematizada
AIA SAS - ALTAR STONES SAS
GESTOR RCD'S REGISTRO CAR 52
CEL 3102390140 - 3028494813

Entrada de Producto No **6853**

Fecha de Ingreso : 2025-03-21 8:54:32 AM
Fecha de Salida : 2025-03-21 9:20:11 AM

SWN418

Peso de Entrada	35610	Kg
Peso de Salida	11950	Kg
Peso Neto	23660	Kg

Precio : $0
Proveedor : CONSORCIO TUNJUELITO
Nit :
Producto : RECEBO
Conductor : VARIOS
Cedula :
Origen : AIA
Destino :
Remision :
Precinto : 18
Pesado por : ALTAR STONES

Scanned with CamScanner

Camilo Montoya

(10) 3051989958

Bascula Electronica Sistematizada

AIA SAS - ALTAR STONES SAS
GESTOR RCD'S REGISTRO CAR: 52
CEL: 3102390140 - 3028494813

Entrada de Producto No 6696

Fecha de Ingreso : 2025-03-10 3:52:25 PM
Fecha de Salida : 2025-03-10 4:05:07 PM

TFT570

Peso de Entrada	35030	Kg
Peso de Salida	11020	Kg
Peso Neto	24210	Kg

Precio : $0
Proveedor : CONSORCIO TUNJUELITO
Nit :
Producto : RECEBO
Conductor : WILLIAM BONILLA
Cedula :
Origen : AIA
Destino :
Remision :
Precinto : 15
Pesado por : ALTAR STONES
Obs.: CANCELA $75.000

Camilo Montoya

Bascula Electronica Sistematizada

AIA SAS - ALTAR STONES SAS
GESTOR RCD'S REGISTRO CAR: 52
CEL: 3102390140 - 3028494813

Entrada de Producto No 6698

Fecha de Ingreso : 2025-03-10 12:22:12 PM
Fecha de Salida : 2025-03-10 12:32:50 PM

TFT870

Peso de Entrada	33710	Kg
Peso de Salida	11620	Kg
Peso Neto	22090	Kg

Precio : $0
Proveedor : CONSORCIO TUNJUELITO
Nit :
Producto : RECEBO
Conductor : WILLIAM BONILLA
Cedula :
Origen : AIA
Destino :
Remision :
Precinto : 16,9
Pesado por : ALTAR STONES
Obs.: $92.500

3192981695
Jesson Rons.

Bascula Electronica Sistematizada

AIA SAS - ALTAR STONES SAS
GESTOR RCD'S REGISTRO CAR: 52
CEL: 3102390140 - 3028494813

Entrada de Producto No. 6676

Fecha de Ingreso : 2025-03-10 11:37:37 AM
Fecha de Salida : 2025-03-10 11:56:48 AM

SWN418

Peso de Entrada :	34590	Kg
Peso de Salida :	10560	Kg
Peso Neto :	24030	Kg

Precio : $0
Proveedor : CONSORCIO TUNJUELITO
Nit :
Producto : RECEBO
Conductor : VARIOS
Cedula :
Origen : AIA
Destino :
Remision :
Precinto : 18.50
Pesado por : ALTAR STONES
Obs.: $92.500

Scanned with CamScanner



MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS MANAS
NIT: 900.459.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel. 7023049/60/65

Res. 1480 de 2014 de la ANLA

Remisión N: RM-165735
Fecha: 2025-03-22 10:31:22
Cajera: Luis
Placa: SXS936 PIN Volqueta: 0
CLIENTE: EFECTIVO
Recibo No. 0 N.V. 3
Obra: GENERAL
Viaje: DOBLE- EXCAVACIÓN HUMEDA, CAPA VEGETAL, TIERRA NEGRA
M³: 15,0
TOTAL: ..... $ 150.000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

Powered by CamScanner

20

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS MANAS
NIT: 900.459.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel. 7023048/60/65

Res. 1480 de 2014 de la ANLA

Remisión N: RM-166310
Fecha: 2025-03-26 13:14:44
Cajero: Luis
Placa: SZX882 PIN Volqueta: 2700
CLIENTE: EFECTIVO
Recibo No. 0 N.V: 13
Obra: GENERAL
Viaje: DOBLE- EXCAVACIÓN TIERRA, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 15,0
TOTAL: ..... $ 100.000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

Powered by CamScanner

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS MANAS
NIT: 900.459.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel.
7023048/60/65

Res. 1480 de 2014 de la ANLA

Remision N: RM-165366
Fecha: 2025-03-21 10:32:56
Cajero: Luis
Placa: DBB045 PIN Volqueta: 2071
CLIENTE: EFECTIVO
Recibo No. 0 N.V: 4
Obra: GENERAL
Viaje: DOBLE- EXCAVACION HUMEDA, CAPA VEGETAL, TIERRA NEGRA
Mts: 15,0
TOTAL: ..... $ 150.000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS MANAS
NIT: 900.459.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel.
7023048/60/65

Res. 1480 de 2014 de la ANLA

Remision N: RM-165434
Fecha: 2025-03-21 12:39:30
Cajero: Luis
Placa: SX5806 PIN Volqueta: 0
CLIENTE: EFECTIVO
Recibo No. 0 N.V: 10
Obra: GENERAL
Viaje: DOBLE- EXCAVACION TIERRA, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 15,0
TOTAL: ..... $ 100.000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS MANAS
NIT: 900.459.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel.
7023048/60/65

Res. 1480 de 2014 de la ANLA

Remisión N: RM-165437
Fecha: 2025-03-21 12:42:46
Cajero: Luis
Placa: SZX082 PIN Volqueta: 2700
CLIENTE: EFECTIVO
Recibo No. 0 N.V: 12
Obra: GENERAL
Viaje: DOBLE- EXCAVACIÓN TIERRA, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 15,0
TOTAL: ..... $ 100.000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS MANAS
NIT: 900.459.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel.
7023048/60/65

Res. 1480 de 2014 de la ANLA

Remisión N: RM-165537
Fecha: 2025-03-21 15:13:47
Cajero: Luis
Placa: DBB045 PIN Volqueta: 2071
CLIENTE: EFECTIVO
Recibo No. 0 N.V: 5
Obra: GENERAL
Viaje: DOBLE- EXCAVACIÓN HUMEDA, CAPA VEGETAL, TIERRA NEGRA
Mts: 15,0
TOTAL: ..... $ 150.000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

Powered by CamScanner

INGEOMINERIA

SAN ANTONIO

SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICIÓN

Licencias y registros: RESOLUCIÓN DMB DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO RDCYDN 0130
REGISTRO PRODUCTOR (RCD-P) 4964-2022

130

Comprobante de Ingreso

62420

vale por 1 viaje

Fecha:	22/03/2025
Hora	9:15
Placa Vehiculo	DBB045
PIN	2071
Empresa Generadora	DVR INGECO S.A.S
Origen Material	SAN VICENTE
vale Externo	-
Tipo Material	EXCAVACION
Tipo Vehiculo!	DOBLE
Factura POS	500

FPOS 500

INGEOMINERIA
NIT. 901.000.046-7
San Antonio
CAJA
Resolución 1110 del 12 de Septiembre de 2017 de ANLA

INGEOMINERIA
NIT. 901.000.046-7

INGEOMINERIA
NIT. 901.000.046-7
San Antonio
PORTERIA

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS MANAS
NIT: 900.459.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel. 7023048/60/65

Res. 1480 de 2014 de la ANLA

Remisión N: RM-165869
Fecha: 2025-03-25 10:30:04
Cajero: Luis
Placa: DBB045 PIN Volqueta: 2071
CLIENTE: EFECTIVO
Recibo No. 0 N.V: 6
Obra: GENERAL
Viaje: DOBLE- EXCAVACIÓN HUMEDA, CAPA VEGETAL, TIERRA NEGRA
Mts: 15,0
TOTAL: ..... $ 170.000

Powered by CamScanner

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 11 03 25

REMISIÓN: EF 14651

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE	CONSORCIO DC 2025	
OBRA	NUEVO MURO.	
DIRECCION	DIAG 51B CRA 58	
MATERIAL	EXCAVACIÓN	
PLACA VEHICULO	SWN 418	18:00. M3
CONDUCTOR	YEISON ROJAS	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:	

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 11 3 25

REMISIÓN: EF 14652

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE	CONSORCIO D.C. 2025	
OBRA	DIAG 51B CRA 58.	
DIRECCION	NUEVO MURO	
MATERIAL	EXCAVACIÓN	
PLACA VEHICULO	SRM. 395	15~ M3
CONDUCTOR		
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:	

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 11 3 25

REMISIÓN: EF 14653

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE	CONSORCIO NDC 2025.	
OBRA	NUEVO MURO	
DIRECCION	DIAG. 51 B CRA 58	
MATERIAL	EXCAVACIÓN.	
PLACA VEHICULO	SWN 418	15 M3. M3
CONDUCTOR	YEISON ROJAS	
DESPACHADO POR:	RECÍBIDO POR:	

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 11 3 25

REMISIÓN: EF 14654

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE	CONSORCIO DC 2025	
OBRA	NUEVO MURO	
DIRECCION	DIG. 51B CRA 58	
MATERIAL	EXCAVACION	
PLACA VEHICULO	SRM 395	15 M3
CONDUCTOR	JUAN DAVID.	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:	

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 12 3 25

REMISIÓN: EF 14655

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE	CONSORCIO DC. 2025	
OBRA	NUEVO MURO	
DIRECCION	DIAG 51B CRA 58.	
MATERIAL	EXCAVACION	
PLACA VEHICULO	SWN 418	15 M3 M3
CONDUCTOR	YEISON ROJAS	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:	

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 12 3 25

REMISIÓN: EF 14656

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE	CONSORCIO DC. 2025	
OBRA	NUEVO MURO	
DIRECCION	DIAG 51B CRA 58	
MATERIAL	EXCAVACION	
PLACA VEHICULO	SRM 395.	15 M3
CONDUCTOR	JUAN DAVID	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:	

Powered by CamScanner

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 11/03/25
ORDEN CLIENTE No.:
REMISIÓN: EF 14657

CLIENTE	Consorcio DC 2025	
OBRA	Nuevo Muzu	
DIRECCION	Dig 51 B Cra 58	
MATERIAL	Excavación	
PLACA VEHICULO	SRM 395	15 m7 M3
CONDUCTOR	Juan David	
DESPACHADO POR:		RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 11/03/25
ORDEN CLIENTE No.:
REMISIÓN: EF 14658

CLIENTE	Consorcio DC 2025	
OBRA	Nuevo Muzú	
DIRECCION	Dig 51 B Cra 58	
MATERIAL	Excavación	
PLACA VEHICULO	SRM 395	M3
CONDUCTOR	Juan David	
DESPACHADO POR:		RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 12/03/25
ORDEN CLIENTE No.:
REMISIÓN: EF 14659

CLIENTE	Consorcio DC 2025	
OBRA	Nuevo Muzú	
DIRECCION	Dig 51 B Cra 58	
MATERIAL	Excavación	
PLACA VEHICULO	SWN 418	15m3 M3
CONDUCTOR	Jaisson Rojas	
DESPACHADO POR:		RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 12/03/25
ORDEN CLIENTE No.:
REMISIÓN: EF 14660

CLIENTE	Consorcio DC 2025	
OBRA	Nuevo Muzú	
DIRECCION	Dig 51 B Cra 58	
MATERIAL	Excavación	
PLACA VEHICULO	TFT 870	15 m3 M3
CONDUCTOR	Camilo Montoya	
DESPACHADO POR:		RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 12/03/25
ORDEN CLIENTE No.:
REMISIÓN: EF 14661

CLIENTE	Consorcio DC 2025	
OBRA	Nuevo Muzu	
DIRECCION	Dig 51 B Cra 58	
MATERIAL	Excavación	
PLACA VEHICULO	SRM 395	15 m3 M3
CONDUCTOR	Juan David	
DESPACHADO POR:		RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 13/03/25
ORDEN CLIENTE No.:
REMISIÓN: EF 14662

CLIENTE	Consorcio DC 2025	
OBRA	Nuevo Muzú	
DIRECCION	Dig 51 B Cra 58	
MATERIAL	Excavación	
PLACA VEHICULO	TFT 870	15 m3 M3
CONDUCTOR	Camilo Montoya	
DESPACHADO POR:		RECIBIDO POR:

Powered by CamScanner

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 13/03/25

ORDEN CLIENTE No.:

REMISIÓN: EF 14663

CLIENTE	Consorcio DC 2025	
OBRA	Nuevo Muzú	
DIRECCION	Dg 51 B Cra 58	
MATERIAL	Excavación	
PLACA VEHICULO	SWN 418	15 m3 M3
CONDUCTOR	Camilo Montoya	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:	

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 13/03/25

ORDEN CLIENTE No.:

REMISIÓN: EF 14664

CLIENTE	Consorcio DC 2025	
OBRA	Nuevo Muzú	
DIRECCION	Dg 51 B Cra 58	
MATERIAL	Excavación	
PLACA VEHICULO	SWN 418	15 m3 M3
CONDUCTOR	Jayson Rojas	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:	

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 14/03/25

ORDEN CLIENTE No.:

REMISIÓN: EF 14665

CLIENTE	Consorcio DC 2025	
OBRA	Nuevo Muzú	
DIRECCION	Dg 51 B Cra 58	
MATERIAL	Excavación	
PLACA VEHICULO	TFT 870	15 m3 M3
CONDUCTOR	Camilo Montoya	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:	

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 14/03/25

ORDEN CLIENTE No.:

REMISIÓN: EF 14666

CLIENTE	Consorcio DC 2025	
OBRA	Nuevo Muzu	
DIRECCION	Dg 51 B Cra 58	
MATERIAL	Excavación	
PLACA VEHICULO	SWN 418	15 m3 M3
CONDUCTOR	Jayson Rojas	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:	

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 14/03/25

ORDEN CLIENTE No.:

REMISIÓN: EF 14667

CLIENTE	Consorcio DC 2025	
OBRA	Nuevo Muzu	
DIRECCION	Dg 51 B Cra 58	
MATERIAL	Excavación	
PLACA VEHICULO	SWN 418	15 m3 M3
CONDUCTOR	Jayson Rojas	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:	

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 14/03/25

ORDEN CLIENTE No.:

REMISIÓN: EF 14668

CLIENTE	Consorcio DC 2025	
OBRA	Nuevo Muzú	
DIRECCION	Dg 51 B Cra 58	
MATERIAL	Excavación	
PLACA VEHICULO	SWN 418	15 m3 M3
CONDUCTOR	Jayson Rojas	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:	

Powered by CamScanner

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 17/03/25
ORDEN CLIENTE No.:
REMISIÓN: EF 14669

CLIENTE	Consorcio DC 2025	
OBRA	Nuevo Muzú	
DIRECCION	Dg 51 B cra 58	
MATERIAL	Excavación	
PLACA VEHICULO	SWN 418	15 m3 M3
CONDUCTOR	Jaisson Rojas	
DESPACHADO POR:		RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 18/03/25
ORDEN CLIENTE No.:
REMISIÓN: EF 14670

CLIENTE	Consorcio DC 2025	
OBRA	Nuevo Muzú	
DIRECCION	Dg 51 B cra 58	
MATERIAL	Excavación	
PLACA VEHICULO	SWN 418	15 m3 M3
CONDUCTOR	Jaisson Rojas	
DESPACHADO POR:		RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 19/03/25
ORDEN CLIENTE No.:
REMISIÓN: EF 14671

CLIENTE	Consorcio DC 2025	
OBRA	Nuevo Muzú	
DIRECCION	Dg 51 B cra 58	
MATERIAL	Excavación	
PLACA VEHICULO	SWN 418	15 m3 M3
CONDUCTOR	Jaisson Rojas.	
DESPACHADO POR:		RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 20/03/25
ORDEN CLIENTE No.:
REMISIÓN: EF 14672

CLIENTE	Consorcio DC 2025	
OBRA	Nuevo Muzú	
DIRECCION	Dg 51 B cra 58	
MATERIAL	Excavación	
PLACA VEHICULO	SWN 418	15 m3 M3
CONDUCTOR	Jaisson Rojas	
DESPACHADO POR:		RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 21/03/25
ORDEN CLIENTE No.:
REMISIÓN: EF 14673

CLIENTE	Consorcio DC 2025	
OBRA	Nuevo Muzú	
DIRECCION	Dg 51 B cra 58	
MATERIAL	Excavación	
PLACA VEHICULO	SWN 418	15 m3 M3
CONDUCTOR	Jaisson Rojas.	
DESPACHADO POR:		RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 26/03/25
ORDEN CLIENTE No.:
REMISIÓN: EF 14674

CLIENTE	Consorcio DC 2025	
OBRA	Nuevo Muzú	
DIRECCION	Dg 51 B cra 58	
MATERIAL	Excavación	
PLACA VEHICULO	SWN 418	15 m3 M3
CONDUCTOR	Jaisson Rojas.	
DESPACHADO POR:		RECIBIDO POR:

Powered by CamScanner

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alticó. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 25/03/25

REMISIÓN: EF 14675

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE	Consorcio DC 2025	
OBRA	Nuevo Muzú	
DIRECCION	CIV 6000587	
MATERIAL	Excavación	
PLACA VEHICULO	SWN 418	15 m3 M3
CONDUCTOR	Jaison Rojas.	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:	

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alticó. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 25/03/25

REMISIÓN: EF 14676

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE	Consorcio DC 2025	
OBRA	Nuevo Muzú	
DIRECCION	CIV 6000587	
MATERIAL	Excavación	
PLACA VEHICULO	TFT 870	15 m3 M3
CONDUCTOR	Camilo Montoya	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:	

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alticó. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 25/03/25

REMISIÓN: EF 14677

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE	Consorcio DC 2025	
OBRA	Nuevo Muzú	
DIRECCION	CIV 6000587	
MATERIAL	Excavación	
PLACA VEHICULO	SWN 418	15 m3 M3
CONDUCTOR	Jaison Rojas	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:	

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alticó. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 25/03/25

REMISIÓN: EF 14678

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE	Consorcio DC 2025	
OBRA	Nuevo Muzú	
DIRECCION	CIV 6000587	
MATERIAL	Excavación	
PLACA VEHICULO	SWN 418	15 m3 M3
CONDUCTOR	Jaison Rojas	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:	

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alticó. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 25/03/25

REMISIÓN: EF 14679

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE	Consorcio DC 2025	
OBRA	Nuevo Muzú	
DIRECCION	CIV 6000587	
MATERIAL	Excavación	
PLACA VEHICULO	SRM 395	15 m3 M3
CONDUCTOR	Juan David	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:	

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alticó. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 26/03/25

REMISIÓN: EF 14680

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE	Consorcio DC 2025	
OBRA	Nuevo Muzú	
DIRECCION	CIV 6000587	
MATERIAL	Excavación	
PLACA VEHICULO	SWN 418	15 m3 M3
CONDUCTOR	Jaison Rojas	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:	

Powered by CamScanner

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alticó. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 26 03 25

REMISIÓN: EF 14681

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE	Consorcio DC 2025
OBRA	Nuevo Muzú
DIRECCION	CLV 6000587
MATERIAL	Excavación
PLACA VEHICULO	SWN 418 — 15 M3
CONDUCTOR	Jaisson Rojas
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alticó. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 26 03 25

REMISIÓN: EF 14682

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE	Consorcio DC 2025
OBRA	Nuevo Muzú
DIRECCION	CLV 6000587
MATERIAL	Excavación
PLACA VEHICULO	TFT 970 — 15 M3
CONDUCTOR	Camilo Montoya
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alticó. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 26 03 25

REMISIÓN: EF 14683

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE	Consorcio DC 2025
OBRA	Nuevo Muzú
DIRECCION	CLV 6000587
MATERIAL	Excavación
PLACA VEHICULO	SRM 395 — 15 M3
CONDUCTOR	Juan David
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alticó. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 26 03 25

REMISIÓN: EF 14684

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE	Consorcio DC 2025
OBRA	Nuevo Muzú
DIRECCION	CLV 6000587
MATERIAL	Excavación
PLACA VEHICULO	TFT 970 — 15 M3
CONDUCTOR	Camilo Montoya
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alticó. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 27 03 25

REMISIÓN: EF 14685

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE	Consorcio DC 2025
OBRA	Nuevo Muzú
DIRECCION	CLV 6000587
MATERIAL	Excavación
PLACA VEHICULO	SWN 418 — 15 M3
CONDUCTOR	Jaisson Rojas
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alticó. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 27 03 25

REMISIÓN: EF 14686

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE	Consorcio DC 2025
OBRA	Nuevo Muzú
DIRECCION	CLV 6000587
MATERIAL	Excavación
PLACA VEHICULO	SWN 418 — 15 M3
CONDUCTOR	Jaisson Rojas
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:

Powered by CamScanner

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alticó. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 28/03/25
ORDEN CLIENTE No.:
REMISIÓN: EF 14687

CLIENTE	Consorcio DC 2025
OBRA	Nuevo Muzú
DIRECCION	CIV 6000587
MATERIAL	Excavación
PLACA VEHICULO	TFT 970 — 15 m3 M3
CONDUCTOR	Camilo Montoya
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alticó. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 28/03/25
ORDEN CLIENTE No.:
REMISIÓN: EF 14688

CLIENTE	Consorcio DC 2025
OBRA	Nuevo Muzú
DIRECCION	CIV 6000587
MATERIAL	Excavación
PLACA VEHICULO	SRM 395 — 15 m3 M3
CONDUCTOR	Juan David
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alticó. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 29/03/25
ORDEN CLIENTE No.:
REMISIÓN: EF 14689

CLIENTE	Consorcio DC 2025
OBRA	Nuevo Muzú
DIRECCION	CIV 6000587
MATERIAL	Excavación
PLACA VEHICULO	SWN 418 — 15 m3 M3
CONDUCTOR	Jaisson Rojas
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alticó. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 29/03/25
ORDEN CLIENTE No.:
REMISIÓN: EF 14690

CLIENTE	Consorcio DC 2025
OBRA	Nuevo Muzú
DIRECCION	CIV 6000587
MATERIAL	Excavación
PLACA VEHICULO	SWN 418 — 15 m3 M3
CONDUCTOR	Jaisson Rojas
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alticó. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 29/03/25
ORDEN CLIENTE No.:
REMISIÓN: EF 14691

CLIENTE	Consorcio DC 2025
OBRA	Nuevo Muzú
DIRECCION	CIV 6000587
MATERIAL	Excavación
PLACA VEHICULO	TFT 970 — 15 m3 M3
CONDUCTOR	Camilo Montoya
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alticó. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 29/03/25
ORDEN CLIENTE No.:
REMISIÓN: EF 14692

CLIENTE	Consorcio DC 2025
OBRA	Nuevo Muzú
DIRECCION	CIV 6000587
MATERIAL	Excavación
PLACA VEHICULO	SRM 395 — 15 m3 M3
CONDUCTOR	Juan David
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:

Powered by CamScanner

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alticó. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 30/03/25

REMISIÓN: EF 14693

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE	Consorcio DC 2025	
OBRA	Nuevo Muzú	
DIRECCION	CLV6000597	
MATERIAL	Excavación	
PLACA VEHICULO	SWN 418	15 m3 M3
CONDUCTOR	Jaison Rojas	
DESPACHADO POR:		RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alticó. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 30/03/25

REMISIÓN: EF 14694

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE	Consorcio DC 2025	
OBRA	Nuevo Muzú	
DIRECCION	CLV6000597	
MATERIAL	Excavación	
PLACA VEHICULO	SWN 418	15 m3 M3
CONDUCTOR	Jaison Rojas	
DESPACHADO POR:		RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alticó. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 30/03/25

REMISIÓN: EF 14695

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE	Consorcio DC 2025	
OBRA	Nuevo Muzú	
DIRECCION	CLV6000597	
MATERIAL	Excavación	
PLACA VEHICULO	TFT 370	15 m3 M3
CONDUCTOR	Camilo Montoya	
DESPACHADO POR:		RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alticó. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 30/03/25

REMISIÓN: EF 14696

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE	Consorcio DC 2025	
OBRA	Nuevo Muzú	
DIRECCION	CLV6000597	
MATERIAL	Excavación	
PLACA VEHICULO	SRM 395	15 m3 M3
CONDUCTOR	Juan David	
DESPACHADO POR:		RECIBIDO POR:

Powered by CamScanner

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alteo. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

REMISIÓN **EF 14720**

FECHA: 24 03 25

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE: Consorcio DC 2025
OBRA: San Vicente Ferrer CIV 6000897
DIRECCION: Kr 32 - C11 52 6 sur y C11 52 F sur
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: DBB 045 — 15 m³ M3
CONDUCTOR: Luis Sanchez
DESPACHADO POR:
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alteo. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

REMISIÓN **EF 14721**

FECHA: 25 03 25

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE: Consorcio DC 2025
OBRA: San Vicente Ferrer - CIV 6000897
DIRECCION: Kr 32 - C11 52 6 sur y C11 52 F sur
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: SZX 882 — 15 mt³ M3
CONDUCTOR: Jaime Urrego
DESPACHADO POR:
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alteo. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

REMISIÓN **EF 14722**

FECHA: 25 03 25

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE: Consorcio OC 2025
OBRA: San Vicente Ferrer - CIV 6000897
DIRECCION: Kr 32 - C11 52 6 sur - C11 52 F sur
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: SXS 806 — 15 m³ M3
CONDUCTOR: Edwin Murillo
DESPACHADO POR:
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alteo. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

REMISIÓN **EF 14723**

FECHA: 26 03 25

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE: Consorcio DC 2025
OBRA: San Vicente Ferrer - CIV 6000897
DIRECCION: Kr 32 - C11 52 6 sur y C11 52 F sur
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: SRO 465 — 15 m³ M3
CONDUCTOR: Victor Moreno
DESPACHADO POR:
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alteo. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

REMISIÓN **EF 14724**

FECHA: 27 03 25

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE: Consorcio DC 2025
OBRA: San Vicente Ferrer - CIV 6000897
DIRECCION: Kr 32 - C11 52 6 sur y C11 52 F sur
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: DBB 045 — 15 m³ M3
CONDUCTOR: Luis Sanchez
DESPACHADO POR:
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alteo. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

REMISIÓN **EF 14725**

FECHA: 28 03 25

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE: Consorcio DC 2025
OBRA: San Vicente Ferrer - CIV 6000897
DIRECCION: Kr 32 - C11 52 6 sur y C11 52 F sur
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: DBB 045 — 15 m3 M3
CONDUCTOR: Luis Sanchez
DESPACHADO POR:
RECIBIDO POR:

Powered by CamScanner

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alisco. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 18 03 25

REMISIÓN: EF 14697

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE: Consorcio DC 2025
OBRA: San Vicente Ferrer CIV 6001042
DIRECCION: Kr 29 - C11 53 A sur y C11 53 B sur
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: 045 - DBB — 15 m3 M3
CONDUCTOR: Luis Sanchez
DESPACHADO POR:
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alisco. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 18 03 25

REMISIÓN: EF 14698

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE: Consorcio DC 2025
OBRA: San Vicente Ferrer CIV6001042
DIRECCION: Kr 29 - C1153 A sur y C1153 B sur
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: DBB 045 — 15m3 M3
CONDUCTOR: Luis Sanchez
DESPACHADO POR:
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alisco. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 18 03 25

REMISIÓN: EF 14699

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE: Consorcio DC 2025
OBRA: San Vicente Ferrer CIV6001042
DIRECCION: Kr 29 - C11 53 A sur - C1153 B sur
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: DBB 045 — 15m3 M3
CONDUCTOR: Luis Sanchez
DESPACHADO POR:
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alisco. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 19 03 25

REMISIÓN: EF 14700

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE: Consorcio DC 2025
OBRA: San Vicente Ferrer CIV 6001042
DIRECCION: Kr 29 - C1153 A sur - C1153 B sur
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: SZX 882 — 15 m3 M3
CONDUCTOR: Jaime Urrego
DESPACHADO POR:
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alisco. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 19 03 25

REMISIÓN: EF 14702

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE: Consorcio DC 2025
OBRA: San Vicente Ferrer CIV 6001042
DIRECCION: Kr 29 - C1153 A sur - C1153 B sur
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: SZX 882 — 15m3 M3
CONDUCTOR: Jaime Urrego
DESPACHADO POR:
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alisco. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 20 03 25

REMISIÓN: EF 14703

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE: Consorcio DC 2025
OBRA: San Vicente Ferrer CIV 6001042
DIRECCION: Kr 29 - C1153 A sur - C11 53 B sur
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: SXS 806 — 15 m3 M3
CONDUCTOR: Edwin Murillo
DESPACHADO POR:
RECIBIDO POR:

Powered by CamScanner

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 20 03 25

REMISIÓN: EF 14704

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE: Consorcio DC 2025
OBRA: San Vicente Ferrer CIV6001042
DIRECCION: Kr 29 - C11 53 A sur - C11 53 B sur
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: SXS 806 — 15 m³ M3
CONDUCTOR: Edwin Murillo
DESPACHADO POR:
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 21 03 25

REMISIÓN: EF 14705

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE: Consorcio DC 2025
OBRA: San Vicente Ferrer
DIRECCION: Kr 29 - C11 53 A sur y C11 53 B sur
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: SRO 465 Victor — 15m³ M3
CONDUCTOR: Victor Moreno
DESPACHADO POR:
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 21 03 25

REMISIÓN: EF 14706

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE: Consorcio DC 2025
OBRA: San Vicente Ferrer - 6001042
DIRECCION: Kr 29 - C11 53 A sur y C11 53 B sur
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: SRO 465 — 15 m³ M3
CONDUCTOR: Victor Moreno
DESPACHADO POR:
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 22 03 25

REMISIÓN: EF 14707

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE: Consorcio DC 2025
OBRA: San Vicente Ferrer - CIV6001042
DIRECCION: Kr 29 - C11 53 A sur y C11 53 B sur
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: DBB 045 — 15m³ M3
CONDUCTOR: Luis Sanchez
DESPACHADO POR:
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 22 03 25

REMISIÓN: EF 14708

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE: Consorcio DC 2025
OBRA: San Vicente Ferrer - CIV 6001042
DIRECCION: Kr 29 - C11 53 A sur y C11 53 B sur
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: DBB 045 — 15m³ M3
CONDUCTOR: Luis Sanchez
DESPACHADO POR:
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 24 03 25

REMISIÓN: EF 14709

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE: Consorcio DC 2025
OBRA: San Vicente Ferrer - CIV 6001042
DIRECCION: Kr 29 - C11 53 A sur - C11 53 B sur
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: SZX 882 — 15m³ M3
CONDUCTOR: Jaime Urrego
DESPACHADO POR:
RECIBIDO POR:

Powered by CamScanner

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 24 03 25

REMISIÓN: EF 14710

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE: Consorcio DC 2025
OBRA: San Vicente Ferrer - CIV 6001042
DIRECCION: Kr 29 - C11 53 A sur y C1153 B sur
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: SZX 882 — 15 m³ M3
CONDUCTOR: Jaime Urrego
DESPACHADO POR:
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 25 03 25

REMISIÓN: EF 14711

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE: Consorcio DC 2025
OBRA: San Vicente Ferrer - CIV 6001042
DIRECCION: Kr 29 - C11 53 A sur y C11 53 B sur
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: SXS 806 — 15 m³ M3
CONDUCTOR: Edwin Murillo
DESPACHADO POR:
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 25 03 25

REMISIÓN: EF 14712

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE: Consorcio DC 2025
OBRA: San Vicente Ferrer - CIV 6001042
DIRECCION: Kr 29 - C1153A sur y C1153 B sur
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: SXS 806 — 15 m³ M3
CONDUCTOR: Edwin Murillo
DESPACHADO POR:
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 26 03 25

REMISIÓN: EF 14713

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE: Consorcio DC 2025
OBRA: San Vicente Ferrer - CIV 6001042
DIRECCION: Kr 29 - C1153A sur y C1153B sur
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: SRO465 — 15 m³ M3
CONDUCTOR: Victor Moreno
DESPACHADO POR:
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 26 03 25

REMISIÓN: EF 14714

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE: Consorcio DC 2025
OBRA: San Vicente Ferrer - CIV 6001042
DIRECCION: Kr 29 - C1153A sur y C1153B sur
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: SRO 465 — 15m³ M3
CONDUCTOR: Victor Moreno
DESPACHADO POR:
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 27 03 25

REMISIÓN: EF 14715

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE: Consorcio DC 2025
OBRA: San Vicente Ferrer - CIV 6001042
DIRECCION: Kr 29 - C1153A sur - C1153 B sur
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: DBB 045 — 15m³ M3
CONDUCTOR: Luis Sanchez
DESPACHADO POR:
RECIBIDO POR:

Powered by CamScanner

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 27 03 25

ORDEN CLIENTE No.:

REMISIÓN: EF 14716

CLIENTE: Consorcio DC 2025
OBRA: San Vicente Ferrer - CIV 6001042
DIRECCION: Kr 29 - Cll 53 A sur y Cll 53 B sur
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: DBB 045 — 15 m³ M3
CONDUCTOR: Luis Sanchez
DESPACHADO POR:
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 28 03 25

ORDEN CLIENTE No.:

REMISIÓN: EF 14717

CLIENTE: Consorcio DC 2025
OBRA: San Vicente Ferrer - CIV 6001042
DIRECCION: Kr 29 - Cll 53 A sur y Cll 53 B sur
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: SZX 882 — 15 m³ M3
CONDUCTOR: Jaime Urrego
DESPACHADO POR:
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 28 03 25

ORDEN CLIENTE No.:

REMISIÓN: EF 14718

CLIENTE: Consorcio DC 2025
OBRA: San Vicente Ferrer - CIV 6001042
DIRECCION: Kr 29 - Cll 53 A sur y Calle 53 B sur
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: SXS 806 — 15 m³ M3
CONDUCTOR: Edwin Murillo
DESPACHADO POR:
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 29 03 25

ORDEN CLIENTE No.:

REMISIÓN: EF 14719

CLIENTE: Consorcio DC 2025
OBRA: San Vicente Ferrer - CIV 6001042
DIRECCION: Kr 29 - Cll 53 A sur - Cll 53 B sur
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: SXS 806 — 15 m³ M3
CONDUCTOR: Edwin Murillo
DESPACHADO POR:
RECIBIDO POR:

Powered by CamScanner

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 10/04/25
ORDEN CLIENTE No.:
REMISIÓN: EF 14531

CLIENTE	Consorcio DC 2025
OBRA	San Vicente CIV 6001042
DIRECCION	Kra 32 - cll 52 6sur y cll 52 F sur
MATERIAL	Excavacion
PLACA VEHICULO	SRO 465 — 15 M3
CONDUCTOR	Victor Moreno
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 15/04/25
ORDEN CLIENTE No.:
REMISIÓN: EF 14532

CLIENTE	Consorcio DC 2025
OBRA	San Vicente CIV 6001042
DIRECCION	Kra 32 - cll 52 6sur y cll 52 F sur
MATERIAL	Excavacion
PLACA VEHICULO	DBB 045 — 15 M3
CONDUCTOR	Luis Sanchez
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 21/04/25
ORDEN CLIENTE No.:
REMISIÓN: EF 14533

CLIENTE	Consorcio DC 2025
OBRA	San Vicente CIV 6001042
DIRECCION	Kra 32 - cll 52 6sur y cll 52 F sur
MATERIAL	Excavacion
PLACA VEHICULO	SRO 465 — 15 M3
CONDUCTOR	Victor Moreno
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 22/04/25
ORDEN CLIENTE No.:
REMISIÓN: EF 14534

CLIENTE	Consorcio DC 2025
OBRA	San Vicente CIV 6001042
DIRECCION	Kra 32 - cll 52 6 sur y cll 52 F sur
MATERIAL	Excavacion
PLACA VEHICULO	DBB 045 — 15 M3
CONDUCTOR	Luis Sanchez
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:

Powered by CamScanner

MAGIR SAS. ESP

Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

REMISIÓN EF 14535

FECHA 25/04/25

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE	Punto DC 2025	
OBRA	San Vicente CIV 6001042	
DIRECCION	Kra 32 - cll 52 6 sur y cll 52 F sur	
MATERIAL	Excavación	
PLACA VEHICULO	SRO 465	15 M3
CONDUCTOR	Victor Moreno	
DESPACHADO POR:		RECIBIDO POR:

Impreso por IMPRESORES • Cra 69 # 51-873 Bogotá • Tel. 51 873 785-4 • Cel. 312 821 1626

Powered by CamScanner

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 08/04/25
ORDEN CLIENTE No.:
REMISIÓN: EF 14526

CLIENTE	Consorcio DC 2025	
OBRA	San Vicente CIV 6000897	
DIRECCION	Kr 32 - cll 52 6 sur y cll 52F sur	
MATERIAL	Excavación	
PLACA VEHICULO	SRO 465	15 M3
CONDUCTOR	Victor Moreno	
DESPACHADO POR:		RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 09/04/25
ORDEN CLIENTE No.:
REMISIÓN: EF 14527

CLIENTE	Consorcio DC 2025	
OBRA	San Vicente CIV 6000897	
DIRECCION	Kr 32 - cll 52 6 sur y cll 52F sur	
MATERIAL	Excavación	
PLACA VEHICULO	SRO 465	15 M3
CONDUCTOR	Victor Moreno	
DESPACHADO POR:		RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 09/04/25
ORDEN CLIENTE No.:
REMISIÓN: EF 14528

CLIENTE	Consorcio DC 2025	
OBRA	San Vicente CIV 6000897	
DIRECCION	Kra 32 - cll 52 6 sur y cll 52F sur	
MATERIAL	Excavación	
PLACA VEHICULO	DBB 045	15 M
CONDUCTOR	Luis Sanchez	
DESPACHADO POR:		RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 11/04/25
ORDEN CLIENTE No.:
REMISIÓN: EF 14529

CLIENTE	Consorcio DC 2025	
OBRA	San Vicente CIV 6000897	
DIRECCION	Kra 32 - cll 52 6 sur y cll 52F sur	
MATERIAL	Excavación	
PLACA VEHICULO	SRO 465	15 M3
CONDUCTOR	Victor Moreno	
DESPACHADO POR:		RECIBIDO POR:

Powered by CamScanner

MAGIR SAS. ESP

Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

REMISIÓN EF 14530

FECHA 14/04/25

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE	Consorcio DC 2025	
OBRA	San Vicente CIV 6000897	
DIRECCION	Kra 32 - cll 52 6sur y cll 52F sur	
MATERIAL	Excavación	
PLACA VEHICULO	SRO 465	15 M3
CONDUCTOR	Victor Moreno	
DESPACHADO POR:		**RECIBIDO POR:**

Impreso por: IMPRESORES • Cristina Reyes • Nit. 51.873.785-4 • Cel.: 312 321 1626

Powered by CamScanner

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 02/04/25
ORDEN CLIENTE No.:
REMISIÓN: EF 14501

CLIENTE	Consorcio DC 2025	
OBRA	Nuevo Muzú CIV 6000547	
DIRECCION	Dg 4 S1 B Cra 58	
MATERIAL	Excavación	
PLACA VEHICULO	SWN 418	15 M3
CONDUCTOR	Julsson Rojas.	
DESPACHADO POR:		RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 08/04/25
ORDEN CLIENTE No.:
REMISIÓN: EF 14502

CLIENTE	Consorcio DC 2025	
OBRA	Nuevo Muzú	
DIRECCION	CIV 6000547 Dg 51 B Cra 58	
MATERIAL	Excavación	
PLACA VEHICULO	SWN 418	15 M3
CONDUCTOR	Julsson Rojas	
DESPACHADO POR:		RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 08/04/25
ORDEN CLIENTE No.:
REMISIÓN: EF 14503

CLIENTE	Consorcio DC 2025	
OBRA	Nuevo Muzú	
DIRECCION	CIV 6000547 Dg 51 B Cra 58	
MATERIAL	Excavación	
PLACA VEHICULO	TFT 870	15 M3
CONDUCTOR	Camilo Montoya	
DESPACHADO POR:		RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 08/04/25
ORDEN CLIENTE No.:
REMISIÓN: EF 14504

CLIENTE	Consorcio DC 2025	
OBRA	Nuevo Muzú	
DIRECCION	CIV 6000547 Dg 51 B Cra 58	
MATERIAL	Excavación	
PLACA VEHICULO	SWN 418	15 M3
CONDUCTOR	Julsson Rojas	
DESPACHADO POR:		RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 09/04/25
ORDEN CLIENTE No.:
REMISIÓN: EF 14505

CLIENTE	Consorcio DC 2025	
OBRA	Nuevo Muzú	
DIRECCION	CIV 6000547 Dg 51 B Cra 58	
MATERIAL	Excavación	
PLACA VEHICULO	SWN 418	15 M3
CONDUCTOR	Julsson Rojas	
DESPACHADO POR:		RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 15/04/25
ORDEN CLIENTE No.:
REMISIÓN: EF 14506

CLIENTE	Consorcio DC 2025	
OBRA	Nuevo Muzú	
DIRECCION	CIV 6000547 Dg 51 B Cra 58	
MATERIAL	Excavación	
PLACA VEHICULO	TFT 870	15 M3
CONDUCTOR	Camilo Montoya	
DESPACHADO POR:		RECIBIDO POR:

Powered by CamScanner

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 22 04 25
ORDEN CLIENTE No.:
REMISIÓN: EF 14507

CLIENTE	Consorcio DC 2025	
OBRA	Nuevo Muzú	
DIRECCION	CIV 6000547 Dg 51 B Cra 58	
MATERIAL	Excavación	
PLACA VEHICULO	SWN 418	15 M3
CONDUCTOR	Julian Rojas	
DESPACHADO POR:		RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 24 04 25
ORDEN CLIENTE No.:
REMISIÓN: EF 14508

CLIENTE	Consorcio DC 2025	
OBRA	Nuevo Muzú	
DIRECCION	CIV 6000547 Dg 51 B Cra 58	
MATERIAL	Excavación	
PLACA VEHICULO	SWN 418	15 M3
CONDUCTOR	Julian Rojas	
DESPACHADO POR:		RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 25 04 2
ORDEN CLIENTE No.:
REMISIÓN: EF 14509

CLIENTE	Consorcio DC 2025	
OBRA	Nuevo Muzú	
DIRECCION	CIV 6000547 Dg 51B Cra 58	
MATERIAL	Excavacion.	
PLACA VEHICULO	TFT 870	15
CONDUCTOR	Cumilo Montoya	
DESPACHADO POR:		RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 28 04 25
ORDEN CLIENTE No.:
REMISIÓN: EF 14510

CLIENTE	Consorcio DC 2025	
OBRA	Nuevo Muzú	
DIRECCION	CIV 6000547 Dg 51 B Cra 58	
MATERIAL	Excavación	
PLACA VEHICULO	SWN 418	15 M3
CONDUCTOR	Julian Rojas.	
DESPACHADO POR:		RECIBIDO POR:

Powered by CamScanner

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros
Escombrera Municipal El Alisos- Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 07/04/25
ORDEN CLIENTE No.:
REMISIÓN: EF 14511

CLIENTE	Consorcio DC 2025
OBRA	Nuevo Muzú
DIRECCION	CIV 6000587 Dg 52 A sur Kra 58
MATERIAL	Excavación
PLACA VEHICULO	SWN 418 — 15 M3
CONDUCTOR	Jaison Rojas
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros
Escombrera Municipal El Alisos- Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 07/04/25
ORDEN CLIENTE No.:
REMISIÓN: EF 14512

CLIENTE	Consorcio DC 2025
OBRA	Nuevo Muzú
DIRECCION	CIV 6000587 Dg 52A sur Kra 58
MATERIAL	Excavación
PLACA VEHICULO	TFT 870 — 15 M3
CONDUCTOR	Camilo Montoya
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros
Escombrera Municipal El Alisos- Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 02/04/25
ORDEN CLIENTE No.:
REMISIÓN: EF 14513

CLIENTE	Consorcio DC 2025
OBRA	Nuevo Muzú
DIRECCION	CIV 6000587 Dg 52A sur Kra 58
MATERIAL	Excavación
PLACA VEHICULO	SWN 418 — 15 M3
CONDUCTOR	Jaison Rojas
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros
Escombrera Municipal El Alisos- Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 08/04/25
ORDEN CLIENTE No.:
REMISIÓN: EF 14514

CLIENTE	Consorcio DC 2025
OBRA	Nuevo Muzú
DIRECCION	CIV 6000587 Dg 52A sur Kra 58
MATERIAL	Excavación
PLACA VEHICULO	SWN 418 — 15 M3
CONDUCTOR	Jaison Rojas
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros
Escombrera Municipal El Alisos- Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 03/04/25
ORDEN CLIENTE No.:
REMISIÓN: EF 14515

CLIENTE	Consorcio DC 2025
OBRA	Nuevo Muzú
DIRECCION	CIV 6000587 Dg 52A sur Kra 58
MATERIAL	Excavación
PLACA VEHICULO	TFT 870 — 15 M3
CONDUCTOR	Camilo Montoya
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros
Escombrera Municipal El Alisos- Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 07/04/25
ORDEN CLIENTE No.:
REMISIÓN: EF 14516

CLIENTE	Consorcio DC 2025
OBRA	Nuevo Muzú
DIRECCION	CIV 6000587 Dg 52A sur Kra 58
MATERIAL	Excavación
PLACA VEHICULO	SWN 418 — 15 M3
CONDUCTOR	Jaison Rojas
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros
Escombrera Municipal El Alisos- Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 03/04/25
ORDEN CLIENTE No.:
REMISIÓN: EF 14517

CLIENTE	Consorcio DC 2025
OBRA	Nuevo Muzú
DIRECCION	CIV 6000587 Dg 52A sur Kra 58
MATERIAL	Excavación
PLACA VEHICULO	SWN 418 — 15 M3
CONDUCTOR	Jaison Rojas
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros
Escombrera Municipal El Alisos- Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 03/04/25
ORDEN CLIENTE No.:
REMISIÓN: EF 14518

CLIENTE	Consorcio DC 2025
OBRA	Nuevo Muzú
DIRECCION	CIV 6000587 Dg 52A sur Kra 58
MATERIAL	Excavación
PLACA VEHICULO	SWN 418 — 15 M3
CONDUCTOR	Jaison Rojas
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:

Powered by CamScanner

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros
Escombrera Municipal El Alticor, Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 14/04/25
ORDEN CLIENTE No.:
REMISIÓN: EF 14519

CLIENTE	Consorcio DC 2025
OBRA	Nuevo Muzú
DIRECCION	CIV 6000587 Dg 52A sur Kra 5B
MATERIAL	Excavación
PLACA VEHICULO	SWN 418 — 15 M3
CONDUCTOR	Jaisson Rojas
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros
Escombrera Municipal El Alticor, Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 14/04/25
ORDEN CLIENTE No.:
REMISIÓN: EF 14520

CLIENTE	Consorcio DC 2025
OBRA	Nuevo Muzú
DIRECCION	CIV 6000587 Dg 52A sur Kra 5B
MATERIAL	Excavación
PLACA VEHICULO	TFT 870 — 15 M3
CONDUCTOR	Camilo montoya
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR: D.C.I.

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros
Escombrera Municipal El Alticor, Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 14/04/25
ORDEN CLIENTE No.:
REMISIÓN: EF 14521

CLIENTE	Consorcio DC 2025
OBRA	Nuevo Muzú
DIRECCION	CIV 6000587 Dg 52A sur Kra 5B
MATERIAL	Excavación
PLACA VEHICULO	SWN 418 — 15 M3
CONDUCTOR	Jaisson Rojas
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros
Escombrera Municipal El Alticor, Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 14/04/25
ORDEN CLIENTE No.:
REMISIÓN: EF 14522

CLIENTE	Consorcio DC 2025
OBRA	Nuevo Muzú
DIRECCION	CIV 6000587 Dg 52A sur Kra 5B
MATERIAL	Excavación
PLACA VEHICULO	TFT 870 — 15 M3
CONDUCTOR	Camilo montoya
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros
Escombrera Municipal El Alticor, Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 15/04/25
ORDEN CLIENTE No.:
REMISIÓN: EF 14523

CLIENTE	Consorcio DC 2025
OBRA	Nuevo Muzú
DIRECCION	CIV 6000587 Dg 52A sur Kra 5B
MATERIAL	Excavación
PLACA VEHICULO	SWN 418 — 15 M3
CONDUCTOR	Jaisson Rojas
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros
Escombrera Municipal El Alticor, Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 22/04/25
ORDEN CLIENTE No.:
REMISIÓN: EF 14524

CLIENTE	Consorcio DC 2025
OBRA	Nuevo Muzú
DIRECCION	CIV 6000587 Dg 52A sur Kra 5B
MATERIAL	Excavación
PLACA VEHICULO	SWN 418 — 15 M3
CONDUCTOR	Jaisson Rojas
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:

Powered by CamScanner

MAGIR SAS. ESP

Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldia Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

REMISIÓN **EF 14525**

FECHA: 25 04 25

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE	Consorcio DC 2025		
OBRA	Nuevo Muzú		
DIRECCION	CLL 6000 SUR Dg 52A Avr Kra 58		
MATERIAL	Escombros		
PLACA VEHICULO	SWN 418	9.5	M3
CONDUCTOR	Jaison Rojas		
DESPACHADO POR:		RECIBIDO POR:	

Impreso por: IMPRESORES • Cristina Reyes • Nit. 51.873.785-4 • Cel.: 312 321 1626

Powered by CamScanner

SECAM J.R. S.A.S
NIT. 830.507.163-0

RECIBIDO

SECAM J.R.

NIT: 830.507.163-0

GESTION RCDS REGISTRO CAR-DO

RES.0472-2017 MINAMBIENTE

RESOLUCION - ICA - 3142

Recibo Numero: 2141 OK

Placa: SRQ965

Bruto: 0

Tara: 0

Neto: 0

Precio: 0

15 M3

Entrada: 1/04/2025 10:27:15 a. m.

Salida: 1/04/2025 10:27:19 a. m.

Empresa: INGECOP OBRA CIVILES

Producto: MIXTOS

Conductor: VICTOR MORENO

Origen: TUNJUELITO

Nota:

Powered by CamScanner

SECAM J.R. S.A.S
NIT. 830.507.163-0
RECIBIDO
SECAM J.R
NIT: 830.507.163-0
GESTOR RCDS REGISTRO CAR-00
RES.0472-2017 MIN AMBIENTE
[illegible]

Recibo Número: 2187 OK

Placa: SZK682
Bruto: 31840
Tara: 11270
Neto: 20570
Precio: 0
Entrada: 2/04/2025 2:24:35 p. m.
Salida: 2/04/2025 2:32:54 p. m.
Empresa: INGECOP OBRA CIVILES
Productor: MIXTOS
Conductor: ALEXANDER
Origen: TUNJUELITO
Nota:

Powered by CamScanner

T2

SECAM J.R. S.A.S

NIT. 830.507.163-0

RECIBIDO

SECAM JR

NIT: 830.507.163-0

GESTOR RCDS REGISTRO CAR-00

RES.0472-2017 MIN AMBIENTE

DESARROLLO - GRI - 31/4/2025

Recibo Número: 2279 OK

Placa: SOA552

Bruto: 10

Tara: 0

Neto: 10

Precio: 0

15m³

Entrada: 7/04/2025 8:54:54 a. m.

Salida: 7/04/2025 8:55:18 a. m.

Empresa: INGECOP OBRA CIVILES

Productor: MIXTOS

Conductor: ALEXANDER

Origen: TUNUELITO

Nota:

Powered by CamScanner

SECAM J.R. S.A.S.
NIT. 830.507.163-0

RECIBIDO

SECAM JR

NIT: 830.507.163-0

GESTOR RCDS REGISTRO CAR-00

RES.0472-2017 MIN AMBIENTE

[illegible]

Recibo Número: 2280 01

Placa: SZX582

Bruto: 34510

Tara: 20190

Neto: 14320

Precio: 0

Entrada: 7/04/2025 10:10:53 a. m.

Salida: 7/04/2025 10:17:15 a. m.

Empresa: INGECOP OBRA CIVILES

Producto: MIXTOS

Conductor: ALEXANDER

Origen: TUNJUELITO

Nota:

Powered by CamScanner

SECAM J.R. S.A.S
NIT. 830.507.163-0
RECIBIDO

SECAM JR
NIT: 830.507.163-0
GESTOR RCDS REGISTRO CAR-00
RES.0472-2017 MIN AMBIENTE
[illegible]

Recibo Número: 2284 ok

Placa: TTO152
Bruto: 34430
Tara: 10850
Neto: 23580
Precio: 0
Entrada: 7/04/2025 11:45:04 a. m.
Salida: 7/04/2025 11:54:54 a. m.
Empresa: INGECOP OBRA CIVILES
Producto: MIXTOS
Conductor: ROMER AYALA
Origen: TUNUELITO
Nota:

Powered by CamScanner

SECAM J.R. S.A.S
NIT 830.507.163-0
RECIBIDO

SECAM JR
NIT: 830.507.163-0
GESTOR RCDS REGISTRO CAR-041
RES.0472-2017 MIN AMBIENTE
[illegible]

Recibo Número: 2331

Placa: SRO465
Bruto: 0
Tara: 0
Neto: 0
Precio: 0

15 M3

Entrada: 9/04/2025 3:34:31 p. m.
Salida: 9/04/2025 3:34:36 p. m.
Empresa: INGECOP OBRA CIVILES
Producto: MIXTOS
Conductor: VICTOR MORENO
Origen: TUNJUELITO
Nota:

Powered by CamScanner



SECAM J.R. S.A.

NIT. 830.507.163-0

RECIBIDO

SECAM JR

NIT: 830.507.163-0

GESTOR RCDS REGISTRO CAR-00

RES.0472-2017 MIN AMBIENTE

DESARROLLO - TEL - 314 460 4382

Recibo Número: 2387 OK

Placa: SRC465

Bruto: 0

Tara: 0

Neto: 0

Precio: 0

Entrada: 14/04/2025 8:33:39 a. m.

Salida: 14/04/2025 8:33:47 a. m.

Empresa: INGECOP OBRA CIVILES

Producto: MIXTOS

Conductor: VICTOR MORENO

Origen: TUNJUELITO

Nota:

COPIA DEL RECIBO ORIGINAL

Powered by CamScanner

SECAM J.R. S.A.S
NIT 830.507.163-0
RECIBIDO

SECAM JR

NIT: 830.507.163-0

GESTOR RCDS REGISTRO CAR-00

RES.0472-2017 MIN AMBIENTE

[illegible]

Recibo Número: 2401 OK

Placa: SXS806

Bruto: 0

Tara: 0

Neto: 0

Precio: 0

Entrada: 14/04/2025 4:25:23 p. m.

Salida: 14/04/2025 4:25:28 p. m.

Empresa: INGECOP OBRA CIVILES

Producto: MIXTOS

Conductor: EDWIN

Origen: TUNJUELITO

Nota:

Powered by CamScanner

T1

SECAM J.R. S.A.S

NIT. 830.507.163-0

DESPACHADO

SECAMIR

NIT: 830.507.163-0

GESTOR RCDS REGISTRO CAR-00

RES.0472-2017 MIN AMBIENTE

[illegible]

Recibo Número: 2466 OK

Placa: SZX682

Vr.Bto: 31130

Tara: 11300

Neto: 19830

Precio: 0

Entrada: 21/04/2025 11:55:26 a. m.

Salida: 21/04/2025 12:03:50 p. m.

Empresa: INGECOP OBRA CIVILES

Producto: MIXTOS

Conductor: ALEXANDER

Origen: TUNJUELITO

Notas:

Powered by CamScanner

T1

SECAM J.R. S.A.S

NIT. 830.507.163-0

RECIBIDO

SECAM JR

NIT: 830.507.163-0

GESTOR RCDS REGISTRO CAR-00

RES.0472-2017 MIN AMBIENTE

DESARROLLO - CEL - 318 [illegible]

Recibo Número: 2538

Placa: SDX882

Bruto: 0

Tara: 0

Neto: 0

Precio: 0

Entrada: 23/04/2025 4:23:22 p. m.

Salida: 23/04/2025 4:23:26 p. m.

Empresa: INGECOP OBRA CIVILES

Producto: MIXTOS

Conductor: ALEXANDER

Origen: TUNJUELITO

Nota:

T2

SECAM J.R. S.A.S

NIT. 830.507.163-0

RECIBIDO

SECAM JR

NIT: 830.507.163-0

GESTOR RCDS REGISTRO CAR-00

RES.0472-2017 MIN AMBIENTE

DESARROLLO - CEL - 318 [illegible]

Recibo Número: 2548

Placa: TTO152

Bruto: 0

Tara: 0

Neto: 0

Precio: 0

Entrada: 24/04/2025 1:28:25 p. m.

Salida: 24/04/2025 1:28:32 p. m.

Empresa: INGECOP OBRA CIVILES

Producto: MIXTOS

Conductor: ROMER AYALA

Origen: TUNJUELITO

Nota:

SECAM J.R. S.A.S

NIT. 830.507.163-0

DESPACHADO

SECAM J.R. S.A.S

SECAM J.R.

NIT. 830.507.163-0

REGISTRO CAR

RES.0472-2017 MIN AMBIENTE

DESARROLLO - CEL - 318 [illegible]

Recibo Número: 2569

Placa: SDX882

Bruto: 31580

Tara: 17130

Neto: 14450

Precio: 0

Entrada: 25/04/2025 1:13:44 p. m.

Salida: 25/04/2025 1:28:14 p. m.

Empresa: INGECOP OBRA CIVILES


Producto: MIXTOS

Conductor: ALEXANDER

Origen: TUNJUELITO

Nota:

Powered by CamScanner

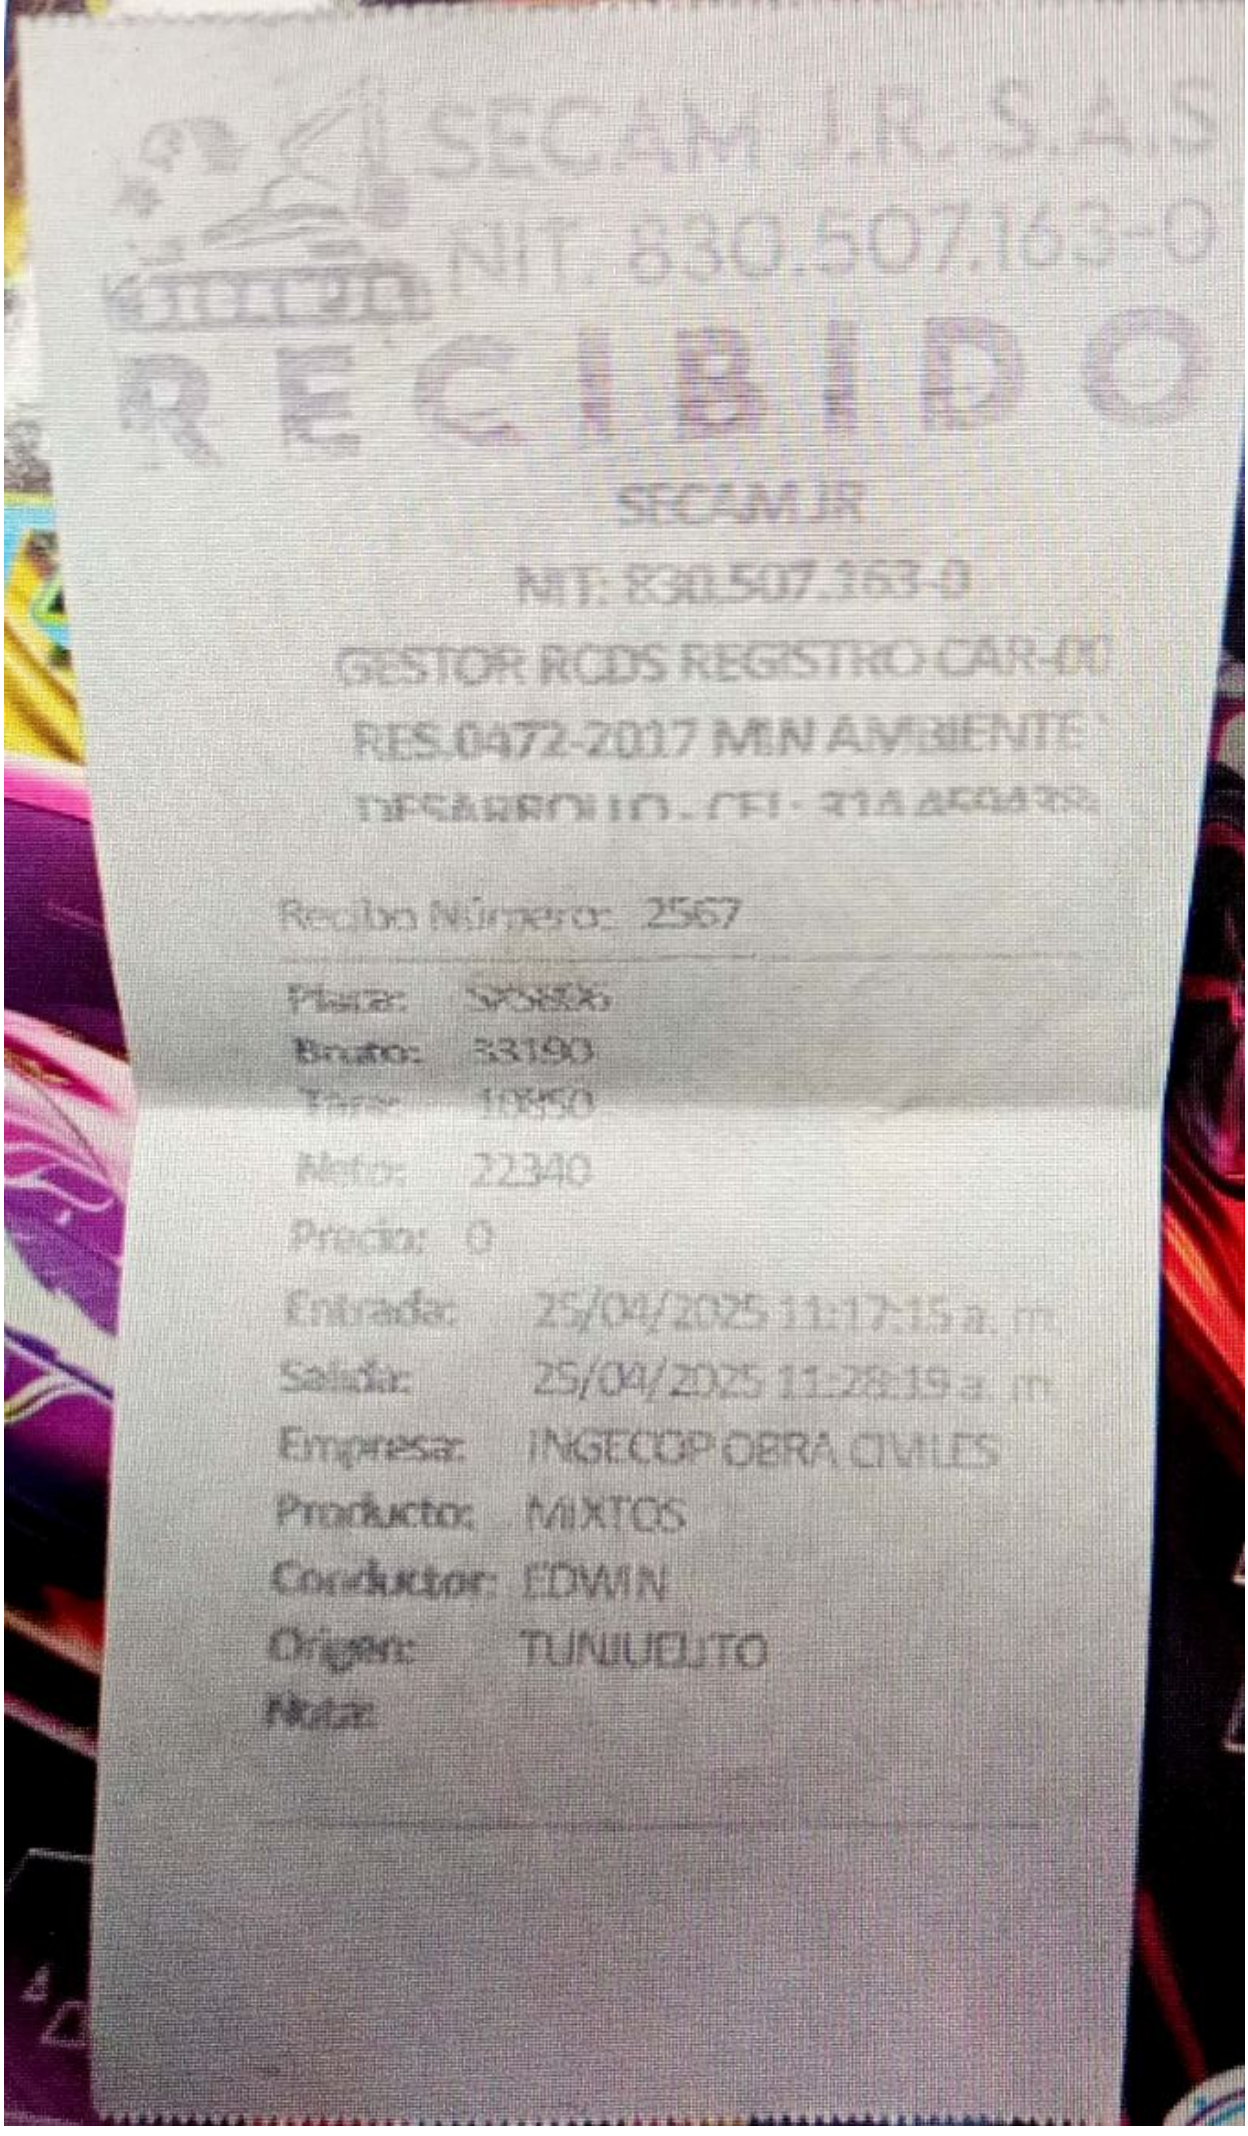

Powered by CamScanner

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS MANAS
NIT: 900.459.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel. 7023048/60/65

Res. 1480 de 2014 de la ANLA

Remisión N: RM-168913 OT
Fecha: 2025-04-07 09:13:59
Cajero: Luis
Placa: TTO152 PIN Volqueta: 0
CLIENTE: EFECTIVO
Recibo No. 0 N.V: 6
Obra: GENERAL
Viaje: DOBLE- EXCAVACIÓN TIERRA, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 15,0
TOTAL: ..... $ 100.000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

Powered by CamScanner

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS
MANGS
NIT: 900.453.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel.
7023048/60/65

Res. 1480 de 2014 de la ANLA

Remisión N: RM-1692555 OK
Fecha: 2025-04-08 09:55:03
Cajero: Luis
Placa: SXS806 PIN Volqueta: 0
CLIENTE: EFECTIVO
Recibo No. 0 N.V: 12
Obra: GENERAL
Viaje: DOBLE- EXCAVACIÓN TIERRA, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 15.0
TOTAL: ..... $ 100.000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

Powered by CamScanner

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS MANAS
NIT: 900.459.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel. 7023048/60/65

Res. 1480 de 2014 de la ANLA

Remision N: RM-169304 Ok
Fecha: 2025-04-08 11:00:03
Cajero: Luis
Placa: SZX832 PIN Volqueta: 2700
CLIENTE: EFECTIVO
Recibo No. 0 N.V. 14
Obra: GENERAL
Viaje: DOBLE- EXCAVACIÓN TIERRA, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 15,0
TOTAL: ..... $ 100.000

FIRMA CONDUCTOR

Powered by CamScanner

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconfiguración Morfológica LAS MANAS
NIT: 900.453.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel. 7023045/60/65

Res. 1480 del 2014 de la ANLA

Remisión N. PM-169536 OH
Fecha: 2025-04-09 10:20:19
Cajero: Luis
Placa: SZX882 PIN Volqueta: 2700
CLIENTE: EFECTIVO
Recibo No. 0 N.V. 16
Obra: GENERAL
Maje: DOBLE- EXCAVACIÓN TIERRA, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 15,0
TOTAL: ..... $ 100.000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

Powered by CamScanner

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS MANAS
NIT: 900.459.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel.
7023048/60/65

Res. 1460 de 2014 de la ANLA

Recibo N: RM 169722 OR
Fecha: 2026-04-09 12:19:59
Cajero: Luis
Placa: SZX892 PIN Volqueta: 2700
CLIENTE: EFECTIVO
Recibo No: 0 N.V. 16
Obra: GENERAL
Viaje: DOBLE EXCAVACIÓN TIERRA, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 15,0
TOTAL: ..... $ 100.000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

Powered by CamScanner

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS
MANAS
NIT: 900.459.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel.
7023048/60/65

Res. 1450 de 2014 de la ANLA

Remisión N: RM-1659880 GR
Fecha: 2025-04-08 16:14:10
Cajera: Luis
Placa: SZX882 PIN Volqueta: 2700
CLIENTE: EFECTIVO
Recibo No. 0 N.V: 17
Obra: GENERAL
Viaje: DOBLE- EXCAVACION TIERRA, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 15,0
TOTAL: ..... $ 100.000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

Powered by CamScanner

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS MANAS
NIT: 900.459.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel. 7023048/60/65

Res. 1460 de 2014 de la ANLA

Remisión N: RM-170023 OK
Fecha: 2025-04-10 10:59:39
Cajero: Luis
Placa: SZX882 PIN Volqueta: 2700
CLIENTE: EFECTIVO
Recibo No. 0 N.V: 18
Obra: GENERAL
Viaje: DOBLE- EXCAVACIÓN TIERRA, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 15,0
TOTAL: ..... $ 100.000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

Powered by CamScanner

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS MANAS
NIT: 900.459.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel. 7023048/60/65

Res. 1480 de 2014 de la ANLA

Remisión N: RM-170152 OK
Fecha: 2025-04-10 14:09:09
Cajero: Luis
Placa: SZX882 PIN Volqueta: 2700
CLIENTE: EFECTIVO
Recibo No. 0 N.V: 19
Obra: GENERAL
Viaje: DOBLE- EXCAVACIÓN TIERRA, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 15,0
TOTAL: ..... $ 100.000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

Powered by CamScanner

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS MANAS
NIT: 900.459.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel. 7023048/60/65

Res. 1450 de 2014 de la ANLA

Remisión N: RM-170258 OT
Fecha: 2025-04-10 16:43:30
Cajero: Luis
Placa: SZX882 PIN Volqueta: 2700
CLIENTE: EFECTIVO
Recibo No. 0 N.V: 20
Obra: GENERAL
Viaje: DOBLE- EXCAVACIÓN TIERRA, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 15,0
TOTAL: ..... $ 100.000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

Powered by CamScanner

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS MANAS
NIT: 900.459.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel. 7023048/60/65

Res. 1480 de 2014 de la ANLA

Remisión N: RM-170423 OK
Fecha: 2025-04-11 12:30:20
Cajero: Luis
Placa: SZO882 PIN Volqueta: 2700
CLIENTE: EFECTIVO
Recibo No. 0 N.V: 0
Obra: GENERAL
Viaje: DOBLE- EXCAVACIÓN TIERRA, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 15,0
TOTAL: ..... $ 100.000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

Powered by CamScanner

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS MANAS
NIT: 900.459.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel. 7023048/60/65

Res. 1450 de 2014 de la ANLA

Remisión N: RM-170424 01
Fecha: 2025-04-11 12:31:50
Cajera: Luis
Placa: SRO465 PIN Volqueta: 0
CLIENTE: EFECTIVO
Recibo No. 0 N.V: 11
Obra: GENERAL
Viaje: DOBLE- EXCAVACIÓN TIERRA, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 15,0
TOTAL: ..... $ 100.000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

Powered by CamScanner

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS MANAS
NIT: 900.459.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel. 7023048/60/65

Res. 1480 de 2014 de la ANLA

Remisión N: RM-170534 OR
Fecha: 2025-04-11 16:01:53
Cajero: Luis
Placa: SXS806 PIN Volqueta: 0
CLIENTE: EFECTIVO
Recibo No. 0 N.V: 15
Obra: GENERAL
Viaje: DOBLE- EXCAVACIÓN TIERRA, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 15,0
TOTAL: ..... $ 100.000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

Powered by CamScanner

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS MANAS
NIT: 900.459.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel. 7023048/60/65

Res. 1480 de 2014 de la ANLA

Remisión N: RM-170646 ok
Fecha: 2025-04-12 09:51:03
Cajero: Luis
Placa: SRO465 PIN Volqueta: 0
CLIENTE: EFECTIVO
Recibo No. 0 N.V: 12
Obra: GENERAL
Viaje: DOBLE- EXCAVACIÓN TIERRA, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 15,0
TOTAL: ..... $ 100.000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

Powered by CamScanner

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS MANAS
NIT: 900.459.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel. 7023045/60/65

Res. 1480 de 2014 de la ANLA

Remisión N: RM-170719 OK
Fecha: 2025-04-12 11:46:54
Cajero: Luis
Placa: SXS806 PIN Volqueta: 0
CLIENTE: EFECTIVO
Recibo No. 0 N.V: 16
Obra: GENERAL
Viaje: DOBLE- EXCAVACIÓN TIERRA, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 15,0
TOTAL: ..... $ 100.000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

Powered by CamScanner

VALLE

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Reconformación Morfológica LAS MANAS
NIT: 900.459.311-1
Kr 17 No. 142 - 25 Tel. 7023048/60/65

Res. 1480 de 2014 de la ANLA

Remisión N: RM-173829
Fecha: 2025-04-28 11:33:56
Cajero: Luis
Placa: SZA882 PIN Volqueta: 2700
CLIENTE: EFECTIVO
Recibo No. 0 N.V: 2
Obra: GENERAL
Viaje: DOBLE- EXCAVACIÓN HUMEDA, CAPA VEGETAL, TIERRA NEGRA
Mts: 15,0
TOTAL: ..... $ 170.000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

Powered by CamScanner

Bascula Electronica Sistematizada

A I A SAS - ALTAR STONES SAS
GESTOR RCD'S REGISTRO CAR: 52
CEL: 3102390140 - 3028494813

Entrada de Producto No. 6956

Fecha de Ingreso	2025-04-02 9:05:07 AM
Fecha de Salida	2025-04-02 9:11:33 AM

SWN418

Peso de Entrada	29820	Kg
Peso de Salida	11800	Kg
Peso Neto	18020	Kg

Precio	$0
Proveedor	CONSORCIO TUNUELITO
Nit	
Producto	ASFALTO
Conductor	VARIOS
Cedula	
Origen	AIA
Destino	
Remision	
Precinto	14
Pesado por	ALTAR STONES

Bascula Electronica Sistematizada

A I A SAS - ALTAR STONES SAS
GESTOR RCD'S REGISTRO CAR: 52
CEL: 3102390140 - 3028494813

Entrada de Producto No. 6980

Fecha de Ingreso	2025-04-03 12:48:55 PM
Fecha de Salida	2025-04-03 12:55:47 PM

SWN418

Peso de Entrada	30060	Kg
Peso de Salida	11980	Kg
Peso Neto	18080	Kg

Precio	$0
Proveedor	CONSORCIO AIA
Nit	
Producto	ASFALTO
Conductor	VARIOS
Cedula	
Origen	
Destino	
Remision	
Precinto	14
Pesado por	ALTAR STONES

Bascula Electronica Sistematizada

A I A SAS - ALTAR STONES SAS
GESTOR RCD'S REGISTRO CAR: 52
CEL: 3102390140 - 3028494813

Entrada de Producto No. 7021

Fecha de Ingreso	2025-04-04 3:55:08 PM
Fecha de Salida	2025-04-04 4:08:19 PM

SWN418

Peso de Entrada	25940	Kg
Peso de Salida	11900	Kg
Peso Neto	14040	Kg

Precio	$0
Proveedor	CONSORCIO TUNJUELITO
Nit	
Producto	ASFALTO
Conductor	VARIOS
Cedula	
Origen	AIA
Destino	
Remision	
Precinto	10
Pesado por	ALTAR STONES

Powered by CamScanner

CEMEX

T2

CONSTANCIA DE RECIBO DE MATERIA

07

FECHA Y HORA 14.04.2025 12:21:37
FOLIO: 501656726
PEDIDO: 501656475

PRODUCTO: SERV.DISPOSDIURNOEXCSECADOBLE
CLIENTE Y NIT: OTC ESCOMBRERA TUNJUELO 8600025231
OBRA: OTC ESCOMBRERA TUNJUELO
CODIGO DE OBRA: ZUN675012
CLASE DE DOCUMENTO DE VENTA: ZTA

Espacio para Sello

14 ABR 2025

EXPEDIDO EN: CO-ESCOMBRERA-TUNJUELO
Avenida al Llano Sur 72-04
CP: 11001000 Bogota CO

OC: DBB045 2071 112000

Observaciones

Espacio para Observaciones

CLIENTE

Usuario :Yeimy Lorena Perez Garcia

ORIGINAL

Este documento presta merito ejecutivo

Powered by CamScanner

CEMEX

CONSTANCIA DE RECIBO DE MATERIA

OK

FECHA Y HORA 15.04.2025 09:38:35
FOLIO: 501668544
PEDIDO: 501668543

PRODUCTO: SERV. DISPOSICIÓN EXCSECA DOBLE
CLIENTE Y NIT: OTC ESCOMBRERA TUNJUELO 8600026231
OBRA: OTC ESCOMBRERA TUNJUELO
CODIGO DE OBRA: ZUN675012
CLASE DE DOCUMENTO DE VENTA: ZTA

CEMEX ACE
15 ABR 2025
DESPACHADO
Espacio para Sello

EXPEDIDO EN: CO-ESCOMBRERA-TUNJUELO
Avenida al Llano Sur 72-04
CP: 11001000 Bogota CO

OC: DBB045 2071 112000

Observaciones Espacio para Observaciones

CLIENTE

Usuario :EDIN DAVIDI ORTIZ ANGULO

ORIGINAL

Este documento presta merito ejecutivo

Powered by CamScanner

CEMEX

CONSTANCIA DE RECIBO DE MATERIA

FECHA Y HORA 07.04.2025 14:06:01
FOLIO: 501567558
PEDIDO: 501567556

PRODUCTO: SERV.DISPOSDIURNOEXCSECADOBLE
CLIENTE Y NIT: OTC ESCOMBRERA TUNJUELO 8600025231
OBRA: OTC ESCOMBRERA TUNJUELO
CODIGO DE OBRA: ZUN675012
CLASE DE DOCUMENTO DE VENTA: ZTA

EXPEDIDO EN: CO-ESCOMBRERA-TUNJUELO
Avenida al Llano Sur 72-04
CP: 11001000 Bogota CO

OC: SXS806 20876 112000

Observaciones

CLIENTE

Usuario :Julieth Viviana Bonces Contreras

ORIGINAL

Este documento presta merito ejecutivo

Powered by CamScanner

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 02 05 25

REMISIÓN: EF 14726

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE	Consorcio DC	
OBRA	Tunjuelito CIV 6000897	
DIRECCION	San Vicente.	
MATERIAL	Excavacion	
PLACA VEHICULO	DBB045	17 M3
CONDUCTOR	Luis Sanchez.	
DESPACHADO POR:		RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 05 05 25

REMISIÓN: EF 14727

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE	Consorcio DC	
OBRA	Tunjelito - CIV 6000897	
DIRECCION	Nuevo Muzu.	
MATERIAL	Excavación.	
PLACA VEHICULO	DBB045	15 M3
CONDUCTOR	Luis Sanchez.	
DESPACHADO POR:		RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 08 05 25

REMISIÓN: EF 14730

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE	Consorcio DC.	
OBRA	Tunjelito. - CIV 6001042	
DIRECCION	San Vicente	
MATERIAL	Excavación	
PLACA VEHICULO	TFT 870	15 M3
CONDUCTOR	Camilo Montoya	
DESPACHADO POR:		RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 09 05 25

REMISIÓN: EF 14731

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE	Consorcio DC.	
OBRA	Tunjelito. - CIV 6000897	
DIRECCION	San Vicente.	
MATERIAL	Excavación	
PLACA VEHICULO	TFT 870	17.2 M3
CONDUCTOR	Camilo Montoya.	
DESPACHADO POR:		RECIBIDO POR:

Scanned with CamScanner

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

REMISIÓN EF 14728

FECHA 22 05 25

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE	Consorcio DC.	
OBRA	Tunjelito. - CIV 6000587	
DIRECCION	Nuevo Mosu.	
MATERIAL	Excavacion.	
PLACA VEHICULO	SJX892	15 M3
CONDUCTOR	Jaime Urrego.	
DESPACHADO POR:	$	RECIBIDO POR: $

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

REMISIÓN EF 14729

FECHA 22 05 25

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE	Consorcio DC.	
OBRA	Tunjelito. - CIV 6000587	
DIRECCION	Nuevo Mosu	
MATERIAL	Excavacion	
PLACA VEHICULO	SJX882.	15 M3
CONDUCTOR	Jaime Urrego	
DESPACHADO POR:	$	RECIBIDO POR: $

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

REMISIÓN EF 14736

FECHA 23 05 25

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE	Consorcio Dc 2025.	
OBRA	Tunjelito. CIV 6000587	
DIRECCION	Nuevo Mosu.	
MATERIAL	Excavacion	
PLACA VEHICULO	TTO 152.	15m3. M3
CONDUCTOR	Romer Ayala	
DESPACHADO POR:	$	RECIBIDO POR: $

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

REMISIÓN EF 14737

FECHA 24 05 25

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE	Consorcio DC 2025	
OBRA	Tunjelito CIV 6000587	
DIRECCION	Nuevo Mosu.	
MATERIAL	Excavacion	
PLACA VEHICULO	Romer Ayala.	15 M3
CONDUCTOR	TTO 152	
DESPACHADO POR:	$	RECIBIDO POR: $

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

REMISIÓN EF 14738

FECHA 26 05 25

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE	Consorcio Dc 2025.	
OBRA	Tunjelito CIV 6000587	
DIRECCION	Nuevo Mosu.	
MATERIAL	Excavacion.	
PLACA VEHICULO	SXS306	15 M3
CONDUCTOR	Edwin Murillo	
DESPACHADO POR:	$	RECIBIDO POR: $

Scanned with CamScanner

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 27 05 25

REMISIÓN: EF 14734

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE: Consorcio DC 2025
OBRA: Nuevo Muzu - CIV 6000587.
DIRECCION: Tunjelito.
MATERIAL: Excavacion
PLACA VEHICULO: SRO465 | 15 M3
CONDUCTOR: Edwin Murillo
DESPACHADO POR:
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 27 05 25

REMISIÓN: EF 14735

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE: Consorcio DC 2025
OBRA: Nuevo Muzu - CIV 6000587
DIRECCION: Tunjelito.
MATERIAL: Excavacion
PLACA VEHICULO: SRO465 | 15 M3
CONDUCTOR: Edwin murillo.
DESPACHADO POR:
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 30 05 25

REMISIÓN: EF 14732

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE: Consorcio DC. 2025
OBRA: Nuevo Muzu - CIV 6000587
DIRECCION: Tunjelito.
MATERIAL: Excavacion
PLACA VEHICULO: SWN418 | 15 M3
CONDUCTOR: Jaime Urrego.
DESPACHADO POR:
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 30 05 25

REMISIÓN: EF 14733

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE: Consorcio DC 2025
OBRA: Nuevo Muzu - CIV 6000587
DIRECCION: Tunjelito.
MATERIAL: Excavacion
PLACA VEHICULO: SWN418 | 15 M3
CONDUCTOR: Jaime Urrego
DESPACHADO POR:
RECIBIDO POR:

Scanned with CamScanner

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 06 06 25

REMISIÓN: EF 13707

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE: Consorcio DC 2025
OBRA: Nuevo Mazo - CN 6000887
DIRECCION: Tunjuelito
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: CVM572 — 10 M3
CONDUCTOR: Dylan Henao

DESPACHADO POR: $

RECIBIDO POR: $

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 06 06 25

REMISIÓN: EF 13708

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE: Consorcio DC 2025
OBRA: Nuevo Mazo - CN 6000887 - 6000547
DIRECCION: Tunjuelito
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: WBO928 — 9,93 M3
CONDUCTOR: Jose Garcia

DESPACHADO POR: $

RECIBIDO POR: $

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 05 06 25

REMISIÓN: EF 13709

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE: Consorcio DC 2025
OBRA: El Carmen - CN 6001045
DIRECCION: Tunjuelito DG 52b Sur entre KR 28 y KR 27
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: CVM573 — 10 M3
CONDUCTOR: Geovanny Santana

DESPACHADO POR: $

RECIBIDO POR: $

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 05 06 25

REMISIÓN: EF 13710

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE: Consorcio DC 2025
OBRA: El Carmen - CN 6001045
DIRECCION: Tunjuelito - DG 52b Sur entre KR28 y KR 27
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: UBS 399 — 15 M3
CONDUCTOR: Rafael Galindo

DESPACHADO POR: $

RECIBIDO POR: $

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 06 06 25

REMISIÓN: EF 13711

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE: Consorcio DC 2025
OBRA: El Carmen - CN 6001045
DIRECCION: Tunjuelito DG 52b Sur entre KR 28 y KR 27
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: CVM572 — 17,5 M3
CONDUCTOR: Dylan Henao

DESPACHADO POR: $

RECIBIDO POR: $

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 06 06 25

REMISIÓN: EF 13712

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE: Consorcio DC 2025
OBRA: El Carmen - CN 6001045
DIRECCION: Tunjuelito - DG 52b Sur entre KR 28 y KR 27
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: WBO928 — 17,5 M3
CONDUCTOR: Jose Garcia

DESPACHADO POR: $

RECIBIDO POR: $

Powered by CamScanner

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 07 06 25

REMISIÓN: EF 13713

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE: Consorcio DC 2025
OBRA: El Carmen - CIV 6001045
DIRECCION: Tunjelito - DG 52b Sur entre KR 28 y KR 27
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: WM573 — 15 M3
CONDUCTOR: Geovanny Santana

DESPACHADO POR: $

RECIBIDO POR: $

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 07 06 25

REMISIÓN: EF 13714

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE: Consorcio DC 2025
OBRA: El Carmen - CIV 6001045
DIRECCION: Tunjelito - DG 52b Sur entre KR 28 y KR 27
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: UPS 399 — 15 M3
CONDUCTOR: Rafael Galindo

DESPACHADO POR: $

RECIBIDO POR: $

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 09 06 25

REMISIÓN: EF 13715

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE: Consorcio DC 2025
OBRA: El Carmen - CIV 6001045
DIRECCION: Tunjelito - DG 52b Sur entre KR 28 y KR 27
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: WM572 — 15 M3
CONDUCTOR: Dylan Heran

DESPACHADO POR: $

RECIBIDO POR: $

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 09 06 25

REMISIÓN: EF 13716

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE: Consorcio DC 2025
OBRA: El Carmen - CIV 6001045
DIRECCION: Tunjelito - DG 52b Sur entre KR 28 y KR 27
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: WEO928 — 15 M3
CONDUCTOR: Jose Garcia

DESPACHADO POR: $

RECIBIDO POR: $

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 10 06 25

REMISIÓN: EF 13717

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE: Consorcio DC 2025
OBRA: El Carmen - CIV 6001045
DIRECCION: Tunjelito - DG 52b Sur entre KR 28 y KR 27
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: WM573 — 15 M3
CONDUCTOR: Geovanny Santana

DESPACHADO POR: $

RECIBIDO POR: $

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 10 06 25

REMISIÓN: EF 13718

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE: Consorcio DC 2025
OBRA: El Carmen - CIV 6001045
DIRECCION: Tunjelito - DG 52b Sur entre KR 28 y KR 27
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: UPS 399 — 15 M3
CONDUCTOR: Rafael Galindo

DESPACHADO POR: $

RECIBIDO POR: $

Powered by CamScanner

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldia Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 11 06 25

ORDEN CLIENTE No.

REMISIÓN: EF 13719

CLIENTE: Consorcio Dc 2025
OBRA: El carmen - CIV Gool045
DIRECCION: Tunjuelito - D6526 Sur entre KR28 y KR27
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: WM572 — 15 M3
CONDUCTOR: Dylan Herrera

DESPACHADO POR: $

RECIBIDO POR: $

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldia Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 11 06 25

ORDEN CLIENTE No.

REMISIÓN: EF 13720

CLIENTE: Consorcio Dc 2025
OBRA: El carmen - CIV Gool045
DIRECCION: Tunjuelito - D6526 Sur entre KR28 y KR27
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: WBG 928 — 15 M3
CONDUCTOR: Jose Garcia

DESPACHADO POR: $

RECIBIDO POR: $

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldia Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 12 06 25

ORDEN CLIENTE No.

REMISIÓN: EF 13721

CLIENTE: Consorcio Dc 2025
OBRA: El carmen - CIV Gool045
DIRECCION: Tunjuelito - D6526 Sur entre KR28 y KR27
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: WM573 — 15 M3
CONDUCTOR: Geovanny Santana

DESPACHADO POR: $

RECIBIDO POR: $

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldia Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 12 06 25

ORDEN CLIENTE No.

REMISIÓN: EF 13722

CLIENTE: Consorcio Dc 2025
OBRA: El carmen - CIV Gool045
DIRECCION: Tunjuelito - D6526 Sur entre KR28 y KR27
MATERIAL: Excavacion
PLACA VEHICULO: WB 394 — 15 M3
CONDUCTOR: Rafael Galindo

DESPACHADO POR: $

RECIBIDO POR: $

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldia Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 13 06 25

ORDEN CLIENTE No.

REMISIÓN: EF 13723

CLIENTE: Consorcio Dc 2025
OBRA: El carmen - CIV Gool045
DIRECCION: Tunjuelito - D6526 Sur entre KR28 y KR27
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: WM572 — 15 M3
CONDUCTOR: Dylan Herrera

DESPACHADO POR: $

RECIBIDO POR: $

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldia Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 13 06 25

ORDEN CLIENTE No.

REMISIÓN: EF 13724

CLIENTE: Consorcio Dc 2025
OBRA: El carmen - CIV Gool045
DIRECCION: Tunjuelito - D6526 Sur entre KR28 y KR27
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: WBU928 — 15 M3
CONDUCTOR: Jose Garcia

DESPACHADO POR: $

RECIBIDO POR: $

Powered by CamScanner

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

REMISIÓN **EF 13725**

FECHA: 14 06 25

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE Consorcio Dc 2025
OBRA El Carmen - CW Gcolo45
DIRECCION Tunjuelito - D652b Sur entre KR28 y KR27
MATERIAL Excavación
PLACA VEHICULO WM573 — 15 M3
CONDUCTOR Geovanny Santana

DESPACHADO POR: $

RECIBIDO POR: $

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

REMISIÓN **EF 13726**

FECHA: 14 06 25

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE Consorcio Dc 2025
OBRA El Carmen - CW Gcolo45
DIRECCION Tunjuelito - D652b Sur entre KR28 y KR27
MATERIAL Excavación
PLACA VEHICULO UPS 399 — 15 M3
CONDUCTOR Rafael Galindo

DESPACHADO POR: $

RECIBIDO POR: $

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

REMISIÓN **EF 13727**

FECHA: 16 06 25

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE Consorcio Dc 2025
OBRA El Carmen - CW Gcolo45
DIRECCION Tunjuelito - D652b Sur entre KR28 y KR27
MATERIAL Excavación
PLACA VEHICULO WM572 — 15 M3
CONDUCTOR Dylan Tapia

DESPACHADO POR: $

RECIBIDO POR: $

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

REMISIÓN **EF 13728**

FECHA: 16 06 25

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE Consorcio Dc 2025
OBRA El Carmen - CW Gcolo45
DIRECCION Tunjuelito - D652b Sur entre KR28 y KR27
MATERIAL Excavación
PLACA VEHICULO WSO 928 — 15 M3
CONDUCTOR Jose Garcia

DESPACHADO POR: $

RECIBIDO POR: $

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

REMISIÓN **EF 13729**

FECHA: 17 06 25

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE Consorcio Dc 2025
OBRA El Carmen - CW Gcolo45
DIRECCION Tunjuelito - D652b Sur entre KR28 y KR27
MATERIAL Excavación
PLACA VEHICULO WM573 — 15 M3
CONDUCTOR Geovanny Santana

DESPACHADO POR: $

RECIBIDO POR: $

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

REMISIÓN **EF 13730**

FECHA: 17 06 25

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE Consorcio Dc 2025
OBRA El Carmen - CW Gcolo45
DIRECCION Tunjuelito - D652b Sur entre KR28 y KR27
MATERIAL Excavación
PLACA VEHICULO UPS 399 — 15 M3
CONDUCTOR Rafael Galindo

DESPACHADO POR: $

RECIBIDO POR: $

Powered by CamScanner

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 18 06 25

ORDEN CLIENTE No.:

REMISIÓN: EF 13731

CLIENTE: Consorcio Dc 2025
OBRA: El carmen - CIV 600 045
DIRECCION: Tunjuelito - D6 52b Sur entre KR28 y KR27
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: WJM 512 — 15 M3
CONDUCTOR: Dylan Henao

DESPACHADO POR: $

RECIBIDO POR: $

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 18 06 25

ORDEN CLIENTE No.:

REMISIÓN: EF 13732

CLIENTE: Consorcio Dc 2025
OBRA: El carmen - CIV 600 045
DIRECCION: Tunjuelito - D6 52b Sur entre KR28 y KR27
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: WSV 928 — 15 M3
CONDUCTOR: Jose Garcia

DESPACHADO POR: $

RECIBIDO POR: $

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 19 06 25

ORDEN CLIENTE No.:

REMISIÓN: EF 13733

CLIENTE: Consorcio DC 2025
OBRA: El carmen - CIV 600 045
DIRECCION: Tunjuelito - D6 52b Sur entre KR28 y KR27
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: WJM 573 — 15 M3
CONDUCTOR: Geovanny Santana

DESPACHADO POR: $

RECIBIDO POR: $

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 19 06 25

ORDEN CLIENTE No.:

REMISIÓN: EF 13734

CLIENTE: Consorcio Dc 2025
OBRA: El carmen - CIV 600 045
DIRECCION: Tunjuelito - D6 52b Sur entre KR28 y KR27
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: WPS 394 — 15 M3
CONDUCTOR: Rafael Galindo

DESPACHADO POR: $

RECIBIDO POR: $

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 20 06 25

ORDEN CLIENTE No.:

REMISIÓN: EF 13735

CLIENTE: Consorcio Dc 2025
OBRA: El carmen - CIV 600 045
DIRECCION: Tunjuelito - D6 52b Sur entre KR28 y KR27
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: WJM 572 — 15 M3
CONDUCTOR: Dylan Henao

DESPACHADO POR: $

RECIBIDO POR: $

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 20 06 25

ORDEN CLIENTE No.:

REMISIÓN: EF 13736

CLIENTE: Consorcio Dc 2025
OBRA: El carmen - CIV 600 045
DIRECCION: Tunjuelito - D6 52b Sur entre KR28 y KR27
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: WSV 928 — 15 M3
CONDUCTOR: Jose Garcia

DESPACHADO POR: $

RECIBIDO POR: $

Powered by CamScanner

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 21 06 25

REMISIÓN: EF 13737

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE	Consorcio Oc 2025	
OBRA	El carmen - CIV 600145	
DIRECCION	Tunjuelito - D6526 Sur entre KR28 y KR27	
MATERIAL	Excavación	
PLACA VEHICULO	UVM 573	15 M3
CONDUCTOR	Geovanny Santana	
DESPACHADO POR:	$	RECIBIDO POR: $

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 21 06 25

REMISIÓN: EF 13738

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE	Consorcio Oc 2025	
OBRA	El Carmen - CIV 600145	
DIRECCION	Tunjuelito - D6526 Sur entre KR28 y KR27	
MATERIAL	Excavación	
PLACA VEHICULO	UPS 399	15 M3
CONDUCTOR	Rafael Galindo	
DESPACHADO POR:	$	RECIBIDO POR: $

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 21 06 25

REMISIÓN: EF 13739

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE	Consorcio Oc 2025	
OBRA	El carmen - CIV600145	
DIRECCION	Tunjuelito - D6526 Sur entre KR28 y KR27	
MATERIAL	Excavación	
PLACA VEHICULO	UVM 572	15 M3
CONDUCTOR	Dylan Henao	
DESPACHADO POR:	$	RECIBIDO POR: $

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 21 06 25

REMISIÓN: EF 13740

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE	Consorcio Oc 2025	
OBRA	El Carmen - CIV600145	
DIRECCION	Tunjuelito - D6526 Sur entre KR28 y KR27	
MATERIAL	Excavación	
PLACA VEHICULO	WGV 928	15 M3
CONDUCTOR	Jose Garcia.	
DESPACHADO POR:	$	RECIBIDO POR: $

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 25 06 25

REMISIÓN: EF 13741

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE	Consorcio Oc 2025	
OBRA	El Carmen - CIV 600145	
DIRECCION	Tunjelito-KR1 D6526Sur entre KR21 y KR28	
MATERIAL	Excavacion	
PLACA VEHICULO	UVM573	15 M3
CONDUCTOR	Geovanny Santana	
DESPACHADO POR:	$	RECIBIDO POR: $

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 25 06 25

REMISIÓN: EF 13742

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE	Consorcio Oc 2025	
OBRA	El Carmen - CIV 600145	
DIRECCION	Tunjelito - D6526 Sur entre KR28 y KR27	
MATERIAL	Excavación	
PLACA VEHICULO	UPS 399	15 M3
CONDUCTOR	Rafael Galindo	
DESPACHADO POR:	$	RECIBIDO POR: $

Powered by CamScanner

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 26 06 25

REMISIÓN: EF 13743

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE: Consorcio Ot 2025
OBRA: El Carmen - CIV 600 LOTS
DIRECCION: Tunjelito - D6526 Sur entre KR28 y KR27
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: WM 572 — 15 M3
CONDUCTOR: Dylan Heroo
DESPACHADO POR: $
RECIBIDO POR: $

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 26 06 25

REMISIÓN: EF 13744

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE: Consorcio Ot 2025
OBRA: El Carmen - CIV 600 LOTS
DIRECCION: Tunjelito - D6526 Sur entre KR28 y KR27
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: WGO 928 — 15 M3
CONDUCTOR: Jose Garcia
DESPACHADO POR: $
RECIBIDO POR: $

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 27 06 25

REMISIÓN: EF 13745

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE: Consorcio Ot 2025
OBRA: El Carmen - CIV 600 LOTS
DIRECCION: Tunjelito - D6526 Sur entre KR28 y KR27
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: WM 573 — 15 M3
CONDUCTOR: Geovanny Santana
DESPACHADO POR: $
RECIBIDO POR: $

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 27 06 25

REMISIÓN: EF 13746

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE: Consorcio Ot 2025
OBRA: El Carmen - CIV 600 LOTS
DIRECCION: Tunjelito - D6526 Sur entre KR28 y KR27
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: UBS 399 — 15 M3
CONDUCTOR: Rafael Galindo
DESPACHADO POR: $
RECIBIDO POR: $

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 28 06 25

REMISIÓN: EF 13747

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE: Consorcio Ot 2025
OBRA: El Carmen - CIV 600 LOTS
DIRECCION: Tunjelito - D6526 Sur entre KR28 y KR27
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: WM 572 — 16.07 M3
CONDUCTOR: Dylan Heroo
DESPACHADO POR: $
RECIBIDO POR: $

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 28 06 25

REMISIÓN: EF 13748

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE: Consorcio Ot 2025
OBRA: El Carmen - CIV 600 LOTS
DIRECCION: Tunjelito - D6526 Sur entre KR28 y KR27
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: WGO 928 — 18 M3
CONDUCTOR: Jose Garcia
DESPACHADO POR: $
RECIBIDO POR: $

Powered by CamScanner

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S NIT. 900767473-7

Granulados Reciclados de Colombia Greco

Vale de Recepcion Nro.: GRE VD A004170-253-2025 **Generado el: 2025-06-04**

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

FECHA Y HORA DE INGRESO: 2025-06-04 12:59:30

TRANSPORTE	DATOS DEL GENERADOR	DATOS DEL GESTOR
TRANSPORTADOR(A): INGECOP OBRAS CIVILES SAS **NO DE IDENTIFICACION:** 901583763 **CONDUCTOR:** RAFAEL GALINDO GARENA **NO DE IDENTIFICACION:** 79658384 **PLACA VEHICULO:** UPS399 **PIN-TRANS:** NA **TIPO VEHICULO:** Doble	**GENERADORA:**INGECOP OBRAS CIVILES SAS **NIT:** 901583763 **PIN-GEN:**NA **TELEFONO:** 3163091076 **NOMBRE OBRA:** NA **DIRECCION:** TUNJUELITO **MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ, D.C.	**NOMBRE:** GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S **NIT:** 900.767.473-7 **NÚMERO ÚNICO ASIGNADO:** 013 **PIN TRAT/APROV:** 2645[illegible]1 **REPRESENTANTE LEGAL:** Javier Alexander Castillo González **DIRECCION:** • Autopista Medellin km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur, Vereda Siberia Cota – Cundinamarca • Avenida Boyacá # 73 - 00 SUR, localidad de Ciudad Bolívar

CLASIFICACIÓN DE MATERIAL: Pétreos	TIPO: **(Concreto, ladrillos, asfalto)**	CANTIDAD: **(m3 Y Ton)**
Observaciones:	Asfalto	15 (m3) - 19.2 Ton

Nombre del conductor	**Nombre del encargado obra**	**Nombre del responsable - CTA**
CC:	CC:	Javier Alexander Castillo González NIT:900767473-7

Nota: La información incluida en este vale, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a GRECO, por lo cual declara y garantiza a GRECO que la información suministrada es verdadera, completa y fidedigna, y exime a GRECO de toda responsabilidad con respecto a la misma. Para generar su certificado de disposición de manera rápida y sencilla, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.reciclados greco.com y utilizar la función 'Genere su certificado' que encontrará en el encabezado, diligencie usuario y contraseña. Si aún no dispone de usuario y contraseña, por favor envíe una solicitud a la dirección de correo electrónico analistacomercial@recicladosgreco.com. Estaremos encantados de asistirle en el proceso, para mas información Cel. 3176575562.

Powered by CamScanner

SECAM J.R. S.A.S
NIT. 830.507.163-0
RECIBIDO

SECAM JR
NIT: 830.507.163-0
GESTOR RCDS REGISTRO CAR-00
RES.0472-2017 MIN.AMBIENTE
RESARRIERO - PTO - 91A-550859

Recibo Número: 3347 OK OK

Placa: UMV672
Bruto: 32330
Tara: 10810
Neto: 21570
Precio: 0
Entrada: 4/06/2025 3:26:17 p. m.
Salida: 4/06/2025 3:32:36 p. m.
Empresa: INGECOP OBRAS CIVILES
Producto: MIXTOS
Conductor: DYLAN HENAO
Origen: TUNJUELITO
Nota:

Tunjuelito

Powered by CamScanner

SECAM J.R. S.A.S
NIT. 830.507.163-0
RECIBIDO

SECAM J.R.
NIT: 830.507.163-0
GESTOR RCDS REGISTRO CAR-00
RES.0472-2017 MIN AMBIENTE
DESARROLLO - CEL - 314 [illegible]

Recibo Número: 3355 OK OK

Placa: WAGU928
Bruto: 0
Tara: 0
Neto: 0
Precio: 0

15 m3

Entrada: 5/06/2025 9:06:38 a. m.
Salida: 5/06/2025 9:06:52 a. m.
Empresa: INGECOP OBRA CIVILES
Producto: MIXTOS
Conductor: JOSE GARCIA
Origen: SAN VICENTE
Nota:

Tunjuelito

Powered by CamScanner

Tunjuelito.

Granulados Reciclados de Colombia Greco

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S NIT. 900767473-7 OK OK

Vale de Recepción Nro.: PBT VD A004170-254-2025 Generado el: 2025-06-06

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

FECHA Y HORA DE INGRESO: 2025-06-06 13:11:31

TRANSPORTE	DATOS DEL GENERADOR	DATOS DEL GESTOR
TRANSPORTADOR(A): **NO DE IDENTIFICACION:** **CONDUCTOR:** GEOVANNY SANTANA **NO DE IDENTIFICACION:** 1031130203 **PLACA VEHICULO:** UVM573 **PIN-TRANS:** NA **TIPO VEHICULO:** Doble	**GENERADORA:**INGECOP OBRAS CIVILES SAS **NIT:** 901583763 **PIN-GEN:**NA **TELEFONO:** 3163091076 **NOMBRE OBRA:** NA **DIRECCION:** TUNJUELITO **MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ, D.C.	**NOMBRE:** GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S **NIT:** 900.767.473-7 **PIN:** 19309 **REPRESENTANTE LEGAL:** Javier Alexander Castillo González **DIRECCION:** • Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur, Vereda Siberia Cota – Cundinamarca • Avenida Boyacá # 73 - 00 SUR, localidad de Ciudad Bolívar

CLASIFICACIÓN DE MATERIAL: Pétreos	TIPO: (Concreto, ladrillos, asfalto)	CANTIDAD: (m3 Y Ton)
Observaciones:	Asfalto	15 (m3) - 19.2 Ton

Nombre del conductor	Nombre del encargado obra	Nombre del responsable - CTA
CC:	CC:	Javier Alexander Castillo González NIT:900767473-7

Nota: La información incluida en este vale, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a GRECO, por lo cual declara y garantiza a GRECO que la información suministrada es verdadera, completa y fidedigna, y exime a GRECO de toda responsabilidad con respecto a la misma. Para generar su certificado de disposición de manera rápida y sencilla, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.recicladosgreco.com y utilizar la función 'Genere su certificado' que encontrará en el encabezado, diligencie usuario y contraseña. Si aún no dispone de usuario y contraseña, por favor envíe una solicitud a la dirección de correo electrónico analistacomercial@recicladosgreco.com. Estaremos encantados de asistirle en el proceso, para mas información Cel. 3176575562.

Powered by CamScanner

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alticó. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 16 07 25

REMISIÓN: EF 11326

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE	Consorcio DC 2025
OBRA	Nuevo Muzú
DIRECCION	
MATERIAL	D. Asfalto
PLACA VEHICULO	TFT 870 — 14.6 M3
CONDUCTOR	Camilo Montoya
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alticó. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 16 07 25

REMISIÓN: EF 11327

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE	Consorcio DC 2025
OBRA	Nuevo Muzú
DIRECCION	
MATERIAL	D. Asfalto
PLACA VEHICULO	SWN 418 — 14.6 M3
CONDUCTOR	Jaisson Rojas
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alticó. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 16 07 25

REMISIÓN: EF 11328

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE	Consorcio DC 2025
OBRA	Nuevo Muzú
DIRECCION	
MATERIAL	D. Asfalto
PLACA VEHICULO	SWN 418 — 14.6 M3
CONDUCTOR	Jaisson Rojas
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alticó. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 16 07 25

REMISIÓN: EF 11329

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE	Consorcio DC 2025
OBRA	Nuevo Muzú
DIRECCION	
MATERIAL	D. Asfalto
PLACA VEHICULO	TFT 870 — 14.6 M3
CONDUCTOR	Camilo Montoya
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alticó. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 17 07 25

REMISIÓN: EF 11330

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE	Consorcio DC 2025
OBRA	Nuevo muzú
DIRECCION	
MATERIAL	D. Asfalto
PLACA VEHICULO	SRM 305 — 14.6 M3
CONDUCTOR	Juan D. Gonzalez
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alticó. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 17 07 25

REMISIÓN: EF 11331

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE	Consorcio DC 2025
OBRA	Nuevo muzú
DIRECCION	
MATERIAL	D. Asfalto
PLACA VEHICULO	TFT 870 — 14.6 M3
CONDUCTOR	Camilo Montoya
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:

Powered by CamScanner

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 17/07/25
ORDEN CLIENTE No.:
REMISIÓN: EF 11333

CLIENTE	Consorcio DC 2025	
OBRA	Nuevo Muzú	
DIRECCION		
MATERIAL	D. Asfalto	
PLACA VEHICULO	TFT 970	14.6 M3
CONDUCTOR	Camilo Montoya	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:	

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 18/07/25
ORDEN CLIENTE No.:
REMISIÓN: EF 11332

CLIENTE	Consorcio DC 2025	
OBRA	Nuevo Muzú	
DIRECCION		
MATERIAL	D. Asfalto	
PLACA VEHICULO	SRM 395	14.6 M3
CONDUCTOR	Juan D. Gonzalez	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:	

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 18/07/25
ORDEN CLIENTE No.:
REMISIÓN: EF 11334

CLIENTE	Consorcio DC 2025	
OBRA	Nuevo Muzú	
DIRECCION		
MATERIAL	D. Asfalto	
PLACA VEHICULO	TFT 970	14.6 M3
CONDUCTOR	Camilo Montoya	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:	

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 19/07/25
ORDEN CLIENTE No.:
REMISIÓN: EF 11335

CLIENTE	Consorcio DC 2025	
OBRA	Nuevo Muzú	
DIRECCION		
MATERIAL	D. Asfalto	
PLACA VEHICULO	TFT 970	14.6 M3
CONDUCTOR	Camilo Montoya	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:	

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 19/07/25
ORDEN CLIENTE No.:
REMISIÓN: EF 11336

CLIENTE	Consorcio DC 2025	
OBRA	Nuevo Muzú	
DIRECCION		
MATERIAL	D. Asfalto	
PLACA VEHICULO	SRM 395	14.6 M3
CONDUCTOR	Juan D Gonzalez	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:	

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 22/07/25
ORDEN CLIENTE No.:
REMISIÓN: EF 11337

CLIENTE	Consorcio DC 2025	
OBRA	Nuevo Muzú	
DIRECCION		
MATERIAL	D. Asfalto	
PLACA VEHICULO	TFT 970	14.6 M3
CONDUCTOR	Camilo Montoya	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:	

Powered by CamScanner

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 22 07 25

ORDEN CLIENTE No.:

REMISIÓN: EF 11338

CLIENTE	Consorcio DC 2025	
OBRA	Nuevo Muzú	
DIRECCION		
MATERIAL	D. Asfalto	
PLACA VEHICULO	SRM 395	14.6 M3
CONDUCTOR	Juan D. Gonzalez	
DESPACHADO POR: MAGIR SAS. ESP	RECIBIDO POR:	

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 22 07 25

ORDEN CLIENTE No.:

REMISIÓN: EF 11339

CLIENTE	Consorcio DC 2025	
OBRA	Nuevo Muzú	
DIRECCION		
MATERIAL	D. Asfalto	
PLACA VEHICULO	TFT 970	14.6 M3
CONDUCTOR	Camilo Montoya	
DESPACHADO POR: MAGIR SAS. ESP	RECIBIDO POR:	

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 23 07 25

ORDEN CLIENTE No.:

REMISIÓN: EF 11340

CLIENTE	Consorcio DC 2025	
OBRA	Nuevo Muzú	
DIRECCION		
MATERIAL	D. Asfalto	
PLACA VEHICULO	SRM 395	14.6 M3
CONDUCTOR	Juan D. Gonzalez	
DESPACHADO POR: MAGIR SAS. ESP	RECIBIDO POR:	

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 23 07 25

ORDEN CLIENTE No.:

REMISIÓN: EF 11341

CLIENTE	Consorcio DC 2025	
OBRA	Nuevo Muzú	
DIRECCION		
MATERIAL	D. Concreto	
PLACA VEHICULO	TFT 970	15 M3
CONDUCTOR	Camilo montoya	
DESPACHADO POR: MAGIR SAS. ESP	RECIBIDO POR:	

Powered by CamScanner

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 01 07 25

ORDEN CLIENTE No.:

REMISIÓN: EF 10367

CLIENTE: Consorcio DC.
OBRA: Tanjuelito - El Carmen.
DIRECCION: El Carmen.
MATERIAL: Excavación.
PLACA VEHICULO: UVM 592 | 15 M3
CONDUCTOR: Dylan Henao.
DESPACHADO POR:
RECIBIDO POR: MAGIR SAS. ESP Servicio de Disposicion Final de Escombros

---

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 01 07 25

ORDEN CLIENTE No.:

REMISIÓN: EF 10368

CLIENTE: Consorcio DC.
OBRA: Tanjuelito.
DIRECCION: El Carmen.
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: UVM 593 | 15. M3
CONDUCTOR: Geovanny Santana
DESPACHADO POR:
RECIBIDO POR: MAGIR SAS. ESP Servicio de Disposicion Final de Escombros

---

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 01 07 25

ORDEN CLIENTE No.:

REMISIÓN: EF 10369

CLIENTE: Consorcio DC -
OBRA: Tanjuelito.
DIRECCION: El carmen.
MATERIAL: Excavación.
PLACA VEHICULO: VPS 399 | 15 M3
CONDUCTOR: Rafael Galindo.
DESPACHADO POR:
RECIBIDO POR: MAGIR SAS. ESP Servicio de Disposicion Final de Escombros

---

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 01 07 25

ORDEN CLIENTE No.:

REMISIÓN: EF 10370

CLIENTE: Consorcio DC-
OBRA: Tanjuelito.
DIRECCION: El carmen.
MATERIAL: Excavación.
PLACA VEHICULO: WSQ 928. | 15. M3
CONDUCTOR: Jose Garcia.
DESPACHADO POR:
RECIBIDO POR: MAGIR SAS. ESP Servicio de Disposicion Final de Escombros

---

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 4 7 25

ORDEN CLIENTE No.:

REMISIÓN: EF 10371

CLIENTE: Consorcio DC.
OBRA: Tanjuelito.
DIRECCION: El carmen.
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: SPV 659 | 15 M3
CONDUCTOR: Diego Vargas
DESPACHADO POR:
RECIBIDO POR: MAGIR SAS. ESP Servicio de Disposicion Final de Escombros

---

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 05 07 25

ORDEN CLIENTE No.:

REMISIÓN: EF 10372

CLIENTE: Consorcio DC.
OBRA: Tanjuelito.
DIRECCION: El carmen.
MATERIAL: Excavación.
PLACA VEHICULO: USC 504 | 15 M3
CONDUCTOR: Geovanny Santana
DESPACHADO POR:
RECIBIDO POR: MAGIR SAS. ESP Servicio de Disposicion Final de Escombros

Scanned with CamScanner

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 05 09 25

ORDEN CLIENTE No.:

REMISIÓN: EF 10373

CLIENTE: Concreto DC.
OBRA: Tunjuelito.
DIRECCION: El Carmen.
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: UVM 512 — 15 M3
CONDUCTOR: Dylan Henao.

DESPACHADO POR:

RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 05 09 25

ORDEN CLIENTE No.:

REMISIÓN: EF 10374

CLIENTE: Concreto DC.
OBRA: Tunjuelito.
DIRECCION: El carmen.
MATERIAL: Excavación.
PLACA VEHICULO: UVM 513 — 14 M3
CONDUCTOR: Geovanny Santana.

DESPACHADO POR:

RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 05 09 25

ORDEN CLIENTE No.:

REMISIÓN: EF 10375

CLIENTE: Concreto DC.
OBRA: Tunjuelito.
DIRECCION: El Carmen.
MATERIAL: Excavación.
PLACA VEHICULO: VBS 399 — 15 M3
CONDUCTOR: Rafael Galindo.

DESPACHADO POR:

RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 08 09 25

ORDEN CLIENTE No.:

REMISIÓN: EF 13705

CLIENTE: Concreto DC.
OBRA: Tunjuelito.
DIRECCION: El Carmen.
MATERIAL: Excavación.
PLACA VEHICULO: WGU 928 — 15 M3
CONDUCTOR: José Garoa

DESPACHADO POR:

RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 08 09 25

ORDEN CLIENTE No.:

REMISIÓN: EF 13706

CLIENTE: Concreto DC
OBRA: Tunjuelito
DIRECCION: El Carmen
MATERIAL: Excavación.
PLACA VEHICULO: SRV 609 — 14 M3
CONDUCTOR: Diego Vargas.

DESPACHADO POR:

RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 09 09 25

ORDEN CLIENTE No.:

REMISIÓN: EF 14739

CLIENTE: Concreto DC.
OBRA: Tunjuelito.
DIRECCION: El Carmen.
MATERIAL: Excavación.
PLACA VEHICULO: USC 604 — 15 M3
CONDUCTOR: Geovanny Mayo

DESPACHADO POR:

RECIBIDO POR:

Scanned with CamScanner

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 09 09 25

ORDEN CLIENTE No.:

REMISIÓN: EF 14740

CLIENTE: Consorcio OC.
OBRA: Tunjelito.
DIRECCION: El Carmen
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: WM 570 | 15 M3
CONDUCTOR: Dylan Heras
DESPACHADO POR:
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 09 09 25

ORDEN CLIENTE No.:

REMISIÓN: EF 14741

CLIENTE: Consorcio OC
OBRA: Tunjelito.
DIRECCION: El Carmen
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: WM503 | 13,63 M3
CONDUCTOR: Geovany Santana
DESPACHADO POR:
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 09 09 25

ORDEN CLIENTE No.:

REMISIÓN: EF 14742

CLIENTE: Consorcio OC.
OBRA: Tunjelito.
DIRECCION: El Carmen.
MATERIAL: Excavación.
PLACA VEHICULO: UPS399 | 15 M3
CONDUCTOR: Rafael Galindo
DESPACHADO POR:
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 12 09 25

ORDEN CLIENTE No.:

REMISIÓN: EF 14743

CLIENTE: Consorcio OC.
OBRA: Tunjelito.
DIRECCION: Nuevo Muzu.
MATERIAL: Excavación.
PLACA VEHICULO: WGU928. | 15 M3
CONDUCTOR: Jose García
DESPACHADO POR:
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 12 09 25

ORDEN CLIENTE No.:

REMISIÓN: EF 14744

CLIENTE: Consorcio OC
OBRA: Tunjelito.
DIRECCION: Nuevo Muzu.
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: SPV659 | 16 M
CONDUCTOR: Diego Vargas
DESPACHADO POR:
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 12 09 25

ORDEN CLIENTE No.:

REMISIÓN: EF 14745

CLIENTE: Consorcio OC.
OBRA: Tunjelito.
DIRECCION: Nuevo Muzu.
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: USC604 | 15
CONDUCTOR: Geovany Mejia
DESPACHADO POR:
RECIBIDO POR:

Scanned with CamScanner

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alticos. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 12 09 25

REMISIÓN: EF 14746

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE	Consorcio DC.	
OBRA	Tunjelito	
DIRECCION	Nuevo Usme.	
MATERIAL	Excavación.	
PLACA VEHICULO	WIM 672	16 M3
CONDUCTOR	Dylan Henao.	
DESPACHADO POR:		RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alticos. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 12 09 25

REMISIÓN: EF 14747

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE	Consorcio DC	
OBRA	Tunjelito	
DIRECCION	Nuevo Usme.	
MATERIAL	Excavación	
PLACA VEHICULO	WIM 573	15 M3
CONDUCTOR	Greanny Santana	
DESPACHADO POR:		RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alticos. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 12 09 25

REMISIÓN: EF 14748

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE	Consorcio DC	
OBRA	Tunjelito.	
DIRECCION	Nuevo Usme.	
MATERIAL	Excavación.	
PLACA VEHICULO	UPS 399	15 M3
CONDUCTOR	Rafael Galindo.	
DESPACHADO POR:		RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alticos. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 12 09 25

REMISIÓN: EF 14749

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE	Consorcio DC	
OBRA	Tunjelito.	
DIRECCION	Nuevo Usme.	
MATERIAL	Excavación	
PLACA VEHICULO	WGU 928	16 M3
CONDUCTOR	José Garcia	
DESPACHADO POR:		RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alticos. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 12 09 25

REMISIÓN: EF 14750

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE	Consorcio DC.	
OBRA	Tunjelito.	
DIRECCION	Nuevo Usme.	
MATERIAL	Excavación.	
PLACA VEHICULO	SPV 659	15 M3
CONDUCTOR	Diego Vargas	
DESPACHADO POR:		RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alticos. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 12 09 25

REMISIÓN: EF 14560

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE	Consorcio DC	
OBRA	Tunjelito	
DIRECCION	Nuevo Usme.	
MATERIAL	Excavación.	
PLACA VEHICULO	USC 604	15 M3
CONDUCTOR	Greanny Maya	
DESPACHADO POR:		RECIBIDO POR:

Scanned with CamScanner

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

REMISIÓN EF 14561

FECHA 12 09 25

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE Consorcio DC
OBRA Tanjuelito.
DIRECCION Nuevo Usme.
MATERIAL Excavación.
PLACA VEHICULO UVM 502 — 16. M3
CONDUCTOR Dylan Henao.
DESPACHADO POR: — RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

REMISIÓN EF 14562

FECHA 14 09 25

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE Consorcio DC.
OBRA Tanjuelito
DIRECCION Nuevo Usme.
MATERIAL Excavación
PLACA VEHICULO UVM 503 — 15 M3
CONDUCTOR Geovanny Santana
DESPACHADO POR: — RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

REMISIÓN EF 14563

FECHA 14 09 25

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE Consorcio DC
OBRA Tanjuelito
DIRECCION Nuevo Usme.
MATERIAL Excavación
PLACA VEHICULO UPS 399 — 15 M3
CONDUCTOR Rafael Galindo.
DESPACHADO POR: — RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

REMISIÓN EF 14564

FECHA 14 09 25

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE Consorcio DC.
OBRA Tanjuelito.
DIRECCION Nuevo Usme.
MATERIAL Excavación
PLACA VEHICULO WSU 928 — 16,91 M3
CONDUCTOR Jose Garcia
DESPACHADO POR: — RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

REMISIÓN EF 14565

FECHA 14 09 25

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE Consorcio DC
OBRA Tanjuelito.
DIRECCION Nuevo Usme.
MATERIAL Excavación.
PLACA VEHICULO SPV 659 — 15 M3
CONDUCTOR Diego Vargas
DESPACHADO POR: — RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

REMISIÓN EF 14566

FECHA 15 09 25

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE Consorcio DC
OBRA Tanjuelito
DIRECCION Nuevo Usme.
MATERIAL Excavación.
PLACA VEHICULO WSC 504 — 15 M3
CONDUCTOR Geovanny Maya
DESPACHADO POR: — RECIBIDO POR:

Scanned with CamScanner

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alisos. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

REMISIÓN EF 14567

FECHA 15 01 25

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE Consorcio DC
OBRA Tynjelito.
DIRECCION Nuevo Usme.
MATERIAL Excavacion.
PLACA VEHICULO UVM 592 | 16 M3
CONDUCTOR Dylan Henao
DESPACHADO POR: | RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alisos. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

REMISIÓN EF 14568

FECHA 15 01 25

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE Consorcio DC
OBRA Tynjelito
DIRECCION Nuevo Usme.
MATERIAL Excavacion.
PLACA VEHICULO UVM 593 | 16 M3
CONDUCTOR Giovanny Santana
DESPACHADO POR: | RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alisos. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

REMISIÓN EF 14569

FECHA 15 01 25

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE Consorcio DC.
OBRA Tynjelito
DIRECCION Nuevo Usme.
MATERIAL Excavación.
PLACA VEHICULO UPS 399 | 15 M3
CONDUCTOR Rafael Gabriel
DESPACHADO POR: | RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alisos. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

REMISIÓN EF 14570

FECHA 16 01 25

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE Consorcio DC
OBRA Tynjelito
DIRECCION Abraham Lincoln.
MATERIAL Excavación.
PLACA VEHICULO WGU 928 | 15 M3
CONDUCTOR José García.
DESPACHADO POR: | RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alisos. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

REMISIÓN EF 14571

FECHA 16 01 25

ORDEN CLIENTE

CLIENTE Consorcio DC
OBRA Tynjelito
DIRECCION Abraham Lincoln
MATERIAL Excavacion
PLACA VEHICULO SPV 659 | 15
CONDUCTOR Diego Vargas.
DESPACHADO POR: | RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alisos. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

REMISIÓN EF 14572

FECHA 16 01 25

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE Consorcio DC.
OBRA Tynjelito.
DIRECCION Abraham Lincoln
MATERIAL Excavacion.
PLACA VEHICULO USC 004 | 15 M3
CONDUCTOR Giovanny Maya
DESPACHADO POR: | RECIBIDO POR:

Scanned with CamScanner

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 16 07 25

ORDEN CLIENTE No.:

REMISIÓN: EF 14573

CLIENTE: Consorcio DC.
OBRA: Tunjelito.
DIRECCION: Abraham Lincoln.
MATERIAL: Excavación.
PLACA VEHICULO: WM 572 | 15
CONDUCTOR: Dylan Henao
DESPACHADO POR:
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 16 07 25

ORDEN CLIENTE No.:

REMISIÓN: EF 14574

CLIENTE: Consorcio DC
OBRA: Tunjelito
DIRECCION: Abraham Lincoln.
MATERIAL: Excavación.
PLACA VEHICULO: UVM 573 | 15 M3
CONDUCTOR: Geovanny Santana
DESPACHADO POR:
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 17 07 25

ORDEN CLIENTE No.:

REMISIÓN: EF 14575

CLIENTE: Consorcio DC.
OBRA: Tunjelito.
DIRECCION: Abraham Lincoln.
MATERIAL: Excavación.
PLACA VEHICULO: VPS 399 | 15 M3
CONDUCTOR: Rafael Galindo
DESPACHADO POR:
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 17 07 25

ORDEN CLIENTE No.:

REMISIÓN: EF 14576

CLIENTE: Consorcio DC.
OBRA: Tunjelito.
DIRECCION: Abraham Lincoln.
MATERIAL: Excavación.
PLACA VEHICULO: WGW928 | 15 M3
CONDUCTOR: José Garcia.
DESPACHADO POR:
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 17 07 25

ORDEN CLIENTE No.:

REMISIÓN: EF 14577

CLIENTE: Consorcio DC
OBRA: Tunjelito.
DIRECCION: Abraham Lincoln.
MATERIAL: Excavación.
PLACA VEHICULO: SPV 659 | 15 M3
CONDUCTOR: Diego Vargas.
DESPACHADO POR:
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 17 07 25

ORDEN CLIENTE No.:

REMISIÓN: EF 14578

CLIENTE: Consorcio DC
OBRA: Tunjelito.
DIRECCION: Abraham Lincoln.
MATERIAL: Excavación.
PLACA VEHICULO: USC 804 | 15 M3
CONDUCTOR: Geovanny Haya
DESPACHADO POR:
RECIBIDO POR:

Scanned with CamScanner

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

REMISIÓN **EF 14579**

FECHA 10 07 25

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE	Consorcio OC.	
OBRA	Tunjuelito	
DIRECCION	Abraham Lincoln.	
MATERIAL	Excavación.	
PLACA VEHICULO	UVM 592	15 M3
CONDUCTOR	Dylan Hanao	
DESPACHADO POR:		RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

REMISIÓN **EF 14580**

FECHA 10 07 25

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE	Consorcio OC.	
OBRA	Tunjuelito	
DIRECCION	Abraham Lincoln.	
MATERIAL	Excavación.	
PLACA VEHICULO	UVM 593	15 M3
CONDUCTOR	Geovanny Santana	
DESPACHADO POR:		RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

REMISIÓN **EF 14581**

FECHA 10 07 25

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE	Consorcio OC.	
OBRA	Tunjuelito.	
DIRECCION	Abraham Lincoln.	
MATERIAL	excavación.	
PLACA VEHICULO	UPS 399	15 M3
CONDUCTOR	Rafael Galindo.	
DESPACHADO POR:		RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

REMISIÓN **EF 14582**

FECHA 10 07 25

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE	Consorcio OC.	
OBRA	Tunjuelito.	
DIRECCION	Abraham Lincoln.	
MATERIAL	Excavación.	
PLACA VEHICULO	WGU 928	15 M3
CONDUCTOR	José Garcia	
DESPACHADO POR:		RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

REMISIÓN **EF 14583**

FECHA 10 07 25

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE	Consorcio OC	
OBRA	Tunjuelito.	
DIRECCION	Abraham Lincoln.	
MATERIAL	Excavación.	
PLACA VEHICULO	SPV 659	15 M3
CONDUCTOR	Diego Vargas	
DESPACHADO POR:		RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

REMISIÓN **EF 14584**

FECHA 10 07 25

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE	Consorcio OC.	
OBRA	Tunjuelito	
DIRECCION	Abraham Lincoln.	
MATERIAL	Excavación.	
PLACA VEHICULO	USC 504	15 M3
CONDUCTOR	Geovanny Moya	
DESPACHADO POR:		RECIBIDO POR:

Scanned with CamScanner

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 19/09/25
ORDEN CLIENTE No.:
REMISIÓN: EF 14585

CLIENTE	Consorcio DC.	
OBRA	Tunjuelito.	
DIRECCION	Abraham Lincoln.	
MATERIAL	Excavación.	
PLACA VEHICULO	UMI 593	15 M3
CONDUCTOR	Dylan Henao.	
DESPACHADO POR:		RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 01/09/25
ORDEN CLIENTE No.:
REMISIÓN: EF 14586

CLIENTE	Consorcio DC.	
OBRA	Tunjuelito.	
DIRECCION	Abraham Lincoln	
MATERIAL	Excavación.	
PLACA VEHICULO	UMI 593	15 M3
CONDUCTOR	Geovanny Santana	
DESPACHADO POR:		RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 01/09/25
ORDEN CLIENTE No.:
REMISIÓN: EF 14587

CLIENTE	Consorcio DC.	
OBRA	Tunjelito.	
DIRECCION	Abraham Lincoln.	
MATERIAL	Excavación.	
PLACA VEHICULO	UPS 399	15 M3
CONDUCTOR	Rafael Galindo	
DESPACHADO POR:		RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 22/09/25
ORDEN CLIENTE No.:
REMISIÓN: EF 14588

CLIENTE	Consorcio DC.	
OBRA	Tunjelito.	
DIRECCION	Abraham Lincoln.	
MATERIAL	Excavación.	
PLACA VEHICULO	UGU 928	15 M3
CONDUCTOR	Jose Garcia	
DESPACHADO POR:		RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 22/09/25
ORDEN CLIENTE No.:
REMISIÓN: EF 14589

CLIENTE	Consorcio DC.	
OBRA	Tunjelito.	
DIRECCION	Abraham Lincoln.	
MATERIAL	Excavación.	
PLACA VEHICULO	SRV 659	15 M3
CONDUCTOR	Diego Vargas	
DESPACHADO POR:		RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 22/09/25
ORDEN CLIENTE No.:
REMISIÓN: EF 14590

CLIENTE	Consorcio DC.	
OBRA	Tunjelito	
DIRECCION	Abraham Lincoln.	
MATERIAL	Excavación.	
PLACA VEHICULO	USE 804	15 M3
CONDUCTOR	Geovanny Mejia.	
DESPACHADO POR:		RECIBIDO POR:

Scanned with CamScanner

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

REMISIÓN **EF 14591**

FECHA: 23 09 25

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE	Consorcio DC.	
OBRA	Tunjelito.	
DIRECCION	Abraham Lincoln.	
MATERIAL	Excavación.	
PLACA VEHICULO	UVM 572	15 M3
CONDUCTOR	Dylan Henao.	
DESPACHADO POR:		RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

REMISIÓN **EF 14592**

FECHA: 23 09 25

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE	Consorcio DC	
OBRA	Tunjelito.	
DIRECCION	Abraham Lincoln.	
MATERIAL	Excavación.	
PLACA VEHICULO	UVM 573	15 M3
CONDUCTOR	Geovanny Sarbana	
DESPACHADO POR:		RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

REMISIÓN **EF 14593**

FECHA: 23 09 25

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE	Consorcio DC.	
OBRA	Tunjelito	
DIRECCION	Abraham Lincoln.	
MATERIAL	Excavación.	
PLACA VEHICULO	UPS 399	15 M3
CONDUCTOR	Rafael Galindo	
DESPACHADO POR:		RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

REMISIÓN **EF 14594**

FECHA: 23 09 25

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE	Consorcio DC.	
OBRA	Tunjelito.	
DIRECCION	Abraham Lincoln.	
MATERIAL	Excavación	
PLACA VEHICULO	WGIL 928	15 M3
CONDUCTOR	Jose Garcia.	
DESPACHADO POR:		RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

REMISIÓN **EF 14595**

FECHA: 23 09 25

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE	Consorcio DC.	
OBRA	Tunjelito.	
DIRECCION	Abraham Lincoln.	
MATERIAL	Excavación.	
PLACA VEHICULO	SPV 659	15 M3
CONDUCTOR	Diego Vargas	
DESPACHADO POR:		RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

REMISIÓN **EF 14596**

FECHA: 23 09 25

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE	Consorcio DC.	
OBRA	Tunjelito.	
DIRECCION	Abraham Lincoln.	
MATERIAL	Excavacion.	
PLACA VEHICULO	USC 504	15 M3
CONDUCTOR	Geovanny Mayo	
DESPACHADO POR:		RECIBIDO POR:

Scanned with CamScanner

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

REMISIÓN **EF 14597**

FECHA: 23 | 01 | 25

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE	Consorcio DC.	
OBRA	Tunjuelito.	
DIRECCION	Abraham Lincoln.	
MATERIAL	Excavación.	
PLACA VEHICULO	WM 512	15 M3
CONDUCTOR	Dylan Hirao	
DESPACHADO POR:		RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

REMISIÓN **EF 14598**

FECHA: 24 | 01 | 25

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE	Consorcio DC.	
OBRA	Tunjuelito.	
DIRECCION	Abraham Lincoln.	
MATERIAL	Excavación.	
PLACA VEHICULO	WM 513	15 M3
CONDUCTOR	Geovanny Santana	
DESPACHADO POR:		RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

REMISIÓN **EF 14599**

FECHA: 24 | 01 | 25

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE	Consorcio DC.	
OBRA	Tunjuelito.	
DIRECCION	Abraham Lincoln.	
MATERIAL	Excavación.	
PLACA VEHICULO	UPS 399	15 M3
CONDUCTOR	Rafael Galindo	
DESPACHADO POR:		RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

REMISIÓN **EF 14600**

FECHA: 24 | 01 | 25

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE	Consorcio DC	
OBRA	Tunjuelito.	
DIRECCION	Abraham Lincoln.	
MATERIAL	Excavación.	
PLACA VEHICULO	WGU 928	15 M3
CONDUCTOR	Jose García	
DESPACHADO POR:		RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

REMISIÓN **EF 14301**

FECHA: 24 | 01 | 25

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE	Consorcio DC	
OBRA	Tunjuelito	
DIRECCION	Abraham Lincoln.	
MATERIAL	Excavación.	
PLACA VEHICULO	SPV 659	15 M3
CONDUCTOR	Diego Vargas	
DESPACHADO POR:		RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

REMISIÓN **EF 14302**

FECHA: 24 | 01 | 25

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE	Consorcio DC.	
OBRA	Tunjuelito.	
DIRECCION	Abraham Lincoln.	
MATERIAL	Excavación.	
PLACA VEHICULO	USC 504	15 M3
CONDUCTOR	Geovanny Mejía	
DESPACHADO POR:		RECIBIDO POR:

Scanned with CamScanner

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

REMISIÓN **EF 14303**

FECHA 24/07/25

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE Consorcio DC.
OBRA Tunjelito
DIRECCION Abraham Lincoln.
MATERIAL Excavación.
PLACA VEHICULO UVM 573 — 16,41 M3
CONDUCTOR Dylan Henao
DESPACHADO POR:
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

REMISIÓN **EF 14304**

FECHA 25/07/25

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE Consorcio DC.
OBRA Tunjelito.
DIRECCION Abraham Lincoln.
MATERIAL Excavación.
PLACA VEHICULO UVM 573 — 15 M3
CONDUCTOR Geovanny Santana
DESPACHADO POR:
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

REMISIÓN **EF 14305**

FECHA 25/07/25

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE Consorcio DC.
OBRA Tunjelito.
DIRECCION Abraham Lincoln.
MATERIAL Excavación.
PLACA VEHICULO UPS 399 — 10 M3
CONDUCTOR Rafael Galindo
DESPACHADO POR:
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

REMISIÓN **EF 14306**

FECHA 25/07/25

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE Consorcio DC.
OBRA Tunjelito.
DIRECCION Abraham Lincoln.
MATERIAL Excavación.
PLACA VEHICULO TWU 958 — 15 M3
CONDUCTOR Jose Garcia
DESPACHADO POR:
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

REMISIÓN **EF 14307**

FECHA 25/07/25

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE Consorcio DC.
OBRA Tunjelito.
DIRECCION Abraham Lincoln.
MATERIAL Excavación.
PLACA VEHICULO SPV 659 — 15 M3
CONDUCTOR Diego Vargas
DESPACHADO POR:
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

REMISIÓN **EF 14308**

FECHA 25/07/25

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE Consorcio DC.
OBRA Tunjelito.
DIRECCION Abraham Lincoln.
MATERIAL Excavación.
PLACA VEHICULO USC 504 — 15 M3
CONDUCTOR Geovanny Moya
DESPACHADO POR:
RECIBIDO POR:

Scanned with CamScanner

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 25 09 25

REMISIÓN: EF 14309

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE: Consorcio DC.
OBRA: Tunjuelito.
DIRECCION: Abraham Lincoln.
MATERIAL: Excavación.
PLACA VEHICULO: uvm 573 | 15 M3
CONDUCTOR: Dylan Henao.
DESPACHADO POR: | RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 25 09 25

REMISIÓN: EF 14310

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE: Consorcio DC.
OBRA: Tunjuelito.
DIRECCION: Abraham Lincoln.
MATERIAL: Excavación.
PLACA VEHICULO: uvm 573 | 15 M3
CONDUCTOR: Geovanny Santana
DESPACHADO POR: | RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 26 09 25

REMISIÓN: EF 14311

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE: Consorcio DC.
OBRA: Tunjuelito.
DIRECCION: Abraham Lincoln.
MATERIAL: Excavación.
PLACA VEHICULO: UPS 359 | 15 M3
CONDUCTOR: Rafael Galindo
DESPACHADO POR: | RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 26 09 25

REMISIÓN: EF 14312

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE: Consorcio DC.
OBRA: Tunjuelito.
DIRECCION: Abraham Lincoln.
MATERIAL: Excavación.
PLACA VEHICULO: wgw 938 | 15 M3
CONDUCTOR: José Aparo
DESPACHADO POR: | RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 26 09 25

REMISIÓN: EF 14313

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE: Consorcio DC.
OBRA: Tunjuelito
DIRECCION: Abraham Lincoln.
MATERIAL: Excavación.
PLACA VEHICULO: SPV 659 | 15 M3
CONDUCTOR: Diego Vargas.
DESPACHADO POR: | RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 26 09 25

REMISIÓN: EF 14314

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE: Consorcio DC.
OBRA: Tunjuelito.
DIRECCION: Abraham Lincoln.
MATERIAL: Excavación.
PLACA VEHICULO: USC 004 | 15 M3
CONDUCTOR: Geovanny maya
DESPACHADO POR: | RECIBIDO POR:

Scanned with CamScanner

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

REMISIÓN **EF 14315**

FECHA: 28 07 25

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE	Cantarco DC.	
OBRA	Tunjuelito.	
DIRECCION	Abraham Lincoln.	
MATERIAL	Excavación.	
PLACA VEHICULO	WMS 012	16 M3
CONDUCTOR	Dylan Henao	
DESPACHADO POR:		RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

REMISIÓN **EF 14316**

FECHA: 28 07 25

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE	Cantarco DC	
OBRA	Tunjuelito	
DIRECCION	Abraham Lincoln.	
MATERIAL	Excavación.	
PLACA VEHICULO	WMS 013	15 M3
CONDUCTOR	Greanny Santana	
DESPACHADO POR:		RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

REMISIÓN **EF 14317**

FECHA: 28 07 25

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE	Cantarco DC.	
OBRA	Tunjuelito.	
DIRECCION	Abraham Lincoln.	
MATERIAL	Excavación.	
PLACA VEHICULO	WPS 399	15 M3
CONDUCTOR	Rafael Galindo	
DESPACHADO POR:		RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

REMISIÓN **EF 14318**

FECHA: 28 07 25

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE	Cantarco DC.	
OBRA	Tunjuelito.	
DIRECCION	Abraham Lincoln.	
MATERIAL	Excavación.	
PLACA VEHICULO	WGU928	15 M3
CONDUCTOR	Jose Garcia	
DESPACHADO POR:		RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

REMISIÓN **EF 14319**

FECHA: 28 07 25

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE	Cantarco DC	
OBRA	Tunjuelito.	
DIRECCION	Abraham Lincoln.	
MATERIAL	Excavación.	
PLACA VEHICULO	SPV 659	15 M3
CONDUCTOR	Diego Vargas	
DESPACHADO POR:		RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

REMISIÓN **EF 14320**

FECHA: 28 07 25

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE	Cantarco DC.	
OBRA	Tunjuelito.	
DIRECCION	Abraham Lincoln	
MATERIAL	Excavacion.	
PLACA VEHICULO	USC 004	16 M3
CONDUCTOR	Greanny Mejia.	
DESPACHADO POR:		RECIBIDO POR:

Scanned with CamScanner

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 29 07 25

REMISIÓN: EF 14321

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE	Consorcio DC.	
OBRA	Tejuelito.	
DIRECCION	Abraham Lincoln.	
MATERIAL	Excavación.	
PLACA VEHICULO	WM 892.	15 M3
CONDUCTOR	Dylan Herrera	
DESPACHADO POR:		RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 29 07 25

REMISIÓN: EF 14322

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE	Consorcio DC.	
OBRA	Tejuelito	
DIRECCION	Abraham Lincoln.	
MATERIAL	Excavación.	
PLACA VEHICULO	WM 593	15 M3
CONDUCTOR	Geovanny Santana	
DESPACHADO POR:		RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 29 07 25

REMISIÓN: EF 14323

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE	Consorcio DC.	
OBRA	Tejuelito.	
DIRECCION	Abraham Lincoln.	
MATERIAL	Excavación.	
PLACA VEHICULO	UPS 379	15 M3
CONDUCTOR	Rafael Galindo	
DESPACHADO POR:		RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 29 07 25

REMISIÓN: EF 14324

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE	Consorcio DC.	
OBRA	Tejuelito.	
DIRECCION	Abraham Lincoln.	
MATERIAL	Excavación.	
PLACA VEHICULO	WGU 928	15 M3
CONDUCTOR	Jose Garcia.	
DESPACHADO POR:		RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 29 07 25

REMISIÓN: EF 14325

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE	Consorcio DC.	
OBRA	Tejuelito.	
DIRECCION	Abraham Lincoln.	
MATERIAL	Excavación.	
PLACA VEHICULO	SPV 659	16 M3
CONDUCTOR	Diego Vargas	
DESPACHADO POR:		RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 29 07 25

REMISIÓN: EF 14326

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE	Consorcio DC.	
OBRA	Tejuelito.	
DIRECCION	Abraham Lincoln.	
MATERIAL	Excavación.	
PLACA VEHICULO	USL 504	15 M3
CONDUCTOR	Geovanny Mejia	
DESPACHADO POR:		RECIBIDO POR:

Scanned with CamScanner

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 29 07 25

REMISIÓN: EF 14327

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE: Consorcio DC
OBRA: Tynjuelito.
DIRECCION: Abraham Lincoln.
MATERIAL: Excavación.
PLACA VEHICULO: WM 573 — 15 M3
CONDUCTOR: Dylan Henao.
DESPACHADO POR:
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 30 07 25

REMISIÓN: EF 14328

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE: Consorcio DC.
OBRA: Tynjuelito
DIRECCION: Abraham Lincoln.
MATERIAL: Excavación.
PLACA VEHICULO: WM 573 — 15 M3
CONDUCTOR: Geovanny Santana.
DESPACHADO POR:
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 30 07 25

REMISIÓN: EF 14329

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE: Consorcio DC.
OBRA: Tynjuelito.
DIRECCION: Abraham Lincoln.
MATERIAL: Excavación.
PLACA VEHICULO: UPS 399 — 15 M3
CONDUCTOR: Rafael Galindo
DESPACHADO POR:
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 30 07 25

REMISIÓN: EF 14330

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE: Consorcio DC.
OBRA: Tynjuelito.
DIRECCION: Abraham Lincoln.
MATERIAL: Excavación.
PLACA VEHICULO: WGU 928 — 15 M3
CONDUCTOR: Jose Garcia.
DESPACHADO POR:
RECIBIDO POR:

Scanned with CamScanner

Abraham

Recibo 2049

Granulados Reciclados de Colombia Greco

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S NIT. 900767473-7

Vale de Recepción Nro.: **PBT VD A004170-263-2025 Generado el: 2025-07-21**

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

FECHA Y HORA DE INGRESO: 2025-07-21 12:21:24

TRANSPORTE	DATOS DEL GENERADOR	DATOS DEL GESTOR
TRANSPORTADOR(A): **NO DE IDENTIFICACION:** **CONDUCTOR:** GEOVANNY MOYA **NO DE IDENTIFICACION:** 1015439400 **PLACA VEHICULO:** USC504 **PIN-TRANS:** NA **TIPO VEHICULO:** Doble	**GENERADORA:**INGECOP OBRAS CIVILES SAS **NIT:** 901583763 **PIN-GEN:**NA **TELEFONO:** 3163091076 **NOMBRE OBRA:** NA **DIRECCION:** MOLINOS **MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ, D.C.	**NOMBRE:** GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S **NIT:** 900.767.473-7 **PIN:** 19309 **REPRESENTANTE LEGAL:** Javier Alexander Castillo González **DIRECCION:** • Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur, Vereda Siberia Cota – Cundinamarca • Avenida Boyacá # 73 - 00 SUR, localidad de Ciudad Bolívar

CLASIFICACIÓN DE MATERIAL: Pétreos	TIPO: **(Concreto, ladrillos, asfalto)**	CANTIDAD: **(m3 Y Ton)**
Observaciones:	Asfalto	13 (m3) - 16.64 Ton

Nombre del conductor	**Nombre del encargado obra**	**Nombre del responsable - CTA**
CC:	CC:	Javier Alexander Castillo González NIT:900767473-7

Nota: La información incluida en este vale, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a GRECO, por lo cual declara y garantiza a GRECO que la información suministrada es verdadera, completa y fidedigna, y exime a GRECO de toda responsabilidad con respecto a la misma. Para generar su certificado de disposición de manera rápida y sencilla, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.recicladosgreco.com y utilizar la función 'Genere su certificado' que encontrará en el encabezado, diligencie usuario y contraseña. Si aún no dispone de usuario y contraseña, por favor envíe una solicitud a la dirección de correo electrónico analistacomercial@recicladosgreco.com. Estaremos encantados de asistirle en el proceso, para mas información Cel. 3176575562.

Powered by CamScanner

Recibo 2044

Granulados Reciclados de Colombia Greco

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S NIT. 900767473-7

Vale de Recepción Nro.: **PBT VD A004170-266-2025 Generado el: 2025-07-22** OK

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

FECHA Y HORA DE INGRESO: 2025-07-22 06:28:15

TRANSPORTE	DATOS DEL GENERADOR	DATOS DEL GESTOR
TRANSPORTADOR(A): **NO DE IDENTIFICACION:** **CONDUCTOR:** DIEGO ARMANDO VARGAS PATIÑO **NO DE IDENTIFICACION:** 1033718626 **PLACA VEHICULO:** SPV659 **PIN-TRANS:** NA **TIPO VEHICULO:** Doble	**GENERADORA:**INGECOP OBRAS CIVILES SAS **NIT:** 901583763 **PIN-GEN:**NA **TELEFONO:** 3163091076 **NOMBRE OBRA:** NA **DIRECCION:** TUNJUELITO **MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ, D.C.	**NOMBRE:** GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S **NIT:** 900.767.473-7 **PIN:** 19309 **REPRESENTANTE LEGAL:** Javier Alexander Castillo González **DIRECCION:** • Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur, Vereda Siberia Cota – Cundinamarca • Avenida Boyacá # 73 - 00 SUR, localidad de Ciudad Bolívar

CLASIFICACIÓN DE MATERIAL: Pétreos	TIPO: (Concreto, ladrillos, asfalto)	CANTIDAD: (m3 Y Ton)
Observaciones:	Asfalto	14 (m3) - 17.92 Ton

Nombre del conductor	Nombre del encargado obra	Nombre del responsable - CTA
CC:	CC:	Javier Alexander Castillo González NIT:900767473-7

Nota: La información incluida en este vale, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a GRECO, por lo cual declara y garantiza a GRECO que la información suministrada es verdadera, completa y fidedigna, y exime a GRECO de toda responsabilidad con respecto a la misma. Para generar su certificado de disposición de manera rápida y sencilla, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.recicladosgreco.com y utilizar la función 'Genere su certificado' que encontrará en el encabezado, diligencie usuario y contraseña. Si aún no dispone de usuario y contraseña, por favor envíe una solicitud a la dirección de correo electrónico analistacomercial@recicladosgreco.com. Estaremos encantados de asistirle en el proceso, para mas información Cel. 3176575562.

Powered by CamScanner

Recibo 2045

Granulados Reciclados de Colombia Greco

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S NIT. 900767473-7

Vale de Recepción Nro.: **PBT VD A004170-264-2025 Generado el: 2025-07-21** OK

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

FECHA Y HORA DE INGRESO: 2025-07-21 13:56:40

TRANSPORTE	DATOS DEL GENERADOR	DATOS DEL GESTOR
TRANSPORTADOR(A): **NO DE IDENTIFICACION:** **CONDUCTOR:** DIEGO ARMANDO VARGAS PATIÑO **NO DE IDENTIFICACION:** 1033718626 **PLACA VEHICULO:** SPV659 **PIN-TRANS:** NA **TIPO VEHICULO:** Doble	**GENERADORA:**INGECOP OBRAS CIVILES SAS **NIT:** 901583763 **PIN-GEN:**NA **TELEFONO:** 3163091076 **NOMBRE OBRA:** NA **DIRECCION:** TUNJUELITO **MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ, D.C.	**NOMBRE:** GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S **NIT:** 900.767.473-7 **PIN:** 19309 **REPRESENTANTE LEGAL:** Javier Alexander Castillo González **DIRECCION:** • Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur, Vereda Siberia Cota – Cundinamarca • Avenida Boyacá # 73 - 00 SUR, localidad de Ciudad Bolívar

CLASIFICACIÓN DE MATERIAL: Pétreos	TIPO: (Concreto, ladrillos, asfalto)	CANTIDAD: (m3 Y Ton)
Observaciones:	Heterogéneo	15 (m3) - 19.2 Ton

Nombre del conductor	Nombre del encargado obra	Nombre del responsable - CTA
CC:	CC:	Javier Alexander Castillo González NIT:900767473-7

Nota: La información incluida en este vale, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a GRECO, por lo cual declara y garantiza a GRECO que la información suministrada es verdadera, completa y fidedigna, y exime a GRECO de toda responsabilidad con respecto a la misma. Para generar su certificado de disposición de manera rápida y sencilla, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.recicladosgreco.com y utilizar la función 'Genere su certificado' que encontrará en el encabezado, diligencie usuario y contraseña. Si aún no dispone de usuario y contraseña, por favor envíe una solicitud a la dirección de correo electrónico analistacomercial@recicladosgreco.com. Estaremos encantados de asistirle en el proceso, para mas información Cel. 3176575562.

Powered by CamScanner

Recibo 2046

Granulados Reciclados de Colombia Greco

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S NIT. 900767473-7

Vale de Recepción Nro.: **PBT VD A004170-265-2025 Generado el: 2025-07-21** OK

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

FECHA Y HORA DE INGRESO: 2025-07-21 16:00:36

TRANSPORTE	DATOS DEL GENERADOR	DATOS DEL GESTOR
TRANSPORTADOR(A): **NO DE IDENTIFICACION:** **CONDUCTOR:** DIEGO ARMANDO VARGAS PATIÑO **NO DE IDENTIFICACION:** 1033718626 **PLACA VEHICULO:** SPV659 **PIN-TRANS:** NA **TIPO VEHICULO:** Doble	**GENERADORA:**INGECOP OBRAS CIVILES SAS **NIT:** 901583763 **PIN-GEN:**NA **TELEFONO:** 3163091076 **NOMBRE OBRA:** NA **DIRECCION:** TUNJUELITO **MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ, D.C.	**NOMBRE:** GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S **NIT:** 900.767.473-7 **PIN:** 19309 **REPRESENTANTE LEGAL:** Javier Alexander Castillo González **DIRECCION:** • Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur, Vereda Siberia Cota – Cundinamarca • Avenida Boyacá # 73 - 00 SUR, localidad de Ciudad Bolívar

CLASIFICACIÓN DE MATERIAL: Pétreos	TIPO: (Concreto, ladrillos, asfalto)	CANTIDAD: (m3 Y Ton)
Observaciones:	Asfalto	15 (m3) - 19.2 Ton

Nombre del conductor	Nombre del encargado obra	Nombre del responsable - CTA
CC:	CC:	Javier Alexander Castillo González NIT:900767473-7

Nota: La información incluida en este vale, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a GRECO, por lo cual declara y garantiza a GRECO que la información suministrada es verdadera, completa y fidedigna, y exime a GRECO de toda responsabilidad con respecto a la misma. Para generar su certificado de disposición de manera rápida y sencilla, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.reciclադosgreco.com y utilizar la función 'Genere su certificado' que encontrará en el encabezado, diligencie usuario y contraseña. Si aún no dispone de usuario y contraseña, por favor envíe una solicitud a la dirección de correo electrónico analistacomercial@reciclադosgreco.com. Estaremos encantados de asistirle en el proceso, para mas información Cel. 3176575562.

Powered by CamScanner

Recibo 2126

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S NIT. 900767473-7

Granulados Reciclados de Colombia Greco

Vale de Recepción Nro.: **PBT VD A004170-273-2025** **Generado el: 2025-07-28**

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

FECHA Y HORA DE INGRESO: 2025-07-28 14:34:47

TRANSPORTE	DATOS DEL GENERADOR	DATOS DEL GESTOR
TRANSPORTADOR(A): **NO DE IDENTIFICACION:** **CONDUCTOR:** DIEGO ARMANDO VARGAS PATIÑO **NO DE IDENTIFICACION:** 1033718626 **PLACA VEHICULO:** SPV659 **PIN-TRANS:** NA **TIPO VEHICULO:** Doble	**GENERADORA:**INGECOP OBRAS CIVILES SAS **NIT:** 901583763 **PIN-GEN:**NA **TELEFONO:** 3163091076 **NOMBRE OBRA:** NA **DIRECCION:** TUNJUELITO **MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ, D.C.	**NOMBRE:** GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S **NIT:** 900.767.473-7 **PIN:** 19309 **REPRESENTANTE LEGAL:** Javier Alexander Castillo González **DIRECCION:** • Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur, Vereda Siberia Cota – Cundinamarca • Avenida Boyacá # 73 - 00 SUR, localidad de Ciudad Bolívar

CLASIFICACIÓN DE MATERIAL: Pétreos	TIPO: **(Concreto, ladrillos, asfalto)**	CANTIDAD: **(m3 Y Ton)**
Observaciones:	Asfalto	15 (m3) - 19.2 Ton

Nombre del conductor	**Nombre del encargado obra**	**Nombre del responsable - CTA**
CC:	CC:	Javier Alexander Castillo González NIT:900767473-7

Nota: La información incluida en este vale, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a GRECO, por lo cual declara y garantiza a GRECO que la información suministrada es verdadera, completa y fidedigna, y exime a GRECO de toda responsabilidad con respecto a la misma. Para generar su certificado de disposición de manera rápida y sencilla, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.recicladosgreco.com y utilizar la función 'Genere su certificado' que encontrará en el encabezado, diligencie usuario y contraseña. Si aún no dispone de usuario y contraseña, por favor envíe una solicitud a la dirección de correo electrónico analistacomercial@recicladosgreco.com. Estaremos encantados de asistirle en el proceso, para mas información Cel. 3176575562.

Powered by CamScanner

Recibo 2127

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S NIT. 900767473-7

Granulados Reciclados de Colombia Greco

Vale de Recepción Nro.: **PBT VD A004170-272-2025** **Generado el: 2025-07-28**

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

FECHA Y HORA DE INGRESO: 2025-07-28 12:42:55

TRANSPORTE	DATOS DEL GENERADOR	DATOS DEL GESTOR
TRANSPORTADOR(A): **NO DE IDENTIFICACION:** **CONDUCTOR:** DIEGO ARMANDO VARGAS PATIÑO **NO DE IDENTIFICACION:** 1033718626 **PLACA VEHICULO:** SPV659 **PIN-TRANS:** NA **TIPO VEHICULO:** Doble	**GENERADORA:**INGECOP OBRAS CIVILES SAS **NIT:** 901583763 **PIN-GEN:**NA **TELEFONO:** 3163091076 **NOMBRE OBRA:** NA **DIRECCION:** TUNJUELITO **MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ, D.C.	**NOMBRE:** GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S **NIT:** 900.767.473-7 **PIN:** 19309 **REPRESENTANTE LEGAL:** Javier Alexander Castillo González **DIRECCION:** • Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur, Vereda Siberia Cota – Cundinamarca • Avenida Boyacá # 73 - 00 SUR, localidad de Ciudad Bolívar

CLASIFICACIÓN DE MATERIAL: Pétreos	TIPO: **(Concreto, ladrillos, asfalto)**	CANTIDAD: **(m3 Y Ton)**
Observaciones:	Asfalto	15 (m3) - 19.2 Ton

Nombre del conductor	**Nombre del encargado obra**	**Nombre del responsable - CTA**
CC:	CC:	Javier Alexander Castillo González NIT:900767473-7

Nota: La información incluida en este vale, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a GRECO, por lo cual declara y garantiza a GRECO que la información suministrada es verdadera, completa y fidedigna, y exime a GRECO de toda responsabilidad con respecto a la misma. Para generar su certificado de disposición de manera rápida y sencilla, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.recicladosgreco.com y utilizar la función 'Genere su certificado' que encontrará en el encabezado, diligencie usuario y contraseña. Si aún no dispone de usuario y contraseña, por favor envíe una solicitud a la dirección de correo electrónico analistacomercial@recicladosgreco.com. Estaremos encantados de asistirle en el proceso, para mas información Cel. 3176575562.

Powered by CamScanner

Recibo 2128

Granulados Reciclados de Colombia Greco

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S NIT. 900767473-7

Vale de Recepción Nro.: **PBT VD A004170-275-2025** **Generado el: 2025-07-29**

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

FECHA Y HORA DE INGRESO: 2025-07-29 07:05:38

TRANSPORTE	DATOS DEL GENERADOR	DATOS DEL GESTOR
TRANSPORTADOR(A): **NO DE IDENTIFICACION:** **CONDUCTOR:** DIEGO ARMANDO VARGAS PATIÑO **NO DE IDENTIFICACION:** 1033718626 **PLACA VEHICULO:** SPV659 **PIN-TRANS:** NA **TIPO VEHICULO:** Doble	**GENERADORA:**INGECOP OBRAS CIVILES SAS **NIT:** 901583763 **PIN-GEN:**NA **TELEFONO:** 3163091076 **NOMBRE OBRA:** NA **DIRECCION:** TUNJUELITO **MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ, D.C.	**NOMBRE:** GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S **NIT:** 900.767.473-7 **PIN:** 19309 **REPRESENTANTE LEGAL:** Javier Alexander Castillo González **DIRECCION:** • Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur, Vereda Siberia Cota – Cundinamarca • Avenida Boyacá # 73 - 00 SUR, localidad de Ciudad Bolívar

CLASIFICACIÓN DE MATERIAL: Pétreos	TIPO: **(Concreto, ladrillos, asfalto)**	CANTIDAD: **(m3 Y Ton)**
Observaciones:	Asfalto	15 (m3) - 19.2 Ton

Nombre del conductor	**Nombre del encargado obra**	**Nombre del responsable - CTA**
CC:	CC:	Javier Alexander Castillo González NIT:900767473-7

Nota: La información incluida en este vale, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a GRECO, por lo cual declara y garantiza a GRECO que la información suministrada es verdadera, completa y fidedigna, y exime a GRECO de toda responsabilidad con respecto a la misma. Para generar su certificado de disposición de manera rápida y sencilla, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.recicladosgreco.com y utilizar la función 'Genere su certificado' que encontrará en el encabezado, diligencie usuario y contraseña. Si aún no dispone de usuario y contraseña, por favor envíe una solicitud a la dirección de correo electrónico analistacomercial@recicladosgreco.com. Estaremos encantados de asistirle en el proceso, para mas información Cel. 3176575562.

Powered by CamScanner

Recibo 2129

Granulados Reciclados de Colombia Greco

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S NIT. 900767473-7

Vale de Recepción Nro.: PBT VD A004170-274-2025 **Generado el:** 2025-07-28

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

FECHA Y HORA DE INGRESO: 2025-07-28 16:22:01

TRANSPORTE	DATOS DEL GENERADOR	DATOS DEL GESTOR
TRANSPORTADOR(A): **NO DE IDENTIFICACION:** **CONDUCTOR:** GEOVANNY MOYA **NO DE IDENTIFICACION:** 1015439400 **PLACA VEHICULO:** USC504 **PIN-TRANS:** NA **TIPO VEHICULO:** Doble	**GENERADORA:**INGECOP OBRAS CIVILES SAS **NIT:** 901583763 **PIN-GEN:**NA **TELEFONO:** 3163091076 **NOMBRE OBRA:** NA **DIRECCION:** TUNJUELITO **MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ, D.C.	**NOMBRE:** GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S **NIT:** 900.767.473-7 **PIN:** 19309 **REPRESENTANTE LEGAL:** Javier Alexander Castillo González **DIRECCION:** • Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur, Vereda Siberia Cota – Cundinamarca • Avenida Boyacá # 73 - 00 SUR, localidad de Ciudad Bolívar

CLASIFICACIÓN DE MATERIAL: Pétreos	TIPO: **(Concreto, ladrillos, asfalto)**	CANTIDAD: **(m3 Y Ton)**
Observaciones:	Asfalto	15 (m3) - 19.2 Ton

Nombre del conductor	**Nombre del encargado obra**	**Nombre del responsable - CTA**
CC:	CC:	Javier Alexander Castillo González NIT:900767473-7

Nota: La información incluida en este vale, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a GRECO, por lo cual declara y garantiza a GRECO que la información suministrada es verdadera, completa y fidedigna, y exime a GRECO de toda responsabilidad con respecto a la misma. Para generar su certificado de disposición de manera rápida y sencilla, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.reciclados greco.com y utilizar la función 'Genere su certificado' que encontrará en el encabezado, diligencie usuario y contraseña. Si aún no dispone de usuario y contraseña, por favor envíe una solicitud a la dirección de correo electrónico analistacomercial@reciclados greco.com. Estaremos encantados de asistirle en el proceso, para mas información Cel. 3176575562.

Powered by CamScanner

Recibo 2304

Granulados Reciclados de Colombia Greco

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S NIT. 900767473-7

Vale de Recepción Nro.: **PBT VD A004170-276-2025** **Generado el: 2025-07-31**

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

FECHA Y HORA DE INGRESO: 2025-07-31 15:36:24

TRANSPORTE	DATOS DEL GENERADOR	DATOS DEL GESTOR
TRANSPORTADOR(A): **NO DE IDENTIFICACION:** **CONDUCTOR:** DIEGO ARMANDO VARGAS PATIÑO **NO DE IDENTIFICACION:** 1033718626 **PLACA VEHICULO:** SPV659 **PIN-TRANS:** NA **TIPO VEHICULO:** Doble	**GENERADORA:**INGECOP OBRAS CIVILES SAS **NIT:** 901583763 **PIN-GEN:**NA **TELEFONO:** 3163091076 **NOMBRE OBRA:** NA **DIRECCION:** TUNJUELITO **MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ, D.C.	**NOMBRE:** GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S **NIT:** 900.767.473-7 **PIN:** 19309 **REPRESENTANTE LEGAL:** Javier Alexander Castillo González **DIRECCION:** • Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur, Vereda Siberia Cota – Cundinamarca • Avenida Boyacá # 73 - 00 SUR, localidad de Ciudad Bolívar

CLASIFICACIÓN DE MATERIAL: Pétreos	TIPO: **(Concreto, ladrillos, asfalto)**	CANTIDAD: **(m3 Y Ton)**
Observaciones:	Asfalto	15 (m3) - 19.2 Ton

Nombre del conductor	**Nombre del encargado obra**	**Nombre del responsable - CTA**
CC:	CC:	Javier Alexander Castillo González NIT:900767473-7

Nota: La información incluida en este vale, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a GRECO, por lo cual declara y garantiza a GRECO que la información suministrada es verdadera, completa y fidedigna, y exime a GRECO de toda responsabilidad con respecto a la misma. Para generar su certificado de disposición de manera rápida y sencilla, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.recicladosgreco.com y utilizar la función 'Genere su certificado' que encontrará en el encabezado, diligencie usuario y contraseña. Si aún no dispone de usuario y contraseña, por favor envíe una solicitud a la dirección de correo electrónico analistacomercial@recicladosgreco.com. Estaremos encantados de asistirle en el proceso, para mas información Cel. 3176575562.

Powered by CamScanner

Recibo 2022

Granulados Reciclados de Colombia Greco

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S NIT. 900767473-7

Vale de Recepción Nro.: **PBT VD A004170-260-2025 Generado el: 2025-07-01** OK

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

FECHA Y HORA DE INGRESO: 2025-07-01 16:29:14

TRANSPORTE	DATOS DEL GENERADOR	DATOS DEL GESTOR
TRANSPORTADOR(A): **NO DE IDENTIFICACION:** **CONDUCTOR:** DIEGO ARMANDO VARGAS PATIÑO **NO DE IDENTIFICACION:** 1033718626 **PLACA VEHICULO:** SPV659 **PIN-TRANS:** NA **TIPO VEHICULO:** Doble	**GENERADORA:**INGECOP OBRAS CIVILES SAS **NIT:** 901583763 **PIN-GEN:**NA **TELEFONO:** 3163091076 **NOMBRE OBRA:** NA **DIRECCION:** EL CARMEN **MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ, D.C.	**NOMBRE:** GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S **NIT:** 900.767.473-7 **PIN:** 19309 **REPRESENTANTE LEGAL:** Javier Alexander Castillo González **DIRECCION:** • Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur, Vereda Siberia Cota – Cundinamarca • Avenida Boyacá # 73 - 00 SUR, localidad de Ciudad Bolívar

CLASIFICACIÓN DE MATERIAL: Pétreos	TIPO: (Concreto, ladrillos, asfalto)	CANTIDAD: (m3 Y Ton)
Observaciones:	Heterogéneo	15 (m3) - 19.2 Ton

Nombre del conductor	Nombre del encargado obra	Nombre del responsable - CTA
CC:	CC:	Javier Alexander Castillo González NIT:900767473-7

Nota: La información incluida en este vale, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a GRECO, por lo cual declara y garantiza a GRECO que la información suministrada es verdadera, completa y fidedigna, y exime a GRECO de toda responsabilidad con respecto a la misma. Para generar su certificado de disposición de manera rápida y sencilla, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.recicladosgreco.com y utilizar la función 'Genere su certificado' que encontrará en el encabezado, diligencie usuario y contraseña. Si aún no dispone de usuario y contraseña, por favor envíe una solicitud a la dirección de correo electrónico analistacomercial@recicladosgreco.com. Estaremos encantados de asistirle en el proceso, para mas información Cel. 3176575562.

Powered by CamScanner

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

REMISIÓN EF 14190

FECHA 14 08 25

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE	Consorcio DC
OBRA	Tunjuelito
DIRECCION	Nuevo Muzu
MATERIAL	D. Asfalto.
PLACA VEHICULO	USC 504 — 15 M3
CONDUCTOR	Geovanny Maya.
DESPACHADO POR:	MAGIR SAS. ESP
RECIBIDO POR:	

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

REMISIÓN EF 14191

FECHA 14 08 25

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE	Consorcio DC
OBRA	Tunjuelito
DIRECCION	Nuevo muzu.
MATERIAL	D. Asfalto.
PLACA VEHICULO	USC 504 — 15 M3
CONDUCTOR	Geovanny Maya.
DESPACHADO POR:	MAGIR SAS. ESP
RECIBIDO POR:	

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

REMISIÓN EF 14192

FECHA 15 08 25

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE	Consorcio DC
OBRA	Tunjuelito.
DIRECCION	Nuevo muzu.
MATERIAL	D. Concreto.
PLACA VEHICULO	DBB 045 — 15. M3
CONDUCTOR	Luis Sanchez.
DESPACHADO POR:	MAGIR SAS. ESP
RECIBIDO POR:	

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

REMISIÓN EF 14193

FECHA 15 08 25

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE	Consorcio DC
OBRA	Tunjuelito
DIRECCION	Nuevo muzu.
MATERIAL	Concreto.
PLACA VEHICULO	DBB 045 — 15 M3
CONDUCTOR	Luis Sanchez.
DESPACHADO POR:	MAGIR SAS. ESP
RECIBIDO POR:	

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

REMISIÓN EF 14194

FECHA 16 08 25

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE	Consorcio DC
OBRA	Tunjuelito
DIRECCION	Nuevo muzu
MATERIAL	Asfalto.
PLACA VEHICULO	SBV 419 — 15. M3
CONDUCTOR	David Montoya.
DESPACHADO POR:	
RECIBIDO POR:	

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

REMISIÓN EF 14195

FECHA 16 08 25

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE	Consorcio DC
OBRA	Tunjuelito.
DIRECCION	Nuevo muzu.
MATERIAL	Asfalto.
PLACA VEHICULO	SBV 419 — 15 M3
CONDUCTOR	David Montoya.
DESPACHADO POR:	
RECIBIDO POR:	

Scanned with CamScanner

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alpino Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1203 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

REMISIÓN **EF 14196**

FECHA 19 08 25

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE	Consorcio DC	
OBRA	Tunjuelito	
DIRECCION	Nuevo Usme	
MATERIAL	Asfalto	
PLACA VEHICULO	USC 504	15 M3
CONDUCTOR	Geovanny Maya.	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:	

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alpino Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1203 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

REMISIÓN **EF 14197**

FECHA 19 08 25

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE	Consorcio DC	
OBRA	Tunjuelito.	
DIRECCION	Nuevo Usme.	
MATERIAL	Asfalto.	
PLACA VEHICULO	USC 504	15 M3
CONDUCTOR	Geovanny Maya.	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:	

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alpino Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1203 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

REMISIÓN **EF 14198**

FECHA 20 08 25

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE	Consorcio DC	
OBRA	Tunjuelito.	
DIRECCION	Nuevo Usme.	
MATERIAL	Asfalto.	
PLACA VEHICULO	DBB045	15 M3
CONDUCTOR	Luis Sanchez	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:	

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alpino Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1203 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

REMISIÓN **EF 14199**

FECHA 20 08 25

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE	Consorcio DC	
OBRA	Tunjuelito.	
DIRECCION	Nuevo Usme.	
MATERIAL	Asfalto.	
PLACA VEHICULO	DBB045	15 M3
CONDUCTOR	Luis Sanchez	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:	

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alpino Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1203 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

REMISIÓN **EF 14200**

FECHA 21 08 25

ORDEN CLIENTE No.

CLIENTE	Consorcio DC	
OBRA	Tunjuelito.	
DIRECCION	Nuevo Usme	
MATERIAL	Asfalto.	
PLACA VEHICULO	SDA 17	15 M3
CONDUCTOR	David Martya.	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:	

Scanned with CamScanner

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 01 08 25
ORDEN CLIENTE:
REMISIÓN: EF 14331

CLIENTE: Consorcio OC
OBRA: Tynjelito
DIRECCION: Nuevo Mosu.
MATERIAL: Excavación.
PLACA VEHICULO: WSC 504 — 15 M3
CONDUCTOR: Geovanny Moya.
DESPACHADO POR: MAGIR SAS. ESP
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 01 08 25
ORDEN CLIENTE No.:
REMISIÓN: EF 14332

CLIENTE: Consorcio OC
OBRA: Tynjelito.
DIRECCION: Nuevo Mosu.
MATERIAL: Excavación.
PLACA VEHICULO: WSC 504 — 15 M3
CONDUCTOR: Geovanny Moya
DESPACHADO POR: MAGIR SAS. ESP
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 02 08 25
ORDEN CLIENTE No.:
REMISIÓN: EF 14333

CLIENTE: Consorcio OC.
OBRA: Tynjelito
DIRECCION: Nuevo Mosu.
MATERIAL: Excavación.
PLACA VEHICULO: DBB045 — 15 M3
CONDUCTOR: Luis Sanchez.
DESPACHADO POR: MAGIR SAS. ESP
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 02 08 25
ORDEN CLIENTE No.:
REMISIÓN: EF 14334

CLIENTE: Consorcio OC.
OBRA: Tynjelito
DIRECCION: Nuevo Mosu.
MATERIAL: Excavacion.
PLACA VEHICULO: DBB045 — 15 M3
CONDUCTOR: Luis Sanchez
DESPACHADO POR: MAGIR SAS. ESP
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 02 08 25
ORDEN CLIENTE No.:
REMISIÓN: EF 14335

CLIENTE: Consorcio OC.
OBRA: Tynjelito
DIRECCION: Nuevo Mosu.
MATERIAL: Excavacion
PLACA VEHICULO: SZV 419 — 15 M3
CONDUCTOR: David Montoya
DESPACHADO POR: MAGIR SAS. ESP
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 04 08 25
ORDEN CLIENTE No.:
REMISIÓN: EF 14336

CLIENTE: Consorcio OC.
OBRA: Tynjelito.
DIRECCION: Nuevo Mosu.
MATERIAL: Excavación.
PLACA VEHICULO: SZV 419 — 15 M3
CONDUCTOR: David Montoya
DESPACHADO POR:
RECIBIDO POR:

Scanned with CamScanner

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 04 09 25

REMISIÓN: EF 14337

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE	Consorcio OC.	
OBRA	Tayacito.	
DIRECCION	Nuevo Mosa.	
MATERIAL	Excavación	
PLACA VEHICULO	SZV 417	15 M3
CONDUCTOR	David Montoya	
DESPACHADO POR:		RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 05 09 25

REMISIÓN: EF 14338

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE	Consorcio OC.	
OBRA	Tayacito.	
DIRECCION	Nuevo Mosa.	
MATERIAL	Excavación.	
PLACA VEHICULO	USC 504	15 M3
CONDUCTOR	Geovanny Maya	
DESPACHADO POR:		RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 05 09 25

REMISIÓN: EF 14339

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE	Consorcio OC.	
OBRA	Tayacito.	
DIRECCION	Nuevo Mosa.	
MATERIAL	Excavación.	
PLACA VEHICULO	USC 504	15 M3
CONDUCTOR	Geovanny Maya.	
DESPACHADO POR:		RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 05 09 25

REMISIÓN: EF 14340

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE	Consorcio OC.	
OBRA	Tayacito.	
DIRECCION	Nuevo Mosa.	
MATERIAL	Excavación.	
PLACA VEHICULO	DBB045	15 M3
CONDUCTOR	Luis Sancha.	
DESPACHADO POR:		RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

el. 320 830 6335
el. 312 447 3316

FECHA: 05 09 25

REMISIÓN: EF 14341

ORDEN CLIENTE No.:

IENTE	Consorcio OC.	
RA	Tayacito.	
RECCION	Nuevo Mosa.	
TERIAL	Excavación.	
ACA VEHICULO	DBB045	15 M3
NDUCTOR	Luis Sancha.	
SPACHADO POR:		RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 06 09 25

REMISIÓN: EF 14342

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE	Consorcio OC.	
OBRA	Tayacito.	
DIRECCION	Nuevo Mosa.	
MATERIAL	Excavación	
PLACA VEHICULO	SZV 417	15 M3
CONDUCTOR	David Montoya	
DESPACHADO POR:		RECIBIDO POR:

Scanned with CamScanner

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 08 09 25

ORDEN CLIENTE No.:

REMISIÓN: EF 14343

CLIENTE: Consorcio DC.
OBRA: Tunjelito.
DIRECCION: Nuevo Usme.
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: SZV 417 — 15 M3
CONDUCTOR: David Hortuja.
DESPACHADO POR:
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 09 09 25

ORDEN CLIENTE No.:

REMISIÓN: EF 14344

CLIENTE: Consorcio DC.
OBRA: Tunjelito.
DIRECCION: Nuevo Usme.
MATERIAL: Excavación.
PLACA VEHICULO: WSC 504 — 15 M3
CONDUCTOR: Geovanny Moya.
DESPACHADO POR:
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 09 09 25

ORDEN CLIENTE No.:

REMISIÓN: EF 14345

CLIENTE: Consorcio DC.
OBRA: Tunjelito.
DIRECCION: Nuevo Usme.
MATERIAL: Excavación.
PLACA VEHICULO: WSC 504 — 15 M3
CONDUCTOR: Geovanny Moya.
DESPACHADO POR:
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 11 09 25

ORDEN CLIENTE No.:

REMISIÓN: EF 14346

CLIENTE: Consorcio DC.
OBRA: Tunjelito.
DIRECCION: Nuevo Usme.
MATERIAL: Excavación.
PLACA VEHICULO: DBB045 — 15. M3
CONDUCTOR: Luis Sanchez
DESPACHADO POR:
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 11 09 25

ORDEN CLIENTE No.:

REMISIÓN: EF 14347

CLIENTE: Consorcio DC.
OBRA: Tunjelito.
DIRECCION: Nuevo Usme.
MATERIAL: Excavación.
PLACA VEHICULO: DBB045 — 15 M3
CONDUCTOR: Luis Sanchez
DESPACHADO POR:
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 12 09 25

ORDEN CLIENTE No.:

REMISIÓN: EF 14348

CLIENTE: Consorcio DC.
OBRA: Tunjelito.
DIRECCION: Nuevo Usme.
MATERIAL: Excavación.
PLACA VEHICULO: SZV 417 — 15 M3
CONDUCTOR: David Hortuja
DESPACHADO POR:
RECIBIDO POR:

Scanned with CamScanner

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 12 09 25
ORDEN CLIENTE No.:
REMISIÓN: EF 14349

CLIENTE: Consorcio DC-
OBRA: Tunjelito
DIRECCION: Nuevo Muzu.
MATERIAL: Excavación.
PLACA VEHICULO: SZV 417 | 15 M3
CONDUCTOR: David Montoya
DESPACHADO POR: | RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 14 09 25
ORDEN CLIENTE No.:
REMISIÓN: EF 14350

CLIENTE: Consorcio DC-
OBRA: Tunjelito
DIRECCION: Nuevo Muzu.
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: USC 504 | 15 M3
CONDUCTOR: Geovanny Moya
DESPACHADO POR: | RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 14 09 25
ORDEN CLIENTE No.:
REMISIÓN: EF 14157

CLIENTE: Consorcio DC
OBRA: Tunjelito
DIRECCION: Nuevo Muzu.
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: USC 504 | 15 M3
CONDUCTOR: Geovanny Moya.
DESPACHADO POR: | RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 15 09 25
ORDEN CLIENTE No.:
REMISIÓN: EF 14158

CLIENTE: Consorcio DC
OBRA: Tunjelito.
DIRECCION: Nuevo Muzu
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: DBB045 | 15 M3
CONDUCTOR: Luis Sanchez.
DESPACHADO POR: | RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 15 09 25
ORDEN CLIENTE No.:
REMISIÓN: EF 14159

CLIENTE: Consorcio DC.
OBRA: Tunjelito.
DIRECCION: Nuevo Muzu.
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: DBB045 | 15 M3
CONDUCTOR: Luis Sanchez.
DESPACHADO POR: | RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 16 09 25
ORDEN CLIENTE No.:
REMISIÓN: EF 14160

CLIENTE: Consorcio DC
OBRA: Nuevo Muzu.
DIRECCION: Tunjelito.
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: SZV417 | 15 M3
CONDUCTOR: David Montoya.
DESPACHADO POR: | RECIBIDO POR:

Scanned with CamScanner

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 16 09 25

ORDEN CLIENTE No.:

REMISIÓN: EF 14161

CLIENTE: Consorcio OC
OBRA: Tunjuelito.
DIRECCION: Nuevo Muzu.
MATERIAL: Excavacion
PLACA VEHICULO: SZV 417 | 15 M3
CONDUCTOR: David Montoya.
DESPACHADO POR: MAGIR SAS. ESP
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 19 09 25

ORDEN CLIENTE No.:

REMISIÓN: EF 14162

CLIENTE: Consorcio OC
OBRA: Tunjuelito
DIRECCION: Nuevo Muzu.
MATERIAL: Excavacion
PLACA VEHICULO: SZV 417. | 15 M3
CONDUCTOR: David Montoya.
DESPACHADO POR: MAGIR SAS. ESP
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 19 09 25

ORDEN CLIENTE No.:

REMISIÓN: EF 14163

CLIENTE: Consorcio OC
OBRA: Tunjuelito
DIRECCION: Abraham Lincoln.
MATERIAL: Excavacion
PLACA VEHICULO: USC 504 | 15 M3
CONDUCTOR: Geovanny Moya.
DESPACHADO POR:
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 19 09 25

ORDEN CLIENTE No.:

REMISIÓN: EF 14164

CLIENTE: Consorcio OC.
OBRA: Tunjuelito.
DIRECCION: Abraham Lincoln.
MATERIAL: Excavacion
PLACA VEHICULO: USC 504 | 15 M3
CONDUCTOR: Geovanny Moya
DESPACHADO POR: MAGIR SAS. ESP
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 20 09 25

ORDEN CLIENTE No.:

REMISIÓN: EF 14165

CLIENTE: Consorcio OC
OBRA: Tunjuelito.
DIRECCION: Abraham Lincoln.
MATERIAL: Excavacion
PLACA VEHICULO: DBB 045 | 15 M3
CONDUCTOR: Luis Sanchez.
DESPACHADO POR: MAGIR SAS. ESP
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 20 09 25

ORDEN CLIENTE No.:

REMISIÓN: EF 14166

CLIENTE: Consorcio OC
OBRA: Tunjuelito
DIRECCION: Abraham Lincoln.
MATERIAL: Excavacion
PLACA VEHICULO: DBB 045 | 15 M3
CONDUCTOR: Luis Sanchez.
DESPACHADO POR:
RECIBIDO POR:

Scanned with CamScanner

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 21 08 25

ORDEN CLIENTE No.:

REMISIÓN: EF 14167

CLIENTE: Consorcio DC
OBRA: Tunjuelito
DIRECCION: Abraham, Lincln.
MATERIAL: Excavacion
PLACA VEHICULO: SJV 41M | 15 M3
CONDUCTOR: David Montoya.
DESPACHADO POR: MAGIR SAS. ESP
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 21 08 25

ORDEN CLIENTE No.:

REMISIÓN: EF 14168

CLIENTE: Consorcio DC
OBRA: Tunjelito.
DIRECCION: Abraham, Lincln
MATERIAL: Excavacion.
PLACA VEHICULO: SJV 41M | 15 M3
CONDUCTOR: David Montoya.
DESPACHADO POR: MAGIR SAS. ESP
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 22 08 25

ORDEN CLIENTE No.:

REMISIÓN: EF 14169

CLIENTE: Consorcio DC
OBRA: Tunjelito
DIRECCION: Abraham, Lincln.
MATERIAL: Excavacion
PLACA VEHICULO: DBB 040 | 15 M3
CONDUCTOR: Luis Sanchez
DESPACHADO POR: MAGIR SAS. ESP
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 22 08 25

ORDEN CLIENTE No.:

REMISIÓN: EF 14170

CLIENTE: Consorcio DC
OBRA: Tunjuelito
DIRECCION: Abraham, Lincln.
MATERIAL: Excavacion
PLACA VEHICULO: USC 504 | 15 M3
CONDUCTOR: Geovanny Maya.
DESPACHADO POR: MAGIR SAS. ESP
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 23 08 25

ORDEN CLIENTE No.:

REMISIÓN: EF 14171

CLIENTE: Consorcio DC
OBRA: Tunjelito.
DIRECCION: Abraham Lincln.
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: USC 504 | 15 M3
CONDUCTOR: Geovanny Maya.
DESPACHADO POR: MAGIR SAS. ESP
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 23 08 25

ORDEN CLIENTE No.:

REMISIÓN: EF 14172

CLIENTE: Consorcio DC
OBRA: Tunjuelito
DIRECCION: Abraham Lincln.
MATERIAL: Excavación.
PLACA VEHICULO: SJV 41M | 15 M3
CONDUCTOR: David Montoya.
DESPACHADO POR: MAGIR SAS. ESP
RECIBIDO POR:

Scanned with CamScanner

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 25 / 08 / 25

REMISIÓN: EF 14173

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE	Consorcio DC	
OBRA	Tunjuelito.	
DIRECCION	Abraham Lincln.	
MATERIAL	Excavación.	
PLACA VEHICULO	USC 604	15 M3
CONDUCTOR	Geovanny Maya.	
DESPACHADO POR:		RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 25 / 08 / 25

REMISIÓN: EF 14174

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE	Consorcio DC	
OBRA	Tunjuelito.	
DIRECCION	Abraham Lincln.	
MATERIAL	Excavación.	
PLACA VEHICULO	USC 604	15 M3
CONDUCTOR	Geovanny Maya.	
DESPACHADO POR:		RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 26 / 08 / 25

REMISIÓN: EF 14175

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE	Consorcio DC	
OBRA	Tunjuelito.	
DIRECCION	Abraham Lincln.	
MATERIAL	Excavación.	
PLACA VEHICULO	DBB040.	15 M3
CONDUCTOR	Luis Sanchz	
DESPACHADO POR:		RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 26 / 08 / 25

REMISIÓN: EF 14176

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE	Consorcio DC	
OBRA	Tunjuelito.	
DIRECCION	Abraham Lincln.	
MATERIAL	Excavación.	
PLACA VEHICULO	DBB040.	15 M3
CONDUCTOR	Luis Sanchz.	
DESPACHADO POR:		RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 27 / 08 / 25

REMISIÓN: EF 14177

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE	Consorcio DC	
OBRA	Tunjuelito	
DIRECCION	Abraham Lincln.	
MATERIAL	Excavación.	
PLACA VEHICULO	SZV 417.	15 M3
CONDUCTOR	David Montoya.	
DESPACHADO POR:		RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 27 / 08 / 25

REMISIÓN: EF 14178

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE	Consorcio DC	
OBRA	Tunjuelito	
DIRECCION	Abraham Lincln.	
MATERIAL	Excavación.	
PLACA VEHICULO	SZV 417.	15 M3
CONDUCTOR	David Montoya.	
DESPACHADO POR:		RECIBIDO POR:

Scanned with CamScanner

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 28 08 25

ORDEN CLIENTE No.:

REMISIÓN: EF 14179

CLIENTE: Consorcio OC
OBRA: tunjuelito
DIRECCION: Abraham Lincoln.
MATERIAL: Excavación.
PLACA VEHICULO: USC 504 | 15 M3
CONDUCTOR: Geovanny Moya.
DESPACHADO POR: | RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 28 08 25

ORDEN CLIENTE No.:

REMISIÓN: EF 14180

CLIENTE: Consorcio OC
OBRA: Tunjuelito.
DIRECCION: Abraham Lincoln.
MATERIAL: Excavación.
PLACA VEHICULO: USC 504. | 15 M3
CONDUCTOR: Geovanny Moya.
DESPACHADO POR: | RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 29 08 25

ORDEN CLIENTE No.:

REMISIÓN: EF 14181

CLIENTE: Consorcio OC
OBRA: tunjuelito
DIRECCION: Abraham Lincoln.
MATERIAL: Excavación.
PLACA VEHICULO: DBS045. | 15 M3
CONDUCTOR: Luis Sanchez
DESPACHADO POR: | RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 29 08 25

ORDEN CLIENTE No.:

REMISIÓN: EF 14182

CLIENTE: Consorcio OC
OBRA: tunjuelito
DIRECCION: Abraham Lincoln.
MATERIAL: Excavación.
PLACA VEHICULO: DBS045. | 15 M3
CONDUCTOR: Luis Sanchez
DESPACHADO POR: | RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 30 08 25

ORDEN CLIENTE No.:

REMISIÓN: EF 14183

CLIENTE: Consorcio OC
OBRA: Tunjuelito
DIRECCION: Abraham Lincoln.
MATERIAL: Excavación.
PLACA VEHICULO: SZV 417. | 15 M3
CONDUCTOR: David Montoya.
DESPACHADO POR: | RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 30 08 25

ORDEN CLIENTE No.:

REMISIÓN: EF 14184

CLIENTE: Consorcio OC
OBRA: Tunjuelito.
DIRECCION: Abraham Lincoln.
MATERIAL: Excavación.
PLACA VEHICULO: SZV 417. | 15 M3
CONDUCTOR: David Montoya.
DESPACHADO POR: | RECIBIDO POR:

Scanned with CamScanner

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 19 / 08 / 25

ORDEN CLIENTE No.:

REMISIÓN: EF 14185

CLIENTE	Consorcio OC
OBRA	Tunjelito.
DIRECCION	Abraham Lincoln.
MATERIAL	Excavación
PLACA VEHICULO	USC 504 — 15 M3
CONDUCTOR	Geovanny Maya.
DESPACHADO POR:	
RECIBIDO POR:	

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 19 / 08 / 25

ORDEN CLIENTE No.:

REMISIÓN: EF 14186

CLIENTE	Consorcio OC
OBRA	Tunjelito
DIRECCION	Abraham Lincoln.
MATERIAL	Excavación.
PLACA VEHICULO	USC 504. — 15 M3
CONDUCTOR	Geovanny Maya.
DESPACHADO POR:	
RECIBIDO POR:	

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 20 / 08 / 25

ORDEN CLIENTE No.:

REMISIÓN: EF 14187

CLIENTE	Consorcio OC.
OBRA	Tunjelito.
DIRECCION	Abraham Lincoln.
MATERIAL	Excavación.
PLACA VEHICULO	DBB045 — 15 M3
CONDUCTOR	Luis Sanchez.
DESPACHADO POR:	
RECIBIDO POR:	

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 20 / 08 / 25

ORDEN CLIENTE No.:

REMISIÓN: EF 14188

CLIENTE	Consorcio OC
OBRA	Tunjelito.
DIRECCION	Abraham Lincoln.
MATERIAL	Excavación.
PLACA VEHICULO	DBB045 — 15 M3
CONDUCTOR	Luis Sanchez
DESPACHADO POR:	
RECIBIDO POR:	

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 21 / 08 / 25

ORDEN CLIENTE No.:

REMISIÓN: EF 14189

CLIENTE	Consorcio OC
OBRA	Tunjelito
DIRECCION	Abraham Lincoln.
MATERIAL	Excavación.
PLACA VEHICULO	SZV 411. — 15 M3
CONDUCTOR	David Montoya.
DESPACHADO POR:	
RECIBIDO POR:	

Scanned with CamScanner

Granulados Reciclados de Colombia Greco

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S NIT. 900767473-7

Vale de Recepción Nro.: PBT VD A004170-280-2025 Generado el: 2025-08-25

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

FECHA Y HORA DE INGRESO: 2025-08-25 11:56:27

TRANSPORTE	DATOS DEL GENERADOR	DATOS DEL GESTOR
TRANSPORTADOR(A): **NO DE IDENTIFICACION:** **CONDUCTOR:** LUIS SANCHEZ **NO DE IDENTIFICACION:** 80411869 **PLACA VEHICULO:** DBB045 **PIN-TRANS:** 2071 **TIPO VEHICULO:** Doble	**GENERADORA:**INGECOP OBRAS CIVILES SAS **NIT:** 901583763 **PIN-GEN:**NA **TELEFONO:** 3163091076 **NOMBRE OBRA:** NA **DIRECCION:** TUNJUELO **MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ, D.C.	**NOMBRE:** GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S **NIT:** 900.767.473-7 **PIN:** 19309 **REPRESENTANTE LEGAL:** Javier Alexander Castillo González **DIRECCION:** • Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur, Vereda Siberia Cota – Cundinamarca • Avenida Boyacá # 73 - 00 SUR, localidad de Ciudad Bolívar

CLASIFICACIÓN DE MATERIAL: Pétreos	TIPO: **(Concreto, ladrillos, asfalto)**	CANTIDAD: **(m3 Y Ton)**
Observaciones:	Asfalto	15 (m3) - 19.2 Ton

Nombre del conductor	**Nombre del encargado obra**	**Nombre del responsable - CTA**
CC:	CC:	Javier Alexander Castillo González NIT:900767473-7

Nota: La información incluida en este vale, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a GRECO, por lo cual declara y garantiza a GRECO que la información suministrada es verdadera, completa y fidedigna, y exime a GRECO de toda responsabilidad con respecto a la misma. Para generar su certificado de disposición de manera rápida y sencilla, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.recicladosgreco.com y utilizar la función 'Genere su certificado' que encontrará en el encabezado, diligencie usuario y contraseña. Si aún no dispone de usuario y contraseña, por favor envíe una solicitud a la dirección de correo electrónico analistacomercial@recicladosgreco.com. Estaremos encantados de asistirle en el proceso, para mas información Cel. 3176575562.

Powered by CamScanner

Granulados Reciclados de Colombia Greco

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S NIT. 900767473-7

Vale de Recepción Nro.: PBT VD A004170-281-2025 Generado el: 2025-08-26

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

FECHA Y HORA DE INGRESO: 2025-08-26 09:36:03

TRANSPORTE	DATOS DEL GENERADOR	DATOS DEL GESTOR
TRANSPORTADOR(A): **NO DE IDENTIFICACION:** **CONDUCTOR:** DAVID MONTOYA **NO DE IDENTIFICACION:** 3185786 **PLACA VEHICULO:** SZV417 **PIN-TRANS:** NA **TIPO VEHICULO:** Doble	**GENERADORA:**INGECOP OBRAS CIVILES SAS **NIT:** 901583763 **PIN-GEN:**NA **TELEFONO:** 3163091076 **NOMBRE OBRA:** NA **DIRECCION**: TUNJUELITO **MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ, D.C.	**NOMBRE:** GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S **NIT:** 900.767.473-7 **PIN:** 19309 **REPRESENTANTE LEGAL:** Javier Alexander Castillo González **DIRECCION:** • Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur, Vereda Siberia Cota – Cundinamarca • Avenida Boyacá # 73 - 00 SUR, localidad de Ciudad Bolívar

CLASIFICACIÓN DE MATERIAL: Pétreos	TIPO: (Concreto, ladrillos, asfalto)	CANTIDAD: (m3 Y Ton)
Observaciones:	Asfalto	15 (m3) - 19.2 Ton

Nombre del conductor	Nombre del encargado obra	Nombre del responsable - CTA
CC:	CC:	Javier Alexander Castillo González NIT:900767473-7

Nota: La información incluida en este vale, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a GRECO, por lo cual declara y garantiza a GRECO que la información suministrada es verdadera, completa y fidedigna, y exime a GRECO de toda responsabilidad con respecto a la misma. Para generar su certificado de disposición de manera rápida y sencilla, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.reciclados greco.com y utilizar la función 'Genere su certificado' que encontrará en el encabezado, diligencie usuario y contraseña. Si aún no dispone de usuario y contraseña, por favor envíe una solicitud a la dirección de correo electrónico analistacomercial@reciclados greco.com. Estaremos encantados de asistirle en el proceso, para mas información Cel. 3176575562.

Powered by CamScanner

Granulados Reciclados de Colombia Greco

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S NIT. 900767473-7

Vale de Recepción Nro.: PBT VD A004170-282-2025 Generado el: 2025-08-27

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

FECHA Y HORA DE INGRESO: 2025-08-27 11:35:34

TRANSPORTE	DATOS DEL GENERADOR	DATOS DEL GESTOR
TRANSPORTADOR(A): **NO DE IDENTIFICACION:** **CONDUCTOR:** LUIS SANCHEZ **NO DE IDENTIFICACION:** 80411869 **PLACA VEHICULO:** DBB045 **PIN-TRANS:** 2071 **TIPO VEHICULO:** Doble	**GENERADORA:**INGECOP OBRAS CIVILES SAS **NIT:** 901583763 **PIN-GEN:**NA **TELEFONO:** 3163091076 **NOMBRE OBRA:** NA **DIRECCION:** TUNJUELITO **MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ, D.C.	**NOMBRE:** GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S **NIT:** 900.767.473-7 **PIN:** 19309 **REPRESENTANTE LEGAL:** Javier Alexander Castillo González **DIRECCION:** • Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur, Vereda Siberia Cota – Cundinamarca • Avenida Boyacá # 73 - 00 SUR, localidad de Ciudad Bolívar

CLASIFICACIÓN DE MATERIAL: Pétreos	TIPO: **(Concreto, ladrillos, asfalto)**	CANTIDAD: **(m3 Y Ton)**
Observaciones:	Asfalto	15 (m3) - 19.2 Ton

Nombre del conductor	**Nombre del encargado obra**	**Nombre del responsable - CTA**
CC:	CC:	Javier Alexander Castillo González NIT:900767473-7

Nota: La información incluida en este vale, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a GRECO, por lo cual declara y garantiza a GRECO que la información suministrada es verdadera, completa y fidedigna, y exime a GRECO de toda responsabilidad con respecto a la misma. Para generar su certificado de disposición de manera rápida y sencilla, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.recicladosgreco.com y utilizar la función 'Genere su certificado' que encontrará en el encabezado, diligencie usuario y contraseña, Si aún no dispone de usuario y contraseña, por favor envíe una solicitud a la dirección de correo electrónico analistacomercial@recicladosgreco.com. Estaremos encantados de asistirte en el proceso, para mas información Cel. 3176575562.

Powered by CamScanner

Granulados Reciclados de Colombia Greco

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S NIT. 900767473-7

Vale de Recepción Nro.: PBT VD A004170-283-2025 Generado el: 2025-08-29

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

FECHA Y HORA DE INGRESO: 2025-08-29 11:04:23

TRANSPORTE	DATOS DEL GENERADOR	DATOS DEL GESTOR
TRANSPORTADOR(A): **NO DE IDENTIFICACION:** **CONDUCTOR:** LUIS SANCHEZ **NO DE IDENTIFICACION:** 80411869 **PLACA VEHICULO:** DBB045 **PIN-TRANS:** 2071 **TIPO VEHICULO:** Doble	**GENERADORA:**INGECOP OBRAS CIVILES SAS **NIT:** 901583763 **PIN-GEN:**NA **TELEFONO:** 3163091076 **NOMBRE OBRA:** NA **DIRECCION:** TUNJUELITO **MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ, D.C.	**NOMBRE:** GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S **NIT:** 900.767.473-7 **PIN:** 19309 **REPRESENTANTE LEGAL:** Javier Alexander Castillo González **DIRECCION:** • Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur, Vereda Siberia Cota – Cundinamarca • Avenida Boyacá # 73 - 00 SUR, localidad de Ciudad Bolívar

CLASIFICACIÓN DE MATERIAL: Pétreos	TIPO: (Concreto, ladrillos, asfalto)	CANTIDAD: (m3 Y Ton)
Observaciones:	Asfalto	15 (m3) - 19.2 Ton

Nombre del conductor	Nombre del encargado obra	Nombre del responsable - CTA
CC:	CC:	Javier Alexander Castillo González NIT:900767473-7

Nota: La información incluida en este vale, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a GRECO, por lo cual declara y garantiza a GRECO que la información suministrada es verdadera, completa y fidedigna, y exime a GRECO de toda responsabilidad con respecto a la misma. Para generar su certificado de disposición de manera rápida y sencilla, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.reciclados greco.com y utilizar la función 'Genere su certificado' que encontrará en el encabezado, diligencie usuario y contraseña. Si aún no dispone de usuario y contraseña, por favor envíe una solicitud a la dirección de correo electrónico analistacomercial@recicladosgreco.com. Estaremos encantados de asistirle en el proceso, para mas información Cel. 3176575562.

Powered by CamScanner

Recibo 2308

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S NIT. 900767473-7

Granulados Reciclados de Colombia Greco

Vale de Recepción Nro.: PBT VD A004170-277-2025 **Generado el: 2025-08-01**

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

FECHA Y HORA DE INGRESO: 2025-08-01 15:07:30

TRANSPORTE	DATOS DEL GENERADOR	DATOS DEL GESTOR
TRANSPORTADOR(A): **NO DE IDENTIFICACION:** **CONDUCTOR:** GEOVANNY MOYA **NO DE IDENTIFICACION:** 1015439400 **PLACA VEHICULO:** USC504 **PIN-TRANS:** NA **TIPO VEHICULO:** Doble	**GENERADORA:**INGECOP OBRAS CIVILES SAS **NIT:** 901583763 **PIN-GEN:**NA **TELEFONO:** 3163091076 **NOMBRE OBRA:** NA **DIRECCION:** TUNJUELITO **MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ, D.C.	**NOMBRE:** GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S **NIT:** 900.767.473-7 **PIN:** 19309 **REPRESENTANTE LEGAL:** Javier Alexander Castillo González **DIRECCION:** • Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur, Vereda Siberia Cota – Cundinamarca • Avenida Boyacá # 73 - 00 SUR, localidad de Ciudad Bolívar

CLASIFICACIÓN DE MATERIAL: Pétreos	TIPO: **(Concreto, ladrillos, asfalto)**	CANTIDAD: **(m3 Y Ton)**
Observaciones:	Asfalto	15 (m3) - 19.2 Ton

Nombre del conductor	**Nombre del encargado obra**	**Nombre del responsable - CTA**
CC:	CC:	Javier Alexander Castillo González NIT:900767473-7

Nota: La información incluida en este vale, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a GRECO, por lo cual declara y garantiza a GRECO que la información suministrada es verdadera, completa y fidedigna, y exime a GRECO de toda responsabilidad con respecto a la misma. Para generar su certificado de disposición de manera rápida y sencilla, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.recicladosgreco.com y utilizar la función 'Genere su certificado' que encontrará en el encabezado, diligencie usuario y contraseña. Si aún no dispone de usuario y contraseña, por favor envíe una solicitud a la dirección de correo electrónico analistacomercial@recicladosgreco.com. Estaremos encantados de asistirle en el proceso, para mas información Cel. 3176575562.

Powered by CamScanner

Recibo 2314

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S NIT. 900767473-7

Granulados Reciclados de Colombia Greco

Vale de Recepción Nro.: **PBT VD A004170-278-2025** **Generado el: 2025-08-01**

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

FECHA Y HORA DE INGRESO: 2025-08-01 16:52:24

TRANSPORTE	DATOS DEL GENERADOR	DATOS DEL GESTOR
TRANSPORTADOR(A): **NO DE IDENTIFICACION:** **CONDUCTOR:** GEOVANNY MOYA **NO DE IDENTIFICACION:** 1015439400 **PLACA VEHICULO:** USC504 ***PIN-TRANS:*** NA **TIPO VEHICULO:** Doble	**GENERADORA:**INGECOP OBRAS CIVILES SAS **NIT:** 901583763 **PIN-GEN:**NA **TELEFONO:** 3163091076 **NOMBRE OBRA:** NA **DIRECCION:** TUNJUELITO **MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ, D.C.	**NOMBRE:** GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S **NIT:** 900.767.473-7 **PIN:** 19309 **REPRESENTANTE LEGAL:** Javier Alexander Castillo González **DIRECCION:** • Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur, Vereda Siberia Cota – Cundinamarca • Avenida Boyacá # 73 - 00 SUR, localidad de Ciudad Bolívar

CLASIFICACIÓN DE MATERIAL: Pétreos	TIPO: **(Concreto, ladrillos, asfalto)**	CANTIDAD: **(m3 Y Ton)**
Observaciones:	Asfalto	15 (m3) - 19.2 Ton

Nombre del conductor	**Nombre del encargado obra**	**Nombre del responsable - CTA**
CC:	CC:	Javier Alexander Castillo González NIT:900767473-7

Nota: La información incluida en este vale, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a GRECO, por lo cual declara y garantiza a GRECO que la información suministrada es verdadera, completa y fidedigna, y exime a GRECO de toda responsabilidad con respecto a la misma. Para generar su certificado de disposición de manera rápida y sencilla, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.recicladosgreco.com y utilizar la función 'Genere su certificado' que encontrará en el encabezado, diligencie usuario y contraseña. Si aún no dispone de usuario y contraseña, por favor envíe una solicitud a la dirección de correo electrónico analistacomercial@recicladosgreco.com. Estaremos encantados de asistirle en el proceso, para mas información Cel. 3176575562.

Powered by CamScanner

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 06/09/25
ORDEN CLIENTE No.:
REMISIÓN: EF 14541

CLIENTE: Consorcio DC.
OBRA: Tunjuelito
DIRECCION: Nuevo Mixe.
MATERIAL: Concreto.
PLACA VEHICULO: SZV 417 — 15 M3
CONDUCTOR: David Montoya
DESPACHADO POR:
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 02/09/25
ORDEN CLIENTE No.:
REMISIÓN: EF 14154

CLIENTE: Consorcio DC.
OBRA: Tunjuelito
DIRECCION: Nuevo Mixe.
MATERIAL: Concreto.
PLACA VEHICULO: WSC 604 — 16 M3
CONDUCTOR: Geovanny Maya.
DESPACHADO POR:
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 01/09/25
ORDEN CLIENTE No.:
REMISIÓN: EF 14153

CLIENTE: Consorcio DC
OBRA: Tunjuelito
DIRECCION: Nuevo Mixe.
MATERIAL: Concreto.
PLACA VEHICULO: SZV 417 — 16,86. M3
CONDUCTOR: David Montoya.
DESPACHADO POR:
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 02/09/25
ORDEN CLIENTE No.:
REMISIÓN: EF 14155

CLIENTE: Consorcio DC
OBRA: Tunjuelito.
DIRECCION: Nuevo Mixe.
MATERIAL: Concreto.
PLACA VEHICULO: WSC 604 — 17 M3
CONDUCTOR: Geovanny Maya
DESPACHADO POR:
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 0509/25
ORDEN CLIENTE No.:
REMISIÓN: EF 14540

CLIENTE: Consorcio DC
OBRA: Tunjuelito.
DIRECCION: Nuevo Mixe.
MATERIAL: Concreto.
PLACA VEHICULO: WSC 604 — 15 M3
CONDUCTOR: Geovanny Maya.
DESPACHADO POR:
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 08/09/25
ORDEN CLIENTE No.:
REMISIÓN: EF 14156

CLIENTE: Consorcio DC
OBRA: Tunjuelito.
DIRECCION: Nuevo Mixe.
MATERIAL: Concreto.
PLACA VEHICULO: DBB 045 — 17 M3
CONDUCTOR: Luis Sanchez
DESPACHADO POR:
RECIBIDO POR:

Scanned with CamScanner

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 04 09 25
ORDEN CLIENTE No.:
REMISIÓN: EF 14539

CLIENTE: Consorcio DC
OBRA: Tynchito
DIRECCION: Nuevo Muzu.
MATERIAL: Concreto.
PLACA VEHICULO: DBB045 | 17 M3
CONDUCTOR: Luis Sanchez
DESPACHADO POR:
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 02 09 25
ORDEN CLIENTE No.:
REMISIÓN: EF 14149

CLIENTE: Consorcio DC
OBRA: Tynchito
DIRECCION: Nuevo Muzu.
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: WSC 504 | 15 M3
CONDUCTOR: Giovanny Maya
DESPACHADO POR:
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 01 09 25
ORDEN CLIENTE No.:
REMISIÓN: EF 14148

CLIENTE: Consorcio DC
OBRA: Nuevo Muzu.
DIRECCION: Tynchito.
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: DBB045 | 16 M3
CONDUCTOR: Luis Sanchez
DESPACHADO POR:
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 08 09 25
ORDEN CLIENTE No.:
REMISIÓN: EF 14147

CLIENTE: Consorcio DC
OBRA: Tynchito
DIRECCION: Nuevo Muzu.
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: SZV 419 | 15 M3
CONDUCTOR: David Montoya
DESPACHADO POR:
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 06 09 25
ORDEN CLIENTE No.:
REMISIÓN: EF 14146

CLIENTE: Consorcio DC
OBRA: Tynchito
DIRECCION: Nuevo Muzu.
MATERIAL: Excavación -
PLACA VEHICULO: WSC 504 | 15 M3
CONDUCTOR: Giovanny Maya
DESPACHADO POR:
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 05 09 25
ORDEN CLIENTE No.:
REMISIÓN: EF 14145

CLIENTE: Consorcio DC
OBRA: Tynchito
DIRECCION: Nuevo Muzu
MATERIAL: Excavación.
PLACA VEHICULO: DBB045 | 16 M3
CONDUCTOR: Luis Sanchez
DESPACHADO POR:
RECIBIDO POR:

Scanned with CamScanner

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 04 09 25

ORDEN CLIENTE No.:

REMISIÓN: EF 14144

CLIENTE	Consorcio DC	
OBRA	Tunjuelito	
DIRECCION	Nuevo Muzu.	
MATERIAL	Excavacion	
PLACA VEHICULO	SZV 417	15 M3
CONDUCTOR	David Montoya	
DESPACHADO POR:		RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 03 09 25

ORDEN CLIENTE No.:

REMISIÓN: EF 14143

CLIENTE	Consorcio DC	
OBRA	Tunjuelito	
DIRECCION	Nuevo Muzu.	
MATERIAL	Excavación	
PLACA VEHICULO	WSC 504	15 M3
CONDUCTOR	Geovany Maya	
DESPACHADO POR:		RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 02 09 25

ORDEN CLIENTE No.:

REMISIÓN: EF 14142

CLIENTE	Consorcio DC	
OBRA	Tunjuelito	
DIRECCION	Nuevo Muzu	
MATERIAL	Excavacion	
PLACA VEHICULO	DBB 045	16 M3
CONDUCTOR	Luis Sanchez	
DESPACHADO POR:		RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 04 09 25

ORDEN CLIENTE No.:

REMISIÓN: EF 14141

CLIENTE	Consorcio DC	
OBRA	Tunjuelito	
DIRECCION	Nuevo Muzu	
MATERIAL	Excavacion	
PLACA VEHICULO	SZV 417	15 M3
CONDUCTOR	David Montoya	
DESPACHADO POR:		RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 03 09 25

ORDEN CLIENTE No.:

REMISIÓN: EF 14140

CLIENTE	Consorcio DC	
OBRA	Tunjuelito.	
DIRECCION	Nuevo Muzu.	
MATERIAL	Excavacion	
PLACA VEHICULO	WSC 504	16 M3
CONDUCTOR	Geovany Maya	
DESPACHADO POR:		RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 05 09 25

ORDEN CLIENTE No.:

REMISIÓN: EF 14139

CLIENTE	Consorcio DC	
OBRA	Tunjuelito	
DIRECCION	Nuevo Muzu.	
MATERIAL	Excavacion	
PLACA VEHICULO	DBB 045	15 M3
CONDUCTOR	Luis Sanchez.	
DESPACHADO POR:		RECIBIDO POR:

Scanned with CamScanner

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alisco. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 08 09 25

REMISIÓN: EF 14138

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE	Corvoco DC	
OBRA	Tunjuelito	
DIRECCION	Nuevo Muzu	
MATERIAL	Excavación	
PLACA VEHICULO	SZV 417	15 M3
CONDUCTOR	David Mateya	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:	

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alisco. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 08 09 25

REMISIÓN: EF 14137

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE	Corvoco DC	
OBRA	Tunjuelito	
DIRECCION	Corvoco DC	
MATERIAL	Excavación	
PLACA VEHICULO	USC 504	16,81 M3
CONDUCTOR	Geovanny Maya	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:	

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alisco. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 06 09 25

REMISIÓN: EF 14136

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE	Corvoco DC	
OBRA	Tunjuelito	
DIRECCION	Nuevo Muzu	
MATERIAL	Excavación	
PLACA VEHICULO	PBB045	15 M3
CONDUCTOR	Luis Sanchez	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:	

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alisco. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 06 09 25

REMISIÓN: EF 14135

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE	Corvoco DC	
OBRA	Tunjuelito	
DIRECCION	Nuevo Muzu	
MATERIAL	Excavación	
PLACA VEHICULO	SZV 417	15 M3
CONDUCTOR	David Mateya	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:	

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alisco. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 06 09 25

REMISIÓN: EF 14134

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE	Corvoco DC	
OBRA	Tunjuelito	
DIRECCION	Nuevo Muzu	
MATERIAL	Excavación	
PLACA VEHICULO	USC 504	15 M3
CONDUCTOR	Geovanny Maya	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:	

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alisco. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 06 09 25

REMISIÓN: EF 14133

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE	Corvoco DC	
OBRA	Tunjuelito	
DIRECCION	Nuevo Muzu	
MATERIAL	Excavación	
PLACA VEHICULO	PBB045	15 M3
CONDUCTOR	Luis Sanchez	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:	

Scanned with CamScanner

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alticos. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 05 09 25

REMISIÓN: EF 14132

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE	Consorcio DC	
OBRA	Tunjuelito	
DIRECCION	Nuevo Muzu.	
MATERIAL	Excavación	
PLACA VEHICULO	SZV 417	15 M3
CONDUCTOR	David Montoya	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:	

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alticos. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 05 09 25

REMISIÓN: EF 14131

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE	Consorcio DC	
OBRA	Tunjuelito	
DIRECCION	Nuevo Muzu.	
MATERIAL	Excavación	
PLACA VEHICULO	USC 504	16 M3
CONDUCTOR	Geovanny Moya	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:	

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alticos. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 05 09 25

REMISIÓN: EF 14130

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE	Consorcio DC	
OBRA	Tunjuelito.	
DIRECCION	Nuevo Muzu.	
MATERIAL	Excavación	
PLACA VEHICULO	DBB 045	15 M3
CONDUCTOR	Luis Sanchez	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:	

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alticos. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 05 09 25

REMISIÓN: EF 14129

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE	Consorcio DC	
OBRA	Tunjuelito	
DIRECCION	Nuevo Muzu.	
MATERIAL	Excavación	
PLACA VEHICULO	SZV 417	16 M3
CONDUCTOR	David Montoya	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:	

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alticos. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 04 09 25

REMISIÓN: EF 14128

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE	Consorcio DC	
OBRA	Tunjuelito	
DIRECCION	Nuevo Muzu.	
MATERIAL	Excavación	
PLACA VEHICULO	DBB 045	15 M3
CONDUCTOR	Luis Sanchez.	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:	

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alticos. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 04 09 25

REMISIÓN: EF 14127

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE	Consorcio DC	
OBRA	Tunjuelito.	
DIRECCION	Nuevo Muzu.	
MATERIAL	Excavación	
PLACA VEHICULO	USC 504	15 M3
CONDUCTOR	Geovanny Moya	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:	

Scanned with CamScanner

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alisco. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 04 09 25

REMISIÓN: EF 14126

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE: Consorcio DC
OBRA: Tunjuelito
DIRECCION: Nuevo Muro.
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: SZV 419 | 15 M3
CONDUCTOR: David Montoya

DESPACHADO POR:

RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alisco. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 04 09 2

REMISIÓN: EF 14125

ORDEN CLIENT

CLIENTE: Consorcio DC
OBRA: Tunjelito
DIRECCION: Nuevo Muro.
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: DBB 045 | 15
CONDUCTOR: Luis Sanchez

DESPACHADO POR:

RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alisco. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 03 09 25

REMISIÓN: EF 14124

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE: Consorcio DC.
OBRA: Tunjelito.
DIRECCION: Nuevo Muro.
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: SZV 419 | 15 M3
CONDUCTOR: David Montoya

DESPACHADO POR:

RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alisco. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 03 0

REMISIÓN: EF 14123

ORDEN CLIE

CLIENTE: Consorcio DC
OBRA: Tunjelito
DIRECCION: Nuevo Muro.
MATERIAL: Excavación.
PLACA VEHICULO: WSC 504 | 15
CONDUCTOR: Giovanny Maya

DESPACHADO POR:

RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alisco. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 03 09 25

REMISIÓN: EF 14122

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE: Consorcio DC
OBRA: Tunjelito
DIRECCION: Nuevo Muro
MATERIAL: Excavacion
PLACA VEHICULO: DBB 045 | 15 M3
CONDUCTOR: Luis Sanchez

DESPACHADO POR:

RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alisco. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 03 09 2

REMISIÓN: EF 14121

ORDEN CLIENTE

CLIENTE: Consorcio DC
OBRA: Tunjelito.
DIRECCION: Nuevo Muro.
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: WSC 504 | 15 M
CONDUCTOR: Giovanny Maya

DESPACHADO POR:

RECIBIDO POR:

Scanned with CamScanner

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 02 09 25

ORDEN CLIENTE No.:

REMISIÓN: EF 14120

CLIENTE: Consorcio DC
OBRA: Tunjuelito
DIRECCION: Nuevo Muro
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: SZV 41M | 15 M3
CONDUCTOR: David Montoya

DESPACHADO POR: MAGIR SAS. ESP

RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 02 09 2

ORDEN CLIENTE:

REMISIÓN: EF 14119

CLIENTE: Consorcio DC
OBRA: Tunjelito.
DIRECCION: Nuevo Muro.
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: DBB045 | 17 M
CONDUCTOR: Luis Sanchez

DESPACHADO POR: MAGIR SAS. ESP

RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 02 09 25

ORDEN CLIENTE No.:

REMISIÓN: EF 14118

CLIENTE: Consorcio DC.
OBRA: Tunjelito.
DIRECCION: Nuevo Muro.
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: WSC 504 | 15 M3
CONDUCTOR: Geovanny Maya

DESPACHADO POR: MAGIR SAS. ESP

RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 02 09 25

ORDEN CLIENTE No.:

REMISIÓN: EF 14117

CLIENTE: Consorcio DC
OBRA: Tunjelito
DIRECCION: Nuevo Muro.
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: SZV 4M | 15 M3
CONDUCTOR: David Montoya

DESPACHADO POR: MAGIR SAS. ESP

RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 01 09 25

ORDEN CLIENTE No.:

REMISIÓN: EF 14116

CLIENTE: Consorcio DC
OBRA: Tunjelito
DIRECCION: Nuevo Muro.
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: DBB045 | 17 M3
CONDUCTOR: Luis Sanchez

DESPACHADO POR: MAGIR SAS. ESP

RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 01 09 25

ORDEN CLIENTE No.:

REMISIÓN: EF 14115

CLIENTE: Consorcio DC
OBRA: Tunjelito
DIRECCION: Nuevo Muro.
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: WSC 504 | 15 M3
CONDUCTOR: Geovanny Maya

DESPACHADO POR: MAGIR SAS. ESP

RECIBIDO POR:

Scanned with CamScanner

MAGIR SAS. ESP

Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Alto de Bonanuevo Alcaldía Municipal de Sincelejo 1202 del 21 de Diciembre de 2016

FECHA: 01 09 25

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

REMISIÓN: EF 14113

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE: Cutrago SC

OBRA: Tupelito

DIRECCION: Nueva Mesa

MATERIAL: Excavacion

PLACA VEHICULO: DBB 045 | 15 M3

CONDUCTOR: Luis Sanchez

DESPACHADO POR:

RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 01 09 25

ORDEN CLIENTE No.:

REMISIÓN: EF 14152

CLIENTE	Consorcio DC	
OBRA	Tunjuelito	
DIRECCION	Abraham Lincoln.	
MATERIAL	Concreto.	
PLACA VEHICULO	DBB045	11,57 M3
CONDUCTOR	Luis Sanchez.	
DESPACHADO POR:		RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 01 09 25

ORDEN CLIENTE No.:

REMISIÓN: EF 14106

CLIENTE	Consorcio DC	
OBRA	Tunjuelito	
DIRECCION	Abraham Lincoln.	
MATERIAL	Excavacion	
PLACA VEHICULO	DBB045	15 M3
CONDUCTOR	Luis Sanchez	
DESPACHADO POR:		RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 01 09 25

ORDEN CLIENTE No.:

REMISIÓN: EF 14105

CLIENTE	Consorcio DC	
OBRA	Tunjelito	
DIRECCION	Abraham Lincoln.	
MATERIAL	Excavacion	
PLACA VEHICULO	USC 504	15 M3
CONDUCTOR	Geovanny Mayo	
DESPACHADO POR:		RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 02 09 25

ORDEN CLIENTE No.:

REMISIÓN: EF 14108

CLIENTE	Consorcio DC	
OBRA	Tunjelito.	
DIRECCION	Abraham Lincoln.	
MATERIAL	Excavacion	
PLACA VEHICULO	SJV 417	16 M3
CONDUCTOR	David Mateya	
DESPACHADO POR:		RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 01 09 25

ORDEN CLIENTE No.:

REMISIÓN: EF 14107

CLIENTE	Consorcio DC	
OBRA	Tunjelito.	
DIRECCION	Abraham Lincoln.	
MATERIAL	Excavacion	
PLACA VEHICULO	DBB045	11,78 M3
CONDUCTOR	Luis Sanchez.	
DESPACHADO POR:		RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolucion Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 01 09 25

ORDEN CLIENTE No.:

REMISIÓN: EF 14104

CLIENTE	Consorcio DC.	
OBRA	Tunjelito	
DIRECCION	Abraham Lincoln.	
MATERIAL	Excavación.	
PLACA VEHICULO	USC 504	15 M3
CONDUCTOR	Geovanny Mayo	
DESPACHADO POR:		RECIBIDO POR:

Scanned with CamScanner

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 01 09 25

REMISIÓN: EF 14101

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE: Consorcio DC.
OBRA: Tunjuelito.
DIRECCION: Abraham Lincoln.
MATERIAL: Excavación.
PLACA VEHICULO: WSC 504 — 15,3 M3
CONDUCTOR: Giovanny Maya
DESPACHADO POR:
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 01 09 25

REMISIÓN: EF 14103

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE: Consorcio DC.
OBRA: Tunjuelito.
DIRECCION: Abraham Lincoln.
MATERIAL: Excavación.
PLACA VEHICULO: SJN 417 — 17 M3
CONDUCTOR: David Mantoya.
DESPACHADO POR:
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016


Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 01 09 25

REMISIÓN: EF 14102

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE: Consorcio DC.
OBRA: Tunjuelito
DIRECCION: Abraham Lincoln.
MATERIAL: Excavación.
PLACA VEHICULO: DBB 045 — 17 M3
CONDUCTOR: Luis Sanchez.
DESPACHADO POR:
RECIBIDO POR:

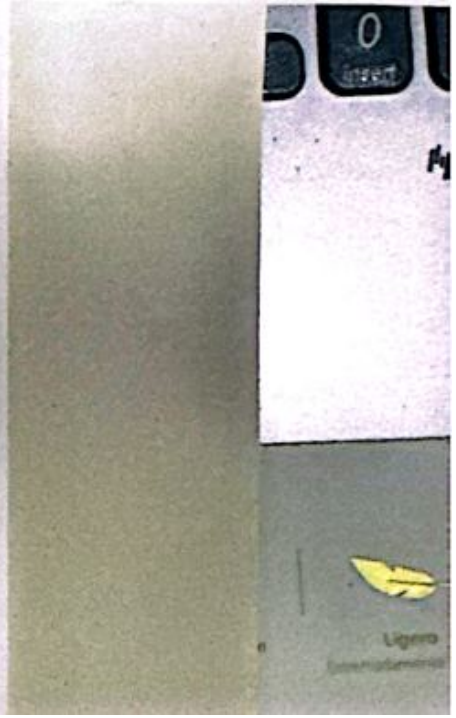

Scanned with CamScanner

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 02 09 25
ORDEN CLIENTE No.:
REMISIÓN: EF 14112

CLIENTE: Consorcio DC
OBRA: Tunjelito.
DIRECCION: Samore.
MATERIAL: Excavacion
PLACA VEHICULO: DBB 045 — 16 M3
CONDUCTOR: Luis Sanchez.
DESPACHADO POR:
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 03 09 25
ORDEN CLIENTE No.:
REMISIÓN: EF 14111

CLIENTE: Consorcio DC
OBRA: Tunjelito.
DIRECCION: Samore.
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: WSC 504 — 17,38 M3
CONDUCTOR: Giovanny Moya
DESPACHADO POR:
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 02 09 25
ORDEN CLIENTE No.:
REMISIÓN: EF 14110

CLIENTE: Consorcio DC
OBRA: Tunjelito.
DIRECCION: Samore.
MATERIAL: Excavacion
PLACA VEHICULO: SZV 419 — 17 M3
CONDUCTOR: David Montoya
DESPACHADO POR:
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 01 09 25
ORDEN CLIENTE No.:
REMISIÓN: EF 14109

CLIENTE: Consorcio DC
OBRA: Tunjelito.
DIRECCION: Samore.
MATERIAL: Excavacion
PLACA VEHICULO: DBB 045. — 15 M3
CONDUCTOR: Luis Sanchez
DESPACHADO POR:
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 01 09 25
ORDEN CLIENTE No.:
REMISIÓN: EF 14151

CLIENTE: Consorcio DC.
OBRA: Tunjelito.
DIRECCION: Samore.
MATERIAL: Asfalto.
PLACA VEHICULO: WSC 504 — 14,65 M3
CONDUCTOR: Giovanny Moya
DESPACHADO POR:
RECIBIDO POR:

Scanned with CamScanner

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 322 252 6816

FECHA: 19 09 25

REMISIÓN: EF 22470

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE: Consorcio DC 2025
OBRA:
DIRECCION: Tunjuelito
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: DBO045 | 17 M3
CONDUCTOR: Luis Sanchez
DESPACHADO POR: MAGIR SAS. ESP
RECIBIDO POR: $

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 322 252 6816

FECHA: 19 09 25

REMISIÓN: EF 22469

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE: Consorcio DC 2025
OBRA:
DIRECCION: Tunjuelito
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: WSC504 | 17 M3
CONDUCTOR: Geovanny mejia
DESPACHADO POR: MAGIR SAS. ESP
RECIBIDO POR: $

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 322 252 6816

FECHA: 19 09 25

REMISIÓN: EF 22468

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE: Consorcio DC 2025
OBRA:
DIRECCION: Tunjuelito
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: SZV417 | 17 M3
CONDUCTOR: David mateja
DESPACHADO POR: MAGIR SAS. ESP
RECIBIDO POR: $

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 322 252 6816

FECHA: 19 09 25

REMISIÓN: EF 22467

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE: Consorcio DC 2025
OBRA:
DIRECCION: Tunjuelito
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: DBO045 | 17 M3
CONDUCTOR: Luis Sanchez
DESPACHADO POR: MAGIR SAS. ESP
RECIBIDO POR: $

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 322 252 6816

FECHA: 19 09 25

REMISIÓN: EF 22466

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE: Consorcio DC 2025
OBRA:
DIRECCION: Tunjuelito
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: WSC504 | 17 M3
CONDUCTOR: Geovanny mejia
DESPACHADO POR: MAGIR SAS. ESP
RECIBIDO POR: $

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 322 252 6816

FECHA: 18 09 25

REMISIÓN: EF 22465

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE: Consorcio DC 2025
OBRA:
DIRECCION: Tunjuelito
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: SZV417 | 17 M3
CONDUCTOR: David mateja
DESPACHADO POR: MAGIR SAS. ESP
RECIBIDO POR: $

Powered by CamScanner

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldia Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 322 252 6816

FECHA: 16 09 25
ORDEN CLIENTE No.:
REMISIÓN: EF 22459

CLIENTE: Consorcio Dc 2025
OBRA:
DIRECCION: Tunjuelito
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: S2U417 — 18 M3
CONDUCTOR: David montoya
DESPACHADO POR: MAGIR SAS. ESP
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldia Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 322 252 6816

FECHA: 17 09 25
ORDEN CLIENTE No.:
REMISIÓN: EF 22460

CLIENTE: Consorcio Dc 2025
OBRA:
DIRECCION: Tunjuelito
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: USC504 — 18 M3
CONDUCTOR: Geovany Moya
DESPACHADO POR: MAGIR SAS. ESP
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldia Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 322 252 6816

FECHA: 17 09 25
ORDEN CLIENTE No.:
REMISIÓN: EF 22461

CLIENTE: Consorcio Dc 2025
OBRA:
DIRECCION: Tunjuelito
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: DBB045 — 18 M3
CONDUCTOR: Luis Sanchez
DESPACHADO POR: MAGIR SAS. ESP
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldia Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 322 252 6816

FECHA: 17 09 25
ORDEN CLIENTE No.:
REMISIÓN: EF 22462

CLIENTE: Consorcio Dc 2025
OBRA:
DIRECCION: Tunjuelito
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: S2U417 — 18 M3
CONDUCTOR: David montoya
DESPACHADO POR: MAGIR SAS. ESP
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldia Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 322 252 6816

FECHA: 18 09 25
ORDEN CLIENTE No.:
REMISIÓN: EF 22463

CLIENTE: Consorcio Dc 2025
OBRA:
DIRECCION: Tunjuelito
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: USC504 — 17 M3
CONDUCTOR: Geovany Moya
DESPACHADO POR: MAGIR SAS. ESP
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldia Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 322 252 6816

FECHA: 18 09 25
ORDEN CLIENTE No.:
REMISIÓN: EF 22464

CLIENTE: Consorcio Dc 2025
OBRA:
DIRECCION: Tunjuelito
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: DBB045 — 17 M3
CONDUCTOR: Luis Sanchez
DESPACHADO POR: MAGIR SAS. ESP
RECIBIDO POR:

Powered by CamScanner

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 322 252 6816

FECHA: 16 09 25

REMISIÓN: EF 22458

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE: Consorcio DC 2025
OBRA:
DIRECCION: Tunjuelito
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: DBB045 — 17 M3
CONDUCTOR: Luis Sanchez
DESPACHADO POR: MAGIR SAS. ESP
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 322 252 6816

FECHA: 16 09 25

REMISIÓN: EF 22457

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE: Consorcio DC 2025
OBRA:
DIRECCION: Tunjuelito
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: USC504 — 17 M3
CONDUCTOR: Geovanny Mojo
DESPACHADO POR: MAGIR SAS. ESP
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 322 252 6816

FECHA: 15 09 25

REMISIÓN: EF 22456

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE: Consorcio DC 2025
OBRA:
DIRECCION: Tunjuelito
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: SZU417 — 17 M3
CONDUCTOR: David Montoya
DESPACHADO POR: MAGIR SAS. ESP
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 322 252 6816

FECHA: 15 09 25

REMISIÓN: EF 22455

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE: Consorcio DC 2025
OBRA:
DIRECCION: Tunjuelito
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: DBB045 — 17 M3
CONDUCTOR: Luis Sanchez
DESPACHADO POR: MAGIR SAS. ESP
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 322 252 6816

FECHA: 15 09 25

REMISIÓN: EF 22454

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE: Consorcio DC 2025
OBRA:
DIRECCION: Tunjuelito
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: USC504 — 17 M3
CONDUCTOR: Geovanny (Araujo) Mojo
DESPACHADO POR: MAGIR SAS. ESP
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 322 252 6816

FECHA: 12 09 25

REMISIÓN: EF 22453

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE: Consorcio DC 2025
OBRA:
DIRECCION: Tunjuelito
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: SZU417 — 17 M3
CONDUCTOR: David Montoya
DESPACHADO POR: MAGIR SAS. ESP
RECIBIDO POR:

Powered by CamScanner

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

FECHA: 01 | 10 | 25

320 830 6335
312 447 3316

REMISIÓN: EF 14542

ORDEN CLIENTE No.:

ITE: Constructora Inglech sas.
Tunjuelito
CCION: Nuevo Muzú
RIAL: Excavación
A VEHICULO: 520 361 — 15. M3
UCTOR: Juan Gonzalez
CHADO POR: MAGIR SAS. ESP
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

REMISIÓN: EF 14543

CLIENTE: Constructora Inglech sas
OBRA: Tunjuelito
DIRECCION: Nuevo Muzú
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: 52K 769
CONDUCTOR: Jhonatan Saavedra
DESPACHADO POR: MAGIR SAS. ESP
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

FECHA: 01 | 10 | 25

el. 320 830 6335
el. 312 447 3316

REMISIÓN: EF 14544

ORDEN CLIENTE No.:

LIENTE: Constructora Inglech sas
BRA: Tunjuelito
RECCION: Nuevo Muzú
ATERIAL: Excavación
ACA VEHICULO: TFT 870 — 15. M3
ONDUCTOR: Camilo Montoya
ESPACHADO POR: MAGIR SAS. ESP
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

REMISIÓN: EF 14545

CLIENTE: Constructora Inglech sa
OBRA: Tunjuelito
DIRECCION: Nuevo Muzú
MATERIAL: Excavación.
PLACA VEHICULO: 520 361
CONDUCTOR: Juan Gonzalez
DESPACHADO POR: MAGIR SAS. ESP
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

FECHA: 01 | 10 | 25

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

REMISIÓN: EF 14546

ORDEN CLIENTE No.:

LIENTE: Constructora Inglech sas.
OBRA: Tunjuelito
DIRECCION: Nuevo Muzú
MATERIAL: Excavación.
PLACA VEHICULO: 52K 769 — 15. M3
CONDUCTOR: Jhonatan Saavedra
DESPACHADO POR: MAGIR SAS. ESP
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

REMISIÓN: EF 14547

CLIENTE: Constructora Inglech sas
OBRA: Tunjuelito
DIRECCION: Nuevo Muzú
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: TFT 870
CONDUCTOR: Camilo Montoya
DESPACHADO POR: MAGIR SAS. ESP
RECIBIDO POR:

Powered by CamScanner

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

FECHA 02 10 25

ORDEN CLIENTE No.

) 830 6335
! 447 3316 REMISIÓN **EF 14548**

Constructora Ingtech sas.
Tunjuelito
ION Nuevo Muzú
AL Excavación
EHICULO SZK 769 | 15 M3
CTOR Jhonatan Saavedra
IADO POR: | RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

ORDEN

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316 REMISIÓN **EF 14550**

CLIENTE Constructora Ingtech sas
OBRA Tunjuelito
DIRECCION Nuevo Muzú
MATERIAL Excavación
PLACA VEHICULO SZU 361 | 15
CONDUCTOR Juan González
DESPACHADO POR: | RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

FECHA 02 10 25

ORDEN CLIENTE No.

20 830 6335
12 447 3316 REMISIÓN **EF 13599**

E Constructora Ingtech sas.
Tunjuelito
ION Nuevo Muzú
IAL Excavación
VEHICULO SZU 361 | 15 M3
CTOR Juan Gonzalez
HADO POR: | RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316 REMISIÓN **EF 13600**

CLIENTE Constructora Ingtech sas
OBRA Tunjuelito
DIRECCION Nuevo Muzú
MATERIAL Excavación
PLACA VEHICULO TFT 870 | 15
CONDUCTOR Camilo Montoya
DESPACHADO POR: | RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

FECHA 03 10 25

ORDEN CLIENTE No.

. 320 830 6335
. 312 447 3316 REMISIÓN **EF 13550**

NTE Constructora Ingtech sas
A Tunjuelito
ECCION Nuevo Muzú
TERIAL Excavación
CA VEHICULO SZK 769 | 15 M3
NDUCTOR Jhonatan Saavedra
SPACHADO POR: | RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316 REMISIÓN **EF 13147**

CLIENTE Constructora Ingtech sas
OBRA Tunjuelito
DIRECCION Nuevo Muzú
MATERIAL Excavación
PLACA VEHICULO SZU 361 | 15
CONDUCTOR Juan Gonzalez
DESPACHADO POR: | RECIBIDO POR:

Powered by CamScanner

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

320 830 6335
312 447 3316

FECHA: 08 10 25
ORDEN CLIENTE No.:
REMISIÓN: EF 13148

TE: Constructora Ingtech sas
Tunjuelito
CION: Nuevo Muzú
RIAL: Excavación
A VEHICULO: SZK 361 — 15 M3
UCTOR: Juan González
CHADO POR: | RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 312 447 3316

FECHA: 08 1
ORDEN CL
REMISIÓN: EF 13149

CLIENTE: Constructora Inglech sas
OBRA: Tunjuelito
DIRECCION: Nuevo Muzú
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: SZK 769 — 15
CONDUCTOR: Jhonatan Saavedra
DESPACHADO POR: | RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

. 320 830 6335
. 312 447 3316

FECHA: 06 10 25
ORDEN CLIENTE No.:
REMISIÓN: EF 13150

ENTE: Constructora Inglech sas
RA: Tunjuelito
RECCION: Nuevo Muzú
ATERIAL: Excavación
ACA VEHICULO: TFT 870 — 15 M3
ONDUCTOR: Camilo Montoya
SPACHADO POR: | RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 322 252 6816

FEC
06 10
ORDEN CLIE
REMISIÓN: EF 23165

CLIENTE: Constructora Inglech sas
OBRA: Tunjuelito
DIRECCION: Nuevo Muzú
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: SZU 361 — 15
CONDUCTOR: Juan González
DESPACHADO POR: | RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

el. 320 830 6335
el. 322 252 6816

FECHA: 06 10 25
ORDEN CLIENTE No.:
REMISIÓN: EF 23166

LIENTE: Constructora Inglech sas
BRA: Tunjuelito
IRECCION: Nuevo Muzú
ATERIAL: Excavación
LACA VEHICULO: SZK 769 — 15 M3
ONDUCTOR: Jhonatan Saavedra
ESPACHADO POR: | RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 322 252 6816

FECHA: 09 10 25
ORDEN CLIENTE N
REMISIÓN: EF 23167

CLIENTE: Constructora Inglech sas
OBRA: Tunjuelito
DIRECCION: Nuevo Muzú
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: TFT 870 — 15 M
CONDUCTOR: Camilo Montoya
DESPACHADO POR: | RECIBIDO POR:

Powered by CamScanner

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 322 252 6816

FECHA: 07 10 25

ORDEN CLIENTE No.:

REMISIÓN: EF 23168

CLIENTE	Constructora Ingtech sas
OBRA	Tunjuelito
DIRECCION	Nuevo Muzú
MATERIAL	Excavación
PLACA VEHICULO	SZU 361 — 15 M3
CONDUCTOR	Juan Gonzalez
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 322 252 6816

ORDE: 6

REMISIÓN: EF 23169

CLIENTE	Constructora Ingtech sas
OBRA	Tunjuelito
DIRECCION	Nuevo Muzú
MATERIAL	Excavación
PLACA VEHICULO	SZK 769 — 15
CONDUCTOR	Jhonatan Saavedra
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 322 252 6816

FECHA: 07 10 25

ORDEN CLIENTE No.:

REMISIÓN: EF 23170

CLIENTE	Constructora Ingtech sas
OBRA	Tunjuelito
DIRECCION	Nuevo Muzú
MATERIAL	Excavación
PLACA VEHICULO	TFT 870 — 15 M3
CONDUCTOR	Camilo Montoya
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 322 252 6816

FECH: 08 10

ORDEN CLIE:

REMISIÓN: EF 23171

CLIENTE	Constructora Ingtech sas
OBRA	Tunjuelito
DIRECCION	Nuevo Muzú
MATERIAL	Excavación
PLACA VEHICULO	SZU 361 — 15
CONDUCTOR	Juan Gonzàlez
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 322 252 6816

FECHA: 08 10 25

ORDEN CLIENTE No.:

REMISIÓN: EF 23172

CLIENTE	Constructora Ingtech sas
OBRA	Tunjuelito
DIRECCION	Nuevo Muzú
MATERIAL	Excavación
PLACA VEHICULO	SZU 361 — 15 M3
CONDUCTOR	Juan Gonzalèz
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 322 252 6816

FECHA: 08 10 25

ORDEN CLIENTE No.:

REMISIÓN: EF 23173

CLIENTE	Constructora Ingtech sas
OBRA	Tunjuelito
DIRECCION	Nuevo Muzú
MATERIAL	Excavación
PLACA VEHICULO	SZK 769 — 15 M3
CONDUCTOR	Jhonatan Saavedra
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:

Powered by CamScanner

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

FECHA: 08 10 25

0 830 6335
2 252 6816

REMISIÓN: EF 23174

ORDEN CLIENTE No.:

E: Constructora Ingtech sas
: Tunjuelito
ION: Nuevo Muzú
AL: Excavación
VEHICULO: TFT 870 — 15 M3
CTOR:

HADO POR: | RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

FECHA: 10 10

Cel. 320 830 6335
Cel. 322 252 6816

REMISIÓN: EF 23175

ORDEN CLIE

CLIENTE: Constructora Ingtech sas
OBRA: Tunjuelito
DIRECCION: Nuevo Muzú
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: SZU 361 — 15
CONDUCTOR: Juan Gonzalez
DESPACHADO POR: | RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

FECHA: 10 10 25

20 830 6335
22 252 6816

REMISIÓN: EF 23176

ORDEN CLIENTE No.:

TE: Constructora Ingtech sas
: Tunjuelito
CION: Nuevo Muzú
RIAL: Excavación
VEHICULO: SZK 769 — 15 M3
JCTOR: Jhonatan Saavedra
HADO POR: | RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

FECHA: 10 10 25

Cel. 320 830 6335
Cel. 322 252 6816

REMISIÓN: EF 23177

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE: Constructora Ingtech sas
OBRA: Tunjuelito
DIRECCION: Nuevo Muzú
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: TFT 870 — 15 M3
CONDUCTOR: Camilo Montoya
DESPACHADO POR: | RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolucion Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

FECHA: 13 10 25

1. 320 830 6335
1. 322 252 6816

REMISIÓN: EF 23178

ORDEN CLIENTE No.:

IENTE: Constructora Ingtech sas
RA: Tunjuelito
RECCION: Nuevo Muzú
ATERIAL: Excavación
ACA VEHICULO: SZU 361 — 15 M3
ONDUCTOR: Juan Gonzalez
SPACHADO POR: | RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

FECHA: 13 10 25

Cel. 320 830 6335
Cel. 322 252 6816

REMISIÓN: EF 23179

ORDEN CLIENTE No.:

CLIENTE: Constructora Ingtech sas
OBRA: Tunjuelito
DIRECCION: Nuevo Muzú
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: SZK 769 — 15. M3
CONDUCTOR: Jhonatan Saavedra
DESPACHADO POR: | RECIBIDO POR:

Powered by CamScanner

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 322 252 6816

FECHA: 13 | 10 | 25

ORDEN CLIENTE No.:

REMISIÓN: EF 23180

CLIENTE: Constructora Inglech sas
OBRA: Tunjuelito
DIRECCION: Nuevo Muzú
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: TFT 870 — 15 M3
CONDUCTOR: Camilo Montoya
DESPACHADO POR:
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 322 252 6816

13

ORDEN

REMISIÓN: EF 23181

CLIENTE: Constructora Inglech sas
OBRA: Tunjuelito
DIRECCION: Nuevo Muzú
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: SZU 361 — 15
CONDUCTOR: Juan Gonzalez
DESPACHADO POR:
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 322 252 6816

FECHA: 14 | 10 | 25

ORDEN CLIENTE No.:

REMISIÓN: EF 23182

CLIENTE: Constructora Inglech sas
OBRA: Tunjuelito
DIRECCION: Nuevo Muzú
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: SZK 769 — 15 M3
CONDUCTOR: Jhonatan Saavedra
DESPACHADO POR:
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 322 252 6816

FECHA: 14 | 10

ORDEN CLIENT

REMISIÓN: EF 23183

CLIENTE: Constructora Inglech sas
OBRA: Tunjuelito
DIRECCION: Nuevo Muzú
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: TFT 870 — 15
CONDUCTOR: Camilo Montoya
DESPACHADO POR:
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 322 252 6816

FECHA: 14 | 10 | 25

ORDEN CLIENTE No.:

REMISIÓN: EF 23184

CLIENTE: Constructora Inglech sas
OBRA: Tunjuelito
DIRECCION: Nuevo Muzú
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: SZU 361 — 15 M3
CONDUCTOR: Juan Gonzalez
DESPACHADO POR:
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 322 252 6816

FECHA: 16 | 10 | 2

ORDEN CLIENTE N

REMISIÓN: EF 23185

CLIENTE: Constructora Inglech sas
OBRA: Tunjuelito
DIRECCION: Nuevo Muzú
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: SZK 769 — 15 M
CONDUCTOR: Jhonatan Saavedra
DESPACHADO POR:
RECIBIDO POR:

Powered by CamScanner

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 322 252 6816

FECHA: 16 10 25

ORDEN CLIENTE No.:

REMISIÓN: EF 23186

CLIENTE: Constructora Inglech sas
OBRA: Tunjuelito
DIRECCION: Nuevo Muzú
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: TFT 870 — 15 M3
CONDUCTOR: Camilo Montoya
DESPACHADO POR:
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 322 252 6816

FECHA: 16 10

ORDEN CLIEN

REMISIÓN: EF 23187

CLIENTE: Constructora Inglech sas
OBRA: Tunjuelito
DIRECCION: Nuevo Muzú
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: SZU 361 — 15
CONDUCTOR: Juan Gonzalez
DESPACHADO POR:
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 322 252 6816

FECHA: 20 10 25

ORDEN CLIENTE No.:

REMISIÓN: EF 23188

CLIENTE: Constructora Inglech sas
OBRA: Tunjuelito
DIRECCION: Nuevo Muzú
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: SZK 769 — 15 M3
CONDUCTOR: Jhonatan Saavedra
DESPACHADO POR:
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 322 252 6816

FECHA: 20 10 2

ORDEN CLIENTE N

REMISIÓN: EF 23189

CLIENTE: Constructora Inglech sas
OBRA: Tunjuelito
DIRECCION: Nuevo Muzú
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: TFT 870 — 15 M3
CONDUCTOR: Camilo Montoya
DESPACHADO POR:
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 322 252 6816

FECHA: 20 10 25

ORDEN CLIENTE No.:

REMISIÓN: EF 23190

CLIENTE: Constructora Inglech sas
OBRA: Tunjuelito
DIRECCION: Nuevo Muzú
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: SZU 361 — 15 M3
CONDUCTOR: Juan Gonzalez
DESPACHADO POR:
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 322 252 6816

FECHA: 20 10 25

ORDEN CLIENTE No.:

REMISIÓN: EF 23191

CLIENTE: Constructora Inglech sas
OBRA: Tunjuelito
DIRECCION: Nuevo Muzú
MATERIAL: Excavación
PLACA VEHICULO: SZK 769 — 15 M3
CONDUCTOR: Jhonatan Saavedra
DESPACHADO POR:
RECIBIDO POR:

Powered by CamScanner

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

FECHA 22 10 25

ORDEN CLIENTE No.

20 830 6335
22 252 6816

REMISIÓN EF 23192

E Constructora Inglech sas
Tunjuelito
CION Nuevo Muzú
IAL Excavación
VEHICULO TFT 870 15 M3
CTOR Camilo Montoya
HADO POR:
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

FE 22 1

ORDEN CI

Cel. 320 830 6335
Cel. 322 252 6816

REMISIÓN EF 23193

CLIENTE Constructora Inglech sas
OBRA Tunjuelito
DIRECCION Nuevo Muzú
MATERIAL Excavación
PLACA VEHICULO SZU 361 15
CONDUCTOR Juan Gonzalez
DESPACHADO POR:
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

FECHA 29 10 25

ORDEN CLIENTE No.

0 830 6335
22 252 6816

REMISIÓN EF 23194

E Constructora Inglech sas
Tunjuelito
CION Nuevo Muzú
RIAL Excavación
VEHICULO SZK 769 15 M3
UCTOR Jhonatan Saavedra
CHADO POR:
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

FECH 29 10

ORDEN CLIE

Cel. 320 830 6335
Cel. 322 252 6816

REMISIÓN EF 23195

CLIENTE Constructora Inglech sas
OBRA Tunjuelito
DIRECCION Nuevo Muzú
MATERIAL Excavación
PLACA VEHICULO TFT 870 15-
CONDUCTOR Camilo Montoya
DESPACHADO POR:
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

FECHA 30 10 25

ORDEN CLIENTE No.

l. 320 830 6335
l. 322 252 6816

REMISIÓN EF 23196

IENTE Constructora Inglech sas
BRA Tunjuelito
RECCION Nuevo Muzú
ATERIAL Excavación
ACA VEHICULO SZU 361 1T M3
ONDUCTOR Juan Gonzalez
SPACHADO POR:
RECIBIDO POR:

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldía Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

FECHA 30 10 2

ORDEN CLIENTE

Cel. 320 830 6335
Cel. 322 252 6816

REMISIÓN EF 23197

CLIENTE Constructora Inglech sas
OBRA Tunjuelito
DIRECCION Nuevo Muzú
MATERIAL Excavación
PLACA VEHICULO SKZ 769 15 M
CONDUCTOR Jhonatan Saavedra
DESPACHADO POR:
RECIBIDO POR:

Powered by CamScanner

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldia Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 322 252 6816

FECHA: 31 | 10 | 25

ORDEN CLIENTE No.:

REMISIÓN: EF 23198

CLIENTE	Constructora Inglech sas	
OBRA	Tunjuelito	
DIRECCION	Nuevo Muzú	
MATERIAL	Excavación	
PLACA VEHICULO	TFT 870	15 M3
CONDUCTOR	Camilo Montoya	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:	

IMPRESORES • Cristina Reyes • NIT 51.932.726-4 • Cel. 312 371 1626

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldia Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 322 252 6816

FECHA: 31 | 10 | 25

ORDEN CLIENTE No.:

REMISIÓN: EF 23199

CLIENTE	Constructora Inglech sas	
OBRA	Tunjuelito	
DIRECCION	Nuevo Muzú	
MATERIAL	Excavación	
PLACA VEHICULO	TFT 870	15. M3
CONDUCTOR	Camilo Montoya	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:	

IMPRESORES • Cristina Reyes • NIT 51.932.726-4 • Cel. 312 371 1626

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Escombrera Municipal El Altico. Resolución Alcaldia Municipal de Soacha 1202 del 21 de Diciembre de 2016

Cel. 320 830 6335
Cel. 322 252 6816

FECHA: 31 | 10 | 25

ORDEN CLIENTE No.:

REMISIÓN: EF 23200

CLIENTE	Constructora Inglech sas	
OBRA	Tunjuelito	
DIRECCION	Nuevo Muzú	
MATERIAL	Excavación	
PLACA VEHICULO	SZU 361	13 M3
CONDUCTOR	Juan Gonzalez	
DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:	

IMPRESORES • Cristina Reyes • NIT 51.932.726-4 • Cel. 312 371 1626

Powered by CamScanner

Granulados Reciclados de Colombia Greco

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S NIT. 900767473-7

Vale de Recepción Nro.: **PBT VD A004170-285-2025** **Generado el: 2025-12-01**

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

FECHA Y HORA DE INGRESO: 2025-10-06 12:09:50

TRANSPORTE	DATOS DEL GENERADOR	DATOS DEL GESTOR
TRANSPORTADOR(A): **NO DE IDENTIFICACION:** **CONDUCTOR:** EDUIN MURILLO **NO DE IDENTIFICACION:** 1019602573 **PLACA VEHICULO:** SXS806 **PIN-TRANS:** NA **TIPO VEHICULO:** Doble	**GENERADORA:**INGECOP OBRAS CIVILES SAS **NIT:** 901583763 **PIN-GEN:**NA **TELEFONO:** 3163091076 **NOMBRE OBRA:** NA **DIRECCION:** TUNAL **MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ, D.C.	**NOMBRE:** GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S **NIT:** 900.767.473-7 **PIN:** 19309 **REPRESENTANTE LEGAL:** Javier Alexander Castillo González **DIRECCION:** • Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur, Vereda Siberia Cota – Cundinamarca • Avenida Boyacá # 73 - 00 SUR, localidad de Ciudad Bolívar

CLASIFICACIÓN DE MATERIAL: Pétreos	TIPO: (Concreto, ladrillos, asfalto)	CANTIDAD: (m3 Y Ton)
Observaciones: VIAJE CONTAMINADO	Asfalto	15 (m3) - 19.2 Ton

Nombre del conductor	Nombre del encargado obra	Nombre del responsable - CTA
CC:	CC:	Javier Alexander Castillo González NIT:900767473-7

Nota: La información incluida en este vale, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a GRECO, por lo cual declara y garantiza a GRECO que la información suministrada es verdadera, completa y fidedigna, y exime a GRECO de toda responsabilidad con respecto a la misma. Para generar su certificado de disposición de manera rápida y sencilla, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.recicladosgreco.com y utilizar la función 'Genere su certificado' que encontrará en el encabezado, diligencie usuario y contraseña. Si aún no dispone de usuario y contraseña, por favor envíe una solicitud a la dirección de correo electrónico analistacomercial@recicladosgreco.com. Estaremos encantados de asistirle en el proceso, para mas información Cel. 3176575562.

Granulados Reciclados de Colombia Greco

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S NIT. 900767473-7

Vale de Recepción Nro.: **PBT VD A004170-292-2025 Generado el: 2025-10-22**

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

FECHA Y HORA DE INGRESO: 2025-10-22 12:28:16

TRANSPORTE	DATOS DEL GENERADOR	DATOS DEL GESTOR
TRANSPORTADOR(A): **NO DE IDENTIFICACION:** **CONDUCTOR:** LUIS SANCHEZ **NO DE IDENTIFICACION:** 80411869 **PLACA VEHICULO:** DBB045 **PIN-TRANS:** 2071 **TIPO VEHICULO:** Doble	**GENERADORA:**INGECOP OBRAS CIVILES SAS **NIT:** 901583763 **PIN-GEN:**NA **TELEFONO:** 3163091076 **NOMBRE OBRA:** NA **DIRECCION:** TUNJUELITO **MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ, D.C.	**NOMBRE:** GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S **NIT:** 900.767.473-7 **PIN:** 19309 **REPRESENTANTE LEGAL:** Javier Alexander Castillo González **DIRECCION:** • Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur, Vereda Siberia Cota – Cundinamarca • Avenida Boyacá # 73 - 00 SUR, localidad de Ciudad Bolívar

CLASIFICACIÓN DE MATERIAL: Pétreos	TIPO: **(Concreto, ladrillos, asfalto)**	CANTIDAD: **(m3 Y Ton)**
Observaciones:	Concreto	15 (m3) - 19.2 Ton

Nombre del conductor	**Nombre del encargado obra**	**Nombre del responsable - CTA**
CC:	CC:	Javier Alexander Castillo González NIT:900767473-7

Nota: La información incluida en este vale, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a GRECO, por lo cual declara y garantiza a GRECO que la información suministrada es verdadera, completa y fidedigna, y exime a GRECO de toda responsabilidad con respecto a la misma. Para generar su certificado de disposición de manera rápida y sencilla, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.reciclados greco.com y utilizar la función 'Genere su certificado' que encontrará en el encabezado, diligencie usuario y contraseña, por favor envíe una solicitud a la dirección de correo electrónico analistacomercial@reciclados greco.com. Estaremos encantados de asistirle en el proceso, para mas información Cel. 3176575562.

Powered by CamScanner

Granulados Reciclados de Colombia Greco

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S NIT. 900767473-7

Vale de Recepción Nro.: **PBT VD A0041[illegible]-284-2025 Generado el: 2025-10-06**

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

FECHA Y HORA DE INGRESO: 2025-10-06 11:07:00

TRANSPORTE	DATOS DEL GENERADOR	DATOS DEL GESTOR
TRANSPORTADOR(A): **NO DE IDENTIFICACION:** **CONDUCTOR:** ROBINSON ROJAS **NO DE IDENTIFICACION:** 1003540693 **PLACA VEHICULO:** TAL534 **PIN-TRANS:** NA **TIPO VEHICULO:** Doble	**GENERADORA:**INGECOP OBRAS CIVILES SAS **NIT:** 901583763 **PIN-GEN:**NA **TELEFONO:** 3163091076 **NOMBRE OBRA:** NA **DIRECCION:** TUNJUELITO **MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ, D.C.	**NOMBRE:** GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S **NIT:** 900.767.473-7 **PIN:** 19309 **REPRESENTANTE LEGAL:** Javier Alexander Castillo González **DIRECCION:** • Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur, Vereda Siberia Cota - Cundinamarca • Avenida Boyacá # 73 - 00 SUR, localidad de Ciudad Bolívar

CLASIFICACIÓN DE MATERIAL: Pétreos	TIPO: **(Concreto, ladrillos, asfalto)**	CANTIDAD: **(m3 Y Ton)**
Observaciones:	Asfalto	15 (m3) - 19.2 Ton

Nombre del conductor	**Nombre del encargado obra**	**Nombre del responsable - CTA**
CC:	CC:	Javier Alexander Castillo González NIT:900767473-7

Nota: La información incluida en este vale, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a GRECO, por lo cual declara y garantiza a GRECO que la información suministrada es verdadera, completa y fidedigna, y exime a GRECO de toda responsabilidad con respecto a la misma. Para generar su certificado de disposición de manera rápida y sencilla, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.recicladosgreco.com y utilizar la función 'Genere su certificado' que encontrará en el encabezado, diligencie usuario y contraseña. Si aún no dispone de usuario y contraseña, por favor envíe la solicitud a la dirección de correo electrónico analistacomercial@recicladosgreco.com. Estaremos encantados de asistirle en el proceso, para mas información Cel. 3176575562.

Powered by CamScanner

Granulados Reciclados de Colombia Greco

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S NIT. 900767473-7

Vale de Recepción Nro.: **PBT VD A004170-286-2025 Generado el: 2025-10-06**

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

FECHA Y HORA DE INGRESO: 2025-10-06 12:35:39

TRANSPORTE	DATOS DEL GENERADOR	DATOS DEL GESTOR
TRANSPORTADOR(A): **NO DE IDENTIFICACION:** **CONDUCTOR:** YOMAR SANTANA **NO DE IDENTIFICACION:** 1023006260 **PLACA VEHICULO:** SZX882 **PIN-TRANS:** NA **TIPO VEHICULO:** Doble	**GENERADORA:**INGECOP OBRAS CIVILES SAS **NIT:** 9015837 **PIN-GEN:**NA **TELEFONO:** 3163091076 **NOMBRE OBRA:** NA **DIRECCION:** TUNJUELITO **MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ, D.C.	**NOMBRE:** GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S **NIT:** 900.767.473-7 **PIN:** 19309 **REPRESENTANTE LEGAL:** Javier Alexander Castillo González **DIRECCION:** • Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur, Vereda Siberia Cota – Cundinamarca • Avenida Boyacá # 73 - 00 SUR, localidad de Ciudad Bolívar

CLASIFICACIÓN DE MATERIAL: Pétreos	TIPO: (Concreto, ladrillos, asfalto)	CANTIDAD: (m3 Y Ton)
Observaciones:	Asfalto	15 (m3) - 19.2 Ton

Nombre del conductor	Nombre del encargado obra	Nombre del responsable - CTA
CC:	CC:	Javier Alexander Castillo González NIT:900767473-7

Nota: La información incluida en este vale, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a GRECO, por lo cual declara y garantiza a GRECO que la información suministrada es verdadera, completa y fidedigna, y exime a GRECO de toda responsabilidad con respecto a la misma. Para generar su certificado de disposición de manera rápida y sencilla, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.recicladosgreco.com y utilizar la función 'Genere su certificado' que encontrará en el encabezado, diligencie usuario y contraseña. Si aún no dispone de usuario y contraseña, por favor envíe una sol citud a la dirección de correo electrónico analistacomercial@recicladosgreco.com. Estaremos encantados de asistirle en el proceso, para mas información Cel. 3176575562.

Powered by CamScanner

Granulados Reciclados de Colombia Greco

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S NIT. 900767473-7

Vale de Recepción Nro.: **PBT VD A004170-287-2025 Generado el: 2025-10-06**

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

FECHA Y HORA DE INGRESO: 2025-10-06 13:34:55

TRANSPORTE	DATOS DEL GENERADOR	DATOS DEL GESTOR
TRANSPORTADOR(A): **NO DE IDENTIFICACION:** **CONDUCTOR:** ROBINSON ROJAS **NO DE IDENTIFICACION:** 1003540693 **PLACA VEHICULO:** TAL534 **PIN-TRANS:** NA **TIPO VEHICULO:** Doble	**GENERADORA:**INGECOP OBRAS CIVILES SAS **NIT:** 901583763 **PIN-GEN:**NA **TELEFONO:** 3163091076 **NOMBRE OBRA:** NA **DIRECCION:** TUNJUELITO **MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ, D.C.	**NOMBRE:** GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S **NIT:** 900.767.473-7 **PIN:** 19309 **REPRESENTANTE LEGAL:** Javier Alexander Castillo González **DIRECCION:** • Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur, Vereda Siberia Cota – Cundinamarca • Avenida Boyacá # 73 - 00 SUR, localidad de Ciudad Bolívar

CLASIFICACIÓN DE MATERIAL: Pétreos	TIPO: **(Concreto, ladrillos, asfalto)**	CANTIDAD: **(m3 Y Ton)**
Observaciones:	Asfalto	15 (m3) - 19.2 Ton

Nombre del conductor	**Nombre del encargado obra**	**Nombre del responsable - CTA**
CC:	CC:	Javier Alexander Castillo González NIT:900767473-7

Nota: La información incluida en este vale, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a GRECO, por lo cual declara y garantiza a GRECO que la información suministrada es verdadera, completa y fidedigna, y exime a GRECO de toda responsabilidad con respecto a la misma. Para generar su certificado de disposición de manera rápida y sencilla, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.recicladosgreco.com y utilizar la función 'Genere su certificado' que encontrará en el encabezado, diligencie usuario y contraseña. Si aún no dispone de usuario y contraseña, por favor envíe una solicitud a la dirección de correo electrónico analistacomercial@recicladosgreco.com. Estaremos encantados de asistirle en el proceso, para mas información Cel. 3176575562.

Powered by CamScanner

Granulados Reciclados de Colombia Greco

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S NIT. 900767473-7

Vale de Recepción Nro.: **PBT VD A004170-288-2025 Generado el: 2025-10-06**

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

FECHA Y HORA DE INGRESO: 2025-10-06 15:57:04

TRANSPORTE	DATOS DEL GENERADOR	DATOS DEL GESTOR
TRANSPORTADOR(A): **NO DE IDENTIFICACION:** **CONDUCTOR:** YOMAR SANTANA **NO DE IDENTIFICACION:** 1023006260 **PLACA VEHICULO:** SZX982 **PIN-TRANS:** NA **TIPO VEHICULO:** Doble	**GENERADORA:**INGECOP OBRAS CIVILES SAS **NIT:** 901583763 **PIN-GEN:**NA **TELEFONO:** 3163091076 **NOMBRE OBRA:** NA **DIRECCION:** TUNJUELITO **MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ, D.C.	**NOMBRE:** GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S **NIT:** 900.767.473-7 **PIN:** 19309 **REPRESENTANTE LEGAL:** Javier Alexander Castillo González **DIRECCION:** • Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur, Vereda Siberia Cota – Cundinamarca • Avenida Boyacá # 73 - 00 SUR, localidad de Ciudad Bolívar

CLASIFICACIÓN DE MATERIAL: Pétreos	TIPO: **(Concreto, ladrillos, asfalto)**	CANTIDAD: **(m3 Y Ton)**
Observaciones:	Asfalto	15 (m3) - 19.2 Ton

Nombre del conductor	**Nombre del encargado obra**	**Nombre del responsable - CTA**
CC:	CC:	Javier Alexander Castillo González NIT:900767473-7

Nota: La información incluida en este vale, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a GRECO, por lo cual declara y garantiza a GRECO que la información suministrada es verdadera, completa y fidedigna, y exime a GRECO de toda responsabilidad con respecto a la misma. Para generar su certificado de disposición de manera rápida y sencilla, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.recicladosgreco.com y utilizar la función 'Genere su certificado' que encontrará en el encabezado, diligencie usuario y contraseña. Si aún no dispone de usuario y contraseña, por favor envíe una solicitud a la dirección de correo electrónico analistacomercial@recicladosgreco.com. Estaremos encantados de asistirle en el proceso, para mas información Cel. 3176575562.

Powered by CamScanner

Granulados Reciclados de Colombia Greco

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S NIT. 900767473-7

Vale de Recepción Nro.: **PBT VD A004170-289-2025 Generado el: 2025-10-07**

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

FECHA Y HORA DE INGRESO: 2025-10-07 09:10:37

TRANSPORTE	DATOS DEL GENERADOR	DATOS DEL GESTOR
TRANSPORTADOR(A): **NO DE IDENTIFICACION:** **CONDUCTOR:** ROBINSON ROJAS **NO DE IDENTIFICACION:** 1003540693 **PLACA VEHICULO:** TAL534 **PIN-TRANS:** NA **TIPO VEHICULO:** Doble	**GENERADORA:**INGECOP OBRAS CIVILES SAS **NIT:** 901583763 **PIN-GEN:**NA **TELEFONO:** 3163091076 **NOMBRE OBRA:** NA **DIRECCION:** TUNJUELITO **MUNICIPIO:** BOGOTÁD.C.-BOGOTÁ, D.C.	**NOMBRE:** GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S **NIT:** 900.767.473-7 **PIN:** 19309 **REPRESENTANTE LEGAL:** Javier Alexander Castillo Gonzalez **DIRECCION:** • Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur, Vereda Siberia Cota – Cundinamarca • Avenida Boyacá # 73 - 00 SUR, localidad de Ciudad Bolívar

CLASIFICACIÓN DE MATERIAL: Pétreos	TIPO: (Concreto, ladrillos, asfalto)	CANTIDAD: (m3 Y Ton)
Observaciones:	Asfalto	15 (m3) - 19.2 Ton

Nombre del conductor	Nombre del encargado obra	Nombre del responsable - CTA
CC:	CC:	Javier Alexander Castillo González NIT:900767473-7

Nota: La información incluida en este vale, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a GRECO, por lo cual declara y garantiza a GRECO que la información suministrada es verdadera, completa y fidedigna, y exime a GRECO de toda responsabilidad con respecto a la misma. Para generar su certificado de disposición de manera rápida y sencilla, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.recicladosgreco.com y utilizar la función 'Genere su certificado' que encontrará en el encabezado, diligencie usuario y contraseña. Si aún no dispone de usuario y contraseña, por favor envíe una solicitud a la dirección de correo electrónico analistacomercial@recicladosgreco.com. Estaremos encantados de asistirle en el proceso, para mas información Cel 3176575562.

Powered by CamScanner

Granulados Reciclados de Colombia Greco

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S NIT. 900767473-7

Vale de Recepción Nro.: **PBT VD A004170-290-2025 Generado el: 2025-10-07**

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

FECHA Y HORA DE INGRESO: 2025-10-07 10:53:47

TRANSPORTE	DATOS DEL GENERADOR	DATOS DEL GESTOR
TRANSPORTADOR(A): **NO DE IDENTIFICACION:** **CONDUCTOR:** YOMAR SANTANA **NO DE IDENTIFICACION:** 1023006260 **PLACA VEHICULO:** SZX882 **PIN-TRANS:** NA **TIPO VEHICULO:** Doble	**GENERADORA:**INGECOP OBRAS CIVILES SAS **NIT:** 901583763 **PIN-GEN:**NA **TELEFONO:** 3163091076 **NOMBRE OBRA:** NA **DIRECCION:** TUNJUELITO **MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ, D.C.	**NOMBRE:** GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S **NIT:** 900.767.473-7 **PIN:** 19309 **REPRESENTANTE LEGAL:** Javier Alexander Castillo González **DIRECCION:** • Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur, Vereda Siberia Cota – Cundinamarca • Avenida Boyacá # 73 - 00 SUR, localidad de Ciudad Bolívar

CLASIFICACIÓN DE MATERIAL: Pétreos	TIPO: **(Concreto, ladrillos, asfalto)**	CANTIDAD: **(m3 Y Ton)**
Observaciones:	Asfalto	15 (m3) - 19.2 Ton

Nombre del conductor	**Nombre del encargado obra**	**Nombre del responsable - CTA**
CC:	CC:	Javier Alexander Castillo González NIT:900767473-7

Nota: La información incluida en este vale, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a GRECO, por lo cual declara y garantiza a GRECO que la información suministrada es verdadera, completa y fidedigna, y exime a GRECO de toda responsabilidad con respecto a la misma. Para generar su certificado de disposición de manera rápida y sencilla, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.reciclados greco.com y utilizar la función 'Genere su certificado' que encontrará en el encabezado, diligencie usuario y contraseña. Si aún no dispone de usuario y contraseña, por favor envíe una solicitud a la dirección de correo electrónico analistacomercial@reciclados greco.com. Estaremos encantados de asistirle en el proceso, para mas información Cel. 3176575562.

Powered by CamScanner

Granulados Reciclados de Colombia Greco

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S NIT. 900767473-7

Vale de Recepción Nro.: **PBT VD A004170-291-2025 Generado el: 2025-10-07**

ANEXO II - CONSTANCIA DE GESTIÓN PROVISIONAL

FECHA Y HORA DE INGRESO: 2025-10-07 11:33:35

TRANSPORTE	DATOS DEL GENERADOR	DATOS DEL GESTOR
TRANSPORTADOR(A): **NO DE IDENTIFICACION:** **CONDUCTOR:** LUIS SANCHEZ **NO DE IDENTIFICACION:** 80411869 **PLACA VEHICULO:** DBB045 **PIN-TRANS:** 2071 **TIPO VEHICULO:** Doble	**GENERADORA:**INGECOP OBRAS CIVILES SAS **NIT:** 901583763 **PIN-GEN:**NA **TELEFONO:** 3163091076 **NOMBRE OBRA:** NA **DIRECCION:** TUNJUELITO **MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ, D.C.	**NOMBRE:** GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S **NIT:** 900.767.473-7 **PIN:** 19309 **REPRESENTANTE LEGAL:** Javier Alexander Castillo González **DIRECCION:** • Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur, Vereda Siberia Cota – Cundinamarca • Avenida Boyacá # 73 - 00 SUR, localidad de Ciudad Bolívar

CLASIFICACIÓN DE MATERIAL: Pétreos	TIPO: **(Concreto, ladrillos, asfalto)**	CANTIDAD: **(m3 Y Ton)**
Observaciones:	Asfalto	15 (m3) - 19.2 Ton

Nombre del conductor	**Nombre del encargado obra**	**Nombre del responsable - CTA**
CC:	CC:	Javier Alexander Castillo González NIT:900767473-7

Nota: La información incluida en este vale, asociada al origen de los RCD, es suministrada por el cliente a GRECO, por lo cual declara y garantiza a GRECO que la información suministrada es verdadera, completa y fidedigna, y exime a GRECO de toda responsabilidad con respecto a la misma. Para generar su certificado de disposición de manera rápida y sencilla, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.recicladosgreco.com y utilizar la función 'Genere su certificado' que encontrará en el encabezado, diligencie usuario y contraseña. Si aún no dispone de usuario y contraseña, por favor envíe una solicitud a la dirección de correo electrónico analistacomercial@recicladosgreco.com. Estaremos encantados de asistirle en el proceso, para mas información Cel. 3176575562.

Powered by CamScanner

RECIBO DE RECEPCIÓN

La empresa **Consorcio DC 2025** identificada con NIT No. **901893060-1** de la sede **Consorcio DC 2025**, por intermedio de **WELTNEU CO SAS**, quien realizó la recolección y transporte, identificado con NIT No. **901265986-2**, entregó a **TRACOL S.A.S ESP** los siguientes residuos para su respectiva disposición final en celda de seguridad de acuerdo a los siguientes datos:

INFORMA QUE:

Solicitud No.	Nombre Técnico	Peso (Kg)	Fecha de Recepción	Nombre Declarado
TRA63775	Sólidos contaminados con derivados del petróleo	200	18/11/2025	SOLIDOS CONTAMINADOS O CADUCADOS

RECIBO DE RECEPCIÓN NO VALIDA COMO ACTA DE DISPOSICIÓN FINAL

Nota: El peso relacionado es peso aproximado generado en la solicitud, el real será entregado en el acta de disposición final.

El material se tratará de acuerdo con la licencia ambiental otorgada por la CAR:

1. Resolución 989 de 26 de mayo de 2015 otorgada a VALCO CONSTRUCTORES LTDA. para: "Almacenamiento, tratamiento y disposición final en celda de desechos peligrosos".
2. Licencia ambiental cedida totalmente por medio de la Resolución 1821 de julio de 2017 a TRACOL SAS ESP Nit. 900962813-3.

Cualquier información adicional relacionada con este recibo se encuentra disponible para su consulta en las instalaciones de TRACOL SAS ESP.

REPORTE DE CANTIDADES DE RCD Y MATERIALES VALORIZADOS

Contrato	622 del 2024
Periodo Evaluado	dic-24
Pin Ambiental	26829

ETAPA	TIPO DE RCD	CANTIDAD DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN VALORIZADOS DE RCD A USAR EN OBRA (Toneladas)	ORIGEN*	CANTIDAD REAL DE LOS RCD GENERADOS EN (Toneladas)	TIPO DE GESTIÓN				
					Disposicion Final	Reutilización	Reciclaje	Otros	Lugar Disposicion Final
Demolición, Excavación y cimentación Construcción	**01 Residuos de Construcción y Demolición susceptibles de aprovechamiento**								
	01 01 Excavación								
	01 01 01 Coberturas Vegetales	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 01 02 Tierras Limpias de excavación	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 01 03 Limos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 01 04 Materiales petreos producto de la excavación	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 01 05 Otros residuos de excavación	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 02 Producto de Cimentacion y Pilotaje								
	01 02 01 Arcillas	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 02 02 Bentonitas	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 02 03 Otros residuos de clmentacion y pilotaje	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 02 Pétreos								
	01 03 01 Concretos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 03 02 Gravas	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 03 03 Cantos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 03 04 Ladrillos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 03 05 Arenas	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 03 06 Morteros	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 03 07 Materiales Cerámicos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 03 08 Residuos de material asfáltico	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 03 09 Bases y subbases granulares	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 03 10 Otros residuos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 No pétreos								
	01 04 01 Madera	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 02 Plásticos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 03 Vidrio	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 04 Papel y Cartón	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 05 Gomas y cauchos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 06 Cartón yeso (drywall)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 07 Acrílico	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 08 Mezclas bituminosas y alquitrán	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 09 Materiales a base fibrocemento	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 10 Otros residuos no pétreos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 05 Metales								
	01 05 01 Acero y hierro	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 05 02 Zinc	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 05 03 Cobre	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 05 04 Aluminio	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 05 05 Otros metales	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	02 RCD - No susceptibles de aprovechamiento								
	02 01 Los que por su estado no pueden ser aprovechados	0	0	0	0	0	0	0	0
	02 02 Los que tengan caracteristicas de peligrosidad								
	02 02 01 Residuos con contenido de asbesto o amiantos y productos que lo contengan	0	0	0	0	0	0	0	0
	02 02 02 Otros residuos con caracteristicas de peligrosidad	0	0	0	0	0	0	0	0

Rafael Eduardo Alzate
REPRESENTANTE LEGAL

REPORTE DE CANTIDADES DE RCD Y MATERIALES VALORIZADOS

Contrato	622 del 2024
Periodo Evaluado	ene-25
Pin Ambiental	26829

ETAPA	TIPO DE RCD	CANTIDAD DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN VALORIZADOS DE RCD A USAR EN OBRA (Toneladas)	ORIGEN*	CANTIDAD REAL DE LOS RCD GENERADOS EN (Toneladas)	TIPO DE GESTIÓN				
					Disposicion Final	Reutilización	Reciclaje	Otros	Lugar Disposicion Final
Demolición, Excavación y cimentación Construcción	**01 Residuos de Construcción y Demolición susceptibles de aprovechamiento**								
	01 01 Excavación								
	01 01 01 Coberturas Vegetales	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 01 02 Tierras Limpias de excavación	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 01 03 Limos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 01 04 Materiales petreos producto de la excavación	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 01 05 Otros residuos de excavación	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 02 Producto de Cimentacion y Pilotaje								
	01 02 01 Arcillas	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 02 02 Bentonitas	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 02 03 Otros residuos de clmentacion y pilotaje	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 02 Pétreos								
	01 03 01 Concretos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 03 02 Gravas	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 03 03 Cantos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 03 04 Ladrillos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 03 05 Arenas	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 03 06 Morteros	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 03 07 Materiales Cerámicos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 03 08 Residuos de material asfáltico	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 03 09 Bases y subbases granulares	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 03 10 Otros residuos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 No pétreos								
	01 04 01 Madera	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 02 Plásticos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 03 Vidrio	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 04 Papel y Cartón	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 05 Gomas y cauchos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 06 Cartón yeso (drywall)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 07 Acrílico	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 08 Mezclas bituminosas y alquitrán	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 09 Materiales a base fibrocemento	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 10 Otros residuos no pétreos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 05 Metales								
	01 05 01 Acero y hierro	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 05 02 Zinc	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 05 03 Cobre	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 05 04 Aluminio	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 05 05 Otros metales	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	02 RCD - No susceptibles de aprovechamiento								
	02 01 Los que por su estado no pueden ser aprovechados	0	0	0	0	0	0	0	0
	02 02 Los que tengan caracteristicas de peligrosidad								
	02 02 01 Residuos con contenido de asbesto o amiantos y productos que lo contengan	0	0	0	0	0	0	0	0
	02 02 02 Otros residuos con caracteristicas de peligrosidad	0	0	0	0	0	0	0	0

Rafael Eduardo Alzate
REPRESENTANTE LEGAL

REPORTE DE CANTIDADES DE RCD Y MATERIALES VALORIZADOS

Contrato	622 del 2024
Periodo Evaluado	feb-25
Pin Ambiental	26829

ETAPA	TIPO DE RCD	CANTIDAD DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN VALORIZADOS DE RCD A USAR EN OBRA (Toneladas)	ORIGEN*	CANTIDAD REAL DE LOS RCD GENERADOS EN (Toneladas)	TIPO DE GESTIÓN				
					Disposicion Final	Reutilización	Reciclaje	Otros	Lugar Disposicion Final
Demolición, Excavación y cimentación Construcción	**01 Residuos de Construcción y Demolición susceptibles de aprovechamiento**								
	01 01 Excavación								
	01 01 01 Coberturas Vegetales	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 01 02 Tierras Limpias de excavación	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 01 03 Limos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 01 04 Materiales petreos producto de la excavación	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 01 05 Otros residuos de excavación	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 02 Producto de Cimentacion y Pilotaje								
	01 02 01 Arcillas	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 02 02 Bentonitas	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 02 03 Otros residuos de clmentacion y pilotaje	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 02 Pétreos								
	01 03 01 Concretos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 03 02 Gravas	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 03 03 Cantos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 03 04 Ladrillos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 03 05 Arenas	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 03 06 Morteros	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 03 07 Materiales Cerámicos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 03 08 Residuos de material asfáltico	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 03 09 Bases y subbases granulares	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 03 10 Otros residuos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 No pétreos								
	01 04 01 Madera	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 02 Plásticos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 03 Vidrio	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 04 Papel y Cartón	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 05 Gomas y cauchos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 06 Cartón yeso (drywall)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 07 Acrílico	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 08 Mezclas bituminosas y alquitrán	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 09 Materiales a base fibrocemento	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 10 Otros residuos no pétreos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 05 Metales								
	01 05 01 Acero y hierro	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 05 02 Zinc	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 05 03 Cobre	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 05 04 Aluminio	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 05 05 Otros metales	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	02 RCD - No susceptibles de aprovechamiento								
	02 01 Los que por su estado no pueden ser aprovechados	0	0	0	0	0	0	0	0
	02 02 Los que tengan caracteristicas de peligrosidad								
	02 02 01 Residuos con contenido de asbesto o amiantos y productos que lo contengan	0	0	0	0	0	0	0	0
	02 02 02 Otros residuos con caracteristicas de peligrosidad	0	0	0	0	0	0	0	0

Rafael Eduardo Alzate
REPRESENTANTE LEGAL

REPORTE DE CANTIDADES DE RCD Y MATERIALES VALORIZADOS

Contrato	622 del 2024
Periodo Evaluado	mar-25
Pin Ambiental	26829

ETAPA	TIPO DE RCD	CANTIDAD DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN VALORIZADOS DE RCD A USAR EN OBRA (Toneladas)	ORIGEN*	CANTIDAD REAL DE LOS RCD GENERADOS EN (Toneladas)	TIPO DE GESTIÓN				
					Disposicion Final	Reutilización	Reciclaje	Otros	Lugar Disposicion Final
Demolición, Excavación y cimentación Construcción	**01 Residuos de Construcción y Demolición susceptibles de aprovechamiento**								
	01 01 Excavación								
	01 01 01 Coberturas Vegetales	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 01 02 Tierras Limpias de excavación	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 01 03 Limos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 01 04 Materiales petreos producto de la excavación	**0**	**0**	**2085,56**	**2085,56**	**0**	**0**	**0**	**Servicios Profesionales AIA - Maquinas Amarillas - Ingeomineria - MAGIR**
	01 01 05 Otros residuos de excavación	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 02 Producto de Cimentacion y Pilotaje								
	01 02 01 Arcillas	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 02 02 Bentonitas	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 02 03 Otros residuos de cImentacion y pilotaje	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 02 Pétreos								
	01 03 01 Concretos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 03 02 Gravas	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 03 03 Cantos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 03 04 Ladrillos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 03 05 Arenas	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 03 06 Morteros	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 03 07 Materiales Cerámicos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 03 08 Residuos de material asfáltico	**0**	**0**	**23,53**	**0**	**0**	**23,53**	**0**	**Servicios Profesionales AIA**
	01 03 09 Bases y subbases granulares	**425,65**	**Granulados Reciclados GRECO - Asmicol**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 03 10 Otros residuos	**0**	**0**	**141,15**	**0**	**0**	**141,15**	**0**	**- SECAM**
	01 04 No pétreos								
	01 04 01 Madera	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 02 Plásticos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 03 Vidrio	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 04 Papel y Cartón	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 05 Gomas y cauchos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 06 Cartón yeso (drywall)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 07 Acrílico	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 08 Mezclas bituminosas y alquitrán	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 09 Materiales a base fibrocemento	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 10 Otros residuos no pétreos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 05 Metales								
	01 05 01 Acero y hierro	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 05 02 Zinc	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 05 03 Cobre	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 05 04 Aluminio	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 05 05 Otros metales	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	02 RCD - No susceptibles de aprovechamiento								
	02 01 Los que por su estado no pueden ser aprovechados	0	0	0	0	0	0	0	0
	02 02 Los que tengan caracteristicas de peligrosidad								
	02 02 01 Residuos con contenido de asbesto o amiantos y productos que lo contengan	0	0	0	0	0	0	0	0
	02 02 02 Otros residuos con caracteristicas de peligrosidad	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		**425,65**	**0**	**2250,24**	**2085,56**	**0**	**164,68**	**0**	

Rafael Eduardo Alzate
REPRESENTANTE LEGAL

AIAS217-2025

Bogotá D.C., 16 de abril del 2025

SERVICIOS PROFESIONALES A.I.A SAS
NIT. 901.651.148-2

GESTOR DE RCDS
REGISTRO DE INSCRIPCIÓN No. 681-2023 del Directorio Ambiental de Proveedores IDU

CERTIFICA QUE

DATOS BÁSICOS DEL GESTOR					
Numero unico asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto	REGISTRO DE INSCRIPCIÓN CAR 052 17 MAYO 2023				
Nombre o razón social	**SERVICIOS PROFESIONALES A.I.A SAS**				
Nit	901.651.148-2				
Representante legal	ANGIE PAOLA RADA				
Dirección	Carrera 71 D # 57 10 sur				
Numero telefónico de contacto	3028494813				
Correo electronico	comercial.serproaia@gmail.com				
Municipio o Distrito	Bogotá D.C				
Gestor	Punto Limpio		Planta de aprovechamiento	X	Disposición final

DATOS BÁSICOS DEL GENERADOR	
Numero único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental competente por proyecto	26829
Nombre o razón social	CONSORCIO DC 2025
Número de identificación o NIT	901.893.060-1
Representante legal	RAFAEL ALZATE MORENO
Dirección de domicilio	CALLE 19 ·43 G 80
Teléfono	3123799155
Correo electrónico	consorciodc2025@gmail.com
Dirección de generación de RCD	Contrato de Obra No. 622 de 2024, cuyo objeto contractual es "Ejecutar, a monto agotable y bajo el sistema de precios unitarios, las actividades correspondientes a la conservación, mantenimiento y/o rehabilitación de la malla vial local e intermedia

CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOS POR TIPO M3		
Tipo de Residuo	Cantidad de RCD recibidos del generador	
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:		
	M3	**TON**
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras,limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	120,30	169,97
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás		
1.3 Pétreos: hormigón, arenas,gravas,gravillas,cantos,pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	15,00	23,53
Total RCD recibidos M3	**135,30**	**193,50**
Fecha de recepción de los RCD	Del 1 al 31 de marzo del 2025	

ANGIE PAOLA RADA
C.C No. 1.010.234.998
Representante Legal

Bogotá, 14 de abril de 2025

CERT-603-2025

Sitio de disposición de material de escombros y estériles las manas (residuos de construcción y demolición) PIN 8418 - SDA secretaria distrital del medio ambiente autorizados mediante resolución número 1480 de 2014 ANLA, dando cumplimiento a la Resolución 1257 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo, escombrera Las Manas.

CERTIFICA QUE:

DATOS EL GESTOR	
Nombre o razón social	MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Número de identificación	NIT: 900.459.311-1
Representante Legal	HERNANDO LAVERDE MANJARRES
Teléfono	+57 (601) 7023060
Correo electrónico	comercial@maquiamarillas.com
Dirección	AV BOYACÁ 71 SUR # 12 - 20
Municipio o Distrito	BOGOTÁ D.C.
Gestor	DISPOSICION FINAL
DATOS BASICOS DEL GENERADOR	
Pin de la obra	26829
Nombre de la obra	CONSORCIO DC CONTRATO DE OBRA No. 622 de 2024 EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
Nombre o razón social	CONSORCIO DC 2025
Documento de identificación o NIT	901893060
Representante Legal	ALZATE MORENO RAFAEL EDUARDO
Dirección domicilio	Cl 19 # 43 G - 80 Ap 812
Teléfono	3 1 2 3 7 9 9 1 5 5
Correo electrónico	rafael.alzate2013@gmail.com
CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO	

TIPO DE RESIDUO	***CANTIDAD M3***	***CANTIDAD TON***
1. Residuos de Construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento	*0,00*	*0,00*
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	*255,00*	*327,09*
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás	*0,00*	*0,00*
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillo y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos, concretos hidráulicos, entre otros	*0,00*	*0,00*
1.4 No petreos: Vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos, tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrilico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, maderay compuestos de madera, cartón-yeso (drywall) entre otros	*0,00*	*0,00*
Totales:	***255,00***	***327,09***

Fecha de Recepción RCD el día 19 de marzo de 2025 hasta el día 26 de marzo de 2025

Verifique la autenticidad de este certificado escaneando el código Qr ubicado en la esquina superior derecha

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.

Aprobó: ANDREA ALVAREZ GARZON

Bogotá/ Cra 17 # 142-25
Tel 702-3060
Cel: 321-469-0709
gerencia@maquiamarillas.com
www.maquiamarillas.com

Transforma Ambientes

Bogotá D.C., sábado, 19 de abril de 2025 **Certificación No. SEC-01523JR-2025**

SECAM J.R S.A.S.
NIT. 830.507.163-0
GESTOR DE RCDS
REGISTRO DE INSCRIPCIÓN No. 514-2019 y 517-2019 del Directorio Ambiental de Proveedores IDU

CERTIFICA QUE

DATOS BASICOS DEL GESTOR	
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto	REGISTRO DE INSCRIPCIÓN CAR 001 MAYO 2 DE 2018
Nombre o razón social	SECAM J.R S.A.S
NIT	830.507.163-0
Representante Legal	RUBIELA RADA ORTIZ
Dirección	CRA 71 D 57 - 10 SUR
Número telefónico de contacto	7763445 - 3002414969
Correo electrónico	solicitudes.soacha@secamjr.com
Municipio o Distrito	BOGOTÁ D.C.
Gestor	☐ Punto Limpio ☑ Planta de aprovechamiento ☐ Disposición final
DATOS BASICOS DEL GENERADOR	
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto	26829.
Nombre o razón social	CONSORCIO DC.
Número de identificación o NIT	901.893.060-1.
Representante legal	-
Dirección de domicilio	-
Teléfono	-
Correo electrónico	ingecop.obrasciviles@gmail.com
	Contrato de obra No. 622 DE 2024, cuyo objeto es "EJECUTAR A

Dirección de generación de RCD	MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”.	
CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOS POR TIPO		
Tipo de Residuo	Cantidad de RCD recibidos del generador	
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:		
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras,limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	0.00 M3	0.00 TON
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.		
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas,gravillas,cantos,pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	90.00 M3	141.15 TON
Total RCD recibidos	90.00 M3	141.15 TON
Fecha de recepción de los RCD	Del 01/03/2025 al 31/03/2025	

Atentamente,



ANGIE PANQUEVA RADA

C.C. No. 1.010.234.998

Representante Legal

Verificar autenticidad

E-mail: solicitudes@secamjr.com

Verifique siempre la autenticidad del presente certificado, comuníquese a los teléfonos relacionados en el pie de la página o por medio del correo electrónico

ANEXO II. FORMATO CONSTANCIA GESTORES

DATOS BÁSICOS DEL GESTOR		
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto	ANLA Resolución 0836 de 2015 ANLA Resolución 1110 de 2017 Secretaría Distrital de Ambiente: PIN 9730	
Nombre o razón social	Ingeominería Outsourcing SAS	
Documento de identificación o NIT	901.000.046-7	
Representante Legal	Miguel Ángel Revelo Ávila	
Dirección	Av. Boyacá # 73 – 00 sur	
Teléfono	3243798749	
Correo electrónico	administracion@ingeomineria.com	
Municipio o Distrito	Bogotá D.C	
Gestor	Punto limpio	
	Planta de aprovechamiento	
	Disposición final	X
DATOS BÁSICOS DEL GENERADOR		
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto	26829	
Nombre o razón social	CONSORCIO DC	
Documento de identificación o NIT	800166199	
Representante Legal	RAFAEL EDUARDO ALZATE	
Dirección domicilio	TUNJUELITO	
Teléfono	3123799155	
Correo electrónico	RAFAEL.ALZATE2013@GMAIL.COM	
Dirección de generación de RCD	TUNJUELITO	
CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO		
Tipo de residuo	**Cantidad de RCD recibidos del generador (t)**	
1. Residuos de construcción y demolición – RCD susceptibles de aprovechamiento:	-	
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	34.5	
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas,bentonitas y demás.	0	
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos,entre otros.	0	
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall),entre otros.	0	
2. Residuos de construcción y demolición - RCD nosusceptibles de aprovechamiento:	-	
2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.	0	
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.	0	
2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos seregirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.	0	
Total, RCD recibidos (t)	**34.5**	
Fecha de recepción de los RCD	Desde el 22/03/2025 hasta el 22/03/2025	

Nota: La densidad relacionada de acuerdo a las características de los materiales y pruebas realizadas dentro del sitio de disposición final es de 2,3 $\frac{Tn}{m^3}$

Cordialmente,

FIRMA (Gestor de RCD – Representante Legal)
NIT: 901.000.046-7
NOMBRE: Miguel Ángel Revelo Ávila

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

Soacha, Abril 15 de 2025.

MAGIR-2025
STIKER –026

CONTRATO DE OBRA No 622-2024 CUYO OBJETO ES " EJECUTAR A MONTO AGOTABE Y BAJO EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA ASI COMO DEL ESPACIO PUBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, CIUDAD DE BOGOTA D.C." PIN 26829.

MANEJO Y GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS S.A.S. NIT 900.714.397- operador único de la escombrera municipal ubicada en el predio denominado EL ESPARTO, ubicado en la vereda Panamá jurisdicción del municipio de Soacha-Cundinamarca autorizada bajo la Resolución CAR No 0680 del 01 de abril del 2016 mediante Resolución prorroga DRSOA No 11247000018 del 01 de marzo del 2024 y Resolución No 1202 del 21 de diciembre del 2016 mediante Resolución prorroga No. 1526 del 17 de agosto del 2023, inscripción IDU 444-2016 **CERTIFICA** que **CONSORCIO DC 2025** con **NIT 901.893.060-1** utilizó el banco de suelo de nuestra compañía, durante el siguiente periodo:

- Del 10 al 31 de Marzo de 2025, para la Disposición final de 1.110M3 **(Mil Ciento Diez Metros Cúbicos)** material de excavación de tierra, de la obra en referencia.

Cualquier información adicional será atendida en el 8214508.

Atentamente,

ILTON PEDRAZA CORREAL
Representante Legal

ANEXO II. FORMATO CONSTANCIA GESTORES		
DATOS BÁSICOS DEL GESTOR		
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto	11247000018	
Nombre o razón social	MAGIR S.A.S ESP	
Documento de identificación o NIT	900.714.397-8	
Representante Legal	Ilton Pedraza Correal	
Dirección	Clle 12 D No 0-16 Este Soacha- Cll 6C No 82A-78 oficina 204	
Teléfono	6226620	
Correo electrónico	magiresp@yahoo.es	
Municipio o Distrito	Soacha	
Gestor	Punto limpio	
	Planta de aprovechamiento	
	Disposición final	x
DATOS BÁSICOS DEL GENERADOR		
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental competente por proyecto	26829	
Nombre o razón social	CONSORCIO DC 2025	
Documento de identificación o NIT	901.893.060-1	
Representante Legal	Rafael Alzate Moreno	
Dirección domicilio	Calle 19 No 43G-80 Apto 812	
Teléfono	3123799155	
Correo electrónico	consorciodc2025@gmail.com	
Dirección de generación de RCD	DG 52 a Sur entre KR 60F y KR 61 KR 29 entre CLL 53 a s y call 53B KR 32 entre CLL 52G Sur y CLL 52F Sur	
CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO		
Tipo de Residuo	**Cantidad de RCD recibidos del generador (t)**	
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:		
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	1554	
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.		
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.		
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros		
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:		
2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.		
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.		
2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.		
Total RCD recibidos (t) 1.110M3	1554,0	
Fecha de recepción de los RCD	10 al 31 de Marzo de 2025	

Cordialmente,

FIRMA (Gestor de RCD – Representante Legal)
c.c. o NIT 900.714.397-8
NOMBRE Manejo y Gestión Integral de Residuos Solidos SAS ESP

REPORTE DE CANTIDADES DE RCD Y MATERIALES VALORIZADOS

Contrato	622 del 2024
Periodo Evaluado	abr-25
Pin Ambiental	26829

ETAPA	TIPO DE RCD	CANTIDAD DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN VALORIZADOS DE RCD A USAR EN OBRA (Toneladas)	ORIGEN*	CANTIDAD REAL DE LOS RCD GENERADOS EN (Toneladas)	TIPO DE GESTIÓN				
					Disposicion Final	Reutilización	Reciclaje	Otros	Lugar Disposicion Final
Demolición, Excavación y cimentación Construcción	**01 Residuos de Construcción y Demolición susceptibles de aprovechamiento**								
	01 01 Excavación								
	01 01 01 Coberturas Vegetales	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 01 02 Tierras Limpias de excavación	**0**	**0**	**65,94**	**65,94**	**0**	**0**	**0**	**CEMEX**
	01 01 03 Limos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 01 04 Materiales petreos producto de la excavación	**0**	**0**	**1023,61**	**1023,61**	**0**	**0**	**0**	**MAQUINAS AMARILLAS MAGIR**
	01 01 05 Otros residuos de excavación	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 02 Producto de Cimentacion y Pilotaje								
	01 02 01 Arcillas	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 02 02 Bentonitas	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 02 03 Otros residuos de cImentacion y pilotaje	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 02 Pétreos								
	01 03 01 Concretos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 03 02 Gravas	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 03 03 Cantos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 03 04 Ladrillos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 03 05 Arenas	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 03 06 Morteros	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 03 07 Materiales Cerámicos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 03 08 Residuos de material asfáltico	**0**	**0**	**59,6**	**0**	**0**	**59,6**	**0**	**Servicios Profesionales AIA**
	01 03 09 Bases y subbases granulares	**533,18**	**Granulados Reciclados GRECO - Asmicol**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 03 10 Otros residuos	**0**	**0**	**305,81**	**0**	**0**	**305,81**	**0**	**SECAM**
	01 04 No pétreos								
	01 04 01 Madera	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 02 Plásticos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 03 Vidrio	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 04 Papel y Cartón	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 05 Gomas y cauchos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 06 Cartón yeso (drywall)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 07 Acrílico	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 08 Mezclas bituminosas y alquitrán	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 09 Materiales a base fibrocemento	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 10 Otros residuos no pétreos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 05 Metales								
	01 05 01 Acero y hierro	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 05 02 Zinc	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 05 03 Cobre	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 05 04 Aluminio	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 05 05 Otros metales	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	02 RCD - No susceptibles de aprovechamiento								
	02 01 Los que por su estado no pueden ser aprovechados	0	0	0	0	0	0	0	0
	02 02 Los que tengan caracteristicas de peligrosidad								
	02 02 01 Residuos con contenido de asbesto o amiantos y productos que lo contengan	0	0	0	0	0	0	0	0
	02 02 02 Otros residuos con caracteristicas de peligrosidad	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		**533,18**	**0**	**1454,96**	**1089,55**	**0**	**365,41**	**0**	

Rafael Eduardo Alzate
REPRESENTANTE LEGAL

AIAS222-2025

Bogotá D.C., 06 de mayo del 2025

SERVICIOS PROFESIONALES A.I.A SAS
NIT. 901.651.148-2

GESTOR DE RCDS
REGISTRO DE INSCRIPCIÓN No. 681-2023 del Directorio Ambiental de Proveedores IDU

CERTIFICA QUE

DATOS BÁSICOS DEL GESTOR					
Numero unico asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto	REGISTRO DE INSCRIPCIÓN CAR 052 17 MAYO 2023				
Nombre o razón social	**SERVICIOS PROFESIONALES A.I.A SAS**				
Nit	901.651.148-2				
Representante legal	ANGIE PAOLA RADA				
Dirección	Carrera 71 D # 57 10 sur				
Numero telefónico de contacto	3028494813				
Correo electronico	comercial.serproaia@gmail.com				
Municipio o Distrito	Bogotá D.C				
Gestor	Punto Limpio		Planta de aprovechamiento	X	Disposición final
DATOS BÁSICOS DEL GENERADOR					
Numero único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental competente por proyecto	26829				
Nombre o razón social	CONSORCIO DC 2025				
Número de identificación o NIT	901.893.060-1				
Representante legal	RAFAEL ALZATE MORENO				
Dirección de domicilio	CALLE 19 43 G 80				
Teléfono	3123799155				
Correo electrónico	consorciodc2025@gmail.com				
Dirección de generación de RCD	Contrato de Obra No. 022 de 2024, cuyo objeto contractual es: "Ejecutar, a monto agotable y bajo el sistema de precios unitarios, las actividades correspondientes a la conservación, mantenimiento y/o rehabilitación de la malla vial local e intermedia				

CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOS POR TIPO M3		
Tipo de Residuo	Cantidad de RCD recibidos del generador	
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:		
	M3	**TON**
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras,limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.		
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás		
1.3 Pétreos: hormigón, arenas,gravas,gravillas,cantos,pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	38,00	59,60
Total RCD recibidos M3	**38,00**	**59,60**
Fecha de recepción de los RCD	Del 1 al 30 de abril del 2025	

ANGIE PAOLA RADA
C.C No. 1,010.234.998
Representante Legal

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

MAGIR - 2025
STICKER - 032

MANEJO Y GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS S.A.S.
NIT 900.714.397-8

AUTORIZADA BAJO LA RESOLUCIÓN CAR NO 0680 DEL 01 DE ABRIL DEL 2016 MEDIANTE RESOLUCIÓN PRORROGA DRSOA NO 11247000018 DEL 01 DE MARZO DEL 2024 Y RESOLUCIÓN NO 1202 DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 MEDIANTE RESOLUCIÓN PRORROGA NO. 1526 DEL 17 DE AGOSTO DEL 2023, INSCRIPCIÓN IDU 444-2016

CERTIFICA QUE:

El CONSORCIO DC 2025, identificado con NIT 901.893.060-1, en calidad de *Generador*, llevó a cabo la disposición de material proveniente de residuos de construcción y demolición (RCD) en la escombrera municipal, ubicada en el predio denominado El Esparto, en la vereda Panamá, jurisdicción del municipio de Soacha, departamento de Cundinamarca.
Dicha actividad se realizó en el período comprendido entre el 01 de abril de 2025 y el 30 de abril de 2025, en el marco del Contrato de Obra No. 622 de 2024, cuyo objeto contractual es: "Ejecutar, a monto agotable y bajo el sistema de precios unitarios, las actividades correspondientes a la conservación, mantenimiento y/o rehabilitación de la malla vial local e intermedia, así como del espacio público asociado en la localidad de Tunjuelito, ciudad de Bogotá D.C.", identificado con el PIN de obra No. 26829. La disposición del material RCD se realiza conforme a la normativa ambiental vigente, garantizando el cumplimiento de las medidas técnicas y de manejo establecidas para la disposición final de este tipo de residuos.

Cantidades para certificar:

Material/RCD (*)	Cant. Viajes	Volumen (m3)	Peso (Tn)
Excavación	35	525	735
Totales	**35**	**525**	**735**

El presente certificado se expide a solicitud del interesado el 12 de mayo de 2025, Soacha Cundinamarca.

En constancia se firma



ILTON PEDRAZA CORREAL
Representante Legal

ANEXO IV. CONSTANCIA DE GESTION		
DATOS BÁSICOS DEL GESTOR		
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto	11247000018	
Nombre o razón social	MAGIR S.A.S ESP	
Documento de identificación o NIT	900.714.397-8	
Representante Legal	Ilton Pedraza Correal	
Dirección	Clle 12 D No 0-16 Este Soacha- Cll 6C No 82A-78 oficina 204	
Teléfono	3208306335	
Correo electrónico	magiresp@yahoo.es	
Municipio o Distrito	Soacha	
Gestor	Punto limpio	
	Planta de aprovechamiento	
	Disposición final	x
DATOS BÁSICOS DEL GENERADOR		
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental competente por proyecto	26829	
Nombre o razón social	CONSORCIO DC 2025	
Documento de identificación o NIT	901.893.060-1	
Representante Legal	Rafael Alzate Moreno	
Dirección domicilio	Calle 19 No. 43G - 80 Apto 812	
Teléfono	3123799155	
Correo electrónico	consorciodc2025@gmail.com	
Dirección de generación de RCD	KR 61 Entre DG 51B Sur y DG 52 Sur DG 52a sur entre KR 60f y KR 61 KR 29 entre CLL 53AS y CLL 53 B S KR 32 entre CLL 52 G Sur y CLL 52 F Sur	
CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO		
Tipo de Residuo	**Cantidad de RCD recibidos del generador (t)**	
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:		
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	735	
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.		
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.		
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros		
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:		
2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.		
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.		
2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.		
Total RCD recibidos (t)	735,0	
Fecha de recepción de los RCD	01 de Abril al 30 de Abril de 2025	

Cordialmente,

FIRMA (Gestor de RCD – Representante Legal)
c.c. o NIT 900.714.397-8
NOMBRE Manejo y Gestión Integral de Residuos Solidos SAS. ESP

CEMEX	ANEXO IV - CONSTANCIA DE GESTIÓN
APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN SDA NO. 1280 DE 2017, MEDIANTE RESOLUCIÓN ANLA NO. 1506 -2006 Y 1480-2014.	APROBADO MEDIANTE PINES 8418-1778

NTR --

1. DATOS DEL GENERADOR

PIN-GEN	26829
Nombre del proyecto (obra)	622-2024
Nombre o razón social	ALCALDIA LOCAL DE TUNJUELITO
Documento de identificación o NIT	8999990619 006
Representante Legal	NO REGISTRA
Dirección domicilio	NO REGISTRA
Teléfono	3163091076
Correo electrónico	ingecop.obrasciviles@gmail.com
Dirección de generación de RCD	CL 52 SUR No. 12 - 13

2. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE LOS RCD

Transportador:	Razón social	CONSORCIO DC 2025	No. de Identificación	9018930601

Vehículos asociados:	Tipo	Placa	No. PIN TRANS
	Volqueta sencilla y/o doble, tractomula (entre otros)	DBB045	2071
		SXS806	20876

No. Constancias de Gestión Provisional recibidas al transportador	3

3. GESTIÓN INTEGRAL RCD (ALMACENAMIENTO, TRATAMIENTO, APROVECHAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL)

Gestor	Punto Limpio		Sitio de disposición final	X	Recuperador Especifico	
	Receptor		Planta de tratamiento y aprovechamiento		Otro (¿Cuál?)	

PIN del gestor	8418-1778	Datos del Gestor

NTR		Nombre o Razón Social	CEMEX COLOMBIA S.A.
Fecha de recepción RCD	04 - 2025	Identificación o NIT	860.002.523-1
		Representante Legal	CARLOS ANDRÉS BONILLA SABOGAL
		Dirección	Av. Boyacá No. 72 - 04 sur
		Municipio	Bogotá, D.C. Colombia
		Teléfono de contacto	3112209197

01 RCD susceptibles de aprovechamiento			
01 01 Excavación		Ton	m3
01 01 01	Coberturas vegetales		
01 01 02	Tierras limpias de excavación	65.94	45
01 01 03	Limos		
01 01 04	Materiales petreos de excavación		
01 01 05	Otros residuos de excavación		

01 02 Productos de cimentación y pilotaje		Ton	m3
01 02 01	Arcillas		
01 02 02	Bentonitas		
01 02 03	Otros residuos de cimentación y pilotaje		

01 03 Petreos		Ton	m3
01 03 01	Concretos		
01 03 02	Gravas		
01 03 03	Cantos		
01 03 04	Ladrillos		
01 03 05	Arenas		
01 03 06	Morteros		
01 03 07	Materiales cerámicos		
01 03 08	Residuos de material asfáltico		
01 03 09	Bases y sub bases granulares		
01 03 10	Otros residuos pétreos		

Nombre del encargado obra (Director de obra, representante legal, residente técnico ambiental, o quien haga sus veces)	**Rafael Eduardo Alzate**		
CC	**7.176.318**	Firma	

Nombre del representante legal gestor	SALOME ESTEPHANIA FIQUE ESPITIA		
CC	860.002.523-1	Firma	SALOME ESTEPHANIA FIQUE ESPITIA COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL CENTRO DE CIRCULARIDAD CEMEX COLOMBIA S.A.

Consecutivo para la verificación del certificado: 8a9m9WA6-41311, generado en: 2025-05-22

La presente certificación tendrá una fecha máxima de verificación de 30 días calendario a partir de su recepción, para solicitud de ajustes y cambios de la misma por parte de CEMEX COLOMBIA S.A.

© 2024, CEMEX COLOMBIA S.A. Todos los derechos reservados

Bogotá, 8 de mayo de 2025

CERT-809-2025

Sitio de disposición de material de escombros y estériles las manas (residuos de construcción y demolición) PIN 8418 - SDA secretaria distrital del medio ambiente autorizados mediante resolución número 1480 de 2014 ANLA, dando cumplimiento a la Resolución 1257 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo, escombrera Las Manas.

CERTIFICA QUE:

DATOS EL GESTOR	
Nombre o razón social	MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Número de identificación	NIT: 900.459.311-1
Representante Legal	HERNANDO LAVERDE MANJARRES
Teléfono	+57 (601) 7023060
Correo electrónico	comercial@maquiamarillas.com
Dirección	AV BOYACÁ 71 SUR # 12 - 20
Municipio o Distrito	BOGOTÁ D.C.
Gestor	DISPOSICION FINAL
DATOS BASICOS DEL GENERADOR	
Pin de la obra	26829
Nombre de la obra	CONSORCIO DC CONTRATO DE OBRA No. 622 de 2024 EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
Nombre o razón social	CONSORCIO DC 2025
Documento de identificación o NIT	901893060
Representante Legal	ALZATE MORENO RAFAEL EDUARDO
Dirección domicilio	Cl 19 # 43 G - 80 Ap 812
Teléfono	3 1 2 3 7 9 9 1 5 5
Correo electrónico	rafael.alzate2013@gmail.com
CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO	

TIPO DE RESIDUO	***CANTIDAD M3***	***CANTIDAD TON***
1. Residuos de Construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento	*0,00*	*0,00*
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	*225,00*	*288,61*
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás	*0,00*	*0,00*
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillo y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos, concretos hidráulicos, entre otros	*0,00*	*0,00*
1.4 No petreos: Vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos, tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrilico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, maderay compuestos de madera, cartón-yeso (drywall) entre otros	*0,00*	*0,00*
Totales:	***225,00***	***288,61***

Fecha de Recepción RCD el día 07 de abril de 2025 hasta el día 28 de abril de 2025

Verifique la autenticidad de este certificado escaneando el código Qr ubicado en la esquina superior derecha

MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.

Aprobó: ANDREA ALVAREZ GARZON

Bogotá/ Cra 17 # 142-25
Tel 702-3060
Cel: 321-469-0709
gerencia@maquiamarillas.com
www.maquiamarillas.com

Transforma Ambientes

Bogotá D.C., jueves, 8 de mayo de 2025 **Certificación No. SEC-01533JR-2025**

SECAM J.R S.A.S.
NIT. 830.507.163-0
GESTOR DE RCDS
REGISTRO DE INSCRIPCIÓN No. 514-2019 y 517-2019 del Directorio Ambiental de Proveedores IDU

CERTIFICA QUE

DATOS BASICOS DEL GESTOR	
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto	REGISTRO DE INSCRIPCIÓN CAR 001 MAYO 2 DE 2018
Nombre o razón social	SECAM J.R S.A.S
NIT	830.507.163-0
Representante Legal	RUBIELA RADA ORTIZ
Dirección	CRA 71 D 57 - 10 SUR
Número telefónico de contacto	7763445 - 3002414969
Correo electrónico	solicitudes.soacha@secamjr.com
Municipio o Distrito	BOGOTÁ D.C.
Gestor	☐ Punto Limpio ☑ Planta de aprovechamiento ☐ Disposición final
DATOS BASICOS DEL GENERADOR	
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto	26829.
Nombre o razón social	CONSORCIO DC.
Número de identificación o NIT	901.893.060-1.
Representante legal	-
Dirección de domicilio	-
Teléfono	-
Correo electrónico	ingecop.obrasciviles@gmail.com
	Contrato de obra No. 622 DE 2024, cuyo objeto es " EJECUTAR A

Dirección de generación de RCD	MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”.	
CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOS POR TIPO		
Tipo de Residuo	Cantidad de RCD recibidos del generador	
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:		
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras,limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	0.00 M3	0.00 TON
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.		
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas,gravillas,cantos,pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	195.00 M3	305.82 TON
Total RCD recibidos	195.00 M3	305.82 TON
Fecha de recepción de los RCD	Del 01/04/2025 al 30/04/2025	

Atentamente,

Verificar autenticidad



ANGIE PANQUEVA RADA

C.C. No. 1.010.234.998

Representante Legal

E-mail: solicitudes@secamjr.com

Verifique siempre la autenticidad del presente certificado, comuníquese a los teléfonos relacionados en el pie de la página o por medio del correo electrónico

REPORTE DE CANTIDADES DE RCD Y MATERIALES VALORIZADOS

Contrato	622 del 2024
Periodo Evaluado	may-25
Pin Ambiental	26829

ETAPA	TIPO DE RCD	CANTIDAD DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN VALORIZADOS DE RCD A USAR EN OBRA (Toneladas)	ORIGEN*	CANTIDAD REAL DE LOS RCD GENERADOS EN (Toneladas)	TIPO DE GESTIÓN				
					Disposicion Final	Reutilización	Reciclaje	Otros	Lugar Disposicion Final
Demolición, Excavación y cimentación Construcción	**01 Residuos de Construcción y Demolición susceptibles de aprovechamiento**								
	01 01 Excavación								
	01 01 01 Coberturas Vegetales	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 01 02 Tierras Limpias de excavación	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 01 03 Limos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 01 04 Materiales petreos producto de la excavación	**0**	**0**	**278,88**	**278,88**	**0**	**0**	**0**	**MAGIR**
	01 01 05 Otros residuos de excavación	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 02 Producto de Cimentacion y Pilotaje								
	01 02 01 Arcillas	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 02 02 Bentonitas	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 02 03 Otros residuos de cImentacion y pilotaje	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 02 Pétreos								
	01 03 01 Concretos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 03 02 Gravas	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 03 03 Cantos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 03 04 Ladrillos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 03 05 Arenas	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 03 06 Morteros	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 03 07 Materiales Cerámicos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 03 08 Residuos de material asfáltico	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 03 09 Bases y subbases granulares	**250,80**	**Asmicol**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 03 10 Otros residuos	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	01 04 No pétreos								
	01 04 01 Madera	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 02 Plásticos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 03 Vidrio	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 04 Papel y Cartón	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 05 Gomas y cauchos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 06 Cartón yeso (drywall)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 07 Acrílico	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 08 Mezclas bituminosas y alquitrán	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 09 Materiales a base fibrocemento	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 10 Otros residuos no pétreos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 05 Metales								
	01 05 01 Acero y hierro	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 05 02 Zinc	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 05 03 Cobre	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 05 04 Aluminio	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 05 05 Otros metales	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	02 RCD - No susceptibles de aprovechamiento								
	02 01 Los que por su estado no pueden ser aprovechados	0	0	0	0	0	0	0	0
	02 02 Los que tengan caracteristicas de peligrosidad								
	02 02 01 Residuos con contenido de asbesto o amiantos y productos que lo contengan	0	0	0	0	0	0	0	0
	02 02 02 Otros residuos con caracteristicas de peligrosidad	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		**250,8**	**0**	**278,88**	**278,88**	**0**	**0**	**0**	

Rafael Eduardo Alzate
REPRESENTANTE LEGAL

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

MAGIR-2025
STIKER –035

MANEJO Y GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS S.A.S.
NIT 900.714.397-8

AUTORIZADA BAJO LA RESOLUCIÓN CAR NO 0680 DEL 01 DE ABRIL DEL 2016 MEDIANTE RESOLUCIÓN PRORROGA DRSOA NO 11247000018 DEL 01 DE MARZO DEL 2024 Y RESOLUCIÓN NO 1202 DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 MEDIANTE RESOLUCIÓN PRORROGA NO. 1526 DEL 17 DE AGOSTO DEL 2023, INSCRIPCIÓN IDU 444-2016

CERTIFICA QUE:

El CONSORCIO DC 2025, identificado con NIT 901.893.060-1, en calidad de *Generador*, llevó a cabo la disposición de material proveniente de residuos de construcción y demolición (RCD) en la escombrera municipal, ubicada en el predio denominado El Esparto, en la vereda Panamá, jurisdicción del municipio de Soacha, departamento de Cundinamarca.

Dicha actividad se realizó en el período comprendido entre el 01 de mayo de 2025 y el 31 de mayo de 2025, en el marco del Contrato de Obra No. 622 de 2024, cuyo objeto contractual es: "Ejecutar, a monto agotable y bajo el sistema de precios unitarios, las actividades correspondientes a la conservación, mantenimiento y/o rehabilitación de la malla vial local e intermedia, así como del espacio público asociado en la localidad de Tunjuelito, ciudad de Bogotá D.C.", identificado con el PIN de obra No. 26829. La disposición del material RCD se realiza conforme a la normativa ambiental vigente, garantizando el cumplimiento de las medidas técnicas y de manejo establecidas para la disposición final de este tipo de residuos.

Cantidades para certificar:

Material/RCD (*)	Cant. Viajes	Volumen (m3)	Peso (Tn)
Excavación	13	199.2	278.8
Totales	**13**	**199.2**	**278.8**

El presente certificado se expide a solicitud del interesado el 04 de junio de 2025, Soacha Cundinamarca.

En constancia se firma.

ILTON PEDRAZA CORREAL
Representante Legal

ANEXO IV. CONSTANCIA DE GESTIÓN		
DATOS BÁSICOS DEL GESTOR		
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto	11247000018	
Nombre o razón social	MAGIR S.A.S ESP	
Documento de identificación o NIT	900.714.397-8	
Representante Legal	Ilton Pedraza Correal	
Dirección	Clle 12 D No 0-16 Este Soacha- Cll 6C No 82A-78 oficina 204	
Teléfono	3208306335	
Correo electrónico	magiresp@yahoo.es	
Municipio o Distrito	Soacha	
Gestor	Punto limpio	
	Planta de aprovechamiento	
	Disposición final	x
DATOS BÁSICOS DEL GENERADOR		
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental competente por proyecto	26829	
Nombre o razón social	CONSORCIO DC 25	
Documento de identificación o NIT	901.893.060-1	
Representante Legal	RAFAEL E. ALZATE MORENO	
Dirección domicilio	Calle 19 No. 43G-80 Apartamento 812	
Teléfono	3123799155	
Correo electrónico	consorciodc2025@gmail.com	
Dirección de generación de RCD	KR 61 Entre DG 51B Sur y DG 52 Sur. DG 52a sur entre KR 60f y KR 61. KR 29 entre CLL 53AS yCLL 53 B S. KR 32 entre CLL 52 G Sur y CLL 52 F Sur	
CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO		
Tipo de Residuo	**Cantidad de RCD recibidos del generador (t)**	
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:		
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	278.8	
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.		
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.		
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros		
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:		
2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.		
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.		
2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.		
Total RCD recibidos (t) **199,2M3**	278.8	
Fecha de recepción de los RCD	01 al 31 de mayo de 2025	

Cordialmente,

FIRMA (Gestor de RCD – Representante Legal)
c.c. o NIT 900.714.397-8
NOMBRE Manejo y Gestión Integral de Residuos Solidos SAS ESP

REPORTE DE CANTIDADES DE RCD Y MATERIALES VALORIZADOS

Contrato	622 del 2024
Periodo Evaluado	jun-25
Pin Ambiental	26829

ETAPA	TIPO DE RCD	CANTIDAD DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN VALORIZADOS DE RCD A USAR EN OBRA (Toneladas)	ORIGEN*	CANTIDAD REAL DE LOS RCD GENERADOS EN (Toneladas)	TIPO DE GESTIÓN				
					Disposicion Final	Reutilización	Reciclaje	Otros	Lugar Disposicion Final
Demolición, Excavación y cimentación Construcción	**01 Residuos de Construcción y Demolición susceptibles de aprovechamiento**								
	01 01 Excavación								
	01 01 01 Coberturas Vegetales	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 01 02 Tierras Limpias de excavación	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 01 03 Limos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 01 04 Materiales petreos producto de la excavación	**0**	**0**	**873,60**	**873,60**	**0**	**0**	**0**	**MAGIR**
	01 01 05 Otros residuos de excavación	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 02 Producto de Cimentacion y Pilotaje								
	01 02 01 Arcillas	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 02 02 Bentonitas	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 02 03 Otros residuos de cImentacion y pilotaje	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 02 Pétreos								
	01 03 01 Concretos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 03 02 Gravas	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 03 03 Cantos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 03 04 Ladrillos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 03 05 Arenas	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 03 06 Morteros	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 03 07 Materiales Cerámicos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 03 08 Residuos de material asfáltico	**0**	**0**	**38,4**	**0**	**0**	**38,4**	**0**	**Granulados Reciclados GRECO**
	01 03 09 Bases y subbases granulares	**348,00**	**Granulados Reciclados GRECO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 03 10 Otros residuos	**0**	**0**	**47,05**	**0**	**0**	**47,05**	**0**	**SECAM**
	01 04 No pétreos								
	01 04 01 Madera	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 02 Plásticos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 03 Vidrio	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 04 Papel y Cartón	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 05 Gomas y cauchos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 06 Cartón yeso (drywall)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 07 Acrílico	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 08 Mezclas bituminosas y alquitrán	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 09 Materiales a base fibrocemento	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 10 Otros residuos no pétreos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 05 Metales								
	01 05 01 Acero y hierro	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 05 02 Zinc	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 05 03 Cobre	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 05 04 Aluminio	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 05 05 Otros metales	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	02 RCD - No susceptibles de aprovechamiento								
	02 01 Los que por su estado no pueden ser aprovechados	0	0	0	0	0	0	0	0
	02 02 Los que tengan caracteristicas de peligrosidad								
	02 02 01 Residuos con contenido de asbesto o amiantos y productos que lo contengan	0	0	0	0	0	0	0	0
	02 02 02 Otros residuos con caracteristicas de peligrosidad	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		**348**	**0**	**959,05**	**873,6**	**0**	**85,45**	**0**	

Rafael Eduardo Alzate
REPRESENTANTE LEGAL

Consecutivo para la verificación del certificado: GRE VD A004170-253-2025

Generado el : 2025-07-21

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S
NIT. 900767473-7

PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD

MEDIANTE OFICIO EMITIDO POR LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL CAR NRO. 9162109219 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2016 Y LA SECRETARÍA AGROPECUARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONÓMICO (SAMADE) DEL MUNICIPIO DE COTA RI NRO. C015712 DEL 12 DE JUNIO DE 2017
MEDIANTE EL INFORME TECNICO 01939 DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE EXPEDIDO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2020 Y CON PIN AMBIENTAL 19309

CERTIFICA QUE:

La firma INGECOP OBRAS CIVILES S.A.S. identificada con NIT 901583763-0 quién actúa como transportador, realizó la disposición de material RCD del tercero CONSORCIO DC 2025 identificada con el Nit 901893060-1 quien actúa como Generador, en el período de tiempo comprendido entre 2025-06-01 al 2025-06-30 para la obra Contrato No. 622 de 2024, cuyo objeto es: EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. con pin de obra 26829, en la planta de tratamiento y aprovechamiento de Greco SAS quien aplicando la Resolución 1257 del 23 de noviembre de 2021 del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE y el Decreto 507 del 31 de octubre de 2023 de la SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE, realiza la reutilización, tratamiento y reciclaje de RCD, para transformarlos en materia prima o insumos fundamentales en la producción de nuevos materiales de construcción y así reincorporarlos al ciclo económico. De acuerdo con la siguiente relación

Cantidades a certificar:

Material/RCD (*)	**Cant. Viajes**	**Volumen (m3)**	**Peso (Tn)**
Asfalto	2	30	38.4
Totales	2	30	38.4
Observaciones:			

El presente certificado se expide a solicitud del interesado el 2025-07-21, Cota Cundinamarca

En constancia se firma

JAVIER CASTILLO GONZALEZ

Director Comercial

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS

Cel. 3046383774

E-Mail:dircomercial@recicladosgreco.com

La presente certificación tendrá 30 días calendario a partir de la fecha de expedición para solicitud de cambios

“Por la cual se modifica la Resolución 01115 del 26 de septiembre de 2012 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD y se adoptan otras disposiciones”

Anexo II FORMATO CONSTANCIA GESTORES – Resolución 1257 de 202

DATOS BÁSICOS DEL GESTOR	
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto	013 y 19309
Nombre o razón social	GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS
Documento de identificación o NIT	900767473-7
Representante Legal	JAVIER ALEXANDER CASTILLO GONZALEZ
Dirección	KM 1.5 Puente de Guadua Vía Bogotá – Medellín
Teléfono	3046383774
Correo electrónico	dircomercial@recicladosgreco.com
Municipio o Distrito	Cota - Cundinamarca
Gestor	Punto limpio: Planta de aprovechamiento: x Disposición final:
DATOS BÁSICOS DEL GENERADOR	
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental competente por proyecto	26829
Nombre o razón social	CONSORCIO DC 2025
Documento de identificación o NIT	901893060-1
Representante Legal	RAFAEL EDUARDO ALZATE
Dirección domicilio	CL 19 43G 80
Teléfono	3118143469
Correo electrónico	ingecop.obrasciviles@gmail.com
Dirección de generación de RCD	TUNJUELITO
CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO	

Tipo de Residuo	Cantidad de RCD recibidos del generador (t)
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:	-
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	-
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.	-
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	30 m3 en Toneladas 38.4
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.	-
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:	-
2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.	-
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.	-
2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.	-
Total RCD recibidos (t)	30 m3 en Toneladas 38.4
Fecha de recepción de los RCD	01 de junio al 30 de junio de 2025



Firma

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS

NIT - 900767473

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

MAGIR-2025
STICKER –067

MANEJO Y GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS S.A.S.
NIT 900.714.397-8

AUTORIZADA BAJO LA RESOLUCIÓN CAR NO 0680 DEL 01 DE ABRIL DEL 2016 MEDIANTE RESOLUCIÓN PRORROGA DRSOA NO 11247000018 DEL 01 DE MARZO DEL 2024 Y RESOLUCIÓN NO 1202 DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 MEDIANTE RESOLUCIÓN PRORROGA NO. 1526 DEL 17 DE AGOSTO DEL 2023, INSCRIPCIÓN IDU 444-2016

CERTIFICA QUE:

El CONSORCIO DC 2025, identificado con NIT 901.893.060-1, en calidad de *Generador*, llevó a cabo la disposición de material proveniente de residuos de construcción y demolición (RCD) en la escombrera municipal, ubicada en el predio denominado El Esparto, en la vereda Panamá, jurisdicción del municipio de Soacha, departamento de Cundinamarca.
Dicha actividad se realizó en el período comprendido entre el 01 de junio de 2025 y el 30 de junio de 2025, en el marco del Contrato de Obra No. 622 de 2024, cuyo objeto contractual es: "Ejecutar, a monto agotable y bajo el sistema de precios unitarios, las actividades correspondientes a la conservación, mantenimiento y/o rehabilitación de la malla vial local e intermedia, así como del espacio público asociado en la localidad de Tunjuelito, ciudad de Bogotá D.C.", identificado con el PIN de obra No. 26829. La disposición del material RCD se realiza conforme a la normativa ambiental vigente, garantizando el cumplimiento de las medidas técnicas y de manejo establecidas para la disposición final de este tipo de residuos.

Cantidades para certificar:

Material/RCD (*)	Cant. Viajes	Volumen (m3)	Peso (Tn)
Excavación	42	624.0	873.6
Totales	**42**	**624.0**	**873.6**

El presente certificado se expide a solicitud del interesado el 07 de julio de 2025, Soacha Cundinamarca.

En constancia se firma.

ILTON PEDRAZA CORREAL
Representante Legal

ANEXO II. FORMATO CONSTANCIA GESTORES		
DATOS BÁSICOS DEL GESTOR		
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto	11247000018	
Nombre o razón social	MAGIR S.A.S ESP	
Documento de identificación o NIT	900.714.397-8	
Representante Legal	Ilton Pedraza Correal	
Dirección	Clle 12 D No 0-16 Este Soacha- Cll 6C No 82A-78 oficina 204	
Teléfono	3208306335	
Correo electrónico	magiresp@yahoo.es	
Municipio o Distrito	Soacha	
Gestor	Punto limpio	
	Planta de aprovechamiento	
	Disposición final	x
DATOS BÁSICOS DEL GENERADOR		
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental competente por proyecto	26829	
Nombre o razón social	CONSORCIO DC 2025	
Documento de identificación o NIT	901.893.060-1	
Representante Legal	Rafael Álzate Moreno	
Dirección domicilio	Calle 19 No. 43G - 80 Apto 812	
Teléfono	3123799155	
Correo electrónico	consorciodc2025@gmail.com	
Dirección de generación de RCD	DG 52b sur entre KR 27 y KR 28 DG 52a sur entre KR 60f y KR 61	

CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO	
Tipo de Residuo	**Cantidad de RCD recibidos del generador (t)**
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:	
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	873.6
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.	
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros	
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:	
2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.	
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.	
2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.	
Total RCD recibidos (t)	873.6
Fecha de recepción de los RCD	01 de Junio al 30 de Junio de 2025

Cordialmente,

FIRMA (Gestor de RCD – Representante Legal)
c.c. o NIT 900.714.397-8
NOMBRE Manejo y Gestión Integral de Residuos Solidos SAS ESP

Transforma Ambientes

Bogotá D.C., viernes, 18 de julio de 2025 **Certificación No. SEC-01564JR-2025**

SECAM J.R S.A.S.
NIT. 830.507.163-0
GESTOR DE RCDS
REGISTRO DE INSCRIPCIÓN No. 514-2019 y 517-2019 del Directorio Ambiental de Proveedores IDU

CERTIFICA QUE

DATOS BASICOS DEL GESTOR	
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto	REGISTRO DE INSCRIPCIÓN CAR 001 MAYO 2 DE 2018
Nombre o razón social	SECAM J.R S.A.S
NIT	830.507.163-0
Representante Legal	RUBIELA RADA ORTIZ
Dirección	CRA 71 D 57 - 10 SUR
Número telefónico de contacto	7763445 - 3002414969
Correo electrónico	solicitudes.soacha@secamjr.com
Municipio o Distrito	BOGOTÁ D.C.
Gestor	☐ Punto Limpio ☑ Planta de aprovechamiento ☐ Disposición final
DATOS BASICOS DEL GENERADOR	
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto	26829.
Nombre o razón social	CONSORCIO DC..
Número de identificación o NIT	901.893.060-1.
Representante legal	-
Dirección de domicilio	-
Teléfono	-
Correo electrónico	ingecop.obrasciviles@gmail.com
	Contrato de obra No. 622 DE 2024, cuyo objeto es "EJECUTAR A

Dirección de generación de RCD	MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”.	
CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOS POR TIPO		
Tipo de Residuo	Cantidad de RCD recibidos del generador	
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:		
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras,limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	0.00 M3	0.00 TON
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.		
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas,gravillas,cantos,pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	30.00 M3	47.05 TON
Total RCD recibidos	30.00 M3	47.05 TON
Fecha de recepción de los RCD	Del 01/06/2025 al 30/06/2025	

Atentamente,

Verificar autenticidad



ANGIE PANQUEVA RADA

C.C. No. 1.010.234.998

Representante Legal

E-mail: solicitudes@secamjr.com

Verifique siempre la autenticidad del presente certificado, comuníquese a los teléfonos relacionados en el pie de la página o por medio del correo electrónico

REPORTE DE CANTIDADES DE RCD Y MATERIALES VALORIZADOS

Contrato	622 del 2024
Periodo Evaluado	jul-25
Pin Ambiental	26829

ETAPA	TIPO DE RCD	CANTIDAD DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN VALORIZADOS DE RCD A USAR EN OBRA (Toneladas)	ORIGEN*	CANTIDAD REAL DE LOS RCD GENERADOS EN (Toneladas)	TIPO DE GESTIÓN				
					Disposicion Final	Reutilización	Reciclaje	Otros	Lugar Disposicion Final
Demolición, Excavación y cimentación Construcción	**01 Residuos de Construcción y Demolición susceptibles de aprovechamiento**								
	01 01 Excavación								
	01 01 01 Coberturas Vegetales	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 01 02 Tierras Limpias de excavación	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 01 03 Limos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 01 04 Materiales petreos producto de la excavación	**0**	**0**	**1985,27**	**1985,27**	**0**	**0**	**0**	**MAGIR**
	01 01 05 Otros residuos de excavación	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 02 Producto de Cimentacion y Pilotaje								
	01 02 01 Arcillas	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 02 02 Bentonitas	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 02 03 Otros residuos de cImentacion y pilotaje	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 02 Pétreos								
	01 03 01 Concretos	**0**	**0**	**24,73**	**24,73**	**0**	**0**	**0**	**Granulados Reciclados GRECO Y MAGIR**
	01 03 02 Gravas	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	01 03 03 Cantos	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	01 03 04 Ladrillos	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	01 03 05 Arenas	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	01 03 06 Morteros	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	01 03 07 Materiales Cerámicos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 03 08 Residuos de material asfáltico	**0**	**0**	**510,85**	**361,09**	**0**	**149,76**	**0**	**Granulados Reciclados GRECO Y MAGIR**
	01 03 09 Bases y subbases granulares	**854,22**	**Granulados Reciclados GRECO y Asmincol**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 03 10 Otros residuos	**0**	**0**	**38**	**0**	**0**	**38**	**0**	**0**
	01 04 No pétreos								
	01 04 01 Madera	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 02 Plásticos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 03 Vidrio	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 04 Papel y Cartón	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 05 Gomas y cauchos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 06 Cartón yeso (drywall)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 07 Acrílico	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 08 Mezclas bituminosas y alquitrán	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 09 Materiales a base fibrocemento	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 10 Otros residuos no pétreos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 05 Metales								
	01 05 01 Acero y hierro	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 05 02 Zinc	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 05 03 Cobre	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 05 04 Aluminio	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 05 05 Otros metales	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	02 RCD - No susceptibles de aprovechamiento								
	02 01 Los que por su estado no pueden ser aprovechados	0	0	0	0	0	0	0	0
	02 02 Los que tengan caracteristicas de peligrosidad								
	02 02 01 Residuos con contenido de asbesto o amiantos y productos que lo contengan	0	0	0	0	0	0	0	0
	02 02 02 Otros residuos con caracteristicas de peligrosidad	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		**854,22**	**0**	**2559,25**	**2371,09**	**0**	**188,16**	**0**	

Rafael Eduardo Alzate
REPRESENTANTE LEGAL

Granulados Reciclados de Colombia Greco	**CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN RCD GRECO S.A.S**	**Código:** FO-CM-005 **Versión:** 0 **Fecha:** 25/07/2025

Consecutivo para la verificación del certificado: PBT VD A004170-263-2025

Generado el: 2025-08-06

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S
NIT. 900767473-7

PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD

MEDIANTE OFICIO EMITIDO POR LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL CAR NRO. 9162109219 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2016 Y LA SECRETARÍA AGROPECUARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONÓMICO (SAMADE) DEL MUNICIPIO DE COTA RI NRO. C015712 DEL 12 DE JUNIO DE 2017
MEDIANTE EL INFORME TECNICO 01939 DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE EXPEDIDO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2020 Y CON PIN AMBIENTAL 19309

CERTIFICA QUE:

La firma INGECOP OBRAS CIVILES S.A.S. identificada con NIT 901583763-0 quién actúa como transportador, realizó la disposición de material RCD del tercero CONSORCIO DC 2025 identificada con el Nit 901893060-1 quien actúa como Generador, en el período de tiempo comprendido entre 2025-07-01 al 2025-07-31 para la obra Contrato No. 622 de 2024, cuyo objeto es: EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. con pin de obra 26829, en la planta de tratamiento y aprovechamiento de Greco SAS quien aplicando la Resolución 1257 del 23 de noviembre de 2021 del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE y el Decreto 507 del 31 de octubre de 2023 de la SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE, realiza la reutilización, tratamiento y reciclaje de RCD, para transformarlos en materia prima o insumos fundamentales en la producción de nuevos materiales de construcción y así reincorporarlos al ciclo económico. De acuerdo con la siguiente relación

Cantidades a certificar:

Material/RCD (*)	**Cant. Viajes**	**Volumen (m3)**	**Peso (Tn)**
Asfalto	8	117	149.76
Heterogéneo	2	30	38.4
Totales	10	147	188.16
Observaciones:			

El presente certificado se expide a solicitud del interesado el 2025-08-06, Cota Cundinamarca

En constancia se firma



JAVIER CASTILLO GONZALEZ

Director Comercial

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS

Cel. 3046383774

E-Mail:dircomercial@recicladosgreco.com

La presente certificación tendrá 30 días calendario a partir de la fecha de expedición para solicitud de cambios

"*Este documento hace parte del sistema de gestión de calidad de Granulados Reciclados de Colombia - GRECO S.A.S, la versión impresa de este documento, es considerada una* ***COPIA NO CONTROLADA****"*

Granulados Reciclados de Colombia Greco	**CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN RCD GRECO S.A.S**	**Código:** FO-CM-005 **Versión:** 0 **Fecha:** 25/07/2025

"Por la cual se modifica la Resolución 01115 del 26 de septiembre de 2012 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD y se adoptan otras disposiciones"

Anexo II FORMATO CONSTANCIA GESTORES – Resolución 1257 de 202

DATOS BÁSICOS DEL GESTOR		
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto	013 y 19309	
Nombre o razón social	GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS	
Documento de identificación o NIT	900767473-7	
Representante Legal	JAVIER ALEXANDER CASTILLO GONZALEZ	
Dirección	KM 1.5 Puente de Guadua Vía Bogotá – Medellín	
Teléfono	3046383774	
Correo electrónico	dircomercial@recicladosgreco.com	
Municipio o Distrito	Cota - Cundinamarca	
Gestor	Punto limpio	
	Planta de aprovechamiento	x
	Disposición final	
DATOS BÁSICOS DEL GENERADOR		
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental competente por proyecto	26829	
Nombre o razón social	CONSORCIO DC 2025	
Documento de identificación o NIT	901893060-1	
Representante Legal	RAFAEL EDUARDO ALZATE	
Dirección domicilio	CL 19 43G 80	
Teléfono	3118143469	
Correo electrónico	ingecop.obrasciviles@gmail.com	

Granulados Reciclados de Colombia Greco	**CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN RCD GRECO S.A.S**	**Código:** FO-CM-005 **Versión:** 0 **Fecha:** 25/07/2025

Dirección de generación de RCD	TUNJUELITO
CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO	
Tipo de Residuo	**Cantidad de RCD recibidos del generador (t)**
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:	**-**
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	**-**
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.	**-**
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	147 m3 en Toneladas 188.16
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.	**-**
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:	**-**
2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.	**-**
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.	**-**
2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.	**-**
Total RCD recibidos (t)	147 m3 en Toneladas 188.16
Fecha de recepción de los RCD	01 de julio al 31 de julio de 2025

Firma

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS
NIT - 900767473

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

MAGIR-2025
STICKER –082

MANEJO Y GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS S.A.S.
NIT 900.714.397-8

AUTORIZADA BAJO LA RESOLUCIÓN CAR NO 0680 DEL 01 DE ABRIL DEL 2016 MEDIANTE RESOLUCIÓN PRORROGA DRSOA NO 11247000018 DEL 01 DE MARZO DEL 2024 Y RESOLUCIÓN NO 1202 DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 MEDIANTE RESOLUCIÓN PRORROGA NO. 1526 DEL 17 DE AGOSTO DEL 2023, INSCRIPCIÓN IDU 444-2016

CERTIFICA QUE:

El CONSORCIO DC 2025, identificado con NIT 901.893.060-1, en calidad de *Generador*, llevó a cabo la disposición de material proveniente de residuos de construcción y demolición (RCD) en la escombrera municipal, ubicada en el predio denominado El Esparto, en la vereda Panamá, jurisdicción del municipio de Soacha, departamento de Cundinamarca.
Dicha actividad se realizó en el período comprendido entre el 01 de julio de 2025 y el 31 de julio de 2025, en el marco del Contrato de Obra No. 622 de 2024, cuyo objeto contractual es: "Ejecutar, a monto agotable y bajo el sistema de precios unitarios, las actividades correspondientes a la conservación, mantenimiento y/o rehabilitación de la malla vial local e intermedia, así como del espacio público asociado en la localidad de Tunjuelito, ciudad de Bogotá D.C.", identificado con el PIN de obra No. 26829. La disposición del material RCD se realiza conforme a la normativa ambiental vigente, garantizando el cumplimiento de las medidas técnicas y de manejo establecidas para la disposición final de este tipo de residuos.

Cantidades para certificar:

Material/RCD (*)	Cant. Viajes	Volumen (m3)	Peso (Tn)
Excavación	94	1418,05	1985,27
Totales	**94**	**1418,05**	**1985,27**

El presente certificado se expide a solicitud del interesado el 12 de agosto de 2025, Soacha Cundinamarca.

En constancia se firma.

ILTON PEDRAZA CORREAL
Representante Legal

ANEXO II. FORMATO CONSTANCIA GESTORES		
DATOS BÁSICOS DEL GESTOR		
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto	11247000018	
Nombre o razón social	MAGIR S.A.S ESP	
Documento de identificación o NIT	900.714.397-8	
Representante Legal	Ilton Pedraza Correal	
Dirección	Clle 12 D No 0-16 Este Soacha- Cll 6C No 82A-78 oficina 204	
Teléfono	3208306335	
Correo electrónico	magiresp@yahoo.es	
Municipio o Distrito	Soacha	
Gestor	Punto limpio	
	Planta de aprovechamiento	
	Disposición final	x
DATOS BÁSICOS DEL GENERADOR		
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental competente por proyecto	26829	
Nombre o razón social	CONSORCIO DC 2025	
Documento de identificación o NIT	901.893.060-1	
Representante Legal	Rafael Álzate Moreno	
Dirección domicilio	Calle 19 No. 43G - 80 Apto 812	
Teléfono	3123799155	
Correo electrónico	consorciodc2025@gmail.com	
Dirección de generación de RCD	CL 52 Sur entre KR 11A y KR 12 Diag 53 sur entre Cr 61c y Cr 61f Dig 52B Sur entre Cr 27 y Cr 28	

CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO	
Tipo de Residuo	**Cantidad de RCD recibidos del generador (t)**
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:	
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	1985.27
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.	
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros	
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:	
2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.	
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.	
2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.	
Total RCD recibidos (t)	1985.27
Fecha de recepción de los RCD	01 de Julio al 31 de Juiio de 2025

Cordialmente,

FIRMA (Gestor de RCD – Representante Legal)
c.c. o NIT 900.714.397-8
NOMBRE Manejo y Gestión Integral de Residuos Solidos SAS ESP

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposicion Final de Escombros

MAGIR - 2025
STICKER – 053

MANEJO Y GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS S.A.S.
NIT 900.714.397-8

AUTORIZADA BAJO LA RESOLUCIÓN CAR NO 0680 DEL 01 DE ABRIL DEL 2016 MEDIANTE RESOLUCIÓN PRORROGA DRSOA NO 11247000018 DEL 01 DE MARZO DEL 2024 Y RESOLUCIÓN NO 1202 DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 MEDIANTE RESOLUCIÓN PRORROGA NO. 1526 DEL 17 DE AGOSTO DEL 2023, INSCRIPCIÓN IDU 444-2016

CERTIFICA QUE:

El CONSORCIO DC 2025, identificado con NIT 901.893.060-1, en calidad de *Generador*, llevó a cabo la disposición de material proveniente de residuos de construcción y demolición (RCD) en la escombrera municipal, ubicada en el predio denominado El Esparto, en la vereda Panamá, jurisdicción del municipio de Soacha, departamento de Cundinamarca.
Dicha actividad se realizó en el período comprendido entre el 01 de julio de 2025 y el 30 de julio de 2025, en el marco del Contrato de Obra No. 622 de 2024, cuyo objeto contractual es: "Ejecutar, a monto agotable y bajo el sistema de precios unitarios, las actividades correspondientes a la conservación, mantenimiento y/o rehabilitación de la malla vial local e intermedia, así como del espacio público asociado en la localidad de Tunjuelito, ciudad de Bogotá D.C.", identificado con el PIN de obra No. 26829. La disposición del material RCD se realiza conforme a la normativa ambiental vigente, garantizando el cumplimiento de las medidas técnicas y de manejo establecidas para la disposición final de este tipo de residuos.

Cantidades para certificar:

Material/RCD (*)	Cant. Viajes	Volumen (m3)	Peso (Tn)
Demolición de Asfalto	15	219	361.09
Demolición de Concreto	1	15	24.733
Totales	**16**	**234**	**385.823**

El presente certificado se expide a solicitud del interesado el 07 de agosto de 2025, Soacha Cundinamarca.

En constancia se firma

ILTON PEDRAZA CORREAL
Representante Legal

ANEXO IV. CONSTANCIA DE GESTION		
DATOS BASICOS DEL GESTOR		
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto	11247000018	
Nombre o razón social	MAGIR S.A.S ESP	
Documento de identificación o NIT	900.714.397-8	
Representante Legal	Ilton Pedraza Correal	
Dirección	Cll 12 D No 0-16 Este Soacha- Cll 6C No 82A-78 oficina 204	
Teléfono	3208306335	
Correo electrónico	magiresp@yahoo.es	
Municipio o Distrito	Soacha	
Gestor	Punto limpio	
	Planta de aprovechamiento	
	Disposición final	x
DATOS BÁSICOS DEL GENERADOR		
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental competente por proyecto	26829	
Nombre o razón social	CONSORCIO DC 2025	
Documento de identificación o NIT	901.893.060-1	
Representante Legal	Rafael Alzate Moreno	
Dirección domicilio	Calle 19 No. 43G - 80 Apto 812	
Teléfono	3123799155	
Correo electrónico	consorciodc2025@gmail.com	
Dirección de generación de RCD	DG 52a sur entre KR 60f y KR 61	
CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO		
Tipo de Residuo	**Cantidad de RCD recibidos del generador (t)**	
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:		
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	385.823	
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.		
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.		
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros		
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:		
2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.		
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.		
2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.		
Total RCD recibidos (t)	385.823	
Fecha de recepción de los RCD	01 de Julio al 31 de Julio de 2025	

Cordialmente



FIRMA (Gestor RCD – Representante Legal)
CC o NIT 900.714.397 - 8
NOMBRE Manejo y Gestión Integral de Residuos Sólidos SAS. ESP

REPORTE DE CANTIDADES DE RCD Y MATERIALES VALORIZADOS

Contrato	622 del 2024
Periodo Evaluado	ago-25
Pin Ambiental	26829

ETAPA	TIPO DE RCD	CANTIDAD DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN VALORIZADOS DE RCD A USAR EN OBRA (Toneladas)	ORIGEN*	CANTIDAD REAL DE LOS RCD GENERADOS EN (Toneladas)	TIPO DE GESTIÓN				
					Disposicion Final	Reutilización	Reciclaje	Otros	Lugar Disposicion Final
Demolición, Excavación y cimentación Construcción	**01 Residuos de Construcción y Demolición susceptibles de aprovechamiento**								
	01 01 Excavación								
	01 01 01 Coberturas Vegetales	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 01 02 Tierras Limpias de excavación	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 01 03 Limos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 01 04 Materiales petreos producto de la excavación	**0**	**0**	**1113,00**	**1113,00**	**0**	**0**	**0**	**MAGIR**
	01 01 05 Otros residuos de excavación	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 02 Producto de Cimentacion y Pilotaje								
	01 02 01 Arcillas	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 02 02 Bentonitas	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 02 03 Otros residuos de cImentacion y pilotaje	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 02 Pétreos								
	01 03 01 Concretos	**0**	**0**	**49,46**	**49,46**	**0**	**0**	**0**	**MAGIR**
	01 03 02 Gravas	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 03 03 Cantos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 03 04 Ladrillos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 03 05 Arenas	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 03 06 Morteros	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 03 07 Materiales Cerámicos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 03 08 Residuos de material asfáltico	**0**	**0**	**337,80**	**222,60**	**0**	**115,20**	**0**	**Granulados Reciclados GRECO Y MAGIR**
	01 03 09 Bases y subbases granulares	**1361,29**	**Granulados Reciclados GRECO y Asmincol**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 03 10 Otros residuos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 No pétreos								
	01 04 01 Madera	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 02 Plásticos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 03 Vidrio	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 04 Papel y Cartón	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 05 Gomas y cauchos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 06 Cartón yeso (drywall)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 07 Acrílico	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 08 Mezclas bituminosas y alquitrán	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 09 Materiales a base fibrocemento	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 10 Otros residuos no pétreos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 05 Metales								
	01 05 01 Acero y hierro	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 05 02 Zinc	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 05 03 Cobre	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 05 04 Aluminio	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 05 05 Otros metales	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	02 RCD - No susceptibles de aprovechamiento								
	02 01 Los que por su estado no pueden ser aprovechados	0	0	0	0	0	0	0	0
	02 02 Los que tengan caracteristicas de peligrosidad								
	02 02 01 Residuos con contenido de asbesto o amiantos y productos que lo contengan	0	0	0	0	0	0	0	0
	02 02 02 Otros residuos con caracteristicas de peligrosidad	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		**1361,294**	**0**	**1500,26**	**1385,06**	**0**	**115,2**	**0**	

Rafael Eduardo Alzate
REPRESENTANTE LEGAL

Granulados Reciclados de Colombia Greco	**CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN RCD GRECO S.A.S**	**Código:** FO-CM-005 **Versión:** 0 **Fecha:** 25/07/2025

Consecutivo para la verificación del certificado: PBT VD A004170-277-2025

Generado el: 2025-09-10

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S
NIT. 900767473-7

PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD

MEDIANTE OFICIO EMITIDO POR LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL CAR NRO. 9162109219 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2016 Y LA SECRETARÍA AGROPECUARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONÓMICO (SAMADE) DEL MUNICIPIO DE COTA RI NRO. C015712 DEL 12 DE JUNIO DE 2017
MEDIANTE EL INFORME TECNICO 01939 DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE EXPEDIDO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2020 Y CON PIN AMBIENTAL 19309

CERTIFICA QUE:

La firma INGECOP OBRAS CIVILES S.A.S. identificada con NIT 901583763-0 quién actúa como transportador, realizó la disposición de material RCD del tercero CONSORCIO DC 2025 identificada con el Nit 901893060-1 quien actúa como Generador, en el período de tiempo comprendido entre 2025-08-01 al 2025-08-31 para la obra Contrato No. 622 de 2024, cuyo objeto es: EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. con pin de obra 26829, en la planta de tratamiento y aprovechamiento de Greco SAS quien aplicando la Resolución 1257 del 23 de noviembre de 2021 del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE y el Decreto 507 del 31 de octubre de 2023 de la SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE, realiza la reutilización, tratamiento y reciclaje de RCD, para transformarlos en materia prima o insumos fundamentales en la producción de nuevos materiales de construcción y así reincorporarlos al ciclo económico. De acuerdo con la siguiente relación

Cantidades a certificar:

Material/RCD (*)	**Cant. Viajes**	**Volumen (m3)**	**Peso (Tn)**
Asfalto	6	90	115.2
Totales	6	90	115.2
Observaciones:			

El presente certificado se expide a solicitud del interesado el 2025-09-10, Cota Cundinamarca

En constancia se firma

JAVIER CASTILLO GONZALEZ

Director Comercial

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS

Cel. 3046383774

E-Mail:dircomercial@recicladosgreco.com

La presente certificación tendrá 30 días calendario a partir de la fecha de expedición para solicitud de cambios

"Este documento hace parte del sistema de gestión de calidad de Granulados Reciclados de Colombia - GRECO S.A.S, la versión impresa de este documento, es considerada una ***COPIA NO CONTROLADA****"*

Granulados Reciclados de Colombia Greco	**CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN RCD GRECO S.A.S**	**Código:** FO-CM-005 **Versión:** 0 **Fecha:** 25/07/2025

"Por la cual se modifica la Resolución 01115 del 26 de septiembre de 2012 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD y se adoptan otras disposiciones"

Anexo II FORMATO CONSTANCIA GESTORES – Resolución 1257 de 202

DATOS BÁSICOS DEL GESTOR		
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto	013 y 19309	
Nombre o razón social	GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS	
Documento de identificación o NIT	900767473-7	
Representante Legal	JAVIER ALEXANDER CASTILLO GONZALEZ	
Dirección	KM 1.5 Puente de Guadua Vía Bogotá – Medellín	
Teléfono	3046383774	
Correo electrónico	dircomercial@recicladosgreco.com	
Municipio o Distrito	Cota - Cundinamarca	
Gestor	Punto limpio	
	Planta de aprovechamiento	x
	Disposición final	
DATOS BÁSICOS DEL GENERADOR		
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental competente por proyecto	26829	
Nombre o razón social	CONSORCIO DC 2025	
Documento de identificación o NIT	901893060-1	
Representante Legal	RAFAEL EDUARDO ALZATE	
Dirección domicilio	CL 19 43G 80	
Teléfono	3118143469	
Correo electrónico	ingecop.obrasciviles@gmail.com	

Granulados Reciclados de Colombia Greco	**CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN RCD GRECO S.A.S**	**Código:** FO-CM-005 **Versión:** 0 **Fecha:** 25/07/2025

Dirección de generación de RCD	TUNJUELITO
CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO	
Tipo de Residuo	**Cantidad de RCD recibidos del generador (t)**
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:	-
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	-
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.	-
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	90 m3 en Toneladas 115.2
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.	-
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:	-
2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.	-
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.	-
2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.	-
Total RCD recibidos (t)	90 m3 en Toneladas 115.2
Fecha de recepción de los RCD	01 de agosto al 31 de agosto de 2025

Firma

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS
NIT - 900767473

*"Este documento hace parte del sistema de gestión de calidad de Granulados Reciclados de Colombia - GRECO S.A.S, la versión impresa de este documento, es considerada una **COPIA NO CONTROLADA**"*

Granulados Reciclados de Colombia Greco	**CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN RCD GRECO S.A.S**	**Código:** FO-CM-005 **Versión:** 0 **Fecha:** 25/07/2025

Anexo IV CONSTANCIA DE GESTIÓN – Decreto 507 de 2023

(Aplicable solo para gestores de puntos limpios, plantas de tratamiento y/o aprovechamiento, recuperadores específicos y sitios de disposición final)

1. DATOS DEL GENERADOR	
	PBT VD A004170-277-2025
PIN - GEN	26829
Nombre del proyecto (obra)	Contrato No. 622 de 2024
Nombre o razón social	CONSORCIO DC 2025
Identificación o NIT	901893060-1
Representante Legal	RAFAEL EDUARDO ALZATE
Dirección domicilio	CL 19 43G 80
Teléfono	3118143469
Correo electrónico	ingecop.obrasciviles@gmail.com
Dirección de generación de RCD	TUNJUELITO

2. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE LOS RCD

Transportador	Razón Social	No de Identificación	Vehículos autorizados	Tipo	No. Constancias de Gestión Provisional recibidas al transportador	No. PIN TRANS
DAVID MONTOYA	3185786	3185786	SZV417	Doble	1	NA
GEOVANNY MOYA	1015439400	1015439400	USC504	Doble	2	NA
LUIS SANCHEZ	80411869	80411869	DBB045	Doble	3	2071

3. GESTIÓN INTEGRAL RCD (ALMACENAMIENTO, TRATAMIENTO, APROVECHAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL)

Gestor (Marque con una X al gestor a quien entrega los RCD)	Punto Limpio		Sitio de disposición fina		Recuperador Especifico	
	Receptor		Planta de tratamiento y/o aprovechamiento	x	Otro ¿Cuál?	

PIN del gestor	26491 y 19309
NTR	PBT VD A004170-277-2025

Datos del Gestor	
Nombre o Razón Social	GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S

Fecha de recepción RCD	01 de agosto al 31 de agosto de 2025

Identificación o NIT	900.767.473-7

*"Este documento hace parte del sistema de gestión de calidad de Granulados Reciclados de Colombia - GRECO S.A.S, la versión impresa de este documento, es considerada una **COPIA NO CONTROLADA**"*

Granulados Reciclados de Colombia Greco	**CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN RCD GRECO S.A.S**	**Código:** FO-CM-005 **Versión:** 0 **Fecha:** 25/07/2025

Representante Legal	JAVIER ALEXANDER CASTILLO GONZALEZ
Dirección	Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur
Municipio	Cota (Cundinamarca)
Teléfono	3046383774

01 RDC susceptibles de aprovechamiento		
01 01 Excavación		**Ton**
01 01 01	Coberturas vegetales	
01 01 02	Tierras limpias de excavación	
01 01 03	Limos	
01 01 04	Materiales petreos de excavación	
01 01 05	Otros residuos de excavación	

01 02 Productos de cimentación y pilotaje		**Ton**
01 02 01	Arcillas	
01 02 02	Bentonitas	
01 02 03	Otros residuos de cimentación y pilotaje	

01 04 No pétreos M		**Ton**
01 04 01	Madera	
01 04 02	Plásticos	
01 04 03	Vidrio	
01 04 04	Papel y cartón	

01 03 Pétreos		**Ton**
01 03 01	Concretos	
01 03 02	Gravas	
01 03 03	Cantos	
01 03 04	Ladrillos	
01 03 05	Arenas	
01 03 06	Morteros	
01 03 07	Materiales cerámicos	
01 03 08	Residuos de material asfáltico	115.2 ton
01 03 09	Bases y sub bases granulares	
01 03 10	Otros residuos pétreos	

01 05 Metales		**Ton**
01 05 01	Acero y hierro	
01 05 02	Zinc	
01 05 03	Cobre	
01 05 04	Aluminio	


01 04 05	Gomas y cauchos	
01 04 06	Cartón yeso (Drywall)	

01 05 05	Otros metales	

*"Este documento hace parte del sistema de gestión de calidad de Granulados Reciclados de Colombia - GRECO S.A.S, la versión impresa de este documento, es considerada una **COPIA NO CONTROLADA**"*

01 04 07	Acrílico	
01 04 08	Mezclas bituminosas y alquitrán	
01 04 09	Materiales a base de fibrocemento	
01 04 10	Otros residuos no pétreos	

02 RCD – No susceptibles de aprovechamiento		**Ton**
02 01	Los que por su estado no pueden ser aprovechados	
02 02	Los que tengan características de peligrosidad y/o sean de manejo diferenciado.	
02 02	Los que tengan características de peligrosidad	
02 02 01	Residuos con contenido de asbesto o amiantos y productos que lo contengan	
02 02 02	Otros residuos con características de peligrosidad	

FIRMAS					
Nombre del encargado de obra	RAFAEL EDUARDO ALZATE	**CC**	7.176.318	**Firma**	
Nombre del representante legal gestor	JAVIER ALEXANDER CASTILLO GONZALEZ	**CC**	900.767.473-7	**Firma**	



"Este documento hace parte del sistema de gestión de calidad de Granulados Reciclados de Colombia - GRECO S.A.S, la versión impresa de este documento, es considerada una ***COPIA NO CONTROLADA****"*

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

MAGIR-2025
STICKER –084

MANEJO Y GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS S.A.S.
NIT 900.714.397-8

AUTORIZADA BAJO LA RESOLUCIÓN CAR NO 0680 DEL 01 DE ABRIL DEL 2016 MEDIANTE RESOLUCIÓN PRORROGA DRSOA NO 11247000018 DEL 01 DE MARZO DEL 2024 Y RESOLUCIÓN NO 1202 DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 MEDIANTE RESOLUCIÓN PRORROGA NO. 1526 DEL 17 DE AGOSTO DEL 2023, INSCRIPCIÓN IDU 444-2016

CERTIFICA QUE:

El CONSORCIO DC 2025, identificado con NIT 901.893.060-1, en calidad de *Generador*, llevó a cabo la disposición de material proveniente de residuos de construcción y demolición (RCD) en la escombrera municipal, ubicada en el predio denominado El Esparto, en la vereda Panamá, jurisdicción del municipio de Soacha, departamento de Cundinamarca.
Dicha actividad se realizó en el período comprendido entre el 01 de agosto de 2025 y el 31 de agosto de 2025, en el marco del Contrato de Obra No. 622 de 2024, cuyo objeto contractual es: "Ejecutar, a monto agotable y bajo el sistema de precios unitarios, las actividades correspondientes a la conservación, mantenimiento y/o rehabilitación de la malla vial local e intermedia, así como del espacio público asociado en la localidad de Tunjuelito, ciudad de Bogotá D.C.", identificado con el PIN de obra No. 26829. La disposición del material RCD se realiza conforme a la normativa ambiental vigente, garantizando el cumplimiento de las medidas técnicas y de manejo establecidas para la disposición final de este tipo de residuos.

Cantidades para certificar:

Material/RCD (*)	Cant. Viajes	Volumen (m3)	Peso (Tn)
Excavación	53	795	1113
Totales	**53**	**795**	**1113**

El presente certificado se expide a solicitud del interesado el 15 de Septiembre de 2025, Soacha

Cundinamarca. En constancia se firma.

ILTON PEDRAZA CORREAL
Representante Legal

ANEXO II. FORMATO CONSTANCIA GESTORES		
DATOS BÁSICOS DEL GESTOR		
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto	11247000018	
Nombre o razón social	MAGIR S.A.S ESP	
Documento de identificación o NIT	900.714.397-8	
Representante Legal	Ilton Pedraza Correal	
Dirección	Clle 12 D No 0-16 Este Soacha- Cll 6C No 82A-78 oficina 204	
Teléfono	3208306335	
Correo electrónico	magiresp@yahoo.es	
Municipio o Distrito	Soacha	
Gestor	Punto limpio	
	Planta de aprovechamiento	
	Disposición final	x
DATOS BÁSICOS DEL GENERADOR		
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental competente por proyecto	26829	
Nombre o razón social	CONSORCIO DC 2025	
Documento de identificación o NIT	901.893.060-1	
Representante Legal	Rafael Álzate Moreno	
Dirección domicilio	Calle 19 No. 43G - 80 Apto 812	
Teléfono	3123799155	
Correo electrónico	consorciodc2025@gmail.com	
Dirección de generación de RCD	CL 52 Sur entre KR 11A y KR 12 Diag 53 sur entre Cr 61c y Cr 61f Dig 52B Sur entre Cr 27 y Cr 28	

CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO	
Tipo de Residuo	**Cantidad de RCD recibidos del generador (t)**
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:	
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	1113,00
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.	
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros	
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:	
2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.	
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.	
2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.	
Total RCD recibidos (t)	1113,00
Fecha de recepción de los RCD	01 de Agosto al 31 de Agosto de 2025

Cordialmente,

FIRMA (Gestor de RCD – Representante Legal)
c.c. o NIT 900.714.397-8
NOMBRE Manejo y Gestión Integral de Residuos Solidos SAS ESP

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

MAGIR - 2025
STICKER – 055

MANEJO Y GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS S.A.S.
NIT 900.714.397-8

AUTORIZADA BAJO LA RESOLUCIÓN CAR NO 0680 DEL 01 DE ABRIL DEL 2016 MEDIANTE RESOLUCIÓN PRORROGA DRSOA NO 11247000018 DEL 01 DE MARZO DEL 2024 Y RESOLUCIÓN NO 1202 DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 MEDIANTE RESOLUCIÓN PRORROGA NO. 1526 DEL 17 DE AGOSTO DEL 2023, INSCRIPCIÓN IDU 444-2016

CERTIFICA QUE:

El CONSORCIO DC 2025, identificado con NIT 901.893.060-1, en calidad de *Generador*, llevó a cabo la disposición de material proveniente de residuos de construcción y demolición (RCD) en la escombrera municipal, ubicada en el predio denominado El Esparto, en la vereda Panamá, jurisdicción del municipio de Soacha, departamento de Cundinamarca.
Dicha actividad se realizó en el período comprendido entre el 01 de Agosto de 2025 y el 31 de Agosto de 2025, en el marco del Contrato de Obra No. 622 de 2024, cuyo objeto contractual es: "Ejecutar, a monto agotable y bajo el sistema de precios unitarios, las actividades correspondientes a la conservación, mantenimiento y/o rehabilitación de la malla vial local e intermedia, así como del espacio público asociado en la localidad de Tunjuelito, ciudad de Bogotá D.C.", identificado con el PIN de obra No. 26829. La disposición del material RCD se realiza conforme a la normativa ambiental vigente, garantizando el cumplimiento de las medidas técnicas y de manejo establecidas para la disposición final de este tipo de residuos.

Cantidades para certificar:

Material/RCD (*)	Cant. Viajes	Volumen (m3)	Peso (Tn)
Demolición de Asfalto	9	135	222.60
Demolición de Concreto	2	30	49.46
Totales	**11**	**165**	**272,06**

El presente certificado se expide a solicitud del interesado el 15 de septiembre de 2025, Soacha Cundinamarca.

En constancia se firma

ILTON PEDRAZA CORREAL
Representante Legal

ANEXO IV. CONSTANCIA DE GESTION		
DATOS BASICOS DEL GESTOR		
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto	11247000018	
Nombre o razón social	MAGIR S.A.S ESP	
Documento de identificación o NIT	900.714.397-8	
Representante Legal	Ilton Pedraza Correal	
Dirección	Cll 12 D No 0-16 Este Soacha- Cll 6C No 82A-78 oficina 204	
Teléfono	3208306335	
Correo electrónico	magiresp@yahoo.es	
Municipio o Distrito	Soacha	
Gestor	Punto limpio	
	Planta de aprovechamiento	
	Disposición final	x
DATOS BÁSICOS DEL GENERADOR		
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental competente por proyecto	26829	
Nombre o razón social	CONSORCIO DC 2025	
Documento de identificación o NIT	901.893.060-1	
Representante Legal	Rafael Alzate Moreno	
Dirección domicilio	Calle 19 No. 43G - 80 Apto 812	
Teléfono	3123799155	
Correo electrónico	consorciodc2025@gmail.com	
Dirección de generación de RCD	DG 52a sur entre KR 60f y KR 61	
CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO		
Tipo de Residuo	**Cantidad de RCD recibidos del generador (t)**	
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:		
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.		
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.		
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	272,06	
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros		
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:		
2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.		
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.		
2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.		
Total RCD recibidos (t)	272,06	
Fecha de recepción de los RCD	01 de Agosto al 31 de Agosto de 2025	

Cordialmente



FIRMA (Gestor RCD – Representante Legal)
CC o NIT 900.714.397 - 8
NOMBRE Manejo y Gestión Integral de Residuos Sólidos SAS. ESP

REPORTE DE CANTIDADES DE RCD Y MATERIALES VALORIZADOS

Contrato	622 del 2024
Periodo Evaluado	sep-25
Pin Ambiental	26829

ETAPA	TIPO DE RCD	CANTIDAD DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN VALORIZADOS DE RCD A USAR EN OBRA (Toneladas)	ORIGEN*	CANTIDAD REAL DE LOS RCD GENERADOS EN (Toneladas)	TIPO DE GESTIÓN				
					Disposicion Final	Reutilización	Reciclaje	Otros	Lugar Disposicion Final
Demolición, Excavación y cimentación Construcción	**01 Residuos de Construcción y Demolición susceptibles de aprovechamiento**								
	01 01 Excavación								
	01 01 01 Coberturas Vegetales	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 01 02 Tierras Limpias de excavación	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 01 03 Limos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 01 04 Materiales petreos producto de la excavación	**0**	**0**	**1481,59**	**1481,59**	**0**	**0**	**0**	**MAGIR**
	01 01 05 Otros residuos de excavación	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 02 Producto de Cimentacion y Pilotaje								
	01 02 01 Arcillas	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 02 02 Bentonitas	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 02 03 Otros residuos de clmentacion y pilotaje	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 02 Pétreos								
	01 03 01 Concretos	**0**	**0**	**206,65**	**206,65**	**0**	**0**	**0**	**MAGIR**
	01 03 02 Gravas	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 03 03 Cantos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 03 04 Ladrillos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 03 05 Arenas	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 03 06 Morteros	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 03 07 Materiales Cerámicos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 03 08 Residuos de material asfáltico	**0**	**0**	**24,16**	**24,16**	**0**	**0**	**0**	**MAGIR**
	01 03 09 Bases y subbases granulares	**232,32**	**Asmincol**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 03 10 Otros residuos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 No pétreos								
	01 04 01 Madera	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 02 Plásticos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 03 Vidrio	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 04 Papel y Cartón	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 05 Gomas y cauchos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 06 Cartón yeso (drywall)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 07 Acrílico	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 08 Mezclas bituminosas y alquitrán	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 09 Materiales a base fibrocemento	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 10 Otros residuos no pétreos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 05 Metales								
	01 05 01 Acero y hierro	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 05 02 Zinc	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 05 03 Cobre	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 05 04 Aluminio	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 05 05 Otros metales	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	02 RCD - No susceptibles de aprovechamiento								
	02 01 Los que por su estado no pueden ser aprovechados	0	0	0	0	0	0	0	0
	02 02 Los que tengan caracteristicas de peligrosidad								
	02 02 01 Residuos con contenido de asbesto o amiantos y productos que lo contengan	0	0	0	0	0	0	0	0
	02 02 02 Otros residuos con caracteristicas de peligrosidad	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		**232,32**	**0**	**1712,39742**	**1712,397**	**0**	**0**	**0**	

Rafael Eduardo Alzate
REPRESENTANTE LEGAL

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

MAGIR-2025
STIKER –073

MANEJO Y GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS S.A.S.
NIT 900.714.397-8

AUTORIZADA BAJO LA RESOLUCIÓN CAR NO 0680 DEL 01 DE ABRIL DEL 2016 MEDIANTE RESOLUCIÓN PRORROGA DRSOA NO 11247000018 DEL 01 DE MARZO DEL 2024 Y RESOLUCIÓN NO 1202 DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 MEDIANTE RESOLUCIÓN PRORROGA NO. 1526 DEL 17 DE AGOSTO DEL 2023, INSCRIPCIÓN IDU 444-2016

CERTIFICA QUE:

El CONSORCIO DC 2025, identificado con NIT 901.893.060-1, en calidad de *Generador*, llevó a cabo la disposición de material proveniente de residuos de construcción y demolición (RCD) en la escombrera municipal, ubicada en el predio denominado El Esparto, en la vereda Panamá, jurisdicción del municipio de Soacha, departamento de Cundinamarca.
Dicha actividad se realizó en el período comprendido entre el 01 de septiembre de 2025 y el 30 de septiembre de 2025, en el marco del Contrato de Obra No. 622 de 2024, cuyo objeto contractual es: "Ejecutar, a monto agotable y bajo el sistema de precios unitarios, las actividades correspondientes a la conservación, mantenimiento y/o rehabilitación de la malla vial local e intermedia, así como del espacio público asociado en la localidad de Tunjuelito, ciudad de Bogotá D.C.", identificado con el PIN de obra No. 26829. La disposición del material RCD se realiza conforme a la normativa ambiental vigente, garantizando el cumplimiento de las medidas técnicas y de manejo establecidas para la disposición final de este tipo de residuos.

Cantidades para certificar:

Material/RCD (*)	Cant. Viajes	Volumen (m3)	Peso (Tn)
Excavación	48	737,35	1032,29
Demolición de Concreto, asfalto heterogéneo	9	139.98	230,81
Totales	**57**	**877,33**	**1263,10**

El presente certificado se expide a solicitud del interesado el 03 de octubre de 2025, Soacha Cundinamarca.

En constancia se firma



ILTON PEDRAZA CORREAL
Representante Legal

ANEXO II. FORMATO CONSTANCIA GESTORES		
DATOS BÁSICOS DEL GESTOR		
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto	11247000018	
Nombre o razón social	MAGIR S.A.S ESP	
Documento de identificación o NIT	900.714.397-8	
Representante Legal	Ilton Pedraza Correal	
Dirección	Clle 12 D No 0-16 Este Soacha- Cll 6C No 82A-78 oficina 204	
Teléfono	3208306335	
Correo electrónico	magiresp@yahoo.es	
Municipio o Distrito	Soacha	
Gestor	Punto limpio	
	Planta de aprovechamiento	
	Disposición final	x
DATOS BÁSICOS DEL GENERADOR		
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental competente por proyecto	26829	
Nombre o razón social	CONSORCIO DC 2025	
Documento de identificación o NIT	901.893.060-1	
Representante Legal	Rafael Álzate Moreno	
Dirección domicilio	Calle 19 No. 43G - 80 Apto 812	
Teléfono	3123799155	
Correo electrónico	consorciodc2025@gmail.com	
Dirección de generación de RCD	DG 52a sur entre KR 60f y KR 61 Carrera 61f No. 52B Sur -20	
CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO		
Tipo de Residuo	**Cantidad de RCD recibidos del generador (t)**	
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:		
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	1032,29	
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.		
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	230,81	
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros		
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:		
2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.		
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.		
2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.		
Total RCD recibidos (t)	1263,09	
Fecha de recepción de los RCD	01 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2025	

Cordialmente,

FIRMA (Gestor de RCD – Representante Legal)
c.c. o NIT 900.714.397-8
NOMBRE Manejo y Gestión Integral de Residuos Solidos SAS ESP

MAGIR SAS. ESP
Servicio de Disposición Final de Escombros

MAGIR-2026
STIKER –036

MANEJO Y GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS S.A.S.
NIT 900.714.397-8

AUTORIZADA BAJO LA RESOLUCIÓN CAR NO 0680 DEL 01 DE ABRIL DEL 2016 MEDIANTE RESOLUCIÓN PRORROGA DRSOA NO 11247000018 DEL 01 DE MARZO DEL 2024 Y RESOLUCIÓN NO 1202 DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 MEDIANTE RESOLUCIÓN PRORROGA NO. 1526 DEL 17 DE AGOSTO DEL 2023, INSCRIPCIÓN IDU 444-2016

CERTIFICA QUE:

El CONSORCIO DC 2025, identificado con NIT 901.893.060-1, en calidad de *Generador*, llevó a cabo la disposición de material proveniente de residuos de construcción y demolición (RCD) en la escombrera municipal, ubicada en el predio denominado El Esparto, en la vereda Panamá, jurisdicción del municipio de Soacha, departamento de Cundinamarca.

Dicha actividad se realizó en el período comprendido entre el 01 de septiembre de 2025 y el 30 de septiembre de 2025, en el marco del Contrato de Obra No. 622 de 2024, cuyo objeto contractual es: "Ejecutar, a monto agotable y bajo el sistema de precios unitarios, las actividades correspondientes a la conservación, mantenimiento y/o rehabilitación de la malla vial local e intermedia, así como del espacio público asociado en la localidad de Tunjuelito, ciudad de Bogotá D.C.", identificado con el PIN de obra No. 26829. La disposición del material RCD se realiza conforme a la normativa ambiental vigente, garantizando el cumplimiento de las medidas técnicas y de manejo establecidas para la disposición final de este tipo de residuos.

Cantidades para certificar:

Material/RCD (*)	Cant. Viajes	Volumen (m3)	Peso (Tn)
Excavación	**18**	310	449.3
Totales	**18**	**310**	**449.3**

El presente certificado se expide a solicitud del interesado el 31 de octubre de 2025, Soacha Cundinamarca.

En constancia se firma

ILTON PEDRAZA CORREAL
Representante Legal

ANEXO II. FORMATO CONSTANCIA GESTORES		
DATOS BÁSICOS DEL GESTOR		
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto	11247000018	
Nombre o razón social	MAGIR S.A.S ESP	
Documento de identificación o NIT	900.714.397-8	
Representante Legal	Ilton Pedraza Correal	
Dirección	Clle 12 D No 0-16 Este Soacha- Cll 6C No 82A-78 oficina 204	
Teléfono	3208306335	
Correo electrónico	magiresp@yahoo.es	
Municipio o Distrito	Soacha	
Gestor	Punto limpio	
	Planta de aprovechamiento	
	Disposición final	x
DATOS BÁSICOS DEL GENERADOR		
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental competente por proyecto	26829	
Nombre o razón social	CONSORCIO DC 2025	
Documento de identificación o NIT	901.893.060-1	
Representante Legal	Rafael Álzate Moreno	
Dirección domicilio	Calle 19 No. 43G - 80 Apto 812	
Teléfono	3123799155	
Correo electrónico	consorciodc2025@gmail.com	
Dirección de generación de RCD	DG 52a sur entre KR 60f y KR 61 Carrera 61f No. 52B Sur -20	

CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO	
Tipo de Residuo	**Cantidad de RCD recibidos del generador (t)**
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:	
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	449,3
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.	
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros	
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:	
2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.	
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.	
2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.	
Total RCD recibidos (t)	449,3
Fecha de recepción de los RCD	01 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2025

Cordialmente,

FIRMA (Gestor de RCD – Representante Legal)
c.c. o NIT 900.714.397-8
NOMBRE Manejo y Gestión Integral de Residuos Solidos SAS ESP

REPORTE DE CANTIDADES DE RCD Y MATERIALES VALORIZADOS

Contrato	622 del 2024
Periodo Evaluado	oct-25
Pin Ambiental	26829

ETAPA	TIPO DE RCD	CANTIDAD DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN VALORIZADOS DE RCD A USAR EN OBRA (Toneladas)	ORIGEN*	CANTIDAD REAL DE LOS RCD GENERADOS EN (Toneladas)	TIPO DE GESTIÓN				
					Disposicion Final	Reutilización	Reciclaje	Otros	Lugar Disposicion Final
Demolición, Excavación y cimentación Construcción	**01 Residuos de Construcción y Demolición susceptibles de aprovechamiento**								
	01 01 Excavación								
	01 01 01 Coberturas Vegetales	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 01 02 Tierras Limpias de excavación	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 01 03 Limos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 01 04 Materiales petreos producto de la excavación	**0**	**0**	**1256,04**	**1256,04**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 01 05 Otros residuos de excavación	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 02 Producto de Cimentacion y Pilotaje								
	01 02 01 Arcillas	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 02 02 Bentonitas	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 02 03 Otros residuos de clmentacion y pilotaje	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 02 Pétreos								
	01 03 01 Concretos	**0**	**0**	**19,20**	**0**	**0,00**	**19,2**	**0**	**Granulados Reciclados GRECO**
	01 03 02 Gravas	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 03 03 Cantos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 03 04 Ladrillos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 03 05 Arenas	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 03 06 Morteros	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 03 07 Materiales Cerámicos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 03 08 Residuos de material asfáltico	**0**	**0**	**153,60**	**0**	**0,00**	**154**	**0**	**Granulados Reciclados GRECO**
	01 03 09 Bases y subbases granulares	**539,97**	**Granulados Reciclados GRECO y Asmincol**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 03 10 Otros residuos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 No pétreos								
	01 04 01 Madera	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 02 Plásticos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 03 Vidrio	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 04 Papel y Cartón	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 05 Gomas y cauchos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 06 Cartón yeso (drywall)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 07 Acrílico	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 08 Mezclas bituminosas y alquitrán	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 09 Materiales a base fibrocemento	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 10 Otros residuos no pétreos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 05 Metales								
	01 05 01 Acero y hierro	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 05 02 Zinc	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 05 03 Cobre	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 05 04 Aluminio	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 05 05 Otros metales	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	02 RCD - No susceptibles de aprovechamiento								
	02 01 Los que por su estado no pueden ser aprovechados	0	0	0	0	0	0	0	0
	02 02 Los que tengan caracteristicas de peligrosidad								
	02 02 01 Residuos con contenido de asbesto o amiantos y productos que lo contengan	0	0	0	0	0	0	0	0
	02 02 02 Otros residuos con caracteristicas de peligrosidad	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		**539,97**	**0**	**1428,841**	**1256,041**	**0**	**172,8**	**0**	

Rafael Eduardo Alzate
REPRESENTANTE LEGAL

Granulados Reciclados de Colombia Greco	**CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN RCD GRECO S.A.S**	**Código:** FO-CM-005 **Versión:** 0 **Fecha:** 25/07/2025

Consecutivo para la verificación del certificado: PBT VD A004170-284-2025

Generado el: 2025-11-05

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S
NIT. 900767473-7

PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD

MEDIANTE OFICIO EMITIDO POR LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL CAR NRO. 9162109219 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2016 Y LA SECRETARÍA AGROPECUARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONÓMICO (SAMADE) DEL MUNICIPIO DE COTA RI NRO. C015712 DEL 12 DE JUNIO DE 2017
MEDIANTE EL INFORME TECNICO 01939 DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE EXPEDIDO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2020 Y CON PIN AMBIENTAL 19309

CERTIFICA QUE:

La firma INGECOP OBRAS CIVILES S.A.S. identificada con NIT 901583763-0 quién actúa como transportador, realizó la disposición de material RCD del tercero CONSORCIO DC 2025 identificada con el Nit 901893060-1 quien actúa como Generador, en el período de tiempo comprendido entre 2025-10-01 al 2025-10-31 para la obra Contrato No. 622 de 2024, cuyo objeto es: EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. con pin de obra 26829, en la planta de tratamiento y aprovechamiento de Greco SAS quien aplicando la Resolución 1257 del 23 de noviembre de 2021 del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE y el Decreto 507 del 31 de octubre de 2023 de la SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE, realiza la reutilización, tratamiento y reciclaje de RCD, para transformarlos en materia prima o insumos fundamentales en la producción de nuevos materiales de construcción y así reincorporarlos al ciclo económico. De acuerdo con la siguiente relación

Cantidades a certificar:

Material/RCD (*)	**Cant. Viajes**	**Volumen (m3)**	**Peso (Tn)**
Asfalto	8	120	153.6
Concreto	1	15	19.2
Totales	9	135	172.8

Observaciones:

El presente certificado se expide a solicitud del interesado el 2025-11-05, Cota Cundinamarca

En constancia se firma

JAVIER CASTILLO GONZALEZ

Director Comercial

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS

Cel. 3046383774

E-Mail:dircomercial@recicladosgreco.com

La presente certificación tendrá 30 días calendario a partir de la fecha de expedición para solicitud de cambios

"*Este documento hace parte del sistema de gestión de calidad de Granulados Reciclados de Colombia - GRECO S.A.S, la versión impresa de este documento, es considerada una* ***COPIA NO CONTROLADA****"*

Granulados Reciclados de Colombia Greco	**CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN RCD GRECO S.A.S**	**Código:** FO-CM-005 **Versión:** 0 **Fecha:** 25/07/2025

"Por la cual se modifica la Resolución 01115 del 26 de septiembre de 2012 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD y se adoptan otras disposiciones"

Anexo II FORMATO CONSTANCIA GESTORES – Resolución 1257 de 202

DATOS BÁSICOS DEL GESTOR		
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto	013 y 19309	
Nombre o razón social	GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS	
Documento de identificación o NIT	900767473-7	
Representante Legal	JAVIER ALEXANDER CASTILLO GONZALEZ	
Dirección	KM 1.5 Puente de Guadua Vía Bogotá – Medellín	
Teléfono	3046383774	
Correo electrónico	dircomercial@recicladosgreco.com	
Municipio o Distrito	Cota - Cundinamarca	
Gestor	Punto limpio	
	Planta de aprovechamiento	x
	Disposición final	
DATOS BÁSICOS DEL GENERADOR		
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental competente por proyecto	26829	
Nombre o razón social	CONSORCIO DC 2025	
Documento de identificación o NIT	901893060-1	
Representante Legal	RAFAEL EDUARDO ALZATE	
Dirección domicilio	TUNJUELITO	
Teléfono	3118143469	
Correo electrónico	ingecop.obrasciviles@gmail.com	

Granulados Reciclados de Colombia Greco	**CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN RCD GRECO S.A.S**	**Código:** FO-CM-005 **Versión:** 0 **Fecha:** 25/07/2025

Dirección de generación de RCD	TUNJUELITO
CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO	
Tipo de Residuo	**Cantidad de RCD recibidos del generador (t)**
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:	-
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	-
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.	-
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	135 m3 en Toneladas 172.8
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.	-
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:	-
2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.	-
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.	-
2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.	-
Total RCD recibidos (t)	135 m3 en Toneladas 172.8
Fecha de recepción de los RCD	01 de octubre al 31 de octubre de 2025

Firma

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS
NIT - 900767473

Granulados Reciclados de Colombia Greco	**CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN RCD GRECO S.A.S**	**Código:** FO-CM-005 **Versión:** 0 **Fecha:** 25/07/2025

Anexo IV CONSTANCIA DE GESTIÓN – Decreto 507 de 2023

(Aplicable solo para gestores de puntos limpios, plantas de tratamiento y/o aprovechamiento, recuperadores específicos y sitios de disposición final)

1. DATOS DEL GENERADOR	
	PBT VD A004170-284-2025
PIN - GEN	26829
Nombre del proyecto (obra)	Contrato No. 622 de 2024
Nombre o razón social	CONSORCIO DC 2025
Identificación o NIT	901893060-1
Representante Legal	RAFAEL EDUARDO ALZATE
Dirección domicilio	TUNJUELITO
Teléfono	3118143469
Correo electrónico	ingecop.obrasciviles@gmail.com
Dirección de generación de RCD	TUNJUELITO

2. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE LOS RCD

Transportador	Razón Social	No de Identificación	Vehículos autorizados	Tipo	No. Constancias de Gestión Provisional recibidas al transportador	No. PIN TRANS
EDUIN MURILLO	1019602573	1019602573	SXS806	Doble	1	NA
LUIS SANCHEZ	80411869	80411869	DBB045	Doble	2	2071
ROBINSON ROJAS	1003540693	1003540693	TAL534	Doble	3	NA
YOMAR SANTANA	1023006260	1023006260	SZX882	Doble	3	NA

3. GESTIÓN INTEGRAL RCD (ALMACENAMIENTO, TRATAMIENTO, APROVECHAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL)

Gestor (Marque con una X al gestor a quien entrega los RCD)	Punto Limpio		Sitio de disposición fina		Recuperador Especifico	
	Receptor		Planta de tratamiento y/o aprovechamiento	x	Otro ¿Cuál?	

PIN del gestor	26491 y 19309	**Datos del Gestor**

NTR	PBT VD A004170-284-2025
Fecha de recepción RCD	01 de octubre al 31 de octubre de 2025

Nombre o Razón Social	GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S
Identificación o NIT	900.767.473-7

*"Este documento hace parte del sistema de gestión de calidad de Granulados Reciclados de Colombia - GRECO S.A.S, la versión impresa de este documento, es considerada una **COPIA NO CONTROLADA**"*

Granulados Reciclados de Colombia Greco	**CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN RCD GRECO S.A.S**	**Código:** FO-CM-005 **Versión:** 0 **Fecha:** 25/07/2025

Representante Legal	JAVIER ALEXANDER CASTILLO GONZALEZ
Dirección	Autopista Medellín km 1.5 Puente de Guadua, Costado Sur
Municipio	Cota (Cundinamarca)
Teléfono	3046383774

01 RDC susceptibles de aprovechamiento		
01 01 Excavación		**Ton**
01 01 01	Coberturas vegetales	
01 01 02	Tierras limpias de excavación	
01 01 03	Limos	
01 01 04	Materiales petreos de excavación	
01 01 05	Otros residuos de excavación	

01 02 Productos de cimentación y pilotaje		**Ton**
01 02 01	Arcillas	
01 02 02	Bentonitas	
01 02 03	Otros residuos de cimentación y pilotaje	

01 04 No pétreos M		**Ton**
01 04 01	Madera	
01 04 02	Plásticos	
01 04 03	Vidrio	

01 03 Pétreos		**Ton**
01 03 01	Concretos	19.2 ton
01 03 02	Gravas	
01 03 03	Cantos	
01 03 04	Ladrillos	
01 03 05	Arenas	
01 03 06	Morteros	
01 03 07	Materiales cerámicos	
01 03 08	Residuos de material asfáltico	153.6 ton
01 03 09	Bases y sub bases granulares	
01 03 10	Otros residuos pétreos	

01 05 Metales		**Ton**
01 05 01	Acero y hierro	
01 05 02	Zinc	
01 05 03	Cobre	

01 04 04	Papel y cartón	
01 04 05	Gomas y cauchos	
01 04 06	Cartón yeso (Drywall)	


01 05 04	Aluminio	
01 05 05	Otros metales	

*"Este documento hace parte del sistema de gestión de calidad de Granulados Reciclados de Colombia - GRECO S.A.S, la versión impresa de este documento, es considerada una **COPIA NO CONTROLADA**"*

Granulados Reciclados de Colombia Greco	**CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN RCD GRECO S.A.S**	**Código:** FO-CM-005 **Versión:** 0 **Fecha:** 25/07/2025

01 04 07	Acrílico	
01 04 08	Mezclas bituminosas y alquitrán	
01 04 09	Materiales a base de fibrocemento	
01 04 10	Otros residuos no pétreos	

02 RCD – No susceptibles de aprovechamiento		**Ton**
02 01	Los que por su estado no pueden ser aprovechados	
02 02	Los que tengan características de peligrosidad y/o sean de manejo diferenciado.	
02 02	Los que tengan características de peligrosidad	
02 02 01	Residuos con contenido de asbesto o amiantos y productos que lo contengan	
02 02 02	Otros residuos con características de peligrosidad	

FIRMAS					
Nombre del encargado de obra	RAFAEL EDUARDO ALZATE	**CC**	7.176.318	**Firma**	
Nombre del representante legal gestor	JAVIER ALEXANDER CASTILLO GONZALEZ	**CC**	900.767.473-7	**Firma**	

"Este documento hace parte del sistema de gestión de calidad de Granulados Reciclados de Colombia - GRECO S.A.S, la versión impresa de este documento, es considerada una ***COPIA NO CONTROLADA****"*

MAGIR-2026
STIKER –029

MANEJO Y GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS S.A.S.
NIT 900.714.397-8

AUTORIZADA BAJO LA RESOLUCIÓN CAR NO 0680 DEL 01 DE ABRIL DEL 2016 MEDIANTE RESOLUCIÓN PRORROGA DRSOA NO 11247000018 DEL 01 DE MARZO DEL 2024 Y RESOLUCIÓN NO 1202 DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 MEDIANTE RESOLUCIÓN PRORROGA NO. 1526 DEL 17 DE AGOSTO DEL 2023, INSCRIPCIÓN IDU 444-2016

CERTIFICA QUE:

El CONSORCIO DC 2025, identificado con NIT 901.893.060-1, en calidad de *Generador*, llevó a cabo la disposición de material proveniente de residuos de construcción y demolición (RCD) en la escombrera municipal, ubicada en el predio denominado El Esparto, en la vereda Panamá, jurisdicción del municipio de Soacha, departamento de Cundinamarca.

Dicha actividad se realizó en el período comprendido entre el 01 de octubre de 2025 y el 31 de octubre de 2025, en el marco del Contrato de Obra No. 622 de 2024, cuyo objeto contractual es: "Ejecutar, a monto agotable y bajo el sistema de precios unitarios, las actividades correspondientes a la conservación, mantenimiento y/o rehabilitación de la malla vial local e intermedia, así como del espacio público asociado en la localidad de Tunjuelito, ciudad de Bogotá D.C.", identificado con el PIN de obra No. 26829. La disposición del material RCD se realiza conforme a la normativa ambiental vigente, garantizando el cumplimiento de las medidas técnicas y de manejo establecidas para la disposición final de este tipo de residuos.

Cantidades para certificar:

Material/RCD (*)	Cant. Viajes	Volumen (m3)	Peso (Tn)
Excavación	51	762	1,256.41
Totales	**51**	**762**	**1,256,041**

El presente certificado se expide a solicitud del interesado el 31 de octubre de 2025, Soacha Cundinamarca.

En constancia se firma.

ILTON PEDRAZA CORREAL
Representante Legal

ANEXO II. FORMATO CONSTANCIA GESTORES		
DATOS BÁSICOS DEL GESTOR		
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto	11247000018	
Nombre o razón social	MAGIR S.A.S ESP	
Documento de identificación o NIT	900.714.397-8	
Representante Legal	Ilton Pedraza Correal	
Dirección	Clle 12 D No 0-16 Este Soacha- Cll 6C No 82A-78 oficina 204	
Teléfono	3208306335	
Correo electrónico	magiresp@yahoo.es	
Municipio o Distrito	Soacha	
Gestor	Punto limpio	
	Planta de aprovechamiento	
	Disposición final	x
DATOS BÁSICOS DEL GENERADOR		
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental competente por proyecto	26829	
Nombre o razón social	CONSORCIO DC 2025	
Documento de identificación o NIT	901.893.060-1	
Representante Legal	Rafael Álzate Moreno	
Dirección domicilio	Calle 19 No. 43G - 80 Apto 812	
Teléfono	3123799155	
Correo electrónico	consorciodc2025@gmail.com	
Dirección de generación de RCD	DG 52a sur entre KR 60f y KR 61 Carrera 61f No. 52B Sur -20	
CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO		
Tipo de Residuo	**Cantidad de RCD recibidos del generador (t)**	
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:		
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	1256,41	
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.		
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.		
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros		
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:		
2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.		
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.		
2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.		
Total RCD recibidos (t)	1256,4	
Fecha de recepción de los RCD	01 de Octubre al 31 de Octubre de 2025	

Cordialmente,

FIRMA (Gestor de RCD – Representante Legal)
c.c. o NIT 900.714.397-8
NOMBRE Manejo y Gestión Integral de Residuos Solidos SAS ESP

REPORTE DE CANTIDADES DE RCD Y MATERIALES VALORIZADOS

Contrato	622 del 2024
Periodo Evaluado	nov-25
Pin Ambiental	26829

ETAPA	TIPO DE RCD	CANTIDAD DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN VALORIZADOS DE RCD A USAR EN OBRA (Toneladas)	ORIGEN*	CANTIDAD REAL DE LOS RCD GENERADOS EN (Toneladas)	TIPO DE GESTIÓN				
					Disposicion Final	Reutilización	Reciclaje	Otros	Lugar Disposicion Final
Demolición, Excavación y cimentación Construcción	**01 Residuos de Construcción y Demolición susceptibles de aprovechamiento**								
	01 01 Excavación								
	01 01 01 Coberturas Vegetales	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 01 02 Tierras Limpias de excavación	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 01 03 Limos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 01 04 Materiales petreos producto de la excavación	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 01 05 Otros residuos de excavación	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 02 Producto de Cimentacion y Pilotaje								
	01 02 01 Arcillas	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 02 02 Bentonitas	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 02 03 Otros residuos de cImentacion y pilotaje	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 02 Pétreos								
	01 03 01 Concretos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 03 02 Gravas	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 03 03 Cantos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 03 04 Ladrillos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 03 05 Arenas	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 03 06 Morteros	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 03 07 Materiales Cerámicos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 03 08 Residuos de material asfáltico	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 03 09 Bases y subbases granulares	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 03 10 Otros residuos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 No pétreos								
	01 04 01 Madera	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 02 Plásticos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 03 Vidrio	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 04 Papel y Cartón	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 05 Gomas y cauchos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 06 Cartón yeso (drywall)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 07 Acrílico	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 08 Mezclas bituminosas y alquitrán	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 09 Materiales a base fibrocemento	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 10 Otros residuos no pétreos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 05 Metales								
	01 05 01 Acero y hierro	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 05 02 Zinc	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 05 03 Cobre	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 05 04 Aluminio	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 05 05 Otros metales	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	02 RCD - No susceptibles de aprovechamiento								
	02 01 Los que por su estado no pueden ser aprovechados	0	0	0	0	0	0	0	0
	02 02 Los que tengan caracteristicas de peligrosidad								
	02 02 01 Residuos con contenido de asbesto o amiantos y productos que lo contengan	0	0	0	0	0	0	0	0
	02 02 02 Otros residuos con caracteristicas de peligrosidad	0	0	0,2	0,2	0	0	0	TRACOL SAS ESP
TOTAL		**0**	**0**	**0,2**	**0,2**	**0**	**0**	**0**	

Rafael Eduardo Alzate
REPRESENTANTE LEGAL

TRATAMIENTOS Y RELLENOS AMBIENTALES DE COLOMBIA SAS ESP

NIT: 900.962.813-3

CERTIFICADO DE TRATAMIENTO NO. 422699840746461352514

La empresa **Consorcio DC 2025** identificado con NIT No. **901893060 - 1** de la sede Consorcio DC 2025, por intermedio de **WELTNEU CO SAS** quien realizó la recolección y transporte, identificado con NIT No. **901265986** - **2**, entregó a TRACOL S.A.S ESP los siguientes residuos para su respectiva disposición final en celda de seguridad de acuerdo a los siguientes datos:

Solicitud No.	Nombre Técnico	Fecha Disposición	Peso Kg	Nombre Declarado	Pretratamiento	Corriente A	Corriente Y
TRA63775	Sólidos contaminados con derivados del petróleo	18/11/2025	200.00	Sólidos contaminados con derivados del petróleo	No aplica	A4140 - Desechos consistentes o que contienen productos químicos que no responden a las especificaciones o caducados 10 correspondientes a las categorías del anexo I, y que muestran las características peligrosas del anexo III	

El material se trató de acuerdo con la licencia ambiental otorgada por la CAR:

1. Resolución 989 de 26 de mayo de 2015 Otorgada a VALCO CONSTRUCTORES LTDA. para:
   Almacenamiento, tratamiento y disposición final celda de desechos peligrosos.
2. Licencia Ambiental Cedida totalmente por medio de la Resolución 1821 de Julio 2017 a TRACOL SAS ESP Nit.900962813-3.

La presente certificación se expide a el 26/12/2025. Cualquier información adicional relacionada con este certificado, se encuentra disponible para su consulta en las instalaciones de TRACOL SAS ESP.

Cordialmente,

Jonathan Rodríguez
GERENTE

CONSORCIO DC 2025

REPORTE DE CANTIDADES DE RCD Y MATERIALES VALORIZADOS

Contrato	622 del 2024
Periodo Evaluado	26 de diciembre del 2024 al 10 de Noviembre del 2025
Pin Ambiental	26829

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO | BOGOTÁ

ETAPA	TIPO DE RCD	CANTIDAD DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN VALORIZADOS DE RCD A USAR EN OBRA (Toneladas)	ORIGEN*	CANTIDAD REAL DE LOS RCD GENERADOS EN (Toneladas)	TIPO DE GESTIÓN				
					Disposicion Final	Reutilización	Reciclaje	Otros	Lugar Disposicion Final
Demolición, Excavación y cimentación Construcción	**01 Residuos de Construcción y Demolición susceptibles de aprovechamiento**								
	01 01 Excavación								
	01 01 01 Coberturas Vegetales	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 01 02 Tierras Limpias de excavación	**0**	**0**	**65,94**	**65,94**	**0**	**0**	**0**	**CEMEX**
	01 01 03 Limos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 01 04 Materiales petreos producto de la excavación	**0**	**0**	**10097,55**	**10097,55**	**0**	**0**	**0**	**Servicios profesionales AIA, Ingeomineria, Maquinas Amarillas, MAGIR, Ingeomineria**
	01 01 05 Otros residuos de excavación	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 02 Producto de Cimentacion y Pilotaje								
	01 02 01 Arcillas	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 02 02 Bentonitas	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 02 03 Otros residuos de clmentacion y pilotaje	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 02 Pétreos								
	01 03 01 Concretos	**0**	**0**	**300,04**	**281**	**0,00**	**19,2**	**0**	**Granulados Reciclados GRECO, MAGIR**
	01 03 02 Gravas	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**
	01 03 03 Cantos	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**
	01 03 04 Ladrillos	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**
	01 03 05 Arenas	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**
	01 03 06 Morteros	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**
	01 03 07 Materiales Cerámicos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 03 08 Residuos de material asfáltico	**0**	**0**	**1147,94**	**607,85**	**0,00**	**540**	**0**	**Granulados Reciclados GRECO, MAGIR, Servicios Profesionales AIA**
	01 03 09 Bases y subbases granulares	**4545,43**	**Granulados Reciclados GRECO y Asmincol**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 03 10 Otros residuos	**0**	**0**	**532,41**	**0**	**0**	**532**	**0**	**SECAM**
	01 04 No pétreos								
	01 04 01 Madera	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 02 Plásticos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 03 Vidrio	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 04 Papel y Cartón	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 05 Gomas y cauchos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 06 Cartón yeso (drywall)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 07 Acrílico	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 08 Mezclas bituminosas y alquitrán	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 09 Materiales a base fibrocemento	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 04 10 Otros residuos no pétreos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 05 Metales								
	01 05 01 Acero y hierro	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 05 02 Zinc	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 05 03 Cobre	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 05 04 Aluminio	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01 05 05 Otros metales	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	02 RCD - No susceptibles de aprovechamiento								
	02 01 Los que por su estado no pueden ser aprovechados	0	0	0	0	0	0	0	0
	02 02 Los que tengan caracteristicas de peligrosidad								
	02 02 01 Residuos con contenido de asbesto o amiantos y productos que lo contengan	0	0	0	0	0	0	0	0
	02 02 02 Otros residuos con caracteristicas de peligrosidad	0	0	0,2	0,2	0	0	0	**TRACOL SAS ESP**
TOTAL		**4545,434**	**0**	**12144,08**	**11052,38**	**0**	**1091,7**	**0**	

Rafael Eduardo Alzate
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO DC 2025	**CONTRATO 622 DE 2024**	BOGOTÁ Alcaldía Local de Tunjuelito
	PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION	
	PIN 26829	

Bogotá, D.C., 30 Noviembre de 2025

Señores
SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
Subdirección del Sector Público
Bogotá

Asunto: Certificado de NO Aprovechamiento In-Situ

Respetados señores:

Yo, RAFAEL EDUARDO ALZATE en calidad de Director Obra del Contratista Consorcio DC 2025, el cual realiza la ejecución del contrato de Obra No 622 de 2024 cuyo objeto es ***"EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."*** certifico que el CONSORCIO DC 2025 contratista de obra con PIN – GEN 26829, durante los siguientes periodos de ejecución: Diciembre 2024, Enero 2025, Febrero 2025, Marzo 2025, Abril 2025, Mayo 2025, Junio 2025, Julio 2025, Agosto 2025, Septiembre 2025, Octubre 2025 y Noviembre 2025, NO realizó Aprovechamiento In-Situ de Residuos de Construcción y Demolición dentro de sus actividades en ningún frente de obra bajo el contrato 622 del 2024.

La presente certificación se expide a solicitud de la entidad competente a los 30 días del mes de Noviembre de 2025.

Cordialmente,

Ing, RAFAEL EDUARDO ALZATE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO DC 2025

Ing, CARLOS FERNANDEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
VELCEC SA

CONSORCIO DC 2025	**INFORME DE APROVECHAMIENTO IN SITU** **CONTRATO No. 622 del 2024**	BOGOTÁ Alcaldía Local de Tunjuelito

Meta del Aprovechamiento:

Nombre del Proyecto:	"EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/ O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."
PIN-GEN:	26829
Periodo:	26 de Diciembre del 2024 al 10 de Noviembre del 2025

1. Registro fotográfico del "antes" del sitio que va aser utilizado para la reutilizacion, con referencia de la zona:

Descripción:

NO APLICA

NO APLICA

2. Esquema del área a usar para la reutilización de los RCD´s (Especifique las dimensiones del área para reutilizar)

Alto: Ancho: Largo:

NO APLICA

3- Tipo de material a emplear en la reutilización:

Descripción detallada:

NO APLICA

4. Descripción del proceso a realizar: Definir el origen del residuo y el coeficiente de compactación del material

NO APLICA

5. Registro fotográfico durante la reutilización:

Descripción:

NO APLICA

NO APLICA

6. Registro fotográfico de la finalización del proceso de reutilización:

Descripción:

NO APLICA

NO APLICA

Información de la Reutilización

7. Cantidad de manterial proveniente de Plantas de Tratamiento y/o Aprovechamiento moviles: 00 (Ton)

7.1. PIN TRAT/APROV (planta de tratamiento y/o aprovechamiento móvil): NO APLICA

8. Volumen total reutilizado: 00 **(Ton)**

9. Duración del proceso: 00 **(meses)**

10. Área final recuperada: 00 **(m2)**

11. Valor del % de la reutilización, respecto al total del material utilizado para la construcción de la obra: 00 **(%)**

12. Comentarios, Comclusiones y/o Justificacion de la no reutilización

De acuerdo a las actividades propias objeto del contrato no se realiza aprovechamiento Insitu

Rafael E Alzate
Firma del Representante Legal

595

RESOLUCIÓN No 0276 DE 2004

- 9 MAR 2004

Por la cual se acoge un plan de manejo ambiental como instrumento de seguimiento ambiental y se adoptan otras medidas

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA " CORTOLIMA"

En ejercicio de sus funciones Legales especialmente las conferidas por la Ley 99 de 1993, , Ley 685 de 2001, Decretos No 1180 de 2003, 948 de 1995, 02 de 1982, Resolución No 180861 del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial.

C O N S I D E R A N D O

Que mediante resolución No. 2213 de Noviembre 7 de 1996, CORTOLIMA otorgó Autorización Ambiental para la explotación de Material de GRAVAS, ASFALTITAS, ORO Y DEMÁS CONCESIBLES al señor ALEXANDER MOLLER BUSTOS, en el predio Santa Inés, vereda Santo Domingo, jurisdicción del municipio de Armero Guayabal, departamento del Tolima; además dispuso imponer el Plan de Manejo Ambiental para la explotación antes citada, por el término de duración del proyecto, entre otras disposiciones.

Que mediante el registro Minero GCRI-02, expedido por Minercol, establece que el contrato de concesión No.16727 tiene una vigencia desde el 16 de Diciembre de 1993, hasta el 16 de Diciembre de 2023, donde aparecen como titulares los señores Alexander y Fritz Franz Moller Bustos, para la explotación de Grava, oro y asfaltita en el municipio de Armero Guayabal.

Que por oficio No.6449 de Mayo 8 de 2002, el Subdirector de Gestión Ambiental requiere al señor ALEXANDER MOLLER BUSTOS la presentación de Actualización de Plan de Manejo Ambiental, del proyecto de explotación minero, desarrollado en el municipio de Armero Guayabal.

Que mediante radicado No. 017508 de Diciembre 18 de 2003, el señor ALEXANDER MOLLER BUSTOS presenta informe de avance de la mina San Pedro y Actualización del Plan de Manejo Ambiental solicitado.

Que el día 21 de Enero de 2004, se practico visita de seguimiento ambiental al proyecto de explotación que adelanta el señor ALEXANDER MOLLER BUSTOS, Mina San Pedro en el municipio de Armero Guayabal encontrándose lo siguiente:

- La explotación se realiza por el método a cielo abierto cuyo sistema de explotación es por bancos descendentes, el material es denominado como gravas y arenas, en un espesor aproximado de 3 – 4 metros aproximadamente, en un espesor de 8 – 9

metros se observa el manto de asfaltitas en una longitud de 80 – 100 metros, la explotación se realiza limitándose por la vía que conduce al municipio de Falan y Palocabildo, aclarando que en algunos sectores no se ha respetado el derecho de vía, sin embargo el material es compacto y garantiza una estabilidad a la banca de la misma.

- En las piscinas de sedimentación se observó, que el agua sigue siendo recirculada, las cuales se aprovechan para el beneficio del lavado de las gravas y arenas; lo referente al beneficio de asfaltitas, materiales que solamente son clasificados por medio de zarandas móviles.
- Se observo mantenimiento a la siembra de limón swingla las cuales fueron instauradas con el objeto de barrera viva y pantalla visual.
- Se observa un sector destinado para el deposito de material estéril, los cuales en visitas anteriores se verificó que el material era erodado hacia un drenaje de aguas lluvias que pasa por ese sector siendo invadido y aportando material, sin embargo se había recomendado la realización de trinchos en guadua en donde existen vestigios que se instalaron, pero desafortunadamente no se estabilizo ya que el material es suelo, por otra parte la pendiente es muy elevada.
- Se constato la reforestación de 20 hectáreas con especies de NIM, las cuales estas plantulas presentan un porte de aproximadamente de 1.5 – 2.00 metros de altura, con un diámetro de 10 – 15 centímetros algunos y otros delgados.
- Se observo que las cunetas se encuentran habilitadas para el manejo de aguas lluvias, las cuales son transportadas hacia las piscinas de sedimentación, las cuales se encuentran revestidas en algunos tramos, sin embargo en algunos tramos falta establecer el revestimiento, ya que se encuentra despoblados, de esta manera genera material colmatando las cajas sedimentadoras antes de llegar a las piscinas.

Que una vez analizada la actualización del plan de manejo ambiental, por parte de CORTOLIMA en el concepto técnico de fecha 21 de Enero de 2004, presenta alternativas para el mantenimiento de las obras realizadas, pero crea la necesidad de establecer y proponer alternativas de compensación las cuales consisten en:

- Reforestación de especies nativas en sectores despoblados de cobertura implementando especies nativas en áreas de aproximadamente 16 hectáreas, las cuales se encuentran localizadas en el plano visto a folio No. 556.
- Por otra parte se realizará intensificación del sector sembrado con especies de NIM con el objeto de protección de la cuenca ya que la zona es boscosa, además son sectores aledaños a la explotación, sin embargo no se encuentran estipuladas para su aprovechamiento.
- Se proyecta realizar talleres de educación ambiental a las personas que laboran en el proyecto.
- El proyecto contará con la participación de la comunidad ya que es fuente de empleo del municipio lo cual ayuda a la operación y en los momentos de arreglos de vía se intensifica.

- 9 MAR 2004

596

0276

Concluye el informe técnico antes citado que una vez llevada a cabo la visita de seguimiento ambiental al proyecto de explotación de arenas, gravas, oro y asfaltitas adelantada por los señores ALEXANDER y FRITZ FRANZ MOLLER BUSTOS en el municipio de Armero Guayabal, se observa un cumplimiento con las obligaciones impuestas mediante resolución No. 2213 del 7 de Octubre de 1996, por lo cual se aprueba lo presentado en el informe de avance mediante radicado No. 017508 de Diciembre 18 de 2003.

Que revisado el documento denominado Actualización del Plan de Manejo ambiental se observa que la explotación se realizará bajo las mismas condiciones con que fue aprobada anteriormente, creando alternativas de compensación y obras a realizar teniendo en cuenta los componentes de Suelo, Fauna, Biota, Social, Agua, recuperación y estabilización; de acuerdo a lo anterior se recomienda acoger el Plan de manejo presentado por el señor ALEXANDER MOLLER BUSTOS, teniendo en cuenta el registro minero cuya vigencia es hasta Diciembre 16 de 2023.

Que los señores ALEXANDER y FRITZ FRANZ MOLLER BUSTOS deberán realizar mantenimientos a las obras realizadas en cumplimiento de la resolución No. 2213 del 7 de Octubre de 1996, además de las siguientes:

1. Se deberá respetar una franja protectora hacia la vía que conduce a Falan en una distancia de 30 metros, con respecto a la explotación.
2. Deben allegar los informes de avance a los cuales se anexe los soportes con respecto a donaciones, actas de charlas de educación ambiental, avance de reforestación, avance de explotación.
3. Deberán hacer un mantenimiento periódico a los desarenadores para el manejo de aguas lluvias.
4. Se deberá realizar un revestimiento de las cunetas para el manejo de aguas lluvias bien sea en cemento o material asfaltico, el cual no genere erodación de material hacia los desarenadores; esto facilitará su mantenimiento.
5. Referente al botadero de esteriles se recomienda realizar un banqueo en dos (2) secciones cuyas características serán de 3 metros de altura y bermas de 3 metros con un ángulo de inclinación de 60° para material suelto y de 80 – 90° para material compacto, por otra parte se deberá realizar retiro o perfilamiento de talud hacia el drenaje de aguas lluvias que pasa en el sector, estas obras se deben empezar a realizar en el transcurso de dos meses, las cuales se deberá culminar en el primer año.
6. Deben conformar las bermas con especies como leucaena y pasto rastrojo, los cuales permitan el amarre y cubrimiento de los mismos, como también la empradización del talud establecido.
7. Intensificar la siembra de especies en lugares estrategicos cuyo objeto será disminuir el impacto visual; estas especies deberán ser de porte alto a las cuales debe realizarse las labores silvoculturales necesarias para su desarrollo.

0276

Que por lo expuesto anteriormente y con fundamento en la ley 99 de 1993, los decretos 1753 de 1994 y 1180 de 2003, se considera procedente acoger el plan de Manejo Ambiental como instrumento de seguimiento ambiental para el proyecto de explotación de Gravas, oro y asfaltita, realizada por los señores Alexander y Fritz Franz Moller Bustos, localizada en el predio Santa Inés de la vereda San Domingo en de municipio de Armero Guayabal, departamento del Tolima, para desarrollar la actividad consistente en la explotación de material de gravas, oro y asfaltita.

Que por corresponder a una actividad, que se viene desarrollando antes de la vigencia de la Ley 99 de 1993 y por ende de su decreto reglamentario 1753 de 1994, se le exigió la presentación de un plan de manejo acorde al régimen de transición contemplado en el inciso tercero del artículo 38 ibidem, aclarando que deberán los beneficiarios continuar presentado actualizaciones de planes de manejo por el término del contrato de concesión Minera, y efectuando ajustes a la implementación de dichos planes de Manejo, cuando la Autoridad Ambiental lo requiera.

Que por todo lo anterior,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Acoger la Actualización del Plan de Manejo Ambiental, presentado por el señor Alexander Moller Bustos, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.328.527 de Villavicencio, para la explotación de material de gravas, oro y asfaltita, según contrato de concesión minera No.16727 otorgado a los titulares ALEXANDER Y FRITZ FRANZ MOLLER BUSTOS, como complemento de la resolución No. 2213 de Octubre 7 de 1996, actividad localizada en el predio santa Inés, vereda Santo Domingo del municipio de Armero Guayabal, departamento del Tolima.

ARTICULO SEGUNDO: Los señores ALEXANDER y FRITZ FRANZ MOLLER BUSTOS, identificados con cédulas de ciudadanías Nos. 17.328.527 y 19.305.348 deberán realizar los mantenimientos a las obras efectuadas en cumplimiento de la resolución No. 2213 del 7 de Octubre de 1996, además de implementar las siguientes obligaciones:

1. Respetar una franja protectora y de aislamiento hacia la vía que conduce a Falan en una distancia de 30 metros, con respecto a la explotación.
2. Allegar los informes de avance a los cuales se anexe los soportes con respecto a donaciones, actas de charlas de educación ambiental, avance de reforestación, avance de explotación.
3. Hacer mantenimientos periódicos a los desarenadores para el manejo de aguas lluvias.
4. Realizar un revestimiento de las cunetas para el manejo de aguas lluvias bien sea en cemento o material asfaltico, el cual no genere erodación de material hacia los desarenadores; esto facilitará su mantenimiento.

5. Referente al botadero de estériles se debe realizar un banqueo en dos (2) secciones cuyas características serán de 3 metros de altura y bermas de 3 metros con un ángulo de inclinación de 60° para material suelto y de 80 – 90° para material compacto, por otra parte se deberá realizar retiro o perfilamiento de talud hacia el drenaje de aguas lluvias que pasa en el sector, estas obras se debes empezar a realizar en el transcurso de dos meses, las cuales se deberán culminar en el primer año.
6. Conformar las bermas con especies como leucaena y pasto rastrojo los cuales permitan el amarre y cubrimiento de los mismos, como también la empradización del talud establecido.
7. Intensificar la siembra de especies en lugares estrategicos cuyo objeto será de disminuir el impacto visual; estas especies deberán ser de porte alto a las cuales debe realizarse las labores silvoculturales necesarias para su desarrollo.

ARTICULO TERCERO.- Los señores ALEXANDER y FRITZ FRANZ MOLLER BUSTOS, deberán cancelar anualmente a favor de CORTOLIMA, las tarifas correspondientes al valor de seguimiento ambiental, conforme a lo establecido en la ley 633 de 2000, la resolución 1611 de 2001 y/o normas vigentes, las que se establecerán mediante auto debidamente motivado, para lo cual deberán aportar los costos de operación en los primeros quince (15) días del mes de Enero de cada año, durante la duración del proyecto o actividad.

PARAGRAFO.-Las anteriores tarifas estarán sujetas a modificaciones y/o reajustes que se implementen por medio de reglamentación posterior sobre la materia.

ARTICULO CUARTO.- Con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el permisionario y planteadas en el presente acto administrativo y Plan de Manejo ambiental, los señores ALEXANDER y FRITZ FRANZ MOLLER BUSTOS,, deberán suscribir a favor de CORTOLIMA una garantía o póliza de seguros equivalente al 30% del costo anual del valor de las obras estipuladas en el Plan de Manejo ambiental determinado en este caso para un periodo de cinco años y un costo por el primer año de $15´045.000,00; luego del primer año y hasta el quinto año, la poliza se deberá renovar anualmente por el mismo valor, a partir del quinto año la póliza se renovara anualmente en forma automática durante la vida útil del proyecto y dos años más.

ARTICULO QUINTO.- Los señores ALEXANDER y FRITZ FRANZ MOLLER BUSTOS, deben efectuar un control ambiental permanente a través de una interventoría contratada con profesionales idóneos en el área, con el fin de supervisar las actividades y verificar el cumplimiento de las labores del Plan de Manejo Ambiental, para lo cual deberán entregar informes semestrales de avance del Plan de Manejo Ambiental y de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo.

ARTICULO SEXTO.- En caso de incumplimiento por parte de los beneficiarios a cualquiera de los términos, condiciones, obligaciones o exigencias contempladas en la

0276

- 9 MAR 2004

presente resolución, CORTOLIMA procederá a imponer las sanciones y medidas preventivas consagradas en la legislación ambiental y en especial las contenidas en el artículo 85 de la Ley 99 de 1993.

ARTICULO SEPTIMO.- Los señores ALEXANDER y FRITZ FRANZ MOLLER BUSTOS, deberán implementar y dar cumplimiento a todas y cada una de las medidas preventivas, correctivas, de control, programa de seguridad industrial, para todas las etapas de funcionamiento de la planta, contenidos en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTICULO OCTAVO.- CORTOLIMA supervisará la ejecución del proyecto y verificará el cumplimiento de lo dispuesto en la resolución No.2213 de Octubre 7 de 1996 y el presente acto administrativo, en lo que sea de su competencia.

ARTÍCULO NOVENO: Enviar copia de esta providencia a la Alcaldía y Personería del Municipio de Armero Guayabal, Departamento del Tolima, para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTICULO DECIMO : La presente Resolución debe publicarse por cuenta del interesado dentro de los diez (10) días siguientes a su expedición, en el Boletín oficial de CORTOLIMA, entendiéndose publicada cuando se presente el respectivo comprobante de pago.

PARAGRAFO: Sin el lleno del anterior requisito, el presente Acto Administrativo no producirá efectos jurídicos.

ARTICULO DECIMO PRIMERO.- Contra esta providencia procede únicamente el recurso de reposición, ante el Director General de CORTOLIMA, el cual se podrá interponer por parte del interesado dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación personal o por Edicto y por terceros, dentro de los cinco días siguientes a su publicación.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Ibagué, - 9 MAR 2004

COPIA
SUB DIRECCION DE
GESTION AMBIENTAL

JOSE EDGAR BONILLA SUAREZ
Director General

JOSE MANUEL CALDERON BOHORQUEZ
Subdirector de Gestión Ambiental

Exp.2345T.9-Acoge P.M.A hco- febrero-23 -2004

CORTOLIMA
Ibagué, Abril 14/2004
Ayer a las 8:00 de la mañana fijado

Ejecutoria de RES Nº 0276 de marzo 9/2004
Días hábiles 5, 6, 7, 12 y 13 de Abril 2004
Días no hábiles 3, 4, 8, 9, 10 y 11 de Abril/2004

Mariam

Corporación Autónoma Regional del Tolima

EL SUBDIRECTOR JURÍDICO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA "CORTOLIMA"

CERTIFICA:

Que mediante Resolución 2213 de 07 de Noviembre de 1996, CORTOLIMA otorgó Autorización Ambiental para la explotación de material de Gravas, Asfaltitas, Oro y demás concesibles, al señor Franz Moller Reyes, en el predio Santa Inés, de la Vereda Santo Domingo, y corresponde al expediente L-2345.

Que, mediante Resolución No.0276 de marzo 9 de 2004, CORTOLIMA acoge un Plan de Manejo Ambiental como instrumento de seguimiento ambiental al proyecto de explotación.

Que, a la fecha, la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución No. 2213 de 07 de Noviembre de 1996, se encuentra vigente.

Que, mediante Resolución 592 de 5 de marzo de 2018, se acogido la actualización del Plan de Manejo Ambiental.

Que, mediante Resolución 0276 del 3 de septiembre de 2023, se acogió la actualización del Plan de Manejo Ambiental.

La anterior se expide a solicitud del interesado, a lo dos (2) días del mes de junio de dos mil veinticuatro (2024), con destino a quien corresponda.

JUAN CARLOS GUZMAN ORTES
Subdirector Jurídico

Elaboró: Luisa Fernanda Borja Olaya – Profesional Universitario
Revisó: Dr. Henry Cifuentes Ocampo – Profesional Especializado

SEDE CENTRAL
Cra. 5ª Av. Del Ferrocarril, Calle 44
Tels.: (8) 2654551/52/54/55
Fax: (8) 2654553 – 2700120
E-Mail: cortolima@cortolima.gov.co
Web: www.cortolima.gov.co
Ibagué – Tolima – Colombia

Dirección Territorial Sur:
C.C. Kalarama
Cra. 8 No. 7 – 24/28
Of. 301-303
Telefax.: (8) 2462779
Chaparral

Dirección Territorial Norte:
Cra. 6 No. 4 – 37
Telefax.: (8) 2530115
Armero Guayabal

Dirección Territorial Suroriente:
Calle 6 No. 23 -37 Piso 2
Telefax.: (8) 2456876
Melgar

Dirección Territorial Oriente:
Cra. 4 No. 8A - 27
Telefax.: (8) 2281204
Purificación

CERTIFICADO DE REGISTRO MINERO

CRM-202405061942-566129 Fecha de Reporte: 06/may/2024 19:42

CÓDIGO DE EXPEDIENTE:	16727	**MODALIDAD:**	CONTRATO DE CONCESIÓN (D 2655)	**FECHA Y HORA DE REGISTRO:**	10/feb/1993 00:00
VIGENCIA HASTA:	16/dic/2023	**ESTADO:**	Activo	**AUTORIDAD MINERA COMPETENTE:**	AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

TITULARES

NOMBRES	TIPO	IDENTIFICACIÓN	USUARIO AnnA
ALEXANDER MOLLER BUSTOS	Cédula de Ciudadanía	17328527	13311
FRANZ MOLLER REYES	Cédula de Ciudadanía	79939385	29069
LUZ ANGELA RODRIGUEZ SALAH	Cédula de Ciudadanía	63356613	28795

ÁREA TOTAL (ha):	364.2497
MUNICIPIOS:	ARMERO (Guayabal)-Tolima

MINERALES:	ARENAS, ASFALTO NATURAL, BENTONITA, GRAVAS, RECEBO

ANOTACIONES

ANOTACIÓN:	1
FECHA DE ANOTACIÓN:	10/feb/1993
TIPO DE ANOTACIÓN:	LICENCIA EXPLORACION
FECHA EJECUTORIA:	
TIPO DE DOCUMENTO:	RESOLUCION
CÓDIGO DEL DOCUMENTO:	OTRO
NÚMERO DE DOCUMENTO:	5-3031
ESPECIFICACIÓN:	OTORGA LICENCIA DE EXPLORACION

ANOTACIÓN:	2
FECHA DE ANOTACIÓN:	26/ago/1993
TIPO DE ANOTACIÓN:	ACEPTAR REDUCCION AREA/NUEVA ALINDERACION/AREA MODIFICADA
FECHA EJECUTORIA:	
TIPO DE DOCUMENTO:	AUTO
CÓDIGO DEL DOCUMENTO:	OTRO
NÚMERO DE DOCUMENTO:	0
ESPECIFICACIÓN:	ACEPTA REDUCCION DE AREA

ANOTACIÓN:	3
FECHA DE ANOTACIÓN:	16/dic/1993
TIPO DE ANOTACIÓN:	POLIZA DE CUMPLIMIENTO
FECHA EJECUTORIA:	
TIPO DE DOCUMENTO:	POLIZA
CÓDIGO DEL DOCUMENTO:	OTRO
NÚMERO DE DOCUMENTO:	1067171
ESPECIFICACIÓN:	GARANTIZA CUMPLIMIENTO CONTRATO CONCESIO

ANOTACIÓN:	4
FECHA DE ANOTACIÓN:	16/dic/1993
TIPO DE ANOTACIÓN:	CONTRATO DE CONCESION
FECHA EJECUTORIA:	
TIPO DE DOCUMENTO:	CONTRATO
CÓDIGO DEL DOCUMENTO:	OTRO
NÚMERO DE DOCUMENTO:	16727
ESPECIFICACIÓN:	CONTRATA EXPLOTACION MEDIANA MINERIA

ANOTACIÓN:	5
FECHA DE ANOTACIÓN:	03/feb/1994
TIPO DE ANOTACIÓN:	ACLARACION DE TITULARES
FECHA EJECUTORIA:	
TIPO DE DOCUMENTO:	RESOLUCION
CÓDIGO DEL DOCUMENTO:	OTRO
NÚMERO DE DOCUMENTO:	3047
ESPECIFICACIÓN:	OTORGA CONCESION DE AGUAS AL TITULAR

ANOTACIÓN:	6
FECHA DE ANOTACIÓN:	25/jul/1994
TIPO DE ANOTACIÓN:	OTROSI/MODIFICA/ADICIONA/COMPLEMENTA CONTRATO DE OPERACION
FECHA EJECUTORIA:	
TIPO DE DOCUMENTO:	RESOLUCION
CÓDIGO DEL DOCUMENTO:	OTRO
NÚMERO DE DOCUMENTO:	100598
ESPECIFICACIÓN:	INSCRIPCION OTROSI CAMBIO TITULAR

ANOTACIÓN:	7
FECHA DE ANOTACIÓN:	14/nov/1995
TIPO DE ANOTACIÓN:	CESION PARCIAL DE DERECHOS
FECHA EJECUTORIA:	
TIPO DE DOCUMENTO:	RESOLUCION
CÓDIGO DEL DOCUMENTO:	OTRO
NÚMERO DE DOCUMENTO:	0432
ESPECIFICACIÓN:	ACEPTA CESION PARCIAL DEL 50%

ANOTACIÓN:	8
FECHA DE ANOTACIÓN:	27/oct/1998

TIPO DE ANOTACIÓN:	POLIZA DE CUMPLIMIENTO
FECHA EJECUTORIA:	
TIPO DE DOCUMENTO:	POLIZA
CÓDIGO DEL DOCUMENTO:	OTRO
NÚMERO DE DOCUMENTO:	19843
ESPECIFICACIÓN:	GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

ANOTACIÓN:	9
FECHA DE ANOTACIÓN:	04/nov/1999
TIPO DE ANOTACIÓN:	CESION TOTAL DE DERECHOS
FECHA EJECUTORIA:	
TIPO DE DOCUMENTO:	RESOLUCION
CÓDIGO DEL DOCUMENTO:	OTRO
NÚMERO DE DOCUMENTO:	1000-019
ESPECIFICACIÓN:	DECLARA PERFECCIONADA CESION TOTAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

ANOTACIÓN:	10
FECHA DE ANOTACIÓN:	20/dic/2001
TIPO DE ANOTACIÓN:	SIN DEFINIR
FECHA EJECUTORIA:	10/dic/2001
TIPO DE DOCUMENTO:	RESOLUCION
CÓDIGO DEL DOCUMENTO:	OTRO
NÚMERO DE DOCUMENTO:	45
ESPECIFICACIÓN:	SE ADOPTA EL NUEVO SISTEMA DE REGISTRO MINERO NACIONAL, EL CODIGO: 93-00192-16727-03-00000-00 CAMBIA A: GCRI-02

ANOTACIÓN:	11
FECHA DE ANOTACIÓN:	12/abr/2006
TIPO DE ANOTACIÓN:	EMBARGO DE TITULOS
FECHA EJECUTORIA:	06/abr/2006
TIPO DE DOCUMENTO:	OFICIO
CÓDIGO DEL DOCUMENTO:	OTRO
NÚMERO DE DOCUMENTO:	396
ESPECIFICACIÓN:	COMEDIDAMENTE ME PERMITO COMUNICARLE A USTED, ESE DESPACHO MEDIANTE AUTO DEL 6 DE LOS CORRIENTES, DICTADO DENTRO DEL PROCESO DE LA REFERENCIA, DECRETO EL EMBARGO DE LOS DERECHOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION EN LA PROPORCION QUE TENGA EL DEMANDADO ALEXANDER MOLLER BUSTOS, DEL CUAL ES TITULAR JUNTO CON OTROS DEL INSTITUTO MINERO CONSISTENTE EN CONTRATO DE CONCESION DISTINGUIDO CON EL NUMERO 16727 DEL 7 DE DICIEMBRE DE 1993 DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, REGISTRADO EN EL REGISTRO MINERO NACIONAL QUE LLEVA INGEOMINAS

ANOTACIÓN:	12
FECHA DE ANOTACIÓN:	16/may/2006
TIPO DE ANOTACIÓN:	ACLARACION/MODIFICACION DE TITULO
FECHA EJECUTORIA:	05/jun/2001
TIPO DE DOCUMENTO:	RESOLUCION
CÓDIGO DEL DOCUMENTO:	OTRO

NÚMERO DE DOCUMENTO:	10900113
ESPECIFICACIÓN:	ACLARAR EL ARTICULO PRIMERO DE LA RESOLUCION NO. 1000-019 DEL 13 DE AGOSTO DE 1999.

ANOTACIÓN:	13
FECHA DE ANOTACIÓN:	20/sep/2007
TIPO DE ANOTACIÓN:	CESION TOTAL DE DERECHOS
FECHA EJECUTORIA:	25/oct/2006
TIPO DE DOCUMENTO:	RESOLUCION
CÓDIGO DEL DOCUMENTO:	OTRO
NÚMERO DE DOCUMENTO:	DSM-1111
ESPECIFICACIÓN:	DECLARA PERFECCIONADA CESION TOTAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL 50% QUE LE CORRESPONDE A FRITZ FRANZ MOLLER BUSTOS EN FAVOR DE FRANZ MOLLER REYES Y LUZ ANGELA RODRIGUEZ SALAH, CADA UNO CON EL 25%, QUEDANDO SOLIDARIAMENTE RESPONSABLE CON EL CO-TITULAR ALEXANDER MOLLER BUSTOS

ANOTACIÓN:	14
FECHA DE ANOTACIÓN:	16/dic/2008
TIPO DE ANOTACIÓN:	EMBARGO DE TITULOS
FECHA EJECUTORIA:	21/oct/2008
TIPO DE DOCUMENTO:	OFICIO
CÓDIGO DEL DOCUMENTO:	OTRO
NÚMERO DE DOCUMENTO:	J1PMAG-725
ESPECIFICACIÓN:	PROCESO EJECUTIVO MINIMA NO. 2003-00005-00, DEMANDANTE. MARCO FEDERMAN VERGARA MORENO, DEMANDADO ALEXANDER MOLLER BUSTOS Y/O SOCIEDAD COMERCIAL MINA SAN PEDRO, PRO AUTO DE SEPTIEMBRE 5 DE 2008 SE DECRETO EL EMBARGO DE LA CONCESION MINERA NRO 16727 DE LAS MINAS DE SAN PEDRO FINCA SANTA INES KM 4, EN LA PARTE QUE LE CORRESPONDE AL SR ALEXANDER MOLLER BUSTOS

ANOTACIÓN:	15
FECHA DE ANOTACIÓN:	08/oct/2009
TIPO DE ANOTACIÓN:	DESEMBARGO DE TITULOS
FECHA EJECUTORIA:	07/sep/2009
TIPO DE DOCUMENTO:	OFICIO
CÓDIGO DEL DOCUMENTO:	OTRO
NÚMERO DE DOCUMENTO:	J1PMAG-0591
ESPECIFICACIÓN:	POR PROVIEDENCIA DEL 20 DE AGOSTO DEL 2009, SE DECLARO ENTRE OTROS, LA TERMINACION DEL PROCESO Y EL ARCHIVO DEL MISMO. POR LO ANTERIOR SE ORDENA LEVANTAR EL EMBARGO DE LA CONCESION MINERA NRO 16727 CODIGO GCRI-02 DE MINERCOL - INGEOMINAS; DE LA CUAL ESTA EN NOMBRE DEL SE?OR ALEXANDER MOLER BUSTOS, CON C.C. NRO 17.328.527 DE VILLAVICENCIO; MEDIDA QUE FUE ORDENADA MEDIANTE NUESTRO OFICIO NRO 725 DEL 21 DE OCTUBRE DE 2008.

ANOTACIÓN:	16
FECHA DE ANOTACIÓN:	15/dic/2010
TIPO DE ANOTACIÓN:	EMBARGO DE TITULOS
FECHA EJECUTORIA:	30/sep/2021

TIPO DE DOCUMENTO:	AUTO
CÓDIGO DEL DOCUMENTO:	OTRO
NÚMERO DE DOCUMENTO:	1557
ESPECIFICACIÓN:	EL JUZGADO PRIMERO DE FAMILIA DE BOGOTA MEDIANTE AUTO DE FECHA AGOSTO 25 DE 2010, DICTADO DENTRO DEL PROCESO DE LA REFERENCIA DECRETO EL EMBARGO Y SECUESTRO DE LA LICENCIA MINERA QUE CORRESPONDEN A LOS CONTRATOS DE CONCESION No 16727 I HIF-08022 SOBRE EL 50% DE PROPIEDAD DEL SEÑOR ALEXADER MOLLER BUSTOS.

ANOTACIÓN:	17
FECHA DE ANOTACIÓN:	04/jun/2019
TIPO DE ANOTACIÓN:	EMBARGO DE TITULOS
FECHA EJECUTORIA:	14/may/2019
TIPO DE DOCUMENTO:	OFICIO
CÓDIGO DEL DOCUMENTO:	OTRO
NÚMERO DE DOCUMENTO:	Oficio No. 2003
ESPECIFICACIÓN:	El Juzgado Sexto Civil del Circuito de Ibagué ¿ Tolima, COMUNICA a la Agencia Nacional de Minería que dentro del proceso ejecutivo singular instaurado por MARIELA MENDOZA RAMIREZ C.C. 28.681.092 contra ALEXANDER MOLLER BUSTOS C.C. 17.328.527 con Radicado No. 73001-31-03-006-2005-00147-00 se profirió Auto del 07 de mayo del año en curso, mediante el cual DECRETÓ el EMBARGO (...) del Contrato de Concesión Minera No. 16727 que hace parte del concesionario aquí demandado ALEXANDER MOLLER BUSTOS identificado con la cédula de ciudadanía 17.328.527.

ANOTACIÓN:	18
FECHA DE ANOTACIÓN:	26/jul/2022
TIPO DE ANOTACIÓN:	DESEMBARGO DE TITULOS
FECHA EJECUTORIA:	23/oct/2020
TIPO DE DOCUMENTO:	OFICIO
CÓDIGO DEL DOCUMENTO:	Juzgado
NÚMERO DE DOCUMENTO:	3501
ESPECIFICACIÓN:	INSCRIPCIÓN en el Registro Minero Nacional de la cancelación del embargo del título minero del Contrato de Concesión No. 16727 en el porcentaje que corresponda al demandado ALEXANDER MOLLER BUSTOS identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.328.527, cancelación de medida cautelar que fue decretada por el JUZGADO SEXTO CIVIL DEL CIRCUITO DE IBAGUÉ TOLIMA, mediante auto del dieciséis (16) de octubre de 2020, proferido dentro del proceso ejecutivo singular instaurado por MARIELA MENDOZA RAMIREZ CC 28.681.092 contra ALEXANDER MOLLER BUSTOS CC. 17.328.527 con radicado No. 73001-31-03-006-2005-00147-00. La medida cautelar de embargo se comunicó a la Agencia Nacional de Minería mediante oficio No. 2003 del 14 de mayo de 2019, librado por el juzgado.

ANOTACIÓN:	19
FECHA DE ANOTACIÓN:	20/ene/2023
TIPO DE ANOTACIÓN:	ACLARACION/MODIFICACION DE TITULO
FECHA EJECUTORIA:	19/ene/2023
TIPO DE DOCUMENTO:	OFICIO
CÓDIGO DEL DOCUMENTO:	Circular
NÚMERO DE DOCUMENTO:	001 2023
	INSCRIPCIÓN en el Registro Minero Nacional de la entrada en producción en la información gráfica de los títulos mineros que se visualiza en el Sistema Integral de Gestión Minera –AnnA Minería-, de conformidad con lo comunicado a través de la

ESPECIFICACIÓN:	Circular Externa No. 001 del 19 de enero de 2023, expedida por la Agencia Nacional de Minería en aplicación de lo dispuesto en la Resolución 370 del 16 de junio de 2021, proferida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC, por medio de la cual se establece “el sistema de proyección cartográfica oficial para Colombia, específicamente, la determinación de distancias y áreas para todos los títulos mineros, se hará a partir del 20 de enero de 2023 con respecto la proyección cartográfica “Transverse Mercator” como sistema oficial de coordenadas planas para Colombia, con un único origen denominado “Origen Nacional”, referido al Marco Geocéntrico Nacional de Referencia, también denominado MAGNA-SIRGAS”; es decir, el valor del área concedida para algunos títulos mineros, puede visualizarse mayor o menor, sin que esto signifique modificación del polígono otorgado.

ANOTACIÓN:	20
FECHA DE ANOTACIÓN:	03/ago/2023
TIPO DE ANOTACIÓN:	DESEMBARGO DE TITULOS
FECHA EJECUTORIA:	06/jun/2023
TIPO DE DOCUMENTO:	OFICIO
CÓDIGO DEL DOCUMENTO:	Juzgado
NÚMERO DE DOCUMENTO:	Oficio No. 0878
ESPECIFICACIÓN:	INSCRIPCIÓN en el Registro Minero Nacional de la orden de LEVANTAMIENTO del embargo del derecho a explorar y explotar emanado del contrato de concesión No. 16727 cuyo titular es el señor Alexander Moller Bustos C.C. 17.328.527. La orden de levantamiento de medida cautelar fue decretada por el JUZGADO VEINTISIETE DE FAMILIA DE BOGOTÁ, mediante sentencia de fecha 23 de mayo de 2023, proferida dentro del proceso de liquidación de sociedad conyugal con radicado No. 1100131-10-001-2012-00560-00 en el cual actúa como demandante GLORIA ISABEL CIRO DIMIÁN C.C. 51.737.138 y como demandado ALEXANDER MOLLER BUSTOS C. C. 17.328.527. La medida fue comunicada por el Juzgado Primero de Familia de Bogotá mediante oficio No. 1557 del 09 de septiembre de 2010 dentro del proceso de DIVORCIO con Rad. 110013110001-2010-00117-00 e inscrita en el Registro Minero Nacional el 15 de diciembre de 2010

CELDAS DEL TÍTULO

18N05K01C21D, 18N05K01C21E, 18N05K01C21I, 18N05K01C21J, 18N05K01C21N, 18N05K01C21P, 18N05K01C21T, 18N05K01C21U, 18N05K01C21Y, 18N05K01C21Z, 18N05K01C22A, 18N05K01C22B, 18N05K01C22C, 18N05K01C22D, 18N05K01C22E, 18N05K01C22F, 18N05K01C22G, 18N05K01C22H, 18N05K01C22I, 18N05K01C22J, 18N05K01C22K, 18N05K01C22L, 18N05K01C22M, 18N05K01C22N, 18N05K01C22P, 18N05K01C22Q, 18N05K01C22R, 18N05K01C22S, 18N05K01C22T, 18N05K01C22U, 18N05K01C22V, 18N05K01C22W, 18N05K01C22X, 18N05K01C22Y, 18N05K01C22Z, 18N05K01C23A, 18N05K01C23B, 18N05K01C23C, 18N05K01C23D, 18N05K01C23E, 18N05K01C23F, 18N05K01C23G, 18N05K01C23H, 18N05K01C23I, 18N05K01C23J, 18N05K01C23K, 18N05K01C23L, 18N05K01C23M, 18N05K01C23N, 18N05K01C23P, 18N05K01C23Q, 18N05K01C23R, 18N05K01C23S, 18N05K01C23T, 18N05K01C23U, 18N05K01C23V, 18N05K01C23W, 18N05K01C23X, 18N05K01C23Y, 18N05K01C23Z, 18N05K01C24A, 18N05K01C24B, 18N05K01C24C, 18N05K01C24D, 18N05K01C24E, 18N05K01C24F, 18N05K01C24G, 18N05K01C24H, 18N05K01C24I, 18N05K01C24J, 18N05K01C24K, 18N05K01C24L, 18N05K01C24M, 18N05K01C24N, 18N05K01C24P, 18N05K01C24Q, 18N05K01C24R, 18N05K01C24S, 18N05K01C24T, 18N05K01C24U, 18N05K01C24V, 18N05K01C24W, 18N05K01C24X, 18N05K01C24Y, 18N05K01C24Z, 18N05K01C25A, 18N05K01C25B, 18N05K01C25C, 18N05K01C25D, 18N05K01C25E, 18N05K01C25F, 18N05K01C25G, 18N05K01C25H, 18N05K01C25I, 18N05K01C25J, 18N05K01C25K, 18N05K01C25L, 18N05K01C25M, 18N05K01C25N, 18N05K01C25P, 18N05K01C25Q, 18N05K01C25R, 18N05K01C25S, 18N05K01C25T, 18N05K01C25U, 18N05K01C25V, 18N05K01C25W, 18N05K01C25X, 18N05K01C25Y, 18N05K01C25Z, 18N05K01G01D, 18N05K01G01E, 18N05K01G01I, 18N05K01G01J, 18N05K01G01N, 18N05K01G01P, 18N05K01G01T, 18N05K01G01U, 18N05K01G01Y, 18N05K01G01Z, 18N05K01G02A, 18N05K01G02B, 18N05K01G02C, 18N05K01G02D, 18N05K01G02E, 18N05K01G02F, 18N05K01G02G, 18N05K01G02H, 18N05K01G02I, 18N05K01G02J, 18N05K01G02K, 18N05K01G02L, 18N05K01G02M, 18N05K01G02N, 18N05K01G02P, 18N05K01G02Q, 18N05K01G02R, 18N05K01G02S, 18N05K01G02T, 18N05K01G02U, 18N05K01G02V, 18N05K01G02W, 18N05K01G02X, 18N05K01G02Y, 18N05K01G02Z, 18N05K01G03A, 18N05K01G03B, 18N05K01G03C, 18N05K01G03D, 18N05K01G03E, 18N05K01G03F, 18N05K01G03G, 18N05K01G03H, 18N05K01G03I, 18N05K01G03J, 18N05K01G03K, 18N05K01G03L, 18N05K01G03M, 18N05K01G03N, 18N05K01G03P, 18N05K01G03Q, 18N05K01G03R, 18N05K01G03S, 18N05K01G03T, 18N05K01G03U, 18N05K01G03V, 18N05K01G03W, 18N05K01G03X, 18N05K01G03Y, 18N05K01G03Z, 18N05K01G04A, 18N05K01G04B, 18N05K01G04C, 18N05K01G04D, 18N05K01G04E, 18N05K01G04F, 18N05K01G04G, 18N05K01G04H, 18N05K01G04I, 18N05K01G04J, 18N05K01G04K, 18N05K01G04L, 18N05K01G04M, 18N05K01G04N, 18N05K01G04P, 18N05K01G04Q, 18N05K01G04R, 18N05K01G04S, 18N05K01G04T, 18N05K01G04U, 18N05K01G04V, 18N05K01G04W, 18N05K01G04X, 18N05K01G04Y, 18N05K01G04Z, 18N05K01G05A, 18N05K01G05B, 18N05K01G05C, 18N05K01G05D, 18N05K01G05E, 18N05K01G05F, 18N05K01G05G, 18N05K01G05H, 18N05K01G05I, 18N05K01G05J, 18N05K01G05K, 18N05K01G05L, 18N05K01G05M, 18N05K01G05N, 18N05K01G05P, 18N05K01G05Q, 18N05K01G05R, 18N05K01G05S, 18N05K01G05T, 18N05K01G05U, 18N05K01G05V, 18N05K01G05W, 18N05K01G05X, 18N05K01G05Y, 18N05K01G05Z, 18N05K01G06D, 18N05K01G06E, 18N05K01G06I, 18N05K01G06J, 18N05K01G06N, 18N05K01G06P, 18N05K01G06T, 18N05K01G06U, 18N05K01G07A, 18N05K01G07B, 18N05K01G07C, 18N05K01G07D, 18N05K01G07E, 18N05K01G07F, 18N05K01G07G, 18N05K01G07H, 18N05K01G07I, 18N05K01G07J, 18N05K01G07K, 18N05K01G07L, 18N05K01G07M, 18N05K01G07N, 18N05K01G07P, 18N05K01G07Q, 18N05K01G07R, 18N05K01G07S, 18N05K01G07T, 18N05K01G07U, 18N05K01G08A, 18N05K01G08B, 18N05K01G08C, 18N05K01G08D, 18N05K01G08E, 18N05K01G08F, 18N05K01G08G, 18N05K01G08H, 18N05K01G08I, 18N05K01G08J, 18N05K01G08K, 18N05K01G08L, 18N05K01G08M, 18N05K01G08N, 18N05K01G08P, 18N05K01G08Q, 18N05K01G08R, 18N05K01G08S, 18N05K01G08T, 18N05K01G08U, 18N05K01G09A, 18N05K01G09B, 18N05K01G09C, 18N05K01G09D, 18N05K01G09E, 18N05K01G09F, 18N05K01G09G, 18N05K01G09H, 18N05K01G09I, 18N05K01G09J, 18N05K01G09K, 18N05K01G09L, 18N05K01G09M, 18N05K01G09N, 18N05K01G09P, 18N05K01G09Q, 18N05K01G09R, 18N05K01G09S, 18N05K01G09T, 18N05K01G09U, 18N05K01G10A, 18N05K01G10B, 18N05K01G10C, 18N05K01G10D, 18N05K01G10E, 18N05K01G10F, 18N05K01G10G, 18N05K01G10H, 18N05K01G10I, 18N05K01G10J, 18N05K01G10K, 18N05K01G10L, 18N05K01G10M, 18N05K01G10N, 18N05K01G10P, 18N05K01G10Q, 18N05K01G10R, 18N05K01G10S, 18N05K01G10T, 18N05K01G10U

Nota: Las celdas reportadas en el listado se suporponen total o parcialmente con el título

COORDENADAS DEL TÍTULO

Coordenadas en WKT*

POLYGON ((-74.92505026 4.96642826999999, -74.925067484 4.979991274999975, -74.946976198 4.979962887999989, -74.946958526 4.966399960999979, -74.92505026 4.96642826999999))

* WKT: Well Known Text. Codificación o sintaxis en formato ASCII estandarizada diseñada para describir objetos espaciales expresados de forma vectorial. Para visualizar las coordenadas puede cargar el texto en el sitio https://arthur-e.github.io/Wicket/sandbox-gmaps3.html



WILLIAM ALBERTO MARTINEZ DIAZ

GERENTE DE CATASTRO Y REGISTRO MINERO

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

CERTIFICADO DE REGISTRO MINERO

CRM-202405061942-566129 Fecha de Reporte: 06/may/2024 19:42

NOTAS ACLARATORIAS

De acuerdo con la circular Número 0010 del 18 de junio de 2015 expedida por la Agencia Nacional de Minería - ANM -, se fija la directriz relacionada con la inscripción de prendas mineras, donde se determina que Por disposición de la Ley 1676 de 2013 y el Decreto 400 de 2014 las garantías mineras o cualquier gravamen que recaiga sobre el derecho a explorar y explotar en los términos de la señalada norma, deben ser consultadas en el registro de Garantías Mobiliarias, el cual se desarrollará por parte de la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecamaras).

Las coordenadas de los vértices están referidas al sistema MAGNA-SIRGAS

Las áreas han sido calculadas con respecto al Origen Nacional de la proyección Gauss-Krüeger, Transverse Mercator Colombia.

Este certificado electrónico tiene validez conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y las demás normas que los complementen, modifiquen o reemplacen. Para verificar su autenticidad escanee el código QR que se encuentra en el encabezado del documento. Este código lo direccionará a una URL que le permitirá descargar el documento original y compararlo con el presente documento electrónico.

Recuerde que la URL válida debe empezar con https://annamineria.anm.gov.co, en caso contrario abstenerse de realizar cualquier acción en el navegador.

El estado del título descrito en este certificado corresponde al día y hora en la que fue expedido.

********** FIN DE ESTE DOCUMENTO **********

Ibagué, 13-06-2024 13:59 PM

Señor
FRANZ MOLLER REYES
Cotitular
Contrato de Concesión No. 16727
Email: fmoller04@hotmail.com
Teléfono: 0
Celular: 3176423400
Dirección: Calle 77 No. 10-33 Ed. Frontera Living Apartaments torre 01 apt 815
Departamento: TOLIMA
Municipio: IBAGUE

Asunto: Respuesta radicado No. 20249010535422

Por medio del presente, se emite respuesta a su radicado No. 20249010535422 del 27 de mayo de 2024, con asunto: "DERECHO DE PETICION CERTIFICACION ESTADO ACTUAL TITULO MINERO 16727":

> *"DERECHO DE PETICION CERTIFICACION ESTADO ACTUAL TITULO MINERO 16727*
>
> *Cordialmente,"*

Se informa que el Contrato de Concesión para Mediana Minería No. 16727, inscrito en el Registro Minero Nacional el 16 de diciembre de 1.993 y que una vez verificado el Sistema Integral de Gestión Minera-ANNA MINERÍA, se encuentra activo y vigente, toda vez que los titulares han presentado de forma oportuna la solicitud de prórroga del referido título minero, la cual está siendo sometida a las correspondientes evaluaciones técnica y jurídica, que serán acogidas mediante acto administrativo en el que se librarán las disposiciones que en derecho haya lugar, las cuales, a su vez, serán notificadas oportunamente conforme a los procedimientos establecidos en la normatividad vigente.

Cordialmente,

DIEGO FERNANDO LINARES ROZO
Coordinador Punto de Atención Regional Ibagué.

Anexos: "No aplica".
Copia: "No aplica".
Elaboró: Juan Pablo Arboleda Barrios. Ingeniero de Minas – PAR Ibagué.
Revisó: "No aplica".
Fecha de elaboración: 13-06-2024 11:47 AM
Número de radicado que responde: 20249010535422

Tipo de respuesta: "Total".
Archivado en: Expediente 16727.

Certificado

Registro Único de RUCOM

Registro **RUCOM-2023061524734**

En cumplimiento del Capítulo 6º del Decreto Único Reglamentario del Sector de Minas y Energía No. 1073 del 25 de mayo de 2015, la Agencia Nacional de Minería certifica que ASMINCOL SAS con NIT número 900467519 acredita la calidad de comercializador autorizado inscrito en el Registro Único de Comercializadores de Minerales.

La presente certificación permite al comercializador realizar de forma regular la actividad de comprar y vender minerales para transformarlos, beneficiarlos, distribuirlos, intermediarlos, exportarlos o consumirlos y tiene una vigencia del 20-06-2024 hasta el 31-07-2025. Durante el mes de mayo de 2025 el interesado debe realizar los trámites de renovación indicada en el Decreto 1073 de 2015.

Se acredita al comercializador de minerales luego de verificar y validar la información suministrada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN - y consultar en la Base de datos de Confecámaras.

EL PRESENTE CERTIFICADO NO AUTORIZA AL COMERCIALIZADOR A REALIZAR ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN DE MINERALES.

Los minerales autorizados para ser comercializados son: CARBON TERMICO, CONGLOMERADO (ROCA O PIEDRA), ARENAS ARCILLOSAS, ARENAS INDUSTRIALES (MIG), YESO NATURAL; ANHIDRITA

Dado en Bogotá D.C., a los 20 dias del mes de junio del año 2024.

JAIME ALONSO GARCÍA ARANGO
Gerente - Grupo de Regalías y Contraprestaciones Económicas

BRAYAN LEANDRO GARCIA LOPEZ
20-06-2024 01:06

Este documento ha sido firmado digitalmente con un certificado provisto por una entidad autorizada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 28 de la ley 527 de 1999, y 15 del Decreto 1747 de 2000. La firma digital aquí impuesta es el equivalente electrónico de la firma manuscrita.
La autenticidad del presente certificado podrá ser validada ingresando a www.anm.gov.co, con el número Registro RUCOM disponible en este certificado.

Ibagué, 11 de julio del 2024

CERTIFICACION COMERCIAL

INGENIERIA Y MINERIA INGEMIN S.A.S, sociedad identificada con el NIT No 813.005.203-0, PROPIETARIO del yacimiento minero No 16727 de la Mina SAN PEDRO, ubicada en el corregimiento de San Pedro, Municipio de Armero Guayabal, Departamento del Tolima con licencia ambiental para la operación establecida mediante Resolución 0276 del 9 de marzo del 2004, certifica que se encuentra vigente y sin procesos sancionatorios y cuenta con relación comercial vigente con la empresa **ASMINCOL S.A.S** identificada con NIT: 900.467.519 para el suministro de materiales de cantera requeridos en las obras que vienen adelantando en Bogotá.

Cordialmente

FRANZ MOLLER REYES
C.C 79.939.385 de Bogota
INGENIERIA Y MINERIA S.A – INGEMIN S.A
REPRESENTANTE LEGAL
NIT 813.005.203-0
Cra 7 No 60-21 Oficina 503 edificio Distrito 60
IBAGUE TOLIMA

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE
AMBIENTE

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE Folios 2 Anexos: 0
Proc. # 5516495 Radicado # 2023EE32713 Fecha 2023-02-15
Tercero: 860002523-1 - CEMEX COLOMBIA S.A
Dep.: SUBDIRECCION DE CONTROL AMBIENTAL AL SECTOR PUBLICO
Tipo Doc.: Oficio de salida Clase Doc.: Salida

CEMEX COLOMBIA S.A.
Atn. Nubia Elizabeth González Salazar
Apoderada General
Calle 99 No. 9A - 54 Piso 8
Teléfono: 317 574 1171
Correo electrónico: correo.juridica@cemex.com
Ciudad

CEMEX COLOMBIA-Radicacion Entrada
Radicacion 202300338
Destino ELISA MORALES RESTREPO
Remitente SECRETARIA DE AMBIENTE dd/mm/yyyy
Regional CO-CRI 100 10 46 16/02/2023

Referencia: Respuesta a radicado SDA **No. 2022ER153751 –** Planta de Tratamiento y Aprovechamiento de RCD.

Cordial saludo,

La Subdirección de Control Ambiental al Sector Público –SCASP de la Secretaría Distrital de Ambiente –SDA, como autoridad ambiental del perímetro urbano del Distrito Capital, en cumplimiento de su misión según lo estipulado en el Decreto 109 de 2009 *"Por el cual se modifica la estructura de la Secretaría Distrital de Ambiente y se dictan otras disposiciones"*; en atención al radicado de la referencia, mediante el cual realizan la inscripción de la empresa Cemex Colombia S.A., como Planta de Tratamiento y Aprovechamiento, en predio de la carrera 17 No. 71 - 10 sur, sobre área adyacente a la planta de mortero y polígono aprobado bajo Plan de Manejo de Recuperación y Restauración Ambiental con Registro Minero de Cantera - RMC 056; se permite informar lo siguiente:

Profesionales adscritos a la SCASP revisaron la trazabilidad de los procesos asociados a CEMEX COLOMBIA S.A. y se tiene que, mediante Comunicado Oficial Externo No. **2023IE31895** del 14 de febrero de 2023; se dio atención al radicado SDA No. **2022ER332493** del 26 de diciembre de 2022, informando que, una vez evaluada la información y conforme a lo evidenciado en visita técnica del 29 de agosto de 2022, se emitió el respectivo Informe Técnico de aprobación de la Planta de Tratamiento y Aprovechamiento de RCD bajo en **PIN 22599,** con número de informe técnico de la **SCASP – 00649**, el cual se adjunta al presente oficio para su conocimiento y fines pertinentes.

En el momento en que el concepto emitido por esta dependencia llegue a las instalaciones de la empresa, esta podrá iniciar las actividades listadas dentro del informe, y será incluida en el directorio ambiental de la SDA.

Finalmente, se recuerda que la Secretaría Distrital de Ambiente, desde la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público quedará atenta a suministrar o solucionar cualquier inquietud o solicitud desde el ámbito de las competencias de la Entidad, ya sea directamente en la ventanilla de atención al público de la entidad, ubicada en la Avenida Caracas No. 54 – 38, o a través de la línea telefónica 3778904.

Atentamente,

HELMAN ALEXANDER GONZALEZ FONSECA
SUBDIRECCION DE CONTROL AMBIENTAL AL SECTOR PUBLICO

Anexos: Radicado 2023IE31895 del 14/02/2023 – 30 Folios.

Proyectó: SANTIAGO ENRIQUE ENCISO ACOSTA
Revisó: HUGO ESTEBAN MORALES VARGAS

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE Folios 30 Anexos: 0
Proc. # 5787475 Radicado # 2023IE31895 Fecha: 2023-02-14
Tercero: 860002523-1 - CEMEX COLOMBIA S.A.
Dep.: SUBDIRECCION DE CONTROL AMBIENTAL AL SECTOR PUBLICO
Tipo Doc.: Informe tecnico Clase Doc.: Interno

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL AL SECTOR PÚBLICO

Informe Tecnico No. 00649, 14 de febrero del 2023

La Secretaría Distrital de Ambiente – SDA como autoridad promotora del desarrollo sostenible y el ambiente sano en el Distrito Capital, para elevar la calidad de vida de sus habitantes, y en cumplimiento de su misión, tiene la facultad de emitir una valoración sobre los impactos que pueda o no generar una actividad productiva.

Lo anterior, en cumplimiento de los Lineamientos Normativos Distritales establecidos en el Decreto 586 de 2015 *"Por medio del cual se adopta el modelo eficiente y sostenible de gestión de los Residuos de Construcción y Demolición - RCD en Bogotá D.C."*, y de ambiente Nacional bajo la Resolución 0472 de 2017 *"Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de Construcción y Demolición (RCD) y se dictan otras disposiciones"*, modificada y adicionada por la Resolución 1257 de 2021.

Por consiguiente, a partir de la visita técnica realizada por un profesional de la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público – SCASP, el pasado **29 de agosto de 2022** al predio ubicado en la **carrera 17 No. 71 - 10 sur,** sobre área adyacente a la planta de mortero y polígono aprobado bajo el Plan de Manejo de Recuperación y Restauración Ambiental con Registro Minero de Cantera - RMC 056, de la localidad de **Ciudad Bolívar**, se presenta el siguiente Informe Técnico como mecanismo de inscripción y aprobación de la empresa **CEMEX COLOMBIA S.A.** como gestor de Residuos de Construcción y Demolición - RCD, bajo la modalidad de Planta de Tratamiento y Aprovechamiento de RCD en el Distrito capital.

1. OBJETIVO

Generar Informe Técnico como mecanismo de inscripción y aprobación de **CEMEX COLOMBIA S.A.** con **NIT No. 860002523-1,** como Planta de Tratamiento y Aprovechamiento de RCD para polígono situado sobre predio de la **carrera 17 No. 71 - 10 sur,** identificado con **CHIP catastral AAA0143SWSK**; para la actividad de tratamiento y aprovechamiento de residuos de construcción y demolición de origen pétreo proveniente de demolición de estructuras verticales o elementos viales como concreto, mortero, unidades de albañilería de concreto, agregados no tratados, áridos tratados con cementantes hidráulicos, unidades de albañilería de arcilla, ladrillos, tejas y asfalto.

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

2. ANTECEDENTES

La señora **Nubia Elizabeth González Salazar** identificado con **Cedula de Ciudadanía** No. 52.378.961, en calidad de Apoderada General para Asuntos Mineros y Ambientales, como registra ante Cámara de Comercio y Certificado de Existencia y Representación Legal, la cual dispone:

> *"(...) Por Escritura Pública No. 15690 del 16 de julio de 2021, otorgada en la Notaría 29 de Bogotá D.C., registrada en esta Cámara de Comercio el 13 de septiembre de 2021, con el No. 00045948 del libro V, la persona jurídica confirió poder general, amplio y suficiente a Nubia Elizabeth González Salazar, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.378.961 de Bogotá D.C., y Tarjeta Profesional 162.564 del C.S de la J., para que obrando en nombre y representación de la poderdante, intervenga con plenos poderes y facultades en los siguientes actos, diligencias, procedimientos y actuaciones minero ambientales (...) 2) Suscribir o presentar ante cualquier autoridad minera o ambiental nacional, departamental o municipal, con competencia en asuntos de carácter ambiental o minero, todo tipo de solicitudes o respuestas a requerimientos ordinarios de información o requerimientos especiales y, en general, cualquier otra clase de respuesta a solicitudes de cualquier naturaleza formuladas por autoridades administrativas nacionales, departamentales y municipales en dichos asuntos (...)"*
>
> *Subrayado fuera de texto.*

Mediante radicados SDA No. **2022ER169546** y **2022ER230186** el 08 de julio y 07 de septiembre de 2022, solicitó la inscripción como Planta de Tratamiento y Aprovechamiento de RCD para la empresa **CEMEX COLOMBIA S.A.** con operación en área eventualmente localizada en polígono de predio de la **carrera 17 No. 71 - 10 sur**, sobre área adyacente a la planta de mortero y polígono aprobado bajo Plan de Manejo de Recuperación y Restauración Ambiental con Registro Minero de Cantera - RMC 056.

En atención a la solicitud, un profesional de la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público - SCASP realizó la verificación y evaluación de la información remitida, conforme a los lineamientos establecidos por la Secretaría Distrital de Ambiente para el trámite de inscripción como Planta de Tratamiento y Aprovechamiento – CTA, de RCD en el Distrito Capital.

Por lo anterior, profesionales adscritos a la SCASP realizaron visita el pasado 29 de agosto de 2022, al área referenciada en la solicitud para la instalación de la Planta de Tratamiento y Aprovechamiento de RCD. No obstante, evaluada la información allegada a la entidad mediante radicados SDA No. **2022ER169546 y 2022ER230186** y georreferenciadas las coordenadas del


Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

polígono de la Planta (4°32'54.69 N - 74° 8'10.87" W), se encontró que, si bien el predio se encuentra por fuera del polígono aprobado bajo PMRRA con Registro Minero de Cantera 056; este se localiza parcialmente sobre elemento de la estructura ecológica principal correspondiente a la categoría de "*sistema hídrico*" de los canales Boyacá Sector II y la Estrella I.

Por consiguiente, esta entidad bajo radicado SDA No. **2022EE307992** del 29 de noviembre de 2022, solicitó a Cemex Colombia S.A. **delimitar y remitir las coordenadas del polígono** del predio de la **carrera 17 No. 71 - 10 sur**, sobre el cual, se pretenden adelantar las actividades de recepción, separación y/o clasificación, acopio, tratamiento, transformación y aprovechamiento de los residuos, de manera tal, que este no contemple elementos de la Estructura Ecológica Principal.

Por lo anteriormente enunciado, mediante radicado SDA No. **2022ER332493** del 26 de diciembre de 2022, Cemex Colombia S.A. remite respuesta delimitando la localización de la Planta de Tratamiento y Aprovechamiento de RCD, de tal forma que el mismo, de manera tal, que las actividades no contemplen elementos de la estructura ecológica principal ni determinantes ambiental, en alcance al Artículo 204° del Decreto 555 de 2021.

Ilustración No. 1 Ubicación ajustada de Planta de Tratamiento y Aprovechamiento de RCD – Cemex Colombia S.A.

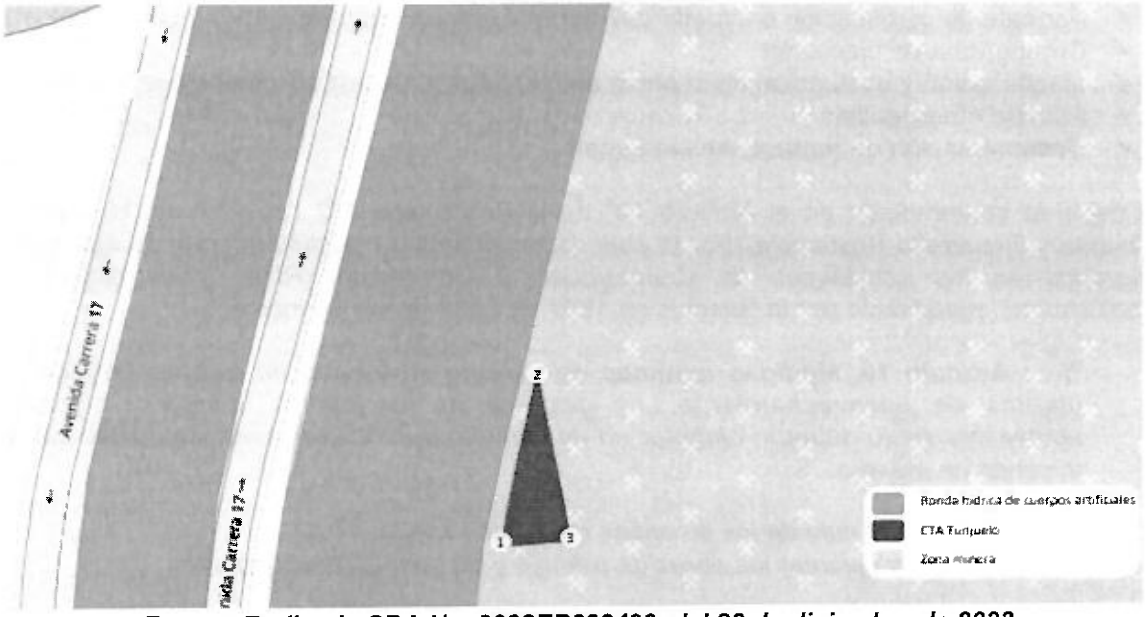

Fuente. Radicado SDA No. 2022ER332493, del 26 de diciembre de 2022

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

3. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA

3.1 Verificación de la Documentación Requerida

En cumplimiento del marco normativo establecido en el Artículo 21° del Decreto 586 de 2015, en calidad de Apoderada General para Asuntos Mineros y Ambientales y solicitante del trámite de inscripción como Planta de Tratamiento y Aprovechamiento de RCD para la empresa **CEMEX COLOMBIA S.A.,** la señora **Nubia Elizabeth González Salazar**, el 08 de julio y 09 de septiembre de 2022 mediante radicados SDA No. **2022ER169546** y **2022ER230186** respectivamente, remitió a la Secretaría Distrital de Ambiente los documentos requeridos para este trámite, los cuales se verificaron con base en los *"lineamientos ambientales para los Centros de Tratamiento y/o aprovechamiento – CTA de residuos de construcción y demolición"*, encontrando los siguientes:

- ✓ Resumen ejecutivo y datos generales del solicitante
- ✓ Localización del predio
- ✓ Descripción del proyecto y proceso de transformación
- ✓ Descripción de la maquinaria emplear en los procesos de transformación y aprovechamiento.
- ✓ Descripción de materiales a recibir y productos finales
- ✓ Formato de certificación a expedir del material entregado para el aprovechamiento
- ✓ Cronograma de ejecución
- ✓ Identificación y evaluación de impacto ambientales y medidas de manejo ambiental
- ✓ Plan de emergencias
- ✓ Documentación de representación Legal

Así como lo contemplado en el Artículo 10° de la Resolución 472 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible "*Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de Construcción y Demolición (RCD) y se dictan otras disposiciones"*, modificado por la Resolución 1257 de 2021 donde se indica:

> *"(...) **Artículo 10. Medidas mínimas de manejo ambiental en puntos limpios y en plantas de aprovechamiento.** Los gestores de los puntos limpios y plantas de aprovechamiento deberán elaborar un documento que contenga las siguientes medidas mínimas de manejo:*
>
> *1. Describir el flujo de los procesos realizados con los RCD.*
> *2. Diseñar y ejecutar las obras de drenaje y de control de sedimentos.*

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

3. Contar con instrumentos de pesaje debidamente calibrados de acuerdo con la normatividad vigente.

4. Establecer barreras para evitar el impacto visual en los alrededores de la planta, cuando a ello hubiere lugar.

5. Realizar acciones para evitar la dispersión de partículas.
6. Mantener los RCD debidamente separados de acuerdo con el tipo de RCD de que trata el Anexo I.

***Parágrafo 1°.** El gestor deberá remitir copia del documento de que trata el presente artículo a la autoridad ambiental competente, dentro de los 30 días calendario siguientes al inicio de actividades de los puntos limpios y plantas de aprovechamiento, para efectos de su seguimiento y control. A dicho documento se le anexarán copia de los permisos, licencias y demás autorizaciones ambientales a que haya lugar, así como copia de la certificación sobre la compatibilidad del proyecto con los usos del suelo establecidos en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT), o Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) (...)"*

Subrayado fuera de texto.

3.2 Ubicación del Predio y Descripción de la Actividad

La Planta de Tratamiento y Aprovechamiento de RCD de **CEMEX COLOMBIA S.A.S,** se ubicará sobre un área de 250 m², adyacente a la planta de mortero y polígono aprobado bajo el Plan de Manejo de Recuperación y Restauración Ambiental con Registro Minero de Cantera - RMC 056, sobre predio de la **carrera 17 No. 71 - 10 sur,** con **CHIP catastral AAA0143SWSK**, del barrio **Mochuelo Oriental,** de la UPZ-63 El Mochuelo y UPZ-56 Danubio de la localidad de **Ciudad Bolívar.**

A continuación, se relacionan las coordenadas del polígono donde se ubicará la Planta de Tratamiento y Aprovechamiento "*Cemex Colombia S.A.*".


Tabla No. 4 Coordenadas polígono de la Planta de Tratamiento y Aprovechamiento de RCD

PUNTO	LATITUD	LONGITUD
1	4,548129°	-74,136290°
2	4,548464°	-74,136220°
3	4,548139°	-74,136159°

Fuente. Radicado SDA No.* 2022ER332493 *– Cemex Colombia S.A., 2022.

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

***Mapa No. 1 – Localización de la Planta de Tratamiento y Aprovechamiento de RCD* a cargo de Cemex Colombia S.A.**

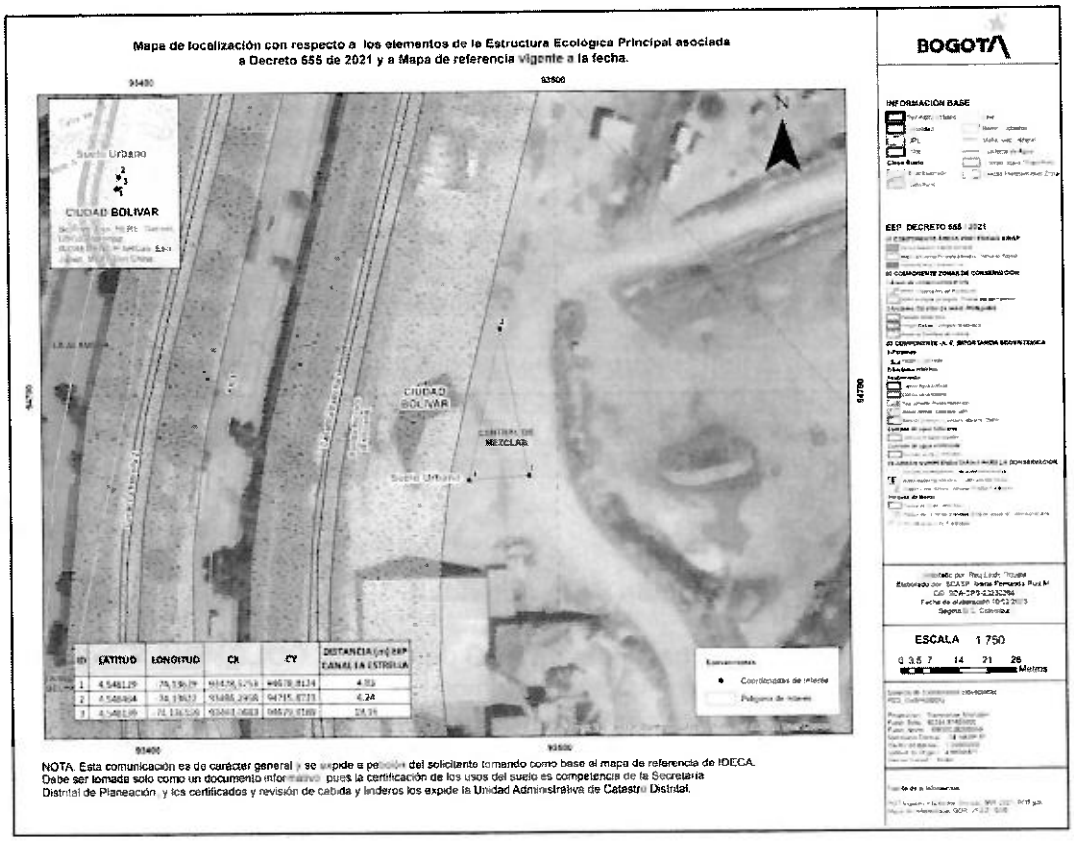

Fuente. Sistema de Información Geográfico – SDA, SCASP, 2023.

4. SITUACIÓN ENCONTRADA

A partir de la visita realizada al polígono del predio ubicado en la **carrera 17 No. 71 - 10 sur,** con **CHIP catastral AAA0143SWSK,** donde operara la Planta de Tratamiento y Aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición - RCD, por parte de la empresa **CEMEX COLOMBIA S.A.;** se verificó que esta ejecutara actividades de tratamiento de RCD de origen pétreo susceptibles de aprovechamiento que no estén mezclados con otros tipos de residuos como

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

ordinarios, líquidos y/o peligrosos, de acuerdo con los lineamientos normativos establecido en la Resolución 01115 de 2012, Decreto 586 de 2015 y Resolución 472 de 2017, esta última modificada y adicionada por la Resolución 1257 de 2021.

Es importante precisar que sobre el predio donde se localizará la Planta de Tratamiento y Aprovechamiento de RCD, actualmente Cemex Colombia S.A., realiza la disposición final de residuos de construcción y demolición como parte del Proyecto de Reconformación Morfológica sujeta a los permisos otorgados por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, mediante la **Resolución 1480 de 2014** para Cemex Tunjuelo, Resolución 1560 de 2006 para Cemex La Fiscala; y por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente bajo la aprobación del Plan de Manejo, Restauración y Recuperación Ambiental PMRRA a través del radicado SDA No. 2017EE111539 y Resolución SDA No.1280 de 2017 para Cemex Central de Mezclas, asociados al Registro Minero de Cantera - RMC 056.

De igual manera, a continuación, se describen cada uno de los aspectos que se evaluaron para la operación de la Planta de Tratamiento y Aprovechamiento de RCD, para la empresa CEMEX COLOMBIA S.A.

- **USOS DEL SUELO Y CAPACIDAD INSTALADA**

Con relación con los usos del suelo permitidos, es importante resaltar que el predio en el que se ubicara la Planta de Tratamiento y Aprovechamiento de RCD, no presenta restricción ni se encuentra condicionada, para las actividades de transformación y aprovechamiento de RCD pétreos, dando alcance a lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento Territorial – POT, reglamentado por el POT "*Bogotá Reverdece 2022- 2035*" reglamentado bajo el Decreto 555 de 2021 "*Por el cual se adopta la revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C.*", en el cual se indica lo siguiente:

> *"(...)* ***Artículo 204. Plantas de tratamiento y aprovechamiento de RCD.*** *Son instalaciones donde se realizan actividades de separación, almacenamiento temporal, reutilización, tratamiento y reincorporación de RCD. De acuerdo con la permanencia de sus instalaciones, se clasifican en:*
>
> ***1. Plantas de tratamiento y aprovechamiento fijas.*** *Instalaciones que operan de manera permanente en un predio determinado, incluye edificaciones, maquinaria y equipo. Les son aplicables las condiciones del uso industrial y su localización se permiten en suelo de protección por servicios públicos, predios afectados por minería y en área de actividad grandes servicios metropolitanos.*

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

2. *Plantas de tratamiento y aprovechamiento móviles.* *Instalaciones transitorias acondicionadas en el sitio de generación, incluye maquinaria y equipo, y están asociadas a los procesos de construcción de edificaciones y obras civiles. Se pueden ubicar donde se genere el residuo siempre que sea de manera temporal.*

Se pueden ubicar donde se genere el residuo o en sitios cercanos como reservas viales no construidas total o parcialmente, planes parciales no desarrollados; predios mineros; siempre que sea de manera temporal o transitoria; previa expedición de lineamientos por parte de la autoridad ambiental.

Parágrafo. *El producto terminado del tratamiento de los RCD puede ser aprovechado en proyectos viales y de espacio público y en general en cualquier infraestructura pública o privada, así como en suelos con amenaza media o alta y en la recuperación geomorfológica de predios. El almacenamiento temporal o permanente de RCD queda prohibido en las áreas de la estructura ecológica principal y en el espacio público (...)"*

Subrayado fuera de texto.

No obstante, teniendo en consideración que el predio de la **carrera 17 No. 71 - 10 sur** se localiza parcialmente sobre elemento de la estructura ecológica principal correspondiente a la categoría de "*sistema hídrico*" de los canales Boyacá Sector II y la Estrella I; el cual de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 60° del Decreto 555 de 2021, se define como:

*"(...) **Artículo 60. Sistema hídrico.** El sistema hídrico del Distrito Capital es una categoría del componente de áreas de especial importancia ecosistémica de la Estructura Ecológica Principal, el cual está compuesto por los cuerpos y corrientes hídricas naturales y artificiales y sus áreas de ronda, los cuales son:*

1. *Nacimientos de agua y sus rondas hídricas.*
2. *Ríos y quebradas y sus rondas hídricas.*
3. *Lagos y lagunas.*
4. *Humedales y sus rondas hídricas.*
5. *Áreas de recarga de acuíferos.*
6. *Cuerpos hídricos naturales canalizados y sus rondas hídricas.*
7. *Canales artificiales.*
8. *Embalses (...)"*

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

Ilustración No. 2 Georreferenciación del predio de la carrera 17 No. 71 - 10 sur – Planta de Aprovechamiento de RCD - CEMEX



Fuente. Visor Geográfico Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente 2022.

Ilustración No. 3. Reporte de elementos de estructura ecológica principal – Decreto 555 de 2021

Decreto 555 de 2021[1]:

Sistema Hídrico[2]

CATEGORÍA	NOMBRE	ÁREA AFECTADA
Sistema Hídrico	Canal Boyacá Sector II	Parcial
Sistema Hídrico	Canal La Estrella 1	Parcial

Fuente. Visor Geográfico Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente 2022.

Cabe resaltar que las actividades de Planta de Tratamiento y Aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición – RCD, están totalmente prohibidas sobre las zonas que

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

contemplan elementos de la estructura ecológica principal, en razón por la cual, dichas zonas no se podrá localizar maquinaria y acopios temporal de RCD y/o producto terminado (agregados, base y sub bases recicladas).

Por otra parte, resulta importante mencionar que las actividades de Planta de Tratamiento y Aprovechamiento de RCD por parte de **Cemex Colombia S.A.** contará con una capacidad instalada para la producción de 150 Ton/hora, se espera recibir aproximadamente 20.000 – 30.000 m³ de RCD al mes, con los cuales se esperan obtener 20.000 m³ de agregado reciclado como lo son agregados finos, medios, gruesos, bases, sub-bases y arena de trituración, los cuales serán direccionados para su reincorporación en obras de ingeniería del sector público y privado.

Ilustración No. 4. Producción proyectada.

Material	Producción	
	Ton/mes*	Ton/día**
Base granular	7781.01	353.68
Sub base granular	7781.01	353.68
Arena de trituración	7781.01	353.68
Grava Gruesa 1"	3112.40	141.47
Grava Media 1/2"	4668.60	212.21
Afirmado	3112.40	141.47
Total	**31124.03**	**1414.73**

Fuente. Radicado SDA No. 2022ER169546 – Cemex Colombia S.A.

- **DEFINICIÓN DE ÁREAS PROYECTADAS PARA LA ACTIVIDAD DE PLANTA DE TRATAMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE RCD**

Área de almacenamiento de materia prima y producto terminado; ***"(...) El almacenamiento de la materia prima es decir el RCD susceptible de aprovechamiento, será seleccionado y almacenado en el RMC 056, el cual cuenta en su PMRRA con la autorización para dicha actividad (...)***

Teniendo en consideración que la Planta de Tratamiento y Aprovechamiento de RCD "*Cemex Colombia S.A..*", se localizará sobre el área autorizada por la Secretaría Distrital de Ambiente para la ejecución del PMRRA de Central de Mezclas, Cemex Colombia S.A. empleará las áreas de soporte que actualmente se encuentran activas al interior del predio para las

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

actividades de reconformación morfológica aprobadas mediante la **Resolución SDA No.1280 de 2017.**

- ✓ **Vías internas:** Actualmente, el área del proyecto cuenta con vías internas que empleadas para el tránsito de vehículos desde el ingreso (portería 1 y 2) hasta los frentes de la Planta de mortero seco, y áreas de reconformación morfológica. Vale la pena resaltar que las vías de acceso a los frentes de reconformación son temporales, por lo tanto, estas pueden ser modificadas en ubicación, dimensiones y materiales de conformación.

- ✓ **Área de almacenamiento y mantenimiento de equipos**

  Dentro de la infraestructura existente y empleada para las actividades de reconformación morfológica del predio, y que sirve como complemento a las actividades de retro llenado que se ejecutan actualmente y que ha hecho parte de las actividades de explotación minera y posteriormente de las actividades de cierre y abandono se tiene:

- ✓ Unidades de limpieza y lavado de llantas – "*Quiebra patas*" y batea
- ✓ Hangar de mantenimiento de maquinaria y Equipo
- ✓ Puntos de acopio temporal de residuos separados y señalizados según su tipología.

➢ DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.

Con base en la información presentada mediante radicados SDA No. **2022ER169546** y **2022ER230186,** a continuación, se describen las actividades a desarrollar como Planta de Tratamiento y Aprovechamiento de residuos de construcción y demolición - RCD:

1. **Preclasificación de RCD al ingreso de manera visual:** verificación visual de los diferentes tipos residuos de construcción y demolición, teniendo en cuenta si son aptos para su transformación y pasarán a ser procesados en la planta de aprovechamiento, en caso de no ser aptos, estos se utilizarán para el retro llenado del PIT de explotación sobre el PMMRA del Registro Minero de Cantera 056.

   En visita del 29 de agosto de 2022, se evidenció la localización de dos puntos de control e inspección del material que ingresa al predio, en el cual, se sitúa un operario que revisan el contenido interno del volcó del vehículo, dicho operador revisa y verifica desde la parte alta de la volqueta si el material que se ingresa al sitio es el permitido.

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

2. **Recepción de RCD - Registro, pesaje y verificación del material:** Una vez lleguen los RCD a la planta de aprovechamiento, se procede a realizar el pesaje del material, así como una inspección del tipo y calidad de escombro que llega, esto con el fin de asegurar que el material efectivamente se puede tratar en la planta, para lo cual deben estar limpios, debidamente separados por tipo de material, y no es estar contaminados con residuos peligrosos o metales pesados. Un operario de la planta será el encargado de revisar el contenido de todos los vehículos que entren en la instalación e indicará el lugar de descarga en función de sus características.





Fotografías No. 1 y 2. Puntos de inspección y bascula. Cemex Colombia S.A. Fuente. Visita Técnica del 29 de agosto de 2022 – SCASP, RCD.

3. **Descargue y almacenamiento temporal RCD:** Proceso mediante el cual se realiza la separación de materiales que contaminan el material objeto de aprovechamiento y se clasifica de acuerdo a su tipología. Los diferentes materiales obtenidos serán llevados a la planta de tratamiento en donde mediante diferentes procesos de trituración, cribado, separación magnética y clasificación se obtendrá el material a reutilizar (áridos o Eco-áridos), los cuales son parte fundamental en la construcción de bases y sub-bases para vías y en la industria de la construcción.

4. **Selección previa o desbrozado:** Consiste en la separación de los materiales voluminosos y tipologías de materiales, del pétreo que se van a tratar en la planta.

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

Esta operación se puede realizar manualmente o combinado con medios mecánicos (retroexcavadora con pinzas). El material que ingresa se separa y clasifica en fracciones reutilizables, y/o reciclables, y finalmente una fracción de materiales no reciclables que se destina para el relleno de la escombrera.

5. Actividades proceso de tratamiento.

a. Alimentación: Proceso consistente en la descarga de los residuos aprovechables obtenidos en la fase de selección, sobre la tolva de alimentación de la planta, con rejilla superior y una cinta transportadora con banda de goma.

***b.* Descripción de proceso de trituración de RCD:** El sistema de trituración planteado es en seco, pues los materiales a triturar provienen de procesos de demolición de productos ya empleados en la construcción, por lo tanto; estos ya garantizan las propiedades de limpieza en arcillas requeridas en los productos finales.

i. Trituración primaria: se realizará con un equipo de mandíbula, el cual reducirá el material de 20" a 4" mediante proceso de pre cribado y cribado.

***ii.* Trituración secundaria:** Mediante zaranda para la obtención de grava de 1" y de ½" y arena de trituración.

"(...) El proceso de trituración se ejecuta en los siguientes pasos:

- ✓ ***Paso 1:*** *Acopio de material RCD, limpieza manual de contaminantes como: madera, plásticos, vidrios, acero, etc.*


- ✓ ***Paso 2:*** *Se alimenta con la retroexcavadora Liebherr R916 la trituradora primaria RM80 (mandíbula), la cual seleccionará mediante el precribado Grizzli el producto (afirmado) y mediante la criba OS80 retorna el sobre tamaño por el componente RFB80 y entrega los materiales base granular y sub base granular. El resto del material se entrega a la trituradora secundaria impactor CS3600.*

- ✓ ***Paso 3:*** *La trituradora CS3600 reduce de 4" a 1" y entrega a la zaranda de productos finales: grava de 1", grava de 1/2" y arena de trituración.*

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

- ✓ ***Paso 4:*** *Con el cargador Liebherr L538 se acopia el producto terminado o se despacha (…)*

Ilustración No. 5. Diagrama del proceso de trituración – Línea productiva Cemex Colombia S.A. – Planta de Tratamiento y Aprovechamiento de RCD

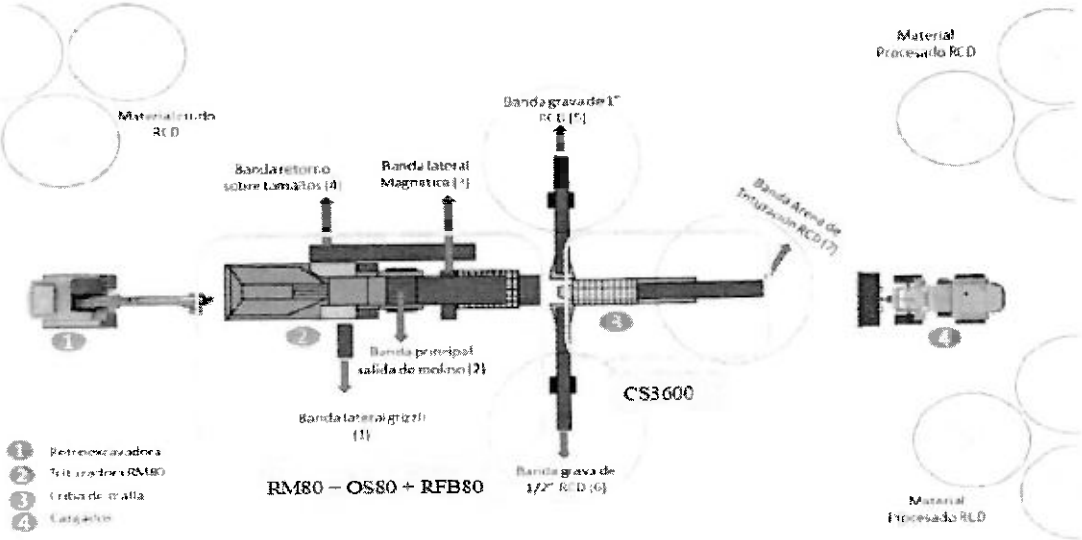


Fuente. Radicado SDA No. 2022ER169546 – Cemex Colombia S.A.

c. **Acopio de materiales:** Los áridos obtenidos en el proceso de reciclaje se acopiarán en diferentes pilas en función de su granulometría y grado de limpieza. Cabe mencionar que en alcance a lo dispuesto en el Artículo 204° del Decreto 555 de 2021, no se podrán acopiar maquinaria y equipo, RCD y/o producto terminado sobre áreas que contemplen elementos de la estructura ecológica principal.

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

Ilustración No. 6. Diagrama proceso del tratamiento y aprovechamiento de RCD – Cemex Colombia S.A.

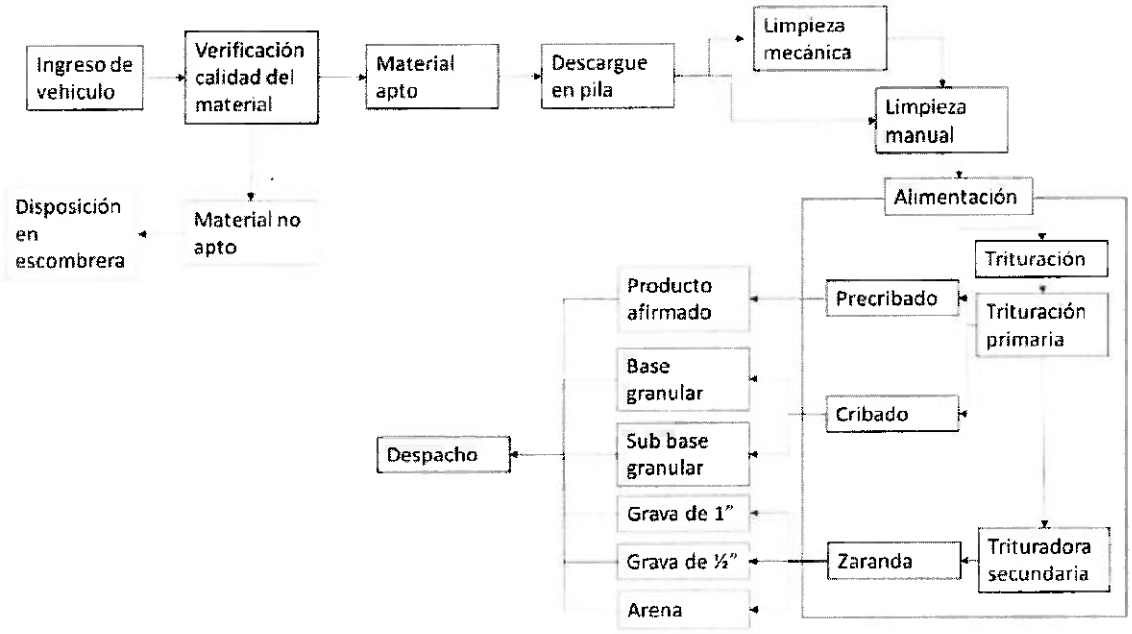

Fuente. Radicado SDA No. 2022ER169546 – Cemex Colombia S.A.

➢ MAQUINARIA Y EQUIPO

Para el desarrollo del proceso de tratamiento y aprovechamiento de residuos pétreos, CEMEX COLOMBIA S.A. empleará maquinaria fija y móvil, siendo esta última movilizada y empleada únicamente al interior del polígono del donde se localizará la planta:

- ✓ **Zaranda:** *de alta frecuencia de capacidad minina de 150TN/h, capaz de cribar materiales provenientes de RCD.*

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

Ilustración No. 7. Zaranda de alta frecuencia. Planta de Tratamiento y Aprovechamiento de RCD – Cemex Colombia S.A.S.



Zaranda de alta frecuencia	
Capacidad Mínima	150TN/H
Años superiores al	2010
Cantidad de líneas de producto	3

Fuente. Radicado SDA No. 2022ER169546 – Cemex Colombia S.A.

- ✓ **Trituradora Portátil:** Equipo que por medio de impactos o golpes realizará la trituración de los RCD de origen pétreo, con el fin de reducir el tamaño de estos y obtener diferentes granulometrías de materiales. "(…) *Para agregados reciclado de capacidad mínima de 150TN/h, equipo impacto, tamaño de alimentación mínimo de 600mm, preferiblemente con separador magnético (…)*

Ilustración No. 8. Trituradora Portátil.



Trituradora	
Capacidad Mínima	150TN/H
Tamaño mínimo de alimentación	600mm
Años superiores al	2010
Tipo de trituración	Impactor

Fuente. Radicado SDA No. 2022ER169546 – Cemex Colombia S.A.

- ✓ **Criba:** *Para corte de material en al menos 3 productos de tamaño diferentes, que se pueden cambiar los tendidos de mallas para ajustar el producto a las necesidades.*

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá. D.C. Colombia

Ilustración No.9. Zaranda de producto terminado.



Zaranda de producto terminado	
Capacidad Mínima	150TN/H
Años superiores al	2010
Cantidad de líneas de producto	3

Fuente. Radicado SDA No. 2022ER169546 – Cemex Colombia S.A.

- ✓ **Retroexcavadora:** *Para la alimentación de la línea de producción se requiere una retroexcavadora de una potencia mínima de 150HP, con un balde mínimo de 1m3.*

Ilustración No. 10. Zaranda de producto terminado.



Retroexcavadora	
Potencia mínima requerida	150 HP
Capacidad del balde mínima	1m3
Años superiores al	2010

Fuente. Radicado SDA No. 2022ER169546 – Cemex Colombia S.A.

- ✓ ***Cargador frontal:*** *Al final de la línea de producción se requiere un cargador para acomodar y desalojar el producto terminado. Este equipo debe tener una potencia minina de 130 HP, que su balde tenga mínimo 2,5m3.*

- ✓ Vehículos para el transporte de material - Volquetas
- ✓ Vehículos para el riego de vías

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

- ✓ **Bascula tipo camionera:** El proyecto cuenta con una báscula para el pesaje de los RCD que ingresan al proyecto y del material procesado que sale, dando cumplimiento a los lineamientos normativos definidos en la resolución 472 de 2017, modificada por la Resolución 1257 de 2021 del ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible:

  "(...) ***Artículo 9°. Aprovechamiento.*** *El aprovechamiento de RCD se realizará en plantas de aprovechamiento fijas o móviles o a través de un receptor.*

  Las plantas fijas o móviles deberán contar mínimo con las siguientes áreas de operación:

  1. Recepción y pesaje.
  2. Separación y almacenamiento por tipo de RCD aprovechables.
  3. Aprovechamiento.
  4. Almacenamiento de materiales procesados (...)

  (...) ***Artículo 10. Medidas mínimas de manejo ambiental en puntos limpios y en plantas de aprovechamiento.*** *Los gestores de los puntos limpios y plantas de aprovechamiento, deberán elaborar un documento que contenga las siguientes medidas mínimas de manejo:*

  1. Describir el flujo de los procesos realizados con los RCD.
  2. Diseñar y ejecutar las obras de drenaje y de control de sedimentos.
  3. Contar con instrumentos de pesaje debidamente calibrados de acuerdo con la normatividad vigente (...)"

  Subrayado fuera de texto.

- ➢ **CARACTERISTICAS DEL MATERIAL A TRITURAR**

De conformidad con la información remitida a la SDA mediante radicados SDA No. **2022ER169546** y **2022ER230186,** CEMEX COLOMBIA S.A., recibirá residuos de construcción y demolición pétreos producto de demolición de estructuras verticales o elementos viales (Concreto, productos de concreto, mortero y unidades de albañilería de concreto, agregados no tratados, piedra natural, áridos tratados con cementantes hidráulicos, unidades de albañilería de arcilla, ladrillos, tejas y asfalto).

Con relación a lo anterior, el tamaño máximo del material a triturar será de 60 cm en la alimentación de la trituradora, para lo cual, se precisa que la Planta de Tratamiento y Aprovechamiento no podrá recibir residuos de Drywall o RCD contaminados con residuos

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

sólidos ordinarios, líquidos o residuos peligrosos, tampoco se recibirán residuos de cimentaciones y pilotajes como Arcillas, bentonitas y demás.

- **CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS FINALES**

De conformidad con el proceso de transformación y aprovechamiento que **CEMEX COLOMBIA S.A.** realizará a residuos de construcción de origen pétreo, se obtendrán como productos finales: Base granular, Subbase granular, agregados pétreos para concreto, afirmados descritos en la norma IDU Resolución 0109 10 de 2019 o cualquiera que la modifique.

Ahora bien, con la información remitida mediante radicados SDA No. **2022ER169546, 2022ER230186** y **2022ER332493** y con el *Acta de Visita Técnica Evaluación del Manejo Ambiental para Centros de Tratamiento y Aprovechamiento – CTA en Bogotá D.C.*, se realizó la evaluación de los aspectos enumerados a continuación. Sin embargo, no se pudo evidenciar en campo, los impactos ambientales que el centro de tratamiento y aprovechamiento de RCD "*Cemex Colombia S.A.*" puede generar al ambiente, dado a que, en el momento de la visita, se estaban realizando actividades de adecuación del polígono para instalación de infraestructura temporal y puesta en marcha de la planta. Así las cosas, el presente informe técnico se hace de acuerdo a lo expuesto en los radicados anteriormente referenciados.

4.1 RESIDUOS SÓLIDOS Y PELIGROSOS

Las actividades que se desarrollarán en el proceso de tratamiento y aprovechamiento de RCD, generarán residuos sólidos ordinarios básicamente de las actividades administrativas y residuos sólidos domésticos del campamento de la Planta de Tratamiento y Aprovechamiento de RCD, los cuales serán tratados de conformidad con el Programa de Manejo de Residuos definido por CEMEX COLOMBIA S.A.

Para el caso de los residuos sólidos no aprovechables, estos serán entregados al prestador de servicio de aseo para su disposición en el Relleno Sanitario Doña Juana, no obstante, serán previamente almacenados en un espacio definido, debidamente señalizado y demarcado, y los residuos aprovechables se manejarán por empresas o fundaciones que puedan reciclar este tipo de materiales.

Ahora bien, teniendo en consideración que para las actividades de trituración se hace uso de maquinaria que requiere actividades de mantenimiento, resultante de las misma se producen residuos peligrosos compuestos principalmente por aceites, filtros y partes contaminadas. No

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

obstante, debido al alto nivel de contaminación que representa el aceite usado y la imposibilidad de tratar insitu los residuos, CEMEX COLOMBIA S.A. transportara este tipo de residuos a sitios especializados en su tratamiento definitivo.

El proceso para la disposición final del aceite, filtros y solidos contaminados será el siguiente:

1. ***ALMACENAMIENTO TEMPORAL:*** *Los residuos peligrosos serán acopiados en el sitio de disposición de RESPEL ubicado en otra área operada por CEMEX COLOMBIA en un predio, colindante con el área del proyecto. Dicho sitio de disposiciones se encuentra debidamente señalizado y cuenta con cerramiento, cubierta, piso impermeable, ventilación y extintor, lo cual permitirá un adecuado almacenamiento temporal.*

2. ***DISPOSICIÓN FINAL:*** *La disposición final se hará a través de una empresa autorizada la cual se encargará de la recolección de estos en el área de almacenamiento temporal y de su adecuada disposición final.*

Por lo anterior, durante la visita se observaron puntos de acopio para el almacenamiento temporal para cada uno de los tipos de residuos (No peligrosos y peligrosos), los cuales se encuentran separados, señalizados y cubiertos. Adicionalmente, las canecas donde se acopian los residuos peligrosos están respectivamente rotuladas.



Fotografía No. 3. *Punto de acopio temporal de residuos aprovechables. Cemex Colombia S.A.* ***Fuente.*** *Visita Técnica del 29 de agosto de 2022 – SCASP, RCD.*



Fotografía No. 4. *Punto de acopio temporal de residuos peligrosos. Cemex Colombia S.A.* ***Fuente.*** *Radicado SDA No. 2022ER169546 – Cemex Colombia S.A.*

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

4.2 RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Durante el proceso de transformación y aprovechamiento de RCD por parte de CEMEX COLOMBIA S.A.S., se generarán residuos provenientes de las actividades de selección y rechazos de RCD, obteniendo principalmente 4 tipos de residuos:

- ✓ Residuos especiales
- ✓ Residuos potencialmente aprovechables
- ✓ Metales
- ✓ Residuos de construcción y demolición no aprovechables

En consideración con lo anterior, en aras de garantizar una adecuada gestión de los RCD, CEMEX COLOMBIA S.A. plantea las siguientes medidas de manejo ambiental:



- ❖ El material que ingrese a la Planta de Aprovechamiento se separará y clasificará en fracciones reutilizables, y/o reciclables, y finalmente una fracción de materiales no reciclables que se destina para el relleno de la escombrera cercana al área de clasificación de RCD dentro del PMRRA del Registro Minero de Cantera – RMC 056.

- ❖ Los residuos especiales serán acopiados temporalmente en una zona delimitada y señalizada con capacidad de almacenamiento aproximado a 20 toneladas de residuos, y serán entregados al prestador del servicio de aseo para su disposición final.

- ❖ Los residuos de construcción y demolición no aprovechables serán acopiados en una zona delimitada y señalizada hasta contar con el material suficiente para ser transportados y dispuestos en el PIT de explotación que se encuentra en proceso de reconformación morfológica de Cemex Tunjuelo, La Fiscala y/o Central de Mezclas.

- ❖ En relación con los metales clasificados y almacenados en la planta de separación, serán entregados a siderúrgicas o gestores de aprovechamiento de dicho material. La entrega del material se realizará conforme a la capacidad de almacenamiento de la planta.

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

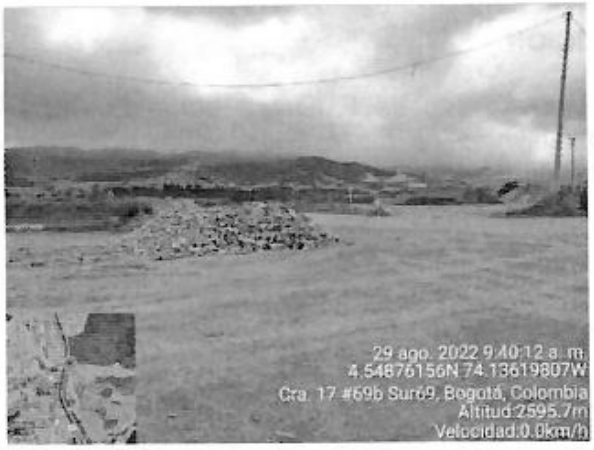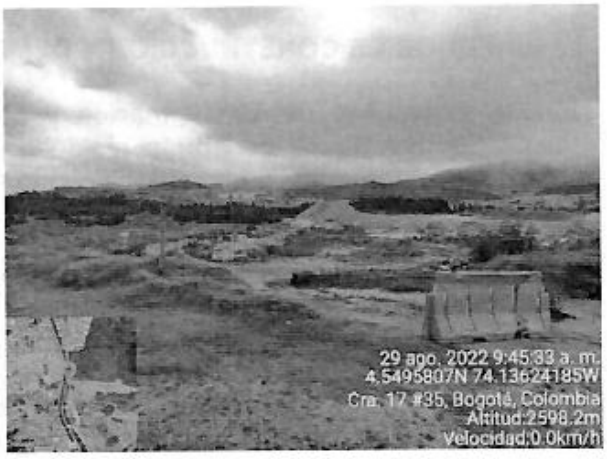	
Fotografía No. 5. *Área donde se ubicará la Planta de Tratamiento y Aprovechamiento Cemex* ***Fuente****. Visita Técnica del 29 de agosto de 2022 – SCASP, RCD.*	***Fotografía No. 6.*** *Áreas de reconformación RMC 056.* ***Fuente.*** *Radicado SDA No. 2022ER169546 – Cemex Colombia S.A.*

4.3 AIRE

Las actividades de recepción, almacenamiento temporal, transformación y aprovechamiento de RCD, generan gran cantidad de material particulado al ambiente, adicional a ello, la generación de gases y humos en la Planta de Tratamiento y Aprovechamiento, generado principalmente en las labores de recepción, trituración, cargue y transporte interno.


En consideración con lo anterior, CEMEX COLOMBIA S.A.S plantea las siguientes medidas de manejo ambiental para el control y prevenir la contaminación del aire por gases, humos y dispersión de material particulado:

> *"(…) La planta utilizará sistemas de aspersión para mitigar la emisión de material particulado que se podría generar durante el proceso de trituración de RCD. Estos sistemas de aspersión se ubicarían específicamente en los equipos de trituración que componen la planta móvil, es decir la trituradora y la criba.*
>
> *Para ello se requerirá de la instalación de un tanque de agua de mínimo 2000 Litros, tubería para direccionar el agua almacenada y boquillas que permitan la aspersión del agua en forma de nebulización.*

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

Con la instalación de los 8 puntos de nebulización que permiten rociar agua sobre los materiales a granel, con el fin de evitar la formación de polvo durante los procesos intrínsecos de la trituración, se estima una eficiencia entre el 80% y el 98% en la reducción de emisiones de material particulado

Ilustración No. 11. Sistema de nebulización localizada para control de material particulado. Cemex Colombia S.A.

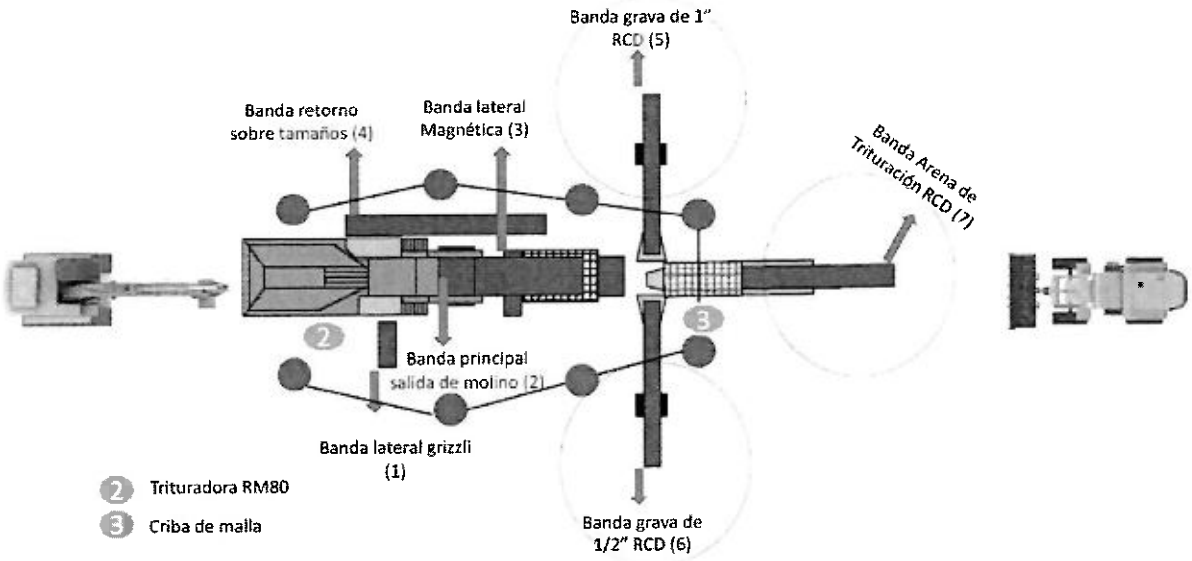

Fuente. Radicado SDA No. 2022ER169546 – Cemex Colombia S.A.

Por otra parte, durante la visita realizada polígono del predio, CEMEX COLOMBIA S.A., manifiesta que para la operación de la Planta de Tratamiento y Aprovechamiento de RCD, se hará uso de las vías existentes en el sitio de disposición final de su propiedad, para lo cual, se realizará la humectación de las vías de acceso mediante carro tanque, limpieza y barrido en húmedo de la vía de acceso al predio, así como retiro de material de arrastre producto de la salida de las volquetas; con el fin de evitar la dispersión del material particulado durante el proceso de barrido y de retirar todo el material de arrastre que pueda quedar en la vía.

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

Es importante precisar que, la empresa deberá tener en cuenta que las actividades de acopio y transformación de RCD deben realizarse teniendo en cuenta las medidas de manejo ambiental que minimicen los impactos negativos producidos al ambiente por el desarrollo de las actividades. Razón por la cual, esta entidad solicita a CEMEX COLOMBIA S.A., evaluar la aplicabilidad del permiso de emisiones de fuentes fijas y móviles con la Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual - SCAAV de la Secretaría Distrital de Ambiente de conformidad con la normatividad legal ambiental aplicable.

4.4 RUIDO

La maquinaria utilizada en el proceso de tratamiento y aprovechamiento de RCD móvil y fija, posiblemente generen ruido, sin embargo, se debe garantizar que estos no excedan los estándares máximos de ruido establecidos en la ***Resolución 0627 De 2006*** *"por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental".* Adicionalmente, se recuerda que, si se va a trabajar en horarios fuera de los permitidos por el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y la Alcaldía Local, se deberá contar con el permiso emitido por la autoridad competente las cuales son las Alcaldías Locales. Durante la visita, se observó señalización donde se informa que está prohibido pitar dentro del sitio de disposición final.

4.5 VERTIMIENTOS – RECURSO HÍDRICO

Dado a que la Planta de Tratamiento y/o aprovechamiento se ubicará en el predio sobre el cual se sitúa el Registro Minero de Cantera – RMC 056 donde actualmente operan los Sitio de Disposición Final de Cemex Tunjuelo, La Fiscala y Central de Mezclas, este hará uso de las instalaciones para el manejo del recurso hídrico para la actividad de Planta de Tratamiento y Aprovechamiento. Por lo anterior, actualmente, sobre el predio existen varios canales antrópicos y canales naturales cuya funcionalidad se basa en recolectar y conducir el agua lluvia como es el caso del Canal Trompeta. Durante la visita no se evidenciaron sólidos o sedimentos que obstruyeran el flujo natural del agua. Por otro lado, dentro de los canales perimetrales presentes en el fondo de la mina tampoco se observaron sedimentos o sólidos que obstruyeran el flujo interno de las aguas lluvias.

De igual manera, en el sitio se ejecutan actividades encaminadas a mitigar las afectaciones causadas sobre la Avenida Boyacá a la salida de los Sitios de Disposición Final por el material de arrastre adherido a las llantas de los vehículos, consistentes en:

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

1. Se fomenta la reutilización de agua para las actividades de lavado de llantas y barrido en húmedo en la vía. Incluso, en la entrada vehicular se evidenció el sistema de lavado de llantas, el cual consta de un sedimentador y un sistema de recirculación de aguas gracias al cárcamo instalado, un tanque y el sistema de salto hidráulico.

2. Actividades de limpieza y barrido de la entrada y salida de los SDF la cual es ejecutada por dos o tres operarios, aumentando la frecuencia de la actividad según las condiciones climatológicas.

3. Empleo de los equipos según los compromisos adquiridos, como: conos, Minicargador, cepillos, palas etc. de acuerdo con el Plan de Manejo de Tránsito -PMT autorizado por la Secretaría Distrital de Movilidad.

4. Uso del camión cisterna para efectuar las actividades de humectación de las vías internas y externas cuando se requiera, calculando la cantidad de agua en aspersión para evitar la formación de lodos que puedan generar incidentes sobre la Avenida Boyacá.

Ahora bien, para el manejo del agua de escorrentía asociado al área de la Planta de Tratamiento y Aprovechamiento, esta será articulada con la totalidad del predio que se conecta con la zona de reconformación morfológica de Cemex Tunjuelo. En este sentido Cemex Colombia S.A. manejará pendientes internas que permitan el flujo de las aguas lluvias hacia las líneas de flujo actuales del proyecto de disposición de RCDs. Flujo que acumula las aguas lluvias en puntos bajos donde se permite la sedimentación de las aguas.

Para la ejecución de actividades de transformación y aprovechamiento de RCD, Cemex Colombia S.A. no requerirá de la captación de aguas superficiales o subterráneas, debido a que reutilizarán el agua lluvia para los procesos productivos. En cuanto al agua para el consumo humano será adquirida en botellones a distribuidores autorizados.

4.6 PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL

Durante la visita realizada al predio de Cemex Colombia S.A., se observó valla informativa del Proyecto de Reconformación Morfológica en donde se muestra el acto administrativo que aprueba dicha actividad, los tipos de Residuos de Construcción y Demolición – RCD que se reciben, los números de contacto y los servicios que ofrecen. Dicha valla se puede observar desde la parte externa del predio.

En cuanto al trámite de solicitud de registro único de elementos de publicidad exterior visual, Cemex Colombia S.A. registra solicitud de elemento publicitario mediante el Radicado SDA No.

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

2019ER87639 del 23 de abril de 2019, el cual fue atendido por la Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual bajo registro SCAAV -00934 con radicado SDA No. **2020EE120414.**



Fotografía No. 7. *Valla publicitaria para las actividades de reconformación morfológica – Cemex Colombia S.A.* ***Fuente.*** *Visita técnica del 29 de agosto de 2022 – SCASP, RCD.*

4.7 ASPECTO DEL RECURSO FLORA – ÁRBOLES PATRIMONIALES

Es importante precisar que sobre el predio donde se localizará la Planta de Tratamiento y Aprovechamiento de RCD, actualmente Cemex Colombia S.A., realiza la disposición final de residuos de construcción y demolición como parte del Proyecto de Reconformación Morfológica sujeta a los permisos otorgados por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, mediante la **Resolución 1480 de 2014** para Cemex Tunjuelo, Resolución 1560 de 2006 para Cemex La Fiscala; y por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente la aprobación del Plan de Manejo, Restauración y Recuperación Ambiental PMRRA a través del radicado SDA No. **2017EE111539** y Resolución SDA No. 1280 de 2017 para Cemex Central de Mezclas, asociados al Registro Minero de Cantera - RMC 056.

Por lo anterior, los individuos arbóreos presentes sobre el predio se ubican en la parte superior y posterior del mismo, demarcada como vivero y colindante con el *"Meandro Carrillo"*. En dicha área se encuentran sembrados varias especies de individuos arbóreos y la instalación de varias casas pequeñas para las aves que allí habitan.

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

Ahora bien, sobre el área influencia del polígono del predio donde operará la Planta de Tratamiento y Aprovechamiento de RCD, no se observaron individuos arbóreos que puedan ser afectados por el desarrollo de las actividades de recepción, acopio temporal, transformación y aprovechamiento de RCD. De igual manera, durante la visita se evidenció ejecución de actividades de adecuación de terreno, sin remoción de cobertura vegetal ni afectación al recurso flora, ni arboles patrimoniales.

No obstante, teniendo en cuenta que el polígono colinda con elementos de la estructura ecológica principal correspondiente a la categoría de "*sistema hídrico*" de los canales Boyacá Sector II y la Estrella I, es importante mencionar que el desarrollo de Planta de Tratamiento y Aprovechamiento de RCD o acopio temporal y permanente de residuos y/o material esta totalmente prohibido sobre dichas áreas. Lo anterior, en alcance a lo dispuesto en el parágrafo del Artículo 204° del Decreto 555 de 2021, el cual preceptúa:

> "(...) ***Parágrafo.*** *El producto terminado del tratamiento de los RCD puede ser aprovechado en proyectos viales y de espacio público y en general en cualquier infraestructura pública o privada, así como en suelos con amenaza media o alta y en la recuperación geomorfológica de predios. El almacenamiento temporal o permanente de RCD queda prohibido en las áreas de la estructura ecológica principal y en el espacio público (...)"*
>
> *Subrayado fuera de texto.*

5. CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, soportado con el *Acta de Visita Técnica Evaluación del Manejo Ambiental para Centros de Tratamiento y Aprovechamiento de RCD, en Bogotá D.C.*, con la información que entregó el solicitante al momento de la visita y complementada con la información enviada a la Secretaría Distrital de Ambiente con anterioridad, esta entidad **APRUEBA** el registro de la empresa **CEMEX COLOMBIA S.A.** identificada con **NIT No. 860002523-1**, como Planta de Tratamiento y Aprovechamiento de RCD, con localización en polígono adyacente a la planta de mortero y polígono aprobado bajo el Plan de Manejo de Recuperación y Restauración Ambiental con Registro Minero de Cantera - RMC 056, sobre predio de la **carrera 17 No. 71 - 10 sur**, con **CHIP catastral AAA0143SWSK**, del barrio Mochuelo Oriental, de la UPZ-63 El Mochuelo y UPZ-56 Danubio de la localidad de Ciudad Bolívar.

La anterior aprobación se mantiene para el polígono del predio de la **carrera 17 No. 71 - 10 sur,** siempre y cuando no se cambien las características descritas anteriormente y no se desarrollen actividades diferentes a la recolección, acopio, transformación, aprovechamiento y comercialización de los materiales aprovechables que fueron descritos en el presente informe técnico. En el caso en que existan modificaciones en las actividades y/o se implementen otros

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

sitios de acopio u otras actividades se deberá informar a la Secretaría Distrital de Ambiente para tramitar un nuevo concepto.

Por otra parte, se solicita a la empresa tener en cuenta que las actividades de acopio y transformación deben realizarse teniendo en cuenta las medidas de manejo ambiental que minimicen los impactos negativos producidos al ambiente por el desarrollo de las actividades. Así mismo, la empresa debe garantizar la correcta entrega de certificados de recolección a las obras de construcción, con el fin de avalar la adecuada disposición de residuos de construcción y recolección de RCD en el Distrito Capital. Lo anterior en consideración con lo establecido en el Decreto 586 de 2015 *"Por medio del cual se adopta el modelo eficiente y sostenible de gestión de los Residuos de Construcción y Demolición - RCD en Bogotá D.C."*

Se debe tener en cuenta que el presente informe técnico en ningún momento se asimila a un permiso de carácter ambiental.

6. CONSIDERACIONES FINALES Y ANEXOS

- El formato de presentación de las certificaciones del tratamiento y aprovechamiento de RCD, será válido solo con la firma del representante legal y/o persona con apoderamiento de CEMEX COLOMBIA S.A., con la finalidad de evitar falsificación de documentos.

- En cumplimiento del marco normativo establecido en el Artículo 16° de la Resolución 472 de 2017 *"Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de Construcción y Demolición (RCD) y se dictan otras disposiciones"* modificada y adicionada por la Resolución 1257 de 2021, CEMEX COLOMBIA S.A, deberá: "(...) *Presentar a la autoridad ambiental competente regional o urbana dentro de los 15 días calendario posteriores a la finalización de cada trimestre del año, el reporte del periodo inmediatamente anterior indicando la cantidad y el destino final de los residuos gestionados, de acuerdo con el formato del Anexo III, que forma parte integral de la presente resolución (...)"*

- Se recuerda a CEMEX COLOMBIA S.A., que esta prohibido el acopio temporal y permanente de maquinaria y equipo, residuos de construcción y demolición y/o materiales sobre elementos de la estructura ecológica principal, en razón de ello, esta entidad verificara el cumplimiento del parágrafo del artículo 204° del Decreto 555 de 2021, en visitas periódicas de seguimiento y control ambiental.

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

- **CEMEX COLOMBIA S.A.** deberá tener en cuenta que las actividades de acopio y transformación de RCD deben realizarse teniendo en cuenta las medidas de manejo ambiental que minimicen los impactos negativos producidos al ambiente por el desarrollo de las actividades. Razón por la cual, esta entidad solicita a Cemex Colombia S.A., evaluar la aplicabilidad del permiso de emisiones de fuentes fijas y móviles con la Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual – SCAAV de la Secretaría Distrital de Ambiente de conformidad con la normatividad legal ambiental aplicable.

- **CEMEX COLOMBIA S.A.,** deberá adoptar de manera permanente y durante la ejecución del tratamiento de los RCD, las medidas de manejo ambiental adecuadas con el fin de controlar, prevenir y/o mitigar los factores que se pueden generar por la obra al medio ambiente urbano, teniendo como línea de acción los programas establecidos en la *"Guía de Manejo Ambiental para el Sector de la Construcción".*

Finalmente, se informa que la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público - SCASP, realizará visitas periódicas de evaluación, seguimiento y control al Centro de Tratamiento y Aprovechamiento, verificando el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente; en caso de identificar posibles incumplimientos a dicha normatividad, se procederá a suspender la aprobación y se determinará la posibilidad de imponer las medidas preventivas o sancionatorias a que haya lugar, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009 *"Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones".*

Atentamente,

HELMAN ALEXANDER GONZALEZ FONSECA
SUBDIRECCION DE CONTROL AMBIENTAL AL SECTOR PUBLICO

Anexos: *Acta de Visita de Evaluación al Manejo Ambiental del 29 de agosto de 2022, en cuatro (4) folios.*

Elaboró:

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

SANTIAGO ENRIQUE ENCISO ACOSTA	CPS:	CONTRATO 20220045 DE 2021	FECHA EJECUCION:	14/02/2023
Revisó:				
HUGO ESTEBAN MORALES VARGAS	CPS:	CONTRATO 20221406 DE 2022	FECHA EJECUCION:	14/02/2023
Aprobó: **Firmó:**				
HELMAN ALEXANDER GONZALEZ FONSECA	CPS:	FUNCIONARIO	FECHA EJECUCION:	14/02/2023

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá. D.C. Colombia

DTINI
202423501018531
Información Pública
Al responder cite este número

Bogotá D.C., Agosto 02 de 2024

Señor
JUAN CAMILO OSPINA SALCEDO
ASMINCOL S.A.S.
comercial@asmincol.com
Bogotá - Bogotá DC

REF: Envío Respuesta al Radicado Número 202452601234592.

Asunto: Inscripción del Registro IDU No. 719 – 2024 en el Directorio de Proveedores de Materiales de Construcción, Sitios de Disposición Final, Transformación y Aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición RCD del IDU.

Respetado señor:

En atención al radicado de la referencia, mediante el cual da respuesta a la comunicación IDU No. 202423500897991, relacionado con la Inscripción en la categoría de *Agregados a partir de Residuos de Construcción y Demolición – RCD* del Directorio de Proveedores[1], una vez revisada la información aportada, y teniendo en consideración entre otros documentos los siguientes:

1. Copia del Certificado de Existencia y Representación Legal de la Cámara de Comercio de Bogotá, expedida el 13 de junio de 2024, con matrícula mercantil a nombre de la empresa Asmincol SAS, NIT: 900.467.519-1, representada legalmente por Juan Camilo Ospina Salcedo , identificado con cedula de ciudadanía No. 74.380.539 de Duitama, quien suscribe el formato FOIC07 de inscripción o renovación en el Directorio de Proveedores.

2. Copia del contrato de suministro de agregados reciclados y comodato de bien inmueble suscrito entre Asmincol SAS y Cemex Colombia SA, suscrito el 19/06/2024, por Alejandro Ramírez Cantu, en su calidad de representante legal de Cemex Colombia.

3. Copia del pronunciamiento emitido por la Subdirección de Control Ambiental al Sector Publico de la Secretaria Distrital de Ambiente - SDA, con el No. 2024EE114188 de fecha 28/05/2024, suscrito por Helman Alexander González Fonseca, en su calidad de subdirector, en el que informa:

[1] Resolución No. 001330 del 01 de abril de 2019, "Por medio de la cual se establecen los lineamientos del Directorio de Proveedores de Materiales de Construcción, Sitios de Disposición final, Transformación y Aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición RCD del IDU".

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web
https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia
Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 11031
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195
FO-DO-07_V15

DTINI
202423501018531
Información Pública
Al responder cite este número

"Referencia: Radicados SDA No. 2024ER90929 y 2024ER53389 – Planta de Tratamiento y Aprovechamiento

Cordial saludo,

La Subdirección de Control Ambiental al Sector Público de la Secretaría Distrital de Ambiente, en atención a los radicados de la referencia por medio de los cuales se solicita información sobre el estado actual para el gestor de residuos de construcción y demolición Cemex S.A. bajo la modalidad de Planta de Tratamiento y Aprovechamiento; informa lo siguiente:

Una vez verificada la trazabilidad para la operación de la Planta de Tratamiento y Aprovechamiento Cemex S.A se identifica que este se encuentra vigente y en estado activo bajo el pin 22599, cuya operación se lleva a cabo en la carrera 17 No. 71 - 10 sur, en el predio identificado con Chip Catastral AAA0143SWSK.

En este sentido, a continuación se emite respuesta a las solicitudes presentadas en los radicados indicados en la referencia, en los siguientes términos:

1. *La vigencia de permiso de emisiones e indique que a la fecha el respectivo permiso o la actividad no cuenta con ninguna medida de suspensión de actividades o sanción debidamente ejecutoriada*

   En cuanto al permiso de emisiones atmosféricas esta Subdirección se permite informar que el mismo fue otorgado mediante la Resolución 0873 del 01 de abril de 2022 bajo radicado 2022EE73062 otorgado para la fuente fija "Trituradora primaria RM80, Trituradora Secundaria Impactor CS3600 RCD y demás procesos susceptibles de generar emisiones relacionados a la actividad de aprovechamiento de RCD" el cual cuenta con una vigencia de cinco (5) años contados a partir del 27 de abril de 2022. De otro lado por medio de la Resolución 01384 del 27 de abril de 2022 bajo radicado 2022EE95704 se aclaró un error formal en cuanto a la digitación del encabezado de la resolución referida previamente, en consecuencia esta última no afectó la vigencia del registro otorgado.

   Ahora bien, en cuanto a, la petición si la vigencia del permiso otorgado cuenta con alguna medida de suspensión de actividades debidamente ejecutoriada, sobre el particular es necesario precisar que una vez verificado el Sistema de Información Ambiental - Forest de la Entidad, no se evidenció ninguna medida que desde el trámite permisivo que a la fecha afecte la vigencia de la Resolución 0873 del 01 de abril de 2022 con radicado 2022ER73062.

   En ejercicio de las actividades de seguimiento a la Resolución 0873 de 2022 realizó visita desde el grupo de Fuentes Fijas a la sociedad en mención el

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web
https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia
Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 11031
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195
FO-DO-07_V15

02/08/2023 emitiendo Concepto Técnico 11724 del 19-10-2023 (radicado SDA No. 2023IE245147).

Como resultado de la visita mencionada se emitió el requerimiento 2024EE09534 del 14- 01-2024, comunicado 17 de enero del 2024, en el cual se determinaron las acciones que debe adelantar para dar cumplimiento a la normatividad vigente.

Además, se informa que, una vez verificadas todas las bases de información con que cuenta esta Autoridad Ambiental, se constató que la citada sociedad a la fecha de este comunicado no ha sido objeto de sanciones como consecuencia de un trámite sancionatorio ambiental, ni de imposición de medidas preventivas, de acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley 1333 de 2009, como consecuencia de la operación y funcionamiento de la citada planta.

2. *Se informe la vigencia del PIN ambiental No. 22599 para la planta de tratamiento y aprovechamiento de RCD e indique que a la fecha el respectivo permiso o la actividad no cuenta con ninguna medida de suspensión de actividades o sanción, debidamente ejecutoriada.*

   En primera instancia, es preciso mencionar que la aprobación como gestor de residuos de construcción y demolición no presenta vigencia, toda vez que esto depende de la operación que la planta fija de tratamiento y aprovechamiento pueda ejercer en el predio y las condiciones para su operación.

   Es así como, mediante el Informe Técnico SDA No. 00649 del 14 de febrero de 2023, con radicado 2023IE31895, se informó que la aprobación se mantendrá para el polígono del predio ubicado en la carrera 17 No. 71 - 10 sur, siempre y cuando no se cambien las características descritas en el documento y no se desarrollen actividades diferentes a la recolección, acopio, transformación, aprovechamiento y comercialización de residuos de construcción y demolición de origen pétreo proveniente de la demolición de estructuras verticales o elementos viales como concreto, mortero; unidades de albañilería de concreto, agregados no tratados, áridos tratados con cementantes hidráulicos, unidades de albañilería de arcilla, ladrillos, tejas y asfalto.

   Ahora bien, desde la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público, actualmente el gestor Cemex S.A, no presenta ninguna medida de suspensión de actividades o sanción, para la gestión efectuada como Planta de Tratamiento y Aprovechamiento.

   A pesar de lo anterior, es importante señalar que, si bien la aprobación antes mencionada se emitió bajo las condiciones del Decreto 586 de 20151, este se derogó mediante el Decreto Distrital 507 de 20232, por lo tanto, se espera el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 35° para los gestores

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web
https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia
Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 11031
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195
FO-DO-07_V15

en la modalidad de plantas de tratamiento y/o aprovechamiento. Acciones que serán corroboradas a través de las visitas de inspección, vigilancia y control que esta subdirección adelanta sobre los diferentes actores que intervienen en la cadena de los residuos de construcción y demolición que se generan en la ciudad.

Finalmente, se espera en estos términos haber atendido la solicitud y se recuerda que la Subdirección de Control Ambiental al Sector Publico estará dispuesta a resolver cualquier duda relacionada con nuestras funciones, las cuales se encuentran establecidas en el Decreto 109 de 2009 3 artículo 17°, modificado por el artículo 3° del Decreto 175 del 2009, a través de la ventanilla de atención al público de la Entidad, ubicada en la avenida Caracas No. 54 – 38, o a través de la línea telefónica 3778904."

Esta Dirección Técnica, informa que la documentación presentada cumple con los requisitos establecidos en la Resolución IDU No. 001330 de 2019, por cuanto procede a realizar la Inscripción del Registro número 719 - 2024, dentro del "*Directorio Ambiental de Proveedores de Materiales de Construcción, Sitios de Disposición final, Transformación y Aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición RCD del IDU"*, en la categoría de *Agregados a partir de Residuos de Construcción y Demolición – RCD*, a nombre de la empresa Asmincol SAS, como comercializador de agregados reciclados provenientes del CTA Cemex con Pin No. 22599, cuya planta se encuentra ubicada en la Avenida Boyaca No. 72 – 04 sur, en la Ciudad de Bogotá.

Esta Inscripción cuenta con vigencia de un (1) año, a partir de la fecha de la presente comunicación y podrá ser cancelada en cualquier momento por este Instituto conforme a las siguientes causales establecidas en el artículo 7° de la Resolución IDU No. 001330 de 2019, así:

- *"Cuando se imponga medidas sancionatorias o cualquier suspensión que implique el cese de actividades del proveedor por parte de la autoridad competente.*

- *Cuando deje de cumplir alguno de los requisitos de inscripción o renovación establecidos en el procedimiento de Actualización Directorio Ambiental de Proveedores."*

Igualmente, se establece por disposición de la misma Resolución IDU No. 001330, que dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes, se deberá reportar a esta Dirección Técnica[2] los volúmenes de las cantidades de materiales suministrados únicamente a Contratos del IDU, en el formato FOIC06, dispuesto en el siguiente

2 Hoy Dirección Técnica de Inteligencia de Negocio e Innovación, de conformidad con la modificación de la denominación de la dependencia establecida en los artículos 2 y 14 del Acuerdo 06 de 2021 expedido por el Consejo Directivo del IDU.

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web
https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia
Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 11031
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195
FO-DO-07_V15

enlace de la página Web del Instituto: https://www.idu.gov.co/page/siipviales/ambiental/portafolio.

Es importante aclarar que el citado Formato FOIC06 de Reporte que presentan ante este Directorio, es diferente a la Certificación de venta del material que es entregada al Contratista IDU.

Finalmente, es de informar, que se remite copia de la presente comunicación a la Dirección de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, para conocimiento y fines pertinentes en el marco de sus competencias como autoridad ambiental.

Cordialmente,

SULLY MAGALIS ROJAS BAYONA
Directora Técnica de Inteligencia de Negocio e Innovación
Firma mecánica generada el 02-08-2024 03:48:19 PM autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Con Copia a: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - Bogotá DC - Bogotá - Av. ESPERANZA 62 49 P 6 - sau@car.gov.co

Elaboró: NELSON ANDRES ROMERO CARDENAS-Dirección Técnica de Inteligencia de Negocio e Innovación

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web
https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia
Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.


Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 11031
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195
FO-DO-07_V15

20 de julio de 2024

Asunto: Certificación Comercial

CEMEX COLOMBIA S.A. sociedad identificada con el NIT No 860.002.523-1, titular de la planta de aprovechamiento de RCD´s autorizada mediante radicado No 2023EE32713 por la secretaria distrital de ambiente, ubicada en el barrio Mochuelo, Localidad de Ciudad Bolívar, Bogotá D.C, mantiene una relación comercial vigente mediante contrato No URS-258-2024 con la empresa ASMINCOL SAS identificada con NIT: 900467519-1 para el suministro de materiales procesados a partir de RCD´s.

De antemano agradezco su atención prestada,



Christian Felipe Manjarrez
Soluciones Urbanas
Líder de residuos Municipales E Industriales
Teléfono: 317 2793284
christianfelipe.manjarrez@cemex.com

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Dirección Regional Soacha
República de Colombia

CAR 22/05/2024 11:01
Al Contestar cite este No.: **11242002085**
Origen: Dirección Regional Soacha
Destino:WILLIAM FERNANDO JAIMES CAMARGO
Anexos: Fol: 1

Soacha,

WILLIAM FERNANDO JAIMES CAMARGO
DIRECTOR
CALLE 6 No 26-74
william.jaimes@asmincol.com
Bogotá

ASUNTO: Respuesta al radicado 20241051206: Pronunciamiento CAR no sancionatorios ASMINCOL S.A.S

Codial Saludo

En atención a su solicitud de información relacionada en el asunto, amablemente le informo que en virtud de la búsqueda realizada en el Sistema de Administración Documental de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR- SIDCAR y el Sistema de Administración de Expedientes SAE, se verifico que a nombre de ASMINCOL S.A.S. identificada con Nit. 900467519-1, no se adelantan procesos ambientales sancionatorios (ley 1333 del 2009" Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones."), competencia de la Corporación.

Lo anterior en los términos establecidos en el parágrafo del artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, sustituida por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015.

Cualquier aclaración o información adicional gustosamente la brindaremos.

Cordialmente,

CESAR AUGUSTO RICO MAYORGA
Director Regional soacha

Respuesta a: 20241051206 del 21/05/2024

Elaboró: Junior Dario Vargas Carvajal / DRSOA

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE Folios: 4 Anexos: 0
Proc. # 6249313 Radicado # 2024EE114188 Fecha: 2024-05-28
Tercero: 860002523-1 - CEMEX COLOMBIA S.A.
Dep.: SUBDIRECCION DE CONTROL AMBIENTAL AL SECTOR PUBLICO
Tipo Doc.: Oficio de salida Clase Doc.: Salida

Bogotá DC

Señores
CEMEX COLOMBIA S.A.
Dra. Nubia Elizabeth González Salazar
Apoderada General
Calle 99 No. 9A – 54, piso 8
Correos electrónicos: correo.juridica@cemex.com
Ciudad

Referencia: Radicados SDA No. **2024ER90929** y **2024ER53389** – Planta de Tratamiento y Aprovechamiento

Cordial saludo,

La Subdirección de Control Ambiental al Sector Público de la Secretaría Distrital de Ambiente, en atención a los radicados de la referencia por medio de los cuales se solicita información sobre el estado actual para el gestor de residuos de construcción y demolición Cemex S.A. bajo la modalidad de Planta de Tratamiento y Aprovechamiento; informa lo siguiente:

Una vez verificada la trazabilidad para la operación de la Planta de Tratamiento y Aprovechamiento Cemex S.A se identifica que este se encuentra vigente y en estado **activo** bajo el **pin 22599**, cuya operación se lleva a cabo en la carrera 17 No. 71 - 10 sur, en el predio identificado con Chip Catastral AAA0143SWSK

En este sentido, a continuación se emite respuesta a las solicitudes presentadas en los radicados indicados en la referencia, en los siguientes términos:

1. La vigencia de permiso de emisiones e indique que a la fecha el respectivo permiso o la actividad no cuenta con ninguna medida de suspensión de actividades o sanción debidamente ejecutoriada

En cuanto al permiso de emisiones atmosféricas esta Subdirección se permite informar que el mismo fue otorgado mediante la Resolución 0873 del 01 de abril de 2022 bajo radicado 2022EE73062 otorgado para la fuente fija “Trituradora primaria RM80, Trituradora Secundaria Impactor CS3600 RCD y demás procesos susceptibles de generar emisiones relacionados a la actividad de aprovechamiento de RCD” el cual cuenta con una vigencia de cinco (5) años contados a partir del 27 de abril de 2022. De otro lado por medio de la Resolución 01384 del 27 de abril de 2022 bajo radicado 2022EE95704 se aclaró un error formal en cuanto a la digitación del encabezado de la resolución referida previamente, en consecuencia esta última no afectó la vigencia del registro otorgado.

Ahora bien, en cuanto a, la petición si la vigencia del permiso otorgado cuenta con alguna medida de suspensión de actividades debidamente ejecutoriada, sobre el particular es necesario precisar que una vez verificado el Sistema de Información Ambiental - Forest de la Entidad, no se evidenció ninguna medida que desde el trámite permisivo que a la fecha afecte la vigencia de la Resolución 0873 del 01 de abril de 2022 con radicado 2022ER73062.

En ejercicio de las actividades de seguimiento a la Resolución 0873 de 2022 realizó visita desde el grupo de Fuentes Fijas a la sociedad en mención el 02/08/2023 emitiendo Concepto Técnico 11724 del 19-10-2023 (radicado SDA No. 2023IE245147).

Como resultado de la visita mencionada se emitió el requerimiento 2024EE09534 del 14-01-2024, comunicado 17 de enero del 2024, en el cual se determinaron las acciones que debe adelantar para dar cumplimiento a la normatividad vigente.

Además, se informa que, una vez verificadas todas las bases de información con que cuenta esta Autoridad Ambiental, se constató que la citada sociedad a la fecha de este comunicado no ha sido objeto de sanciones como consecuencia de un trámite sancionatorio ambiental, ni de imposición de medidas preventivas, de acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley 1333 de 2009, como consecuencia de la operación y funcionamiento de la citada planta.

2. Se informe la vigencia del PIN ambiental No. 22599 para la planta de tratamiento y aprovechamiento de RCD e indique que a la fecha el respectivo permiso o la actividad no cuenta con ninguna medida de suspensión de actividades o sanción, debidamente ejecutoriada.

En primera instancia, es preciso mencionar que la aprobación como gestor de residuos de construcción y demolición no presenta vigencia, toda vez que esto depende de la operación que la planta fija de tratamiento y aprovechamiento pueda ejercer en el predio y las condiciones para su operación.

Es así como, mediante el Informe Técnico SDA No. 00649 del 14 de febrero de 2023, con radicado 2023IE31895, se informó que la aprobación se mantendrá para el polígono del predio ubicado en la carrera 17 No. 71 - 10 sur, siempre y cuando no se cambien las características descritas en el documento y no se desarrollen actividades diferentes a la recolección, acopio, transformación, aprovechamiento y comercialización de residuos de construcción y demolición de origen pétreo proveniente de la demolición de estructuras verticales o elementos viales como concreto, mortero; unidades de albañilería de concreto, agregados no tratados, áridos tratados con cementantes hidráulicos, unidades de albañilería de arcilla, ladrillos, tejas y asfalto.

Ahora bien, desde la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público, actualmente el gestor Cemex S.A, no presenta ninguna medida de suspensión de actividades o sanción, para la gestión efectuada como Planta de Tratamiento y Aprovechamiento

A pesar de lo anterior, es importante señalar que, si bien la aprobación antes mencionada se emitió bajo las condiciones del Decreto 586 de 2015[1], este se derogó mediante el Decreto Distrital 507 de 2023[2], *por lo tanto, se espera el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el* artículo 35° para los gestores en la modalidad de plantas de tratamiento y/o aprovechamiento. Acciones que serán corroboradas a través de las visitas de inspección, vigilancia y control que esta subdirección adelanta sobre los diferentes actores que intervienen en la cadena de los residuos de construcción y demolición que se generan en la ciudad.

Finalmente, se espera en estos términos haber atendido la solicitud y se recuerda que la Subdirección de Control Ambiental al Sector Publico estará dispuesta a resolver cualquier duda relacionada con nuestras funciones, las cuales se encuentran establecidas en el Decreto 109 de 2009 [3] artículo 17°, modificado por el artículo 3° del Decreto 175 del 2009, a través de la ventanilla de atención al público de la Entidad, ubicada en la avenida Caracas No. 54 – 38, o a través de la línea telefónica 3778904.

Atentamente,

---

[1] Decreto 586 de 2015 "Por medio del cual se adopta el modelo eficiente y sostenible de gestión de los Residuos de Construcción y Demolición - RCD en Bogotá D.C."
[2] Decreto 507 de 2023 "Por el cual se adopta el modelo y los lineamientos para la gestión integral de los Residuos de Construcción y Demolición – RCD en Bogotá D.C., y se dictan otras disposiciones"
[3] Decreto 109 de 2009 "Por el cual se modifica la estructura de la Secretaría Distrital de Ambiente y se dictan otras disposiciones".



HELMAN ALEXANDER GONZALEZ FONSECA
SUBDIRECCION DE CONTROL AMBIENTAL AL SECTOR PUBLICO

Elaboró:				
DANIELA URREA RUIZ	CPS:	SDA-CPS-20240278	FECHA EJECUCIÓN:	28/05/2024
Revisó:				
NATALIA NARVAEZ TORRES	CPS:	CONTRATO SDA-CPS-20230188 DE 2023	FECHA EJECUCIÓN:	28/05/2024
HELMAN ALEXANDER GONZALEZ FONSECA	CPS:	FUNCIONARIO	FECHA EJECUCIÓN:	28/05/2024
Aprobó: **Firmó:**				
HELMAN ALEXANDER GONZALEZ FONSECA	CPS:	FUNCIONARIO	FECHA EJECUCIÓN:	28/05/2024

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Dirección Regional Bogotá D.C. - La Calera
República de Colombia

CAR 06/12/2024 16:19
Al Contestar cite este No.: **01242010976**
Origen: Dirección Regional Bogotá D.C. -
Destino:GILDARDO RODRIGUEZ VARGAS
Anexos: Fol: 2

Bogotá,

Señor
GILDARDO RODRIGUEZ VARGAS
Tel: 7464651, Cel: 3186129043
Av Calle 26 # 59-51 Local 5
grodriguezv174@gmail.com
Localidad de Ciudad Bolivar (Bogotá)

ASUNTO: Exp 7411 - Respuesta al radicado 20241123113: Solicitud de pronunciamiento para la Renovación Directorio de proveedores IDU

Cordial saludo,

En atención a su solicitud, se informa que consultado el SAE., se evidenció que bajo el expediente 7411, el señor GILDARDO RODRÍGUEZ VARGAS, identificado con cédula de ciudadanía 3.020.892, es titular del contrato de concesión minera No. 17415, el cual le fue aprobado mediante Resolución 407 del 02 de abril de 2002, un Plan de Manejo Ambiental, para mitigar, controlar y compensar el deterioro de los Recursos Naturales presentado por la actividad extractiva llevada a cabo en la cantera Bellavista, ubicada en la Vereda Quiba de la localidad de Ciudad Bolívar y a la fecha se encuentra vigente.

Es de aclarar, que actualmente el Plan de Manejo Ambiental mencionado se encuentra en trámite de actualización y, dentro de este no se encontró información de medidas preventivas, ni con procesos sancionatorios ejecutoriados, que afecten el citado instrumento ambiental.

Así mismo, se informa que a través del Auto DRBC 338 del 23 de abril de 2018, se declaró iniciado el trámite de modificación y/o actualización del Plan de Manejo Ambiental –PMA., aprobado por medio de la Resolución No. 407 de 02 de abril de 2002.

Quedamos atentos a cualquier inquietud,

Atentamente,

.

MARÍA FERNANDA ZULUAGA MARTÍNEZ
Directora Operativa

Los datos personales serán tratados de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y la Resolución CAR 3294 de 2019 y serán utilizados solo para fines misionales de la Corporación

Respuesta a: 20241123113 del 04/12/2024

Elaboró: Alba Luz Tovar Lombo / DRBC

Los datos personales serán tratados de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y la Resolución CAR 3294 de 2019 y serán utilizados solo para fines misionales de la Corporación

Certificado

Registro Único de RUCOM

Registro **RUCOM-2024112629638**

En cumplimiento del Capítulo 6º del Decreto Único Reglamentario del Sector de Minas y Energía No. 1073 del 25 de mayo de 2015, la Agencia Nacional de Minería certifica que CONSTRITURAR S.A.S. con NIT número 830089377 acredita la calidad de comercializador autorizado inscrito en el Registro Único de Comercializadores de Minerales.

La presente certificación permite al comercializador realizar de forma regular la actividad de comprar y vender minerales para transformarlos, beneficiarlos, distribuirlos, intermediarlos, exportarlos o consumirlos y tiene una vigencia del 28-11-2024 hasta el 31-07-2025. Durante el mes de mayo de 2025 el interesado debe realizar los trámites de renovación indicada en el Decreto 1073 de 2015.

Se acredita al comercializador de minerales luego de verificar y validar la información suministrada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN - y consultar en la Base de datos de Confecámaras.

EL PRESENTE CERTIFICADO NO AUTORIZA AL COMERCIALIZADOR A REALIZAR ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN DE MINERALES.

Los minerales autorizados para ser comercializados son: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, RECEBO (MIG), OTRAS ROCAS O PIEDRAS TRITURADAS PARA CONSTRUCCIÓN NCP

Dado en Bogotá D.C., a los 28 dias del mes de noviembre del año 2024.

JAIME ALONSO GARCÍA ARANGO
Gerente - Grupo de Regalías y Contraprestaciones Económicas

NATALIA DURAN ANGULO
28-11-2024 09:25

Este documento ha sido firmado digitalmente con un certificado provisto por una entidad autorizada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 28 de la ley 527 de 1999, y 15 del Decreto 1747 de 2000. La firma digital aquí impuesta es el equivalente electrónico de la firma manuscrita.
La autenticidad del presente certificado podrá ser validada ingresando a www.anm.gov.co, con el número Registro RUCOM disponible en este certificado.

CONSTRITURAR
Construcciones · Triturados · Transportes

Bogotá D. C., diez (10) de enero de 2025

COMUNICADO

Asunto**: ENTREGA DE DOCUMENTOS SOMETIDOS A RESERVA LEGAL**

Atendiendo que a la fecha son recurrentes las solicitudes de presentar a nuestros clientes copia del contrato de concesión minera No. 17415 del cual somos operadores mineros, resulta necesario informar que no es posible atender dichas solicitudes en razón que los documentos que contienen información técnica y económica en materia minera gozan de RESERVA LEGAL de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código de Minas, el cual ha tenido amplio desarrollo por parte de la autoridad minera mediante conceptos No. 231000003403 del 23 de enero de 2013 y 20131200237081 del 6 de septiembre del mismo año.

Adicionalmente, en virtud de lo señalado en el artículo 50 de la Ley 685 de 2001 el contrato de concesión minera debe ser inscrito en el Registro Minero Nacional para su perfeccionamiento, es por ello que para efectos de comprobar la vigencia y cumplimiento de las obligaciones en materia minera basta con verificar el certificado de registro minero donde se encuentra actualizada toda la información concerniente al titulo minero No. 17415 cuyo beneficiario es el señor Gildardo Rodríguez Vargas y del cual somos operadores mineros.

Así mismo, como empresa vinculada al sector minero energético y en apego al ordenamiento jurídico, presentamos anualmente la información de los permisos de funcionamiento del título minero No. 17415 ante las Entidades Nacionales y distritales encargadas del otorgamiento de los permisos necesarios para la comercialización de minerales, por tanto no es dable que dichas Entidades soliciten a nuestros clientes información que ellos poseen, lo anterior en aplicación de la Ley Anti trámites (Decreto Ley 019 de 2012 – Artículo 9º), el cual señala:

> ARTÍCULO 9. PROHIBICIÓN DE EXIGIR DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD. Cuando se esté adelantando un trámite ante la administración, se prohíbe exigir actos administrativos, constancias, certificaciones o documentos que ya reposen en la entidad ante la cual se está tramitando la respectiva actuación.

Cordialmente,

NATHALIA RODRIGUEZ
Representante Legal

NELSON ENRIQUE DIAZ
ASESOR JURIDICO

CERTIFICADO DE REGISTRO MINERO

CRM-202412041203-661773 Fecha de Reporte: 04/dic/2024 12:03

CÓDIGO DE EXPEDIENTE:	17415	**MODALIDAD:**	CONTRATO DE CONCESIÓN (D 2655)	**FECHA Y HORA DE REGISTRO:**	25/mar/1994 00:00
VIGENCIA HASTA:	04/oct/2031	**ESTADO:**	Activo	**AUTORIDAD MINERA COMPETENTE:**	AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

TITULARES			
NOMBRES	**TIPO**	**IDENTIFICACIÓN**	**USUARIO AnnA**
GILDARDO RODRIGUEZ VARGAS	Cédula de Ciudadanía	3020892	36634

ÁREA TOTAL (ha):	218.1597
MUNICIPIOS:	BOGOTÁ, D.C.-Bogotá D.C.

MINERALES:	RECEBO

ANOTACIONES	
ANOTACIÓN:	1
FECHA DE ANOTACIÓN:	28/mar/1994
TIPO DE ANOTACIÓN:	LICENCIA EXPLORACION
FECHA EJECUTORIA:	
TIPO DE DOCUMENTO:	RESOLUCION
CÓDIGO DEL DOCUMENTO:	OTRO
NÚMERO DE DOCUMENTO:	600853
ESPECIFICACIÓN:	OTORGA LICENCIA DE EXPLORACION

ANOTACIÓN:	2
FECHA DE ANOTACIÓN:	04/oct/2001
TIPO DE ANOTACIÓN:	CONTRATO DE CONCESION
FECHA EJECUTORIA:	
TIPO DE DOCUMENTO:	CONTRATO
CÓDIGO DEL DOCUMENTO:	OTRO
NÚMERO DE DOCUMENTO:	17415
ESPECIFICACIÓN:	CONTRATO DE CONCESION PARA MEDIANA MINERIA

ANOTACIÓN:	3
FECHA DE ANOTACIÓN:	04/oct/2001

TIPO DE ANOTACIÓN:	APROBAR INFORMES
FECHA EJECUTORIA:	
TIPO DE DOCUMENTO:	CONCEPTOS
CÓDIGO DEL DOCUMENTO:	OTRO
NÚMERO DE DOCUMENTO:	0
ESPECIFICACIÓN:	APRUEBA PROGRAMA DE TRABAJOS E INVERSIONES P. T. I.

ANOTACIÓN:	4
FECHA DE ANOTACIÓN:	04/oct/2001
TIPO DE ANOTACIÓN:	POLIZA DE CUMPLIMIENTO
FECHA EJECUTORIA:	
TIPO DE DOCUMENTO:	POLIZA
CÓDIGO DEL DOCUMENTO:	OTRO
NÚMERO DE DOCUMENTO:	7306197
ESPECIFICACIÓN:	GARANTIZA EL CUMPLIMEINTO SEGUN LICENCIA 17415

ANOTACIÓN:	5
FECHA DE ANOTACIÓN:	04/oct/2001
TIPO DE ANOTACIÓN:	ACEPTAR REDUCCION AREA/NUEVA ALINDERACION/AREA MODIFICADA
FECHA EJECUTORIA:	
TIPO DE DOCUMENTO:	CONCEPTOS
CÓDIGO DEL DOCUMENTO:	OTRO
NÚMERO DE DOCUMENTO:	0
ESPECIFICACIÓN:	SE ACEPTA REDUCCION DE AREA

ANOTACIÓN:	6
FECHA DE ANOTACIÓN:	20/dic/2001
TIPO DE ANOTACIÓN:	SIN DEFINIR
FECHA EJECUTORIA:	10/dic/2001
TIPO DE DOCUMENTO:	RESOLUCION
CÓDIGO DEL DOCUMENTO:	OTRO
NÚMERO DE DOCUMENTO:	45
ESPECIFICACIÓN:	SE ADOPTA EL NUEVO SISTEMA DE REGISTRO MINERO NACIONAL, EL CODIGO: 94-00288-17415-03-00000-00 CAMBIA A: GDIJ-06

ANOTACIÓN:	7
FECHA DE ANOTACIÓN:	15/sep/2003
TIPO DE ANOTACIÓN:	APROBACION POLIZA DE CUMPLIMIENTO
FECHA EJECUTORIA:	20/mar/2003
TIPO DE DOCUMENTO:	CERTIFICACION
CÓDIGO DEL DOCUMENTO:	OTRO
NÚMERO DE DOCUMENTO:	7615345
ESPECIFICACIÓN:	GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE CONCESION NRO. 17415 (GDIJ-06)

ANOTACIÓN:	8
FECHA DE ANOTACIÓN:	20/ene/2023
TIPO DE ANOTACIÓN:	ACLARACION/MODIFICACION DE TITULO

FECHA EJECUTORIA:	19/ene/2023
TIPO DE DOCUMENTO:	OFICIO
CÓDIGO DEL DOCUMENTO:	Circular
NÚMERO DE DOCUMENTO:	001 2023
ESPECIFICACIÓN:	INSCRIPCIÓN en el Registro Minero Nacional de la entrada en producción en la información gráfica de los títulos mineros que se visualiza en el Sistema Integral de Gestión Minera –AnnA Minería-, de conformidad con lo comunicado a través de la Circular Externa No. 001 del 19 de enero de 2023, expedida por la Agencia Nacional de Minería en aplicación de lo dispuesto en la Resolución 370 del 16 de junio de 2021, proferida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC, por medio de la cual se establece “el sistema de proyección cartográfica oficial para Colombia, específicamente, la determinación de distancias y áreas para todos los títulos mineros, se hará a partir del 20 de enero de 2023 con respecto la proyección cartográfica “Transverse Mercator” como sistema oficial de coordenadas planas para Colombia, con un único origen denominado “Origen Nacional”, referido al Marco Geocéntrico Nacional de Referencia, también denominado MAGNA-SIRGAS”; es decir, el valor del área concedida para algunos títulos mineros, puede visualizarse mayor o menor, sin que esto signifique modificación del polígono otorgado.

CELDAS DEL TÍTULO

18N05L24J18Y, 18N05L24J18Z, 18N05L24J19V, 18N05L24J19W, 18N05L24J23D, 18N05L24J23E, 18N05L24J23H, 18N05L24J23I, 18N05L24J23J, 18N05L24J23L, 18N05L24J23M, 18N05L24J23N, 18N05L24J23P, 18N05L24J23R, 18N05L24J23S, 18N05L24J23T, 18N05L24J23U, 18N05L24J23V, 18N05L24J23W, 18N05L24J23X, 18N05L24J23Y, 18N05L24J23Z, 18N05L24J24A, 18N05L24J24B, 18N05L24J24C, 18N05L24J24D, 18N05L24J24E, 18N05L24J24F, 18N05L24J24G, 18N05L24J24H, 18N05L24J24I, 18N05L24J24J, 18N05L24J24K, 18N05L24J24L, 18N05L24J24M, 18N05L24J24N, 18N05L24J24P, 18N05L24J24Q, 18N05L24J24R, 18N05L24J24S, 18N05L24J24T, 18N05L24J24U, 18N05L24J24V, 18N05L24J24W, 18N05L24J24X, 18N05L24J25F, 18N05L24J25G, 18N05L24J25H, 18N05L24J25K, 18N05L24J25L, 18N05L24J25M, 18N05L24J25Q, 18N05L24J25R, 18N05L24J25S, 18N05L24N02J, 18N05L24N02P, 18N05L24N02T, 18N05L24N02U, 18N05L24N02X, 18N05L24N02Y, 18N05L24N02Z, 18N05L24N03A, 18N05L24N03B, 18N05L24N03C, 18N05L24N03D, 18N05L24N03E, 18N05L24N03F, 18N05L24N03G, 18N05L24N03H, 18N05L24N03I, 18N05L24N03J, 18N05L24N03K, 18N05L24N03L, 18N05L24N03M, 18N05L24N03N, 18N05L24N03P, 18N05L24N03Q, 18N05L24N03R, 18N05L24N03S, 18N05L24N03T, 18N05L24N03U, 18N05L24N03V, 18N05L24N03W, 18N05L24N03X, 18N05L24N03Y, 18N05L24N03Z, 18N05L24N04A, 18N05L24N04B, 18N05L24N04C, 18N05L24N04F, 18N05L24N04G, 18N05L24N04H, 18N05L24N04K, 18N05L24N04L, 18N05L24N04M, 18N05L24N04N, 18N05L24N04P, 18N05L24N04Q, 18N05L24N04R, 18N05L24N04S, 18N05L24N04T, 18N05L24N04U, 18N05L24N04V, 18N05L24N04W, 18N05L24N04X, 18N05L24N04Y, 18N05L24N04Z, 18N05L24N05K, 18N05L24N05Q, 18N05L24N05R, 18N05L24N05S, 18N05L24N05U, 18N05L24N05V, 18N05L24N05W, 18N05L24N05X, 18N05L24N05Y, 18N05L24N05Z, 18N05L24N07C, 18N05L24N07D, 18N05L24N07E, 18N05L24N07H, 18N05L24N07I, 18N05L24N07J, 18N05L24N07P, 18N05L24N08A, 18N05L24N08B, 18N05L24N08C, 18N05L24N08D, 18N05L24N08E, 18N05L24N08F, 18N05L24N08G, 18N05L24N08H, 18N05L24N08I, 18N05L24N08J, 18N05L24N08K, 18N05L24N08L, 18N05L24N08M, 18N05L24N08N, 18N05L24N08P, 18N05L24N08R, 18N05L24N08S, 18N05L24N08T, 18N05L24N08U, 18N05L24N08Y, 18N05L24N08Z, 18N05L24N09A, 18N05L24N09B, 18N05L24N09C, 18N05L24N09D, 18N05L24N09E, 18N05L24N09F, 18N05L24N09G, 18N05L24N09H, 18N05L24N09I, 18N05L24N09J, 18N05L24N09K, 18N05L24N09L, 18N05L24N09M, 18N05L24N09N, 18N05L24N09P, 18N05L24N09Q, 18N05L24N09R, 18N05L24N09S, 18N05L24N09T, 18N05L24N09U, 18N05L24N09V, 18N05L24N09W, 18N05L24N09X, 18N05L24N09Y, 18N05L24N09Z, 18N05L24N10A, 18N05L24N10B, 18N05L24N10C, 18N05L24N10D, 18N05L24N10E, 18N05L24N10F, 18N05L24N10G, 18N05L24N10H, 18N05L24N10I, 18N05L24N10J, 18N05L24N10K, 18N05L24N10L, 18N05L24N10M, 18N05L24N10N, 18N05L24N10Q, 18N05L24N10R, 18N05L24N10S, 18N05L24N10T, 18N05L24N10V, 18N05L24N10W, 18N05L24N10X, 18N05L24N10Y, 18N05L24N13E, 18N05L24N14A, 18N05L24N14B, 18N05L24N14C, 18N05L24N14D, 18N05L24N14E, 18N05L24N14G, 18N05L24N14H, 18N05L24N14I, 18N05L24N14J, 18N05L24N14N, 18N05L24N14P, 18N05L24N14U, 18N05L24N15A, 18N05L24N15B, 18N05L24N15C, 18N05L24N15D, 18N05L24N15F, 18N05L24N15G, 18N05L24N15H, 18N05L24N15I, 18N05L24N15K, 18N05L24N15L, 18N05L24N15M, 18N05L24N15N, 18N05L24N15Q, 18N05L24N15R, 18N05L24N15S, 18N05L24N15W, 18N05L24N15X

Nota: Las celdas reportadas en el listado se suporponen total o parcialmente con el título

COORDENADAS DEL TÍTULO

Coordenadas en WKT*

POLYGON ((-74.15257139 4.526655346999974, -74.152751773 4.528373519000013, -74.161033174 4.530597289000013, -74.167565005 4.51923843899999, -74.152659998 4.510603837000019, -74.15117358 4.514673371000015, -74.151759314 4.514944609999986, -74.151308977 4.517205427000022, -74.151849632 4.517205376999982, -74.151849787 4.518878350000023, -74.151759677 4.518878358999984, -74.151759686 4.518968788999985, -74.150480131 4.518968906999987, -74.150137903 4.521048851999979, -74.150678586 4.521320096000011, -74.151579525 4.519601823000016, -74.152120325 4.521139100000028, -74.153291752 4.52113898900001, -74.154598478 4.52254054399998, -74.157229688 4.522540283000012, -74.157230095 4.526609678, -74.157167018 4.52660968399999, -74.157167022 4.52665489899999, -74.15257139 4.526655346999974))

* WKT: Well Known Text. Codificación o sintaxis en formato ASCII estandarizada diseñada para describir objetos espaciales expresados de forma vectorial. Para visualizar las coordenadas puede cargar el texto en el sitio https://arthur-e.github.io/Wicket/sandbox-gmaps3.html

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

WILLIAM ALBERTO MARTINEZ DIAZ

GERENTE DE CATASTRO Y REGISTRO MINERO

CERTIFICADO DE REGISTRO MINERO

CRM-202412041203-661773 Fecha de Reporte: 04/dic/2024 12:03

NOTAS ACLARATORIAS

De acuerdo con la circular Número 0010 del 18 de junio de 2015 expedida por la Agencia Nacional de Minería - ANM -, se fija la directriz relacionada con la inscripción de prendas mineras, donde se determina que Por disposición de la Ley 1676 de 2013 y el Decreto 400 de 2014 las garantías mineras o cualquier gravamen que recaiga sobre el derecho a explorar y explotar en los términos de la señalada norma, deben ser consultadas en el registro de Garantías Mobiliarias, el cual se desarrollará por parte de la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecamaras).

Las coordenadas de los vértices están referidas al sistema MAGNA-SIRGAS

Las áreas han sido calculadas con respecto al Origen Nacional de la proyección Gauss-Krüeger, Transverse Mercator Colombia.

Este certificado electrónico tiene validez conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y las demás normas que la complementen, modifiquen o reemplacen. Para verificar su autenticidad escanee el código QR que se encuentra en el encabezado del documento. Este código lo direccionará a una URL que le permitirá descargar el documento original y compararlo con el presente documento electrónico.

Recuerde que la URL válida debe empezar con https://annamineria.anm.gov.co, en caso contrario abstenerse de realizar cualquier acción en el navegador.

El estado del título descrito en este certificado corresponde al día y hora en la que fue expedido.

********** FIN DE ESTE DOCUMENTO **********

DTINI
202523500017461
Información Pública
Al responder cite este número

Bogotá D.C., Enero 10 de 2025

Señora
NATALIA RODRIGUEZ HIGUITA
CONSTRITURAR SAS
CL 26 59 65
111321
financiera@constriturar.com
Bogotá - Bogotá DC

REF: Envío Respuesta al Radicado Número 202452602157002.

Asunto: Renovación de vigencia Registro No. 49 - 2002 en el Directorio de Proveedores de Materiales de Construcción, Sitios de Disposición final, Transformación y Aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición RCD del IDU.

Respetada señora:

En atención al radicado de la referencia, relacionado con la Renovación de vigencia del Registro IDU No. 49 - 2002, en la categoría de *Agregados Pétreos* del Directorio de Proveedores[1], una vez revisada la información aportada, y teniendo en consideración entre otros documentos los siguientes:

1. Copia del certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio de Bogotá, expedido el 26 de noviembre de 2024, con matrícula mercantil a nombre de Constriturar SAS, NIT: 830.089.377-5, representada legalmente por Natalia Rodríguez Higuita, identificada con cédula de ciudadanía. No. 1.018.411.748 de Bogotá, quien suscribe el formato FOIC07 de inscripción o renovación en el Directorio de Proveedores.

2. Certificación emitida el 12 de diciembre de 2024, por Gildardo Rodríguez Vargas, en su calidad de titular minero del contrato de concesión 17415, en la que informa:

   "Referencia: Certificación de vigencia del Contrato de Operación.

   Asunto: Renovación del registro 49-2002 del Directorio Ambiental de Proveedores del I.D.U.

[1] Resolución No. 001330 del 01 de abril de 2019, "Por medio de la cual se establecen los lineamientos del Directorio de Proveedores de Materiales de Construcción, Sitios de Disposición final, Transformación y Aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición RCD del IDU".

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web
https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia
Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 11031
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195
FO-DO-07_V15

GILDARDO RODRIGUEZ VARGAS, identificado como aparece al pie de mi correspondiente firma, en mi calidad de titular minero y responsable de las obligaciones derivadas del contrato de concesión minera No. 17415, me permito certificar que, a la fecha se encuentra vigente el contrato de operación minera celebrado entre el suscrito y la firma CONSTRITURAR S.A.S., cuya vigencia finaliza el cuatro (04) de octubre de 2031, para lo cual adjunto contrato y modificatorio al contrato. Así mismo, cuento con el conocimiento y autorizo a la empresa mencionada, para adelantar la renovación del registro No. 49-2002 en el directorio ambiental de proveedores, perteneciente a la entidad que usted representa."

3. Copia del pronunciamiento emitido por la Dirección Regional Bogotá D.C – La Calera de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, expedido el 06/12/2024 con el radicado No. 01242010976, suscrito por María Fernanda Zuluaga Martínez, en su calidad de directora operativa, en el que informa:

   "ASUNTO: Exp 7411 - Respuesta al radicado 20241123113: Solicitud de pronunciamiento para la Renovación Directorio de proveedores IDU

   Cordial saludo,

   En atención a su solicitud, se informa que consultado el SAE., se evidenció que bajo el expediente 7411, el señor GILDARDO RODRÍGUEZ VARGAS, identificado con cédula de ciudadanía 3.020.892, es titular del contrato de concesión minera No. 17415, el cual le fue aprobado mediante Resolución 407 del 02 de abril de 2002, un Plan de Manejo Ambiental, para mitigar, controlar y compensar el deterioro de los Recursos Naturales presentado por la actividad extractiva llevada a cabo en la cantera Bellavista, ubicada en la Vereda Quiba de la localidad de Ciudad Bolívar y a la fecha se encuentra vigente.

   Es de aclarar, que actualmente el Plan de Manejo Ambiental mencionado se encuentra en trámite de actualización y, dentro de este no se encontró información de medidas preventivas, ni con procesos sancionatorios ejecutoriados, que afecten el citado instrumento ambiental.

   Así mismo, se informa que a través del Auto DRBC 338 del 23 de abril de 2018, se declaró iniciado el trámite de modificación y/o actualización del Plan de Manejo Ambiental –PMA., aprobado por medio de la Resolución No. 407 de 02 de abril de 2002."

4. Copia del Certificado de Registro Minero del expediente No. 17415, con fecha de expedición del 04 de diciembre de 2024, cuya vigencia es desde el 25 de marzo de 1994, hasta el 04 de octubre de 2031, cuyo titular es Gildardo Rodríguez Vargas, con cedula de ciudadanía No. 3020892, con un área total de 218 hectáreas y 1597

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web
https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia
Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 11031
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195
FO-DO-07_V15

metros cuadrados, ubicado en el municipio de Bogotá DC, y contempla como minerales: Materiales de Construcción.

5. Copia del certificado del Registro Único de Comercializadores de Minerales – RUCOM No. 2024112629638, el cual certifica:

   "En cumplimiento del Capítulo 6º del Decreto Único Reglamentario del Sector de Minas y Energía No. 1073 del 25 de mayo de 2015, la Agencia Nacional de Minería certifica que CONSTRITURAR S.A.S. con NIT número 830089377 acredita la calidad de comercializador autorizado inscrito en el Registro Único de Comercializadores de Minerales.

   La presente certificación permite al comercializador realizar de forma regular la actividad de comprar y vender minerales para transformarlos, beneficiarlos, distribuirlos, intermediarlos, exportarlos o consumirlos y tiene una vigencia del 28-11-2024 hasta el 31-07-2025. Durante el mes de mayo de 2025 el interesado debe realizar los trámites de renovación indicada en el Decreto 1073 de 2015.

   Se acredita al comercializador de minerales luego de verificar y validar la información suministrada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN - y consultar en la Base de datos de Confecámaras.

   EL PRESENTE CERTIFICADO NO AUTORIZA AL COMERCIALIZADOR A REALIZAR ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN DE MINERALES.

   Los minerales autorizados para ser comercializados son: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, RECEBO (MIG), OTRAS ROCAS O PIEDRAS TRITURADAS PARA CONSTRUCCIÓN NCP.

   Dado en Bogotá D.C., a los 28 días del mes de noviembre del año 2024."

Esta Dirección Técnica, informa que la documentación presentada cumple con los requisitos establecidos en la Resolución IDU No. 001330 de 2019, por cuanto procede a realizar la Renovación de vigencia del Registro número 49 - 2002, dentro del "*Directorio Ambiental de Proveedores de Materiales de Construcción, Sitios de Disposición final, Transformación y Aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición RCD del IDU"*, en la categoría de *Agregados Pétreos*, a nombre de Constriturar SAS, como comercializador del título Minero No. 17415, cuya planta se encuentra ubicada en el Parque Minero Industrial el Mochuelo, vereda Pasquilla, de la Localidad de Ciudad Bolívar, en la Ciudad de Bogotá D.C.

Esta Renovación cuenta con vigencia hasta el día 31 de julio de 2025, según la vigencia del certificado RUCOM en calidad de comercializador y podrá ser cancelada

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web
https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia
Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 11031
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195
FO-DO-07_V15

en cualquier momento por este Instituto conforme a las siguientes causales establecidas en el artículo 7° de la Resolución IDU No. 001330 de 2019, así:

- "Cuando se imponga medidas sancionatorias o cualquier suspensión que implique el cese de actividades del proveedor por parte de la autoridad competente.

- Cuando deje de cumplir alguno de los requisitos de inscripción o renovación establecidos en el procedimiento de Actualización Directorio Ambiental de Proveedores."

Igualmente, se establece por disposición de la misma Resolución IDU No. 001330, que dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes, se deberá reportar a esta Dirección Técnica[2] los volúmenes de las cantidades de materiales suministrados únicamente a Contratos del IDU, en el formato FOIC06, dispuesto en el siguiente enlace de la página Web del Instituto: https://www.idu.gov.co/page/siipviales/ambiental/portafolio.

Es importante aclarar que el citado Formato FOIC06 de Reporte que presentan ante este Directorio, es diferente a la Certificación de venta del material que es entregada al Contratista IDU.

Finalmente, es de informar, que se remite copia de la presente comunicación a la Dirección Regional Bogotá D.C – La Calera de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, para conocimiento y fines pertinentes en el marco de sus competencias como autoridad ambiental.

Cordialmente,

SULLY MAGALIS ROJAS BAYONA
Directora Técnica de Inteligencia de Negocio e Innovación
Firma mecánica generada el 10-01-2025 11:51:32 AM autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Con Copia a: DIRECCION REGIONAL BOGOTA DC - LA CALERA CAR - Bogotá DC - Bogotá - KR 10 16 82 P 4 - sau@car.gov.co

Elaboró: NELSON ANDRES ROMERO CARDENAS-Dirección Técnica de Inteligencia de Negocio e Innovación

2 Hoy Dirección Técnica de Inteligencia de Negocio e Innovación, de conformidad con la modificación de la denominación de la dependencia establecida en los artículos 2 y 14 del Acuerdo 06 de 2021 expedido por el Consejo Directivo del IDU.

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web
https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia
Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 11031
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195
FO-DO-07_V15

Certificado Registro Único de Comercializadores de Minerales RUCOM

Registro

RUCOM-2023051924443

En cumplimiento del Capítulo 6º del Decreto Único Reglamentario del Sector de Minas y Energía No. 1073 del 25 de mayo de 2015, la Agencia Nacional de Minería certifica que DEC CONSTRUCCIONES SAS con NIT número 901505369 acredita la calidad de comercializador autorizado inscrito en el Registro Único de Comercializadores de Minerales.

La presente certificación permite al comercializador realizar de forma regular la actividad de comprar y vender minerales para transformarlos, beneficiarlos, distribuirlos, intermediarlos, exportarlos o consumirlos y tiene una vigencia del 04-06-2025 hasta el 31-07-2026. Durante el mes de mayo de 2026 el interesado debe realizar los trámites de renovación indicada en el Decreto 1073 de 2015.

Se acredita al comercializador de minerales luego de verificar y validar la información suministrada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN - y consultar en la Base de datos de Confecámaras.

EL PRESENTE CERTIFICADO NO AUTORIZA AL COMERCIALIZADOR A REALIZAR ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN DE MINERALES.

Los minerales autorizados para ser comercializados son: ARENAS Y GRAVAS SILÍCEAS ELABORADAS (TRITURADAS, MOLIDAS O PULVERIZADAS), ARENAS Y GRAVAS NATURALES Y SILICEAS

Dado en Bogotá D.C., a los 4 dias del mes de junio del año 2025.

JAIME ALONSO GARCÍA ARANGO
Gerente - Grupo de Regalías y Contraprestaciones Económicas

CARLOS ARBEY CEDENO OSSO
04-06-2025 08:30

Este documento ha sido firmado digitalmente con un certificado provisto por una entidad autorizada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 28 de la ley 527 de 1999, y 15 del Decreto 1747 de 2000. La firma digital aquí impuesta es el equivalente electrónico de la firma manuscrita.
La autenticidad del presente certificado podrá ser validada ingresando a www.anm.gov.co, con el número Registro RUCOM disponible en este certificado.

PL-VR 342-1136

Bogotá, octubre 06 de 2.025

Señores
INGECOP OBRAS CIVILES
Ciudad

Referencia, entrega de documentos ambientales planta de asfalto

Respetados señores,

De acuerdo a la solicitud realizada al área comercial de la empresa, estamos entregando copia de los siguientes documentos correspondientes a la planta de asfalto

- Copia de la resolución 50227000026 del 03 de febrero de 2.022, por medio de la cual se renueva un permiso de emisiones atmosféricas de fuentes fijas y se dictan otras disposiciones

- Copia del certificado de registro IDU 302 de 2.009

Cordialmente,

FELIPE ATUESTA BECERRA.
REPRESENTANTE LEGAL
DOBLE A INGENIERÍA S.A.S.
SI-058

DTINI
20252350004621 1
Información Pública
Al responder cite este número

Bogotá D.C., Enero 17 de 2025

Señor
FELIPE ATUESTA BECERRA
DOBLE A INGENIERIA
CALLE 79 B 8 11
gerencia@dai.com.co
Bogotá - Bogotá DC

REF: Envío Respuesta al Radicado Número 20255260003323 2.

Asunto: Renovación de vigencia Registro No. 302 - 2009 en el Directorio de Proveedores de Materiales de Construcción, Sitios de Disposición final, Transformación y Aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición RCD del IDU.

Respetado señor:

En atención al radicado de la referencia, relacionado con la Renovación de vigencia del Registro IDU No. 302 - 2009, en la categoría de *Mezclas Asfálticas* del Directorio de Proveedores[1], una vez revisada la información aportada, y teniendo en consideración entre otros documentos los siguientes:

1. Copia del certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio de Bogotá, expedido el 22 de noviembre de 2024, con matrícula mercantil a nombre de la empresa Doble A Ingenieria SAS, con NIT: 860.072.279-6, representada legalmente por Felipe Atuesta Becerra, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.980.125 de Bogotá DC, quien suscribe el formato FOIC07 de inscripción o renovación en el Directorio de Proveedores.

2. Copia del pronunciamiento, emitido por la Dirección Regional Sabana Occidente de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, expedido el 23/12/2024, con el radicado No. 10242010477, suscrito por Mercy Johanne Ospina Cuartas, en su calidad de director regional, en el que informa:

   "ASUNTO: Respuesta al radicado 20241125554: SOLICITUD.

   Cordial saludo.

[1] Resolución No. 001330 del 01 de abril de 2019, "Por medio de la cual se establecen los lineamientos del Directorio de Proveedores de Materiales de Construcción, Sitios de Disposición final, Transformación y Aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición RCD del IDU".

DOCUMENTO VALIDO UNICAMENTE PARA INFRACOBRAS CIVILES, CONSORCIO EC 2025

Subsistema de Gestión Antisoborno - IDU
denuncia.soborno@idu.gov.co
Para descargar la versión firmada mecánicamente puede escanear el código QR

DTINI
20252350004621 1
Información Pública
Al responder cite este número

En atención a su petición radicada bajo el número relacionado en el asunto, de manera atenta me permito informarle que una vez revisado en el Sistema de Administración de Expedientes "SAE", el expediente 1393, se observa que mediante Resolución No. 151 del 11 de mayo de 2001, modificada con la Resolución No. 286 del 1 de octubre de 2001, renovada con la Resolución No. 69 del 29 de enero de 2007, a su vez modificada parcialmente con la Resolución No. 352 del 27 de febrero de 2009 y renovada a través de las Resoluciones Nos. 339 del 3 de febrero de 2012, 299 del 8 de febrero de 2017 y la Resolución DJUR No. 50227000026 del 3 de febrero de 2022 , la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, otorgó a favor de la sociedad DOBLE A INGENIERIA S.A.S., con NIT 860.072.279-6, permiso de emisiones atmosféricas para fuentes fijas, para la operación del tambor secador de la Planta de Asfalto CMI, con capacidad de 240 ton/h y la planta Astecnica modelo DC 60, con capacidad de 240 ton/h, localizadas en el predio denominado Vista Hermosa, identificado con matrícula inmobiliaria No. 50C-1254121 y cédula catastral No. 000000060047000 ubicado en la vereda Balsillas, del Municipio de Mosquera, Cundinamarca, según las especificaciones técnicas por ella presentadas y aplicando las normas de emisión establecidas en el artículo 4 de la Resolución MAVDT 909 de 2008, para actividades industriales nuevas y/o existentes.

Así mismo, al ser revisado el referido expediente, como el Sistema de Administración de Expedientes "SAE", se determina, que a la fecha la citada sociedad no ha sido objeto de imposición de medidas preventivas o trámites administrativos ambientales de carácter sancionatorio por el incumplimiento de las obligaciones a ella impuestas en el marco del permiso de emisiones atmosféricas que le ha sido otorgado."

Esta Dirección Técnica, informa que la documentación presentada cumple con los requisitos establecidos en la Resolución IDU No. 001330 de 2019, por cuanto procede a realizar la Renovación de vigencia del Registro número 302 - 2009, dentro del "*Directorio Ambiental de Proveedores de Materiales de Construcción, Sitios de Disposición final, Transformación y Aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición RCD del IDU*", en la categoría de *Mezclas Asfálticas*, a nombre de la empresa Doble A Ingenieria SAS, para la planta Astenica modelo DC60, ubicada en el predio vista hermosa, en la vereda Balsillas - kilómetro 2.5 vía la mesa, del Municipio de Mosquera - Cundinamarca.

Esta Renovación cuenta con vigencia de un (1) año, a partir del 12 de febrero de 2025 y podrá ser cancelada en cualquier momento por este Instituto conforme a las siguientes causales establecidas en el artículo 7° de la Resolución IDU No. 001330 de 2019, así:

- *"Cuando se imponga medidas sancionatorias o cualquier suspensión que implique el cese de actividades del proveedor por parte de la autoridad competente.*

DOCUMENTO VALIDO UNICAMENTE PARA INGRESO OBRAS CIVILES CONSORCIO DC 2025

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web
https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia
Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 11031
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Línea 195
FO-DO-07_V15

- *Cuando deje de cumplir alguno de los requisitos de inscripción o renovación establecidos en el procedimiento de Actualización Directorio Ambiental de Proveedores."*

Igualmente, se establece por disposición de la misma Resolución IDU No. 001330, que dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes, se deberá reportar a esta Dirección Técnica[2] los volúmenes de las cantidades de materiales suministrados únicamente a Contratos del IDU, en el formato FOIC00, dispuesto en el siguiente enlace de la página Web del Instituto: https://www.idu.gov.co/page/siipviales/ambiental/portafolio.

Es importante aclarar que el citado Formato FOIC00 de Reporte que presentan ante este Directorio, es diferente a la Certificación de venta del material que es entregada al Contratista IDU.

Finalmente, es de informar, que se remite copia de la presente comunicación a la Dirección Regional Sabana Occidente de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, para conocimiento y fines pertinentes en el marco de sus competencias como autoridad ambiental.

Cordialmente,

SULLY MAGALIS ROJAS BAYONA
Directora Técnica de Inteligencia de Negocio e Innovación
Firma mecánica generada el 17-01-2025 05:14:07 PM autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Con Copia a: DIRECCION REGIONAL SABANA OCCIDENTE CAR - Cundinamarca - Facatativa - KR 4 4 38 - sau@car.gov.co
Elaboró: NELSON ANDRES ROMERO CARDENAS-Dirección Técnica de Inteligencia de Negocio e Innovación

DOCUMENTO VALIDO UNICAMENTE PARA INGECOP OBRAS CIVILES, CONSORCIO DC 2023

2 Hoy Dirección Técnica de Inteligencia de Negocio e Innovación, de conformidad con la modificación de la denominación de la dependencia establecida en los artículos 2 y 14 del Acuerdo 06 de 2021 expedido por el Consejo Directivo del IDU.

RESOLUCIÓN DJUR No. 50227000026 de 3 FEB. 2022

Por medio de la cual se renueva un permiso de emisiones atmosféricas de fuentes fijas y se toman otras determinaciones

El DIRECTOR JURÍDICO (E) DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR, con fundamento en el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, Decreto Ley 2811 de 1974, Decreto 01 de 1984 en armonía con el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, Decreto 1076 de 2015 y, en ejercicio de las facultades legales delegadas por la Dirección General mediante la Resolución 3404 del 1 de diciembre de 2014, aclarada y adicionada por la Resolución 3443 del 2 de diciembre de 2014, y

CONSIDERANDO

ANTECEDENTES

Que a través de la Resolución No. 299 del 8 de febrero de 2017, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, renovó por el término de cinco (5) años contados a partir del 7 de febrero de 2017, el permiso de emisiones atmosféricas para fuentes fijas otorgado mediante la Resolución No. 151 del 11 de mayo de 2001, modificada con la Resolución No. 286 del 1 de octubre de 2001, renovada con la Resolución No. 69 del 29 de enero de 2007, a su vez modificada parcialmente con la Resolución No. 352 del 27 de febrero de 2009 y renovada a través de la Resolución No. 339 del 3 de febrero de 2012, a favor de la sociedad DOBLE A INGENIERIA S.A.S., con NIT 860.072.279-6, para la operación del tambor secador de la Planta de Asfalto CMI, con capacidad de 240 ton/h y la planta Astecnica modelo DC 60, con capacidad de 240 ton/h, localizadas en el predio denominado Vista Hermosa, identificado con matrícula inmobiliaria No. 50C-1254121, ubicado en la vereda Balsillas, del Municipio de Mosquera, Cundinamarca. (Folios 2712 – 2722)

Que la mencionada Resolución, fue notificada personalmente el día el 10 de febrero de 2017 a la citada sociedad. (Folio 2722 reverso).

Que por medio de documento con radicado CAR No. 10211000995 del 22 de octubre de 2021, la sociedad DOBLE A INGENIERIA S.A.S., a través del doctor Felipe Atuesta Becerra, en calidad de representante legal, solicitó a esta Corporación dar inicio al trámite de renovación del permiso de emisiones atmosféricas para la Planta Vista Hermosa. (Folios 3276 – 3288)

Que en atención de lo anterior, esta Corporación mediante Auto DRSO No. 1289 del 3 de noviembre de 2021, dio inicio al trámite administrativo ambiental de renovación del permiso de emisiones atmosféricas, ordenó la práctica de una visita técnica, realizó cobro por concepto del servicio de evaluación ambiental y tomó otras determinaciones. (Folios 3298 – 3302)

Que el citado Auto, fue publicado en el Boletín oficial de la Corporación el día 5 de noviembre del año 2021.

DOCUMENTO VALIDO UNICAMENTE PARA TRAMITES; CONSORCIO
RECEPCIONADO POR DOBLE A INGENIERIA S.A.S.

RESOLUCIÓN DJUR No. 50227000026 de 3 FEB. 2022

Por medio de la cual se renueva un permiso de emisiones atmosféricas de fuentes fijas y se toman otras determinaciones

Que el Auto DRSO No. 1289 del 3 de noviembre de 2021, fue notificado a la sociedad DOBLE A INGENIERIA S.A.S., por conducta concluyente en virtud del pago por concepto del servicio de evaluación ambiental aportado con radicación No. 10211001098 del 16 de noviembre de 2021, en cumplimiento de lo ordenado por el artículo 96 de la Ley 633 de 2000, que modificó el artículo 28 de la Ley 344 de 1996, facultando a las entidades ambientales para cobrar el servicio de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones y demás instrumentos de control. (Folios 3327 – 3328)

Que el área técnica de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, realizó visita al predio denominado Vista Hermosa, el día 16 de noviembre de 2021, con el propósito de evaluar la solicitud de renovación del permiso de emisiones atmosféricas otorgado por la Entidad, emitiendo el Informe Técnico DRSO No. 1330 del 20 de noviembre de 2021, donde se determinó lo siguiente:

"(...)
V. EVALUACIÓN DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Solicitud de permiso de emisiones atmosféricas para fuentes fijas

	ÍTEMS	Documento Presentado
1.	*Formulario Único Nacional de Solicitud de Permiso de Emisiones Atmosféricas y Fuentes Fijas, diligenciado.*	*Si*
2.	*Nombre o razón social del solicitante; y del representante legal o apoderado, si los hubiere, con indicación de su domicilio.*	*Si*
3.	*Localización de las instalaciones, del área o de la obra.*	*Si*
4.	*Concepto sobre uso del suelo del establecimiento, obra o actividad, expedido por la autoridad municipal o distrital competente, o en su defecto, los documentos públicos u oficiales contentivos de normas y planos, o las publicaciones oficiales que sustenten y prueben la compatibilidad entre la actividad u obra proyectada y el uso permitido del suelo.*	*Si*
5.	*Estudio técnico de evaluación de las emisiones de sus procesos de combustión o producción; se deberá anexar además información sobre consumo de materias primas, combustibles y otros materiales utilizados.*	*Si*
6.	*Diseño de los sistemas de control de emisiones atmosféricas existentes o proyectados, su ubicación e informe de ingeniería*	*Si*
7.	*Certificado de existencia y representación legal, si es persona jurídica*	*Si*
8.	*Constancia del pago de los derechos de trámite y otorgamiento del permiso, en los términos y condiciones establecidas en el presente Decreto.*	*Si*

Uso del suelo

DOCUMENTO VALIDO UNICAMENTE PARA INGRESO A OBRAS CIVILES CONSORCIO DIC 2025

RESOLUCIÓN DJUR No. 50227000026 de 3 FEB. 2022

Por medio de la cual se renueva un permiso de emisiones atmosféricas de fuentes fijas y se toman otras determinaciones

La sociedad DOBLE A INGENIERIA S.A., allega el Certificado de Uso del Suelo del predio identificado con Cedula Catastral No. 00-00-0006-0047-000, expedido por la secretaria de Planeación y Ordenamiento Territorial del municipio de Mosquera, fechado del día 13 de agosto de 2021, en este se establece su uso principal como Tratamiento Industrial en suelo suburbano y se establece que la actividad es compatible con el uso del suelo.

Informe de emisiones atmosféricas

La información sobre las emisiones contaminantes generadas en el proceso de producción fue evaluada mediante el Informe Técnico DRSO No. 496 del 2 de junio de 2021 en donde se establece lo siguiente:

INFORME PREVIO A LA MEDICIÓN DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS 2021

Mediante Radicado No. 10211100061 del 19 de enero de 2021 la sociedad DOBLE A INGENIERÍA S.A. allega a la Corporación el informe previo para la evaluación de emisiones atmosféricas, documentación que se evalúa de la siguiente manera:

Requisitos según Protocolo para el Control y Vigilancia de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas	Cumplimiento		Observaciones
	SI	No	
Presentar el informe con una antelación de treinta (30) días calendario a la fecha de realización de la evaluación de emisiones.	X		El industrial allega el informe previo 30 días antes de realizarse el monitoreo.
Objetivos de la realización de la evaluación de emisiones atmosféricas	X		Presenta objetivos del estudio.
Certificación por parte del representante legal de la empresa que constate que la evaluación de emisiones atmosféricas se realizara con base en los métodos y procedimientos siempre y cuando estén adoptados por el Ministerio y publicados por el IDEAM.	X		El señor Luis Fernando Penagos Representante legal suscribe la carta de presentación del documento avalando su contenido.
Fecha en la cual se realizará la evaluación de las emisiones por cualquiera de los procedimientos	X		El industrial informa que el monitoreo se llevara a cabo el 22, 23 y 24 de febrero de 2021.
Nombre del responsable que realizara la evaluación de las emisiones, acreditado por el IDEAM	X		La empresa responsable de los muestreos es PYT ECONTROL LTDA.
Descripción de los procesos que serán objeto de la evaluación, incluyendo los equipos asociados, la cantidad y caracterización de las materias primas, el tipo y consumo de combustible.	X		Relaciona la descripción del proceso en un capítulo e incluye Diagrama de flujo del proceso.
El informe previo que se envíe a la autoridad ambiental competente deberá estar en original y en idioma español.	X		El informe presentado es original y en idioma español.

INFORME FINAL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS 2021

DOCUMENTO VALIDO UNICAMENTE PARA INGRESO DE OBRAS CIVILES, CONSORCIO DC 2025

RESOLUCIÓN DJUR No. 50227000026 de 3 FEB. 2022

Por medio de la cual se renueva un permiso de emisiones atmosféricas de fuentes fijas y se toman otras determinaciones

Mediante Radicado No. 10211100410 del 20 de abril de 2021 la sociedad DOBLE A INGENIERÍA S.A.S, aporta el informe final de emisiones atmosféricas de la Planta de asfalto para su correspondiente evaluación, documentación que se evalúa de la siguiente manera:

Información general del informe

Numero de fuentes	Dos (2)
Identificación de las fuentes	Plantas ASTECNIA y CMI
Métodos utilizados para el análisis	1, 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 8 y 29.
Empresa encargada de realizar los muestreos isocinéticos	PYT ECONTROL LTDA.
Fecha de muestreos	23 y 24 de febrero de 2021.

Fuentes evaluadas

Tipo de Fuente de Emisión	Planta de mezcla asfáltica por lotes
Marca	ASTECNIA
Modelo	ABC SOLIDBACHT 180
Serie	180
Capacidad Nominal	120 ton/h
Combustible	Fuel-Oil
Consumo promedio del quemador (gal/día)	945,4
Consumo día del muestreo (gal)	1143,8
Producción promedio (m^3/día)	249,21
Producción día del muestreo (m^3)	360,8
Tipo de sección chimenea	Circular
Tipo de Fuente de Emisión	Planta de mezcla asfáltica por lotes
Marca	CMI
Modelo	ABC SOLIDBACHT 180
Serie	120
Capacidad Nominal	120 ton/h
Combustible	Fuel-Oil
Consumo promedio del quemador (gal/día)	945,4
Consumo día del muestreo (gal)	827
Producción promedio (m^3/día)	137,16
Producción día del muestreo (m^3)	287,29
Tipo de sección chimenea	Circular

Estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para actividades industriales comparados con los establecidos por la Resolución 909 de 2008. (Artículo 4)

DOCUMENTO VALIDO UNICAMENTE PARA INGECOB OBRAS CIVILES, CONSORCIO DC 2025

RESOLUCIÓN DJUR No. 50227000026 de 3 FEB. 2022

Por medio de la cual se renueva un permiso de emisiones atmosféricas de fuentes fijas y se toman otras determinaciones

ESTÁNDARES DE EMISIÓN ADMISIBLES DE CONTAMINANTES (mg/m^3)			
Fuente	**Contaminante**	**Concentración Corregida por Oxigeno**	**Límite Normativo**
Planta CMI	Material Particulado (MP)	138,6	150
	Dióxido de Azufre (SO_2)	217,7	550
	Óxidos de Nitrógeno (NO_X)	250,4	550
	Cadmio (Cd)	0,14	1
	Plomo (Pb)	0,65	1
Planta ASTECNIA	Material Particulado (MP)	44,3	50
	Dióxido de Azufre (SO_2)	225,2	500
	Óxidos de Nitrógeno (NO_X)	209,9	500
	Cadmio (Cd)	0,091	1
	Plomo (Pb)	0,513	1

Con lo anterior se determina que la operación de las plantas ASTECNIA y CMI dan cumplimiento a los estándares de emisión establecidos por la Resolución MAVDT No. 909 de 2008.

VI. CONCEPTO TÉCNICO

(...)

*Por otra parte, el área objeto de estudio **NO** se encuentra dentro del polígono de la Reserva Forestal Protectora Productora de la Cuenca Alta del Rio Bogotá (RFPP Rio Bogotá), establecida en el Artículo 2 del Acuerdo No. 30 de 1976 emanado del INDERENA, aprobado posteriormente mediante la Resolución Ejecutiva No. 76 de 1977, modificado por la Resolución No. 138 del 31 de enero de 2014, por medio de la cual se realindera el polígono de la RFPP de la Cuenca Alta del Rio Bogotá.*

Teniendo en cuenta el ajuste y actualización del Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Rio Bogotá - POMCA Rio Bogotá – los cuales se aprobaron mediante la Resolución No. 0957 del 2 de abril de 2019 emitida en conjunto por la CAR, CORPOGUAVIO y CORPORINOQUIA y de acuerdo con el plano de Zonificación del Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Rio Bogotá - POMCA Rio Bogotá -, se establece que el área de estudio se encuentra ubicada en un área de la categoría de Uso Múltiple y para el predio se tiene una zonificación ambiental catalogada como Áreas de recuperación para el uso múltiple (ARUM).

(...)

De la visita y evaluación documental.

DOCUMENTO VALIDO UNICAMENTE PARA INGECOP OBRAS CIVILES, CONSORCIO DIC 2025

RESOLUCIÓN DJUR No. 50227000026 de 3 FEB. 2022

Por medio de la cual se renueva un permiso de emisiones atmosféricas de fuentes fijas y se toman otras determinaciones

DOCUMENTO VALIDO UNICAMENTE PARA INGECOBRAS SAS ESP CONSORCIO VILLES 2025

- *Durante la visita técnica se pudo apreciar una adecuada organización interna y operación en la planta de producción, así mismo se recomienda mantener activos los planes de limpieza y mantenimiento de los equipos del proceso productivo a fin de evitar posibles contingencias o fallos en el proceso.*

- *Revisada la documentación presentada se evidencia que la misma* ***CUMPLE*** *con los requerimientos establecidos por el Decreto Único Ambiental No. 1076 de 2015 para la solicitud de renovación del permiso de emisiones atmosféricas para fuentes fijas.*

- *El uso del suelo presentado por la sociedad DOBLE A INGENIERÍA S.A. para el predio donde se adelanta la actividad es* ***COMPATIBLE*** *con el uso de tipo industrial.*

- *Después de la medición y evaluación de las emisiones de la fuente objeto de estudio, se pudo determinar que esta* ***CUMPLE*** *con los estándares de emisión establecidos en la Resolución 909 del 2008, para estos equipos.*

- *Una vez estudiado y evaluado el informe para la evaluación de emisiones atmosféricas se evidencia que* ***CUMPLE*** *con los requisitos establecidos por la Resolución 2153 del 2010.*

- *La altura del ducto de descarga CUMPLE con la altura mínima requerida según lo establecido por el Numeral 4 de la resolución 2153 de 2010 "Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas" modificada por la resolución 1632 de 2012, mediante los lineamientos establecidos en el numeral 4.5 "Metodología adicional para la aplicación de Buenas Prácticas de Ingeniería (BPI)".*

Cumplimiento a la resolución MAVDT 909 del 5 de junio de 2008.

Se realiza la evaluación del cumplimiento de la Resolución MAVDT 909 del 5 de junio de 2008 "Por la cual se establecen las normas y estándares de emisión admisibles de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas y se dictan otras disposiciones" por medio de una lista de chequeo así:

EVALUACIÓN DE LA RESOLUCIÓN MAVDT 909 DEL 5 DE JUNIO DE 2008			
ARTICULO	**Cumplimiento**		**OBSERVACIONES**
	Si	**No**	
Artículo 7: Estándares de emisión admisibles para equipos de combustión externa existentes a condiciones de referencia (25 °C, 760 mm Hg) con oxigeno de referencia del 11%.	*X*		*El industrial* **CUMPLE** *con los límites permisibles de emisiones atmosféricas en los informes de evaluación evaluados en el presente documento.*
Capitulo XVII. Determinación del punto de descarga de la emisión por fuentes fijas			

RESOLUCIÓN DJUR No. 50227000026 de 3 FEB. 2022

Por medio de la cual se renueva un permiso de emisiones atmosféricas de fuentes fijas y se toman otras determinaciones

Artículo 69 *Obligatoriedad de construcción de un ducto o chimenea. Toda actividad que realice descargas de contaminantes a la atmósfera debe contar con un ducto o chimenea cuya altura y ubicación favorezca la dispersión de éstos al aire, cumpliendo con los estándares de emisión que le son aplicables.*	X		*Las fuentes fijas Objeto de los monitoreos cuentan con ducto de descarga.*
Artículo 70. *Determinación de la altura del punto de descarga. La altura del punto de descarga (chimenea o ducto) se determinará con base en la altura o el ancho proyectado de las estructuras cercanas, entre otros criterios, siguiendo las Buenas Prácticas de Ingeniería tanto para instalaciones existentes como nuevas, establecidas en el Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas. En todo caso, la altura mínima debe garantizar la dispersión de los contaminantes.*	X		*Evaluado en informes técnicos previos*
Artículo 71. *Localización del sitio de muestreo. Todas las actividades industriales, los equipos de combustión externa, las actividades de incineración de residuos y los hornos crematorios que realicen descargas de contaminantes a la atmósfera deben contar con un sistema de extracción localizada, chimenea, plataforma y puertos de muestreo que permitan realizar la medición directa y demostrar el cumplimiento normativo.*	X		*La localización de los puntos de muestreo se ciñe a lo estipulado en el método US EPA 1.*
Capítulo XVIII. Medición de emisiones para fuentes fijas			
Artículo 72. *Métodos de medición de referencia para fuentes fijas. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial adoptará a nivel nacional el Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas. Dicho protocolo contendrá los métodos de medición de referencia para fuentes fijas, los procedimientos de evaluación de emisiones, la realización de estudios de emisiones atmosféricas y vigilancia y control de la contaminación Atmosférica por fuentes fijas. Las mediciones de las emisiones atmosféricas deben estar de acuerdo con lo establecido en el Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas.*	X		*Usa los métodos de referencia.*
Artículo 79. *Plan de contingencia*	X		*Aprobado mediante la resolución que otorga el permiso*
Artículo 95. *Registro Único Ambiental. Están obligados a diligenciar el Registro Único Ambiental, RUA, todos los establecimientos, cuyas actividades o equipos, de acuerdo con*	X		*Cumple con el registro de información en la plataforma del IDEAM*

DOCUMENTO VALIDO UNICAMENTE PARA OBRAS CIVILES CONSORCIO DC 2025

RESOLUCIÓN DJUR No. 50227000026 de 3 FEB. 2022

Por medio de la cual se renueva un permiso de emisiones atmosféricas de fuentes fijas y se toman otras determinaciones

la normativa ambiental vigente, requieran licencia ambiental, plan de manejo ambiental y/o permiso de emisiones.			

(...)"

Que el Informe Técnico DRSO No. 1330 del 20 de noviembre de 2021, fue complementado con el Informe Técnico DRSO No. 068 del 27 de enero de 2022, donde se determinó:

(...)

VI. CONCEPTO TÉCNICO

De acuerdo con las coordenadas tomadas en campo (Norte: 1009874, Este: 978838, Altura: 2556 m.s.n.m.) y a la información cartográfica de la Corporación se determina que el área objeto de visita pertenece al predio identificado con cedula catastral No. 25473000000000060039000000000, localizado en la vereda Balsillas del municipio de Mosquera, Cundinamarca.



Figura 1. Identificación del área objeto de visita.
Fuente: Plataforma Geoambiental (Cartografía CAR)
geoambiental.car.gov.co/GeoAmbiental

De igual manera, se debe corregir la información sobre la zonificación ambiental del predio establecida en el Informe Técnico DRSO No. 1330 del 20 de noviembre de 2021 la cual se define de la siguiente manera:

Zonificación Ambiental

DOCUMENTO VALIDO UNICAMENTE PARA INGECOP OBRAS CIVILES, CONSORCIO DC 2025

RESOLUCIÓN DJUR No. 50227000026 de 3 FEB. 2022

Por medio de la cual se renueva un permiso de emisiones atmosféricas de fuentes fijas y se toman otras determinaciones

*Consultando la información de áreas protegidas de la Corporación, se determina que el área de estudios **NO** se encuentra dentro de las áreas de reserva declaradas por la misma, de igual forma, el área objeto de estudio **NO** se encuentra dentro del polígono de la Reserva Forestal Protectora Productora de la Cuenca Alta del Río Bogotá (RFPP Rio Bogotá), establecida en el Artículo 2 del Acuerdo No. 30 de 1976 emanado del INDERENA, aprobado posteriormente mediante la Resolución Ejecutiva No. 76 de 1977, modificado por la Resolución No. 138 del 31 de enero de 2014, por medio de la cual se realindera el polígono de la RFPP de la Cuenca Alta del Rio Bogotá.*

Teniendo en cuenta el ajuste y actualización del Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Rio Bogotá - POMCA Rio Bogotá – los cuales se aprobaron mediante la Resolución No. 0957 del 2 de abril de 2019 emitida en conjunto por la CAR, CORPOGUAVIO y CORPORINOQUIA y de acuerdo con el plano de Zonificación del Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Rio Bogotá - POMCA Rio Bogotá - se establece que el área de estudio se encuentra ubicada en un área de la categoría de Uso Múltiple y para el predio se tiene una zonificación ambiental catalogada como Áreas de recuperación para el uso múltiple (ARUM)..."

FUNDAMENTOS LEGALES

Que de conformidad con el artículo 8 de la Constitución Política de 1991, es obligación del Estado y de los particulares proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.

Que la Carta Política elevó a rango Constitucional la obligación que tiene el Estad de proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos de gozar de un ambiente sano. El medio ambiente es un derecho colectivo que debe ser protegido por el Estado, estableciendo todos los mecanismos necesarios para su protección.

Que el Decreto Ley 2811 de 1974 "*Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente*", consagra en su artículo 1°, que el ambiente es patrimonio común y que el Estado y los Particulares deben participar en su preservación y manejo, por ser de utilidad pública e interés social.

Que el Decreto 1076 de 2015 "*Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible*", establece las normas y principios generales para la protección del aire en todo el territorio nacional; y así mismo, regula lo concerniente al agotamiento de permisos de emisión atmosférica, los instrumentos y medio de control y vigilancia respectivos,

DOCUMENTO VALIDO CAR-UT
PARA SECTOR OBRAS CIVILES CONSORCIO
DC 2025

RESOLUCIÓN DJUR No. 50227000026 de 3 FEB. 2022

Por medio de la cual se renueva un permiso de emisiones atmosféricas de fuentes fijas y se toman otras determinaciones

Que el artículo 2.2.5.1.6.2 del Decreto 1076 de 2015, determina como función de las Corporaciones Autónomas Regionales, la de otorgar los permisos de emisión de contaminantes al aire.

Que conforme a lo previsto en el artículo 2.2.5.1.7.1 del Decreto 1076 de 2015, el permiso de emisión atmosférica es el que concede la autoridad ambiental competente, para que dentro de los límites permisibles establecidos en las normas ambientales respectivas, pueda realizar emisiones al aire.

Que así mismo, el artículo 2.2.5.1.7.2 ibidem, prevé taxativamente, las actividades obras o servicios, públicos o privados que requieren permiso previo, de la siguiente manera:

> ***"ARTÍCULO 2.2.5.1.7.2. CASOS QUE REQUIEREN PERMISO DE EMISIÓN ATMOSFÉRICA.*** *Requerirá permiso previo de emisión atmosférica la realización de alguna de las siguientes actividades, obras o servicios, públicos o privados:*
>
> *a) Quemas abiertas controladas en zonas rurales;*
> *b) Descargas de humos, gases, vapores, polvos o partículas por ductos o chimeneas de establecimientos industriales, comerciales o de servicio;*
> *c) Emisiones fugitivas o dispersas de contaminantes por actividades de explotación minera a cielo abierto;*
> *d) Incineración de residuos sólidos, líquidos y gaseosos;*
> *e) operaciones de almacenamiento, transporte, carga y descarga en puertos susceptible de generar emisiones al aire;*
> *f) Operación de calderas o incineradores por un establecimiento industrial o comercial;*
> *g) Quema de combustibles, en operación ordinaria, de campos de explotación de petróleo y gas;*
> *h) Procesos o actividades susceptibles de producir emisiones de sustancias tóxicas;*
> *i) Producción de lubricantes y combustibles;*
> *j) Refinación y almacenamiento de petróleo y sus derivados; y procesos fabriles petroquímicos;*
> *k) Operación de Plantas termoeléctricas;*
> *l) operación de Reactores Nucleares;*
> *m) Actividades generadoras de olores ofensivos;*
> *n) Las demás que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible establezca, con base en estudios técnicos que indiquen la necesidad de controlar otras emisiones.*
>
> ***PARÁGRAFO 1o.*** *En los casos previstos en los literales a), b), d), f) y m) de este artículo, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible establecerá los factores a partir de los cuales se requerirá permiso previo de emisión atmosférica, teniendo en cuenta criterios tales como, los valores mínimos de consumo de combustibles, los volúmenes de producción, el tipo y volumen de las materias primas consumidas, el tamaño y la capacidad instalada, el riesgo para la salud humana y el riesgo ambiental inherente, la ubicación, la vulnerabilidad del área afectada, el valor del proyecto obra o actividad, el consumo de los recursos naturales y de energía y el tipo y peligrosidad de residuos generados, según sea el caso.*

DOCUMENTO VALIDO UNICAMENTE PARA INGRESO DE OBRAS CIVILES, CONSORCIO D 2021

RESOLUCIÓN DJUR No. 50227000026 de 3 FEB. 2022

Por medio de la cual se renueva un permiso de emisiones atmosféricas de fuentes fijas y se toman otras determinaciones

DOCUMENTO VALIDO UNICAMENTE PARA CONTRATO DE OBRA CONSORCIO DC 2021

PARÁGRAFO 2o. *En los casos de quemas abiertas controladas en zonas rurales que se hagan, bien de manera permanente, como parte integrante y cíclica del proceso productivo agrario, o bien para el descapote de terrenos destinados a explotaciones de pequeña minería a cielo abierto, los permisos de emisión podrán otorgarse, para el desarrollo de la actividad de quemas en su conjunto, a asociaciones o grupos de solicitantes cuando realicen sus actividades en una misma zona geográfica, siempre que de manera conjunta establezcan sistemas de vigilancia y monitoreo de los efectos de la contaminación que generan y sin perjuicio de la responsabilidad de cada cual de efectuar el adecuado y correspondiente control de las quemas y de la dispersión de sus emisiones.*

PARÁGRAFO 3o. *No requerirán permiso de emisión atmosférica las quemas incidentales en campos de explotación de gas o hidrocarburos, efectuadas para la atención de eventos o emergencias.*

PARÁGRAFO 4o. *Las ampliaciones o modificaciones de instalaciones que cuenten con permiso de emisión atmosférica, cuyas especificaciones o características, técnicas, arquitectónicas o urbanísticas, introduzcan variaciones sustanciales a las condiciones de emisión o de dispersión de las sustancias contaminantes emitidas, o que tengan por efecto agregar nuevos contaminantes a las emisiones existentes o aumentar la cantidad de estas, requerirán la modificación previa del permiso vigente.*

PARÁGRAFO 5o. *Las calderas u hornos que utilicen como combustible gas natural o gas licuado del petróleo, en un establecimiento industrial o comercial o para la operación de plantas termoeléctricas con calderas, turbinas y motores, no requerirán permiso de emisión atmosférica.*

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible podrá establecer las condiciones técnicas específicas para desarrollar las actividades a que se refiere el inciso anterior.

Que por su parte, el artículo 2.2.5.1.7.10 del Decreto 1076 de 2015, establece que *"Tanto durante la etapa de otorgamiento como durante la vigencia del permiso de emisión, el solicitante o el titular del permiso podrá ceder a otras personas sus derechos y obligaciones, pero ese acto sólo tendrá efectos una vez se haya comunicado expresamente la cesión a la autoridad ambiental competente. El cedente deberá agregar al escrito en que comunica la cesión, copia auténtica del acto o contrato en que la cesión tiene origen.*

El cesionario sustituye en todos los derechos y obligaciones al solicitante o al titular cedente del permiso, sin perjuicio de la responsabilidad del Cedente, por violación a normas ambientales".

Que el artículo 2.2.5.1.7.12 del Decreto 1076 de 2015, establece frente a la suspensión y revocatoria del permiso de emisiones atmosféricas, lo siguiente:

RESOLUCIÓN DJUR No. 50227000026 de 3 FEB. 2022

Por medio de la cual se renueva un permiso de emisiones atmosféricas de fuentes fijas y se toman otras determinaciones

ARTÍCULO 2.2.5.1.7.12. SUSPENSIÓN Y REVOCATORIA. *El permiso de emisión podrá ser suspendido o revocado, mediante resolución motivada, sustentada en concepto técnico, según la gravedad de las circunstancias que se aprecien, por la misma autoridad ambiental que lo otorgó.*

A) La suspensión del permiso de emisión podrá adoptarse en los siguientes casos:

1. Cuando el titular del permiso haya incumplido cualquiera de los términos, condiciones, obligaciones y exigencias establecidas en el permiso o licencia ambiental única, consagrados en la ley, los reglamentos o en la resolución de otorgamiento.
2. En los eventos de declaratoria de los niveles de prevención, alerta o emergencia. En el acto que ordene la suspensión se indicará el término de duración de la misma, o la condición a que se sujeta el término de su duración.

B) La revocatoria procederá:

1. Cuando el titular haya incumplido las obligaciones, términos y condiciones del permiso o cuando hubiere cometido los delitos de falsedad o fraude, previamente declarados por el juez competente, o grave inexactitud en la documentación o información ambiental suministrada a las autoridades ambientales.
2. Cuando el titular de un permiso suspendido, violare las obligaciones y restricciones impuestas por el acto que ordena la suspensión.
3. Cuando por razones ambientales de especial gravedad o por una grave y permanente amenaza a la salud humana o al ambiente, sea definitivamente imposible permitir que continúe la actividad para la cual se ha otorgado el permiso.
PARÁGRAFO 1o. *En los casos en que la suspensión o la revocatoria se impongan como sanciones por la comisión de infracciones, se seguirá el procedimiento señalado en la Ley 1333 de 2009.*

PARÁGRAFO 2o. *La modificación o suspensión de los permisos de emisión, por razones de precaución, procederá como medida transitoria mientras se restablecen los niveles permisibles de concentración de contaminantes sobre cuya base y en consideración a los cuales dichos permisos fueron expedidos.*

La suspensión del permiso, ordenada como medida de precaución, en razón de su naturaleza, no requerirá de traslado alguno al titular de aquel.

Que el artículo 2.2.5.1.7.13 del Decreto 1076 de 2015, señala que el permiso de emisión podrá ser modificado total o parcialmente, previo concepto técnico, por la misma autoridad ambiental que lo otorgó, a solicitud del titular durante el tiempo de su vigencia, en consideración a la variación de las condiciones de efecto ambiental de la obra, industria o actividad autorizada, que hubieran sido consideradas al momento de otorgar el permiso.

DOCUMENTO VALIDO UNICAMENTE PARA INGRESO ORIGINAL CIVILES CONSORCIO 2022

RESOLUCIÓN DJUR No. 50227000026 de 3 FEB. 2022

Por medio de la cual se renueva un permiso de emisiones atmosféricas de fuentes fijas y se toman otras determinaciones

Que el artículo 2.2.5.1.7.14 del Decreto 1076 de 2015, establece que el permiso de emisiones atmosféricas tendrá una vigencia máxima de cinco (5) años, siendo renovable indefinidamente por periodos iguales, e igualmente, que las modificaciones de los estándares de emisión o la expedición de nuevas normas o estándares de emisión atmosférica, modificarán las condiciones y requisitos de ejercicio de los permisos vigentes.

Que con Resolución No. 909 del 5 de junio de 2008, el hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, modificada parcialmente con la Resolución 1377 de 2015, estableció las normas y estándares de emisión admisibles de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas.

Que el artículo 79 de la Resolución No. 909 del 5 de junio de 2008, modificada parcialmente con la Resolución 1377 de 2015, establece que toda fuente de emisión que cuente con un sistema de control, debe elaborar y enviar a la autoridad ambiental competente para su aprobación, el Plan de Contingencia del Sistema de Control, que ejecutará durante la suspensión del funcionamiento de éste, el cual formará parte del permiso de emisión atmosférica, plan de manejo ambiental o licencia ambiental, según el caso.

Que mediante Resolución No. 619 del 7 de julio de 1997, el hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, establece parcialmente los factores a partir de los cuales se requiere permiso de emisiones atmosféricas para fuentes fijas, enumerando los tipos de industrias, obras o actividades o servicios que deben obtener dichos permisos.

Que el artículo primero de la Resolución No. 619 del 7 de julio de 1997, consagra:

ARTICULO 1o. *Industrias, obras, actividades o servicios que requieren permiso de emisión atmosférica. De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 1 del artículo 73 del Decreto 948 de 1995, las siguientes industrias, obras, actividades o servicios requerirán permiso previo de emisión atmosférica, para aquellas sustancias o partículas que tengan definidos parámetros permisibles de emisión, en atención a las descargas de humos, gases, vapores, polvos o partículas, provenientes del proceso de producción, de la actividad misma, de la incineración de residuos, o de la operación de hornos o calderas, de conformidad con los factores y criterios que a continuación se indican*
:

1. QUEMAS ABIERTAS CONTROLADAS EN ZONAS RURALES: Aquellas cuya área de quema semanal, sea igual o superior a:

1.1. AREA A QUEMAR DE CULTIVO DE CAÑA DE AZUCAR: 25 Hectáreas.
1.2. AREA A QUEMAR POSCOSECHA DE CAÑA DE AZUCAR: 25 Hectáreas.
1.3. AREA A QUEMAR POSCOSECHA DE MAIZ: 25 Hectáreas.
1.4. AREA A QUEMAR POSCOSECHA DE SORGO: 25 Hectáreas.
1.5. AREA A QUEMAR POSCOSECHA DE ALGODON: 25 Hectáreas.

DOCUMENTO VÁLIDO ÚNICAMENTE PARA INGRESO OBRAS CIVILES, CONSORCIO DC 2025

RESOLUCIÓN DJUR No. 50227000026 de 3 FEB. 2022

Por medio de la cual se renueva un permiso de emisiones atmosféricas de fuentes fijas y se toman otras determinaciones

DOCUMENTO VALIDO UNICAMENTE PARA INGRESO A OBRAS CIVILES; CONSORCIO 19 2025

2. DESCARGA DE HUMOS, GASES, VAPORES, POLVOS O PARTICULAS POR DUCTOS O CHIMENEAS DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, COMERCIALES O DE SERVICIOS ASI:

2.1. INDUSTRIA PRODUCTORA DE CEMENTO: Todas las plantas de producción de cemento a partir de cualquier volumen de producción.
2.2. INDUSTRIA CON PROCESO DE SINTERIZACION: Con capacidad de producción a partir de 5 Ton/día.
2.3. INDUSTRIA FABRICANTE DE CARBONATO DE SODIO con capacidad superior a 5 Ton/día.
2.4. INDUSTRIAS DE PRODUCCION DE ACIDO NITRICO: Todas a partir de cualquier volumen de producción.
2.5. INDUSTRIAS DE PRODUCCION DE ACIDO SULFURICO: Todas a partir de cualquier volumen de producción.
2.6. INDUSTRIAS DE FABRICACION DE ACIDO CLORHIDRICO: Todas a partir de cualquier volumen de producción.
2.7. INDUSTRIA DE FABRICANTE DE CAUCHO SINTETICO a partir de 2 Ton/día.
2.9. INDUSTRIA MOLINERA: Molinos, harineras y trilladoras de arroz, café, desmontadoras de algodón y leguminosas, con capacidad de producción igual o superior a 2 Ton/día.
2.10. INDUSTRIA CARBOQUIMICA: Todas las plantas a partir de cualquier volumen de producción.
2.11. FABRICACION DE TELA ASFALTICA a partir de 3 Ton/día de producción.
2.12. INDUSTRIA PRODUCTORA DE LLANTAS Y CAMARAS DE CAUCHO NATURAL Y SINTETICO: Todas a partir de cualquier volumen de producción.
2.13. PLANTAS DE PREPARACION O BENEFICIO DE MINERALES O MATERIALES CERAMICAS O SILICOCALCAREOS: Cuando la capacidad de molienda sea superior a 5 Ton/día.
2.14. INDUSTRIAS DE PRODUCCION DE MEZCLAS ASFALTICAS con hornos de secado de 30 Ton/día o más.
2.15. INDUSTRIA DE FUNDICION DE ACERO con hornos de fundición de más de 2 Ton/día.
2.16. INDUSTRIA DE FUNDICION DE HIERRO GRIS con hornos de fundición de más de 2 Ton/día.
2.17. INDUSTRIA DE FUNDICION DE COBRE Y BRONCE con hornos de fundición de más de 2 Ton/día.
2.18. INDUSTRIA DE FUNDICION DE PLOMO con hornos de fundición y recuperación de 100 Kg/día o más.
2.19. INDUSTRIA DE FUNDICION DE ALUMINIO con hornos de fundición y recuperación de 2 Ton/día o más.
2.20. INDUSTRIA DE PRODUCCION DE DETERGENTES con hornos de rociado y secado a partir de 5 Ton/día.
2.21. INDUSTRIA PRODUCTORA DE CARBURO DE CALCIO con hornos de fundición de 5 Ton/día.
2.22. INDUSTRIA DE PRODUCCION DE COKE METALURGICO: Los hornos de coquización a partir de 10 Ton/día.
2.23. INDUSTRIA SIDERURGICA: Cuando la capacidad del alto horno sea igual o superior a 10 Ton/día.

RESOLUCIÓN DJUR No. 50227000026 de 3 FEB. 2022

Por medio de la cual se renueva un permiso de emisiones atmosféricas de fuentes fijas y se toman otras determinaciones

2.24. INDUSTRIA DE PRODUCCION DE CAL: Cuando la capacidad del horno sea superior a 20 Ton/día.
2.25. INDUSTRIA FABRICANTE DE FIBRA DE VIDRIO: Cuando la capacidad del horno de fusión sea superior a 2 Ton/día.
2.26. INDUSTRIA FABRICANTE DE VIDRIO cuando la capacidad del horno de fusión sea superior a 1 Ton/día.
2.27. INDUSTRIA DE FABRICACION DE YESO con hornos de calcinación de 2 o más Ton/día.
2.28. INDUSTRIA PRODUCTORA DE PAPEL: Todas las plantas que posean calderas de recuperación, a partir de cualquier volumen de producción.
2.29. INDUSTRIA FABRICANTE DE PINTURAS con hornos de cocción de 2 o más Ton/día de capacidad.
2.30. INDUSTRIA FABRICANTE DE FERTILIZANTES con hornos de secado con capacidad de 2 o más Ton/día.
2.31. FABRICACION DE OBJETOS DE BARRO, LOZA Y PORCELANA, cuando el horno de cocción tenga capacidad igual o superior a 5 Ton/día.
2.32 <Numeral adicionado por el artículo 1 de la Resolución 1377 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> EQUIPOS DE COMBUSTION EN LOS QUE SE REALICE APROVECHAMIENTO ENERGETICO DE RESIDUOS Y/O DESECHOS NO PELIGROSOS: Todos los equipos de combustión en los cuales se realice aprovechamiento energético de residuos y/o desechos no peligrosos.

3. INCINERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, LIQUIDOS Y GASEOSOS, ASI:

3.1. INCINERACION DE RESIDUOS PATOLOGICOS: Todos los incineradores.
3.2. INCINERACION DE RESIDUOS INDUSTRIALES NO PELIGROSOS: 100 Kg/día o 100 Lt/día para incineradores de líquidos.
3.3. INCINERACION DE RESIDUOS INDUSTRIALES PELIGROSOS: Todos los incineradores.
3.4. INCINERACION DE USO MULTIPLE (Aquellos habilitados para más de una de las categorías de residuos mencionados en los numerales anteriores de este punto): Todos los incineradores.
3.5. INCINERACION DE RESIDUOS DOMESTICOS: 100 Kg/hora.

4. OPERACION DE CALDERAS O INCINERADORES POR UN ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL O COMERCIAL Y OTRAS ACTIVIDADES CON DESCARGA DE HUMOS, GASES, VAPORES, POLVOS O PARTICULAS POR DUCTOS O CHIMENEAS.

4.1. INDUSTRIAS, OBRAS, ACTIVIDADES O SERVICIOS QUE CUENTEN CON CALDERAS Y HORNOS, cuyo consumo nominal de combustible sea igual o superior a:
A. CARBON MINERAL : 500 Kg/hora.
B. BAGAZO DE CAÑA: 3.000 Ton/año.
C. 100 galones/hora de cualquier combustible líquido, tales como ACPM, Fuel Oil o Combustóleo, Bunker, petróleo crudo."

Que con Resolución No. 760 del 20 de abril de 2010, ajustada con Resolución No. 2153 del 2 de noviembre de 2010, el hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo

DOCUMENTO VALIDO UNICAMENTE PARA INGRESO DE OBRAS CIVILES CONSORCIO DC 2022

RESOLUCIÓN DJUR No. 50227000026 de 3 FEB. 2022

Por medio de la cual se renueva un permiso de emisiones atmosféricas de fuentes fijas y se toman otras determinaciones

Sostenible, adoptó a nivel nacional el Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas, estableciendo en la tabla 9 (frecuencia de monitoreo de contaminantes de acuerdo con la Unidad de Contaminación Atmosférica "UCA"), del numeral 3.2, lo siguiente:

Tabla 9 Frecuencia de monitoreo contaminantes de acuerdo con la Unidad de Contaminación Atmosférica

UCA	GRADO DE SIGNIFICANCIA DEL APORTE CONTAMINANTE	FRECUENCIA DE MONITOREO (AÑOS)
≤ 0.25	Muy bajo	3
>0.25 y ≤ 0.5	Bajo	2
>0.5 y ≤ 1.0	Medio	1
>1.0 y ≤ 2.0	Alto	½ (6 meses)
> 2.0	Muy alto	¼ (3 meses)

Que mediante Resolución No. 1632 del 21 de septiembre de 2012, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, adicionó el numeral 4.5 del Capítulo 4 del Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica generada por fuentes fijas, adoptado a través de la Resolución 760 de 2010 y ajustado por la Resolución 2153 de 2010.

DEL COBRO POR CONCEPTO DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL

Que la Ley 633 de 2000, en su artículo 96 dispone que las autoridades ambientales deberán cobrar las tarifas de evaluación y de seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en la ley y los reglamentos, definiendo el sistema y método correspondiente.

Que conforme a lo anterior, la Corporación, expidió el Acuerdo CAR 02 del 2017, estableciendo los parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental en nuestra jurisdicción, determinando en sus artículos 24 y 27 lo siguiente:

> ***"ARTÍCULO 24°. PROCEDIMIENTO.***
>
> ***El acto administrativo mediante el cual se otorgue o establezca la licencia, permiso, concesión, autorización o el instrumento que corresponda, incluirá dentro de las obligaciones del titular respectivo, el deber de cancelar el servicio de seguimiento.***
>
> *La Dirección Regional correspondiente elaborará un auto mediante el cual liquidará el valor del seguimiento del instrumento de control y manejo ambiental respectivo, aplicando los Anexos I y II del presente acuerdo, cada vez que elabore el*

DOCUMENTO VALIDO UNICAMENTE PARA INTEGRO OBRAS CIVILES CONSORCIO DC 2022

RESOLUCIÓN DJUR No. 50227000026 de 3 FEB. 2022

Por medio de la cual se renueva un permiso de emisiones atmosféricas de fuentes fijas y se toman otras determinaciones

seguimiento de conformidad con la frecuencia que lo exija el respectivo instrumento ambiental.

El auto deberá contener los siguientes datos a fin de constituirse en un título ejecutivo claro, expreso y exigible: Nombre o razón social, NIT o cédula de ciudadanía, Dirección de Correspondencia, teléfono fijo y/o celular y valor del seguimiento.

El usuario deberá cancelar el valor por concepto del servicio de seguimiento, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria del auto que ordena el cobro.

Las visitas de seguimiento se podrán realizar sin cobro previo, el cual se formalizará posteriormente con el correspondiente auto e informe de visita.

La Dirección Regional remitirá a la Dirección Administrativa y Financiera los autos de liquidación debidamente ejecutoriados, junto con el informe de visita, de aquellos que los usuarios no hayan pagado el seguimiento, para ser registrados en los Estados Financieros."

*"**ARTÍCULO 27°. OBLIGATORIEDAD DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL.** La Dirección Regional correspondiente deberá efectuar el seguimiento a los instrumentos ambientales con la frecuencia que el instrumento lo requiera e independientemente de la cancelación de este servicio, sin perjuicio de la obligación de comunicar a la Dirección Administrativa y Financiera, remitiendo el respectivo auto de cobro y el informe de visita, a fin de que proceda a registrar en estados financieros estas obligaciones y adelantar las acciones a que haya lugar"*

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN

Que conforme con lo evaluado ambientalmente en el Informe Técnico DRSO No. 1330 del 20 de noviembre de 2021, complementado por el Informe Técnico No. 068 del 27 de enero de 2022 indican lo siguiente:

Que según lo conceptuado en los citados Informes Técnicos y una vez evaluada la información presentada por la sociedad, se recomendó renovar a favor de la sociedad DOBLE A INGENIERIA S.A.S., el Permiso de Emisiones Atmosféricas para fuentes fijas, otorgado por esta Corporación, a través de la Resolución No. 151 del 11 de mayo de 2001, modificada con la Resolución No. 286 del 1 de octubre de 2001, renovada con la Resolución No. 69 del 29 de enero de 2007, a su vez modificada parcialmente con la Resolución No. 352 del 27 de febrero de 2009 y renovada a través de las Resoluciones No. 339 del 3 de febrero de 2012 y 299 del 8 de febrero de 2017.

Que las fuentes enmarcadas por el permiso de emisiones deberán cumplir con la siguiente norma de emisión, según lo establecido en el artículo 4 de la Resolución MAVDT 909 de 2008:

DOCUMENTO VALIDO UNICAMENTE PARA INGRESO POR VENTANILLA DE CIVILES - CONSORCIO

RESOLUCIÓN DJUR No. 50227000026 de 3 FEB. 2022

Por medio de la cual se renueva un permiso de emisiones atmosféricas de fuentes fijas y se toman otras determinaciones

*"**Artículo 4.** Estándares de emisión admisibles para actividades industriales. En la Tabla 1 se establecen los estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para las actividades industriales definidas en el artículo 6° de la presente resolución.*

Tabla 1

Estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para actividades industriales a condiciones de referencia (25° C y 760 mm Hg) con oxígeno de referencia del 11%

Contaminante	Flujo del Contaminante (Kg/h)	Estándar de Emisión	
		Actividades Industriales Existentes	Actividades Industriales Nuevas
Material Particulado (MP)	≤ 0.5	250	150
	> 0.5	150	50
Óxidos de Nitrógeno (NO_x)	Todos	550	500
Dióxido de Azufre (SO_2)	Todos	550	500

(...)"

Que para la realización de los muestreos de contaminantes de las fuentes a permisionar se debe tener en cuenta la periodicidad calculada con las Unidades de Contaminación Atmosférica (UCA) del último muestreo isocinético de acuerdo con lo establecido por la Resolución MAVDT 2153 del 2010 *"Protocolo para el Control y Vigilancia de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas"* adoptada por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, modificada por la Resolución 1632 de 2012.

Adicionalmente, la sociedad DOBLE A INGENIERIA S.A.S., deberá:

a) Dar estricto cumplimiento a lo estipulado por el Decreto 1076 de 2015 y/o toda aquella norma que lo desarrolle, reglamente, sustituya o la modifique.

b) Realizar las tareas periódicas de limpieza y mantenimiento de los equipos con el fin de asegurar su buen funcionamiento y mejorar la calidad de la descarga de contaminantes atmosféricos.

Que con base en lo señalado anteriormente y acogiendo lo recomendado por los profesionales del área técnica de la Regional Sabana Occidente en el Informe Técnico No. DRSO No. 1330 del 20 de noviembre de 2021 y su alcance dado en el Informe Técnico DRSO No. 068 del 27 de enero de 2022, la Corporación considera procedente, renovar el permiso de emisiones atmosféricas para fuentes fijas, otorgado a favor de la sociedad DOBLE A INGENIERIA S.A.S., con Resolución No.

DOCUMENTO VALIDO UNICAMENTE PARA INGECO CONSORCIO BRAS CIVILES, CONSORCIO 2025

RESOLUCIÓN DJUR No. 50227000026 de 3 FEB. 2022

Por medio de la cual se renueva un permiso de emisiones atmosféricas de fuentes fijas y se toman otras determinaciones

151 del 11 de mayo de 2001, modificada con la Resolución No. 286 del 1 de octubre de 2001, renovada con la Resolución No. 69 del 29 de enero de 2007, a su vez modificada parcialmente con la Resolución No. 352 del 27 de febrero de 2009 y renovada a través de las Resoluciones Nos. 339 del 3 de febrero de 2012 y la Resolución No. 299 del 8 de febrero de 2017, bajo los términos, obligaciones y condiciones, señaladas en la parte resolutiva del presente acto administrativo.

Que la Corporación, surtió el procedimiento y las condiciones previstas para este tipo de autorización en la Resolución No. 909 del 5 de junio de 2008, modificada parcialmente por la Resolución 1309 de 2010, expedidas por el hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Que en desarrollo de sus funciones, la Corporación efectuará el seguimiento ambiental del permiso que se otorga mediante el presente acto administrativo

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, el Director Jurídico (E) de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1: Renovar a favor de la sociedad DOBLE A INGENIERIA S.A.S., con NIT 860.072.279-6, por un término de cinco (5) años, el permiso de emisiones atmosféricas para fuentes fijas, otorgado para la operación del tambor secador de la Planta de Asfalto CMI, con capacidad de 240 ton/h y la planta Astecnica modelo DC 60, con capacidad de 240 ton/h, localizadas en el predio denominado Vista Hermosa, identificado con matrícula inmobiliaria No. 50C-1254121 y cédula catastral No. 000000060047000 ubicado en la vereda Balsillas, del Municipio de Mosquera, Cundinamarca, a través de la Resolución No. 151 del 11 de mayo de 2001, modificada con la Resolución No. 286 del 1 de octubre de 2001, renovada con la Resolución No. 69 del 29 de enero de 2007, a su vez modificada parcialmente con la Resolución No. 352 del 27 de febrero de 2009 y renovada a través de las Resoluciones Nos. 339 del 3 de febrero de 2012 y la Resolución No. 299 del 8 de febrero de 2017, según las especificaciones técnicas por ella presentadas y aplicando las normas de emisión establecidas en el artículo 4 de la Resolución MAVDT 909 de 2008, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de la presente Resolución.

PARÁGRAFO: Para la renovación del presente permiso de emisiones atmosféricas se requerirá que con antelación no inferior a sesenta (60) días de la fecha de vencimiento del término de su vigencia, el titular del permiso la solicite con el lleno de los requisitos previstos en el artículo 2.2.5.1.7.14 del Decreto 1076 de 2015.

ARTÍCULO 2: Fijar como norma de emisión atmosférica de conformidad con el artículo 4 de la Resolución MAVDT 909 de 2008, para la sociedad DOBLE A INGENIERIA S.A.S., la siguiente:

DOCUMENTO VALIDO UNICAMENTE PARA OBRAS CIVILES, CONSORCIO DC 2025

RESOLUCIÓN DJUR No. 50227000026 de 3 FEB. 2022

Por medio de la cual se renueva un permiso de emisiones atmosféricas de fuentes fijas y se toman otras determinaciones

"Artículo 4. Estándares de emisión admisibles para actividades industriales. En la Tabla 1 se establecen los estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para las actividades industriales definidas en el artículo 6° de la presente resolución.

Tabla 1

Estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para actividades industriales a condiciones de referencia (25° C y 760 mm Hg) con oxígeno de referencia del 11%

Contaminante	Flujo del Contaminante (Kg/h)	Estándar de Emisión	
		Actividades Industriales Existentes	Actividades Industriales Nuevas
Material Particulado (MP)	≤ 0.5	250	150
	> 0.5	150	50
Óxidos de Nitrógeno (NO_x)	Todos	550	500
Dióxido de Azufre (SO_2)	Todos	550	500

ARTÍCULO 3: La sociedad DOBLE A INGENIERIA S.A.S., deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Dar estricto cumplimiento a lo estipulado por el Decreto Único Ambiental No. 1076 de 2015 y/o toda aquella norma que lo desarrolle, reglamente, sustituya o las modifique.
2. Los muestreos de contaminantes ejecutados por el industrial, para garantizar el cumplimiento de la Resolución 909 de 2008, deberán ser realizados con los lineamientos técnicos y procedimientos establecidos en la Resolución 2153 del 2010 "Protocolo para el Control y Vigilancia de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas" adoptada por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, modificada por la Resolución 1632 de 2012.
3. Para la realización de los muestreos de contaminantes, se debe tener en cuenta la periodicidad calculada con las Unidades de Contaminación Atmosférica (UCA).
4. Continuar implementando las medidas de manejo ambiental, que garanticen el bienestar de la comunidad que habita el área circundante al proyecto.
5. Realizar tareas periódicas de limpieza y mantenimiento de los equipos con el fin de asegurar su buen funcionamiento y mejorar la calidad de la descarga de contaminantes atmosféricos.
6. Presentar las mediciones de las emisiones atmosféricas generadas, de acuerdo a lo señalado en la tabla No. 9, (frecuencia de monitoreo de contaminantes de acuerdo con la Unidad de Contaminación Atmosférica "UCA") del numeral 3.2 del protocolo para el control y vigilancia de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas, adoptado por Resolución 760 de 2010, ajustado por la Resolución 2153 de 2010, del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo

DOCUMENTO VALIDO UNICAMENTE PARA INGRESO OBRAS CIVILES, CONSORCIO DC 2025

RESOLUCIÓN DJUR No. 50227000026 de 3 FEB. 2022

Por medio de la cual se renueva un permiso de emisiones atmosféricas de fuentes fijas y se toman otras determinaciones

Territorial, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y remitir los resultados de las mediciones directas a la Corporación en original y medio magnético un (1) mes después de ejecutados.

ARTÍCULO 4: La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, tendrá la facultad de modificar, total o parcialmente, el permiso que se renueva mediante el presente acto administrativo, en los siguientes casos:

1. De manera unilateral, cuando por cualquier causa hayan variado sustancialmente las circunstancias y motivos de hecho y de derecho tenidos en cuenta al momento de otorgarlo.

2. A solicitud del beneficiario del permiso, durante el tiempo de su vigencia, en consideración a la variación de las condiciones de efecto ambiental de la obra, industria o actividad autorizada, que hubieran sido consideradas al momento de otorgar el permiso.

ARTÍCULO 5: La sociedad DOBLE A INGENIERIA S.A.S., podrá ceder a otras personas los derechos y obligaciones que adquiere siempre y cuando comunique expresamente y por escrito esta circunstancia a esta Corporación.

PARÁGRAFO: El cedente deberá agregar en su escrito que comunica la cesión copia autentica del acto o contrato en que la cesión tiene origen de conformidad con el artículo 2.2.5.1.7.10 del Decreto 1076 de 2015.

ARTÍCULO 6: Advertir a la sociedad DOBLE A INGENIERIA S.A.S. que esta Corporación, se reserva la facultad de suspender o revocar el permiso otorgado en la presente resolución, cuando se establezca que se está dando una o varias de las situaciones contempladas en el artículo 2.2.5.1.7.12 del Decreto 1076 de 2015.

ARTÍCULO 7: Advertir a la sociedad DOBLE A INGENIERÍA S.A.S., que de conformidad con el artículo 24 del Acuerdo CAR No. 02 del 17 de enero de 2017, la Dirección Regional Sabana Occidente, elaborará un auto mediante el cual liquidará el valor de seguimiento del instrumento de manejo y control ambiental respectivo, aplicando los anexos I y III, del citado Acuerdo, cada vez que se realice el seguimiento de conformidad con la frecuencia que el presente instrumento ambiental lo requiera.

ARTÍCULO 8: Advertir a la sociedad DOBLE A INGENIERIA S.A.S., que el incumplimiento a las obligaciones impuestas en el presente acto administrativo, así como el uso o aprovechamiento de los recursos naturales sin la respectiva autorización o permiso dará lugar a la imposición de las medidas preventivas y sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009 o la norma que la modifique o sustituya.

DOCUMENTO VALIDO UNICAMENTE PARA INGECOB OBRAS CIVILES, CONSORCIO DC 2025

RESOLUCIÓN DJUR No. 50227000026 de 3 FEB. 2022

Por medio de la cual se renueva un permiso de emisiones atmosféricas de fuentes fijas y se toman otras determinaciones

ARTÍCULO 9: Notificar el contenido de la presente Resolución a la sociedad DOBLE A INGENIERIA S.A.S., por medio de su representante legal o su apoderado debidamente constituido, conforme a lo previsto en los artículos 44 y 45 del Decreto 01 de 1984, en concordancia con el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las respectivas constancias en el expediente.

ARTÍCULO 10: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al municipio de Mosquera, Cundinamarca, por medio de su alcalde municipal como representante legal del mismo.

ARTÍCULO 11: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de la Corporación.

ARTÍCULO 12: En contra de la presente Resolución procede únicamente recurso de reposición, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito ante el Director Jurídico dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación personal o a la desfijación del edicto, o al vencimiento del término de publicación, según sea el caso y con el lleno de los requisitos previstos en el artículo 52 del Decreto 01 de 1984, en concordancia con el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

CESAR AUGUSTO RINCÓN GARCIA
Director Jurídico (E) - DJUR

Proyectó: Cristian Camilo Rodriguez Largo / DRSO
Revisó: Jackeline Maneclba Galindo / DRSO
Carlos Eduardo Rodriguez Suarez / DRSO
Gloria Elena Medina Huertas / DJUR
Expediente: 1393

DOCUMENTO VÁLIDO UNICAMENTE PARA INGECOB OBRAS CIVILES, CONSORCIO EC 2023

MULTINSA
Carrera 19 A No. 73-65 La Libertad
Tel: 6916081 - +57 318 7167942
Barrancabermeja, Santander. Colombian Industry
laboratorio@multinsa.com - www.multinsa.com

CERTIFICADO DE CALIDAD

Del producto con las siguientes propiedades:

ASFALTO MODIFICADO CON GRANO DE CAUCHO RECICLADO TIPO II

No. 12877

Remisión: 17795
Fecha de despacho: 26-11-2024
Cliente: PAVIOBRAS SAS
Pedido: N/A

Fecha de Lote: 26-11-2024
Lote No.: 041124
Placa: TGL-885

PROPIEDADES	NORMA DE ENSAYO	Mínimo	Máximo	Reportado
Viscosidad aparente a 163°C (Pa. s)	INV E-717	1,5	3,0	1,5
Penetración a 25°C, 100g, 5s (1/10mm)	INV E-706	40	70	52
Penetración a 4°C, 200g, 60s (1/10mm)	INV E-706	15	-	23
Punto de ablandamiento (°C)	INV E-712	52	-	63
Resiliencia a 25°C (%)	ASTM D-5329	20	-	41
Punto de ignición mediante copa abierta de Cleveland (°C)	INV E-709	230	-	284
Acondicionamiento en prueba de película delgada - RTFO	**INV E-720**			
Ensayo en el horno de lámina asfáltica delgada en movimiento – RTFOT; (%peso)	INV E-720	-	1	-0,62
Penetración del residuo luego del acondicionamiento en prueba de película delgada, % de la penetración original	INV E-706	65	-	66
Recuperación elástica utilizando el ductilómetro, %	INV E-742	50	-	54

Tec. Químico DIVA CRISTINA TORRES
C.C. 30.389.779 TQ-1066
FIRMA DE LABORATORIO

MULTINSA
Carrera 19 A No. 73-65 La Libertad
Tel: 6916081 - +57 318 7167942
Barrancabermeja, Santander. Colombian Industry
laboratorio@multinsa.com - www.multinsa.com

CERTIFICADO DE CALIDAD

Del producto con las siguientes propiedades:

ASFALTO MODIFICADO CON GRANO DE CAUCHO RECICLADO TIPO II

No. 12877

Propiedad	Mínimo		Máximo	Reportado
Contenido de GCR en el asfalto, %	15		--	15
Uniformidad del asfalto caucho	--		--	No hay presencia de aglomeraciones de GCR en el asfalto
Temperatura de reacción, °C	180		200	180 – 185
Tiempo de reacción, min	55		75	75
Velocidad de agitación, rpm	100		750	300
Temperatura de almacenamiento recomendada, °C	--		--	110 – 150

Distribución de tamaños del grano de caucho reciclado GCR, TIPO B				
TAMIZ (mm/U.S. standard)	Mínimo		Máximo	% Pasa
2.00 / No. 10	100		--	100
1.19 / No. 16	65		100	100
0.59 / No. 30	20		100	100
0.30 / No. 50	0		45	43
0.075 / No. 200	0		5	0.1

CONDICIONES DE MANEJO DE LA MEZCLA CON CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON GRANO DE CAUCHO RECICLADO

En laboratorio, MULTINSA recomienda realizar el diseño de mezcla con el cemento asfáltico modificado con grano de caucho reciclado bajo las siguientes condiciones térmicas:

Temperatura de los áridos, °C	175– 185°C
Temperatura de mezclado, °C	160 – 170°C
Temperatura de compactación, °C	125 -160 °C

Tec. Químico DIVA CRISTINA TORRES
C.C. 30.389.779 TQ-1066
FIRMA DE LABORATORIO

Icontec ISO 9001 SC5235-1
Icontec ISO 14001 SA407-1
Icontec ISO 45001 OS179-1

MULTINSA
Carrera 19 A No. 73-65 La Libertad
Tel: 6916081 - +57 318 7167942
Barrancabermeja, Santander. Colombian Industry
laboratorio@multinsa.com - www.multinsa.com

CERTIFICADO DE CALIDAD

Del producto con las siguientes propiedades:


ASFALTO MODIFICADO CON GRANO DE CAUCHO RECICLADO TIPO II

No. 12877

En obra, MULTINSA recomienda el manejo de temperaturas así:

Temperatura de la mezcla a la salida del mezclador	165 -- 170 °C
Temperatura de descarga después de transportar la mezcla	Mínimo 125 °C
Temperatura al iniciar compactación	125 – 160 °C
Temperatura al finalizar compactación	110 -- 120 °C

Se anexa curva reológica del cemento asfáltico modificado con grano de caucho, INV E-717.

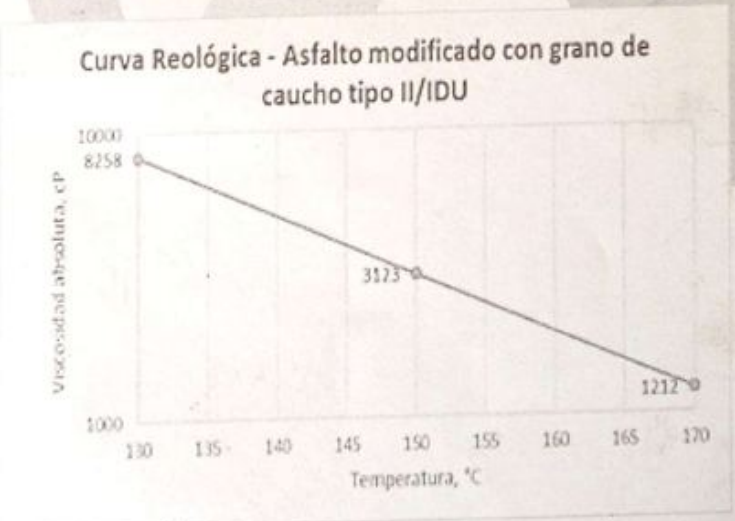

Tec. Químico DIVA CRISTINA TORRES
C.C. 30.389.779 TQ-1066
FIRMA DE LABORATORIO

icontec ISO 9001 SC5225-1
icontec ISO 14001 SA407-1
icontec ISO 45001 OS179-1

PAVIOBRAS S.A.S.

RESUMEN DE RESULTADOS CARACTERIZACION AGREGADOS PETREOS

Fecha 6 de enero de 2025
Cliente: Paviobras S.A.S
Fuente: Guayuriba
Tipo de Muestra: Diseño Mezcla asfáltica en caliente con asfalto modificado con grano de caucho tipo MCCh 25-B
Localización: Parque Industrial Minero el Mochuelo Carrera 17A # 81A-66- Sur

ITEM	ENSAYO	NORMA	RESULTADO	CRITERIOS IDU 510-11		CUMPLE (SI/NO)
1	RESISTENCIA A LA DEGRADACION DE LOS AGREGADOS POR MEDIO DE LA MAQUINA DE LOS ANGELES	INV E- 218 -13	20,0	MAXIMO	30,0	CUMPLE
2	DETERMINACION DE LA RESISTENCIA DEL AGREGADO GRUESO DE LA DEGRADACION POR ABRASION UTILIZANDO EL APARATO MICRO - DEVAL	INV E- 238 -13	11,5	MAXIMO	25,0	CUMPLE
3	DETERMINACION DEL VALOR DEL 10% DE FINOS	INV E- 224 -13	144,3	MINIMO	75,0	CUMPLE
		INV E- 224 -13	96,8	MINIMO	75,0	CUMPLE
4	DETERMINACION DE LA LIMPIEZA SUPERFICIAL DE LASPARTICULAS DE AGREGADO GRUESO	INV E- 237 -13	0,40	MAXIMO	0,50	CUMPLE
5	PORCENTAJE DE PARTICULAS FRACTURADAS EN UN AGREGADO GRUESO	INV E- 227 -13	96,4	MINIMO	90,0	CUMPLE
		INV E- 227 -13	93,8	MINIMO	75,0	CUMPLE
6	PROPORCION DE PARTICULAS PLANAS, ALARGADAS O PLANAS Y ALARGADAS EN AGREGADOS GRUESOS	INV E- 240 -13	0,0	MAXIMO	10,0	CUMPLE
7	DETERMINACION DEL COEFICIENTE DEL PULIMENTO ACELERADO (CPA) DE LOS AGREGADOS GRUESOS	INV E- 232 -13	0,56	MINIMO	0,50	CUMPLE
8	EFECTO DEL AGUA SOBRE LAS MEZCLAS ASFALTICAS SUELTAS	INV E- 757 -13	MAYOR AL 98%	MINIMO	REPORTAR	-
9	CONTENIDO DE ARENA NATURAL	-	0,0	MAXIMO	25,0	CUMPLE
10	CONTENIDO DE VACIOS DEL AGREGADO FINO NO COMPACTADO ENSAYO DE ANGULARIDAD	INV E- 239 -13	49,1	MINIMO	45,0	CUMPLE
11	ADHESIVIDAD DE LOS LIGANTES BITUMINOSOS A LOS AGREGADOS FINOS (METODO RIEDEL-WEBER)	INV E- 774 -13	10	MINIMO	4,0	CUMPLE
12	PROPORCIÓN DE LLENANTE MINERAL DE APORTE % MINIMO EN PESO DEL LLENANTE TOTAL	INV E- 123 -13	100,0	MINIMO	50,0	CUMPLE
13	PESO UNITARIO APARENTE DEL LLENANTE EN KEROSENE	INV E- 225 -13	0,67	ENTRE	0,5-0,8	CUMPLE
14	PODER RIGIDIZANTE DE LLENANTE MINERAL	INV E- 712 -13	15,2	ENTRE	10,0-20,0	CUMPLE
15	DETERMINACION DEL CONTENIDO ORGANICO DE UN SUELO MEDIANTE EL ENSAYO DE PERDIDA POR IGNICION	INV E- 121 -13	0,0	MAXIMO	0,0	CUMPLE
16	ENSAYO LIMITE LIQUIDO,	INV E- 125 -13	N.L	IGUAL	N.L	CUMPLE
17	LIMITE PLASTICO E INDICE DE PASTICIDAD	INV E- 126 -13	N.P	IGUAL	N.P	CUMPLE
18	EQUIVALENTE DE ARENA DE SUELOS Y AGREGADOS FINOS	INV E- 133 -13	65	MINIMO	40,0	CUMPLE
19	VALOR DE AZUL DE METILENO EN AGREGADOS FINOS Y EN LLENANTE MINERAL	INV E- 235 -13	3,8	MAXIMO	8,0	CUMPLE

PAVIOBRAS S.A.S.

RESISTENCIA A LA DEGRADACION DE LOS AGREGADOS POR MEDIO DE LA MAQUINA DE LOS ANGELES

NORMA INV E-218-13 - INV E-219-13

Fecha 6 de enero de 2025
Cliente: Paviobras S.A.S
Fuente: Guayuriba
Tipo de Muestra: Diseño Mezcla asfáltica en caliente con asfalto modificado con grano de caucho tipo MCCh 25-B
Localización: Parque Industrial Minero el Mochuelo Carrera 17A # 81A-66- Sur

PRUEBA	1
No. de esferas	12
No. de revoluciones	500
Gradación usada	A
Peso = 1	5000
Peso = 2	4002,3
P1-P2= Pérdida	997,7
% DE PERDIDA = ((P1 - P2) / P1) * 100	20,0

CRITERIOS IDU 510-11	30 % MAX	CUMPLE

DACION, CARGA ABRASIVA Y REVOLUCIONES

TAMAÑO		PESO Y GRADACION DE LA MUESTRA (Gramos)								
PASA		RETENIDO								
Alterno	mm.	Alterno	mm.	A	B	C	D	E	F	G
3"	76,2	2 1/2"	63,5					2500		
2 1/2"	63,5	2"	50,8					2500		
2"	50,8	1 1/2"	38,1					5000	5000	
1 1/2"	38,1	1"	25,4	1250					5000	5000
1"	25,4	3/4"	19,1	1250						5000
3/4"	19,1	1/2"	12,7	1250	2500					
1/2"	12,7	3/8"	9,5	1250	2500					
3/8"	9,5	1/4"	6,4			2500				
1/4"	6,4	No. 4	4,75			2500				
No. 4	4,75	No. 8	2,36				5000			
Número de Esferas.				12	11	8	6	12	12	12
No. de Revoluciones.				500	500	500	500	1000	1000	1000

Andrey Perilla
Jefe de Laboratorio

Vo.Bo.Ing: Pedro Juan Navarro Rodriguez

DETERMINACION DE LA RESISTENCIA DEL AGREGADO GRUESO DE LA DEGRADACION POR ABRASION UTILIZANDO EL APARATO MICRO - DEVAL

NORMA INV E-238-13

Fecha DE Ensayo 6 de enero de 2025
Cliente: Paviobras S.A.S.
Fuente: Guayuriba
Tipo de Muestra: Diseño Mezcla asfáltica en caliente con asfalto modificado con grano de caucho tipo MCCh 25-B
Localización: Parque Industrial Minero el Mochuelo Carrera 17A # 81A-66- Sur

ENSAYO No.	1
TAMAÑO MAXIMO DE LA MUESTRA	1/2"
TIPO DE COMBINACION UTILIZADA	1
PESO DE ESFERAS (g)	5000
A= PESO DE LA MUESTRA SECA ANTES DE ENSAYO (g)	1500,0
B= PESO DE LA MUESTRA SECA DESPUES DE ENSAYO (g)	1328,2
P1 - P2 = PERDIDA (g)	171,8
% DE PERDIDA = ((A - B) / A) * 100	11,5

CRITERIOS IDU 510-11	25 % MAX	CUMPLE

COMBINACIÓN TIPO 1.	TAMAÑO				Masa de cada una de las fracciones en gramos.	El agregado para la prueba consistirá en material que pasa el tamiz de 19,0 mm (3/4") y es retenido en el tamiz de 9,5 mm (3/8"). Para un total de muestra de 1500 g +/- 5 g .
	PASA		RETENIDO			
	Alterno	mm.	Alterno	mm.		
	3/4"	19,1	5/8"	16,0	375	
	5/8"	16,0	1/2"	12,5	375	
	1/2"	12,5	3/8"	9,5	750	
Para esta combinación, el ensayo se realiza para un número de Revoluciones de 100 rpm +/- 5 rpm, durante 2 h ± 1 min.						

COMBINACIÓN TIPO 2.	TAMAÑO				Masa de cada una de las fracciones en gramos.	En el caso donde el tamaño máximo nominal del agregado grueso sea 12,5 mm (1/2"). Para un total de muestra de 1500 g +/- 5 g .
	PASA		RETENIDO			
	Alterno	mm.	Alterno	mm.		
	1/2"	12,5	3/8"	9,5	750	
	3/8"	9,5	1/4"	6,3	375	
	1/4"	6,3	No. 4	4,75	375	
Para esta combinación, el ensayo se realiza para un número de Revoluciones de 100 rpm +/- 5 rpm, durante 105 ± 1 min.						

COMBINACIÓN TIPO 3.	TAMAÑO				Masa de cada una de las fracciones en gramos.	En el caso donde el tamaño máximo nominal del agregado grueso sea 9,5 mm (3/8"). Para un total de muestra de 1500 g +/- 5 g .
	PASA		RETENIDO			
	Alterno	mm.	Alterno	mm.		
	3/8"	9,5	1/4"	6,3	750	
	1/4"	6,3	No. 4	4,75	750	
Para esta combinación, el ensayo se realiza para un número de Revoluciones de 100 rpm +/- 5 rpm, durante 95 ± 1 min.						

OBSERVACIONES

Andrey Perilla
Jefe de Laboratorio

vo.Bo: Ing.Pedro Juan Navarro Rodriguez

PAVIOBRAS S.A.S.

DETERMINACION DEL VALOR DEL 10% DE FINOS

INV- E-224-13

Fecha **6 de enero de 2025** Muestra No. 1
Cliente: **PaviobrasS.A.S**
Fuente: **Guayuriba**
Muestra: **Diseño Mezcla asfáltica en caliente con asfalto modificado con grano de caucho tipo MCCh 25-B**
Localización: **Parque Industrial Minero el Mochuelo Carrera 17A # 81A-66- Sur**

CONDICION DE ENSAYO DEL AGREGADO RELACION SECO			
Ensayo No.	1	2	3
M1 - Peso en Gramos de la muestra para ensayo	2.496	2.499	2.498
M2 - Peso en Gramos de la fracción que pasa el tamiz No. 8 después de la penetración	252	250	250
M3 - Peso en Gramos de la fracción que retiene el tamiz No. 8 después de la penetración	2.244	2.249	2.248
m - Porcentaje de la fracción que retiene el tamiz No. 8 después de la penetración	10,1	10,0	10,0
f - Carga máxima de la penetración	145,0	145,0	144,0
Fuerza En (KN) Necesaria Para Producir 10% de Finos Sobre la Muestra.	144	145	144
Fuerza promedio en (KN) Necesaria Para Producir 10% de Finos Sobre la Muestra	**144**		

CONDICION DE ENSAYO DEL AGREGADO RELACION HUMEDO			
Ensayo No.	1	2	3
M1 - Peso en Gramos de la muestra para ensayo	2.512	2.511	2.511
M2 - Peso en Gramos de la fracción que pasa el tamiz No. 8 después de la penetración	241	239	241
M3 - Peso en Gramos de la fracción que retiene el tamiz No. 8 después de la penetración	2.271	2.272	2.270
m - Porcentaje de la fracción que retiene el tamiz No. 8 después de la penetración	9,6	9,5	9,6
f - Carga máxima de la penetración	136,0	135,0	135,0
Fuerza En (KN) Necesaria Para Producir 10% de Finos Sobre la Muestra.	140	140	139
Fuerza promedio en (KN) Necesaria Para Producir 10% de Finos Sobre la Muestra	**140**		

RESULTADO SECO

CRITERIOS IDU 510-11	**75 kN**	**MIN**	**144 kN**	**CUMPLE**

RESULTADO HUMEDO/SECO

CRITERIOS IDU 510-11	**75 kN**	**MIN**	**97 kN**	**CUMPLE**

OBSERVACIONES La Masa de la fracción que retiene el tamiz No. 8 después de la penetración
No puede variar en masde 10 Gramos de una a la otra

Andrey Perilla
Jefe de Laboratorio

VoBo.Ing:Pedro Juan Navarro Rodriguez

Oficina Avenida 15 No. 119A-03 Of. 325 - Teléfono 2 15 50 67 Bogotá : 7 90 09 80/ 7 90 07 85 E-mail: ltdapaviobras@gmail.com Página Web: www.paviobras.com

PAVIOBRAS S.A.S.

DETERMINACIÓN DE LA LIMPIEZA SUPERFICIAL DE LAS PARTICULA DE AGREGADO GRUESO

NORMA INV E-237-13

Fecha 6 de enero de 2025
Cliente: Paviobras S.A.S
Fuente: Guayuriba
Muestra: Diseño Mezcla asfáltica en caliente con asfalto modificado con grano de caucho tipo MCCh 25-B
Localización: Parque Industrial Minero el Mochuelo Carrera 17A # 81A-66- Sur

		Tamaño Maximo; D:		**3/4"**	=	**19,05 mm**
Tamaño de la Muestra; M:						
		200 * D	<	**M**	<	500 * D
	3 810 g		<	**M**	<	**9 525 g**

PRUEBA No.	**1**	**2**	
M = Peso Total de la Muestra Humeda: gr.	4.985,3	4.966,3	
Mlh = Peso de la Muestra humeda sin lavar gr.	2.500,0	2.462,3	
Mls = Peso de la Muestra seca sin Lavar: gr	2.485,3	2.504,0	
Mh = Peso de la Muestra Humeda para Ensayo de Lavado: gr.	2.485,3	2.504,0	
m = Peso de la Muestra Seca, Lavada y Tamizada; gr.	2.461,1	2.536,2	
Is = indice de Sequedad = Mls/M1h	0,99	1,02	
Ms = Masa Seca = Mh*Is.	2.470,7	2.546,4	
Impureza = Ms -m.	9,6	10,2	**promedio**
Coeficiente de Limpieza Superficial = (Ms-m)/Ms*100	**0,39**	**0,40**	**0,40**

CRITERIOS IDU 510-11	**0,5 % MAX**	**CUMPLE**

OBSERVACIONES

Andrey Perilla

Vo.Bo: Ing. Pedro Juan Navarro Rodriguez

PORCENTAJE DE PARTICULAS FRACTURADAS EN UN AGREGADO GRUESO

NORMA INV E-227-13

Fecha 6 de enero de 2025
Cliente: Paviobras S.A.S
Fuente: Guayuriba
Muestra: Diseño Mezcla asfáltica en caliente con asfalto modificado con grano de caucho tipo MCCh 25-B
Localización: Parque Industrial Minero el Mochuelo Carrera 17A # 81A-66- Sur

UNA CARA FRACTURADA - NORMA INV E-227/13.

TAMAÑO DE CADA FRACCION				PESO DE CADA FRACCION EN GRAMOS	PESO PARTICULAS CON UNA CARA FRACTURADA EN GRAMOS	PESO PARTICULAS SIN CARAS FRACTURADAS EN GRAMOS	% DE PARTICULAS CON UNA CARA FRACTURADA
Pasa Tamiz.		Retiene Tamiz			F	N	P
1 1/2"	38,1mm	1"	25,4mm	0,0	0,0	0,0	0,0
1"	25,4mm	3/4"	19,1mm	0,0	0,0	0,0	0,0
3/4"	19,1mm	1/2"	12,7mm	790,9	752,4	38,5	95,1
1/2"	12,7mm	3/8"	9,5mm	715,6	699,9	15,7	97,8
3/8"	9,5mm	No.4	4,75 mm	1736,7	1669,5	67,2	96,1
PESO TOTAL				3243,2	3121,8	121,4	289,07
PORCENTAJE TOTAL DE CARAS FRACTURADAS - UNA CARA							**96,4**

CRITERIOS IDU 510-11	90 % MIN	CUMPLE

DOS CARAS FRACTURADAS -NORMA INV E-227/13.

TAMAÑO DE CADA FRACCION				PESO DE CADA FRACCION EN GRAMOS	PESO PARTICULAS CON DOS CARAS FRACTURADAS EN GRAMOS	PESO PARTICULAS SIN CARAS FRACTURADAS EN GRAMOS	% DE PARTICULAS CON DOS CARAS FRACTURADAS
Pasa Tamiz.		Retiene Tamiz			F	N	P
1 1/2"	38,1mm	1"	25,4mm	0,0	0,0	0,0	0,0
1"	25,4mm	3/4"	19,1mm	0,0	0,0	0,0	0,0
3/4"	19,1mm	1/2"	12,7mm	790,9	715,6	75,3	90,5
3/4"	12,7mm	3/8"	9,5mm	715,6	684,5	31,1	95,7
3/8"	9,5mm	No.4	4,75 mm	1736,7	1655,8	80,9	95,3
PESO TOTAL				3243,2	3055,9	187,3	281,47
PORCENTAJE TOTAL DE CARAS FRACTURADAS - DOS CARAS							**93,8**

CRITERIOS IDU 510-11	75 % MIN	CUMPLE

OBSERVACIONES:

Andrey Perilla
Jefe de Laboratorio

Vo.Bo.Ing: Pedro Juan Navarro Rodriquez

Oficina Avenida 15 No. 119A-03 Of. 325 - Teléfono 2 15 50 67 Bogotá : 7 90 09 80/ 7 90 07 85 E-mail: ltdapaviobras@gmail.com Página Web: www.paviobras.com
