
ACTA No. 02			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: ***REUNIÓN AVANCES Y AJUSTES CROCOGRAMA POR AFECTACIONES DEL SISMO – contrato No.*** **CO1.PCCNTR.9597065 "CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO Y DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA ASOCIADA A LA CALDERA PIROTUBULAR HORIZONTAL DE 10 BHP DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIAL DE LA REGIONAL VALLE DEL CAUCA DEL SENA, UBICADA EN SU SEDE PRINCIPAL"**			
CIUDAD Y FECHA:	PALMIRA-21/08/2026	**HORA INICIO:** 11:00 AM	**HORA FIN:** 11:30 AM
LUGAR Y/O ENLACE:	Vínculo de la reunión meet.google.com/pdj-uzac-gmr	**DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:** CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIAL-SENA	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: 1. Avances ejecución del contrato 2. Ajuste del cronograma 3. Proceso de certificación			
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Realizar seguimiento a la ejecución del contrato y ajustar el cronograma de actividades de mantenimiento en el CBI debido a que se encuentra suspendido.			
DESARROLLO REUNION Siendo las 11:00am se da inicio a la reunión desarrollando los siguientes puntos de la agenda a tratar: 1. Avances ejecución contrato Se da inicio a la actividad de capacitación el día 18 de agosto de 2026. Nos conectamos de forma virtual por Meet a la capacitación los funcionarios John Harold García, Ernesto Mendoza y Adolfo Munera los días 18 y 19 de agosto. Se trabajarán todos los conocimientos teóricos dos días por 5 semanas hasta completar las 40 horas y después iniciaremos las actividades prácticas con un total de 24 horas para un total de 64 horas, y para completar las 80 horas se culminará con el proceso de certificación.			

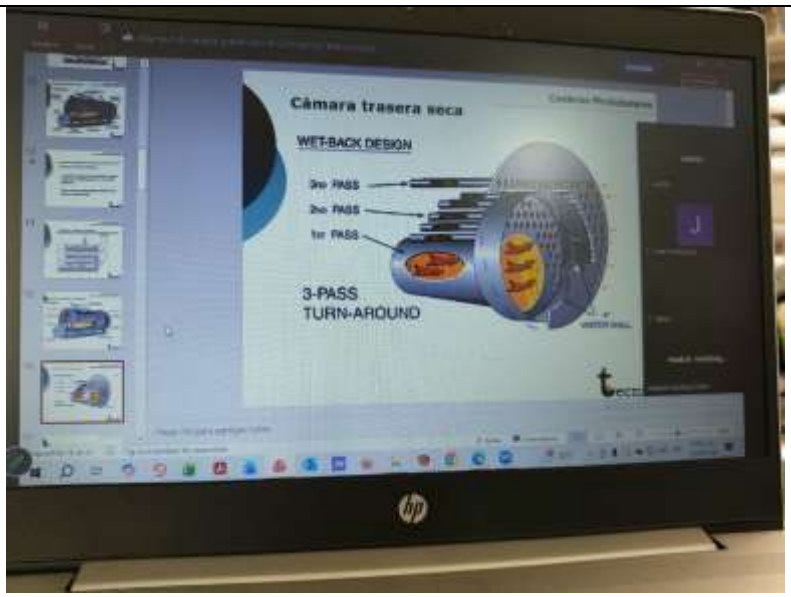

2. Ajuste del cronograma
   Debido a que en estos momentos no hay autorización de ingreso debido a las afectaciones mínimas que sufrió el CBI sede Versalles, se proyectaron las intervenciones en la caldera del 15 al 21 de septiembre donde de la misma manera se realizarán las actividades prácticas. Se encuentra todavía pendiente las fechas, el lugar y la logística para realizar el proceso de certificación. Se espera que para el 15 de septiembre ya se encuentre aprobado el ingreso al CBI para iniciar con la intervención de la caldera.

3. Proceso de Certificación
   Para el avance proceso de certificación la empresa G&T ha solicitado para los funcionarios que se encuentran realizando la capacitación los siguientes documentos:

- Copia de la cédula de ciudadanía.
- Certificación laboral expedida por el SENA.
- Certificados de estudio técnico, tecnológico o profesional.
- Correo electrónico.
- Número de teléfono celular.

En esta semana se realizará las solicitudes de los certificados laborales a talento humano para avanzar en el proceso y se les enviará el resto de información requerida.

CONCLUSIONES

- Se inició con el proceso de capacitación de los funcionarios para culminar con la certificación

- Se ajustó el cronograma de ejecución debido a las afectaciones generadas por el sismo.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Solicitar la información sobre la certificación	24/08/2026	G&T Soluciones de Control y Calderas	**Virtual**
Dar respuesta a las solicitudes de G&T	Dentro de los tiempos establecidos posterior a la solicitud	Supervisor de contrato	**Virtual**

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES

NOMBRE	DEPENDENCIA / EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
John Harold García	Supervisor	**SI**	**N/A**	
Gerardo Andrés Galvan	G&T Soluciones de Control y Calderas	**SI**	**N/A**	

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ANEXOS
