Comité o Grupo:	**Acta No.**
Citada por: Gobernación de Córdoba	**Fecha:** 08/04/2025
Coordinador: Jose Nicolas Orozco **Cargo:** Profesional Universitario	**Hora inicio:** 10:00 am **Fin:** 12:00 m
Secretario: **Cargo:**	**Lugar:** El carito Municipio de Santa Cruz de Lorica

PARTICIPANTES			
No.	**Nombre**	**Cargo**	**Teléfono**
1	Juan Carlos Martinez	Sargento, Ing Militar	
2	Jose Nicolas Orozco	Professional Universitario	
3	Junta de Acción comunal	NA	
4			
5			

PUNTOS DE DISCUSION	
1	Visita de inspección para informe militar, de viabilidad de instalación de puentes temporales
2	
3	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Antecedentes: Se necesita la construcción de un puente militar en el Corregimiento del Carito, perteneciente al municipio de Lorica en el departamento de Córdoba, está localizado a 40 kilómetros de Montería, capital del departamento y a 23 kilómetros de la cabecera municipal del municipio de Santa Cruz de Lorica, beneficiando los corregimientos y veredas Mata caña, Moralito, San pablo, Villa canal, la Ciénaga, los Moros, cielo Azul entre otros.

Siendo las 10 am del día 7 de abril de 2025 se dio inicio a la visita al lugar objetivo con la presencia de la gobernación de Córdoba con el ingeniero José Orozco como funcionario principal, miembros de la comunidad y el sargento del ejército nacional.

Objetivo de la Visita: Realizar un recorrido y reconocimiento técnico para evaluar la viabilidad de construir un puente militar sobre el caño el carito que conecte a la población y beneficie a aproximadamente 3,500 habitantes.


Desarrollo de la Visita:
Primero se realizó el recorrido y mediciones por el área donde se pretende construir el puente, tomando mediciones necesarias para determinar las especificaciones técnicas del proyecto. Actualmente, existe un puente artesanal de madera con una luz de 40 metros que es utilizado por niños, ancianos y población en general. Al terminar las mediciones necesarias se estableció que la luz del puente militar debe ser de 51.85 metros.
Luego de tomar los datos necesarios en campo el ingeniero José Orozco explicó el protocolo y proceso que se sigue en la Gobernación para el avance de cualquier proyecto. Con la ayuda del sargento del Ejército Nacional, se suministró información sobre la función de cada entidad involucrada en el proyecto. Se destacó la importancia de la coordinación y logística entre entidades para el inicio del montaje del puente militar donado por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.
Conclusiones:
- La construcción del puente mejoraría la economía, educación y seguridad de la población del Corregimiento del Carito.
- Es necesario continuar con el proceso de planificación y coordinación para hacer realidad el proyecto.
Siendo las 12:00 p.m., se dio por finalizada la visita al Corregimiento del Carito, agradeciendo la participación y colaboración de todos los asistentes.


Observaciones.

CONCLUSIONES				
No	**Tarea**	**Responsable**	**Período de cumplimiento**	**Observaciones**
	Informe Militar de Viabilidad	Ejercito Nacional	NA	

ANEXO FOTOGRAFICO



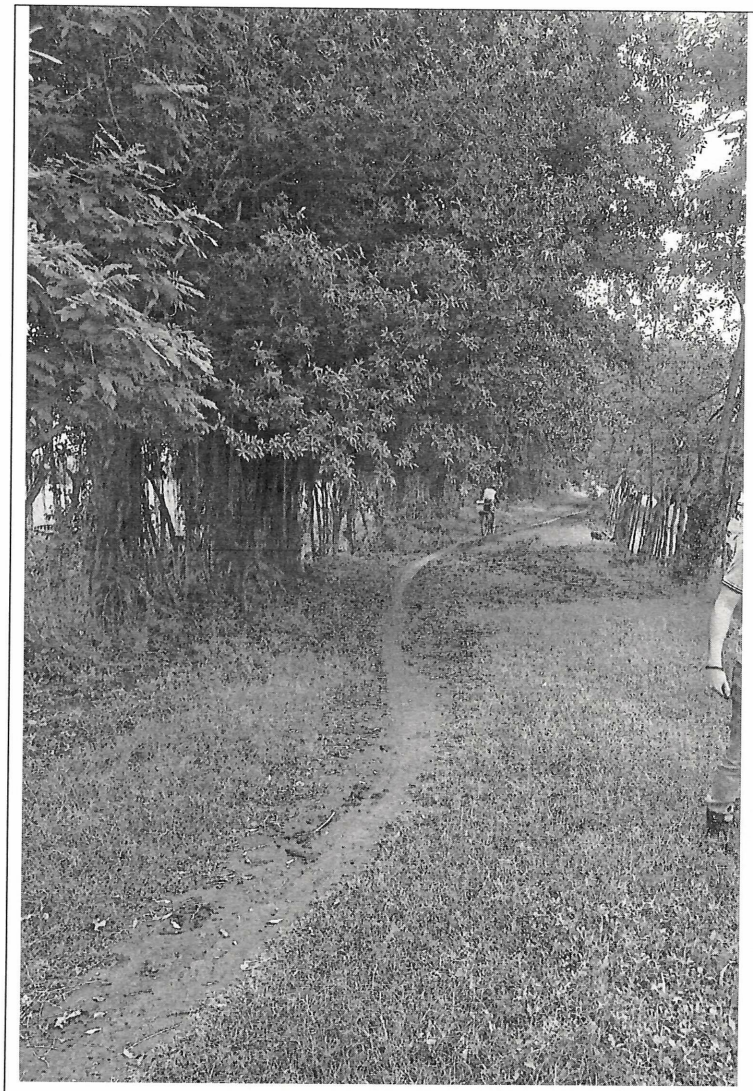

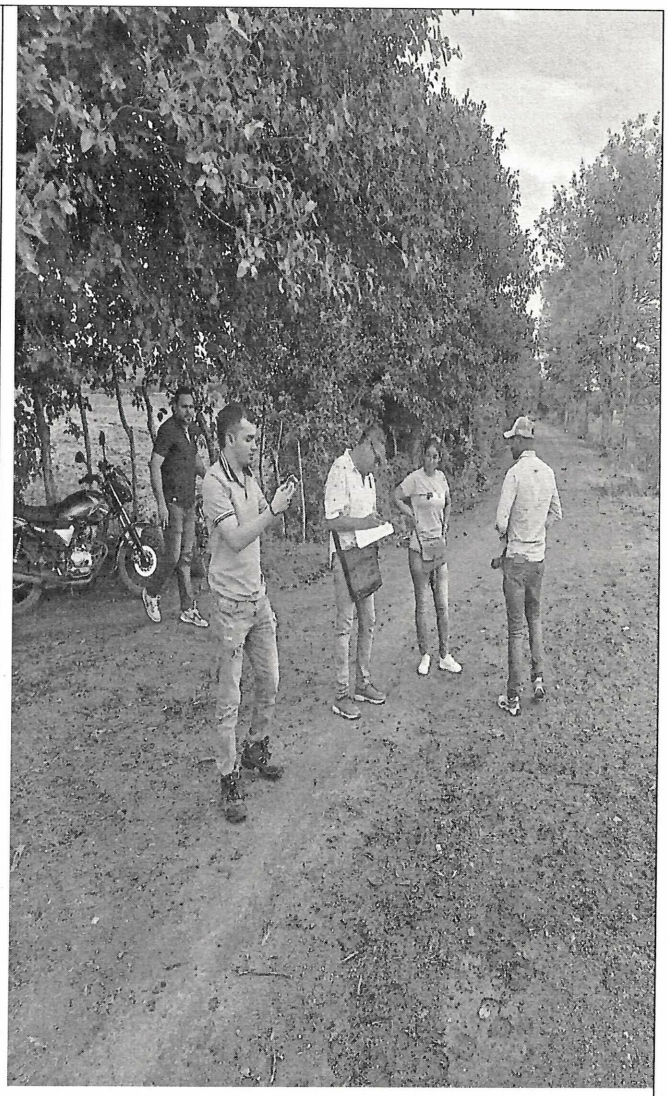



FIRMA DE LOS PARTICIPANTES	
FIRMA: Gilberto A Ortega P.	FIRMA:
NOMBRE: Gilberto A Ortega Pol.	NOMBRE:: Juan Carlos Martinez Cotes
FIRMA: Aris Babilonia P.	FIRMA: José Nicolás Ospino P.
NOMBRE: Aris Babilonia P	NOMBRE: José Nicolás Ospino Poveda
FIRMA: Felix martinez	FIRMA:
NOMBRE: Felix francisco Martinez M	NOMBRE:
FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Heidmer Hernando Páez	NOMBRE:
FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE:	NOMBRE:
FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE:	NOMBRE:
FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE:	NOMBRE:
FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE:	NOMBRE:
