REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

| GRADO DE RESPONSABILIDAD |
|---|
| Mediante la suscripción de la presente acta, el contratista y el supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida |

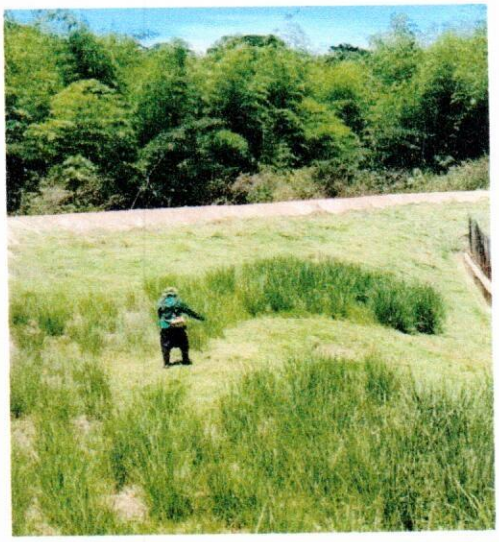
| INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATISTA | |
|---|---|
| **NÚMERO DEL CONTRATO** | CPS224-2026 |
| **DEPENDENCIA** | **SECRETARÍA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS** |
| | |
| **NOMBRE DEL CONTRATISTA** | **YHOBANI MORENO ALVAREZ** |
| **IDENTIFICACIÓN** | 70.471.009 |
| **NÚMERO DEL CONTRATO** | CPS224-2026 |
| **DURACIÓN** | Desde el acta de inicio hasta el 30 de septiembre de 2026 |
| **OBJETO** | Fortalecimiento de los servicios de saneamiento básico, mantenimiento y funcionamiento de la EBAR, PTAR y operación en marcha de cada una de las unidades del sistema. |
| **SUPERVISOR (A)** | Juan Camilo García Ciro<br>Secretario de Planeación y obras Públicas |
| **PERIODO EJECUTADO**: | Desde el 01 de agosto hasta el 30 de agosto del 2026 |
| **VALOR DEL PERIODO:** | 2.725.000 |
| **VALOR DEL CONTRATO** | $ 8.175.000 |
| **SUSPENSIONES** | N/A |
| **ADICIÓN** | N/A |
| **AMPLIACIÓN** | N/A |
| **OTROSÍ (Por motivo diferente a adición y ampliación)** | N/A |

**ACTIVIDADES**

El suscrito contratista informa que, durante el periodo ejecutado, ha desarrollado las siguientes actividades en cumplimiento al objeto del contrato.

| **ACTIVIDADES ESPECIFICAS SEGÚN CONTRATO** (incluir únicamente las que tengan relación con las actividades ejecutadas en el periodo) | **EJECUCIÓN O DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS SEGÚN CONTRATO** | **EVIDENCIA DE LAS OBLIGACIONES CENTRALES DEL CONTRATO** |
|---|---|---|

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

| INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATISTA | | |
|---|---|---|
| **NÚMERO DEL CONTRATO** | CPS224-2026 | |
| **DEPENDENCIA** | **SECRETARÍA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS** | |
| | | |
| 1.Labores de limpieza y mantenimiento en las instalaciones de la EBAR y la PTAR. | Se realizo guadañada en las plantas Ptar Ebar desde el 10 hasta el 14 de agosto<br><br>Se realiza lavado de planta Ptar<br><br>18/08/2026 | Limpieza y mantenimiento de las plantas<br><br><br><br> |

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

| INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATISTA | | |
|---|---|---|
| **NÚMERO DEL CONTRATO** | CPS224-2026 | |
| **DEPENDENCIA** | **SECRETARÍA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS** | |
| | | |
| | | |
| 2.Limpieza del canal de entrada tanto de la EBAR como de la PTAR (material sólido), cribado (material grueso), desarenador (arenas), reactor UASB (natas y canaletas) y lechos de secado (lodo). | • Se realiza limpieza de los canales de entrada, rejillas de cribado, desarenador y canaletas y reactores de la planta PTAR Todos los días.<br><br>Limpieza de cunetas | <br> |

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

| INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATISTA | |
|---|---|
| **NÚMERO DEL CONTRATO** | CPS224-2026 |
| **DEPENDENCIA** | **SECRETARÍA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS** |







HONOR Magic8 Lite 24mm f/1.75 1/100s ISO105



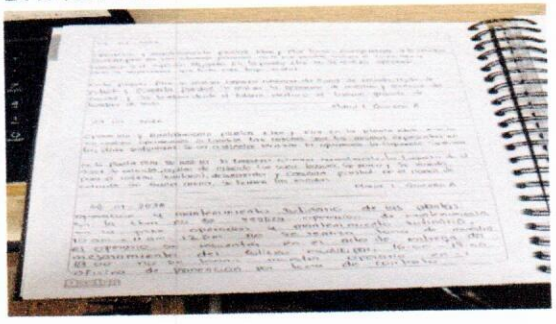
HONOR Magic8 Lite 24mm f/1.75 1/679s ISO100

Limpieza de reactores 18/08/2026

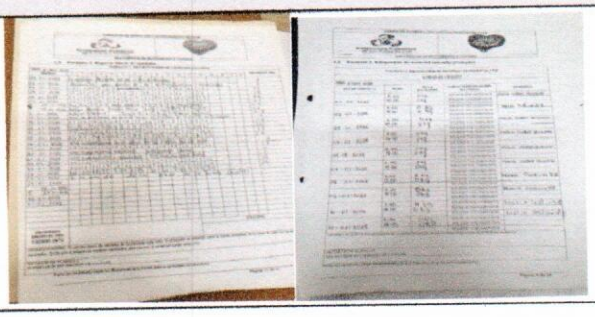
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

| INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATISTA | | |
|---|---|---|
| **NÚMERO DEL CONTRATO** | CPS224-2026 | |
| **DEPENDENCIA** | **SECRETARÍA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS** | |
| | | |
| | | |
| 3.Disponer adecuadamente los residuos extraídos de las unidades de tratamiento. | Se extraen lodos de las unidades de tratamiento y basura de las rejillas de Cribado<br>Después de 5 días de haber echado el lodo en los lechos de secados se voltea y se le aplica cal por otros 5 días y luego se saca del todo.<br>• 28/08/2026<br><br>La basura se empaca en una bolsa de basura y se marca (MATERIAL CONTAMINADO) Para que los operarios del relleno sanitario le den un buen manejo y con cuidado. | <br>HONOR Magic8 Lite 24mm f/1.75 1/199s ISO108 |
| 4.Lectura del caudal en EBAR y la PTAR (flotador y canaleta Parshall. | • El caudal se mide cada hora en una regleta que está ubicada en la canaleta Parshall |  |
| 5.Medición de parámetros en situ en el afluente y efluente de la PTAR y en el efluente del | • En el pH metro se realiza la medición de las aguas | -No aplica para este mes. |

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

| INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATISTA | | |
|---|---|---|
| **NÚMERO DEL CONTRATO** | CPS224-2026 | |
| **DEPENDENCIA** | **SECRETARÍA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS** | |
| | | |
| módulo del reactor UASB; como el pH, alcalinidad, sólidos sedimentables y el perfil de lodos | recaudadas cada hora en el afluente y efluente de la planta<br>• pHmetro fuera de servicio. | |
| 6.Quemar el biogás producido en el reactor UASB. | -No aplica para este mes. | • No aplica para este mes. |
| 7.Purgar las unidades biológicas cuando sea necesario, realizando seguimiento y mantenimiento a los lechos de secado y al lodo deshidratado. | -No aplica para este mes. | • No aplica para este mes. |
| 8.Reportar a tiempo la cantidad de insumos que se necesiten para el cuidado del operador y el funcionamiento de la EBAR y la PTAR, también informar el estado de las estructuras para realizar acciones preventivas. | -No aplica para este mes. | No aplica para este mes. |
| 9.Acompañar las jornadas de muestreo | • El muestreo se toma cada hora, de 6am hasta las 6pm todos los días.<br><br>El pHmetro sigue malo por lo tanto no se toman muestras. | - No aplica para este mes. |
| 10.Diligenciar las bitácoras y formatos para el registro de las operaciones y parámetros ejecutados en la planta | • En la bitácora se anotan todas las novedades durante el mes.<br>• Los formatos se llenan con el registro de muestras, caudal, parámetros de control y material extraído de las unidades de tratamiento. | BITÁCORA<br><br>FORMATOS |

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

| INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATISTA | | |
|---|---|---|
| **NÚMERO DEL CONTRATO** | CPS224-2026 | |
| **DEPENDENCIA** | **SECRETARÍA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS** | |
| | | |
| | |  |
| 11.Realizar las demás actividades relacionadas con apoyo a eventos y campañas emprendidas desde la secretaria de Planeación y Obras Públicas, la Administración Municipal y las demás requeridas para el cumplimiento del objeto contractual y/o solicitadas por el supervisor. | No aplica para este mes | No aplica para este mes |
| **OBSERVACIONES** | | |
| Para constancia, se firma en San Rafael a los (30) días del mes de agosto del año 2026. | | |

**YHOBANI MORENO ALVAREZ**

**C.C. 70.471.009**
**Contratista**

Camilo García
**JUAN CAMILO GARCÍA CIRO**
**Secretario de planeación y obras públicas**

**Supervisor**
