INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROGRAMA: CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTO DE INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

PERIODO DE LA ACTIVIDAD: JULIO DE 2026
CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO GUAKOS
IDENTIFICACION: Nit 892301621-2
No. DE CONTRATO: 1964 DE 2024

ACTIVIDAD: ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
VIA: SAN ROQUE - LA PAZ RUTA 4901
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: MENSUAL

PR		ANCHO PROMEDIO (m)		LONGITUD EFECTIVA DE ROCERIA (m)	CANTIDAD (ha)	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER					
0+000	30+800	5,5	5,5	27.653	30,42	6	5,1 ha/Hombre	
35+200	50+000	4,6	4,5	12.270	11,17	6	1,9 ha/Hombre	

ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE CUNETAS
VIA: SAN ROQUE - LA PAZ RUTA 4901
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: MENSUAL

PR		TIPO DE CUNETA		SECCION	LONGITUD (m)	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
0+000	30+800	Concreto		V	5.211	3	1737 m/Hombre	
35+200	50+000	Concreto		V	1.958	3	652,7 m/Hombre	

ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE BERMA
VIA: SAN ROQUE - LA PAZ RUTA 4901
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: MENSUAL

PR		TIPO DE BERMA		UBICACIÓN	LONGITUD (m)	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
0+000	30+800	Asfalto		Calzada	61.600	3	20533 m/Hombre	
35+200	50+000	Asfalto		Calzada	29.600	3	9867 m/Hombre	

ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS Y BOX CULVERT
VIA: SAN ROQUE - LA PAZ RUTA 4901
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: MENSUAL

PR		CANTIDAD (Und)	CANTIDAD (Und)		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL		ENCOLES	DESCOLES			
0+000	30+800	67	67	67	2	34 Und/Hombre	Alcantarillas y Box Culvert
35+200	50+000	9	9	9	2	5 Und/Hombre	Alcantarillas y Box Culvert

ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES
VIA: SAN ROQUE - LA PAZ RUTA 4901
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: MENSUAL

PR		TIPO	CANTIDAD (Und)	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL					
0+000	30+800	PUENTE	8	4	2 Und/Hombre	
35+200	50+000	PUENTE	6	4	2 Und/Hombre	
0+000	30+800	PONTON	26	4	7 Und/Hombre	
35+200	50+000	PONTON	13	4	3 Und/Hombre	

ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE SEÑALES
VIA: SAN ROQUE - LA PAZ RUTA 4901
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: MENSUAL

PR		UBICACIÓN		CANTIDAD (Und)	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	DER	IZQ				
0+000	30+800	x	x	395	4	99 Und/Hombre	
35+200	50+000	x	x	156	4	39 Und/Hombre	

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROGRAMA: CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTO DE INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

PERIODO DE LA ACTIVIDAD: JULIO DE 2026
CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO GUAKOS
IDENTIFICACION: Nit 892301621-2
No. DE CONTRATO: 1964 DE 2024

ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE DEFENSAS METALICAS
VIA: SAN ROQUE - LA PAZ RUTA 4901
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: MENSUAL

PR		UBICACIÓN		CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	DER	IZQ	(m)			
0+000	30+800	x	x	3153	4	788 Und/Hombre	
35+200	50+000	x	x	1178	4	295 Und/Hombre	

ACTIVIDAD: PODAS FITOSANITARIAS
VIA: SAN ROQUE - LA PAZ RUTA 4901
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: MENSUAL

PR		CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	(Und)			
0+000	30+800	129	3	43 Und/Hombre	
35+200	50+000	101	3	34 Und/Hombre	

OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS:
1. Recoleccion de residuos
2. Atencion de Emergencias
3. Ornato
4. Actividad de Tapahueco

RESUMEN							
ID	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	UND	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	% EJECUCION
1	ROCERIA Y DESMONTE MANUAL	MENSUAL	ha	42	6	6,9 ha/Hombre	100%
2	LIMPIEZA DE CUNETAS	MENSUAL	m	7169	2	3584,5 m/Hombre	100%
3	LIMPIEZA DE BERMA	MENSUAL	m	91.200	3	30400 m/Hombre	100%
4	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	MENSUAL	Und	76	2	38 Und/Hombre	100%
5	LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES	MENSUAL	Und	53	4	13,3 Und/Hombre	100%
6	LIMPIEZA DE SEÑALES	MENSUAL	Und	551	4	137,8 Und/Hombre	100%
7	LIMPIEZA DEFENSAS METALICAS	MENSUAL	m	4331	4	1082,8 m/Hombre	100%
8	PODAS FITOSANITARIAS	MENSUAL	Und	230	3	76,7 Und/Hombre	100%

OBSERVACIONES

JEAN CARLOS DIAZ ARRIETA
Representante Legal COOGUAKOS

REGISTRO FOTOGRAFICO

Rocería y Desmonte Manual

ANTES	DURANTE	DESPUES
		
		

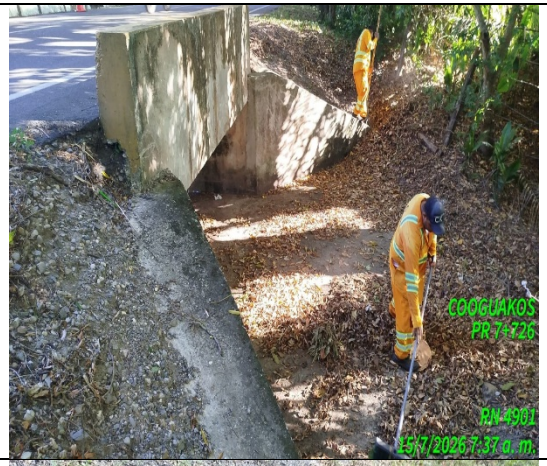
Limpieza de Cunetas

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

Limpieza de Berma

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

Limpieza de Alcantarillas y/o Box Culvert

ANTES	DURANTE	DESPUES
		
		

Limpieza de Puentes y Pontones

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

Podas Fitosanitarias

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

Actividad de Tapahueco

ANTES	DURANTE	DESPUES
		
		

Recolección de Residuos

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

Ornato

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

Limpieza Señales Verticales

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

Limpieza Defensas Metalicas

ANTES	DURANTE	DESPUES
		
