INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA

INFORME MENSUAL No. 1A.

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA GLORIA

NIT No. 819.004.298-7

CONTRATO No. 1632-2025

PERIODO: DEL 09 AL 25 DE OCTUBRE DE 2025

OCTUBRE DE 2025

1 INTRODUCCIÓN

Los contratos de las cooperativas están encaminados a realizar el mantenimiento rutinario en las vías a cargo del Instituto Nacional de Vías, de acuerdo a las actividades descritas a continuación, atendiendo y dando cumplimiento a la logística de trabajos, logística de personal y logística de transporte.

El mantenimiento rutinario es el conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente a lo largo de la vía, con la finalidad principal de preservar todos los elementos de la infraestructura vial con la mínima cantidad de alteraciones o daños, y en lo posible, conservando las condiciones que tiene después de la construcción o mejoramiento.

Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se requiere garantizar el mantenimiento rutinario de algunas vías a cargo del Instituto Nacional de Vías, se adelanta el programa de Mantenimiento Rutinario con el fin de contribuir, mantener y aplicar el significado ya mencionado, preservando el patrimonio de la Nación durante periodos continuos, evitando el deterioro prematuro de las estructuras viales, ofreciendo una atención oportuna, con tiempo de respuesta casi inmediato ante cualquier evento, y buscando mantener los tiempos de desplazamiento para los cuales está diseñada la vía.

Partiendo de las obligaciones contractuales de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA GLORIA, adjudicataria del contrato No. 1632 de 2025, Dirección Territorial Córdoba – INVIAS, se realiza el presente Informe mensual, correspondiente a las actividades ejecutadas durante el mes de octubre.

2 OBJETIVO

Realizar las actividades de Mantenimiento Rutinario de las Carreteras a cargo de la Dirección Territorial Córdoba – INVÍAS, coordinadas, inspeccionadas, revisadas y evaluadas bajo la responsabilidad del Administrador Vial Grupo 3, representado por la empresa VICTOR HUGO BRAVO MARTINEZ.

3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El contrato No. 1632 de 2025 tiene como objeto el SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA; VÍAS: CONECTANTE CERETÉ; CONECTANTE LETICIA (MONTERÍA - MONTERÍA); CONECTANTE LETICIA (CERETÉ CERETÉ); POSTOBÓN - AEROPUERTO (INCLUYE GLORIETA MOCARÍ DE 3 CARRILES);PARALELA CIRCUNVALAR DE MONTERÍA (INCLUYE GLORIETA CALLE 41), CONECTANTE UNICORDOBA;TE AEROPUERTO - CERETÉ (INCLUYE INTERSECCIÓN A DESNIVEL TE AEROPUERTO: 3 ENLACES). VÍA 7402 CERETÉ CIENEGA DE ORO - LA YE; 2514 LA YE - SAHAGÚN - CHINÚ. MÍNIMA CUANTÍA.

4 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A CARGO

4.1 SECTORES A CARGO DE LA COOPERATIVA.

La empresa COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA GLORIA tiene a su cargo las siguientes vías:

- CONECTANTE CERETÉ; CONECTANTE LETICIA (MONTERÍA - MONTERÍA); CONECTANTE LETICIA (CERETÉ CERETÉ); POSTOBÓN - AEROPUERTO (INCLUYE GLORIETA MOCARÍ DE 3 CARRILES);PARALELA CIRCUNVALAR DE MONTERÍA (INCLUYE GLORIETA CALLE 41), CONECTANTE UNICORDOBA;TE AEROPUERTO - CERETÉ (INCLUYE INTERSECCIÓN A DESNIVEL TE AEROPUERTO: 3 ENLACES). VÍA 7402 CERETÉ CIENEGA DE ORO - LA YE; 2514 LA YE - SAHAGÚN - CHINÚ

4.2 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO.

4.2.1 ACTIVIDADES GENERALES

La empresa COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA GLORIA se encarga de realizar las actividades de Mantenimiento Vial Rutinario en los sectores a cargo de la Dirección Territorial Córdoba – INVÍAS. Las actividades con las cuales se evalúa la labor desempeñada por los mismos son las siguientes:

- Bacheo y/o parcheo en áreas inferiores a 4m² para la restauración de la carpeta de rodadura.
- Servicio de mano de obra para realizar Bacheo y/o parcheo (en la berma pavimentada) realizado con mano de obra directa. Relleno de los huecos de la banca.
- Sello de fisuras abiertas (ancho mayor de 3 mm) realizado con mano de obra directa, con mezcla de emulsión y arena.
- Sello de fisuras abiertas (ancho menor de 3 mm) realizado con mano de obra directa, con emulsión asfáltica.
- Limpieza de bermas pavimentadas realizado con mano de obra directa: eliminación de tierra, basura y otros obstáculos, incluyendo cargue y transporte.
- Limpieza de bermas realizado con mano de obra directa (bermas no pavimentadas o en tierra).
- Limpieza manual de las cunetas revestidas y en tierra.
- Limpieza manual de las zanjas de coronación revestidas y en tierra.
- Limpieza manual de encoles y/o descoles revestidos y en tierra.
- Limpieza manual de elementos de más de 0.60 m² de sección (de ϕ 24”, ϕ 36” y box coulverts).
- Limpieza manual de pequeñas obras hidráulicas (zanjas colectoras, canales, cámaras).
- Mantenimiento rutinario de puentes realizado con mano de obra directa, incluye actividades de limpieza manual.
- Limpieza manual del lecho del río (si las condiciones del caudal lo permiten y no requiere permisos ambientales o equipo especializado).
- Limpieza manual de cursos de agua (si no requiere permisos ambientales o equipo especializado).

- Limpieza manual y pintura de barandas.
- Despeje de derrumbes pequeños (solo mano de obra, no incluye maquinaria ni señalización temporal).
- Limpieza de la calzada (que no requiera maquinaria).
- Rocería y desmonte manual (controlar vegetación en zonas laterales y el separador).
- Poda, corte y/o retiro de árboles, que no requieran permiso o trámite ambiental.
- Empradización con semillas.
- Empradización con cespedones.
- Jardinería (sembrar y mantener cultivos de plantas ornamentales).
- Reposición de la lámina de las señales.
- Reposición del poste de la señal.
- Reposición de la señal completa.
- Reposición de las señales de referencia.
- Pintura. Renovación de las indicaciones en el mojón.
- Limpieza manual de señales.
- Instalación de defensas metálicas de correa simple.
- Instalación de defensas metálicas de correa doble.
- Reposición de las partes dañadas de una defensa metálica.
- Limpieza manual de defensas metálicas.
- Vigilancia: Apoyo para el control de botaderos de basuras, invasiones y obras no autorizadas, informando al Administrador.
- Actividades preventivas y de mantenimiento rutinario coordinadas por el administrador vial.
- Atención de emergencias (tareas manuales necesarias para un restablecimiento rápido del tránsito, no incluye maquinaria).

4.2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO EVALUADO

A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas durante el mes de octubre de 2025 para dar cumplimiento a lo establecido en los pliegos de condiciones:

- COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA GLORIA NIT No. 819.004.298-7" (CONTRATO No. 1632-2025)

Semana 1: Miércoles 9 al Martes 15 de Octubre de 2025

- Ejecución de labores de rocería y desmonte manual en los tramos de las vías:
- Conectante Cereté y Conectante Leticia (Montería - Montería), desde el PR [0+000] hasta el PR [2+800].
- Glorieta Mocarí, en la vía Postobón - Aeropuerto, incluyendo limpieza en zona de ciclorruta y separador central.
- Control de vegetación en zonas laterales y cunetas. Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 2: Miércoles 16 al Martes 22 de Octubre de 2025

- Continuación de rocería y desmonte manual en los siguientes sectores:
- Paralela Circunvalar de Montería (incluye Glorieta Calle 41) y Conectante Unicórdoba, desde el PR [2+800] hasta el PR [8+500].
- Tramo Postobón – Aeropuerto – Cereté, incluyendo intersección a desnivel del TE Aeropuerto.
- Mantenimiento de bermas y control de material vegetal acumulado.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 3: Miércoles 23 al Viernes 25 de Octubre de 2025

- Labores de bacheo manual en puntos deteriorados de las vías:
- Vía 7402 Cereté – Ciénaga de Oro – La Ye y Vía 2514 La Ye – Sahagún, con aplicación de mezcla asfáltica en frío en sectores puntuales.
- Actividades de rocería y limpieza general en tramos de las vías a cargo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

4.3 PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) tiene como objetivo la prevención y control de riesgos que puedan derivar en enfermedades laborales o accidentes de trabajo.

De acuerdo con los lineamientos exigidos por el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, la empresa COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA GLORIA cumple con el uso de los elementos de protección personal (EPP) requeridos durante la ejecución de cada actividad, entre los que se encuentran:

- Botas de seguridad
- Canilleras
- Caretas
- Gafas de protección
- Protectores auditivos
- Guantes
- Cascos
- Delantales de cuero para manejo de guadañas

Asimismo, la empresa cuenta con comités institucionales operativos, como el Comité de Vigilancia, el Comité de Convivencia y la Brigada de Emergencia. Estos comités están capacitados para atender situaciones de riesgo como incendios, realizar evacuaciones y aplicar primeros auxilios.

Entre las actividades desarrolladas durante este mes se destacan:

- Entrega del acta de reporte de estándares mínimos a la ARL.
- Inspecciones diarias preoperativas de las guadañas.
- Revisión e inspección periódica del estado de los EPP y su reposición en caso necesario.

La sede administrativa de la empresa se encuentra ubicada en el municipio de Montería, donde se realiza el control documental y logístico de todas las operaciones.

Estas acciones evidencian el compromiso permanente de la empresa con la seguridad y el bienestar de sus trabajadores y el cumplimiento de las normas legales vigentes en materia de SST.

4.4 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL EN LA JORNADA DE TRABAJO

Para brindar una adecuada protección a los trabajadores y a los transeúntes de la vía mientras se ejecutan las actividades de mantenimiento rutinario, se está utilizando una señalización temporal conforme a las disposiciones del Instituto Nacional de Vías – INVIAS.

Durante las jornadas de trabajo se dispone del siguiente equipamiento de señalización temporal:

- Señales temporales
- Conos de tráfico
- Malla protectora (utilizada especialmente durante las actividades de rocería)

Este conjunto de elementos garantiza un entorno de trabajo seguro, minimizando el riesgo de accidentes tanto para el personal como para los usuarios de la vía.

5 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE LA COOPERATIVA

COOPERATIVA	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA GLORIA
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA; VÍAS: CONECTANTE CERETÉ; CONECTANTE LETICIA (MONTERÍA - MONTERÍA);CONECTANTE LETICIA (CERETÉ CERETÉ); POSTOBÓN - AEROPUERTO (INCLUYE GLORIETA MOCARÍ DE 3 CARRILES);PARALELA CIRCUNVALAR DE MONTERÍA (INCLUYE GLORIETA CALLE 41), CONECTANTE UNICORDOBA;TE AEROPUERTO - CERETÉ (INCLUYE INTERSECCIÓN A DESNIVEL TE AEROPUERTO: 3 ENLACES). VÍA 7402 CERETÉ CIENEGA DE ORO - LA YE; 2514 LA YE - SAHAGÚN - CHINÚ. MÍNIMA CUANTÍA
NÚMERO DEL CONTRATO	1632-2025
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL	UN (1) MESES
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	9 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO PRINCIPAL	8 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO	8 DE NOVIEMBRE DE 2025
VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL	$97.251.273,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$97.251.273,00

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Durante el mes de octubre, la cooperativa de mantenimiento rutinario cumplió con los indicadores establecidos por el Administrador Vial.

En este periodo se continuaron las labores de rocería, poda, corte y/o retiro de árboles, permitiendo el despeje de señales verticales en varios puntos, con el objetivo de mantener el ornato y la visibilidad en las vías intervenidas.

También se realizaron actividades complementarias como limpieza en cunetas y alcantarillas, limpieza de bermas y mantenimiento de la señalización vertical, entre otras actividades; asegurando así el adecuado funcionamiento y conservación de la infraestructura vial.

ANEXOS

CUADRO DE RENDIMIENTOS MENSUALES

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

ACTIVIDAD **ROCERIA Y DESMONTE MANUAL** PERIODO: OCTUBRE DE 2025

VÍA CONECTANTE CERETÉ; CONECTANTE LETICIA (MONTERÍA - MONTERÍA);CONECTANTE LETICIA (CERETÉ CERETÉ); POSTOBÓN - AEROPUERTO (INCLUYE GLORIETA MOCARÍ DE 3 CARRILES);PARALELA CIRCUNVALAR DE MONTERÍA (INCLUYE GLORIETA CALLE 41), CONECTANTE UNICORDOBA;TE AEROPUERTO - CERETÉ (INCLUYE INTERSECCIÓN A DESNIVEL TE AEROPUERTO: 3 ENLACES). VÍA 7402 CERETÉ CIENEGA DE ORO - LA YE; 2514 LA YE - SAHAGÚN - CHINÚ

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		ANCHO PROMEDIO (m)		LONG	CANT (Ha)	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	KM				
PR2+0000	PR4+0000	5		2.00	0.05	9	180.00	
PR4+0000	PR6+0500	6		2.50	0.08	9	120.00	
Conectantes Cereté		4	4	2.40	0.10	9	93.75	
Conectante Unicordoba		5	5	1.70	0.09	9	105.88	
PR+00	PR2+0000	5	5	2.00	0.10	9	90.00	
PR2+0000	PR4+0000	5		1.50	0.18	9	50.27	
PR2+0000	PR5+0000		4	3.00	0.06	9	150.00	
PR8+0500	PR10+0400	10	10	1.90	0.19	9	47.37	
PR10+0400	PR12+0700	10	10	2.30	0.23	9	39.13	
PR12+0700	PR15+0400	10	10	2.70	0.27	9	33.33	
PR59+0000	PR60+0000		8	1.00	0.04	5	125.00	
PR65+0000	PR67+0000	8		2.00	0.08	5	62.50	
PR65+0000	PR67+0000		8	2.00	0.08	5	62.50	
PR80+0000	PR82+0000		8	2.00	0.08	5	62.50	
PR84+0000	PR87+0000		8	3.00	0.12	5	41.67	
PR84+0000	PR87+0000	8		3.00	0.12	5	41.67	
PR67+0000	PR69+0000	8		2.00	0.08	5	62.50	
PR72+0000	PR73+0500		8	1.50	0.06	5	83.33	
PR80+0000	PR83+0000	8		3.00	0.12	5	41.67	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE CUNETAS

VIA CONECTANTE CERETÉ; CONECTANTE LETICIA (MONTERÍA - MONTERÍA);CONECTANTE LETICIA (CERETÉ CERETÉ); POSTOBÓN - AEROPUERTO (INCLUYE GLORIETA MOCARÍ DE 3 CARRILES);PARALELA CIRCUNVALAR DE MONTERÍA (INCLUYE GLORIETA CALLE 41), CONECTANTE UNICORDOBA;TE AEROPUERTO - CERETÉ (INCLUYE INTERSECCIÓN A DESNIVEL TE AEROPUERTO: 3 ENLACES). VÍA 7402 CERETÉ CIENEGA DE ORO - LA YE; 2514 LA YE - SAHAGÚN - CHINÚ

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO CUNETA		SECCIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
		X		EN V	0.00	3	#¡DIV/0!	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE BERMAS

VIA CONECTANTE CERETÉ; CONECTANTE LETICIA (MONTERÍA - MONTERÍA);CONECTANTE LETICIA (CERETÉ CERETÉ); POSTOBÓN - AEROPUERTO (INCLUYE GLORIETA MOCARÍ DE 3 CARRILES);PARALELA CIRCUNVALAR DE MONTERÍA (INCLUYE GLORIETA CALLE 41), CONECTANTE UNICORDOBA;TE AEROPUERTO - CERETÉ (INCLUYE INTERSECCIÓN A DESNIVEL TE AEROPUERTO: 3 ENLACES). VÍA 7402 CERETÉ CIENEGA DE ORO - LA YE; 2514 LA YE - SAHAGÚN - CHINÚ

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO DE BERMA		UBICACIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
		X		IZQ	0.00	3		
		x		IZQ	0.00	3		

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS

VIA CONECTANTE CERETÉ; CONECTANTE LETICIA (MONTERÍA - MONTERÍA);CONECTANTE LETICIA (CERETÉ CERETÉ); POSTOBÓN - AEROPUERTO (INCLUYE GLORIETA MOCARÍ DE 3 CARRILES);PARALELA CIRCUNVALAR DE MONTERÍA (INCLUYE GLORIETA CALLE 41), CONECTANTE UNICORDOBA;TE AEROPUERTO - CERETÉ (INCLUYE INTERSECCIÓN A DESNIVEL TE AEROPUERTO: 3 ENLACES). VÍA 7402 CERETÉ CIENEGA DE ORO - LA YE; 2514 LA YE - SAHAGÚN - CHINÚ

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		CANTIDAD	CANTIDAD (ML)		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	UND	ENCOLES	DESCOLES			
						#¡DIV/0!	

ACTIVIDAD BACHEO

VIA CONECTANTE CERETÉ; CONECTANTE LETICIA (MONTERÍA - MONTERÍA);CONECTANTE LETICIA (CERETÉ CERETÉ); POSTOBÓN - AEROPUERTO (INCLUYE GLORIETA MOCARÍ DE 3 CARRILES);PARALELA CIRCUNVALAR DE MONTERÍA (INCLUYE GLORIETA CALLE 41), CONECTANTE UNICORDOBA;TE AEROPUERTO - CERETÉ (INCLUYE INTERSECCIÓN A DESNIVEL TE AEROPUERTO: 3 ENLACES). VÍA 7402 CERETÉ CIENEGA DE ORO - LA YE; 2514 LA YE - SAHAGÚN - CHINÚ

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR	TIPO DE SUELO	VOLUMEN (M3)	ABSCISAS		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
			INICIAL	FINAL			
PR6+000-PR10+000	Asfalto	0.02	PR12+0700	PR15+0400	9	450.00	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

VIA 2514 - SAHAGUN-CHINU

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	NOMBRE	LONGITUD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
				#¡DIV/0!	
				#¡DIV/0!	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE SEÑALES

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA		UBICACIÓN		CANT	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	DER	IZQ				
PR82+0500	PR85+0000	X	X	5	2	0.40	
PR85+0000	PR88+0000	X	X	7	2	0.29	
PR88+0000	PR91+0000	X	X	3	2	0.67	
		X	X	2	3	1.50	
		X	X	3	3	1.00	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES

RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DLA GLORIA

NIT: 819.004.298-7

CONTRATO No. 1632-2025

PERIODO: DEL 09 AL 25 DE OCTUBRE

OTRAS ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	ABSCISA		UBICACIÓN		CANT	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
	INICIAL	FINAL	DER	IZQ				

RESUMEN

ID	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	UND	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	% EJECUCIÓN
1	ROCERIA	DIARIA	Ha	2.12	90	42.55	96
2	LIMPIEZA DE SEÑALES	MESUAL	UND	15	6	0.40	93
3	ACTIVIDAD BACHEO	MESUAL	KM	10.00	10	1.00	94
4							

OBSERVACIONES

LA MICROEMPRESA - COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA GLORIA CUMPLIO CON LOS INDICADORES.

SE RECOMIENDA CONTINUAR PRIORIZANDO LA ACTIVIDAD DE ROCERÍA.

Firma:

Nombre: ROGER DAVID DIAZ GUZMAN
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA GLORIA
CC. No. 85.444.798 DE Ariguaní

Firm a:

Nombre: CARLOS MARIO ZAPATA CUADRADO
INGENIERO RESIDENTE - ADMINISTRADOR VIAL - AMV-G3
VICTOR HUGO BRAVO MARTINEZ
19202-13078 CAU

REGISTRO FOTOGRÁFICO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CÓRDOBA
REGISTRO FOTOGRÁFICO – COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA GLORIA

ADMINISTRADOR VIAL: VÍCTOR HUGO BRAVO MARTÍNEZ LOTE:

FECHA: OCTUBRE 2025 PR'S: VARIOS

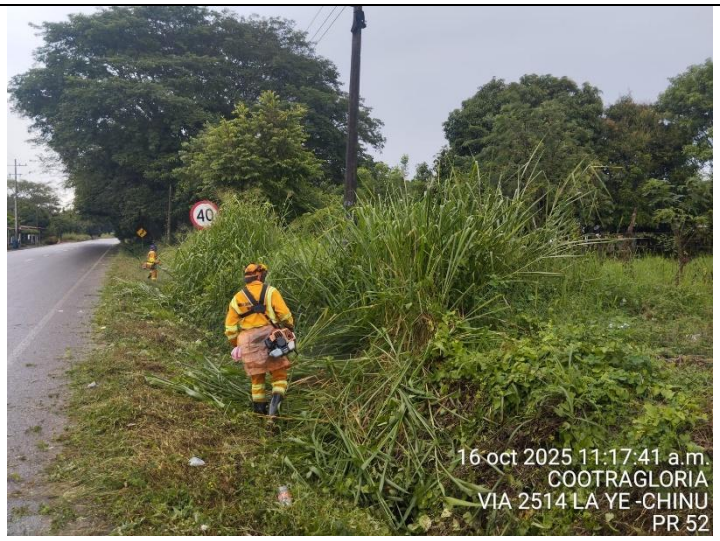
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS







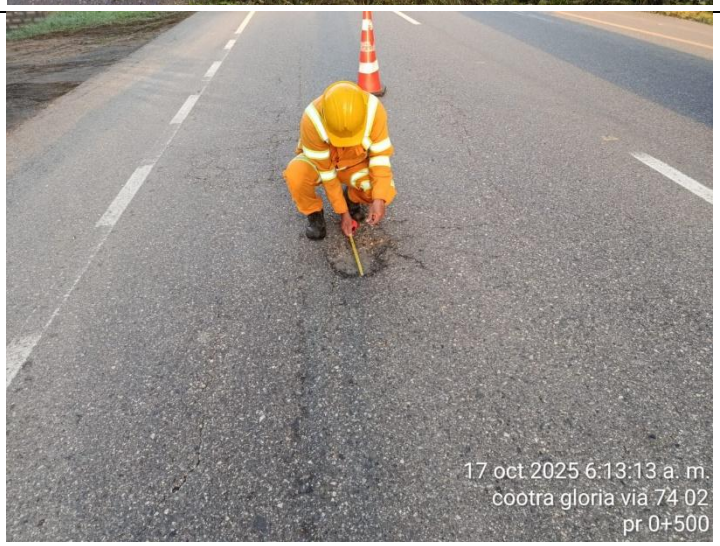


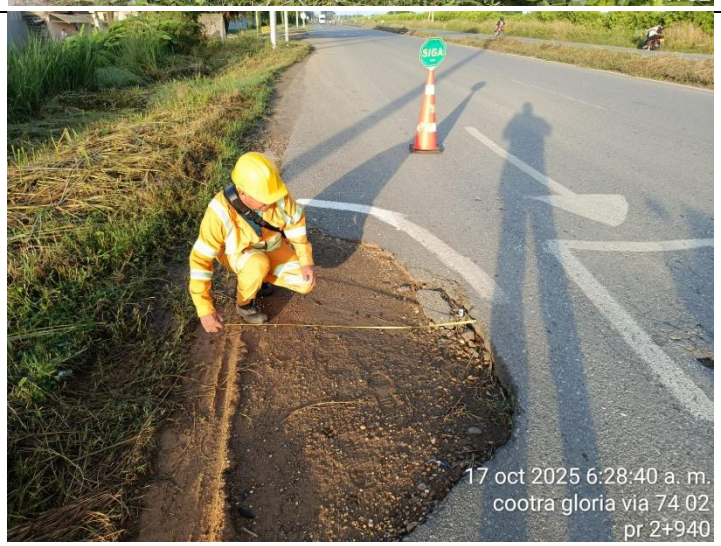

16 oct 2025 11:17:41 a.m.
COOTRAGLORIA
VIA 2514 LA YE -CHINU
PR 52


16 oct 2025 11:15:44 a.m.
COOTRAGLORIA
VIA 2514 LA YE -CHINU
PR 52


16 oct 2025 11:20:59 a.m.
COOTRAGLORIA
VIA 2514 LA YE -CHINU
PR 52


16 oct 2025 11:05:45 a.m.
COOTRAGLORIA
VIA 2514 LA YE -CHINU
PR 52


17 oct 2025 6:13:13 a. m.
cootra gloria via 74 02
pr 0+500


17 oct 2025 6:28:40 a. m.
cootra gloria via 74 02
pr 2+940


Pr
O
7402
19 oct 2025 9:42:21 a. m.
cootra gloria 74 02 cerete la ye
pr0+000


Pr
19 oct 2025 2:49:41 p.m.
COOTRAGLORIA
VIA 2514 LA YE -CHINU
PR 66


21 oct 2025 8:12:22 a.m.
Sahagún-La Ye
Sahagún
Córdoba
COOTRAGLORIA
VIA 2514 LA YE -CHINU
PR 54+900


21 oct 2025 8:16:52 a.m.
Sahagún-La Ye
Sahagún
Córdoba
COOTRAGLORIA
VIA 2514 LA YE -CHINU
PR 54+900


21 oct 2025 8:49:14 a.m.
Sahagún-La Ye
Sahagún
Córdoba
COOTRAGLORIA
VIA 2514 LA YE -CHINU
PR 555+300


21 oct 2025 8:12:52 a. m.
COOTRAGLORIA
VARIANTE MONTERIA - CERETE

FIRMA: _____

ROGER DAVID DIAZ GUZMÁN
C.C. No. 85.444.798 DE Ariguaní
Representante Legal COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA GLORIA
