INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROGRAMA: CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTO DE INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

PERIODO DE LA ACTIVIDAD: SEPTIEMBRE DE 2024
CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO GUAKOS
IDENTIFICACION: Nit 892301621-2
No. DE CONTRATO: 1964 DE 2024

ACTIVIDAD: ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
VIA: SAN ROQUE - LA PAZ RUTA 4901
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: MENSUAL

PR		ANCHO PROMEDIO (m)		LONGITUD EFECTIVA DE ROCERIA (m)	CANTIDAD (ha)	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER					
00+000	34+200	5,8	5,7	31.053	35,71	6	6 ha/Hombre	

PR		ANCHO PROMEDIO (m)		LONGITUD EFECTIVA DE ROCERIA (m)	CANTIDAD (ha)	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER					
41+000	50+000	4,2	3,9	7.770	6,29	6	1,04 ha/Hombre	

ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE CUNETAS
VIA: SAN ROQUE - LA PAZ RUTA 4901
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: MENSUAL

PR		TIPO DE CUNETA		SECCION	LONGITUD (m)	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
00+000	34+200	Concreto		V	5349	2	2675 m/Hombre	

PR		TIPO DE CUNETA		SECCION	LONGITUD (m)	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
41+000	50+000	Concreto		V	1318	2	659 m/Hombre"	

ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE BERMA
VIA: SAN ROQUE - LA PAZ RUTA 4901
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: MENSUAL

PR		TIPO DE BERMA		UBICACIÓN	LONGITUD (m)	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
00+000	34+200	Asfalto		Calzada	68.400	3	22800 m/Hombre	

PR		TIPO DE BERMA		UBICACIÓN	LONGITUD (m)	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
41+000	50+000	Asfalto		Calzada	18.000	3	6000 m/Hombre	

ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS Y BOX CULVERT
VIA: SAN ROQUE - LA PAZ RUTA 4901
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: MENSUAL

PR		CANTIDAD (Und)	CANTIDAD (Und)		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL		ENCOLES	DESCOLES			
00+000	34+200	72	72	72	2	36 Und/Hombre	Alcantarillas y Box Culvert

PR		CANTIDAD (Und)	CANTIDAD (Und)		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL		ENCOLES	DESCOLES			
41+000	50+000	6	6	6	2	3 Und/Hombre	Alcantarillas y Box Culvert

ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES
VIA: SAN ROQUE - LA PAZ RUTA 4901
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: MENSUAL

PR		TIPO	CANTIDAD (Und)	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL					
00+000	34+200	PUENTE	10	4	2,5 Und/Hombre	
00+000	34+200	PONTON	28	4	7 Und/Hombre	

PR		TIPO	CANTIDAD (Und)	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL					
41+000	50+000	PUENTE	5	4	1,2 Und/Hombre	
41+000	50+000	PONTON	12	4	3 Und/Hombre	

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROGRAMA: CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTO DE INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

PERIODO DE LA ACTIVIDAD: SEPTIEMBRE DE 2024
CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO GUAKOS
IDENTIFICACION: Nit 892301621-2
No. DE CONTRATO: 1964 DE 2024

ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE SEÑALES
VIA: SAN ROQUE - LA PAZ RUTA 4901
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: MENSUAL

PR		UBICACIÓN		CANTIDAD (Und)	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	DER	IZQ				
00+000	34+200	x	x	414	4	104 Und/Hombre	

PR		UBICACIÓN		CANTIDAD (Und)	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	DER	IZQ				
41+000	50+000	x	x	82	4	21 Und/Hombre	

ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE DEFENSAS METALICAS
VIA: SAN ROQUE - LA PAZ RUTA 4901
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: MENSUAL

PR		UBICACIÓN		CANTIDAD (m)	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	DER	IZQ				
00+000	34+200	x	x	3414	4	853 m/Hombre	

PR		UBICACIÓN		CANTIDAD (m)	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	DER	IZQ				
41+000	50+000	x	x	1039	4	260 m/Hombre	

ACTIVIDAD: PODAS FITOSANITARIAS
VIA: SAN ROQUE - LA PAZ RUTA 4901
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: MENSUAL

PR		CANTIDAD (Und)	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL				
00+000	34+200	75	3	25 Und/Hombre	

PR		CANTIDAD (Und)	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL				
41+000	50+000	16	3	5 Und/Hombre	

ACTIVIDAD: REFERENCIACION DE OBRAS
VIA: SAN ROQUE - LA PAZ RUTA 4901
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: MENSUAL

PR		CANTIDAD (Und)	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL				
19+000	28+300	27	2	14 Und/Hombre	

ACTIVIDAD: PINTURA DE GUARDARUEDAS
VIA: SAN ROQUE - LA PAZ RUTA 4901
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: MENSUAL

PR		CANTIDAD (Und)	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL				
22+000	39+400	78	2	39 Und/Hombre	

ACTIVIDAD: ACTIVIDAD DE TAPAHUECO
VIA: SAN ROQUE - LA PAZ RUTA 4901
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: MENSUAL

PR		CANTIDAD (Und)	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL				
9+000	50+000	32	6	5 Und/Hombre	

OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS:
1. Recoleccion de residuos
2. Atencion de Emergencias
3. Ornato
4. Instalacion de maletines viales

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROGRAMA: CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTO DE INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

PERIODO DE LA ACTIVIDAD: SEPTIEMBRE DE 2024
CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO GUAKOS
IDENTIFICACION: Nit 892301621-2
No. DE CONTRATO: 1964 DE 2024

RESUMEN							
ID	**ACTIVIDAD**	**PERIODICIDAD**	**UND**	**CANTIDAD**	**No. HOMBRES**	**RENDIMIENTO**	**% EJECUCION**
1	ROCERIA Y DESMONTE MANUAL	MENSUAL	ha	42,00	6,00	7 ha/Hombre	100%
2	LIMPIEZA DE CUNETAS	MENSUAL	m	6667	2	3334 m/Hombre	100%
3	LIMPIEZA DE BERMA	MENSUAL	m	86.400	3	28800 m/Hombre	100%
4	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	MENSUAL	Und	78	2	39 Und/Hombre	100%
5	LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES	MENSUAL	Und	55	4	14 Und/Hombre	100%
6	LIMPIEZA DE SEÑALES	MENSUAL	Und	496	4	124 Und/Hombre	100%
7	LIMPIEZA DEFENSAS METALICAS	MENSUAL	m	4453	4	1113 m/Hombre	100%
8	PODAS FITOSANITARIAS	MENSUAL	Und	91	3	30 Und/Hombre	100%
9	REFERENCIACION DE OBRAS	MENSUAL	Und	27	2	14 Und/Hombre	100%
10	PINTURA DE GUARDARUEDAS	MENSUAL	Und	78	2	39 Und/Hombre	100%
11	ACTIVIDAD DE TAPAHUECO	MENSUAL	Und	32	6	5 Und/Hombre	100%

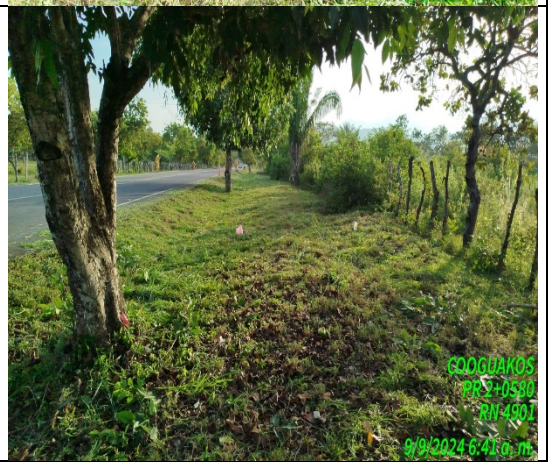
OBSERVACIONES



JEAN CARLOS DIAZ ARRIETA
Representante Legal COOGUAKOS

REGISTRO FOTOGRAFICO

Rocería y Desmonte Manual

ANTES	DURANTE	DESPUES
		
		

Limpieza de Cunetas

ANTES	DURANTE	DESPUES
		
		

Limpieza de Berma

ANTES	DURANTE	DESPUES
		
		

Limpieza de Alcantarillas y/o Box Culvert

ANTES	DURANTE	DESPUES
		
		

Limpieza de Puentes y Pontones

ANTES	DURANTE	DESPUES
		
		

Podas Fitosanitarias

ANTES	DURANTE	DESPUES
		
		

Limpieza de Señales

ANTES	DURANTE	DESPUES
		
		

Limpieza de Defensas Metalicas

ANTES	DURANTE	DESPUES
		
		

Referenciacion de Obras

ANTES	DURANTE	DESPUES
		
		

Pintura de Guardaruedas

ANTES	DURANTE	DESPUES
		
		

Actividad de Tapahueco

ANTES	DURANTE	DESPUES
		
		

Atencion de Emergencias

ANTES	DURANTE	DESPUES
		
		

Recolección de Residuos

ANTES	DURANTE	DESPUES
		
		

Ornato

ANTES	DURANTE	DESPUES
		
		

Instalacion de Maletines viales

ANTES	DURANTE	DESPUES
		
