INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROGRAMA: CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTO DE INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

PERIODO DE LA ACTIVIDAD: MAYO DE 2025
CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO GUAKOS
IDENTIFICACION: Nit 892301621-2
No. DE CONTRATO: 1964 DE 2024

ACTIVIDAD: ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
VIA: SAN ROQUE - LA PAZ RUTA 4901
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: MENSUAL

PR		ANCHO PROMEDIO (m)		LONGITUD EFECTIVA DE ROCERIA (m)	CANTIDAD (ha)	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER					
00+000	19+800	4,9	5	18.313	18,13	6	3 ha/Hombre	
22+000	50+000	5,8	5,6	23.910	27,26	6	4,5 ha/Hombre	

ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE CUNETAS
VIA: SAN ROQUE - LA PAZ RUTA 4901
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: MENSUAL

PR		TIPO DE CUNETA		SECCION	LONGITUD (m)	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
00+000	19+800	Concreto		V	2496	2	1248m/Hombre	
22+000	50+000	Concreto		V	4952	2	2476 m/Hombre	

ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE BERMA
VIA: SAN ROQUE - LA PAZ RUTA 4901
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: MENSUAL

PR		TIPO DE BERMA		UBICACIÓN	LONGITUD (m)	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
00+000	19+800	Asfalto		Calzada	39.600	3	13200 m/Hombre	
22+000	50+000	Asfalto		Calzada	56.000	3	18667 m/Hombre	

ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS Y BOX CULVERT
VIA: SAN ROQUE - LA PAZ RUTA 4901
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: MENSUAL

PR		CANTIDAD (Und)	CANTIDAD (Und)		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL		ENCOLES	DESCOLES			
00+000	19+800	43	43	43	2	22 Und/Hombre	Alcantarillas y Box Culvert
22+000	50+000	34	34	34	2	17 Und/Hombre	Alcantarillas y Box Culvert

ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES
VIA: SAN ROQUE - LA PAZ RUTA 4901
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: MENSUAL

PR		TIPO	CANTIDAD (Und)	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL					
00+000	19+800	PUENTE	7	4	1,8 Und/Hombre	
00+000	19+800	PONTON	21	4	5,3 Und/Hombre	
22+000	50+000	PUENTE	9	4	2,2 Und/Hombre	
22+000	50+000	PONTON	20	4	5,0 Und/Hombre	

ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE SEÑALES
VIA: SAN ROQUE - LA PAZ RUTA 4901
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: MENSUAL

PR		UBICACIÓN		CANTIDAD (Und)	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	DER	IZQ				
00+000	19+800	x	x	234	4	65,0 Und/Hombre	
22+000	50+000	x	x	335	4	84 Und/Hombre	

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROGRAMA: CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTO DE INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

PERIODO DE LA ACTIVIDAD: MAYO DE 2025
CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO GUAKOS
IDENTIFICACION: Nit 892301621-2
No. DE CONTRATO: 1964 DE 2024

ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE DEFENSAS METALICAS
VIA: SAN ROQUE - LA PAZ RUTA 4901
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: MENSUAL

PR		UBICACIÓN		CANTIDAD (m)	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	DER	IZQ				
00+000	19+800	x	x	1990	4	498 m/Hombre	
22+000	50+000	x	x	2667	4	667 m/Hombre	

ACTIVIDAD: PODAS FITOSANITARIAS
VIA: SAN ROQUE - LA PAZ RUTA 4901
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: MENSUAL

PR		CANTIDAD (Und)	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL				
00+000	19+800	73	3	24 Und/Hombre	
22+000	50+000	79	3	26 Und/Hombre	

OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS:
1. Recoleccion de residuos
2. Atencion de Emergencias
3. Ornato
4. Actividad de Tapahueco
5. Entrega de Plegables

RESUMEN							
ID	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	UND	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	% EJECUCION
1	ROCERIA Y DESMONTE MANUAL	MENSUAL	ha	45,39	6,00	8 ha/Hombre	100%
2	LIMPIEZA DE CUNETAS	MENSUAL	m	7448	2	3724 m/Hombre	100%
3	LIMPIEZA DE BERMA	MENSUAL	m	95.600	3	31867 m/Hombre	100%
4	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	MENSUAL	Und	77	2	39 Und/Hombre	100%
5	LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES	MENSUAL	Und	57	4	14 Und/Hombre	100%
6	LIMPIEZA DE SEÑALES	MENSUAL	Und	569	4	142 Und/Hombre	100%
7	LIMPIEZA DEFENSAS METALICAS	MENSUAL	m	4657	4	1164 m/Hombre	100%
8	PODAS FITOSANITARIAS	MENSUAL	Und	152	3	51 Und/Hombre	100%

OBSERVACIONES

JEAN CARLOS DIAZ ARRIETA
Representante Legal COOGUAKOS

REGISTRO FOTOGRAFICO

Rocería y Desmonte Manual

ANTES	DURANTE	DESPUES
		
		

Limpieza de Cunetas

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

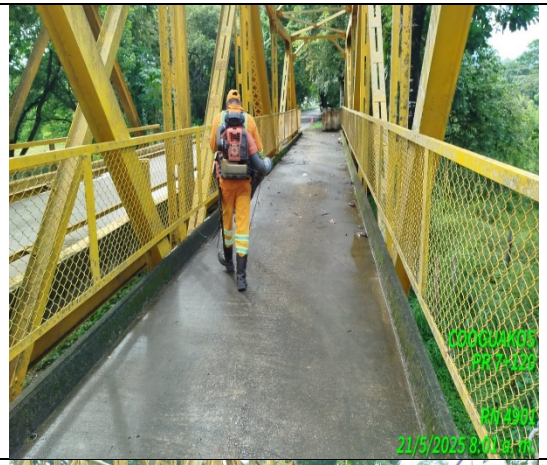
Limpieza de Berma

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

Limpieza de Alcantarillas y/o Box Culvert

ANTES	DURANTE	DESPUES
		
		

Limpieza de Puentes y Pontones

ANTES	DURANTE	DESPUES
		
		

Podas Fitosanitarias

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

Entrega de Plegables

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

Actividad de Tapahueco

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

Recolección de Residuos

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

Ornato

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

Limpieza de Señales Verticales

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

Limpieza de Defensas Metalicas

ANTES	DURANTE	DESPUES
		
