CONSORCIO CAPABRI
RAMA JUDICIAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
MEMORIAS DE CANTIDADES

HOJA 1

CONSULTORIOS PALACIO

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia


A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**	**CORTE No.**	**15**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**	**FECHA:**	**31/07/2025**

ITEM No.	1,3	**DESCRIPCION ITEM:**	PUESTO DE TRABAJO TIPO SECRETARIAL DE 1,50x1,50m. Suministro e instalación de puesto de trabajo en L de 1.5m x 1,50m x 0,75m de altura, la primera superficie será de 1,50m de largo x 0,60m de ancho, la segunda tendrá 0,90m de largo x 0,60m de ancho. Las superficie serán en maderamadera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores,en la parte inferior con balance F- 8 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perimetro con canto rigido termofundido de 2mm de grosor. color similar a la superficie de trabajo. Tendrán 3 soportes en lámina cold rolled calibres 14 a 16 y sección de 5 x 5 cm, en los costados de las superficies o segun diseños a definir en sitio, en la parte inferior niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electrostática de tipo epóxico. Incluye archivador independiente con 5 rodachinas (antivuelco) con freno tipo 2 x 1 (Ver Ficha 13a). Altura total del mueble: de 72 cm. a 75 cm. hasta el nivel superior. El puesto de trabajo llevará faldero por el costado frontal y adicionalmente se requiere un pasa cables, el cual será un orificio en la superficie de 8 cm. de diámetro.	**UNIDAD DE MEDIDA:**	UN

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

Localizacion general - Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía Cl. 12 #7-65, Bogotá

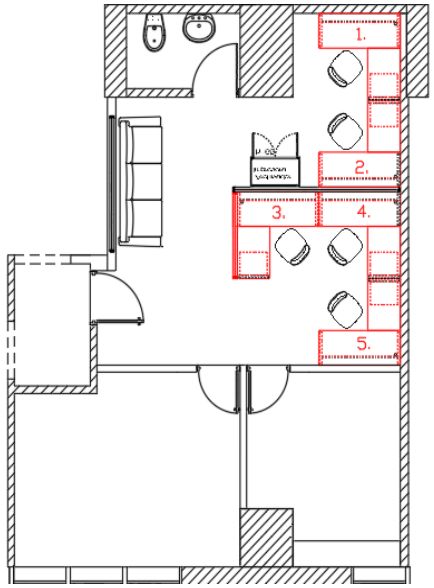

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
Puestos trabajo					5,00	5,00
TOTAL ITEM						**5,00**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**5,00**


Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA	1	CONSULTORIOS PALACIO	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**15**	**FECHA:**	**31/07/2025**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	1,13	**DESCRIPCION ITEM:**	MUEBLE ARCHIVADOR METÁLICO PARA IMPRESORA. de 2 puertas de 0,90m de largo x 0,50m de ancho x 0,65m de alto con un entrepaño metalico interno reforzado,La superficie serán en madera táblex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores,en la parte inferior con balance F- 8 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perimetro con canto rigido termofundido de 2mm de grosor.Se estructura en lámina cold rolled calibre 18 tipo uña, 3 caras y por la parte frontal tendrá dos puertas con chapa u manija en cada puerta. Párales en cold rolled calibre 14 con troquelado para enganche tipo uña El entrepaño será cold rolled calibre 18 reforzado.			**UNIDAD DE MEDIDA:**	UN

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
Localizacion general - Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía Cl. 12 #7-65, Bogotá	Mueble impresora					1,00	1,00
	TOTAL ITEM						**1,00**
	CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
	CANTIDAD CORTE ACTUAL						**1,00**

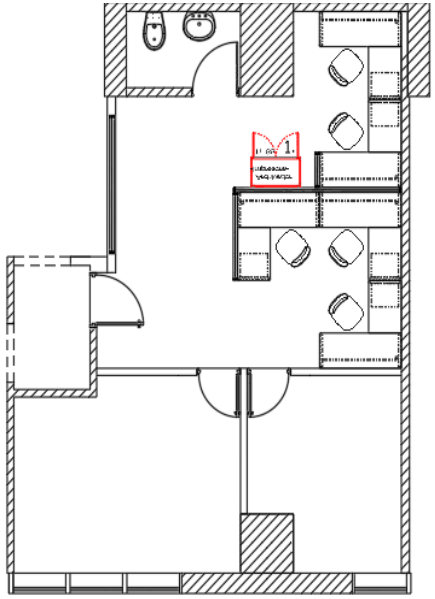

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA	1	CONSULTORIOS PALACIO	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**15**	**FECHA:**	**31/07/2025**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	1,17	**DESCRIPCION ITEM:**	DIVISIÓN PISO TECHO. Suministro e instalación de panel piso techo con espesor de 7cm a 8cm en paneles estructura en aluminio arquitectónico, o en acero cold rolled pintura electroestática, tableros en formica y cristal templado de 6mm con sand-blasting por sus dos caras. Para cerramiento El sistema incluye elementos de enganche y de soporte de acuerdo con los diseños planteados. Estos paneles se unirán entre sí mediante conectores o postes rígidos con estructura similar a la de los paneles, con zócalo inferior de 15 a 17cm de altura para permitir la continuidad del cableado eléctrico y de comunicaciones de voz y datos de un puesto de trabajo a otro sin interferir su recorrido y niveladores. También tendrá que permitir la instalación de tomas eléctrica y lógica por ambos lados. El panel o tablero superior (montante) ira en rejilla perforada en pintura similar a la existente o modulo lleno según diseños.			**UNIDAD DE MEDIDA:**	UN

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

Localizacion general - Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía Cl. 12 #7-65, Bogotá

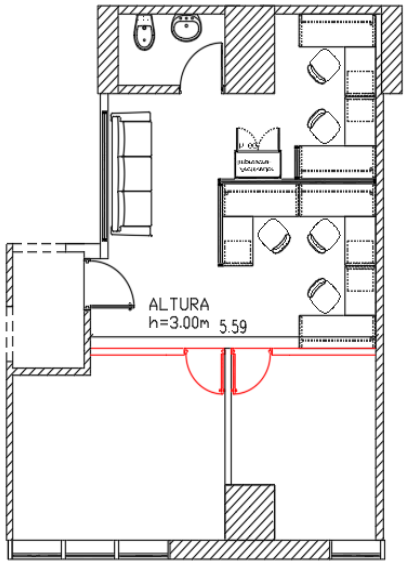

DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
Division piso techo	5,59		3,00	16,77	1,00	16,77
TOTAL ITEM						**16,77**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**16,77**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES		CONSULTORIOS PALACIO	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia
	HOJA	1		

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**15**	**FECHA:**	**31/07/2025**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	1,18	**DESCRIPCION ITEM:**	PANEL MEDIA ALTURA h=1,30m. Suministro e instalación de panel media altura de 1,30m de altura con espesor de 7cm a 8cm en paneles estructura en aluminio arquitectónico, o en acero cold rolled pintura electroestática, tableros en formica y cristal templado de 6mm con sand-blasting por sus dos caras. Para cerramiento El sistema incluye elementos de enganche y de soporte de acuerdo con los diseños planteados. Estos paneles se unirán entre sí mediante conectores o postes rígidos con estructura similar a la de los paneles, con zócalo inferior de 15 a 17cm de altura para permitir la continuidad del cableado eléctrico y de comunicaciones de voz y datos de un puesto de trabajo a otro sin interferir su recorrido y niveladores. También tendrá que permitir la instalación de tomas eléctrica y lógica por ambos lados. El panel o tablero superior (montante) ira en rejilla perforada en pintura similar a la existente o modulo lleno según diseños.	**UNIDAD DE MEDIDA:**	UN		

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

Localizacion general - Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía Cl. 12 #7-65, Bogotá

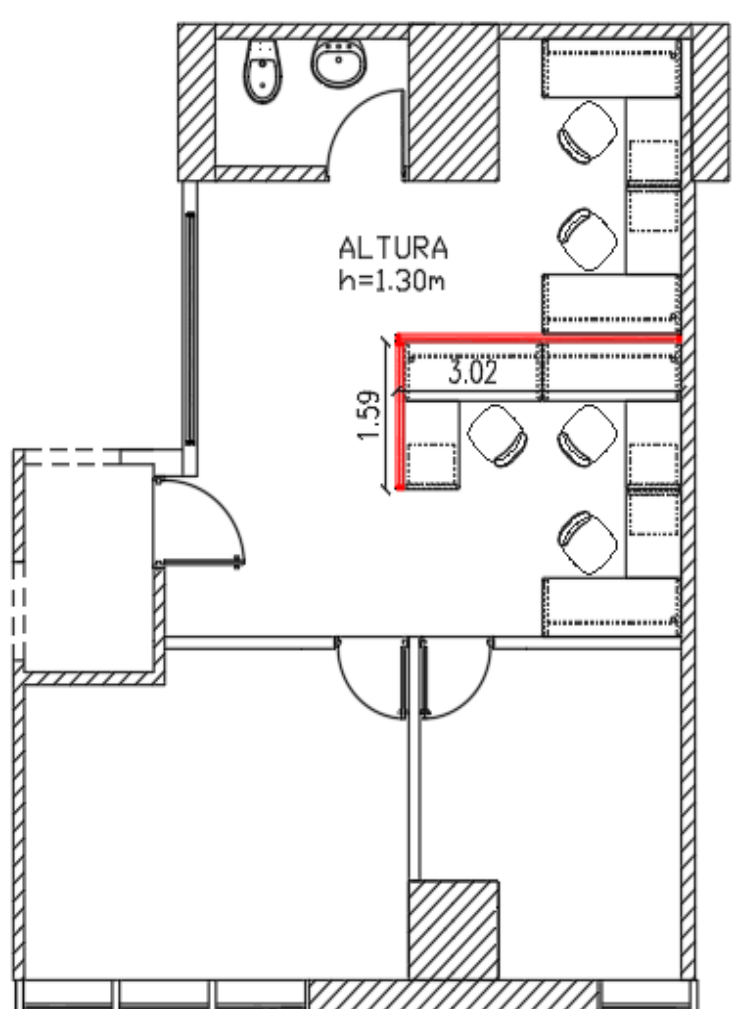


DESCRIPCIÓN /ESPACIO	DIMENSIONES Ancho	Longitud	Altura	MEDIDA PARCIAL	No DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
Division media altura	3,02		1,30	3,93	1,00	3,93
	1,59		1,30	2,07	1,00	2,07
TOTAL ITEM						**5,99**
CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
CANTIDAD CORTE ACTUAL						**5,99**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	REPUBLICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEMORIAS DE CANTIDADES	HOJA	1	CONSULTORIOS PALACIO	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	**167 DE 2025**	**OBJETO:**	**"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL**			**CORTE No.**	**15**	**FECHA:**	**31/07/2025**
INTERVENTORIA:	**TOTALL CORPORATION SAS BIC**						
ITEM No.	1,34	**DESCRIPCION ITEM:**	SILLA TIPO OPERATIVA CON BRAZOS. Silla ergonómica tipo operativa con brazos, espaldar alto en malla y reclinable negra, base de cinco aspas con un diámetro, mínimo de 600mm, rodachinas dobles en goma. Sistema de elevacion neumatica, sistema sincorcontacto y basculante. Movimiento bascular del asiento. Toda la tortillería que ancla el plato con el asiento va con rosca fina, su correspondiente guasa y arandela, contacto permanente 16 grados de inclinación, ajuste de profundidad de la espalda respecto al asiento y ajuste de altura de la espalda. LLevara ajuste lumbar, la silla tendra el acabado en paño hilat recubierto con scotch - Haggard combustión retardada o cordoban. El color se define en sitio con el supervisor después de adjudicado. NOTA: El acabado de la silla variara segun el espacio donde se instale. Para salas de audiencias sera en Cordoban y para despachos, centros de servicios y areas complementarias, la silla en paño.			**UNIDAD DE MEDIDA:**	UN

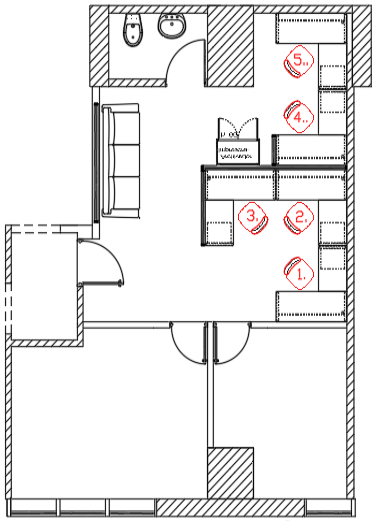PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	**DESCRIPCIÓN /ESPACIO**	**DIMENSIONES**			MEDIDA PARCIAL	**No DE ELEMENTOS**	**MEDIDA TOTAL**
		Ancho	Longitud	Altura			
Localizacion general - Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía Cl. 12 #7-65, Bogotá	Silla operativa					5,00	5,00
							
	TOTAL ITEM						**5,00**
	CANTIDAD PAGADA EN CORTES ANTERIORES						**0,00**
	CANTIDAD CORTE ACTUAL						**5,00**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RESIDENTE DE OBRA	Nombre: DIRECTOR DE OBRA	Nombre: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
