ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

CONTRATO	SAMC-MV-014-2025
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE VALENCIA CORDOBA
CONTRATISTA	PISCINGENIERIA HVS S.A.S NIT NRO. 901324084-8, representada legalmente por HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO, identificado con Cedula de ciudadanía Nro. 15670767 de Planeta Rica, Portador de la tarjeta profesional Nro. 0820261908 ATL
INTERVENTORIA	RSE INGENIEROS S.A.S. Identificado con NIT 900846891-1. KELLY JOHANNA SOTO MARTINEZ, identificado con cedula de ciudadanía Nro. 50.985.250 de San Pelayo
SUPERVISOR	SANDRA PATRICIA HERNANDEZ SIERRA
OBJETO	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LA ASOCIACION APPALSI EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.
VALOR	CIENTO VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS ($ 128.480.361,00 MCTE).
ADICION	DIECISÉIS MILLONES DE PESOS ($16.000.000,00) MCTE
VALOR TOTAL	CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN ($144.480.361,00) MCTE
PLAZO	Dos (02) meses.
PRORROGA	Cuatro (4) DIAS
FECHA DE INICIO	08 de septiembre de 2025
ANTICIPO	Sesenta y cuatro millones doscientos cuarenta mil ciento ochenta y un pesos ($ 64.240.181,00) mcte
FECHA DE SUSPENCIÓN No.1 ACTA	23 de octubre de 2025
TIEMPO DE SUSPENSIÓN No.1	Suspensión temporal del contrato por veinte (20) días calendario
FECHA DE PRORROGA A No.1 A LA SUSPENCIÓN No.1 ACTA	12 de noviembre de 2025
TIEMPO DE PRORROGA A No.1 A LA SUSPENCIÓN	Suspensión temporal del contrato por veinte (20) días calendario

034 7773071
018000400358
alcaldia@valencia-cordoba.gov.co
notificacionjudical@valencia-cordoba.gov.co
Calle 11 Carrera 15
Palacio Municipal

No.1 ACTA	
FECHA DE REINICIO	02 diciembre de 2025
FECHA DE TERMINACION	22 diciembre de 2025

En el municipio de Valencia a los veintidós (22) días del mes de diciembre de 2025 se reunieron la señora SANDRA PATRICIA HERNÁNDEZ SIERRA, identificada con C.C. No. 1.067.924.779 de Montería, en calidad de Supervisora del contrato y representante de la Alcaldía Municipal para estos efectos; el señor HUGO JUNIOR VERGARA SOTELO, identificado con C.C. No. 15.670.767 de Planeta Rica, en calidad de representante legal de PISCINGENIERIA HVS S.A.S.; y la ingeniera KELLY JOHANNA SOTO MARTÍNEZ, identificada con C.C. No. 50.985.250 de San Pelayo, en representación de la firma RSE INGENIEROS S.A.S. como Interventoría del contrato de obra SAMC-MV-014-2025, ANGEL DARIO SUAREZ MARTINEZ identificado con Cédula de Ciudadanía No 10.904.225 expedida en Valencia, representante legal del municipio de Valencia y Luis Medrano, Representante de APALSI; con el fin de entregar y recibir respectivamente lo estipulado en el objeto del contrato; inspeccionadas las obras ejecutadas y verificado que las mismas se efectuaran de acuerdo a lo estipulado en el objeto del contrato suscrito para tal efecto, se recibe a satisfacción:

Las siguientes cantidades ejecutadas:

N°	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad Actualizada
1	**PRELIMINARES**		
1,1	DESCAPOTE MANUAL (HASTA 20 CM) DISTANCIA DE 1 A 5 KM	m2	367,39
1,2	DEMOLICIÓN DE PLACA DE PISO	m2	169,94
2.	**PLACA DE CONCRETO**		
2,1	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 3500 PSI e=0,20 m INCLUYE REFUERZO Y ANCLAJE DE EQUIPOS	m2	-
3	**CALZADA**		
3,1	CONFORMACIÓN DE CALZADA	m2	-
3,2	GEOTEXTIL PARA ESTABILIZACIÓN DE LA SUBRASANTE	m2	296,27

034 7773071
018000400358
alcaldia@valencia-cordoba.gov.co
notificacionjudical@valencia-cordoba.gov.co
Calle 11 Carrera 15
Palacio Municipal

N°	ACTIVIDADES	Unidad	Cantidad Actualizada
3,3	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR CLASE C (ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO, BORDILLO)	m3	142,40
4	**PINTURA**		
4,1	Vinilo Tipo I sobre pañete 3 manos en muros externos (Fachadas)	m2	310,11
4,2	Vinilo Tipo II sobre pañete 2 manos en muros internos	m2	371,67
4,3	Pintura epoxica para muros zona de lavado y clasificación	m2	69,17
NP	**ITEMS NO PREVISTOS**		
NP-1	SUMINISTRO E INSTLACION DE TUBERIA SANITARIA DE 4" PARA PROLONGACION DE CARCAMOS	m	28,00
NP-2	EXCAVACIÓN A MAQUINA AREA DE ZONA DE LAVADO	m3	38,61
NP-3	DESMONTE DE PORTON EXISTEN ZONA SALIDA DE FRUTAS LIMPIAS	Und	1,00
NP-4	DEMOLICIÓN DE CAJAS DE REGISTRO EXISTENTE	Und	5,00
NP-5	CONSTRUCCION DE CAJAS DE REGISTRO SANITARIAS DE 0,80 X 0,80 X 0,60, E=0,12M, EN CONCRETO DE 3000 PSI; INCLUYE TAPA EN CONCRETO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO. ESPESOR DE TODOS LOS ELEMENTOS 0,12 M	Und	4,00
NP-6	CONSTRUCCION DE CAJA DE REGISTRO ELECTRICA DE 0,80 X 0,80 X 0,60, E=0,12M, EN CONCRETO DE 3000 PSI. INCLUYE TAPA EN CONCRET, ACERO DE REFUERZO DIAM 3/8" EN AMBOS SENTIDOS.	Und	1,00
NP-7	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO.	m3	16,37
NP-8	CONSTRUCCION DE RAMPAS DE ACCESO EN CONCRETO DE 3500 PSI. E: 0,20m. ACERO DE REFUERZO diam 1/2" EN AMBOS SENTIDOS. @ 0,25 M, INCLUYE BORDILLOS DE CONFINAMIENTO PERIMETRAL Y BORDILLO DE CAMBIO DE NIVEL. SECCION 0,12 X 0,40 M EN CONCRETO 3500 PSI, ACERO DE REFUERZO LONGITUDINAL DIAMETRO 2N3/8" Y TRANSVERSAL DE 1/4"@0,2M. INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO Y CONFORMACIÓN DEL TERRENO.	m2	24,00
NP-9	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 3500 PSI e=0,20 m INCLUYE REFUERZO.	m2	131,34

034 7773071
018000400358
alcaldia@valencia-cordoba.gov.co
notificacionjudical@valencia-cordoba.gov.co
Calle 11 Carrera 15
Palacio Municipal

REGISTRO FOTOGRAFICO



Ilustración 1. Pintura externa edificio administrativo APALSI



Ilustración 2. Pintura externa edificio administrativo APALSI

034 7773071
018000400358
alcaldia@valencia-cordoba.gov.co
notificacionjudical@valencia-cordoba.gov.co
Calle 11 Carrera 15
Palacio Municipal

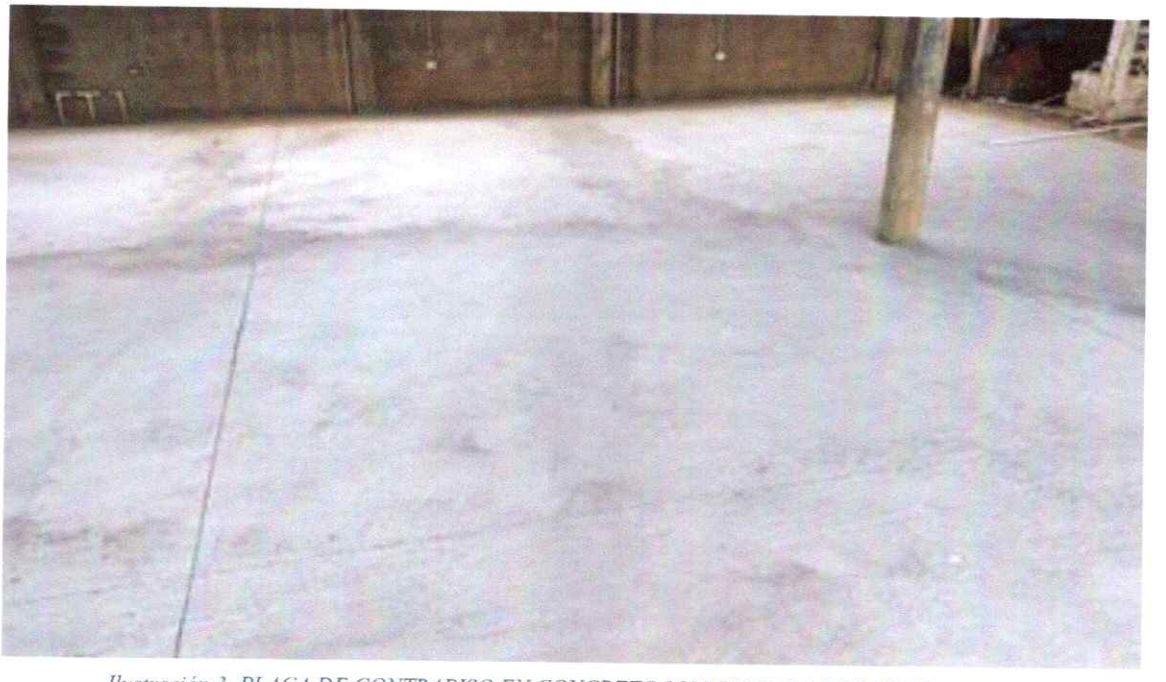


Ilustración 3. PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 3500 PSI PARA ZONA DE LAVADO



Ilustración 4. CAJAS DE REGISTRO SANITARIAS DE 0,80 X 0,80 X 0.60, E=0,12M, EN CONCRETO DE 3000 PSI

034 7773071
018000400358
alcaldia@valencia-cordoba.gov.co
notificacionjudical@valencia-cordoba.gov.co
Calle 11 Carrera 15
Palacio Municipal



Ilustración 5. CAJAS DE REGISTRO ELECTRICAS DE 0,80 X 0,80 X 0,60, E=0,12M, EN CONCRETO DE 3000 PSI



Ilustración 6. CONSTRUCCION DE RAMPAS DE ACCESO EN CONCRETO DE 3500 PSI.

034 7773071
018000400358
alcaldia@valencia-cordoba.gov.co
notificacionjudical@valencia-cordoba.gov.co
Calle 11 Carrera 15
Palacio Municipal



Ilustración 7. SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR CLASE C.

Para constancia se firma en Valencia Córdoba por los que en ella intervinieron, a los veintidós (22) del mes de diciembre de 2025.

SANDRA PATRICIA HERNADEZ SIERRA
Supervisora

HUGO JUNIOR VERGARA SOTELO
Contratista

ANGEL DARIO SUAREZ MARTINEZ
Alcalde Municipal

KELLY JOHANNA SOTO MARTÍNEZ
Interventor

LUIS MEDRANO
Representante de APALSI.

034 7773071
018000400358
alcaldia@valencia-cordoba.gov.co
notificacionjudical@valencia-cordoba.gov.co
Calle 11 Carrera 15
Palacio Municipal
