ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

BOGOTÁ

MEMORIA DE CALUCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Código:
Versión: 1
Fecha: 24-06-2026

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	PROYECTO:	Consolidación de Los Columbarios - Cementerio de Pobres, como espacio de reconocimiento de la memoria y los patrimonios en la ciudad de Bogotá.	CONTRATISTA:	CONSORCIO VIRREY CULTURAL	
	DIRECTOR DE OBRA:	MAURICIO HERNANDEZ	INTERVENTOR:	CONSORCIO RI PATRIMONIAL	
	DIRECTOR DE INTERVENTORIA:	LUIS ALEXANDER JIMENEZ	Contrato de Obra No.	CO-283-2026	
Objeto: CONSOLIDACION DE LOS COLUMBARIOS-CEMENTERIO DE POBRES, COMO ESPACIO DE RECONOCIMIENTO DE LA MEMORIA Y LOS PATRIMONIOS EN LA CIUDAD DE BOGOTA			Vigencia del contrato	18 MESES	
			Contrato de Interventoria No.	CINT-287-2026	
			Vigencia del contrato	19 MESES	

CAPITULO: 1. PRELIMINARES

ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No	DESCRIPCIÓN ÍTEM
1.01	M2	1	CERRAMIENTO EN TELA VERDE h=2,3 M INCLUYE ESTRUCTURA EN MADERA (VARAS CORREDOR) EXCAVACION PARA HINCADA DE POSTES

PERIODO DEL CORTE: 1 de junio de 2026 — 30 de junio de 2026 — FICHA # 1 — DE 1

LOCALIZACIÓN	MEDIDAS ALTO	MEDIDAS ANCHO	MEDIDAS LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
Costado sur reja lateral sobre la 26			68,00	0,80	54,40
Columbario A EJE A , hacia la carrera 19B			234,50	0,80	187,60
				SUBTOTAL	242,00
				CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	-
				CANT. A PAGAR	242,00



FOTOGRAFIAS DE REFERENCIA:





CERRAMIENTO INSTALADO PARALELO AL EJE A DEL COLUMBARIO A





CERRAMIENTO INSTALADO PARALELO AL EJE 26 DEL COLUMBARIO A Y AVENIDA CALLE 26

NOTA: Se deja constancia de que el cerramiento inicialmente contemplado para la obra corresponde a tela verde, instalada mediante postes hincados en excavaciones previamente ejecutadas para su posterior
No obstante, durante el Comité de Obra N.° 1, realizado el 11 de junio de 2026, y con la participación de la Entidad Contratante (IDPC), la Interventoría y el Contratista, se analizaron las condiciones del cerramiento por autorizacion ICANH para excavaciones y se establecieron los siguientes lineamientos y acuerdos, con el propósito de facilitar el avance de las actividades de obra:
Cambio del material del cerramiento:
Se acordó sustituir la lona verde inicialmente contemplada por una lona con un 35 % de visibilidad, con el fin de mejorar las condiciones de visibilidad hacia el exterior y atender las necesidades identificadas durante la ejecución de la obra.
Modificación del sistema de instalación del cerramiento:
Se determinó realizar el cerramiento mediante canecas llenas de concreto, como sistema de soporte de los postes, evitando la ejecución de excavaciones para su instalación. Esta medida se adoptó teniendo en cuenta que no es posible realizar excavaciones sin contar previamente con la aprobación y autorización correspondiente por parte del ICANH.
Refuerzo del cerramiento en el perímetro:
Se acordó reforzar con una mayor cantidad de varas o listones todo el perímetro correspondiente a la Carrera 19B (Centro de Memoria) y Carrera 19 (Columbario D), debido a que las fuertes brisas de la zona han ocasionado el volcamiento del cerramiento. Este refuerzo busca garantizar su estabilidad y compensar la no instalación del cerramiento sobre la Calle 26.
Continuidad del cerramiento por el costado del Centro de Memoria:
Asimismo, se acordó dar continuidad al cerramiento por el costado del Centro de Memoria, con el propósito de delimitar adecuadamente las dos áreas de intervención. Se deja constancia de que esta disposición no se encontraba contemplada inicialmente dentro del esquema de cerramiento previsto, por lo que corresponde a una modificación acordada durante el desarrollo del comité.
En consecuencia, se deja registro de que las condiciones actualmente previstas para el cerramiento corresponden a los acuerdos establecidos entre la Entidad Contratante (IDPC), la Interventoría y el Contratista durante el Comité de Obra N.° 1, los cuales deberán ser tenidos en cuenta para la ejecución y seguimiento de las actividades correspondientes.

ARQUITECTO WILLY JANSSEN BERRIO QUIÑONES
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQUITECTO LUIS ALEXANDER JIMENEZ
VB DIRECTOR INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL | BOGOTÁ

MEMORIA DE CALUCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Código:
Versión: 1
Fecha: 24-06-2026

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	PROYECTO:	Consolidación de Los Columbarios - Cementerio de Pobres, como	CONTRATISTA:		CONSORCIO VIRREY CULTURAL
	DIRECTOR DE OBRA:	MAURICIO HERNANDEZ	INTERVENTOR:		CONSORCIO RI PATRIMONIAL
	DIRECTOR DE	LUIS ALEXANDER JIMENEZ	Contrato de Obra No.		CO-283-2026
Objeto: CONSOLIDACION DE LOS COLUMBARIOS-CEMENTERIO DE POBRES, COMO ESPACIO DE RECONOCIMIENTO DE LA MEMORIA Y LOS PATRIMONIOS EN LA CIUDAD DE BOGOTA			Vigencia del contrato		18 MESES
			Contrato de Interventoria No.		CINT-287-2026
			Vigencia del contrato		19 MESES

CAPITULO: PRELIMINAREAS			DESCRIPCIÓN ÍTEM
ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No	SEÑALIZACION PREVENTIVA
1.02	MES	1	PERIODO DEL CORTE: 1 de junio de 2026 — 30 de junio de 2026 — FICHA # 1 — DE 1

LOCALIZACIÓN	MEDIDAS ALTO	MEDIDAS ANCHO	MEDIDAS LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
COLUMBARIO A-B , Señalizacion preventiva junio				1,000	1,00
			SUBTOTAL		1,00
			CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº		-
			CANT. A PAGAR		1,00



NOTA: NA.

FOTOGRAFIAS DE REFERENCIA:



F1



F2

SEÑALIZACION INSTALADA EN EL ACCESO ENTRE CENTRO MEMORIA Y COLUMBARIOS Y DESNIVELES EN EL TERRENO



F3



F4

SEÑALIZACION DE CIRCULACION PEATONAL ENTRE LOS COLUMBARIOS A Y B

ARQUITECTO WILLY JANSSEN BERRIO QUIÑONES
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQUITECTO LUIS ALEXANDER JIMENEZ
VB DIRECTOR INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
BOGOTÁ

MEMORIA DE CALUCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Código:
Versión: 1
Fecha: 24-06-2026

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	PROYECTO:	Consolidación de Los Columbarios - Cementerio de Pobres, como	CONTRATISTA:		CONSORCIO VIRREY CULTURAL
	DIRECTOR DE OBRA:	MAURICIO HERNANDEZ	INTERVENTOR:		CONSORCIO RI PATRIMONIAL
	DIRECTOR DE INTERVENTORIA:	LUIS ALEXANDER JIMENEZ	Contrato de Obra No.		CO-283-2026
Objeto: CONSOLIDACION DE LOS COLUMBARIOS-CEMENTERIO DE POBRES, COMO ESPACIO DE RECONOCIMIENTO DE LA MEMORIA Y LOS PATRIMONIOS EN LA CIUDAD DE BOGOTA			Vigencia del contrato		18 MESES
			Contrato de Interventoria No.		CINT-287-2026
			Vigencia del contrato		19 MESES

CAPITULO: 1. PRELIMINARES

ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No
11.04	M2	1


DESCRIPCION ITEM

CAMPAMENTO DE TABLA , INCLUYE TEJA DE ZINC, PISO EN CONCRETO DE 17,2 Mpa.

PERIODO DEL CORTE: 1 de junio de 2026 — 30 de junio de 2026 — **FICHA #** 1 — DE 1

LOCALIZACIÓN	MEDIDAS ALTO	MEDIDAS ANCHO	MEDIDAS LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
Adecuacion de cubierta campamento de interventoria		1,00	5,00	1,00	5,00
				SUBTOTAL	5,00
				CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	-
				CANT. A PAGAR	5,00

CAMPAMENTO UBICADO SOBRE EL COLUMBARIO D

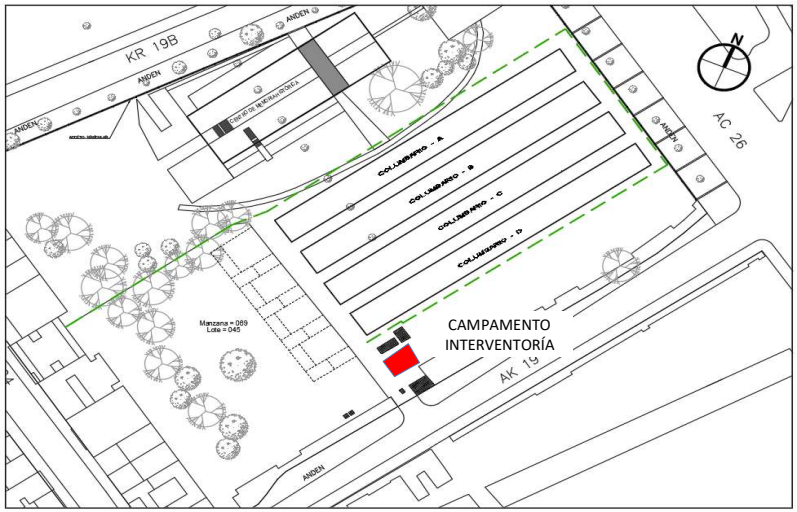


FOTOGRAFIAS DE REFERENCIA:





ESTADO INICIAL Y DESMONTE DE CUBIERTA DEL CAMPAMENTO DE INTERVENTORIA



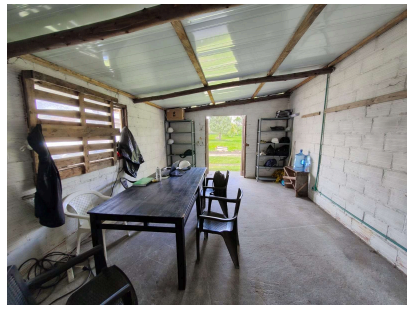

ACONDICIONAMIENTO DE CAMPAMENTO PARA INTERVENTORIA, CAMBIO DE CUBIERTA DE LAMINA DE ZINC A TECHO EN STANDING SEAM

NOTA: Se deja claridad respecto del presente ítem, en el sentido de que se ajusta y mejora la descripción de la actividad para reflejar adecuadamente el alcance a ejecutar. No obstante, la facturación y el cobro se realizarán conforme al ítem contractual establecido y no con base en la actividad específica ejecutada en teja tipo Standing Seam. Los costos adicionales que se generen por la implementación de esta solución, derivada de las condiciones de seguridad existentes en la zona, serán asumidos por el contratista, sin que ello represente un mayor valor para la Entidad.

ARQUITECTO WILLY JANSSEN BERRIO QUIÑONES
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQUITECTO LUIS ALEXANDER JIMENEZ
VB DIRECTOR INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
BOGOTÁ

MEMORIA DE CALUCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Código:
Versión: 1
Fecha: 24-06-2026

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	PROYECTO:	Consolidación de Los Columbarios - Cementerio de Pobres, como	CONTRATISTA:		CONSORCIO VIRREY CULTURAL
	DIRECTOR DE OBRA:	MAURICIO HERNANDEZ	INTERVENTOR:		CONSORCIO RI PATRIMONIAL
	DIRECTOR DE INTERVENTORIA:	LUIS ALEXANDER JIMENEZ	Contrato de Obra No.		CO-283-2026
Objeto: CONSOLIDACION DE LOS COLUMBARIOS-CEMENTERIO DE POBRES, COMO ESPACIO DE RECONOCIMIENTO DE LA MEMORIA Y LOS PATRIMONIOS EN LA CIUDAD DE BOGOTA			Vigencia del contrato		18 MESES
			Contrato de Interventoria No.		CINT-287-2026
			Vigencia del contrato		19 MESES


CAPITULO: 1, PRELIMINAR		
ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No
1.05	M2	1

DESCRIPCIÓN ITEM

ALMACÉN DE OBRA


PERIODO DEL CORTE: 1 de junio de 2026 — 30 de junio de 2026 — FICHA # 1 — DE 1

LOCALIZACIÓN	MEDIDAS			CANTIDAD	TOTAL
	ALTO	ANCHO	LONGITUD		
Acceso oriental AK 19 cotado de columbario D		2,44	6,05	1,00	14,76
				SUBTOTAL	14,76
				CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	-
				CANT. A PAGAR	14,76

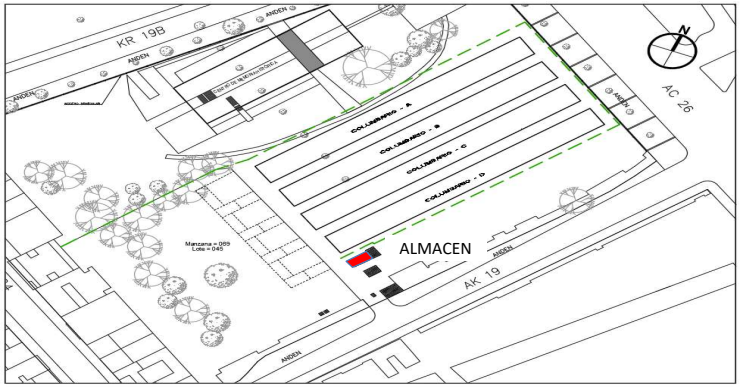

NOTA: Se valida ejecuión con contenedor

FOTOGRAFIAS DE REFERENCIA:

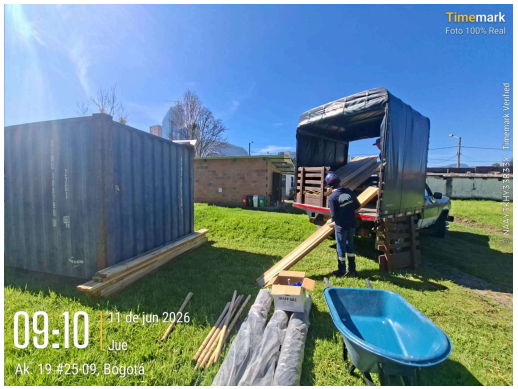



ALMACEN DE OBRA UBICADO PARALELO AL EJE H DEL COLUMBARIO D

ARQUITECTO WILLY JANSSEN BERRIO QUIÑONES
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQUITECTO LUIS ALEXANDER JIMENEZ
VB DIRECTOR INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
BOGOTÁ


MEMORIA DE CALUCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Código:
Versión: 1
Fecha: 24-06-2026

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	PROYECTO:	Consolidación de Los Columbarios - Cementerio de Pobres, como	CONTRATISTA:		CONSORCIO VIRREY CULTURAL
	DIRECTOR DE OBRA:	MAURICIO HERNANDEZ	INTERVENTOR:		CONSORCIO RI PATRIMONIAL
	DIRECTOR DE	LUIS ALEXANDER JIMENEZ	Contrato de Obra No.		CO-283-2026
Objeto: CONSOLIDACION DE LOS COLUMBARIOS-CEMENTERIO DE POBRES, COMO ESPACIO DE RECONOCIMIENTO DE LA MEMORIA Y LOS PATRIMONIOS EN LA CIUDAD DE BOGOTA			Vigencia del contrato		18 MESES
			Contrato de Interventoria No.		CINT-287-2026
			Vigencia del contrato		19 MESES

CAPITULO: 1, PRELIMINAR			DESCRIPCIÓN ÍTEM
ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No	ALQUILER DE BAÑO CABINA SENCILLO FLUSHING + 1 ASEO SEMANAL
1.06	MES	1	PERIODO DEL CORTE: 1 de junio de 2026 — 30 de junio de 2026 — FICHA # 1 — DE 1

LOCALIZACIÓN	MEDIDAS ALTO	MEDIDAS ANCHO	MEDIDAS LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
BAÑOS JUNIO DESDE EL 15 DE JUNIO				0,50	0,50
				SUBTOTAL	0,50
				CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	-
				CANT. A PAGAR	0,50

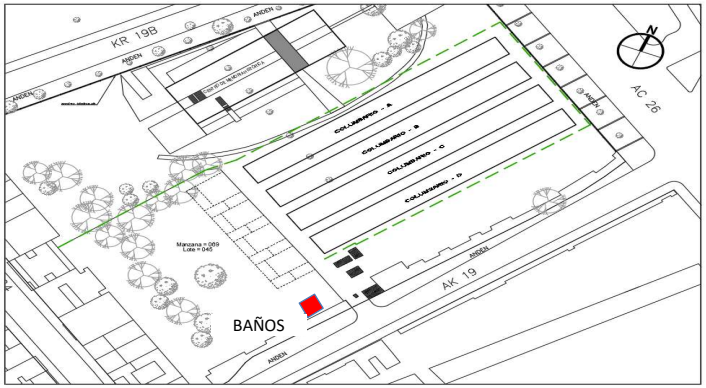

NOTA: Se anexan soportes de lavado semanal

FOTOGRAFIAS DE REFERENCIA:





BAÑOS LOCALIZADOS EN EL SECTOR SURORIENTAL DE LOS COLUMBARIOS, ADYACENTE AL COSTADO IZQUIERDO DEL ACCESO PRINCIPAL.

ARQUITECTO WILLY JANSSEN BERRIO QUIÑONES
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQUITECTO LUIS ALEXANDER JIMENEZ
VB DIRECTOR INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
BOGOTÁ

MEMORIA DE CALUCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Código:
Versión: 1
Fecha: 24-06-2026

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	PROYECTO:	Consolidación de Los Columbarios - Cementerio de Pobres, como	CONTRATISTA:		CONSORCIO VIRREY CULTURAL
	DIRECTOR DE OBRA:	MAURICIO HERNANDEZ	INTERVENTOR:		CONSORCIO RI PATRIMONIAL
	DIRECTOR DE INTERVENTORIA:	LUIS ALEXANDER JIMENEZ	Contrato de Obra No.		CO-283-2026
			Vigencia del contrato		18 MESES
			Contrato de Interventoria No.		CINT-287-2026
			Vigencia del contrato		19 MESES

Objeto: CONSOLIDACION DE LOS COLUMBARIOS-CEMENTERIO DE POBRES, COMO ESPACIO DE RECONOCIMIENTO DE LA MEMORIA Y LOS PATRIMONIOS EN LA CIUDAD DE BOGOTA

CAPITULO: 2. DESMONTAJE RETIROS DEMOLICIONES


ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No
2.01	M2	1


DESCRIPCION ITEM


DESMONTE Y RETIROS DE CUBIERTA EXITENTE (INCLUIYE TEJAS, CABALLETES, CORREAS ALFARDAS, VIGAS, SOLERAS, ESTRUCTURA DE CERCHAS,SEPARADORES MORTERO DE PEGA, ESTERILLA DE GUDUA Y CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS)

PERIODO DEL CORTE:	1 de junio de 2026	30 de junio de 2026	FICHA #	1	DE 2

LOCALIZACIÓN	MEDIDAS ALTO	MEDIDAS ANCHO	MEDIDAS LONGITUD	% OBRA	CANTIDAD	TOTAL
Costado oriental: EJES C-D-E desde el EJE 1 hasta el EJE intermedio entre el 23 y el 24 (costado de columbario a) TEJA		6,26	73,34	0,25	1,00	114,78
costado oriental: EJES C-D-E desde el EJE 1 hasta el EJE 14 (costado del columbario a) MORTERO DE PEGA		6,26	41,91	0,25	1,00	65,59
				SUBTOTAL		180,37
				CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº		
				CANT. A PAGAR		180,37

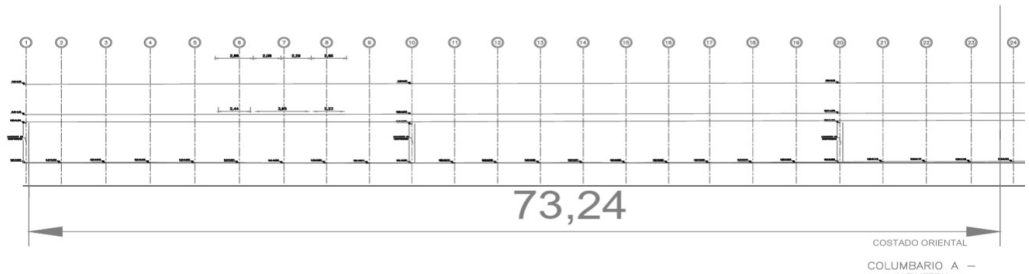




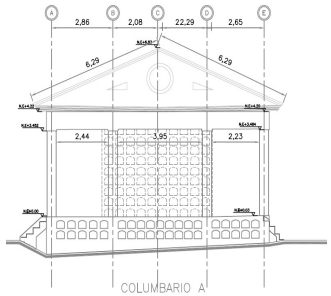

NOTA: SE VA A REALIZAR PAGOS PARCIALES DE ACUERDO A LAS OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA:
25% TEJA
25% TORTA DE BARRO
25%ESTERILLA
25% ESTRUCTURA DE MADERA

FOTOGRAFIAS DE REFERENCIA:



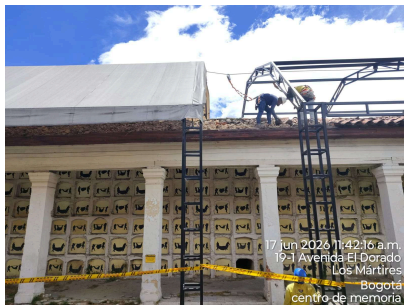

COSTADO OCCIDENTAL: EJES A-B-C DESDE EL EJE 1 HASTA EL EJE 5, CR 19B (COSTADO DEL CENTRO MEMORIA) MORTERO DE PEGA

ARQUITECTO WILLY JANSSEN BERRIO QUIÑONES
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQUITECTA LISSET GOMEZ
VB RESIDENTE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

BOGOTÁ

MEMORIA DE CALUCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Código:
Versión: 1
Fecha: 24-06-2026

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	**PROYECTO:**	**Consolidación de Los Columbarios - Cementerio de Pobres, como**	**CONTRATISTA:**		**CONSORCIO VIRREY CULTURAL**
	DIRECTOR DE OBRA:	**MAURICIO HERNANDEZ**	**INTERVENTOR:**		**CONSORCIO RI PATRIMONIAL**
	DIRECTOR DE INTERVENTORIA:	**LUIS ALEXANDER JIMENEZ**	**Contrato de Obra No.**		**CO-283-2026**
			Vigencia del contrato		**18 MESES**
			Contrato de Interventoria No.		**CINT-287-2026**
			Vigencia del contrato		**19 MESES**


Objeto: CONSOLIDACION DE LOS COLUMBARIOS-CEMENTERIO DE POBRES, COMO ESPACIO DE RECONOCIMIENTO DE LA MEMORIA Y LOS PATRIMONIOS EN LA CIUDAD DE BOGOTA


CAPITULO: 2. DESMONTAJE RETIROS DEMOLICIONES


ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No
2.01	M2	1

DESCRIPCIÓN ÍTEM

DESMONTE Y RETIROS DE CUBIERTA EXITENTE (INCLUIYE TEJAS, CABALLETES, CORREAS ALFARDAS, VIGAS, SOLERAS, ESTRUCTURA DE CERCHAS,SEPARADORES MORTERO DE PEGA, ESTERILLA DE GUDUA Y CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS)

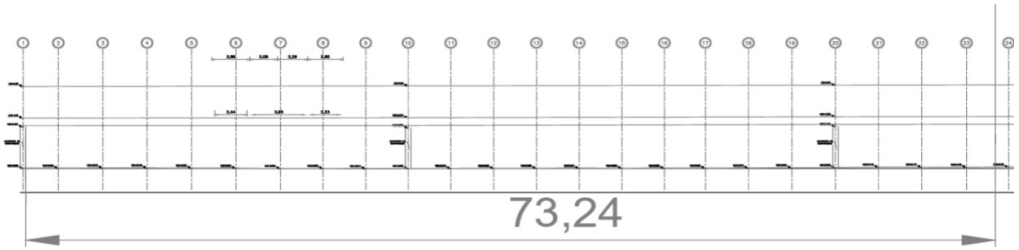

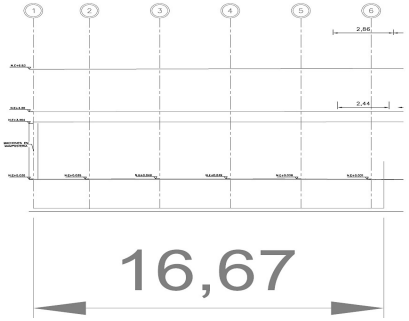

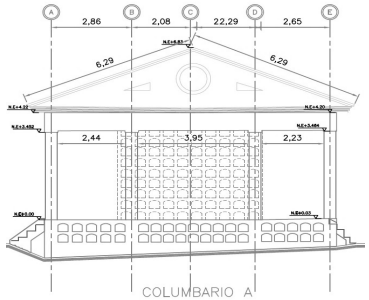

PERIODO DEL CORTE: **1 de junio de 2026** **30 de junio de 2026** **FICHA #** **2** **DE 2**

LOCALIZACIÓN	MEDIDAS ALTO	MEDIDAS ANCHO	MEDIDAS LONGITUD	% OBRA	CANTIDAD	TOTAL
Costado occidental: EJE A-B-C desde el EJE 1 hasta el EJE intermedio entre el 22 y el 23, Teja		6,13	73,34	0,25	1,00	112,39
Costado occidental: EJES A-B-C desde el EJE 1 hasta el EJE 5, Torta de barro.		6,13	16,67	0,25	1,00	25,55
					SUBTOTAL	**137.94**
					CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	180.37
					CANT. A PAGAR	**318,31**

FOTOGRAFIAS DE REFERENCIA:





NOTA: SE VA A REALIZAR PAGOS PARCIALES DE ACUERDO A LAS OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA:
25% TEJA
25% TORTA DE BARRO
25%ESTERILLA
25% ESTRUCTURA DE MADERA

ACOPIO DE TEJA A REINTEGRAR

ARQUITECTO WILLY JANSSEN BERRIO QUIÑONES
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQUITECTO LUIS ALEXANDER JIMENEZ
VB DIRECTOR INTERVENTORIA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
BOGOTÁ

MEMORIA DE CALUCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Código:
Versión: 1
Fecha: 24-06-2026

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	PROYECTO:	Consolidación de Los Columbarios - Cementerio de	CONTRATISTA:		CONSORCIO VIRREY CULTURAL
	DIRECTOR DE OBRA:	MAURICIO HERNANDEZ	INTERVENTOR:		CONSORCIO RI PATRIMONIAL
	DIRECTOR DE INTERVENTORIA:	LUIS ALEXANDER JIMENEZ	Contrato de Obra No.		CO-283-2026
Objeto: CONSOLIDACION DE LOS COLUMBARIOS-CEMENTERIO DE POBRES, COMO ESPACIO DE RECONOCIMIENTO DE LA MEMORIA Y LOS PATRIMONIOS EN LA CIUDAD DE BOGOTA			Vigencia del contrato		18 MESES
			Contrato de Interventoria No.		CINT-287-2026
			Vigencia del contrato		19 MESES

CAPITULO: 3. REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL

ITEM Nº.	UNIDAD	ACTA PARCIAL No
3.1.1	M2	1


DESCRIPCIÓN ÍTEM

LOCALIZACION Y REPLANTEO


PERIODO DEL CORTE: 1 de junio de 2026 — 30 de junio de 2026 — FICHA # 1 — DE 1

LOCALIZACIÓN	MEDIDAS ALTO	MEDIDAS ANCHO	MEDIDAS LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
COLUMBARIO A EJES A-B- C-D-E desde el EJE 1 hasta el EJE 23		10,32	67,71	1,0	698,76
ESCALERA 1 (ORIENTE) EJE 1 y 2 entre D y E		1,60	2,19	1,00	3,50
ESCALERA 2 (OCCIDENTE) EJE 1 y 2 entre A y B		2,17	2,20	1,00	4,77
ESCALERA 3 (OCCIDENTE) EJE 10 y 11 entre A y B		2,20	2,80	1,00	6,16
ESCALERA 4 (OCCIDENTE) EJE 20 y 21 entre A y B		1,00	2,83	1,00	2,83
				SUBTOTAL	716,02
				CONTINUA EN LA FICHA FICHA Nº	-
				CANT. A PAGAR	716,02

COLOUMBARIO A

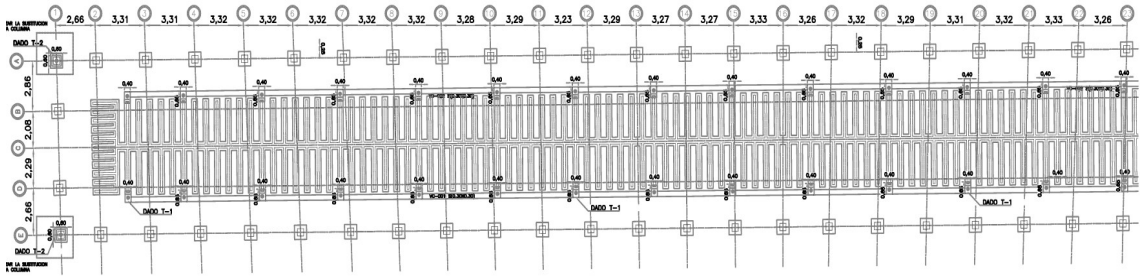

ORIENTE

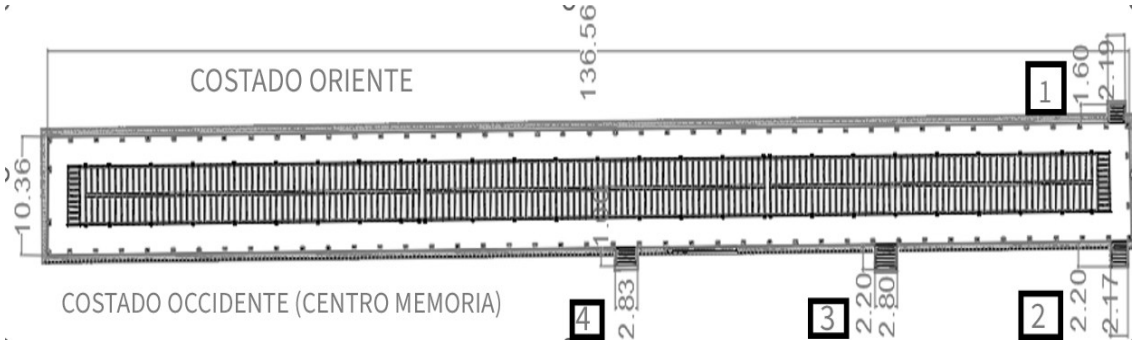

OCCIDENTE

NOTA:

FOTOGRAFIAS DE REFERENCIA:





LOCALIZACION Y REPLANTEO CON TIPOGRAFO Y CADENERO - COLUMBARIO A

ARQUITECTO WILLY JANSSEN BERRIO QUIÑONES
VB. RESIDENTE CONTRATISTA

ARQUITECTO LUIS ALEXANDER JIMENEZ
VB DIRECTOR INTERVENTORIA
