MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 465880

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 29852 De 26/09/2022 Por 104.419.611,00

PAGO PARCIAL ACTA NRO 08 CONTRATO DE INTERVENTORIA NRO 5116 DE 2021 CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMÉRICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV. LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.

ACTA No.: 25827 **de 26/09/2022** **C. Pago TESORERIA** **CXP: NO** **ESTAD0=PAGADA**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL MANTENIMIENTO, CAPACIDAD Y CONECTIVIDAD DE LAS VÍAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

A FAVOR DE: CONSORCIO CONDINA JJAI **C.C o Nit** 901527100

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 5116 de 06/10/2021 Por 2.815.970.447,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMÉRICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV. LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.

VALOR A PAGAR Ciento Cuatro Millones Cuatrocientos Diecinueve Mil Seiscientos Once Pesos M/Cte. **104.419.611,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEFUENTE	509	146.245.954,00	2,00	2.924.919,00	**7.897.282,00**
RETEIVA	509	27.786.731,00	15,00	4.168.010,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	3011	146.245.954,00	0,55	804.353,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **96.522.329,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 162 **Fecha.** 08/01/2022

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1107	**2020660010089**	2.3.2.02.02.009-2402107	Servicios para la comunidad, sociales y personales	701 Recursos del crédito interno	104.419.611,00

Total obligación **104.419.611,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
161590002	Otras construcciones en curso	174.032.685,	0,	Acta de recibo PARCIAL 364551 CONTRATO DE INTERV
243627002	Retención de impuesto de industria y	0,	804.353,	Acta de recibo PARCIAL 364551 CONTRATO DE INTERV
243603002	Honorarios	0,	2.924.919,	Acta de recibo PARCIAL 364551 CONTRATO DE INTERV
243625002	Impuesto a las ventas retenido por c	0,	4.168.010,	Acta de recibo PARCIAL 364551 CONTRATO DE INTERV
190604001	Anticipos sobre contratos	0,	69.613.074,	Acta de recibo PARCIAL 364551 CONTRATO DE INTERV
240102001	Proyectos de inversion	0,	96.522.329,	Acta de recibo PARCIAL 364551 CONTRATO DE INTERV
Sumas Iguales		**174.032.685**	**174.032.685**	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 465880

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 29852 De 26/09/2022 Por 104.419.611,00

PAGO PARCIAL ACTA NRO 08 CONTRATO DE INTERVENTORIA NRO 5116 DE 2021 CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMÉRICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV. LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.

ACTA No.: 25827 **de 26/09/2022** **C. Pago TESORERIA** **CXP: NO** **ESTAD0=PAGADA**

JUAN CARLOS RESTREPO RESTREPO

02459849163527-2359145-005309177

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :364551

Impreso en: 26-SEP-22 04:47 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 25827

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA Nro. 5116

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista CONSORCIO CONDINA JJAI con identificación 901527100 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE INTERVENTORIA en referencia.

De acuerdo al CONTRATO DE INTERVENTORIA se establece que:

Fecha firma	06/10/2021	**Valor orden gasto**	2.815.970.447
Fecha iniciación	11/10/2021	**Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada**	1.990.289.041
Fecha Terminación	31/12/2022	**Valor acta**	104.419.611
Duración	El plazo estimado para la ejecución del contrato será CUATROCIENTOS CUARENTA (440) DÍAS, contado a partir del acta de inicio y sin exceder el 31 de diciembre de 2022.	**Saldo pendiente**	721.261.795

OBJETO DEL CONTRATO:

Periodo de pago:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMÉRICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV. LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

PAGO PARCIAL ACTA NRO 08 CONTRATO DE INTERVENTORIA NRO 5116 DE 2021 CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMÉRICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV. LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS A	146.245.954	27.786.731
Total:		**146.245.954**	**27.786.731**

Total recibido	174.032.685
- Amortización de anticipo	69.613.074
	104.419.611

Valor Ciento Cuatro Millones Cuatrocientos Diecinueve Mil Seiscientos Once Pesos M/Cte.

Valor del Anticipo	1.126.388.179
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo	645.546.981

Nota: El tercero es Declarante

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 25827

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA Nro. 5116

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista CONSORCIO CONDINA JJAI con identificación 901527100 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE INTERVENTORIA en referencia.

Para constancia se firma en pereira el: 26/09/2022

MILTON HURTADO GARCIA
02459849153336-2359110-005308105

MILTON HURTADO GARCIA
02459849153314-2359110-005308101

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.442.593


ROJAS PRIETO

APELLIDOS

JOSE ALBERTO

NOMBRES

FIRMA

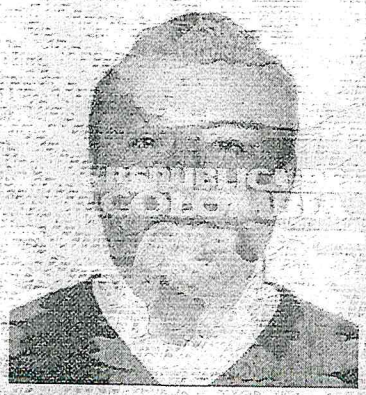



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 28-ENE-1968

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA

A+ G.S. RH

M SEXO

02-MAY-1986 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00163292-M-0079442593-20090717 0013603996A 1 1140101454

Pereira, Risaralda 11 de Agosto de 2022

Señores
Alcaldía de Pereira
Secretaría de infraestructura
Atn: ING Milton Hurtado García

REFERENCIA: Contrato de interventoría No 5116 de 2021. Cuyo objeto es: "interventoría técnica, financiera, administrativa, legal y ambiental al contrato de Construcción de la primera fase de la conexión Avenida Las Américas, zona de expansión occidental Cerritos, desde la intersección Condina K0+00 (Av Las Américas) hasta el Km 3+400 (Sector El Tigre) y obras complementarias".

Asunto: Certificado de pago de aportes parafiscales y de seguridad social

El suscrito, **JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO**, identificado con cédula de ciudadanía número 79.442.593, en calidad de Representante Legal del CONSORCIO CONDINAJJAI con NIT 901.527.100-1; por medio de este documento, me permito CERTIFICAR bajo la GRAVEDAD DE JURAMENTO que el consorcio se encuentra a paz y salvo con el estado por concepto de aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje y Fondo de Fomento a la Construcción; dando así cumplimiento con las normas legales estipuladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Art. 1º de la Ley 828 de 2003 y del Art. 23 de la Ley 1150 de 2007, además certifico que la compañía no se encuentra obligada al pago de la contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción (FIC).

Por lo anterior, de manera expresa por este escrito ACREDITO el pago por parte de la persona jurídica denominada CONSORCIO CONDINA JJAI de los aportes a que está obligada según el SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL de Colombia y el pago de las obligaciones salariales de cada uno de los trabajadores de acuerdo con lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo. De la misma manera se certifica que los trabajadores contratados en la modalidad de Prestación de Servicios y/o Subcontratistas cumplen oportunamente con sus obligaciones parafiscales.



JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
Representante Legal CONSORCIO CONDINA JJAI
CC 79.442.593

Factura Electrónica De Venta No

FV No. 14

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764019197700 que habilita desde FV 1 hasta FV 100. Vence 2022-10-07

CONSORCIO CONDINA - JJAI

Nit 901527100

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Activ 6.90 X 1000

CLIENTE	MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT	891480030 2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 7 18 55 P5 EDIF MUNICIPA	Pereira	6013248230

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA FV14 ACTA No 8

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
01/09/2022	01/10/2022	CONSORCIO CONDINA - JJAI	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	CON	CONTRATO DE CONSULTORIA 5116-2021 OBJETO INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIA. PAGO ACTA No 8 PERIODO JULIO 11 AL 10 DE AGOSTO DE 2022	1	Und.	46.245.954,00	0,19	27.786.731	146.245.954,00

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**146.245.954,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**27.786.731,26**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**174.032.685,26**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
ANTICIPO	**69.613.074,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**104.419.611,26**

Valor en Letras

CIENTO CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS M/CTE CON VEINTISEIS CENTAVOS

Participaciones:

ARA INGENIERIA S.A.S - NIT 830.068.724 - 25%
JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO - Cédula de ciudadanía 79.442.593 - 25%
ALMA INTERVENTORIA CONSULTORIA S.A.S - NIT 901.573.477 - 25%
JPS INGENIERIA SA - NIT 830.035.398 - 25%



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 01/09/2022 10:23:14

Medios de Pago: Consignación bancaria

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 6a1097dc9644e16aeff19f9bd9ea313d08a46cdb817a654515ea2c5fcf13fe164db4bd6cf73556f66249279a3cad486b --Fecha y Hora de Expedición : 01/09/2022 10:27:05 a. m.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.tracker-software.com

ACTA DE INTERVENTORIA

Revision:0

Fecha:11-08-22

ALCALDIA DE PEREIRA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Los tipos de modificación son:
+1 : adición
-1 : reducción

CONTRATO DE CONSULTORIA No: **5116-2021**

Fecha: **05-oct-21**

Objeto: **OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, FINACIERA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE "CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CONEXIÓN AVENIDA LAS AMERICAS, ZONA DE EXPANSIÓN OCCIDENTAL CERRITOS, DESDE LA INTERSECCIÓN CONDINA KM 0+00 (AV LAS AMÉRICAS) HASTA EL KM 3+400 (SECTOR EL TIGRE) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.**

Contratista: **CONSORCIO CONDINA JJAI**

Supervisor: MILTON HURTADO GARCIA
Interventor-Supervisor

Valor inicial: $ 2,815,970,447.00
Valor adición:
Valor total: **$ 2,815,970,447**
Valor Anticipo: $ 1,126,388,178.80
Fecha iniciación: 11-oct-21
Plazo: DIECIOCHO (18) MESES o CUATROCIENTOS CUARENTA (440) DÍAS
Prorroga:
Fecha terminación: 31-dic-22
Fecha Terminación Real:

ACTA 08

Período:
Julio 11 a Agosto 10 de 2022

Fecha: Agosto 11 de 2022

Valor Acta **$ 174,032,685.26**

CONDICIONES GENERALES				CONTRATADO			MODIFICACIONES			EJECUTADO ACTAS ANTERIORES		EJECUTADO ACTA 07		ACUMULADO	
ACTIVIDAD	NIVEL EDUCATIVO/ITEM	UN	VR UNITARIO	DEDICACIÓN	DURACIÓN	VR PARCIAL	+/-	CANT	VALOR			DURACIÓN PRESENTE ACTA	VR PARCIAL	DURACIÓN ACUMULDA	VR PARCIAL
1. PERSONAL PROFESIONAL															
Ingeniero Civil	Director de Interventoria	mes	$ 7,000,000	1.00	18.00	$ 126,000,000.00				9.00	$ 63,000,000.0	1.00	$ 7,000,000.00	10.00	$ 70,000,000.00
Ingeniero Civil	Residente de Interventoria 1	mes	$ 5,000,000	1.00	18.00	$ 90,000,000.00				9.00	$ 45,000,000.0	1.00	$ 5,000,000.00	10.00	$ 50,000,000.00
Ingeniero Civil	Residente de Interventoria 2	mes	$ 5,000,000	1.00	12.00	$ 60,000,000.00	-	-5	$ -25,000,000.0		$ -				
Arquitecto	Asesor en Urbanismo	mes	$ 5,000,000	1.00	12.00	$ 60,000,000.00		-4	$ -20,000,000.0		$ -				
Tecnologo en obras civiles (1)	Inspector de obra (1)	mes	$ 2,000,000	1.00	18.00	$ 36,000,000.00				9.00	$ 18,000,000.0	1.00	$ 2,000,000.00	10.00	$ 20,000,000.00
Tecnologo en obras civiles (2)	Inspector de obra (2)	mes	$ 2,000,000	1.00	12.00	$ 24,000,000.00	-	-5	$ -10,000,000.0		$ -				
Ingeniero Industrial	Asesor SISO/HSEQ	mes	$ 3,500,000	1.00	18.00	$ 63,000,000.00				9.00	$ 31,500,000.0	1.00	$ 3,500,000.00	10.00	$ 35,000,000.00
Profesional en el área social	Asesor engestión social	mes	$ 3,500,000	1.00	18.00	$ 63,000,000.00				9.00	$ 31,500,000.0	1.00	$ 3,500,000.00	10.00	$ 35,000,000.00
Abogado	Asesor en Gestión Predial	mes	$ 5,000,000	1.00	18.00	$ 90,000,000.00				9.00	$ 45,000,000.0	1.00	$ 5,000,000.00	10.00	$ 50,000,000.00
Apoyo administrativo	Secretaria	mes	$ 1,200,000	1.00	18.00	$ 21,600,000.00				9.00	$ 10,800,000.0	1.00	$ 1,200,000.00	10.00	$ 12,000,000.00
Apoyo administrativo	Mensajero	mes	$ 1,000,000	0.50	18.00	$ 9,000,000.00				4.50	$ 4,500,000.0	0.50	$ 500,000.00	5.00	$ 5,000,000.00
			Sub total			$ 642,600,000.00			-$ 55,000,000.00		$ 249,300,000.00		$ 27,700,000.00		$ 277,000,000.00
			Factor multiplicador		**2.30**			2.3							
			Total personal profesional			**$ 1,477,980,000.00**			-$ 126,500,000.00		$ 573,390,000.00		**$ 63,710,000.00**		**$ 637,100,000.00**
2. PERSONAL TECNICO Y DE APOYO															
Ingeniero Civil	Asesor en vías y pavimentos	mes	$ 5,500,000	0.25	16.00	$ 22,000,000.000	-	-1	$ -5,500,000.0		$ -	1.00	$ 5,500,000.00	1.00	$ 5,500,000.00
Ingeniero Civil en Geotecnia	Asesor en estabilidad de taludes y terraplenes	mes	$ 5,500,000	0.25	12.00	$ 16,500,000.000	-	-1	$ -5,500,000.0		$ -	1.00	$ 5,500,000.00	1.00	$ 5,500,000.00
Tecnólogo Industrial	Asesor SISO/HSEQ 1	mes	$ 1,600,000	1.00	12.00	$ 19,200,000.000	-	-4	$ -6,400,000.0		$ -				
Profesional en el Área Ambiental	Asesor Interv. Ambiental	mes	$ 3,300,000	0.25	18.00	$ 14,850,000.000	+	10.5	$ 34,650,000.0	9.00	$ 29,700,000.0	1.00	$ 3,300,000.00	10.00	$ 33,000,000.00
Ingeniero Civil	Asesor en calidad	mes	$ 4,500,000	0.50	12.00	$ 27,000,000.000	-	-3	$ -13,500,000.0		$ -				
Ingeniero Civil	Asesor en programación	mes	$ 4,500,000	0.50	18.00	$ 40,500,000.000				4.50	$ 20,250,000.0	0.50	$ 2,250,000.00	5.00	$ 22,500,000.00
Ingeniero Electricista	Asesor Ingeniero Electricista	mes	$ 4,500,000	0.50	12.00	$ 27,000,000.000	-	4	$ 18,000,000.0	2.57	$ 11,565,000.0	0.75	$ 3,375,000.00	3.32	$ 14,940,000.00
Ingeniero Forestal	Asesor Ingeniero Forerstal	mes	$ 4,500,000	0.50	12.00	$ 27,000,000.000				5.97	$ 26,850,000.0	1.00	$ 4,500,000.00	6.97	$ 31,350,000.00
Biólogo	Biólogo	mes	$ 3,500,000	0.50	12.00	$ 21,000,000.000	+	8	$ 28,000,000.0	7.00	$ 24,500,000.0	1.00	$ 3,500,000.00	8.00	$ 28,000,000.00
Arqueologo o antropólogo	Asesor en Arqueología o Antropología	mes	$ 4,500,000	0.50	6.00	$ 13,500,000.000	+	8	$ 36,000,000.0	7.50	$ 33,750,000.0	1.00	$ 4,500,000.00	8.50	$ 38,250,000.00
Abogado (2)	Asesor en gestión Predial	mes	$ 4,500,000	2.00	8.00	$ 72,000,000.000	-	-7	$ -31,500,000.0	7.00	$ 31,500,000.0			7.00	$ 31,500,000.00
Contador	Apoyo administrativo	mes	$ 2,600,000	0.20	18.00	$ 9,360,000.000				1.80	$ 4,680,000.0	0.20	$ 520,000.00	2.00	$ 5,200,000.00
			Sub total			$ 309,910,000.000			$ 54,250,000.00		$ 182,795,000.00		$ 32,945,000.00		$ 215,740,000.00
			Factor multiplicador		**1.29**			1.29							
			Total personal profesional			**$ 399,783,900.00**			$ 69,982,500.00		$ 235,805,550.00		**$ 42,499,050.00**		**$ 278,304,600.00**
3. COSTOS DIRECTOS REEMBOLSABLES		**UN**	**VR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**DURACION**	**VR PARCIAL**									
Comisión de Topografía (Inc. Equipos y seguridad) instalación y control de puntos para el monitoreo de asentamientos y movimiento		Día	$ 564,860	300.00		$ 169,458,000.00		35	$ 19,770,100.0	315.00	$ 177,930,900.0	26.00	$ 14,686,360.00	341.00	$ 192,617,260.00
Transporte (Camioneta doble cabina. Placa Pública-Incluye conductor)		S.F.	$ 4,500,000	2.00	12.0	$ 108,000,000.00	+	13	$ 58,500,000.0	23.33	$ 105,000,000.0	3.00	$ 13,500,000.00	26.33	$ 118,500,000.00
Costos de oficina - Campamento (Alquiler, dotación, incluye servicios publicos)		S.F.	$ 1,500,000	1.00	18.0	$ 27,000,000.00				9.00	$ 13,500,000.0	1.00	$ 1,500,000.00	10.00	$ 15,000,000.00
Ensayos de laboratorio (incluye toma de muestras, ensayos e informes)		S.F.				$ 30,000,000.00					$ -				
Protocolos de Bioseguridad		S.F.				$ 20,000,000.00	-		$ -18,916,169.0		$ 268,291.0				$ 268,291.00
Computador sin ploter (Alquiler)		S.F.	$ 150,000	3.00	18.0	$ 8,100,000.00				27.00	$ 4,050,000.0	3.00	$ 450,000.00	30.00	$ 4,500,000.00
Papelería, fotocopias, heliográficas, fotografías, etc.		S.F.	$ 150,000	1.00	18.0	$ 2,700,000.00				9.00	$ 1,350,000.0	1.00	$ 150,000.00	10.00	$ 1,500,000.00
Comunicaciones (teléfono, celular, fax, internet, etc.)		S.F.	$ 100,000	3.00	18.0	$ 5,400,000.00				27.00	$ 2,700,000.0	3.00	$ 300,000.00	30.00	$ 3,000,000.00
Edición informes		Und	$ 450,000	1.00	18.0	$ 8,100,000.00				8.00	$ 3,600,000.0	1.00	$ 450,000.00	9.00	$ 4,050,000.00
			Sub total			$ 378,758,000.00			$ 59,353,931.00		$ 308,399,191.00		$ 31,036,360.00		$ 339,435,551.00
			Factor multiplicador		**1.29**			1.29							
			Total costos directos reembolsables			**$ 488,597,820.00**			$ 76,566,571.00		**$ 397,834,957.00**		**$ 40,036,904.00**		**$ 437,871,861.00**
			Total			$ 2,366,361,720.00			$ 20,049,071.00		$ 1,209,945,184.00		$ 146,245,954.00		$ 1,356,191,138.00
			IVA 19%			$ 449,608,727.00			$ 3,809,323.00		$ 229,889,584.96		$ 27,786,731.26		$ 257,676,316.22
			VALOR TOTAL			**$ 2,815,970,447.00**			**$ 23,858,394.00**		**$ 1,439,834,769**		**$ 174,032,685.26**		**$ 1,613,867,454.22**
									$ 15,541,915						

AMORTIZACION ANTICIPO	$ 69,613,074.00
NETO ACTA	$ 104,419,611.26

#¿NOMBRE?

BALANCE ANTICIPO			
VALOR ANTICIPO :	40%		$ 1,126,388,179.00
AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES :		$ 382,475,809.00	
AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA :		$ 69,613,074.00	
Saldo:		$ 674,299,296.00	
Sumas iguales:		**$ 1,126,388,179.00**	**$ 1,126,388,179.00**

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR CONTRATO :	$ 2,815,970,447.00	$ 2,815,970,447.00
V/R ACTAS ANTERIORES	$ 1,439,834,768.96	
V/R PRESENTE ACTA	$ 174,032,685.26	
Saldo	$ 1,202,102,992.78	
SUMAS IGUALES :	**$ 2,815,970,447.00**	**$ 2,815,970,447.00**

MILTON HURTADO GARCIA
Supervisor - Secretaria de infraestructura
Alcaldia de Pereira

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
Rep Legal CONSORCIO CONDINA JJAI.
Contratista

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.tracker-software.com
