IQI-3105-2026
INGEQUALITY S.A.S
Nit 900972178-7
CO20/962451

Código:	IQS-FR-030
Versión:	02
Fecha:	30/09/2019
Página:	1 de 1

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION EN CILINDROS
INV-E-410

INGEQUALITY S.A.S

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META

CLIENTE: UNION TEMPORAL CONFISCA 25
LOCALIZACION: MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - DEPARTAMENTO DEL META
FECHA RECIBO: ENTREGA DE RESULTADOS CORTE MES DE MAYO (A PARTIR DE 06 DE AGOSTO)
OBSERVACIONES: NINGUNA
MARCA DE CEMENTO: PORTLAND C- 17,83 K- 1,38


NUMERO DE SERVICIO : 18359
NUMERO DE INFORME : IQI-3105-26
FECHA INFORME: 15 de septiembre de 2026
TIPO DE MEZCLA: OBRA | PLANTA | MUESTRA DE REFERENCIA X

NOMBRE DEL ELEMENTO	Nº MUESTRA	f'c Diseño (PSI)	Fecha de Toma	EDAD DE CURADO	Fecha de Ensayo	DIAMETRO (cm)	ALTURA (cm)	PESO (gr)	CARGA (Kgf)	AREA (cm2)	DENSIDAD (Kg/cm3)	CORREC. ESBELTEZ	RESISTENCIA PSI	RESISTENCIA Kg/cm2	% REAL	RESISTENCIA PROYECTADA (PSI)	TIPO DE FALLO 1	2	3	4	5
ZAPATAS (CICLOPEO)	1	3000	06/08/26	7 DIAS	13-08-26	10,2	20,3	3852	12458	81,71	2,322	0,99	2156,40	150,95	71,9%	3230,5			X		
	1			14 DIAS	20-08-26	10,1	20,2	3756	14632	80,12	2,321	1	2608,99	182,63	87,0%	3835,1			X		
	1			28 DIAS	03-09-26	10,0	20,2	3724	17362	78,54	2,347	1	3137,99	221,06	105,3%					X	
ZAPATAS (CICLOPEO)	2	3000	08/08/26	7 DIAS	15-08-26	10,0	20,1	3862	11645	78,54	2,446	1	2118,12	148,27	70,6%	3177,7				X	
	2			14 DIAS	22-08-26	10,2	20,2	3741	14744	81,71	2,266	0,99	2551,89	178,63	85,1%	3776,3			X		
	2			28 DIAS	05-09-26	10,1	20,2	3822	17244	80,12	2,362	1	3074,75	215,23	102,5%						X
ZAPATAS	3	3000	11/08/26	7 DIAS	18-08-26	10,1	20,1	3796	11866	80,12	2,357	0,99	2094,63	146,62	69,8%	3145,3			X		
	3			14 DIAS	25-08-26	10,1	20,0	3744	14339	80,12	2,337	0,99	2531,18	177,18	84,4%	3747,7					X
	3			28 DIAS	08-09-26	10,0	20,1	3729	17131	78,54	2,362	1	3119,61	218,37	104,0%				X		
ZAPATAS	4	3000	12/08/26	7 DIAS	19-08-26	10,2	20,2	3764	12550	81,71	2,280	0,99	2172,15	152,05	72,4%	3252,3					X
	4			14 DIAS	26-08-26	10,0	20,2	3738	14603	78,54	2,356	1	2656,15	185,93	88,5%	3920,2				X	
	4			28 DIAS	09-09-26	10,0	20,0	3802	17056	78,54	2,420	1	3102,33	217,16	103,4%						X

OBSERVACIONES:

% DE RESISTENCIA				
7 DIAS	14 DIAS	28 DIAS	56 DIAS	90 DIAS
65-67	82-83	100	117-118	125-130

L/D	0,5	1	1,25	1,5	1,75	2
FACTOR CORR.	0,53	0,83	0,92	0,97	0,99	1,00



La información aquí reportada pertenece unicamente a la muestra analizada y no podrá ser reproducida parcial o totalmente sin la autorización escrita de INGEQUALITY SAS

ELABORO		REVISO	
FIRMA :		FIRMA :	
NOMBRE :	JAMES HERRERA	NOMBRE :	JUAN DIEGO TRUJILLO
CARGO :	AUX. DE LABORATORIO	CARGO :	ING. JEFE DE LABORATORIO

Calle 25D N°25-86 B. San Marcos, 314 355 4384 - 321 384 8961
E-mail: ingequalitysas@gmail.com / admon.ingequalitysas@gmail.com
N.S.-18359

5919

IQI-3105-2026
INGEQUALITY S.A.S
Nit 900972178-7
CO20/962451

Codigo:	IQI-FR-003
Version:	02
Fecha:	30/09/2019
Pagina:	1 de 1

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION EN CILINDROS
INV-E-410


PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – META

CLIENTE: UNION TEMPORAL CONTESCA 23
NUMERO DE SERVICIO: 18359
LOCALIZACION: MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – DEPARTAMENTO DEL META
NUMERO DE INFORME: IQI-3105-26
FECHA RECIBO: ENTREGA DE RESULTADOS CORTE MES DE MAYO (A PARTIR DE 06 DE AGOSTO)
FECHA INFORME: 15 de septiembre de 2026
OBSERVACIONES: NINGUNA
TIPO DE MEZCLA: OBRA | PLANTA | MUESTRA REFERENCIA: X
MARCA DE CEMENTO: PORTLAND C- 17,83 K- 1,38

NOMBRE DEL ELEMENTO	Nº MUESTRA	f'c Diseño (PSI)	Fecha de Toma	EDAD DE CURADO	Fecha de Ensayo	DIAMETRO (cm)	ALTURA (cm)	PESO (gr)	CARGA (Kgf)	AREA (cm2)	DENSIDAD (Kg/cm3)	CORREC. FACTOR	RESISTENCIA PSI	RESISTENCIA Kg/cm2	% REAL	RESISTENCIA PROYECTADA (PSI)	TIPO DE FALLO
ZAPATAS	5	3000	13/08/26	7 DIAS	20-08-26	10,1	20,1	3866	12469	80,12	2,401	0,99	2201,08	154,08	73,4%	3292,2	X
	5			14 DIAS	27-08-26	10,2	20,1	3812	14896	81,71	2,321	0,99	2378,19	180,47	85,9%	3812,6	X
	5			28 DIAS	10-09-26	10,1	20,2	3751	17233	80,12	2,318	1	3072,76	215,08	102,4%		X
PEDESTALES	6	3000	15/08/26	7 DIAS	20-08-26	10,0	20,1	3724	11896	78,54	2,359	1	2163,77	151,46	72,1%	3240,7	X
	6			14 DIAS	27-08-26	10,1	20,2	3801	14609	80,12	2,349	1	2604,89	182,34	86,8%	3843,5	X
	6			28 DIAS	10-09-26	10,3	20,2	3850	17922	83,32	2,287	0,99	3041,99	212,94	101,4%		X
VIGAS DE CIMENTACION	7	3000	14/08/26	7 DIAS	21-08-26	10,1	20,2	3764	12564	80,12	2,326	1	2240,25	156,82	74,7%	3346,3	X
	7			14 DIAS	28-08-26	10,1	20,2	3825	14800	80,12	2,363	1	2638,94	184,73	88,0%	3896,5	X
	7			28 DIAS	11-09-26	10,0	20,0	3819	17285	78,54	2,451	1	3143,98	220,08	104,8%		X
PLACA DE CONTRAPISO	8	3000	19/08/26	7 DIAS	26-08-26	10,2	20,3	3839	12336	81,71	2,314	0,99	2135,11	149,46	71,2%	3201,2	X
	8			14 DIAS	02-09-26	10,0	20,1	3815	14032	78,54	2,417	1	2555,93	178,92	85,2%	3781,9	X
	8			28 DIAS	16-09-26												

OBSERVACIONES:

% DE RESISTENCIA					L/D	0,5	1	1,25	1,5	1,75	2
7 DIAS	14 DIAS	21 DIAS	28 DIAS	56 DIAS	FACTOR CORR.	0,53	0,83	0,92	0,97	0,99	1,00
65-67	85-88	100	117-118	125-130							



La información aquí reportada pertenece únicamente a la muestra analizada y no podrá ser reproducida parcial o totalmente sin la autorización escrita de INGEQUALITY SAS

ELABORO		REVISO	
FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE:	JAMES HERRERA	NOMBRE:	JUAN DIEGO TRUJILLO
CARGO:	AUX. DE LABORATORIO	CARGO:	ING. JEFE DE LABORATORIO

Calle 25D N°25-86 B. San Marcos, 314 355 4384 - 321 384 8961
E-mail: ingequalitysas@gmail.com / admon.ingequalitysas@gmail.com

N.S. 18359

Código	SQI-FR-005
Versión	02
Fecha	20/09/2019
Página	1 de 1

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION EN CILINDROS
INV-E-410


PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – META		
CLIENTE:	UNION TEMPORAL CONFISCA 25	NUMERO DE SERVICIO :	18359
LOCALIZACION:	MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - DEPARTAMENTO DEL META	NUMERO DE INFORME :	IQI-3105-26
FECHA RECIBO:	ENTREGA DE RESULTADOS CORTE MES DE MAYO (A PARTIR DE 06 DE AGOSTO)	FECHA INFORME:	15 de septiembre de 2026
OBSERVACIONES:	NINGUNA	TIPO DE MEZCLA	OBRA / PLANTA / SIN REFERENCIA: X
MARCA DE CEMENTO:	PORTLAND C- 17,83 K- 1,58		

NOMBRE DEL ELEMENTO	Nº MUESTRA	f'c Diseño (PSI)	Fecha de Toma	EDAD DE CURADO	Fecha de Ensayo	DIAMETRO (cm)	ALTURA (cm)	PESO (gr)	CARGA (Kgf)	AREA (cm2)	DENSIDAD (Kg/cm3)	CORREC. DENSIDAD	RESISTENCIA PSI	RESISTENCIA Kg/cm2	% ESTIM.	RESISTENCIA OBTENIDA (PSI)	TIPO DE FALLO	
COLUMNAS	9	3000	21/08/26	7 DIAS	28-08-26	10,2	20,2	3826	12154	81,71	2,318	0,99	2103,61	147,25	70,1%	3157,7		X
	9			14 DIAS	04-09-26	10,0	20,1	3734	13766	78,54	2,378	1	2503,91	175,27	83,5%	3710,1		X
	9			28 DIAS	18-09-26													
COLUMNAS	10	3000	22/08/26	7 DIAS	29-08-26	10,0	20,2	3836	12466	78,54	2,418	1	2267,45	158,72	75,6%	3383,8		X
	10			14 DIAS	05-09-26	10,2	20,3	3861	14855	81,71	2,328	0,99	2571,10	179,98	85,7%	3802,8	X	
	10			28 DIAS	19-09-26													
COLUMNAS	11	3000	25/08/26	7 DIAS	01-09-26	10,0	20,2	3836	11764	78,54	2,418	1	2139,76	149,78	71,3%	3207,6	X	
	11			14 DIAS	08-09-26	10,1	20,0	3748	14000	80,12	2,339	0,99	2471,33	172,99	82,4%	3663,2		X
	11			28 DIAS	22-09-26													
VIGAS AEREAS	12	3000	25/08/26	7 DIAS	01-09-26	10,2	20,3	3752	12655	81,71	2,262	0,99	2190,32	153,32	73,0%	3277,4	X	
	12			14 DIAS	08-09-26	10,1	20,1	3811	14123	80,12	2,367	0,99	2495,05	174,51	83,1%	3695,1		X
	12			28 DIAS	22-09-26													

OBSERVACIONES:

% DE RESISTENCIA				
7 DIAS	14 DIAS	28 DIAS	56 DIAS	90 DIAS
65-67	82-85	100	117-118	128-130

L/D	0,5	1	1,25	1,5	1,75	2
FACTOR CORR.	0,85	0,93	0,92	0,97	0,98	1,00



La información aquí reportada pertenece únicamente a la muestra analizada y no podrá ser reproducida parcial o totalmente sin la autorización escrita de INGEQUALITY SAS

ELABORO	FIRMA :		REVISO	FIRMA :	
	NOMBRE :	JAMES HERRERA		NOMBRE :	JUAN DIEGO TRUJILLO
	CARGO :	AUX. DE LABORATORIO		CARGO :	ING. JEFE DE LABORATORIO

Calle 25D N°25-86 B. San Marcos, 314 355 4384 - 321 384 8961 N.S. 18359
E-mail. ingequalitysas@gmail.com / admon.ingequalitysas@gmail.com

5921

Código:	IQI-FR-C03
Versión:	02
Fecha:	26/09/2019
Página:	1 de 1

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION EN CILINDROS
INV-E-410

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – META		
CLIENTE:	UNION TEMPORAL CONVISCA 23	NUMERO DE SERVICIO:	18559
LOCALIZACION:	MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN – DEPARTAMENTO DEL META	NUMERO DE INFORME:	IQI-3105-26
FECHA RECIBO:	ENTREGA DE RESULTADOS CORTE MES DE MAYO (A PARTIR DE 06 DE AGOSTO)	FECHA INFORME:	15 de septiembre de 2026
OBSERVACIONES:	NINGUNA	TIPO DE MEZCLA:	OBRA / PLANTA / REFERENCIA: X
MARCA DE CEMENTO:	PORTLAND	C- 17,85 K- 1,98	

NOMBRE DEL ELEMENTO	Nº MUESTRA	F'c Diseño (PSI)	Fecha de Toma	EDAD DE CURADO	Fecha de Ensayo	DIAMETRO (cm)	ALTURA (cm)	PESO (kg)	CARGA (Kgf)	AREA (cm2)	DENSIDAD (Kg/cm3)	CORREC. MASTER	RESISTENCIA PSI	RESISTENCIA Kg/cm2	% RESIS.	RESISTENCIA PROYECTADA (psi)	TIPO DE FALLO
VIGAS AEREAS	13	3000	26/08/26	7 DIAS	02-09-26	10,1	20,1	3815	12546	80,12	2,369	0,99	2214,67	155,03	73,8%	3311,0	X
	13			14 DIAS	09-09-26	10,0	20,1	3766	14026	78,54	2,386	1	2551,20	178,58	85,0%	3773,4	X
	13			28 DIAS	23-09-26												
PLACA DE CODENSADORES CONCRETO IMPERMEABILIZADO	14	3000	26/08/26	7 DIAS	02-09-26	10,1	20,2	3851	12066	80,12	2,380	1	2151,43	150,60	71,7%	3223,7	X
	14			14 DIAS	09-09-26	10,2	20,2	3716	14311	81,71	2,253	0,99	2476,94	173,39	82,6%	3672,9	X
	14			28 DIAS	23-09-26												
VIGAS AEREAS	15	3000	27/08/26	7 DIAS	03-09-26	10,0	20,1	3754	11874	78,54	2,378	1	2159,77	151,18	72,0%	3235,2	X
	15			14 DIAS	10-09-26	10,0	20,2	3726	13399	78,54	2,349	1	2437,16	170,60	81,2%	3618,0	X
	15			28 DIAS	24-09-26												
VIGAS DE CONFINAMIENTO Y COLUMNETAS	16	2500	29/08/26	7 DIAS	05-09-26	10,1	20,2	3659	10288	80,12	2,261	1	1834,42	128,41	73,4%	2786,2	X
	16			14 DIAS	12-09-26	10,2	20,3	3627	12144	81,71	2,187	0,99	2101,88	147,13	84,1%	3155,5	X
	16			28 DIAS	26-09-26												

OBSERVACIONES:

% DE RESISTENCIA					L/D	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2
7 DIAS	14 DIAS	28 DIAS	56 DIAS	90 DIAS	FACTOR CORR.	0,87	0,93	0,96	0,97	0,98	1,00
65-67	82-85	100	117-118	128-130							









La información aquí reportada pertenece únicamente a la muestra analizada y no podrá ser reproducida parcial o totalmente sin la autorización escrita de INGEQUALITY SAS

ELABORO	FIRMA:	REVISO	FIRMA:
	NOMBRE: JAMES HERRERA		NOMBRE: JUAN DIEGO TRUJILLO
	CARGO: AUX. DE LABORATORIO		CARGO: ING. JEFE DE LABORATORIO

Calle 25D N°25-86 B. San Marcos, 314 355 4384 - 321 384 8961
E-mail. ingequalitysas@gmail.com / admon.ingequalitysas@gmail.com
N.S. 18359

Codigo:	IQL-IE-003
Version:	02
Fecha:	30/09/2019
Pagina:	1 de 1

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION EN CILINDROS
INV-E-410


PROYECTO:	CONSTRUCCION DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META		
CLIENTE:	UNION TEMPORAL CONFISCA 25	NUMERO DE SERVICIO:	18359
LOCALIZACION:	MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - DEPARTAMENTO DEL META	NUMERO DE INFORME:	IQI-3105-26
FECHA RECIBO:	ENTREGA DE RESULTADOS CORTE MES DE MAYO (A PARTIR DE 06 DE AGOSTO)	FECHA INFORME:	15 de septiembre de 2026
OBSERVACIONES:	NINGUNA	TIPO DE MEZCLA:	OBRA: — PLANTA: — SIN REFERENCIA: X
MARCA DE CEMENTO:	PORTLAND C- 17,83 K- 1,38		

NOMBRE DEL ELEMENTO	No MUESTRA	f'c Diseño (PSI)	Fecha de Toma	EDAD DE CURADO	Fecha de Ensaye	DIAMETRO (cm)	ALTURA (cm)	PESO (gr)	CARGA (Kgs)	AREA (cm2)	DENSIDAD (Kg/cm3)	CORREC RESULTAN	RESISTENCIA PSI	RESISTENCIA Kg/cm2	% RESIS.	RESISTENCIA PROYECTADA (PSI)	TIPO DE FALLA
VIGAS DE CONFINAMIENTO Y COLUMNETAS	17	2500	31/08/26	7 DIAS	07-09-26	10,2	20,1	3752	10433	81,71	2,284	0,99	1805,74	126,40	72,2%	2746,6	X
	17			14 DIAS	14-09-26	10,2	20,2	3699	11867	81,71	2,241	0,99	2053,94	143,78	82,2%	3089,1	X
	17			28 DIAS	28-09-26												

OBSERVACIONES:

% DE RESISTENCIA				
7 DIAS	14 DIAS	28 DIAS	56 DIAS	90 DIAS
65-67	82-83	100	117-118	128-130

L/D	0,5	1	1,25	1,5	1,75	2
FACTOR CORR.	0,50	0,80	0,92	0,97	0,99	1,00



La información aquí reportada pertenece únicamente a la muestra analizada y no podrá ser reproducida parcial o totalmente sin la autorización escrita de INGEQUALITY SAS

ELABORO	FIRMA:	REVISO	FIRMA:
	NOMBRE: JAMES HERRERA		NOMBRE: JUAN DIEGO TRUJILLO
	CARGO: AUX. DE LABORATORIO		CARGO: ING. JEFE DE LABORATORIO

Calle 25D N°25-86 B. San Marcos, 314 355 4384 - 321 384 8961
E-mail. ingequalitysas@gmail.com / admon.ingequalitysas@gmail.com

N.S. 18359

5923

COPIA PAZ Y SALVOS

Puerto Gaitán – Meta
311 386 8024
Confisca25@gmail.com

5'924

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
NIT 902013442-0

CERTIFICACIÓN DE PERSONAL RETIRADO

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO

CERTIFICA:

Que, la **UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25**, identificada con NIT 902.013.442-0, presenta los siguientes trabajadores cuya relación laboral se encuentra terminada o retirada con corte a la fecha 15 de septiembre de 2026.

EMPLEADO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FECHA INICIO	FECHA RETIRO
MARIA FERNANDA PULIDO RODRIGUEZ	1.049.653.548	INGENIERO DE APOYO TECNICO	1/02/2026	31/03/2026
DANIEL ANDRES AYALA ROJAS	1.124.818.810	AYUDANTE DE OBRA	27/02/2026	30/05/2026
CESAR AUGUSTO HERNANDEZ CALDERON	3.215.459	OFICIAL DE OBRA	27/02/2026	5/06/2026
JABIER DARIO HERNANDEZ CALDERON	74.325.151	AYUDANTE DE OBRA	9/03/2026	5/06/2026
CAMILO ANDRES RODRIGUEZ VEGA	1.006.691.448	AYUDANTE DE OBRA	16/03/2026	5/06/2026
WILLIAM TRIGOS MORENO	86.047.574	OFICIAL DE OBRA	16/03/2026	5/06/2026
CRISTIAN FERNANDO PARDO VARGAS	1.006.776.906	AYUDANTE DE OBRA	16/03/2026	5/06/2026
DANY FABIAN JAIMES CAAMAÑO	1.052.413.449	AYUDANTE DE OBRA	7/04/2026	5/06/2026
LEIDER ESTEBAN DARAPO GAITAN	1.134.450.031	AYUDANTE DE OBRA	7/04/2026	5/06/2026
MAYCOL SAMUEL HERNANDEZ VANEGAS	1.124.818.911	AYUDANTE DE OBRA	19/02/2026	5/06/2026
WALFRAN PEREZ CARIBAN	1.124.991.535	CONTROLADOR VIAL	19/02/2026	5/06/2026
CAMILO ANDRES RODRIGUEZ VEGA	1.006.691.448	AYUDANTE DE OBRA	16/06/2026	30/06/2026
DANY FABIAN JAIMES CAAMAÑO	1.052.413.449	AYUDANTE DE OBRA	1/07/2026	22/07/2026

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
NIT 902013442-0

EMPLEADO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FECHA INICIO	FECHA RETIRO
WALFRAN PEREZ CARIBAN	1.124.991.535	CONTROLADOR VIAL	16/06/2026	31/07/2026
LEIDER ESTEBAN DARAPO GAITAN	1.134.450.031	AYUDANTE DE OBRA	16/06/2026	31/07/2026
MAYCOL SAMUEL HERNANDEZ VANEGAS	1.124.818.911	AYUDANTE DE OBRA	18/06/2026	31/07/2026
CESAR AUGUSTO HERNANDEZ CALDERON	3.215.459	OFICIAL DE OBRA	16/06/2026	31/07/2026
EDWIN GEOVANNY RAMIREZ CASTRO	86.060.299	ING. DE APOYO TECNICO	21/08/2026	30/08/2026
GUSTAVO ANTONIO DEANTONIO GARCIA	97.611.039	OFICIAL DE OBRA	3/09/2026	15/09/2026
LIBER AGUSTO ACERO QUESADA	1.121.417.962	AYUDANTE DE OBRA	27/08/2026	15/09/2026

Todos los retiros fueron registrados contablemente y reportados a las entidades del Sistema de Seguridad Social Integral (EPS, AFP, ARL y Caja de Compensación) conforme a la normatividad laboral vigente.

Para constancia de lo anterior y a solicitud del interesado, se firma la presente certificación en la ciudad de Puerto Gaitán, a los 15 días del mes de septiembre de 2026.

Cordialmente,

MIGUEL ANGEL GUERRERO RUEDA
CONTADOR PÚBLICO
C.C. 1.123.086.252
TP 271654-T

ADOLFO VASQUEZ MOSCOSO
CC. 1.023.879.760
R./LEGAL UNIÓN TEMPORAL
CONFISCA 25
NIT 902013442-0

5926

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
NIT 902013442-0

PAZ Y SALVO LABORAL

En el municipio de Puerto Gaitán a los 30 días del mes de agosto del año 2026 se da por terminado el contrato de trabajo celebrado entre la **UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25** con NIT 902.013.442-0 como EMPLEADOR, y el (a) señor (a) **EDWIN GEOVANNY RAMIREZ CASTRO** identificado (a) con cedula de ciudadanía N° 86.060.299 como EMPLEADO, desempeñando el cargo de ING. DE APOYO TECNICO.

Donde se procede a liquidar el pago total de salarios, prestaciones sociales, vacaciones y cualquier otra remuneración a la que tuviera derecho según el contrato individual de trabajo; con la firma de la presente paz y salvo el trabajador acepta haber recibido a satisfacción los valores liquidados, y declara que el empleador no le adeuda ningún otro concepto y valor relacionado con el contrato de trabajo del cual se declara su terminación de la relación laboral.

Sin otro particular.

EDWIN GEOVANNY RAMIREZ CASTRO
CEDULA: 86.060.299

5927

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
NIT 902013442-0

PAZ Y SALVO LABORAL

En el municipio de Puerto Gaitán a los 31 días del mes de julio del año 2026 se da por terminado el contrato de trabajo celebrado entre la **UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25** con NIT 902.013.442-0 como EMPLEADOR, y el (a) señor (a) **CESAR AUGUSTO HERNANDEZ CALDERON** identificado (a) con cedula de ciudadanía N° 3.215.459 como EMPLEADO, desempeñando el cargo de OFICIAL DE OBRA.

Donde se procede a liquidar el pago total de salarios, prestaciones sociales, vacaciones y cualquier otra remuneración a la que tuviera derecho según el contrato individual de trabajo; con la firma de la presente paz y salvo el trabajador acepta haber recibido a satisfacción los valores liquidados, y declara que el empleador no le adeuda ningún otro concepto y valor relacionado con el contrato de trabajo del cual se declara su terminación de la relación laboral.

Sin otro particular.

CESAR AUGUSTO HERNANDEZ CALDERON
CEDULA: 3.215.459

5928

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
NIT 902013442-0

PAZ Y SALVO LABORAL

En el municipio de Puerto Gaitán a los 31 días del mes de julio del año 2026 se da por terminado el contrato de trabajo celebrado entre la **UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25** con NIT 902.013.442-0 como EMPLEADOR, y el (a) señor (a) **CESAR AUGUSTO HERNANDEZ CALDERON** identificado (a) con cedula de ciudadanía N° 3.215.459 como EMPLEADO, desempeñando el cargo de OFICIAL DE OBRA.

Donde se procede a liquidar el pago total de salarios, prestaciones sociales, vacaciones y cualquier otra remuneración a la que tuviera derecho según el contrato individual de trabajo; con la firma de la presente paz y salvo el trabajador acepta haber recibido a satisfacción los valores liquidados, y declara que el empleador no le adeuda ningún otro concepto y valor relacionado con el contrato de trabajo del cual se declara su terminación de la relación laboral.

Sin otro particular.

cesar hernandez

CESAR AUGUSTO HERNANDEZ CALDERON
CEDULA: 3.215.459

5929

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
NIT 902013442-0

PAZ Y SALVO LABORAL

En el municipio de Puerto Gaitán a los 22 días del mes de julio del año 2026 se da por terminado el contrato de trabajo celebrado entre la **UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25** con NIT 902.013.442-0 como EMPLEADOR, y el (a) señor (a) **DANY FABIAN JAIMES CAAMAÑO** identificado (a) con cedula de ciudadanía N° 1.052.413.449 como EMPLEADO, desempeñando el cargo de AYUDANTE DE OBRA.

Donde se procede a liquidar el pago total de salarios, prestaciones sociales, vacaciones y cualquier otra remuneración a la que tuviera derecho según el contrato individual de trabajo; con la firma de la presente paz y salvo el trabajador acepta haber recibido a satisfacción los valores liquidados, y declara que el empleador no le adeuda ningún otro concepto y valor relacionado con el contrato de trabajo del cual se declara su terminación de la relación laboral.

Sin otro particular.

DANY FABIAN JAIMES CAAMAÑO
CEDULA: 1.052.413.449

Puerto Gaitán – Meta
311 386 8024
Confisca25@gmail.com

5930

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
NIT 902013442-0

PAZ Y SALVO LABORAL

En el municipio de Puerto Gaitán a los 31 días del mes de julio del año 2025 se da por terminado el contrato de trabajo celebrado entre la **UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25** con NIT 902.013.442-0 como EMPLEADOR, y el (a) señor (a) **MAYCOL SAMUEL HERNANDEZ VANEGAS** identificado (a) con cedula de ciudadanía N° 1.124.818.911 como EMPLEADO, desempeñando el cargo de AYUDANTE DE OBRA.

Donde se procede a liquidar el pago total de salarios, prestaciones sociales, vacaciones y cualquier otra remuneración a la que tuviera derecho según el contrato individual de trabajo; con la firma de la presente paz y salvo el trabajador acepta haber recibido a satisfacción los valores liquidados, y declara que el empleador no le adeuda ningún otro concepto y valor relacionado con el contrato de trabajo del cual se declara su terminación de la relación laboral.

Sin otro particular.

Maicol Vanegas

MAYCOL SAMUEL HERNANDEZ VANEGAS
CEDULA: 1.124.818.911

Puerto Gaitán – Meta
311 386 8024
Confisca25@gmail.com

5931

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
NIT 902013442-0

PAZ Y SALVO LABORAL

En el municipio de Puerto Gaitán a los 31 días del mes de julio del año 2026 se da por terminado el contrato de trabajo celebrado entre la **UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25** con NIT 902.013.442-0 como EMPLEADOR, y el (a) señor (a) **WALFRAN PEREZ CARIBAN** identificado (a) con cedula de ciudadanía N° 1.124.991.535 como EMPLEADO, desempeñando el cargo de AYUDANTE DE OBRA.

Donde se procede a liquidar el pago total de salarios, prestaciones sociales, vacaciones y cualquier otra remuneración a la que tuviera derecho según el contrato individual de trabajo; con la firma de la presente paz y salvo el trabajador acepta haber recibido a satisfacción los valores liquidados, y declara que el empleador no le adeuda ningún otro concepto y valor relacionado con el contrato de trabajo del cual se declara su terminación de la relación laboral.

Sin otro particular.

Walfran Perez C.

WALFRAN PEREZ CARIBAN
CEDULA: 1.124.991.535

Puerto Gaitán – Meta
311 386 8024
Confisca25@gmail.com

5932

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
NIT 902013442-0

PAZ Y SALVO LABORAL

En el municipio de Puerto Gaitán a los 31 días del mes de julio del año 2026 se da por terminado el contrato de trabajo celebrado entre la **UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25** con NIT 902.013.442-0 como EMPLEADOR, y el (a) señor (a) **LEIDER ESTEBAN DARAPO GAITAN** identificado (a) con cedula de ciudadanía N° 1.134.450.031 como EMPLEADO, desempeñando el cargo de AYUDANTE DE OBRA.

Donde se procede a liquidar el pago total de salarios, prestaciones sociales, vacaciones y cualquier otra remuneración a la que tuviera derecho según el contrato individual de trabajo; con la firma de la presente paz y salvo el trabajador acepta haber recibido a satisfacción los valores liquidados, y declara que el empleador no le adeuda ningún otro concepto y valor relacionado con el contrato de trabajo del cual se declara su terminación de la relación laboral.

Sin otro particular.

Leider E. Darapo

LEIDER ESTEBAN DARAPO GAITAN
CEDULA: 1.134.450.031

Puerto Gaitán - Meta
311 396 8024
Confisca25@gmail.com

5933

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
NIT 902013442-0

PAZ Y SALVO LABORAL

En el municipio de Puerto Gaitán a los 30 días del mes de junio del año 2026 se da por terminado el contrato de trabajo celebrado entre la **UNIÓN TEMPORAL** CONFISCA 25 con NIT 902.013.442-0 como EMPLEADOR, y el (a) señor (a) **CAMILO ANDRES RODRIGUEZ VEGA** identificado (a) con cedula de ciudadanía N° 1.006.691.448 como EMPLEADO, desempeñando el cargo de AYUDANTE DE OBRA.

Donde se procede a liquidar el pago total de salarios, prestaciones sociales, vacaciones y cualquier otra remuneración a la que tuviera derecho según el contrato individual de trabajo; con la firma de la presente paz y salvo el trabajador acepta haber recibido a satisfacción los valores liquidados, y declara que el empleador no le adeuda ningún otro concepto y valor relacionado con el contrato de trabajo del cual se declara su terminación de la relación laboral.

Sin otro particular.

Camilo Vega

CAMILO ANDRES RODRIGUEZ VEGA
CEDULA: 1.006.691.448

5934

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
NIT 902.013.442-0

PAZ Y SALVO LABORAL

En el municipio de Puerto Gaitán a los 05 días del mes de junio del año 2026 se da por terminado el contrato de trabajo celebrado entre la **UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25** con NIT 902.013.442-0 como EMPLEADOR, y el (a) señor (a) MAYCOL SAMUEL HERNANDEZ VANEGAS identificado (a) con cedula de ciudadania N° 1.124.818.911 como EMPLEADO, desempeñando el cargo de AYUDANTE DE OBRA.

Donde se procede a liquidar el pago total de salarios, prestaciones sociales, vacaciones y cualquier otra remuneración a la que tuviera derecho según el contrato individual de trabajo; con la firma de la presente paz y salvo el trabajador acepta haber recibido a satisfacción los valores liquidados, y declara que el empleador no le adeuda ningún otro concepto y valor relacionado con el contrato de trabajo del cual se declara su terminación de la relación laboral.

Sin otro particular.

Maicol Vanegas

MAYCOL SAMUEL HERNANDEZ VANEGAS
CEDULA: 1.124.818.911

S935

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
NIT 902013442-0

PAZ Y SALVO LABORAL

En el municipio de Puerto Gaitán a los 05 dias del mes de junio del año 2026 se da por terminado el contrato de trabajo celebrado entre la **UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25** con NIT 902.013.442-0 como EMPLEADOR, y el (a) señor (a) DANY FABIAN JAIMES **CAAMAÑO** identificado (a) con cedula de ciudadania N° 1.052.413.449 como EMPLEADO, desempeñando el cargo de AYUDANTE DE OBRA.

Donde se procede a liquidar el pago total de salarios, prestaciones sociales, vacaciones y cualquier otra remuneración a la que tuviera derecho según el contrato individual de trabajo; con la firma de la presente paz y salvo el trabajador acepta haber recibido a satisfacción los valores liquidados, y declara que el empleador no le adeuda ningún otro concepto y valor relacionado con el contrato de trabajo del cual se declara su terminación de la relación laboral.

Sin otro particular.

DANY FABIAN JAIMES CAAMAÑO
CEDULA: 1.052.413.449

5936

UNION TEMPORAL CONFISCA 25

NIT 902.013.442-0

PAZ Y SALVO LABORAL

En el municipio de Puerto Gaitán a los 05 días del mes de junio del año 2023 se da por terminado el contrato de trabajo celebrado entre la **UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25** con NIT 902.013.442-0 como EMPLEADOR, y el (a) señor (a) CESAR AUGUSTO **HERNANDEZ CALDERON** identificado (a) con cedula de ciudadania N° 3.215.459 como EMPLEADO, desempeñando el cargo de OFICIAL DE OBRA.

Donde se procede a liquidar el pago total de salarios, prestaciones sociales, vacaciones y cualquier otra remuneración a la que tuviera derecho según el contrato individual de trabajo; con la firma de la presente paz y salvo el trabajador acepta haber recibido a satisfacción los valores liquidados, y declara que el empleador no le adeuda ningún otro concepto y valor relacionado con el contrato de trabajo del cual se declara su terminación de la relación laboral.

Sin otro particular.

Cesar Hernandez

CESAR AUGUSTO HERNANDEZ CALDERON

CEDULA: 3.215.459

5937

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
NIT 902.013.442-0

PAZ Y SALVO LABORAL

En el municipio de Puerto Gaitán a los 05 días del mes de junio del año 2018 se da por terminado el contrato de trabajo celebrado entre la **UNIÓN** TEMPORAL CONFISCA 25 con NIT 902.013.442-0 como EMPLEADOR, y el (a) señor (a) **JABIER DARIO HERNANDEZ CALDERON** identificado (a) con cedula de ciudadanía N° 74.325.151 como EMPLEADO, desempeñando el cargo de AYUDANTE DE OBRA.

Donde se procede a liquidar el pago total de salarios, prestaciones sociales, vacaciones y cualquier otra remuneración a la que tuviera derecho según el contrato individual de trabajo; con la firma de la presente paz y salvo el trabajador acepta haber recibido a satisfacción los valores liquidados, y declara que el empleador no le adeuda ningún otro concepto y valor relacionado con el contrato de trabajo del cual se declara su terminación de la relación laboral.

Sin otro particular.

JABIER DARIO HERNANDEZ CALDERON
CEDULA: 74.325.151

5938

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
NIT 902013442-0

PAZ Y SALVO LABORAL

En el municipio de Puerto Gaitán a los 05 días del mes de junio del año 2026 se da por terminado el contrato de trabajo celebrado entre la **UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25** con NIT 902.013.442-0 como EMPLEADOR, y el (a) señor (a) **WALFRAN PEREZ CARIBAN** identificado (a) con cedula de ciudadanía N° 1.124.991.535 como EMPLEADO, desempeñando el cargo de AYUDANTE DE OBRA.

Donde se procede a liquidar el pago total de salarios, prestaciones sociales, vacaciones y cualquier otra remuneración a la que tuviera derecho según el contrato individual de trabajo; con la firma de la presente paz y salvo el trabajador acepta haber recibido a satisfacción los valores liquidados, y declara que el empleador no le adeuda ningún otro concepto y valor relacionado con el contrato de trabajo del cual se declara su terminación de la relación laboral.

Sin otro particular.

Walfran Perez C.

WALFRAN PEREZ CARIBAN
CEDULA: 1.124.991.535

Puerto Gaitán – Meta
311 386 8024
Confisca25@gmail.com

5939

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25

NIT 902013442-0

PAZ Y SALVO LABORAL

En el municipio de Puerto Gaitán a los 05 días del mes de junio del año 2026 se da por terminado el contrato de trabajo celebrado entre la **UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25** con NIT 902.013.442-0 como EMPLEADOR, y el (a) señor (a) **WILLIAM TRIGOS MORENO** identificado (a) con cedula de ciudadanía N° 86.047.574 como EMPLEADO, desempeñando el cargo de OFICIAL DE OBRA.

Donde se procede a liquidar el pago total de salarios, prestaciones sociales, vacaciones y cualquier otra remuneración a la que tuviera derecho según el contrato individual de trabajo; con la firma de la presente paz y salvo el trabajador acepta haber recibido a satisfacción los valores liquidados, y declara que el empleador no le adeuda ningún otro concepto y valor relacionado con el contrato de trabajo del cual se declara su terminación de la relación laboral.

Sin otro particular.

WILLIAM TRIGOS MORENO
CEDULA: 86.047.574

S940

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
NIT 902.013.442-0

PAZ Y SALVO LABORAL

En el municipio de Puerto Gaitán a los 05 días del mes de junio del año 2026 se da por terminado el contrato de trabajo celebrado entre la **UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25** con NIT 902.013.442-0 como EMPLEADOR, y el (a) señor (a) **CRISTIAN FERNANDO PARDO VARGAS** identificado (a) con cedula de ciudadania N° 1.006.776.906 como EMPLEADO, desempeñando el cargo de AYUDANTE DE OBRA.

Donde se procede a liquidar el pago total de salarios, prestaciones sociales, vacaciones y cualquier otra remuneración a la que tuviera derecho según el contrato individual de trabajo; con la firma de la presente paz y salvo el trabajador acepta haber recibido a satisfacción los valores liquidados, y declara que el empleador no le adeuda ningún otro concepto y valor relacionado con el contrato de trabajo del cual se declara su terminación de la relación laboral.

Sin otro particular.

Cristian Pardo.

CRISTIAN FERNANDO PARDO VARGAS
CEDULA: 1.006.776.906

5941

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25

NIT 902.013.442-0

PAZ Y SALVO LABORAL

En el municipio de Puerto Gaitán a los 05 días del mes de junio del año 2026 se da por terminado el contrato de trabajo celebrado entre la **UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25** con NIT 902.013.442-0 como EMPLEADOR, y el (a) señor (a) **CAMILO ANDRES RODRIGUEZ VEGA** identificado (a) con cedula de ciudadanía N° 1.006.691.448 como EMPLEADO, desempeñando el cargo de AYUDANTE DE OBRA.

Donde se procede a liquidar el pago total de salarios, prestaciones sociales, vacaciones y cualquier otra remuneración a la que tuviera derecho según el contrato individual de trabajo; con la firma de la presente paz y salvo el trabajador acepta haber recibido a satisfacción los valores liquidados, y declara que el empleador no le adeuda ningún otro concepto y valor relacionado con el contrato de trabajo del cual se declara su terminación de la relación laboral.

Sin otro particular.

Camilo Vega

CAMILO ANDRES RODRIGUEZ VEGA

CEDULA: 1.006.691.448

5942

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
NIT 902013442-0

PAZ Y SALVO LABORAL

En el municipio de Puerto Gaitán a los 05 días del mes de junio del año 2026 se da por terminado el contrato de trabajo celebrado entre la **UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25** con NIT 902.013.442-0 como EMPLEADOR, y el (a) señor (a) **LEIDER ESTEBAN DARAPO GAITAN** identificado (a) con cedula de ciudadanía N° 1.134.450.031 como EMPLEADO, desempeñando el cargo de AYUDANTE DE OBRA.

Donde se procede a liquidar el pago total de salarios, prestaciones sociales, vacaciones y cualquier otra remuneración a la que tuviera derecho según el contrato individual de trabajo; con la firma de la presente paz y salvo el trabajador acepta haber recibido a satisfacción los valores liquidados, y declara que el empleador no le adeuda ningún otro concepto y valor relacionado con el contrato de trabajo del cual se declara su terminación de la relación laboral.

Sin otro particular.

LEIDER ESTEBAN DARAPO GAITAN
CEDULA: 1.134.450.031

5943

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
NIT 902013442-0

PAZ Y SALVO LABORAL

En el municipio de Puerto Gaitán a los 30 días del mes de mayo del año 2026 se da por terminado el contrato de trabajo celebrado entre la **UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25** con NIT 902.013.442-0 como EMPLEADOR, y el (a) señor (a) **DANIEL ANDRES AYALA ROJAS** identificado (a) con cedula de ciudadanía N° 1.124.818.810 como EMPLEADO, desempeñando el cargo de AYUDANTE DE OBRA.

Donde se procede a liquidar el pago total de salarios, prestaciones sociales, vacaciones y cualquier otra remuneración a la que tuviera derecho según el contrato individual de trabajo; con la firma de la presente paz y salvo el trabajador acepta haber recibido a satisfacción los valores liquidados, y declara que el empleador no le adeuda ningún otro concepto y valor relacionado con el contrato de trabajo del cual se declara su terminación de la relación laboral.

Sin otro particular.

DANIEL ANDRES AYALA ROJAS
CEDULA: 1.124.818.810

Puerto Gaitán – Meta
311 386 8024
Confisca25@gmail.com

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
NIT 902013442-0

PAZ Y SALVO LABORAL

En el municipio de Puerto Gaitán a los 31 días del mes de marzo del año 2026 se da por terminado el contrato de trabajo celebrado entre la **UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25** con NIT 902.013.442-0 como EMPLEADOR, y el (a) señor (a) **MARÍA FERNANDA PULIDO RODRIGUEZ** identificado (a) con cedula de ciudadanía N° 1.049.653.548 como EMPLEADO, desempeñando el cargo de INGENIERO DE APOYO TÉCNICO.

Donde se procede a liquidar el pago total de salarios, prestaciones sociales, vacaciones y cualquier otra remuneración a la que tuviera derecho según el contrato individual de trabajo; con la firma de la presente paz y salvo el trabajador acepta haber recibido a satisfacción los valores liquidados, y declara que el empleador no le adeuda ningún otro concepto y valor relacionado con el contrato de trabajo del cual se declara su terminación de la relación laboral.

Sin otro particular.

MARÍA FERNANDA PULIDO RODRÍGUEZ
CEDULA: 1.049.653.548

5945

CERTIFICADOS DE CALIDAD

Puerto Gaitán – Meta
311 386 8024
Confisca25@gmail.com

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
NIT 902013442-0

MATERIALES GRANULARES

Puerto Gaitán – Meta
311 386 8024
Confisca25@gmail.com

5947

IQI-1117-2026 INGEQUALITY S.A.S Nit 900972178-7 CO20/962451

Villavicencio, 26 de Marzo de 2026

Señores:
UNION TEMPORAL CONFISCA 25
Ciudad.

Referencia: CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META - CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES PÉTREOS.

Tema: Informe General de control de calidad ensayos para agregado Fino y Grueso usado en la elaboración de Concretos.

Cordial Saludo,

Con la presente estamos haciendo entrega de los resultados finales correspondientes a los ensayos de resistencia a la compresión realizados a las muestras suministradas por ustedes, con el fin de realizar el respectivo control de calidad de los agregados Finos y Gruesos (grava 1/2") usados para la producción de concretos del proyecto en referencia.

La información de los resultados obtenidos se encuentra registrada en el formato IQL-FR-003-015-038-018-021-023-020 perteneciente a INGEQUALITY SAS, donde se referencian: fecha de toma, procedencia, según la información suministrada por Uds., por lo tanto, los resultados obtenidos en los ensayos corresponden exclusivamente a las muestras entregadas al laboratorio.

El presente informe contiene información de todas las muestras de la respectiva orden.

AGREGADO FINO				
TIPO DE ENSAYO	NORMA	VALOR	VAL. ENSAYO	CANTIDAD
ARENAS PARA ELABORACION DE CONCRETOS	INVIAS TABLA 630-1/630-2	ACEPTACION	LABORATORIO	EJECUTADA
Ensayo de Granulometria	INV-E-213	art. 630-2	ver curva	1
Módulo de Finura	INV-E-213	2,3 - 3,1	3,0	1
Solidez, sulfato de Magnesio	INV-E-220	≤15%	0,66%	1
Solidez, sulfato de Sodio	INV-E-220	10%	0,64%	1
Equivalente de Arena	INV-E-133	Min. 60%	82,30%	1
Terrones de arcilla y particulas deleznables	INV-E-211	Max 3%	0,95%	1
Porcentaje de particulas livianas	INV-E-221	Max. 0.5%	0,38%	1
Material que pasa tamiz N° 200	INV-E-214	Max 5%	2,93%	1
Contenido de materia Organica por colorimetria	INV E-212	MAX.3(estándar)	2	1

Calle 25D N°25-86 B. San Marcos, 314 355 4384 - 321 384 8961
E-mail: ingequalitysas@gmail.com / admon.ingequalitysas@gmail.com

N.S.-17497

AGREGADO GRUESO				
TIPO DE ENSAYO	NORMA	VALOR	VAL. ENSAYO	CANTIDAD
GRAVA 1/2" PARA ELABORACION DE CONCRETOS	INVIAS TABLA 630-3/630-4	ACEPTACION	LABORATORIO	EJECUTADA
Ensayo de Granulometria	INV-E-213	art. 630-4	ver curva	1
Desgaste en la maquina de los angeles 500 Rev.	INV-E-218	Max 40%	21,18%	1
Desgaste en la maquina de los angeles 100 Rev.	INV-E-218	Max 8%	4,68%	1
Solidez, sulfato de Magnesio	INV-E-220	≤18%	0,22%	1
Solidez, sulfato de Sodio	INV-E-220	12%	0,17%	1
Terrones de arcilla y particulas deleznables	INV-E-211	Max 3%	0,24	1
Porcentaje de particulas livianas	INV-E-221	Max. 0,5%	0,40%	1
Indice de Alargamiento	INV-E-230	Max. 25,0%	27,46%	1
Indice de Aplanamiento	INV-E-230	Max. 25,0%	25,74%	1

La reproducción, copia, distribución, comunicación pública o transformación no autorizada del contenido de este informe constituye una infracción a los derechos patrimoniales y morales de autor protegidos por la Ley 23 de 1982 y la Decisión Andina 351 de 1993, así como por el Código Penal Colombiano en su artículo 270. INGEQUALITY S.A.S. se reserva el derecho de iniciar acciones legales civiles y penales contra quienes incurran en actos de plagio o uso indebido de este documento, incluyendo la solicitud de indemnización por perjuicios, medidas cautelares y sanciones contempladas en la legislación vigente.

Estamos a su disposición para aclarar cualquier duda,

Atentamente,

JUAN DIEGO TRUJILLO LADINO
Ingeniero Civil
M.P. 25202-336555 CND

En caso de presentarse alguna PQR ó producto no conforme, dirigirla al correo ingequalitysascalidad@gmail.com para ser atendida.

Calle 25D N°25-86 B. San Marcos, 314 355 4384 - 321 384 8961
E-mail: ingequalitysas@gmail.com / admon.ingequalitysas@gmail.com

AGREGADO FINO

Calle 25D N°25-86 B. San Marcos, 314 355 4384 - 321 384 8961
E-mail. ingequalitysas@gmail.com / admon.ingequalitysas@gmail.com

IQI-1117-2026
INGEQUALITY S.A.S
ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONTROL DE CALIDAD
Nit 900972178-7
SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS CO20/962451

Codigo:	IQL-FR-001
Version:	02
Fecha:	30/09/2019
Pagina:	1 de 1

CLASIFICACIÓN

HUMEDAD INV E-122 -13/ GRANULOMETRIA INV-E 123-13

LIMITES DE CONSISTENCIA INV E -124 /125 -13

INGEQUALITY S.A.S

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – META – CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES PÉTREOS".		
CLIENTE:	UNION TEMPORAL CONFISCA 23	NUMERO DE SERVICIO:	17497
LOCALIZACION:	MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META	NUMERO DE INFORME:	IQI-1117-26
FECHA RECIBO:	10 de marzo de 2026	FECHA INFORME:	26 de marzo de 2026
DESCRIPCION DEL MATERIAL:	ARENA DE GRANO MEDIO, COLOR GRIS.	TIPO DE MUESTRA:	CONCRETO
OBSERVACIONES:	MATERIAL PARA LA PRODUCCION DE CONCRETOS	ESPECIFICACION TECNICA:	ARENA

LIMITE LIQUIDO				LIMITE PLASTICO			TARA (gr)
N° Golpes	0	0	0				
N° Recip.				N° Recip.			F2
W. Hum.	0,0	0,0	0,0	W. Hum.	0,0	0,0	1584,5
W.Sec.	0,0	0,0	0,0	W.Sec.	0,0	0,0	1531,2
W.Rec.	4,6	4,5	4,6	W.Rec.	4,5	4,6	122,5
Humed.	0,0%	0,0%	0,0%	Humed.	0,0%	0,0%	3,78%

VALORES		Muestra seca (gr)	1408,70
LIMITE LIQUIDO (%)	0,00	W+ Des. Lav. (gr)	1367,40
LIMITE PLASTICO (%)	0,00	SUMAS	1400,00
INDICE PLASTICIDAD(%)	0,00	% Error:	0,19%
GRAVA	7,32%	% PASA TAMIZ N°200	2,93%
ARENA	85,28%	CU	7,37
FINOS	7,19%	CC	0,68

NORMA		TAMIZ	TAMIZ	PESO (gr)	RETENIDO	% RET. ACUM.	% PASA
INV-630-2		Pulg.	(mm)				
ARENA							
Lim Inf.	Lim Sup						
100	100	1"	25,0	0,0	-	-	100,0
100	100	3/4"	19,0	0,0	-	-	100,0
100	100	1/2"	12,5	0,0	-	-	100,0
100	100	3/8"	9,50	0,0	-	-	100,0
95	100	N°4	4,75	105,8	7,5	7,5	92,5
80	100	N°8	2,36	284,7	20,2	27,8	72,2
50	85	N°16	1,18	201,3	14,3	42,1	57,9
25	60	N°30	0,60	184,5	13,1	55,2	44,8
10	30	N° 50	0,30	321,5	22,9	78,1	21,9
2	10	N° 100	0,15	207,1	14,7	92,8	7,2
		FONDO		101,1	7,2	100,0	
		SUMAS		1406,00	100,0		
TAMAÑO MAXIMO:		3/8"	TAM. MAX. NOM.		N°4	M. F.	3,0

Sistema unificado de clasificación de suelos (S.U.C.S.)

Suelo de particulas gruesas.(Nomenclatura con simbolo doble).

Arena mal graduada con limo con grava SP SM

Clasificación AAHSTO


Material granular

Excelente a bueno como subgrado


A-1-a Fragmentos de roca, grava y arena

T.MAXIMO	3/8"	T.MAX NOMINAL	N°4


GRÁFICA GRANULOMETRICA

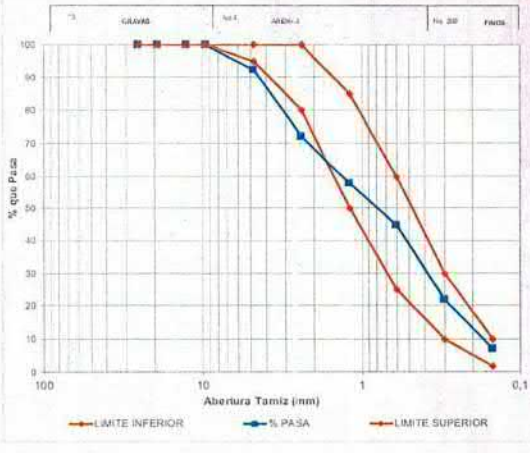

Clasificación fracción limoso-arcillosa (AAHSTO)

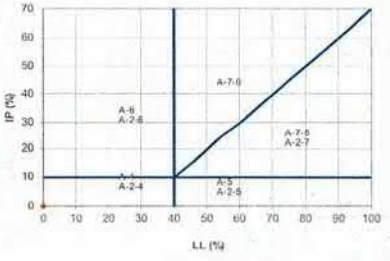

Ábaco de Casagrande



PORCENTAJE DE AGREGADOS		
GRAVA	ARENA	FINOS
7,32%	85,28%	7,19%



La información aquí reportada pertenece únicamente a la muestra analizada y no podrá ser reproducida parcial o totalmente sin la autorización escrita de INGEQUALITY SAS

ELABORO	FIRMA :	REVISO	FIRMA :
	NOMBRE : JAMES ANTONIO HERRERA		NOMBRE : ING. JUAN DIEGO TRUJILLO
	CARGO : AUX. DE LABORATORIO		CARGO : GERENTE TECNICO

Calle 25D N°25-86 B. San Marcos, 314 355 4384 - 321 384 8961
E-mail: ingequalitysas@gmail.com / admon.ingequalitysas@gmail.com

N.S-17497

5951

IQI-1117-2026

INGEQUALITY S.A.S
ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONTROL DE CALIDAD
Nit 900972178-7

ISO 9001 SYSTEM CERTIFICATION SGS CO20/962451

Codigo:	IQL-FR-007
Version:	02
Fecha:	30/09/2019
Pagina:	1 de 1

PRESENCIA DE IMPUREZAS ORGÁNICAS EN ARENAS USADAS PARA LA PREPARACIÓN DE MORTEROS O CONCRETOS

INV-E-213

INGEQUALITY S.A.S

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – META – CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES PÉTREOS".				
CLIENTE:	UNION TEMPORAL CONFISCA 25	NUMERO DE SERVICIO :	17497		
LOCALIZACION:	MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – META	NUMERO DE INFORME :	IQI-1117-26		
FECHA RECIBO:	10 de marzo de 2026	FECHA INFORME:	26 de marzo de 2026		
DESCRIPCION :	ARENA DE GRANO MEDIO, COLOR GRIS.	TIPO DE MUESTRA	SUELO	CONCRETO	PAVIMENTO
OBSERVACIONES:	MATERIAL PARA LA PRODUCCION DE CONCRETOS			X	

DESCRIPCIÓN DEL COLOR	COLOR	COLOR GARDNER ESTANDAR	PLACA ORGANICA No.
Color de la solución		5	1
Amarillo claro		8	2
Amarillo		11	3(estandar)
Naranja		14	4
Ambar		16	5

RESULTADO LABORATORIO		8	2

OBSERVACIONES: _____

La información aquí reportada pertenece unicamente a la muestra analizada y no podrá ser reproducida parcial o totalmente sin la autorización escrita de INGEQUALITY SAS

ELABORO	FIRMA :		REVISO	FIRMA :	
	NOMBRE :	JAMES ANTONIO HERRERA		NOMBRE :	ING. JUAN DIEGO TRUJILLO
	CARGO :	AUX. DE LABORATORIO		CARGO :	GERENTE TECNICO

Calle 25D N°25-86 B. San Marcos, 314 355 4384 - 321 384 8961
E-mail: ingequalitysas@gmail.com / admon.ingequalitysas@gmail.com

N.S. 17497

Codigo:	IQI- FR-038
Version:	02
Fecha:	30/09/2019
Pagina:	1 de 1

PERDIDA EN ENSAYO DE SOLIDEZ EN SULFATO DE MAGNESIO Y SODIO INV-E-220

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – META – CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES PETREOS".

CLIENTE:	UNION TEMPORAL CONFISCA 25	NUMERO DE SERVICIO :	17497
LOCALIZACION:	MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN META	NUMERO DE INFORME	IQI- 1117- 26
FECHA RECIBIDO	10 de marzo de 2026	FECHA INFORME	26 -mar.- 26
DESCRIPCION:	ARENA DE GRANO MEDIO, COLOR GRIS		
OBSERVACIONES:	MATERIAL PARA LA PRODUCCION DE CONCRETOS		

AGREGADO GRUESO

CALCULO DE LA PERDIDA MEDIA		GRANULO	MAGNESIO	SODIO
TAMICES		GRANULO	% PERDIDA	% PERDIDA
mm	pulg	INICIAL	CORREGIDA	CORREGIDA
50,0	2"	N.A	N.A	N.A
37,5	1 1/2"	N.A	N.A	N.A
25,0	1"	N.A	N.A	N.A
19,0	3/4"	N.A	N.A	N.A
12,5	1/2"	N.A	N.A	N.A
9,51	3/8"	N.A	N.A	N.A
4,750	Nº 4	N.A	N.A	N.A
		TOTAL	N.A	N.A

AGREGADO FINO

CALCULO DE LA PERDIDA MEDIA		GRANULO	MAGNESIO	SODIO
TAMICES		GRANULO	% PERDIDA	% PERDIDA
mm	pulg	INICIAL	CORREGIDA	CORREGIDA
4,75	Nº 4	10,6	0,08	0,072
2,36	Nº 8	8,8	0,14	0,069
1,18	Nº 16	13,0	0,25	0,228
0,60	Nº 30	7,1	0,05	0,034
0,300	Nº 50	8,7	0,14	0,239
		TOTAL	0,66	0,64

SULFATO DE MAGNESIO					
TAMICES		PESO NORMA	PESO REAL	PESO TAMIZ	PESO TAMIZ
mm	pulg	grs	ENSAYO (grs)	INFERIOR (grs)	INFERIOR (%)
de 4,75 a 9,51	de Nº4 a 3/8"	300 + ó - 5	0,0	0,0	N.A
de 9,51 a 12,5	de 3/8" a 1/2"	330 + ó - 5	0,0	0,0	N.A
de 12,5 a 19,0	de 1/2" a 3/4"	670 + ó - 10	0,0	0,0	N.A
de 19,0 a 25,0	de 3/4 " a 1"	500 + ó - 30	0,0	0,0	N.A
de 25,0 a 37,5	de 1 " a 1 1/2"	1000 + ó - 50	0,0	0,0	N.A
de 37,5 a 50,0	de 1 1/2" a 2"	2000 + ó - 200	0,0	0,0	N.A
Valor perdida media por acción del Sulfato de Magnesio-					N.A

SULFATO DE MAGNESIO					
TAMICES		PESO NORMA	PESO REAL	PESO TAMIZ	PESO TAMIZ
mm	pulg	grs	ENSAYO (grs)	INFERIOR (grs)	INFERIOR (%)
de 4,75 a 9,51	de Nº4 a Nº30	100 + ó - 5	102,1	100,5	1,57
de 9,51 a 12,5	de Nº16 a Nº30	100 + ó - 5	100,1	99,4	0,70
de 12,5 a 19,0	de Nº8 a Nº16	100 + ó - 5	103,6	101,6	1,93
de 19,0 a 25,0	de Nº4 a Nº8	100 + ó - 5	102,9	101,3	1,55
de 25,0 a 37,5	de Nº3/8 a Nº4	100 + ó - 5	101,4	100,6	0,79
Valor perdida media por acción del Sulfato de Magnesio-					0,66%

SULFATO DE SODIO					
TAMICES		PESO NORMA	PESO REAL	PESO TAMIZ	PESO TAMIZ
mm	pulg.	grs	ENSAYO (grs)	INFERIOR (grs)	INFERIOR (%)
de 4,75 a 9,51	de Nº4 a 3/8"	300 + ó - 5	0,0	0,0	N.A
de 9,51 a 12,5	de 3/8" a 1/2"	330 + ó - 5	0,0	0,0	N.A
de 12,5 a 19,0	de 1/2" a 3/4"	670 + ó - 10	0,0	0,0	N.A
de 19,0 a 25,0	de 3/4 " a 1"	500 + ó - 30	0,0	0,0	N.A
de 25,0 a 37,5	de 1 " a 1 1/2"	1000 + ó - 50	0,0	0,0	N.A
de 37,5 a 50,0	de 1 1/2" a 2"	2000 + ó - 200	0,0	0,0	N.A
Valor perdida media por acción del Sulfato de Sodio -					N.A

SULFATO DE SODIO					
TAMICES		PESO NORMA	PESO REAL	PESO TAMIZ	PESO TAMIZ
mm	pulg.	grs	ENSAYO (grs)	INFERIOR (grs)	INFERIOR (%)
de 4,75 a 9,51	Nº30 a Nº50	100 + ó - 5	102,0	99,2	2,75
de 9,51 a 12,5	Nº16 a Nº30	100 + ó - 5	103,1	102,6	0,48
de 12,5 a 19,0	Nº8 a Nº16	100 + ó - 5	102,3	100,5	1,76
de 19,0 a 25,0	Nº4 a Nº8	100 + ó - 5	101,4	100,6	0,78
de 25,0 a 37,5	3/8" a Nº4	100 + ó - 5	102,2	101,5	0,68
Valor perdida media por acción del Sulfato de Sodio -					0,64%

OBSERVACIONES: NINGUNA

La información aquí reportada pertenece unicamente a la muestra analizada y no podrá ser reproducida parcial o totalmente sin la autorización escrita de INGEQUALITY SAS

ELABORO	FIRMA :		REVISO	FIRMA :	
	NOMBRE :	JAMES ANTONIO HERRERA		NOMBRE :	ING JUAN DIEGO TRUJILLO
	CARGO :	AUXILIAR DE LABORATORIO		CARGO :	GERENTE TECNICO

Calle 25D N°25-86 B. San Marcos, 314 355 4384 - 321 384 8961
E-mail. ingequalitysas@gmail.com / admon.ingequalitysas@gmail.com

5953

IQI-1117-2026

INGEQUALITY S.A.S
ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONTROL DE CALIDAD
Nit 900972178-7

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS CO20/962451

Codigo:	IQL-FR-019
Version:	02
Fecha:	30/09/2019
Pagina:	1 de 1

CALCULO DEL EQUIVALENTE DE ARENA
INV-E-133-13

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÀN - META - CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES PÉTREOS".				
CLIENTE:	UNION TEMPORAL CONFISCA 25	NUMERO DE SERVICIO :	17497		
LOCALIZACION:	MUNICIPIO DE PUERTO GAITÀN - META	NUMERO DE INFORME :	IQI-1117-26		
FECHA RECIBO:	10 de marzo de 2026	FECHA INFORME:	26-mar.-26		
DESCRIPCION:	ARENA DE GRANO MEDIO, COLOR GRIS.	TIPO DE MUESTRA	SUELO	CONCRETO	PAVIMENTO
OBSERVACIONES:	MATERIAL PARA LA PRODUCCION DE CONCRETOS			x	

ENSAYOS	1	2	3
Solución Stock Cone (Sol./Agua)	88 c.c./ 3.785 Lts.	88 c.c./ 3.785 Lts.	88 c.c./ 3.785 Lts.
TIEMPO	25 min.	25 min.	25 min.
LECTURA ARCILLA	5,51	5,57	5,52
LECTURA ARENA	4,58	4,43	4,65
EQUIV. ARENA	83,12	79,53	84,24

PROMEDIO EQUIVALENTE DE ARENA: 82,30

$$\text{EQUIVALENTE DE ARENA} = \frac{\text{LECTURA ARENA}}{\text{LECTURA ARCILLA}} * 100$$

Observaciones : Se realiza mínimo dos veces el ensayo para comprobar los resultados arrojados en las lecturas, y establecer un promedio del ensayo.

La información aquí reportada pertenece únicamente a la muestra analizada y no podrá ser reproducida parcial o totalmente sin la autorización escrita de INGEQUALITY SAS

ELABORO	FIRMA :		REVISO	FIRMA :	
	NOMBRE :	JAMES ANTONIO HERRERA		NOMBRE :	ING. JUAN DIEGO TRUJILLO
	CARGO :	AUX. DE LABORATORIO		CARGO :	GERENTE TECNICO

Calle 25D N°25-86 B. San Marcos, 314 355 4384 - 321 384 8961
E-mail: ingequalitysas@gmail.com / admon.ingequalitysas@gmail.com

N.S. 17497

Codigo:	IQI.-FR-018
Version:	02
Fecha:	30/09/1930
Pagina:	1 de 1

TERRONES DE ARICLLA – PORCENTAJE DE PARTICULAS DELEZNABLES

INV-E-211- 13

INGEQUALITY S.A.S
ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONTROL DE CALIDAD

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – META – CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES PÉTREOS".				
CLIENTE:	UNION TEMPORAL CONFECA 25	NUMERO DE SERVICIO :			17497
LOCALIZACION:	MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – META	NUMERO DE INFORME :			IQI-1117-26
FECHA RECIBO:	10 de marzo de 2026	FECHA INFORME:			26-mar.-26
DESCRIPCION DEL MATERIAL:	ARENA DE GRANO MEDIO, COLOR GRIS.	TIPO DE MUESTRA	SUELO	CONCRETO	PAVIMENTO
OBSERVACIONES:	MATERIAL PARA LA PRODUCCION DE CONCRETOS			X	

MUESTRA N° 1

AGREGADO RETENIDO EN TAMIZ	TAMIZ USADO EN LAVADO	MASA MINIMA DE ENSAYO (gr)	MASA DE LA MUESTRA DE ENSAYO (gr)	MASA DE LA MUESTRA RETENIDA (gr)	TERRONES DE ARCILLA Y PARTICULAS DELEZNABLES (%)
N° 16	No. 20	25	27,8	26,8	3,60
No. 4 – 3/8"	No. 8	1000	1024,2	1012,5	1,14
3/8" – 3/4"	No. 4	2000	0	0	0,00
3/4" – 1½"	No. 4	3000	0	0	0,00
1½"	No. 4	5000	0	0	0,00
CONTENIDO DE TERRONES DE ARCILLA Y PARTICULAS DELEZNABLES EN LA MUESTRA:					0,95

MUESTRA N° 2

AGREGADO RETENIDO EN TAMIZ	TAMIZ USADO EN LAVADO	MASA MINIMA DE ENSAYO (gr)	MASA DE LA MUESTRA DE ENSAYO (gr)	MASA DE LA MUESTRA RETENIDA (gr)	TERRONES DE ARCILLA Y PARTICULAS DELEZNABLES
N° 16	No. 20	25			
No. 4 – 3/8"	No. 8	1000			
3/8" – 3/4"	No. 4	2000			
3/4" – 1½"	No. 4	3000			
1½"	No. 4	5000			
CONTENIDO DE TERRONES DE ARCILLA Y PARTICULAS DELEZNABLES EN LA MUESTRA:					-

La información aquí reportada pertenece únicamente a la muestra analizada y no podrá ser reproducida parcial o totalmente sin la autorización escrita de INGEQUALITY SAS

ELABORO	FIRMA :		REVISO	FIRMA :	
	NOMBRE :	JAMES ANTONIO HERRERA		NOMBRE :	ING. JUAN DIEGO TRUJILLO
	CARGO :	AUX. DE LABORATORIO		CARGO :	GERENTE TECNICO

Calle 25D N°25-86 B. San Marcos, 314 355 4384 – 321 384 8961
E-mail. ingequalitysas@gmail.com / admon.ingequalitysas@gmail.com

Codigo:	IQI-FR-021
Version:	02
Fecha:	30/09/2019
Pagina:	1 de 1

PORCENTAJE DE PARTICULAS LIVIANAS EN AGREGADOS PETREOS INV-E-221-13

INGEQUALITY S.A.S

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – META – CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES PÉTREOS"

CLIENTE:	UNION TEMPORAL CONFISCA 25	NUMERO DE SERVICIO :	17497		
LOCALIZACION:	MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN META	NUMERO DE INFORME :	IQI-1117-26		
FECHA RECIBO:	10 de marzo de 2026	FECHA INFORME:	26 mar. 26		
DESCRIPCION :	ARENA DE GRANO MEDIO, COLOR GRIS	TIPO DE MUESTRA	SUELO	CONCRETO	PAVIMENTO
OBSERVACIONES:	MATERIAL PARA LA PRODUCCION DE CONCRETOS			X	

Peso seco part. retenidas

% PARTICULAS LIVIANAS.- ---------- * 100

Peso muestra seca ret. Tamiz

AGREGADO GRUESO		
ENSAYO	1	2
REACTIVO	Bromoformo y benceno	Bromoformo y benceno
TAMIZ ENSAYO	3/4"	3/4"
PESO SECO DE PARTICULAS RETENIDAS. M_1	-	-
PESO MUESTRA SECA RETENIDA EN EL TAMIZ # 4		
PORCENTAJE DE PARTICULAS LIVIANAS	-	-

PROMEDIO PART.LIV.AGREGADO GRUESO.	-

AGREGADO FINO		
ENSAYO	1	2
REACTIVO	Bromoformo y benceno	Bromoformo y benceno
TAMIZ ENSAYO	N° 4	N° 4
PESO SECO DE PARTICULAS RETENIDAS. M_1	0,22	0,24
PESO MUESTRA SECA RETENIDA EN EL TAMIZ #50	61,13	61,50
PORCENTAJE DE PARTICULAS LIVIANAS	0,36	0,39

PROMEDIO PART.LIV.AGREGADO FINO. -	0,38

Observaciones : Se realiza mínimo dos veces el ensayo para comprobar resultados

La información aquí reportada pertenece unicamente a la muestra analizada y no podrá ser reproducida parcial o totalmente sin la autorización escrita de INGEQUALITY SAS

ELABORO	FIRMA :		REVISO	FIRMA :	
	NOMBRE :	JAMES ANTONIO HERRERA		NOMBRE :	ING. JUAN DIEGO TRUJILLO
	CARGO :	AUX. DE LABORATORIO		CARGO :	GERENTE TECNICO

AGREGADO
GRUESO ½"

Calle 25D N°25-86 B. San Marcos, 314 355 4384 - 321 384 8961
E-mail: ingequalitysas@gmail.com / admon.ingequalitysas@gmail.com

Codigo:	IQL-FR-001
Version:	02
Fecha:	30/09/2019
Pagina:	1 de 1

CLASIFICACIÓN

HUMEDAD INV E-122 -13/ GRANULOMETRIA INV-E 123-13

LIMITES DE CONSISTENCIA INV E -124 /125 -13

INGEQUALITY S.A.S

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META - CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES PÉTREOS".		
CLIENTE:	UNION TEMPORAL CONFISCA 25	NUMERO DE SERVICIO:	17497
LOCALIZACION:	MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – META	NUMERO DE INFORME:	IQI-1117-26
FECHA RECIBO:	10 de marzo de 2026	FECHA INFORME:	26 de marzo de 2026
DESCRIPCION:	GRAVA 1/2", COLOR GRIS, FORMA ANGULAR.	TIPO DE MUESTRA:	CONCRETO
OBSERVACIONES:	MATERIAL PARA LA PRODUCCION DE CONCRETOS	ESPECIFICACION TECNICA:	AG-25

LIMITE LIQUIDO				LIMITE PLASTICO			HUMEDAD
N° Golpes	0	0	0				
N° Recip.				N° Recip.			F
W. Hum.	0,0	0,0	0,0	W. Hum.	0,0	0,0	1588,7
W.Sec.	0,0	0,0	0,0	W.Sec.	0,0	0,0	1578,7
W.Rec.	4,6	4,5	4,6	W.Rec.	4,5	4,6	193,2
Humed.	0,0%	0,0%	0,0%	Humed.	0,0%	0,0%	0,72%

VALORES			
LIMITE LIQUIDO (%)	0,00	Muestra seca (gr)	1383,50
LIMITE PLASTICO (%)	0,00	Wr Des. Lav. (gr)	1383,60
INDICE PLASTICIDAD(%)	0,00	SUMAS	1375,30
GRAVA	86,51%	% Error	0,74%
ARENA	12,64%	% PASA TAMIZ N°200	0,14%
FINOS	0,85%	C.U	1,87
		C.C	1,07

NORMA		TAMIZ	TAMIZ	PESO RETENIDO PARCIAL	% RETENIDO PARCIAL	% RET. ACUM.	% PASA
INV-630-4		Pulg.	(mm)				
AG-25							
Lim Inf.	Lim Sup.						
100	100	3/4"	19,00	0,0	-	-	100,0
90	100	1/2"	12,50	12,0	0,9	0,9	99,1
40	70	3/8"	9,50	136,1	9,9	10,8	89,2
0	15	N° 4	4,75	1041,7	75,7	86,5	13,5
0	5	N° 8	2,36	173,8	12,6	99,1	0,9
		FONDO		11,7	0,9	100,0	-
		SUMAS		1375,30	100,0		

Sistema unificado de clasificación de suelos (S.U.C.S.)

Suelo de particulas gruesas. Suelo limpio.

Grava mal graduada GP

Clasificación AAHSTO


Material granular

Excelente a bueno como subgrado

A-3 Arena fina

T.MAXIMO	1"	T.MAX.NOMINAL	3/4"

Clasificación fracción limoso-arcillosa (AAHSTO)



GRÁFICA GRANULOMETRICA



Ábaco de Casagrande



PORCENTAJE DE AGREGADOS		
GRAVA	ARENA	FINOS
86,51%	12,64%	0,85%



La información aquí reportada pertenece únicamente a la muestra analizada y no podrá ser reproducida parcial o totalmente sin la autorización escrita de INGEQUALITY SAS

ELABORO	FIRMA:	REVISO	FIRMA:
	NOMBRE: JAMES ANTONIO HERRERA		NOMBRE: ING. JUAN DIEGO TRUJILLO
	CARGO: AUX. DE LABORATORIO		CARGO: GERENTE TECNICO

Calle 25D N°25-86 B. San Marcos, 314 355 4384 - 321 384 8961
E-mail: ingequalitysas@gmail.com / admon.ingequalitysas@gmail.com

Codigo:	IQL-ER-015
Version:	02
Fecha:	30/09/2019
Pagina:	1 de 1

DESGASTE EN LA MAQUINA DE LOS ANGELES
INV-E-218 /219 - 13

INGEQUALITY S.A.S

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META - CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES PETREOS"		
CLIENTE:	UNION TEMPORAL CONFISCA 25	NUMERO DE SERVICIO :	17497
LOCALIZACION:	MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META	NUMERO DE INFORME :	IQI-1117-2
FECHA RECIBO:	10 de marzo de 2026	FECHA INFORME:	26 mar -26
DESCRIPCION:	GRAVA 1/2", COLOR GRIS, FORMA ANGULAR	TIPO DE MUESTRA: SUELO / CONCRETO / PAVIMENTO	/ X /
OBSERVACIONES:	MATERIAL PARA LA PRODUCCION DE CONCRETOS		

DETERMINACION DE FRANJA - TAMAÑA MAXIMO DEL AGREGADO

TAMIZADO		PESO Y GRADUACION DE LA MUESTRA grs						
PASA	RETIENE	A	B	C	D	E	F	G
3"	2 1/2"					2500		
2 1/2"	2"					2500		
2"	1 1/2"					5000	5000	
1 1/2"	1"	1250					5000	5000
1"	3/4"	1250						5000
3/4"	1/2"	1250	2500					
1/2"	3/8"	1250	2500					
3/8"	# 3			2500				
# 3	# 4			2500				
# 4	# 8				5000			
Número de Esferas		12	11	8	6	12	12	12
Número de revoluciones		500	500	500	500	1000	1000	1000

ENSAYOS	1	2					
REVOLUCIONES	100	500					
MATERIAL	GRAVA 3/4"	GRAVA 3/4"					
GRADACION USADA	B	B					
Pa grs.	5000	5000					
Pb grs.	4766	3941					
DESGASTE %	4.68%	21.18%					
ESPECIFICACION %	<8%	<40%					

$$\text{Desgaste \%} = \frac{Pa - Pb}{Pa} * 100$$

Pa = Peso de la muestra seca antes del ensayo

Pb = Peso de la muestra seca después del ensayo y despúes de lavar sobre tamiz No. 12

Observaciones: _____

La información aquí reportada pertenece unicamente a la muestra analizada y no podrá ser reproducida parcial o totalmente sin la autorización escrita de INGEQUALITY SAS

ELABORO	FIRMA :		REVISO	FIRMA :	
	NOMBRE :	JAMES ANTONIO HERRERA		NOMBRE :	ING. JUAN DIEGO TRUJILLO
	CARGO :	AUX. DE LABORATORIO		CARGO :	GERENTE TECNICO

Calle 25D N°25-86 B. San Marcos, 314 355 4384 - 321 384 8961
E-mail. ingequalitysas@gmail.com / admon.ingequalitysas@gmail.com

N.S. 17497

Codigo:	IQI-FR-036
Version:	02
Fecha:	30/09/2019
Pagina:	1 de 1

PERDIDA EN ENSAYO DE SOLIDEZ EN SULFATO DE MAGNESIO Y SODIO INV-E-220

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES PÉTREOS"

CLIENTE:	UNION TEMPORAL CONFISCA 25	NUMERO DE SERVICIO :	17497
LOCALIZACION:	MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META	NUMERO DE INFORME :	IQI-1117-26
FECHA RECIBIDO	10 de marzo de 2026	FECHA INFORME	26-mar.-26
DESCRIPCION:	GRAVA 1/2", COLOR GRIS, FORMA ANGULAR		
OBSERVACIONES:	MATERIAL PARA LA PRODUCCION DE CONCRETOS		

AGREGADO GRUESO

CALCULO DE LA PERDIDA MEDIA			MAGNESIO	SODIO
TAMICES		% QUE PASA	% PERDIDA	% PERDIDA
mm	pulg	ENSAYO	CORREGIDO	CORREGIDO
		0,0	0,00	0,000
		0,0	0,00	0,000
		0,0	0,00	0,000
		7,7	0,00	0,000
		75,3	0,12	0,089
		15,0	0,09	0,063
		1,1	0,00	0,014
		TOTAL	0,22	0,17

AGREGADO FINO

CALCULO DE LA PERDIDA MEDIA			MAGNESIO	SODIO
TAMICES		% QUE PASA	% PERDIDA	% PERDIDA
mm	pulg	ENSAYO	CORREGIDO	CORREGIDO
4,75	Nº 4	-	-	-
2,36	Nº 8	-	-	-
1,18	Nº 16	-	-	-
0,600	Nº 30	-	-	-
0,300	Nº 50	-	-	-
		TOTAL	0,00	0,00

SULFATO DE MAGNESIO

TAMICES		PESO NORMA	PESO REAL	PESO TAMIZ	PESO TAMIZ
mm	pulg	grs	ENSAYO (grs)	INFERIOR (grs)	INFERIOR (%)
de 4,75 a 9,51	de Nº4 a 3/8"	300 + ó - 5	304,2	303,2	0,33
de 9,51 a 12,5	de 3/8" a 1/2"	330 + ó - 5	332,5	330,4	0,63
de 12,5 a 19,0	de 1/2" a 3/4"	670 + ó - 10	671,5	670,4	0,16
de 19,0 a 23,0	de 3/4 " a 1"	500 + ó - 30	0,0	0,0	0,00
de 23,0 a 37,5	de 1 " a 1 1/2"	1000 + ó - 50	0	0	0,00
de 37,5 a 50,0	de 1 1/2" a 2"	2000 + ó - 200	0	0	0,00
			0	0	0,00

Valor perdida media por acción del Sulfato de Magnesio- 0,22%

SULFATO DE MAGNESIO

TAMICES		PESO NORMA	PESO REAL	PESO TAMIZ	PESO TAMIZ
mm	pulg	grs	ENSAYO (grs)	INFERIOR (grs)	INFERIOR (%)
de 4,75 a 9,51	Nº4 a 3/8"	100 + ó - 5	-	-	-
de 9,51 a 12,5	3/8" a 1/2"	100 + ó - 5	-	-	-
de 12,5 a 19,0	1/2" a 3/4"	100 + ó - 5	-	-	-
de 19,0 a 23,0	3/4 " a 1"	100 + ó - 5	-	-	-
de 23,0 a 37,5	1 " a 1 1/2"	100 + ó - 5	-	-	-

Valor perdida media por acción del Sulfato de Magnesio- 0,00%

SULFATO DE SODIO

TAMICES		PESO NORMA	PESO REAL	PESO TAMIZ	PESO TAMIZ
mm	pulg	grs	ENSAYO (grs)	INFERIOR (grs)	INFERIOR (%)
de 4,75 a 9,51	de Nº4 a 3/8"	300 + ó - 5	302,1	298,2	1,29
de 9,51 a 12,5	de 3/8" a 1/2"	330 + ó - 5	332,0	330,6	0,42
de 12,5 a 19,0	de 1/2" a 3/4"	670 + ó - 10	674,3	673,5	0,12
de 19,0 a 23,0	de 3/4 " a 1"	500 + ó - 30	0,0	0,0	0,00
de 23,0 a 37,5	de 1 " a 1 1/2"	1000 + ó - 50	0	0	0,00
de 37,5 a 50,0	de 1 1/2" a 2"	2000 + ó - 200	0	0	0,00

Valor perdida media por acción del Sulfato de Sodio - 0,17%

SULFATO DE SODIO

TAMICES		PESO NORMA	PESO REAL	PESO TAMIZ	PESO TAMIZ
mm	pulg	grs	ENSAYO (grs)	INFERIOR (grs)	INFERIOR (%)
de 4,75 a 9,51	Nº30 a Nº30	100 + ó - 5			
de 9,51 a 12,5	Nº16 a Nº30	100 + ó - 5			
de 12,5 a 19,0	Nº8 a Nº16	100 + ó - 5	-	-	-
de 19,0 a 23,0	Nº4 a Nº8	100 + ó - 5	-	-	-
de 23,0 a 37,5	3/8" a Nº4	100 + ó - 5	-	-	-

Valor perdida media por acción del Sulfato de Sodio - 0,00%

OBSERVACIONES: NINGUNA

La información aquí reportada pertenece unicamente a la muestra analizada y no podrá ser reproducida parcial o totalmente sin la autorización escrita de INGEQUALITY SAS

ELABORO	FIRMA :		REVISO	FIRMA :	
	NOMBRE :	JAMES ANTONIO HERRERA		NOMBRE :	ING. JUAN DIEGO PUERTO
	CARGO :	AUXILIAR DE LABORATORIO		CARGO :	GERENTE TECNICO

Calle 25D N°25-86 B. San Marcos, 314 355 4384 - 321 384 8961
E-mail: ingequalitysas@gmail.com / admon.ingequalitysas@gmail.com

5960

Codigo:	IQI. FR. 018
Version:	02
Fecha:	30/09/2019
Pagina:	1 de 1

PORCENTAJE DE PARTICULAS DELEZNABLES

INV-E-211- 13

INGEQUALITY S.A.S

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – META – CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES PÉTREOS".				
CLIENTE:	UNION TEMPORAL CONFISCA 23	NUMERO DE SERVICIO :			17497
LOCALIZACION:	MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – META	NUMERO DE INFORME :			IQI-1117-26
FECHA RECIBO:	10 de marzo de 2026	FECHA INFORME:			26-mar.-26
DESCRIPCION :	GRAVA 1/2", COLOR GRIS, FORMA ANGULAR.	TIPO DE MUESTRA	SUELO	CONCRETO	PAVIMENTO
OBSERVACIONES:	MATERIAL PARA LA PRODUCCION DE CONCRETOS			X	

MUESTRA Nº 1

AGREGADO PASA MALLA No. (mm)	AGREGADO RETENIDO MALLA No.	MASA MINIMA DE ENSAYO (g)	MASA DE LA MUESTRA DE ENSAYO (g)	MASA DE LA MUESTRA SECADA (g)	TERRONES DE ARCILLA Y PARTICULAS DELEZNABLES (%)
Nº 16	No. 20	25	0	0	0,00
No. 4 – 3/8"	No. 8	1000	1021,2	1013,2	0,78
3/8" – 3/4"	No. 4	2000	2025,2	2016,4	0,43
3/4" – 1½"	No. 4	5000	0	0	0,00
1½"	No. 4	5000	0	0	0,00
CONTENIDO DE TERRONES DE ARCILLA Y PARTICULAS DELEZNABLES EN LA MUESTRA:					0,24

MUESTRA Nº 2

AGREGADO PASA MALLA No. (mm)	AGREGADO RETENIDO MALLA No.	MASA MINIMA DE ENSAYO (g)	MASA DE LA MUESTRA DE ENSAYO (g)	MASA DE LA MUESTRA RETENIDO (g)	TERRONES DE ARCILLA Y PARTICULAS DELEZNABLES
Nº 16	No. 20	25			
No. 4 – 3/8"	No. 8	1000			
3/8" – 3/4"	No. 4	2000			
3/4" – 1½"	No. 4	5000			
1½"	No. 4	5000			
CONTENIDO DE TERRONES DE ARCILLA Y PARTICULAS DELEZNABLES EN LA MUESTRA:					-

La información aquí reportada pertenece unicamente a la muestra analizada y no podrá ser reproducida parcial o totalmente sin la autorización escrita de INGEQUALITY SAS

ELABORO	FIRMA :		REVISO	FIRMA :	
	NOMBRE :	JAMES ANTONIO HERRERA		NOMBRE :	ING. JUAN DIEGO TRUJILLO
	CARGO :	AUX. DE LABORATORIO		CARGO :	GERENTE TECNICO

Calle 25D N°25-86 B. San Marcos, 314 355 4384 - 321 384 8961
E-mail: ingequalitysas@gmail.com / admon.ingequalitysas@gmail.com

N.S.-17497

Codigo.	IQL-FR-021
Version.	02
Fecha.	30/09/2019
Pagina.	1 de 1

PORCENTAJE DE PARTICULAS LIVIANAS EN AGREGADOS PETREOS

INV-E-221-13

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – META – CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES PÉTREOS".

CLIENTE:	UNION TEMPORAL CONFISCA 25	NUMERO DE SERVICIO :	17497
LOCALIZACION:	MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META	NUMERO DE INFORME :	IQI-1117-26
FECHA RECIBO:	10 de marzo de 2026	FECHA INFORME:	26 -mar.-26
DESCRIPCION :	GRAVA 1/2", COLOR GRIS, FORMA ANGULAR.	TIPO DE MUESTRA	SUELO: / CONCRETO: x / PAVIMENTO:
OBSERVACIONES:	MATERIAL PARA LA PRODUCCION DE CONCRETOS		

$$\% \text{ PARTICULAS LIVIANAS.-} = \frac{\text{Peso seco part. retenidas}}{\text{Peso muestra seca ret. Tamiz}} * 100$$

AGREGADO GRUESO		
ENSAYO	1	2
REACTIVO	Bromoformo y benceno	Bromoformo y benceno
TAMIZ ENSAYO	3/4"	3/4"
PESO SECO DE PARTICULAS RETENIDAS. M_1	0.62	0,66
PESO MUESTRA SECA RETENIDA EN EL TAMIZ # 4	152,40	164,50
PORCENTAJE DE PARTICULAS LIVIANAS	0.41	0,40

PROMEDIO PART.LIV AGREGADO GRUESO. -	0,40

AGREGADO FINO		
ENSAYO	1	2
REACTIVO	Bromoformo y benceno	Bromoforma y benceno
TAMIZ ENSAYO	N° 4	N° 4
PESO SECO DE PARTICULAS RETENIDAS. M_1		
PESO MUESTRA SECA RETENIDA EN EL TAMIZ #50		
PORCENTAJE DE PARTICULAS LIVIANAS		

PROMEDIO PART.LIV.AGREGADO FINO. -	

Observaciones : Se realiza mínimo dos veces el ensayo para comprobar resultados

La información aquí reportada pertenece unicamente a la muestra analizada y no podrá ser reproducida parcial o totalmente sin la autorización escrita de INGEQUALITY SAS

ELABORO	FIRMA :		REVISO	FIRMA :
	NOMBRE :	JAMES ANTONIO HERRERA		NOMBRE : ING. JUAN DIEGO TRUJILLO
	CARGO :	AUX. DE LABORATORIO		CARGO : GERENTE TECNICO

Calle 25D N°25-86 B. San Marcos, 314 355 4384 - 321 384 8961
E-mail. ingequalitysas@gmail.com / admon.ingequalitysas@gmail.com

5962

IQI-1117-2026

INGEQUALITY S.A.S
ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONTROL DE CALIDAD
Nit 900972178-7

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS CO20/962451

Codigo.	IQL-FR-023
Version.	02
Fecha.	30/09/2019
Pagina.	1 de 1

INDICE DE ALARGAMIENTO Y APLANAMIENTO

INV-E-230-13

INGEQUALITY S.A.S

PROYECTO.	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META - CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES PÉTREOS"				
CLIENTE.	UNION TEMPORAL CONTSCA 25	NUMERO DE SERVICIO.	17497		
LOCALIZACION.	MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META	NUMERO DE INFORME.	IQI-1117-26		
FECHA RECIBO.	10 de marzo de 2026	FECHA INFORME	26-mar.-26		
DESCRIPCION DEL MATERIAL	GRAVA 1/2", COLOR GRIS, FORMA ANGULAR	TIPO DE MUESTRA	SUELO	CONCRETO	PAVIMENTO
OBSERVACIONES.	MATERIAL PARA LA PRODUCCION DE CONCRETOS			X	

DATOS GENERALES			APLANAMIENTO		
TAMAÑO DEL TAMIZ (mm)		% RET. GRANULOMETRIA INICIAL (A)	PESO DE LA MUESTRA TOTAL (B)	PESO DE LA MUESTRA RETENIDA (C)	INDICE DE APLANAMIENTO (C/B)*100
PASA TAMIZ	RETENIDO EN TAMIZ				
2 1/2"	2"	0,00	0,00	0,00	0,00%
2"	1 1/2"	0,00	0,00	0,00	0,00%
1 1/2"	1"	0,00	0,00	0,00	0,00%
1"	3/4"	0,87	0,00	0,00	0,00%
3/4"	1/2"	9,90	0,00	0,00	0,00%
1/2"	3/8"	75,74	500,30	156,00	31,18%
3/8"	1/4"	12,64	208,90	35,00	16,75%
		98,47			
				Indice Aplanamiento total -	25,74%

DATOS GENERALES			APLANAMIENTO		
TAMAÑO DEL TAMIZ (mm)		% RET. GRANULOMETRIA INICIAL (A)	PESO DE LA MUESTRA TOTAL (B)	PESO DE LA MUESTRA RETENIDA (C)	INDICE DE ALARGAMIENTO (C/B)*100
PASA TAMIZ	RETENIDO EN TAMIZ				
2 1/2"	2"	0,00	0,00	0,00	0,00%
2"	1 1/2"	0,00	0,00	0,00	0,00%
1 1/2"	1"	0,00	0,00	0,00	0,00%
1"	3/4"	0,87	0,00	0,00	0,00%
3/4"	1/2"	9,90	0,00	0,00	0,00%
1/2"	3/8"	75,74	500,30	143,60	28,70%
3/8"	1/4"	12,64	208,90	94,50	45,24%
		98,47			
				Indice Alargamiento total -	27,46%

Observaciones :

La información aquí reportada pertenece unicamente a la muestra analizada y no podrá ser reproducida parcial o totalmente sin la autorización escrita de INGEQUALITY SAS

ELABORO	FIRMA .		REVISO	FIRMA .	
	NOMBRE .	JAMES ANTONIO HERRERA		NOMBRE .	ING. JUAN DIEGO TRUJILLO
	CARGO .	AUX. DE LABORATORIO		CARGO .	GERENTE TECNICO

Calle 25D N°25-86 B. San Marcos, 314 355 4384 - 321 384 8961
E-mail. ingequalitysas@gmail.com / admon.ingequalitysas@gmail.com

N.S. 17497

5963

CEMENTO

Puerto Gaitán – Meta
311 386 8024
Confisca25@gmail.com

5964

REPORTE DE CALIDAD DE PRODUCTO

Tequendama

Fecha: 25/06/18	Versión: 6	Código: FR.CC.34	Página 1 de 4

MES: Julio 2026

CEMENTO: ■ TIPO UG ☐ TIPO ART

REQUISITOS FÍSICOS-MÉCANICOS	MÉTODO DE ENSAYO	ESPECIFICACIÓN*	INCERTIDUMBRE	CEMENTOS TEQUENDAMA S.A.S
Finura Blaine, m^2/kg	NTC 33	No especifica	0,36	366
Densidad (g/cm^3)	NTC 221	No especifica	0,03	2,92
Finura Tamiz 45µm (No. 325). %	NTC 294	No especifica	0,4	94,0
Tiempo de fraguado inicial, no menos de, minutos	NTC 118	No menos de 45	8,17	192
Tiempo de fraguado inicial, no más de, minutos	NTC 118	No más de 420		
Tiempo de fraguado final, minutos	NTC 118	No especifica	3,48	282
Resistencia a la compresión, a 1 día, MPa	NTC 220	No especifica	1,01	5,1
Resistencia a la compresión, a 3 días, MPa		Mínimo 8,0	0,31	10,9
Resistencia a la compresión, a 7 días, MPa		Mínimo 15,0	0,94	15,9
Resistencia a la compresión, a 28 días, MPa ***		Mínimo 24,0	0,73	25,8

Nota:

*Los requisitos físicos definidos en la norma NTC-121 , para cemento Tipo UG.

*Las condiciones ambientales estan controladas de acuerdo con las normas referenciadas en este informe.

***Los datos reportados corresponden al promedio mes de Junio

*El muestreo se realizó de acuerdo a lo establecido en el Plan de Inspección y Ensayo "PL.CC.01"

Liliana Becerra R.

Liliana Becerra Romero

GERENTE DE CALIDAD E INNOVACIÓN

Email: lbecerra@cetesa.com.co

3212685712

Vereda Chitiva, Abajo Finca La María

Suesca, Cundinamarca

Fin del Informe

5965

Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according to ISO/IEC 17067) for:

CEMENTO HIDRÁULICO TIPOS UG Y ART

Fabricado por **CEMENTOS TEQUENDAMA S.A.S.** en la **Carrera 11 No. 75 - 19, Bogotá; , Cundinamarca, Colombia** identificada con **número de NIT 830.099.238-2**

Manufactured by **CEMENTOS TEQUENDAMA S.A.S.** in the **Carrera 11 No. 75 - 19, Bogotá, Cundinamarca, Colombia** identified with **NIT number830.099.238-2**

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

NTC 121 (2023)

Especificación de desempeño para cemento hidráulico
Performance specification for hydraulic cement
SECTOR ICS: 91.100.10

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "R-PS-0019 Reglamento para la certificación de producto tangible", lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity of product is subject to the company's and product's permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the "R-PS-0019 Reglamento para la Certificación de producto tangible" document, which will be verified by ICONTEC.

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certificate

Certificado CSC -CER468310
Certificate

Fecha de Aprobación: Approval Date:	2016-05-27	**Fecha Última Modificación:** Last Modification Date:	2023-08-31
Fecha del Último Vencimiento: Last Expiration Date:	2025-05-26	**Fecha de Restauración:** Restoration Date:	2025-06-18
Fecha del Próximo Vencimiento: Next Expiration Date:	2031-05-26		

La autenticidad del certificado y su alcance se puede consultar al correo electrónico: cliente@icontec.org

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por:
ICONTEC is a certification body accreditated by:

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

F-PS-0628
Versión 01

Este certificado es propiedad de ICONTEC ubicado en la Calle 26N° 69 - 76, Edificio Elemento, torre 4, pisos 9 y 10. Bogotá D.C., Colombia.

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
NIT 902013442-0

ACERO

Puerto Gaitán – Meta
311 386 8024
Confisca25@gmail.com

5967

KAPTAN DEMIR CELIK ENDUSTRISI ve TIC. A.S.

MILL'S TEST CERTIFICATE

Description of Goods
REINFORCING DEFORMED STEEL BARS NTC 2289 GR60W
FOR 6 METERS (+/-50 MM) / 12 METERS (+/-100 MM)

CERTIFICATE NO : 24/066
PAGE : 2/2
DATE : 29.05.2024
REF. : KDC/2024-072/RDB

PROCESS ROUTE EAF/CCM/QST

BAR MARK TR KD SIZE W 60

SIZE (INCH / MM)	Length (Meters)	Heat Number	Number of Bundles		Weight	Mechanical Properties					Chemical Composition on Product												
						Yield Strength	Tensile Strength	Rm / ReH	Elng.	Bend	C	Mn	Si	P	S	Ni	Cr	Mo	Cu	V	B	N	Ceq
					Kg/m	Mpa	Mpa		%	Test	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
(#3) Q 3/8"	6 METERS	24-02649	65		0,534	461	611	1,33	16,4	OK	0,27	0,92	0,15	0,021	0,032	0,13	0,10	0,023	0,39	0,005	0,0001	0,0092	0,44
(#3) Q 3/8"	6 METERS	24-02672	54		0,534	486	643	1,32	14,9	OK	0,27	0,94	0,14	0,032	0,025	0,12	0,15	0,021	0,35	0,006	0,0001	0,0096	0,45
(#3) Q 3/8"	6 METERS	24-02670	110		0,531	471	620	1,32	15,9	OK	0,28	0,94	0,14	0,017	0,016	0,12	0,13	0,019	0,37	0,005	0,0001	0,0093	0,46
(#3) Q 3/8"	6 METERS	24-02667	112		0,529	482	614	1,27	16,0	OK	0,29	0,91	0,16	0,015	0,025	0,11	0,07	0,019	0,34	0,005	0,0001	0,0091	0,46
(#3) Q 3/8"	6 METERS	24-02666	87		0,530	483	626	1,30	15,6	OK	0,28	0,87	0,17	0,021	0,019	0,13	0,10	0,021	0,35	0,005	0,0001	0,0092	0,45
(#3) Q 3/8"	6 METERS	24-02680	38		0,531	481	614	1,28	14,8	OK	0,27	0,92	0,18	0,021	0,035	0,13	0,10	0,021	0,38	0,005	0,0001	0,0095	0,45
(#3) Q 3/8"	6 METERS	24-02665	69		0,527	463	609	1,32	16,7	OK	0,28	0,92	0,17	0,016	0,035	0,12	0,09	0,019	0,37	0,005	0,0001	0,0096	0,45
(#3) Q 3/8"	6 METERS	24-02666	20		0,527	472	611	1,29	15,3	OK	0,28	0,87	0,17	0,021	0,019	0,13	0,10	0,021	0,35	0,005	0,0001	0,0092	0,45
(#3) Q 3/8"	6 METERS	24-02645	19		0,528	475	602	1,27	14,3	OK	0,27	0,93	0,13	0,018	0,024	0,11	0,10	0,024	0,35	0,005	0,0001	0,0090	0,45
(#3) Q 3/8"	6 METERS	24-02669	120		0,530	481	626	1,30	15,6	OK	0,27	0,93	0,17	0,015	0,019	0,12	0,10	0,018	0,38	0,005	0,0001	0,0089	0,45
(#3) Q 3/8"	6 METERS	24-02646	122		0,529	479	612	1,28	14,8	OK	0,26	0,92	0,13	0,019	0,022	0,12	0,12	0,026	0,33	0,006	0,0001	0,0094	0,44
(#3) Q 3/8"	6 METERS	24-02668	105		0,531	492	622	1,26	15,1	OK	0,27	0,91	0,17	0,011	0,021	0,12	0,09	0,019	0,39	0,005	0,0001	0,0098	0,44
(#3) Q 3/8"	6 METERS	24-02671	25		0,528	480	618	1,29	14,6	OK	0,27	0,91	0,19	0,019	0,025	0,13	0,13	0,022	0,36	0,005	0,0001	0,0090	0,45
			946																				
			3.270																				

1)Tensile Testing according to ASTM A 370 (Standard Test Methods and Definitions for Mechanical Testing of Steel Products)
2)Bend Testing according to ASTM E 290 (Standard Test Methods for Bend Testing of Material for Ductility)
3) Chemical Analysis according to ASTM E415 (Standard Test Method for Analysis of Carbon and Low-Alloy Steel by Spark Atomic Emission Spectrometry)
4)The results presented correspond exclusively to the sample tested.
5)The laboratory does not assume any responsibility for partial or total reproduction of this document without the written permission of the Division of Mechanical Testing
6)All incoming raw materials checked by radiation detection system(exploranium at900) and natural radioactivity levels detected

KAPTAN DEMIR CELIK ENDUSTRISI VE TIC. A.S.
MERSIS NO: 0499001945300015
MTO SICIL NO: 198822

Adress
Head Office : Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Bestekar Saadettin Kaynak Sokak No:2 34662 Altunizade / Üsküdar / İstanbul / Türkiye
Factory Marmara Ereğlisi : Eksi Elma Mevkii Seymen Yolu 4 km Marmaraereğlisi / TEKIRDAG / TURKEY
e-mail export@kaptandemir.com.tr

5968

KAPTAN DEMIR CELIK ENDUSTRISI ve TIC. A.S.

MILL TEST CERTIFICATE

Description of Goods
REINFORCING DEFORMED STEEL BARS NTC 2289 GR60W
FOR 6 METERS (+/-50 MM)

CERTIFICATE NO : 24/066
PAGE : 1/2
DATE : 29.05.2024
REF. : KDC/2024-072/RDB

PROCESS ROUTE EAF/CCM/QST

BAR MARK TR KD SIZE W 6 0

SIZE (INCH / MM)	Length (Meters)	Heat Number	Number of Bundles		Weight	Mechanical Properties					Chemical Composition on Product												
						Yield Strength	Tensile Strength	Rm / ReH	Elng.	Bend	C	Mn	Si	P	S	Ni	Cr	Mo	Cu	V	B	N	Ceq
					Kg/m	Mpa	Mpa		%	Test	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Q 8,5 MM	6 METERS	24-02671	84		0,429	490	637	1,30	15,1	OK	0,27	0,91	0,19	0,019	0,025	0,13	0,13	0,022	0,36	0,005	0,0001	0,0090	0,45
Q 8,5 MM	6 METERS	24-02664	112		0,420	462	618	1,34	15,0	OK	0,26	0,93	0,16	0,033	0,017	0,12	0,20	0,021	0,37	0,007	0,0001	0,0091	0,47
Q 8,5 MM	6 METERS	24-02686	14		0,421	497	659	1,33	15,6	OK	0,28	0,87	0,17	0,021	0,019	0,13	0,10	0,021	0,35	0,005	0,0001	0,0092	0,45
Q 8,5 MM	6 METERS	24-02683	65		0,422	487	648	1,33	16,2	OK	0,29	0,93	0,16	0,019	0,015	0,13	0,12	0,024	0,34	0,005	0,0001	0,0093	0,47
Q 8,5 MM	6 METERS	24-02682	70		0,424	484	630	1,31	14,8	OK	0,29	0,91	0,18	0,014	0,030	0,13	0,10	0,025	0,34	0,005	0,0001	0,0098	0,46
Q 8,5 MM	6 METERS	24-02903	102		0,422	483	647	1,34	17,3	OK	0,27	0,97	0,17	0,017	0,018	0,14	0,10	0,023	0,37	0,005	0,0001	0,0095	0,46
Q 8,5 MM	6 METERS	24-02683	57		0,421	492	637	1,29	14,8	OK	0,29	0,93	0,16	0,019	0,015	0,13	0,12	0,024	0,34	0,005	0,0001	0,0093	0,47
Q 8,5 MM	6 METERS	24-02682	57		0,422	485	637	1,31	15,6	OK	0,29	0,91	0,18	0,014	0,030	0,13	0,10	0,025	0,34	0,005	0,0001	0,0098	0,46
Q 8,5 MM	6 METERS	24-02661	124		0,424	493	668	1,35	15,3	OK	0,29	0,89	0,17	0,032	0,013	0,16	0,23	0,027	0,38	0,005	0,0001	0,0092	0,48
Q 8,5 MM	6 METERS	24-02660	50		0,420	505	692	1,37	17,6	OK	0,27	0,91	0,15	0,015	0,011	0,14	0,18	0,023	0,36	0,005	0,0001	0,0094	0,46
Q 8,5 MM	6 METERS	24-02641	105		0,423	493	634	1,29	14,9	OK	0,27	0,90	0,16	0,024	0,017	0,12	0,15	0,022	0,35	0,005	0,0006	0,0095	0,45
Q 8,5 MM	6 METERS	24-02660	54		0,420	486	660	1,36	14,7	OK	0,27	0,91	0,15	0,015	0,011	0,14	0,18	0,023	0,36	0,005	0,0001	0,0094	0,46
Q 8,5 MM	6 METERS	24-02640	80		0,420	466	606	1,30	15,0	OK	0,27	0,94	0,19	0,017	0,025	0,12	0,11	0,022	0,34	0,005	0,0001	0,0092	0,46
Q 8,5 MM	6 METERS	24-02903	19		0,422	473	615	1,30	15,3	OK	0,27	0,97	0,17	0,017	0,018	0,14	0,10	0,023	0,37	0,005	0,0001	0,0095	0,46
Q 8,5 MM	6 METERS	24-02657	45		0,421	481	662	1,38	15,5	OK	0,28	1,06	0,22	0,012	0,016	0,12	0,09	0,023	0,38	0,005	0,0001	0,0085	0,48
Q 8,5 MM	6 METERS	24-02642	117		0,422	496	637	1,28	15,4	OK	0,27	0,87	0,16	0,018	0,025	0,12	0,12	0,021	0,34	0,005	0,0002	0,0088	0,44
Q 8,5 MM	6 METERS	24-02640	28		0,421	490	626	1,28	15,8	OK	0,27	0,94	0,19	0,017	0,025	0,12	0,11	0,022	0,34	0,005	0,0001	0,0092	0,46
Q 8,5 MM	6 METERS	24-02657	34		0,423	485	617	1,27	14,7	OK	0,28	1,06	0,22	0,012	0,016	0,12	0,09	0,023	0,38	0,005	0,0001	0,0085	0,48
			1.217																				
Q 9 MM	6 METERS	24-02657	35		0,475	488	653	1,34	14,9	OK	0,28	1,06	0,22	0,012	0,016	0,12	0,09	0,023	0,38	0,005	0,0001	0,0085	0,48
Q 9 MM	6 METERS	24-02644	115		0,471	465	628	1,35	15,2	OK	0,28	0,91	0,14	0,017	0,016	0,12	0,09	0,022	0,34	0,004	0,0001	0,0097	0,45
Q 9 MM	6 METERS	24-02639	117		0,473	468	618	1,32	14,8	OK	0,28	0,91	0,15	0,012	0,014	0,10	0,08	0,021	0,35	0,005	0,0004	0,0095	0,45
Q 9 MM	6 METERS	24-02657	7		0,478	455	603	1,33	15,8	OK	0,28	1,06	0,22	0,012	0,016	0,12	0,09	0,023	0,38	0,005	0,0001	0,0085	0,48
Q 9 MM	6 METERS	24-02640	8		0,473	456	602	1,32	16,3	OK	0,27	0,94	0,19	0,017	0,025	0,12	0,11	0,022	0,34	0,005	0,0001	0,0092	0,46
Q 9 MM	6 METERS	24-02638	112		0,474	472	612	1,30	14,9	OK	0,28	0,87	0,16	0,013	0,017	0,12	0,07	0,022	0,37	0,004	0,0001	0,0092	0,45
Q 9 MM	6 METERS	24-02655	113		0,471	492	625	1,30	15,1	OK	0,26	0,93	0,17	0,015	0,023	0,11	0,09	0,019	0,35	0,006	0,0001	0,0093	0,46
Q 9 MM	6 METERS	24-02656	91		0,472	474	621	1,31	15,8	OK	0,29	0,86	0,17	0,012	0,010	0,12	0,09	0,020	0,35	0,005	0,0001	0,0088	0,46
Q 9 MM	6 METERS	24-02645	110		0,473	470	614	1,31	14,7	OK	0,27	0,93	0,13	0,018	0,024	0,11	0,10	0,024	0,35	0,005	0,0001	0,0090	0,45
Q 9 MM	6 METERS	24-02654	119		0,472	469	601	1,26	15,8	OK	0,26	0,90	0,16	0,014	0,026	0,12	0,09	0,022	0,34	0,005	0,0001	0,0092	0,43
Q 9 MM	6 METERS	24-02966	87		0,473	463	638	1,38	15,7	OK	0,29	0,94	0,17	0,015	0,002	0,19	0,13	0,032	0,36	0,005	0,0001	0,0091	0,48
Q 9 MM	6 METERS	24-03007	115		0,473	481	656	1,36	15,2	OK	0,27	0,92	0,19	0,013	0,022	0,13	0,09	0,023	0,36	0,005	0,0001	0,0096	0,45
Q 9 MM	6 METERS	24-02643	78		0,471	472	607	1,29	14,9	OK	0,27	0,95	0,14	0,017	0,032	0,12	0,08	0,022	0,38	0,004	0,0001	0,0089	0,45
			1.107																				

KAPTAN DEMIR ÇELİK
ENDÜSTRİSİ VE TİC. A.Ş.
www.kaptangroupturkiye.com
MERSİS NO: 0499001945300015
İTO SİCİL NO: 198822

5969

KAPTAN DEMIR CELIK ENDUSTRISI ve TIC. A.S.

MILL TEST CERTIFICATE

Description of Goods
REINFORCING DEFORMED STEEL BARS NTC 2289 GR60W
FOR 6 METERS (+/-50 MM) / 12 METERS (+/-100 MM)

CERTIFICATE NO : 24/083
PAGE : 2/2
DATE : 29.05.2024
REF : KDC/2024-072/RDB

PROCESS ROUTE EAF/CCM/QST

BAR MARK T R K D SIZE W 6 0

SIZE (INCH / MM)	Length (Meters)	Heat Number	Number of Bundles	Weight	Mechanical Properties					Chemical Composition on Product												
					Yield Strength	Tensile Strength	Rm / ReH	Elng.	Bend	C	Mn	Si	P	S	Ni	Cr	Mo	Cu	V	B	N	Ceq
				Kg/m	Mpa	Mpa		%	Test	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
(#5) Q 5/8"	6 METERS	24-03017	94	1,484	480	634	1,32	15,1	OK	0,27	0,98	0,17	0,021	0,017	0,13	0,13	0,027	0,34	0,006	0,0002	0,008	0,46
(#5) Q 5/8"	6 METERS	24-03016	15	1,484	479	619	1,29	15,7	OK	0,27	0,93	0,16	0,019	0,036	0,14	0,14	0,021	0,38	0,005	0,0003	0,009	0,45
(#5) Q 5/8"	6 METERS	23-04731	34	1,465	474	636	1,34	15,8	OK	0,29	0,96	0,19	0,017	0,016	0,13	0,13	0,023	0,34	0,005	0,0001	0,008	0,48
(#5) Q 5/8"	6 METERS	23-04730	48	1,472	477	638	1,34	16,5	OK	0,27	0,91	0,20	0,018	0,029	0,13	0,15	0,024	0,37	0,005	0,0001	0,009	0,45
(#5) Q 5/8"	6 METERS	23-04729	20	1,467	475	623	1,31	15,8	OK	0,27	0,93	0,20	0,017	0,029	0,14	0,12	0,022	0,34	0,005	0,0001	0,008	0,46
			211																			
(#5) Q 5/8"	12 METERS	24-03016	6	1,484	479	619	1,29	15,7	OK	0,27	0,93	0,16	0,019	0,036	0,14	0,14	0,021	0,38	0,005	0,0003	0,009	0,45
(#5) Q 5/8"	12 METERS	23-04731	16	1,465	474	636	1,34	15,8	OK	0,29	0,96	0,19	0,017	0,016	0,13	0,13	0,023	0,34	0,005	0,0001	0,008	0,48
(#5) Q 5/8"	12 METERS	23-04730	19	1,472	477	638	1,34	16,5	OK	0,27	0,91	0,20	0,018	0,029	0,13	0,15	0,024	0,37	0,005	0,0001	0,009	0,45
(#5) Q 5/8"	12 METERS	23-04729	11	1,467	475	623	1,31	15,8	OK	0,27	0,93	0,20	0,017	0,029	0,14	0,12	0,022	0,34	0,005	0,0001	0,008	0,46
			52																			
(#6) Q 3/4"	12 METERS	24-03054	18	2,118	487	640	1,31	15,8	OK	0,28	0,98	0,17	0,020	0,039	0,14	0,12	0,025	0,37	0,005	0,0001	0,009	0,47
(#6) Q 3/4"	12 METERS	24-03055	9	2,106	489	636	1,30	15,5	OK	0,28	0,93	0,19	0,034	0,020	0,14	0,23	0,037	0,35	0,008	0,0001	0,009	0,47
			27																			
			2.410																			

1)Tensile Testing according to ASTM A 370 (Standard Test Methods and Definitions for Mechanical Testing of Steel Products)
2)Bend Testing according to ASTM E 290 (Standard Test Methods for Bend Testing of Material for Ductility)
3) Chemical Analysis according to ASTM E415 (Standard Test Method for Analysis of Carbon and Low-Alloy Steel by Spark Atomic Emission Spectrometry)
4)The results presented correspond exclusively to the sample tested.
5)The laboratory does not assume any responsibility for partial or total reproduction of this document without the written permission of the Division of Mechanical Testing
6)All incoming raw materials checked by radiation detection system(exploranium at900) and natural radioactivity levels detected

KAPTAN DEMİR ÇELİK ENDÜSTRİSİ VE TİC. A.Ş.
www.kaptangruptürkiye.com
MERSIS NO: 0499001945300015
İTO SİCİL NO: 198822

Adress
Head Office : Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Bestekar Saadettin Kaynak Sokak No 2 34662 Altunizade / Üsküdar / İstanbul / Türkiye
Factory Marmara Ereğlisi : Eksi Elma Mevkii Seymen Yolu 4.km Marmaraereğlisi / TEKIRDAG / TURKEY
e-mail export@kaptandemir.com.tr

5970

KAPTAN DEMIR CELIK ENDUSTRISI ve TIC. A.S.

MILL TEST CERTIFICATE

Description of Goods
REINFORCING DEFORMED STEEL BARS NTC 2289 GR60W
FOR 6 METERS (+/-50 MM) / 12 METERS (+/-100 MM)

CERTIFICATE NO : 24/083
PAGE : 1/2
DATE : 29.05.2024
REF : KDC/2024-072/RDB

PROCESS ROUTE EAF/CCM/QST

BAR MARK TR / KD / SIZE / W / 60

SIZE (INCH / MM)	Length (Meters)	Heat Number	Number of Bundles	Weight	Mechanical Properties					Chemical Composition on Product												
					Yield Strength	Tensile Strength	Rm/ ReH	Elng.	Bend	C	Mn	Si	P	S	Ni	Cr	Mo	Cu	V	B	N	Ceq
				Kg/m	Mpa	Mpa		%	Test	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Q 11 MM	6 METERS	24-02885	83	0,715	465	608	1,31	15,3	OK	0,27	0,92	0,20	0,020	0,020	0,07	0,10	0,012	0,36	0,005	0,0000	0,009	0,45
Q 11 MM	6 METERS	24-02887	62	0,709	478	618	1,29	15,7	OK	0,27	0,93	0,18	0,014	0,022	0,08	0,10	0,010	0,33	0,003	0,0000	0,009	0,44
Q 11 MM	6 METERS	24-02888	128	0,710	475	622	1,31	15,2	OK	0,27	0,92	0,19	0,019	0,035	0,08	0,10	0,012	0,34	0,004	0,0000	0,010	0,45
Q 11 MM	6 METERS	24-02891	44	0,714	479	628	1,31	16,3	OK	0,26	0,90	0,17	0,020	0,026	0,08	0,18	0,016	0,33	0,004	0,0000	0,009	0,44
			317																			
Q 12 MM	6 METERS	24-02898	17	0,857	501	639	1,32	15,1	OK	0,28	0,94	0,18	0,019	0,022	0,09	0,11	0,014	0,34	0,004	0,0000	0,009	0,46
Q 12 MM	6 METERS	24-02900	27	0,844	486	638	1,31	15,2	OK	0,27	0,93	0,18	0,017	0,025	0,08	0,09	0,012	0,37	0,004	0,0000	0,009	0,45
Q 12 MM	6 METERS	24-02901	128	0,840	475	639	1,35	15,3	OK	0,28	0,95	0,17	0,017	0,017	0,13	0,11	0,022	0,35	0,005	0,0001	0,008	0,47
Q 12 MM	6 METERS	24-02902	38	0,847	501	633	1,26	15,1	OK	0,29	1,08	0,17	0,033	0,011	0,14	0,18	0,025	0,34	0,007	0,0001	0,009	0,50
Q 12 MM	6 METERS	24-02904	48	0,844	491	631	1,29	16,7	OK	0,27	0,95	0,15	0,019	0,013	0,13	0,10	0,030	0,36	0,005	0,0001	0,009	0,45
Q 12 MM	6 METERS	24-02905	101	0,846	483	636	1,32	14,9	OK	0,27	1,00	0,13	0,023	0,034	0,14	0,09	0,021	0,35	0,005	0,0001	0,009	0,46
Q 12 MM	6 METERS	24-02906	123	0,845	472	630	1,33	15,9	OK	0,26	0,95	0,15	0,019	0,015	0,13	0,08	0,022	0,35	0,005	0,0001	0,010	0,44
Q 12 MM	6 METERS	24-02907	56	0,847	480	624	1,30	15,6	OK	0,28	0,90	0,14	0,021	0,037	0,14	0,11	0,041	0,36	0,005	0,0001	0,010	0,45
			538																			
(#4) Q 1/2"	6 METERS	24-02954	90	0,945	471	616	1,31	16,1	OK	0,28	0,97	0,18	0,013	0,024	0,13	0,09	0,023	0,35	0,005	0,0003	0,010	0,47
(#4) Q 1/2"	6 METERS	24-02955	126	0,944	467	614	1,31	15,0	OK	0,27	0,97	0,18	0,017	0,019	0,15	0,10	0,028	0,35	0,006	0,0002	0,009	0,46
(#4) Q 1/2"	6 METERS	24-02956	110	0,944	481	628	1,31	15,9	OK	0,28	0,95	0,14	0,018	0,013	0,13	0,11	0,025	0,35	0,005	0,0002	0,009	0,46
(#4) Q 1/2"	6 METERS	24-02957	46	0,946	475	624	1,31	15,5	OK	0,27	0,97	0,16	0,018	0,019	0,14	0,10	0,025	0,38	0,005	0,0001	0,009	0,46
(#4) Q 1/2"	6 METERS	24-02958	116	0,948	472	614	1,30	16,8	OK	0,28	0,97	0,15	0,022	0,016	0,13	0,10	0,024	0,36	0,006	0,0001	0,009	0,46
(#4) Q 1/2"	6 METERS	24-02959	114	0,945	476	624	1,31	15,5	OK	0,27	0,93	0,13	0,022	0,017	0,13	0,18	0,026	0,34	0,005	0,0001	0,009	0,46
(#4) Q 1/2"	6 METERS	24-02960	122	0,945	472	614	1,30	15,3	OK	0,28	0,92	0,15	0,014	0,017	0,13	0,12	0,019	0,38	0,005	0,0001	0,009	0,46
(#4) Q 1/2"	6 METERS	24-02961	87	0,942	471	614	1,30	16,9	OK	0,27	0,92	0,14	0,022	0,020	0,13	0,13	0,022	0,37	0,005	0,0001	0,009	0,45
(#4) Q 1/2"	6 METERS	24-02962	110	0,948	469	613	1,31	15,2	OK	0,27	0,95	0,16	0,021	0,017	0,15	0,16	0,025	0,33	0,005	0,0001	0,010	0,46
(#4) Q 1/2"	6 METERS	24-02963	123	0,940	469	625	1,33	15,4	OK	0,27	0,94	0,17	0,015	0,015	0,16	0,15	0,023	0,39	0,005	0,0001	0,009	0,45
(#4) Q 1/2"	6 METERS	24-02964	120	0,942	476	630	1,32	15,8	OK	0,28	0,96	0,17	0,018	0,008	0,13	0,16	0,022	0,36	0,006	0,0001	0,009	0,47
(#4) Q 1/2"	6 METERS	24-02965	101	0,946	475	618	1,30	16,3	OK	0,27	0,91	0,15	0,028	0,019	0,13	0,17	0,020	0,37	0,005	0,0001	0,010	0,45
			1.265																			

KAPTAN DEMIR CELIK
ENDUSTRISI VE TIC. A.S.
www.kaptangroupturkiye.com
MERSIS NO: 0499001945300015
ITO SICIL NO: 198822

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
NIT 902013442-0

PERFILERÍA METÁLICA

Puerto Gaitán – Meta
311 386 8024
Confisca25@gmail.com

5972

DESTINATARIO

NOMBRE	DIRECCIÓN	N° ORDEN DE COMPRA
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25	MZ 2 CASA 10 BRR MI RANCHITO	PV/1937703

AGOFER
BUTH Group

CERTIFICADO DE CALIDAD DE PRODUCTO

P-SGI-16-R01
Versión 5
30/08/2024

DATOS DE LA EMPRESA

NOMBRE:	Agofer S.A.S.	**No. INTERNO**	79,757	**REPORTE DE PRODUCTO**	RPT13842	**FECHA DE PRODUCCIÓN**	2026-05-19
N.I.T.	800.216.499-1	**PLANTA**	**Malambo**	**N° ORDEN DE PRODUCCIÓN**	PO7730	**UNIDADES PRODUCIDAS**	249.0
DIRECCIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN		KM 3-100 Vía a Caracolí					

DATOS DEL PRODUCTO

PRODUCTO		Perfil 'C' HR 305 x 80 x 6m (2.5mm)													
N°	NORMA DE FABRICACIÓN	N° DE TRAZABILIDAD DE LA MATERIA PRIMA	PROPIEDADES QUÍMICAS (%)										RECUBRIMIENTO	PROPIEDADES MECÁNICAS		
			C	Si	Mn	P	S	Al	Cu	Ni	Cr	Mo		Fluencia (F/Y)	Tracción (F/T)	Elongación (%)
1	NTC 5685	6387863	0.0900	0.0100	0.8600	0.0110	0.0020	0.0000	0.0100	0.0100	0.0300	0.0100	No aplica	407.0	502.0	33.0
2	NTC 5685	6387863	0.0900	0.0100	0.8600	0.0110	0.0020	0.0000	0.0100	0.0100	0.0300	0.0100	No aplica	407.0	502.0	33.0
3	NTC 5685	6387863	0.0900	0.0100	0.8600	0.0110	0.0020	0.0000	0.0100	0.0100	0.0300	0.0100	No aplica	407.0	502.0	33.0
4	NTC 5685	6387863	0.0900	0.0100	0.8600	0.0110	0.0020	0.0000	0.0100	0.0100	0.0300	0.0100	No aplica	407.0	502.0	33.0

NOTA: Certificamos que los datos descritos de la composición química y de las propiedades mecánicas son una fiel copia de los certificados de calidad emitidos por el fabricante de la materia prima utilizada, en caso que la propiedades mecánicas estén con valor 0 significa que el fabricante no lo certifica ya que la norma de fabricación no lo exige como aspecto obligatorio.

ENSAYOS REALIZADOS

PRUEBAS DESTRUCTIVAS			
Abocardado	NA	**Doblado**	NA
Aplastamiento	NA		

PRUEBAS DIMENSIONALES					
Diámetro	NA	**Espesor**	Conforme	**Radios**	Conforme
Dimensiones	Conforme	**Longitud**	Conforme	**Rectitud**	Conforme

Certificamos que el material aquí descrito fue producido, revisado y aprobado en la fecha escrita en nuestras instalaciones. Si requiere trazabilidad adicional puede solicitarla al personal de Agofer S.A.S. con el número interno.

Isabelly Angulo Suaréz
Directora del S.I.G.

Declaración generada en **Bogotá** el **21/05/2026**

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
NIT 902013442-0

TUBERÍA ELÉCTRICA

Puerto Gaitán – Meta
311 386 8024
Confisca25@gmail.com

5974

Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according ISO/IEC 17067) for:

TUBOS DE PVC PARA ALOJAR Y PROTEGER CONDUCTORES ELÉCTRICOS Y CABLEADO TELEFÓNICO

Fabricado por **TUBOSA S.A.S.**, en la

Calle 14 B No 20. E 80, Yumbo, Valle del Cauca, Colombia

Manufactured by **TUBOSA S.A.S.**, in the

Calle 14 B No 20. E 80, Yumbo, Valle del Cauca, Colombia

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

NTC 979 (2021)

Tubos y curvas de poli (cloruro de vinilo) rígido (PVC rígido) para alojar y proteger conductores Eléctricos y cableado telefónico

Plastics. Unplsticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) pipes and bends for conduits housing and protecting

SECTOR ICS 29.120.10 - 83.080.20

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "R-PS-019 Reglamento para la certificación de producto tangible", lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity of product is subject to the company's and product's permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the " R-PS-019 Reglamento para la Certificación de producto tangible" document, which will be verified by ICONTEC.

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certificate

Certificado CSC-CER717383
Certificate

Fecha de Aprobación: Approval Date:	2019-10-01	**Fecha Última Modificación:** Last Modification Date:	2023-06-29
Fecha de Renovación: Renewal Date:		**Fecha de Vencimiento:** Expiration Date:	2025-09-30

La autenticidad del certificado y su alcance se puede consultar al correo electrónico: cliente@icontec.org

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por:
ICONTEC is a certification body accreditated by:

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando sea solicitado
ICONTEC carrera 37 nro. 52 - 95, Bogotá D.C., Colombia

8975

Sello con Reglamento Técnico

Esquema de certificación tipo 4

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 4 según ISO/IEC 17067) para:
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 4 according to ISO/IEC 17067) for:

TUBOS CONDUIT DE PVC PARA ALOJAR Y PROTEGER CONDUCTORES ELÉCTRICOS Y CABLEADO TELEFÓNICO

Fabricado por **PLEXIN S.A.S**, en la **Km 3.3 Vía Funza - Siberia. Parque Industrial Santa Lucia, Bodega 11 B Funza, Cundinamarca, Colombia,** identificada con **número de NIT 800.007.473-4**

Manufactured by **PLEXIN S.A.S**, in the **Km 3.3 Vía Funza - Siberia. Parque Industrial Santa Lucia, Bodega 11 B Funza, Cundinamarca, Colombia**, identified with **NIT number 800.007.473-4**

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

Resolución 90708 (2013)

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. Retie Artículo 20.6 y 20.6.1.1 Tubos o Tuberías.
Resolution 90708: 2013.Technical Regulation for Electrical Installations Retie, Articles 20.6 and 20.6.1,1 Pipes or pipelines

SECTOR ICS: 23,040,20

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "R-PS-019 Reglamento para la certificación de producto tangible", lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity of product is subject to the company's and product's permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the "R-PS-019 Reglamento para la Certificación de producto tangible" document, which will be verified by ICONTEC.

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certificate

Certificado CSC- CER1065114
Certificate

Fecha de Aprobación: 2024-08-08
Approval Date:
Fecha de Renovación:
Renewal Date:
Fecha Última Modificación:
Last Modification Date:
Fecha de Vencimiento: 2027-08-07
Expiration Date:

La autenticidad del certificado y su alcance se puede consultar al correo electrónico: cliente@icontec.org

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por
ICONTEC is a certification body accreditated by

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002

ANAB ANSI National Accreditation Board ACCREDITED ISO/IEC 17065 PRODUCT CERTIFICATION BODY ID # 0677

F-PS-628
Versión 00

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando sea solicitado.
ICONTEC, Calle 26 # 69-76, Torre 4 "Agua", "Centro Empresarial Elemento", Bogotá D.C., Colombia

S976

ACCESORIOS PVC

Puerto Gaitán – Meta
311 386 8024
Confisca25@gmail.com

S 977

Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according ISO/IEC 17067) for:

ACCESORIOS DE PVC PARA TUBERÍA SANITARIA-AGUAS LLUVIAS Y VENTILACIÓN

Fabricado por **MEXICHEM COLOMBIA S.A.S.**, en la **Autopista del Sur 71-75, Bogotá D.C., Colombia**

Manufactured by **MEXICHEM COLOMBIA S.A.S.**, in the **Autopista del Sur 71-75, Bogotá D.C., Colombia**

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

NTC 1341 (2006)

Accesorios de poli(cloruro de vinilo) (PVC) rígido para tubería sanitaria-aguas lluvias y ventilación
Poly(vinyl chloride) (PVC) waste and vent fittings
SECTOR ICS: 23,040,20

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "R-PS-019 Reglamento para la certificación de producto tangible", lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity of product is subject to the company's and product's permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the " R-PS-019 Reglamento para la Certificación de producto tangible" document, which will be verified by ICONTEC.

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certificate

Certificado CSC-0001-4
Certificate

Fecha de Aprobación: Approval Date:	1979-01-01	**Fecha Última Modificación:** Last Modification Date:	
Fecha de Renovación: Renewal Date:	2023-09-21	**Fecha de Vencimiento:** Expiration Date:	2029-09-20

La autenticidad del certificado y su alcance se puede consultar al correo electrónico: cliente@icontec.org

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por:
ICONTEC is a certification body accreditated by:

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002

ID # 0677

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando sea solicitado
ICONTEC, Calle 26 # 69-79, Torre 4 "Agua", "Centro Empresarial Elemento". Bogotá D.C., Colombia

S978

Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:

It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according ISO/IEC 17067) for:

ACCESORIOS DE PVC PARA TUBERÍA DE AGUA A PRESIÓN

Fabricado por **MEXICHEM COLOMBIA S.A.S.,** en la **Autopista del Sur 71 - 75 Bogotá D.C., Colombia**

Manufactured by **MEXICHEM COLOMBIA S.A.S.,** in the **Autopista del Sur 71 - 75 Bogotá D.C., Colombia**

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:

The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

NTC 1339 (2006)

Accesorios de Poli (cloruro de vinilo) (PVC)

Pipe fittings of poly (vinyl chloride) (PVC) **SECTOR**

ICS: 23.040.20

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "R-PS-019 Reglamento para la certificación de producto tangible", lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity of product is subject to the company's and product's permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the " R-PS-019 Reglamento para la Certificación de producto tangible" document, which will be verified by ICONTEC.

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certificate

Certificado **CSC-0001-5**
Certificate

Fecha de Aprobación: Approval Date:	**1979-01-01**	**Fecha Última Modificación:** Last Modification Date:	
Fecha de Renovación: Renewal Date:	**2023-09-21**	**Fecha de Vencimiento:** Expiration Date:	**2029-09-20**

La autenticidad del certificado y su alcance se puede consultar al correo electrónico: cliente@icontec.org

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por:
ICONTEC is a certification body accreditated by:

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002

ID # 0677

F-PS-628
Versión 00

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando sea solicitado
ICONTEC, Calle 26 # 69-79, Torre 4 "Agua", "Centro Empresarial Elemento". Bogotá D.C., Colombia

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
NIT 902013442-0

CABLE DESNUDO

Puerto Gaitán – Meta
311 386 8024
Confisca25@gmail.com


S980

prysmian

Export control class. (ECCN) EAR 99

CABLES CONCÉNTRICOS DE COBRE mm²

CONCENTRIC COPPER CONDUCTORS

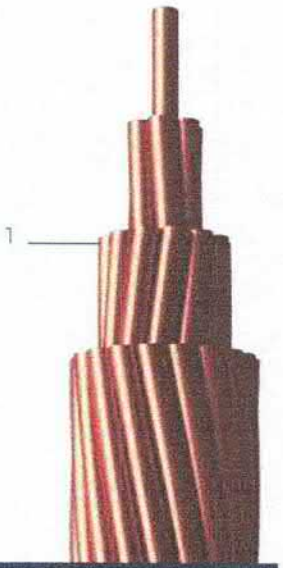

DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS DE MATERIALES

DESIGN AND MATERIALS CHARACTERISTICS

- 1 CONDUCTOR / *CONDUCTOR*

  Cobre suave sólido o cableado de 100% IACS de conductividad y pureza química de 99.9%

  Solid or Stranded soft copper 100% IACS conductivity and 99.9% pure

CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN Y DIMENSIONES

CONSTRUCTION CHARACTERISTICS AND DIMENSIONS

Calibre *Size*	Construcción *Construction*	Diámetro exterior *External diameter*	Resistencia máxima c.c a 20°C *Maximum DC Resistance at 20°C*	Masa total *Total weight*	Capacidad de corriente** *Ampacity*	Corriente de Corto Circuito* *Short circuit current*
mm²	N° alfios / strands	mm	Ω/km	kg/km	A	kA
16	7	4.9	1.15	140	145	3.3
25	7	6.16	0.727	221	191	5.3
35	7	7.26	0.524	307	236	7.3
50	19	8.55	0.387	416	295	9.9
70	19	10.27	0.268	601	364	14.4
95	19	12.11	0.193	834	440	20.0
120	37	13.64	0.153	1052	510	25.2
150	37	15.15	0.124	1298	586	31.1
185	37	16.95	0.0991	1624	668	38.9
240	37	19.43	0.0754	2134	786	51.1
300	61	21.79	0.0601	2677	904	64.1
400	61	24.64	0.0470	3423	1082	81.9
500	61	27.92	0.0366	4396	1244	105.2
630	91	31.78	0.0283	5686	1437	136.1

*Capacidad de corto circuito durante un segundo, temperatura inicial 30°C y temperatura final 560°C. / *Short circuit (1 sec) current, 30°C initial temperature and 560°C final temperature.*

**Capacidad de corriente en sol y viento a 0.61 m/s, Temp. Ambiente 25°C, Temp. Conductor 75°C, radiación solar de 1033.3 W/m², coeficiente de permisividad y absorsion en 0,5 a 60Hz, a nivel del mar. / *Ampacity in sun and wind to 2 ft/sec. 25°C ambient temperature, 75°C conductor temperature, Solar radiation at 96 W/ft2, permittivity and absorption coefficient of 0.5 at 60Hz, at sea level.*

Otras características y/o empaques estarán disponibles bajo común acuerdo. / *Other characteristics and/or packaging could be available under agreement.*

Los datos aquí consignados podrán ser cambiados o actualizados sin previo aviso. / *The information here stated may be changed or updated without prior notice.*

Todos los valores indicados son nominales y están sujetos a las tolerancias normales de fabricación y de las normas. / *All values herein indicated are nominal and are subject to normal manufacturing and standard tolerances.*

CABLES CONCÉNTRICOS DE COBRE mm²

CONCENTRIC COPPER CONDUCTORS

CARACTERÍSTICAS DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y DESEMPEÑO

PERFORMANCE, OPERATION AND INSTALLATION PARAMETERS

Normas
Standards

IEC 60228

Certificaciones de producto
Products Certifications

RETIE y NTC

Cumplimientos
Compliance

Procesos y procedimientos del Sistema de Gestión Integrado ISO 9001, 14001, 45001, 50001. Directiva RoHS.

Processes and Procedures of the Integrated Management System ISO 9001, 14001, 45001, 50001 and RoHS.

Instalación
Installation

Apto para: construcción de sistemas de puesta a tierra como electrodo (M), como conductor del electrodo (CE) y como conductor de puesta a tierra de equipos (PTE).

De acuerdo a lo expresado en el artículo 15 del anexo general del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) y la sección 250 de la NTC 2050.

Suitable for: grounding systems as electrode (M), as grounding electrode conductor (CE) and as equipment grounding conductors (PTE). According to article 15 of RETIE and section 250 of NTC 2050.

OPCIONES

OTHER OPTIONS

Disponible en temple duro bajo pedido. / *Hard drawn available upon request.*

EMPAQUE

PACKAGING

Los cables son entregados en carretes. Las cantidades son las determinadas según acuerdo comercial.

Cables are delivered in reels. Quantities are according to commercial arrangements.

Consulte nuestro directorio de ejecutivos comerciales en https://co.prysmian.com/es/contáctenos

5982

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

Modelo de Certificación
Certification Modality
Marca con Reglamentos Técnicos Colombianos
Esquema 5

No. 07204

La Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico Del Sector Eléctrico - CIDET certifica que el producto:
CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
VARILLA DE PUESTA A TIERRA	VARILLA MACIZA DE COBRE	LONGITUD 2400 mm, DIÁMETRO DE 12.7 A 15.8 mm

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo, que hace parte integral del presente CERTIFICADO. Este documento contiene 2 página(s).
The characteristics and identification of this product is described in the attached document, which is an integral part of this CERTIFICATE

Comercializado y fabricado por
Commercialized and fabricated by:

COLWELD S.A.S.

Carrera 38A No. 54 – 30 Sur Bogotá, Colombia

Satisface los requerimientos de
Satisfies the requirements of

NTC 2206/2001 y RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE
(Numeral 15.3)

Fecha de Certificación: 2018/08/28
Fecha de Renovación: 2024/08/29
Fecha de Vencimiento: 2027/08/28

Fecha máxima para la finalización de las próximas auditorías de seguimiento: 2025/08/28 y 2026/08/28

JULIO ARMANDO BONILLA GUTIERREZ

Julio Bonilla Gutiérrez
Coordinador Operación Certificación de Productos
CIDET Product Certification Operations Coordinator

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados.
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification.
The news and validity of this certificate can be consulted on the www.cidet.org.co/consulta-certificados webpage.
This certificate only can be reproduced in its entirety.

Medellín: Carrera 46 No 56-11 (Av. Oriental), piso 13. Tel: (+574) 444 1211 Fax: (+574) 444 0460

5983

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 07204

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2018/08/28
FECHA DE RENOVACIÓN: 2024/08/29
FECHA DE VENCIMIENTO: 2027/08/28

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE VARILLA DE PUESTA A TIERRA

Tipo	Varilla maciza de cobre
Referencia	Longitud 2400 mm Diámetro de 12.7 a 15.8 mm
Recubrimiento	Cobre macizo
Materia prima	Cobre electrolítico de 98% de pureza
Uso	Conducir y disipar las corrientes de falla con suficiente capacidad
Referencial	NTC 2206/2001 y RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 15.3)

Fabricante	Planta
COLWELD	BOGOTÁ

Atentamente,

Julio Bonilla Gutiérrez
Coordinador Operación Certificación de Productos
CIDET Product Certification Operations Coordinator

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados.
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification.
The news and validity of this certificate can be consulted on the www.cidet.org.co/consulta-certificados web page.
This certificate only can be reproduced in its entirety.

Medellín: Carrera 46 No 56-11 (Av. Oriental), piso 13. Tel: (+574) 444 1211 Fax: (+574) 444 0460

S984

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

Modelo de Certificación
Certification Modality
Marca con Reglamentos Técnicos Colombianos
Sistema 5

No. 00372

La Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico Del Sector Eléctrico - CIDET certifica que el producto:
CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
CABLES Y CONDUCTORES ELÉCTRICOS	COBRE DESNUDO, SUAVE, SEMIDURO Y DURO	VER ANEXO

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo, que hace parte integral del presente CERTIFICADO. Este documento contiene 2 página(s).
The characteristics and identification of this product is described in the attached document, which is an integral part of this CERTIFICATE

Comercializado y fabricado por
Commercialized and fabricated by:

PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S.A.S.

Calle 20 No. 68B - 71, Bogotá D.C., Colombia

Satisface los requerimientos de
Satisfies the requirements of

NTC 307/2012, ASTM B3/2013, ASTM B8/2011, ET 121/2013 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - RETIE (Numeral 20.2)

Fecha de Certificación: 2000/04/18
Fecha de Renovación: 2024/06/17
Fecha de Actualización: 2025/07/29
Fecha de Vencimiento: 2027/06/16

Fecha máxima para la finalización de la próxima auditoría de seguimiento: 2026/06/16

Firmado digitalmente por HERNAN MAURICIO ROJAS HERRERA
Fecha: 2025.07.29 16:09:17 -05'00'

Mauricio Rojas Herrera
Líder Certificación de Productos
CIDET Product Certification Leader

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados.
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification.
The news and validity of this certificate can be consulted on the www.cidet.org.co/consulta-certificados webpage.
This certificate only can be reproduced in its entirety.

Medellín: Carrera 46 No 56-11 (Av. Oriental), piso 16. Tel: (+574) 444 1211

5985

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 00372

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2000/04/18
FECHA DE RENOVACIÓN: 2024/06/17
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 2025/07/29
FECHA DE VENCIMIENTO: 2027/06/16

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE CABLES Y CONDUCTORES ELÉCTRICOS

Tipo	Cobre desnudo, suave, semiduro y duro
Referencia	Cobre suave: Calibres desde 14 AWG hasta 1000 kcmil y Cobre semiduro o duro: Calibres desde 14 AWG hasta 1000 kcmil
Marca	PROCABLES
Designación	Conductores de cobre (Cu)
Conductor	Alambres y conductores de cobre, cableado concéntrico clases AA, A, B, C
Aplicación	Conductores desnudos para redes aéreas de distribución de energía eléctrica de baja tensión (600 V), para puestas a tierra o para ser aislados con materiales termoplásticos o termoestables
Referencia!	NTC 307/2012, ASTM B3/2013, ASTM B8/2011, ET 121/2013 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - RETIE (Numeral 20.2)

Nota: Este certificado se unifica con el 01647 y 07502.

Fábrica	Planta
PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S.A.S.	BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

Atentamente,

Mauricio Rojas Herrera
Líder Certificación de Productos
CIDET Product Certification Leader

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados.
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification.
The news and validity of this certificate can be consulted on the www.cidet.org.co/consulta-certificados webpage.
This certificate only can be reproduced in its entirety.

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
NIT 902013442-0

BLOQUE

Puerto Gaitán – Meta
311 386 8024
Confisca25@gmail.com

S987

Arcillas de COLOMBIA
¡Produciendo su futuro!

BLOQUE TRADICIONAL
No. 5



REQUISITOS FÍSICOS

Item	Medida de Fabricación (mm)	Tolerancia Dimensional (mm)	Mínimo Promedio Permitido (mm)	Máximo Promedio Permitido (mm)	Rendimiento (Und*m²)
Largo	320	9,9	310,1	329,9	13
Alto	220	6,9	213,1	226,9	Peso Unidad (kg)
Ancho	110	3,3	106,7	113,3	5,8

*NTC 4205: "Unidades de mampostería de arcilla cocida. Ladrillo y bloques cerámicos" Parte 2:"Mampostería NO estructural".


*TOLERANCIA DIMENSIONAL: "Para todas las formas y tamaños que se fabriquen, las dimensiones exteriores de las unidades de cualquier tipo o clase pueden variar ±3% de las medidas nominales especificadas".


**Recuerde: La dimensión nominal se refiere a las dimensiones que se usan para dar el nombre o referirse a la unidad. Cuando se trata de la altura y de la longitud de la unidad suelen corresponder a la dimensión de fabricación más la de la junta de pega (10mm).

ALABEO			RESISTENCIA MINIMA A LA COMPRESION Mpa (KGF/cm ²)		ABSORCION DE AGUA MAXIMA EN FRIO %	
NTC 4205-2; 6,7			NTC 4205-2;6,1,2 Tabla 1		NTC 4205-2;6,1,2 Tabla 1	
	Medida de Fabricación (mm)	Tolerancia Alabeo (mm)	PROMEDIO 5 UND	UNIDAD	PROMEDIO 5 UND	UNIDAD
Largo	320	6,4	3,0 (30)	2,0 (20)	17	20
Alto	220	4,4				
Ancho	110	2,2				

ALABEO: NTC 4205-2; 6,7: "Las tolerancias de distorsión de las caras o aristas de las unidades individuales, medidas en relación con la superficie plana o con una línea recta, respectivamente, no deben exceder ±2% de las dimensiones de la cara o arista en la que se mide la distorsión".

CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO: NTC 4205-2; 8,1: En los resultados de los ensayos de resistencia y absorcion se admiten que una de las cinco muestras ensayadas no logren el limite individual, siempre y cuando se cumpla el promedio". 8,2 "Los parametros de alabeo y tolerancia dimensional se consideran conformes a esta norma cuando por lo menos el 95% del despacho o del lote cumple enteramente con los requisitos".



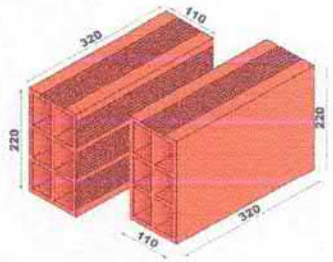


5988

LADRILLERA Santafé

BLOQUE Nº 5

COD: 00000204 **REF:** BL5

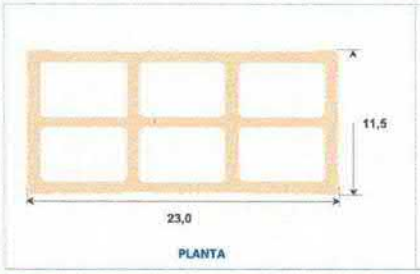

PLANTA



ISOMÉTRICO



PIEZA ENTERA (BL5)

Área de Vacíos = 82,96%

Área de Celda = 27,75 cm²/Un

Dimensiones en cm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones	**Largo**		**Ancho**		**Alto**
	33,0 cm		11,5cm		23,0 cm
Tolerancia Dimensional	± 6 mm		± 3 mm		± 5 mm
	Nota: Hasta el 2% de las piezas podrá estar excedido de estas tolerancias pero sin superar el máximo de ± 4mm.				
Color	Gris claro, oscuro, según mezcla		El color varía dentro una gama similar a la que se observa en la foto de aplicación.		
Textura	ESTRIADO POR SUS CUATRO (4) CARAS				
Paredes	± 10mm				
Tabiques	**Tabique exterior - t_e**	± 8,5 mm	**Tabique interior - t_i**	± 8,5 mm	
Peso/Unidad	6,2 Kg /Un. Podrá tener una variación hasta de ± 0,24 Kg				
Peso/m2	76,85Kg /m2				
Rendimiento con dilatación de 1 cm.	12,25 Un /m2				
Aplicación	Muros divisorios				
Clasificación	Tipo PH		Unidad de Mampostería de Perforación Horizontal		
Resistencia a la compresión - Mínima	**Promedio 5 Unidades**		**Individual**		
	3,0 MPa (30 Kgf/cm²)		2,0 MPa (20 Kgf/cm²)		
Absorción de Agua - Máxima	11,0%		13,0%		
Tratamiento de prehidrofugado	NO				
Normas Aplicadas	AIS		NSR 10 Título D		
	ICONTEC		NTC 4205-1, NTC 4205-3		
	ASTM		C56, C212, C216		
BIM	Cuenta con familias BIM Santafé - LOD 300				
% Contenido de material reciclado por Pieza	**% de Material Reciclado**		**Material reciclado por m2**		
	6,5%		3,86 Kg por m2		

Aislamiento Acústico - Valores STC (de acuerdo a composición de la pared).

Composición de la pared	STC	125 Hz	160 Hz	200 Hz	250 Hz	315 Hz	400 Hz	500 Hz	630 Hz	800 Hz	1.0 Khz	1.25 Khz	1.60 Khz	2.0 Khz	2.50 Khz	3.15 Khz	4.0 Khz
Sencilla	41	35	37	39	40	38	40	40	40	40	41	43	44	45	45	40	42
Pañ 1.5cm - 2 caras	47	36	42	44	45	42	40	44	44	48	47	48	49	51	54	55	54

Recomendaciones de Almacenamiento:

Se recomienda que los piezas de arcilla se almacenen en obra en un sitio plano, seco, aislado del terreno y protegido de la escorrentía, las zonas de escombros, el almacenamiento de arenas y sitios de preparación de mezclas de mortero y concreto. En época de intensas lluvias es conveniente cubrir las piezas para evitar su saturación.

Recomendaciones de Instalación:

Para una correcta y eficiente aplicación seguir las instrucciones de Santafé.

No se deben olvidar las buenas prácticas que se acostumbran en la construcción de muros con piezas de arcilla, aquí recordaremos algunas.

En los muros de fachada y divisorios se deben cumplir los requisitos de la NSR10 Capítulo A.9 Elementos No Estructurales, en su diseño y anclaje a la estructura.

La solución comprende columnetas y viguetas, enchapadas con la pieza utilizada, o dispaniendo el refuerzo vertical a través de las celdas. Para el diseño se pueden seguir las recomendaciones del "Manual de Diseño - Muros divisorios y de fachada en mampostería según normas colombianas de diseño y construcción sismo resistente" de Santafé.

En los muros de mampostería estructural o muros portantes, se deben cumplir los requisitos de la NSR 10 TITULO D - MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL.

ES NATURAL QUE EL TONO GENERAL DEL LADRILLO VARIE LIGERAMENTE ENTRE DIFERENTES LOTES DE PRODUCCIÓN.

Para obtener una mayor homogeneidad de tono de un lote en la fachada, se recomienda tomar las piezas para el muro de diferentes estibas a la vez, 3 o 4, para conseguir la mezcla del producto.

Durante la construcción se procurará mantener el muro lo más limpio posible, esto facilitará la limpieza posterior.

ES NATURAL QUE AL CONSTRUIR EL MURO SE PRESENTEN EFLORESCENCIAS EN LAS PIEZAS DE ARCILLA PRODUCTO DE LA HUMEDAD PROPIA DE LOS MATERIALES DE INSTALACION Y DEL ENTORNO. PARA SU ELIMINACION SE SEGUIRAN LAS RECOMENDACIONES DE LAVADO DE SANTAFÉ.

Recomendaciones de lavado:

Se deben seguir las recomendaciones del Manual de Lavado de Santafé.

El muro deberá estar seco. En la soluciones de lavado **NO USAR ACIDO MURIÁTICO NI ÁCIDOS FUERTES**, se deben utilizar ácidos débiles como el ácido nítrico, NO pueden estar compuestas con altas concentraciones del ácido recomendado, para su aplicación, previamente se deben retirar los excesos de mortero y polvo, y pre humedecer el muro. (así se reduce la penetración del ácido de la solución de lavado en la pieza de arcilla). Después de refregar el muro con la solución de lavado, esta se debe retirar con abundante agua.

Siempre se debe verificar con ensayos previos la efectividad de la solución de lavado.

	Vo. Bo. OPERACIONES	Vo. Bo. CALIDAD	Vo. Bo. COMERCIAL
PREPARO: Gerencia de Ingeniería			
REVISO:			
FECHA: 2026			

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
NIT 902013442-0

CINTA PVC

Puerto Gaitán – Meta
311 386 8024
Confisca25@gmail.com

5990

CONSTRUYENDO CONFIANZA

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sika Waterbar®/Cinta PVC O

Perfil de PVC para sello de juntas.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sika Waterbar®/Cinta PVC O es una cinta especialmente formulada y fabricada a partir de PVC flexible (cloruro de polivinilo).
Sika Waterbar®/Cinta PVC O debe ser embebida en y a lo largo de la junta, para formar un diafragma hermético que previene el paso del líquido a través de la junta.
Se ofrece una variedad de tamaños y perfiles para cumplir con diferentes aplicaciones tanto para juntas de expansión como de aislamiento (juntas con movimiento).
Versiones O-15/O-22.

USOS

Sika Waterbar®/Cinta PVC O es usada para sellar juntas con movimiento en estructuras de concreto tales como:
- Plantas de tratamiento de agua y agua residual.
- Presas.
- Reservorios y acueductos.
- Muros de contención.
- Cimentaciones.
- Túneles y box culverts.
- Puentes.
- Contenedores y tanques.
- Losas de contrapiso.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- PVC de alta Calidad: más durable.
- Alta resistencia a la tensión y elongación.
- Flexibilidad.
- Adecuado para niveles altos de tensión y presión hidrostática.
- Múltiples venas; barreras impenetrables para migración de agua.
- Resistente a sustancias naturales del subsuelo agresivas para el concreto.
- Resistente diferentes productos químicos.
- No produce decoloración con el concreto o acción electrolítica.
- Se puede soldar para crear un sello continuo entre juntas.

CERTIFICADOS / NORMAS

Sika Waterbar®/Cinta PVC O cumple con el siguiente grupo de normas y/o especificaciones:
- Cuerpo de ingenieros de USA CRD-C 572.
- ACI 350 "Code Requirements for Environmental Engineering Concrete Structures".


INFORMACION DEL PRODUCTO

Empaques	Cajas individuales ▪ O-15: Rollo de 15m ▪ O-22: Rollo de 15m
Vida útil en el recipiente	No expira.
Condiciones de Almacenamiento	Almacenar bajo techo para proteger de aceites, polvo y luz solar.
Apariencia / Color	Cinta flexible/amarillo.

INFORMACION DEL SISTEMA

Estructura del Sistema

Perfil de Sika Waterbar®/Cinta PVC O:

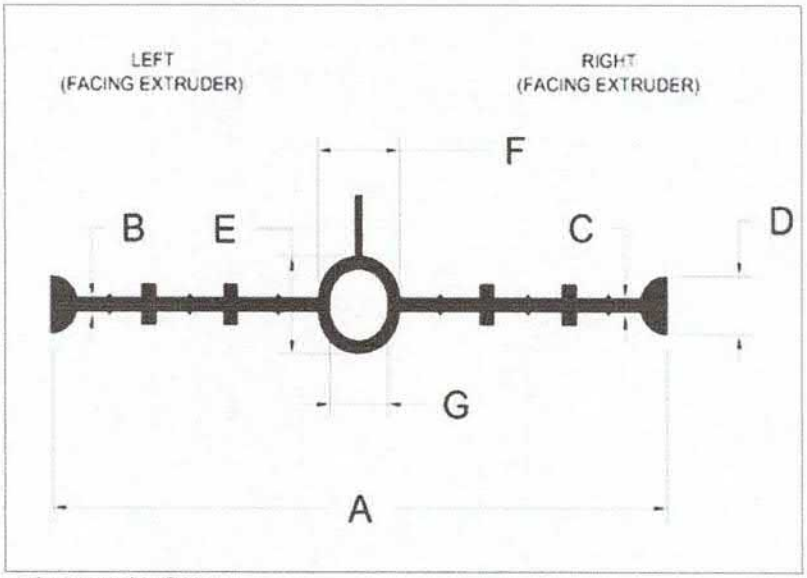

- Sika Waterbar® O-15:

Tolerancia (mm)	Máxima (mm)	Nominal (mm)	Mínima (mm)	Cotas
+/- 2	152	150	148	A
+ 0.5/-0.1	2.6	2.5	2.4	B / C
+1/-0	14.5	14	13.5	D
+/- 1	13.35	12.35	11.35	E / F
+/- 1	8.4	7.4	6.4	G

- Sika Waterbar® O-22:

Tolerancia (mm)	Máxima (mm)	Nominal (mm)	Mínima (mm)	Cotas
+/- 2	222	220	218	A
+ 0.5/-0.1	4	3.5	3.5	B / C
+1/-0	15	14	14	D
+/- 1	33	32	31	E / F
+/- 1	24	23	22	G

INFORMACION TECNICA

Dureza Shore A	> 86	ASTM D2240
Resistencia a la tensión	> 150 kgf / cm²	ASTM D638
Módulo de Elasticidad a Tensión	> 50 kgf / cm²	ASTM D747
Elongación a Rotura	> 300% ±10%	ASTM D638
Resistencia al Desgarro	> 15 MPa	ASTM D624

Efecto de Productos Químicos Líquidos, Incluyendo Agua	**Efecto de álcalis**		
	Cambio de peso	+ 0.25% - 0.10%	CRD-C 572
	Cambio de Dureza	± 5 Puntos	CRD-C 572

5992

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja de Datos del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

Ecología: Puede eliminarse de acuerdo con la legislación local.
Transporte: No peligroso.
Toxicidad: No tóxico.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

SELECCIÓN/ESCOGENCIA DEL PERFIL


Sika® sugiere los siguientes lineamientos básicos para la selección de los perfiles Sika Waterbar®/Cinta PVC O:

- Verificar si existe o no necesidades de resistencia química.
- Determinar el tipo de junta y los requisitos de movimiento de la junta.
- Identificar el tipo de material para un mejor desempeño.
- Definir el perfil y el tamaño (por nombre de producto, si es posible).
- Verificar los detalles de la junta de perfiles de diferentes tipos (considerar el uso de un único perfil a lo largo de las intersecciones para simplificar.
- Definir los detalles / accesorios para transiciones e intersecciones.
- Especificar el método adecuado para garantizar o asegurar el correcto posicionamiento del perfil Sika Waterbar®/Cinta PVC O (consultar el departamento técnico para más información).

TIPOS DE PERFILES

Para juntas con movimiento:
Las juntas de movimiento son típicamente diseñadas para acomodar movimientos significativos durante la contracción, cambios de temperatura, vaciado o deflexiones causadas por cargas vivas. Las juntas con movimiento por lo general incluyen las juntas de contracción, juntas de expansión y juntas de aislamiento.
Los perfiles que se elijan para el sellado primario en este tipo de juntas deben tener la habilidad para acomodarse a los movimientos esperados de la junta. Esto se logra mediante el uso de perfiles con bulbo central, diseñadas geométricamente para absorber los movimientos. Los perfiles con venas y bulbo central absorben movimientos laterales, transversales o de cizallamiento. Los bulbos centrales grandes, absorben movimientos grandes.

Perfil con bulbo central y venas

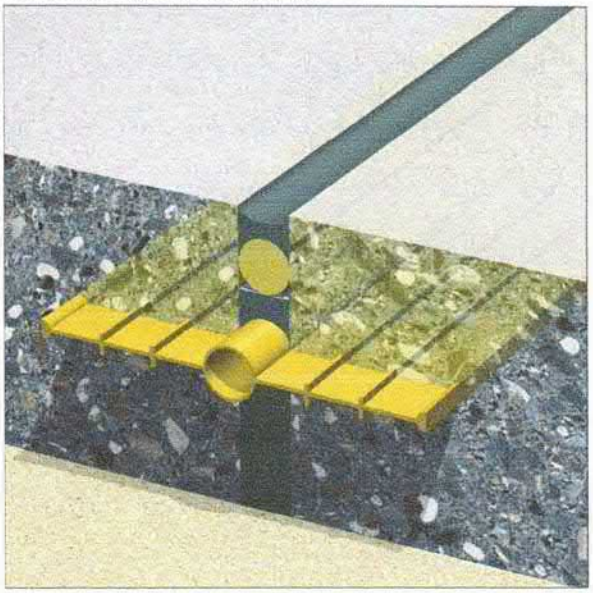

APLICACIÓN

Fijación a encofrado
Los perfiles Sika Waterbar®/Cinta PVC O deben ser instalados antes del vertido del concreto, para asegurar su adecuado posicionamiento y la consolidación del concreto alrededor del perfil.
El bulbo permite que la mitad del perfil sea posicionado de tal forma que quede dentro del primer vaciado del concreto y la otra mitad quede en el segundo vaciado.
La línea central del perfil debe estar alineada con el centro de la junta.
La cinta Sika Waterbar®/Cinta PVC O se deberá sostener firmemente en la posición requerida para prevenir movimientos o perdida de alineación, durante el vertido del concreto.

Fijación a armadura
Los ganchos de sujeción incluidos en el empaque, permite fijar la cinta a los aceros de refuerzo. Para esto se deberá usar alambres que permitan amarrar los ganchos de sujeción de la cinta con los aceros de refuerzo, y así asegurar que las Sika Waterbar®/Cinta PVC O no se desplacen durante el vaciado del concreto.

Colocación del concreto (Primera etapa)
Sika Waterbar®/Cinta PVC O realiza su función solo si ambos lados están bien empotrados en el concreto. Evite la formación de vacíos vibrando con cuidado el concreto. La consistencia del concreto en sí no debe ser ni demasiado plástica ni demasiado rígida, y el agregado debe estar bien graduado. La colocación del concreto fresco cerca de Sika Waterbar®/Cinta PVC O requiere cuidado, ya que de lo contrario se verá obligado a salir

5993

de su posición por la presión del concreto fresco, es decir, los extremos se doblarán. Para evitar esto, la misma presión del concreto debe estar presente en ambos lados del Waterbar.


Colocación de concreto: Segunda etapa
La remoción del encofrado próximo al perfil Sika Waterbar®/Cinta PVC O debe hacerse con cuidado. El extremo embebido del Sika Waterbar®/Cinta PVC O debe revisarse minuciosamente en busca de vacíos y repararse si es necesario, también debe ser limpiado de todos los restos de concreto endurecido adheridos desde la primera etapa de concreto. El procedimiento adicional es similar a la primera etapa.

Soldadura:
Para realizar la soldadura se debe hacer de manera uniforme y simultanea acercando los extremos de la cinta a la plancha a una temperatura entre 200°C - 300°C. Es importante usar una fuente indirecta de calor para este procedimiento, ya que la exposición directa al fuego puede alterar la composición química del PVC y resultar en una soldadura deficiente. Cuando se haya derretido aproximadamente de 2mm a 3 mm de cada extremo del perfil, remueva rápidamente los extremos de la plancha e inmediatamente presione los extremos entre sí, manteniéndolos debidamente alineados. Se debe asegurar presionando hasta que los dos extremos se fundan y se enfríen.
Permita que los empalmes se enfríen naturalmente. La temperatura de fusión se debe mantener uniforme para evitar la quema o carbonización del material, por esta razón se debe hacer con una fuente de energía y voltaje reducida y evite trabajar con extensiones o cables muy largos.
La experiencia ha demostrado que los empalmes especiales (como eles, tes y cruces) son difíciles de lograr en obra. Algunas veces los empalmes especiales requieren de equipos y herramientas especiales que pueden ser difíciles de operar en campo. Por lo tanto, se recomienda que los empalmes especiales sean prefabricados y en campo se limite a empalmes simples de un perfil con otro. De esta forma se puede asegurar la calidad del sistema. El uso de la **Plancha para Soldar Cinta Sika PVC** es indispensable para garantizar la uniformidad de fundición de la cinta y por ende lograr uniformidad en las uniones.
Los empalmes que se consideran inaceptables incluyen los siguientes detalles:

- Resistencia a tensión inferior al 80% de la resistencia del perfil.
- Desalineación de los bulbos o de las venas superiores a 1,58 mm.
- Falla en la soldadura superficial superior a 1,58mm o 15% del espesor del perfil considerar la menor medida.
- Desalineaciones que reducen la sección transversal del perfil en más del 15%.
- Porosidades visibles en la soldadura.
- Burbujas o soldadura inadecuada.
- Separaciones visibles en el empalme cuando se dobla en ángulo agudo una vez se haya enfriado la soldadura
- Material quemado o carbonizado.

Uniones especiales:
ejemplos de empalmes especiales:

- "L" horizontal y vertical
- "T" horizontal y vertical
- "Cruz" horizontal y vertical

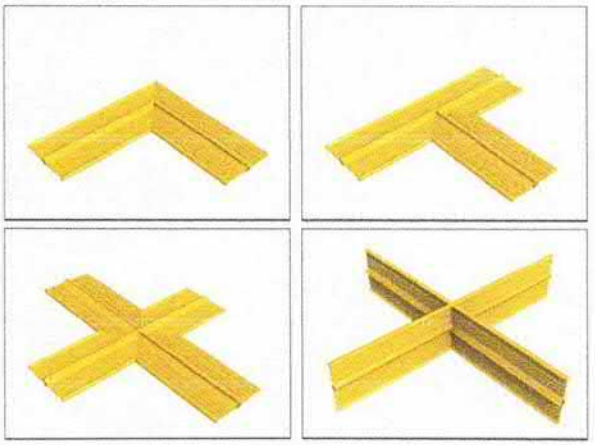

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.
Otras restricciones: ver notas legales.

NOTAS LEGALES

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica,

5194

las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos de venta y despacho publicadas en la página web: col.sika.com.

Sika Colombia S.A.S
Vereda Canavita, Km 20.5 Autopista Norte
Tocancipá, Cundinamarca. Colombia
phone: +57 601 878 6333
e-mail: sika_colombia@co.sika.com
web: col.sika.com

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
NIT 902013442-0

TUBERÍA A PRESIÓN

Puerto Gaitán – Meta
311 386 8024
Confisca25@gmail.com

5996

Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according ISO/IEC 17067) for:

TUBERÍA A PRESIÓN

Fabricado por **CELTA S.A.S.:** Carrera 24 No. 30 - 500, Soledad, Atlántico, Colombia; **Planta Maquila:** Autopista sur No. 71 - 75, Bogotá D.C., Colombia

Manufactured by **CELTA S.A.S.:** Carrera 24 No. 30 - 500, Soledad, Atlántico, Colombia; **Planta Maquila:** Autopista sur No. 71 - 75, Bogotá D.C., Colombia

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

NTC 382 (2018)

Plásticos. Tubos de poli (cloruro de vinilo) (PVC) clasificados según la presión (serie RDE)

Plastics. Poly (vinyl chloride) (PVC) pressure rated pipes (SDR series)

SECTOR ICS: 23,040,20

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "R-PS-019 Reglamento para la certificación de producto tangible", lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity of product is subject to the company's and product's permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the " R-PS-019 Reglamento para la Certificación de producto tangible" document, which will be verified by ICONTEC.

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certificate

Certificado CSC-0002-1
Certificate

Fecha de Aprobación: Approval Date:	1975-12-05	**Fecha Última Modificación:** Last Modification Date:	
Fecha de Renovación: Renewal Date:	2023-09-01	**Fecha de Vencimiento:** Expiration Date:	2029-08-31

La autenticidad del certificado y su alcance se puede consultar al correo electrónico: cliente@icontec.org

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por:
ICONTEC is a certification body accreditated by:

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002

ID 0677

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando sea solicitado.
ICONTEC, Calle 26 # 69-79, Torre 4 "Agua", "Centro Empresarial Elemento", Bogotá D.C., Colombia

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
NIT 902013442-0

MALLA ELECTROSOLDADA

Puerto Gaitán – Meta
311 386 8024
Confisca25@gmail.com

5998

LABORATORIO DE CALIDAD
ARCOE S.A.S - NIT 900783521-1

INFORME DE ENSAYO MALLA ELECTROSOLDADA

Cliente: VILLAVICENCIO **Informe No.:** MS-040326-3059
Obra: VILLAVICENCIO **Referencia:** XX-257
Fecha Ensayo: 2026-03-04 **Malla:** Estandar: X Especial:
N° de paginas del informe: 1 copia N° 2


CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA

Descripción	Unidad	Longitudinal	Transversal	Cuantía Principal cm²/ml
Lote	N.A	TR2-368	TR2-368	2,57

Descripción	Unidad	Valores Nominal	Valores Real	Valores Nominal	Valores Real	Requisitos NTC 5806, Fecha de revisión 2019-06-19. versión :1
Diámetro	mm	7,00	6,91	7,02	6,91	CUMPLE Numeral 7.2.7.1 peso Tabla 6 Diámetro y área
Área	mm²	38,48	37,55	38,48	37,53	
Masa grafil por metro	Kg / m	0,302	0,293	0,302	0,293	
Tolerancia en peso maxima = +/- 6%	%	-3,00		-3,35		

PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS DE LA MUESTRA


Descripción de la prueba		Unidad	Valores Longitudinal Obtenido	Valores Longitudinal Especificado	Valores Transversal Obtenido	Valores Transversal Especificado	Requisitos NTC 5806, Fecha de revisión 2019-06-19. versión :1
Dimensión de la malla		cm	601	600	257	235	CUMPLE NUMERAL 10
Tolerancia en longitud y ancho total		cm	-1,2	(+/- 6cm)	-21,5	(+/- 2.5cm)	CUMPLE NUMERAL 10.2 y NUMERAL 10.1
Tolerancia en longitud de salientes		mm	71	Max 75	44	Max 50	CUMPLE Numeral 10.7 tabla 11
Traccion	Carga Maxima	kgf	2246	2160	2426	2160	CUMPLE NUMERAL 8.1 Tabla 9 NTC 3353
	Esfuerzo max.	Mpa	572	550	618	550	
	Incertidumbre	kgf	19,06		188,86		
Fluencia	Resistencia max.	Mpa	657	485	547	485	CUMPLE NUMERAL 7.2.5.3 Tabla 9
	Incertidumbre	Mpa	35,30		112,60		
Cortante	Fuerza en Soldadura transversal	N	12505	9277	12505	9277	CUMPLE NUMERAL 8.3
Espaciamiento entre alambres	Nominal	mm	15	+/-6,35	15	+/-6,35	CUMPLE NUMERAL 10.6
	Promedio Real		15,6		15,4		
	Variación		-0,6		-0,4		
Resaltes	Altura promedio	mm	0,33	0,31	0,33	0,31	CUMPLE NUMERAL 7.2.4.4 TABLA 6 Y 7
	Ángulo de inclinación	0°	56°	Mayor a 45°	55°	Mayor a 45°	CUMPLE NUMERAL 7.2.4.5
	Espaciamiento Promedio de los resaltes	mm	5,08	4,62 a 7,24	5,08	4,62 a 7,24	CUMPLE NUMERAL 7.2.4.6
	Resaltes por pulgada	N.A	5,0	3,5 a 5,5	5,0	3,5 a 5,5	CUMPLE NUMERAL 7.2.4.3
	Area grafilada	%	39	Mayor a 25%	39	Mayor a 25%	CUMPLE NUMERAL 7.2.4.1
Numero de grafiles		Und	16	16	40	40	CUMPLE NUMERAL 10.7
Doblado mayor a 90°		0°	128°	Sin Agrietamiento	126°	Sin Agrietamiento	CUMPLE Numeral 7.1.6 Tabla 10

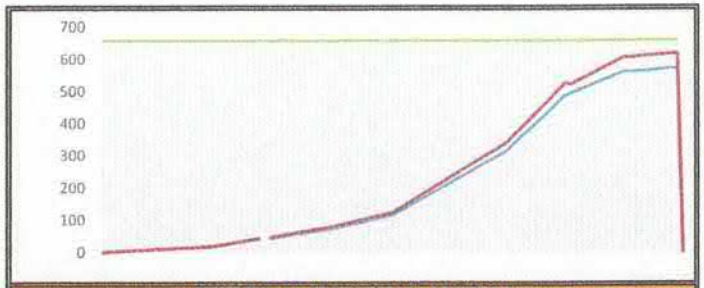

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN Y A LA FLUENCIA

	TENSIÓN Mpa	FLUENCIA Mpa		
			ESPECIFICADO FLUENCIA Mpa	485
Longitudinal	572	657	ESPECIFICADO TENSIÓN Mpa	550
Transversal	618	547		

RESISTENCIA AL CORTE DE LA SOLDADURA



Obtenido N
12505
Especificado N
9277

CERTIFICADO DE CALIBRACION No.8215 MAQUINA DE TRACCION, SUMINISTRADO POR SERVINTEGRAL LTDA

MÉTODO DE ENSAYO ESPECIFICADO EN LA NTC 3353 NUMERAL 13.1.3

◊ Los resultados del presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. ◊ El laboratorio de pruebas y ensayos de ARCOE S.A.S no se responsabiliza por el uso inadecuado de los productos ensayados. ◊ Este certificado no podra ser reproducido parcialmente, con autorizacion previa por escrito de ARCOE S.A.S ◊ cumple etiquetado y estampado

REGLA DE DECISION LABORATORIO ARCOE

El laboratorio de ensayos internos de Arcoe S.A.S a determinado como regla de decision, la Declaracion Binaria para una regla de aceptacion simple (w=0) según Numeral 4.2.1 Gula para establecer reglas de decision en la declaracion de conformidad ILAC

RES 0277-2015
CSR - CER745389
Alambre de acero grafilado y mallas electrosoldadas de alambre grafilado de acero

NTC 5806 (201
CSC - CER7453
Alambre de acero grafil mallas electrosoldadas refuerzo de concret

Elaboro: ALEJANDRO VELANDIA
Laboratorista de Calidad

Autorizado por: DANIEL SAAVEDRA
Lider control de Calidad

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
NIT 902013442-0

TAPA EN LAMINA GALVANIZADA

Puerto Gaitán – Meta
311 386 8024
Confisca25@gmail.com



Tabla de Espesores

ESPESOR				PESO(kg)					
Milimetros	Calibre	Pulgadas	915 X 3000mm	1000 x 3000mm	1200 x 2400mm	1200 x 3000mm	1200 x 4800mm	1219 x 2400mm	1219 x 3000mm
2,00	14	-	45,29	49,50	47,50	59,40	95,04	48,31	60,39
2,50	12	-	56,62	61,88	59,40	74,25	118,80	60,39	75,48
3,00	11	1/8	67,94	74,25	71,28	89,10	142,56	72,46	90,58
4,50	7	3/16	-	111,37	106,92	133,65	213,84	108,7	-
6,00	3	1/4	-	148,50	142,56	178,20	285,12	144,93	181,17

Normas

ASTM A36 = NTC 1920: Acero estructural al carbono.
ASTM A1011 = NTC 6: Láminas y flejes de acero, laminados en caliente, al carbono, estructurales, alta resistencia, baja aleación con conformabilidad mejorada y ultra alta resistencia.
ASTM A568 = NTC 7: Requisitos generales para láminas de acero al carbono, estructural y de alta resitencia, baja aleación, laminadas en caliente y frío.

Fórmula de Peso


- Peso(kg) = Espesor(mm) X Largo(m) X Ancho(m) X 8.25(factor)

Usos

Escaleras /Carrocerías/ Mezzanies /Blindaje/ Pisos
Cajas de seguridad/ Puentes /Básculas

5601


LÁMINAS ALFAJOR Ó ANTIDESLIZANTES



LÁMINAS ALFAJOR O ANTIDESLIZANTE									ESPECIFICACIONES TÉCNICAS				
CALIDADES MAS COMUNES		COMPOSICIÓN QUIMICA							PROPIEDADES MECÁNICAS				APLICACIONES MAS FRECUENTES
		L	C	MN	P	S	SI	CU	LIMITE ELÁSTICO		RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	% ALARGA	
ASTM	DIN		(x 100)	(x 100)	(x 100)	(x 100)	(x 100)	(x 100)					
ASTM 569		MIN											Fabricación de pisos antideslizantes
		MAX	15	60	3.5	1			25Kg/mm3	250MPa	35KgI mm2	365MPa	22

DIMENSIONES Y PESOS DE PLANCHAS COMERCIALES									
	ESPESOR			M2	1.0 X 2.0 MTS	1.22 X 2.44 M (4'X 8')	1.0 X 3.0 M	1.22 X 3.66 M (4'X 12')	1.83 X 6.09 M (6'X 20')
	CALIBRE	PULGADA	MILIMETRO	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.
LÁMINAS ALFAJOR			2.50	20.68	41.35	61.44	62.03	92.32	230.00
	12		2.66	22.00	44.00	65.38	65.99	98.23	245.00
	11		3.00	24.81	49.62	73.73	74.43	110.78	277.00
		1/8"	3.17	26.22	52.43	77.91	78.65	117.06	292.00
			4.00	33.08	66.16	98.31	99.24	147.71	369.00
			4.50	37.22	74.43	110.60	111.65	166.17	415.00
		3/16"	4.76	39.37	78.73	116.99	118.10	175.77	439.00
			5.00	41.35	82.70	122.89	124.05	184.64	461.00
			5.50	45.49	90.97	135.18	136.46	203.10	507.00
			6.00	49.62	99.24	147.47	148.86	221.56	553.00
		1/4"	6.35	52.51	105.03	156.07	157.54	234.49	585.00
			7.50	62.03	124.05	184.33	186.08	276.95	691.00
		5/16"	7.94	65.66	131.33	195.15	196.99	293.20	732.00
			8.00	66.16	132.32	196.62	198.48	295.42	738.00
			9.00	74.43	148.86	221.20	223.29	332.34	830.00
		3/8"	9.53	78.81	157.63	234.23	236.44	351.92	879.00
			10.00	82.70	165.40	245.78	248.10	369.27	922.00
			12.00	99.24	198.48	294.93	297.72	443.13	1.106.00
		1/2"	12.70	105.03	210.06	312.14	315.09	468.98	1.171.00

FORMATO DE LÁMINAS MÁS COMERCIALES EN COLOMBIA



UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
NIT 902013442-0

CUBIERTA

Puerto Gaitán – Meta
311 386 8024
Confisca25@gmail.com

5603

SINO ROPTECK INTERNATIONAL LIMITED
ADD: UNIT NO. 532B ON 5/F, STAR HOUSE, NO. 3 SALISBURY ROAD, KL HONG KONG, CHINA.

MILL TEST CERTIFICATE

/STOMER: ALUACEROS COLOMBIA S.A.S.

)MER ADDRESS: CRA 71 D N 12 C 60 TOWER 2 APT 703 IN RESERVED ALSACE 2, BOGOTA COLOMBIA

).: RG-SC-20250275

NO.: RG-MTC-20250275-SA MTC DATE: 2025-09-20

DESCRIPTION OF GOODS: PRIME PREPAINTED STEEL COILS (PPGL) STANDARD: ASTM A792

NO.	COIL NO.	QC	SIZE (MM)	NET WEIGHT (TON)	GROSS WEIGHT (TON)	ALUZINC COATING (G/M2)	TOP/BACK COLOR (RAL CODE)	TOP/BACK PAINT (UM)	CHEMICAL COMPOSITION(%) HEAT ANALYSIS							MECHANICAL PROPERTICS							
									ZN	AL	C	Mn	Si	P	S	TENSILE STRENGTH (Mpa)	YIELD STRENGTH (Mpa)	HARDNESS	BEND TEST	GLOSS	MEK (TOP/BACK)	SHOCK TEST	ELONGATION (%)
	20250275-001	A 01	0.45*610	4.430	4.460	120	RAL3001 /RAL9010	25/15	43.5	55	0.4	0.21	0.02	0.02	0.01	405	315	55	2T	40	100/90	9J	25
	20250275-002	A 01	0.45*610	4.444	4.474	120	RAL3001 /RAL9010	25/15	43.5	55	0.4	0.21	0.02	0.02	0.01	405	315	55	2T	40	100/90	9J	25
	20250275-003	A 01	0.45*610	4.664	4.694	120	RAL3001 /RAL9010	25/15	43.5	55	0.4	0.21	0.02	0.02	0.01	405	315	55	2T	40	100/90	9J	25
	20250275-004	A 01	0.45*610	4.236	4.266	120	RAL3001 /RAL9010	25/15	43.5	55	0.4	0.21	0.02	0.02	0.01	405	315	55	2T	40	100/90	9J	25
	20250275-005	A 01	0.45*610	4.400	4.430	120	RAL3001 /RAL9010	25/15	43.5	55	0.4	0.21	0.02	0.02	0.01	405	315	55	2T	40	100/90	9J	25
	20250275-006	A 01	0.45*610	4.716	4.746	120	RAL3001 /RAL9010	25/15	43.5	55	0.4	0.21	0.02	0.02	0.01	405	315	55	2T	40	100/90	9J	25
	20250275-007	A 01	0.45*610	3.664	3.694	120	RAL3001 /RAL9010	25/15	43.5	55	0.4	0.21	0.02	0.02	0.01	405	315	55	2T	40	100/90	9J	25
	20250275-008	A 01	0.45*610	4.514	4.544	120	RAL5005 /RAL9010	25/15	43.5	55	0.4	0.21	0.02	0.02	0.01	405	315	55	2T	40	100/90	9J	25
	20250275-009	A 01	0.45*610	4.512	4.542	120	RAL5005 /RAL9010	25/15	43.5	55	0.4	0.21	0.02	0.02	0.01	405	315	55	2T	40	100/90	9J	25
	20250275-010	A 01	0.45*610	4.516	4.546	120	RAL5005 /RAL9010	25/15	43.5	55	0.4	0.21	0.02	0.02	0.01	405	315	55	2T	40	100/90	9J	25
	20250275-011	A 01	0.45*610	4.512	4.542	120	RAL5005 /RAL9010	25/15	43.5	55	0.4	0.21	0.02	0.02	0.01	405	315	55	2T	40	100/90	9J	25
	20250275-012	A 01	0.45*610	4.590	4.620	120	RAL5005 /RAL9010	25/15	43.5	55	0.4	0.21	0.02	0.02	0.01	405	315	55	2T	40	100/90	9J	25
	20250275-013	A 01	0.45*610	4.474	4.504	120	RAL5005 /RAL9010	25/15	43.5	55	0.4	0.21	0.02	0.02	0.01	405	315	55	2T	40	100/90	9J	25
	20250275-014	A 01	0.45*610	4.490	4.520	120	RAL5005 /RAL9010	25/15	43.5	55	0.4	0.21	0.02	0.02	0.01	405	315	55	2T	40	100/90	9J	25
	20250275-015	A 01	0.45*610	4.922	4.952	120	RAL6005 /RAL9010	25/15	43.5	55	0.4	0.21	0.02	0.02	0.01	405	315	55	2T	40	100/90	9J	25
	20250275-016	A 01	0.45*610	4.914	4.944	120	RAL6005 /RAL9010	25/15	43.5	55	0.4	0.21	0.02	0.02	0.01	405	315	55	2T	40	100/90	9J	25
	20250275-017	A 01	0.45*610	4.252	4.282	120	RAL6005 /RAL9010	25/15	43.5	55	0.4	0.21	0.02	0.02	0.01	405	315	55	2T	40	100/90	9J	25
	20250275-018	A 01	0.45*610	4.380	4.410	120	RAL6005 /RAL9010	25/15	43.5	55	0.4	0.21	0.02	0.02	0.01	405	315	55	2T	40	100/90	9J	25
	20250275-019	A 01	0.45*610	4.488	4.518	120	RAL6005 /RAL9010	25/15	43.5	55	0.4	0.21	0.02	0.02	0.01	405	315	55	2T	40	100/90	9J	25

5604

	20250275-020	A 01	0.45*610	4.490	4.520	120	RAL6005 /RAL9010	25/15	43.5	55	0.4	0.21	0.02	0.02	0.01	405	315	55	2T	40	100/90	9J	25
	20250275-021	A 01	0.45*610	4.494	4.524	120	RAL6005 /RAL9010	25/15	43.5	55	0.4	0.21	0.02	0.02	0.01	405	315	55	2T	40	100/90	9J	25
	20250275-022	A 01	0.45*610	4.496	4.526	120	RAL9002 /RAL9010	25/15	43.5	55	0.4	0.21	0.02	0.02	0.01	405	315	55	2T	40	100/90	9J	25
	20250275-023	A 01	0.45*610	4.496	4.526	120	RAL9002 /RAL9010	25/15	43.5	55	0.4	0.21	0.02	0.02	0.01	405	315	55	2T	40	100/90	9J	25
	20250275-024	A 01	0.45*610	4.666	4.696	120	RAL9002 /RAL9010	25/15	43.5	55	0.4	0.21	0.02	0.02	0.01	405	315	55	2T	40	100/90	9J	25
	20250275-025	A 01	0.45*610	4.484	4.514	120	RAL9002 /RAL9010	25/15	43.5	55	0.4	0.21	0.02	0.02	0.01	405	315	55	2T	40	100/90	9J	25
	20250275-026	A 01	0.45*610	4.524	4.554	120	RAL9002 /RAL9010	25/15	43.5	55	0.4	0.21	0.02	0.02	0.01	405	315	55	2T	40	100/90	9J	25
	20250275-027	A 01	0.45*610	4.500	4.530	120	RAL9002 /RAL9010	25/15	43.5	55	0.4	0.21	0.02	0.02	0.01	405	315	55	2T	40	100/90	9J	25
	20250275-028	A 01	0.45*610	4.500	4.530	120	RAL9002 /RAL9010	25/15	43.5	55	0.4	0.21	0.02	0.02	0.01	405	315	55	2T	40	100/90	9J	25
	20250275-029	A 01	0.45*1220	3.844	3.874	120	RAL3001 /RAL9010	25/15	43.5	55	0.4	0.21	0.02	0.02	0.01	405	315	55	2T	40	100/90	9J	25
	20250275-030	A 01	0.45*1220	3.518	3.548	120	RAL3001 /RAL9010	25/15	43.5	55	0.4	0.21	0.02	0.02	0.01	405	315	55	2T	40	100/90	9J	25
	20250275-031	A 01	0.45*1220	3.538	3.568	120	RAL3001 /RAL9010	25/15	43.5	55	0.4	0.21	0.02	0.02	0.01	405	315	55	2T	40	100/90	9J	25
	20250275-032	A 01	0.45*1220	4.466	4.496	120	RAL5005 /RAL9010	25/15	43.5	55	0.4	0.21	0.02	0.02	0.01	405	315	55	2T	40	100/90	9J	25
	20250275-033	A 01	0.45*1220	3.404	3.434	120	RAL5005 /RAL9010	25/15	43.5	55	0.4	0.21	0.02	0.02	0.01	405	315	55	2T	40	100/90	9J	25
	20250275-034	A 01	0.45*1220	3.406	3.436	120	RAL5005 /RAL9010	25/15	43.5	55	0.4	0.21	0.02	0.02	0.01	405	315	55	2T	40	100/90	9J	25
	20250275-035	A 01	0.45*1220	4.498	4.528	120	RAL6005 /RAL9010	25/15	43.5	55	0.4	0.21	0.02	0.02	0.01	405	315	55	2T	40	100/90	9J	25
	20250275-036	A 01	0.45*1220	4.618	4.648	120	RAL6005 /RAL9010	25/15	43.5	55	0.4	0.21	0.02	0.02	0.01	405	315	55	2T	40	100/90	9J	25
	20250275-037	A 01	0.45*1220	3.972	4.002	120	RAL9002 /RAL9010	25/15	43.5	55	0.4	0.21	0.02	0.02	0.01	405	315	55	2T	40	100/90	9J	25
	20250275-038	A 01	0.45*1220	3.980	4.010	120	RAL9002 /RAL9010	25/15	43.5	55	0.4	0.21	0.02	0.02	0.01	405	315	55	2T	40	100/90	9J	25
	20250275-039	A 01	0.45*1220	4.032	4.062	120	RAL9002 /RAL9010	25/15	43.5	55	0.4	0.21	0.02	0.02	0.01	405	315	55	2T	40	100/90	9J	25
			TOTAL	169.044	170.214																		
NOTE:				THIS PRODUCT CONFIRMS WITH ABOVE STANDARDS AND CONTRACT REQUIREMENTS, SHOULD YOU HAVE ANY QUESTION, PLEASE CONTACT US.																		
INSPECTOR:				XIAONA LIU		TOTAL NET WEIGHT:			169044 KGS								DATE OF ISSUE:				2025-9-20		

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
NIT 902013442-0

TUBERÍA SANITARIA

Puerto Gaitán – Meta
311 386 8024
Confisca25@gmail.com

5606

Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according ISO/IEC 17067) for:

TUBOS SANITARIOS - AGUAS LLUVIAS Y VENTILACIÓN

Fabricado por **CELTA S.A.S.**, en la **Carrera 24 No. 30 - 500, Soledad, Atlántico, Colombia**

Manufactured by **CELTA S.A.S.**, in the **Carrera 24 No. 30 - 500, Soledad, Atlántico, Colombia**

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

NTC 1087 (2016)

Tubos de poli(cloruro de vinilo) (PVC) rígido para uso sanitario, aguas lluvias y ventilación

Poly (vinyl chloride) (PVC) waste and vent pipe

SECTOR ICS 23.040.20

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "R-PS-019 Reglamento para la certificación de producto tangible", lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity of product is subject to the company's and product's permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the " R-PS-019 Reglamento para la Certificación de producto tangible" document, which will be verified by ICONTEC.

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certificate

Certificado CSC-0002-2
Certificate

Fecha de Aprobación: Approval Date:	1977-03-30	**Fecha Última Modificación:** Last Modification Date:	
Fecha de Renovación: Renewal Date:	2023-09-01	**Fecha de Vencimiento:** Expiration Date:	2029-08-31

La autenticidad del certificado y su alcance se puede consultar al correo electrónico: cliente@icontec.org

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

ICONTEC es un organismo de Certificacion acreditado por:
ICONTEC is a certification body accreditated by

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002

ID # 0677

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando sea solicitado
ICONTEC, Calle 26 # 69-79, Torre 4 "Agua", "Centro Empresarial Elemento", Bogotá D.C., Colombia

6007

CANAL

Puerto Gaitán – Meta
311 386 8024
Confisca25@gmail.com

6008

TANGSHAN FENGRUN SHENHENG STEEL CO., LTD

ADD: NORTH OF JINCHUANYUAN, CHANGZHUANG TOWN, TANGSHAN, CHINA

MILL TEST CERTIFICATE

TO: ARCOE S. A. S. (NIT: 9007835211)
ADD: CALLE 31 #26-31 BRR PROVENIR Villavicencio COLOMBIA
COMMODITY: PRIME PREPAINTED ALUZINC COILS (PPGL)
STANDARD: ASTM A755 CS-B AND ASTM A653 CS-B

DATE: 2026-03-01
TOTAL WEIGHT: 299.846 MT
TOTAL COILS: 74 COILS
CERTIFICATION NO.: SHS-LJL-2025828

COIL NO.	MATERIAL DESCRIPTION					CHEMICAL COMPOSITION %					MECHANICAL PROPERTIES		
	SIZE	COLOR (RAL)	NO.OF COILS	N.W. (MTS)	G.W. (MTS)	C	Si	Mn	P	S	PENCIL HARDNESS	BENDING TEST(J)	BENDING TEST(T)
260210D12	0.20*900	RAL3020	1	3.9	3.92	0.040	0.010	0.200	0.015	0.011	≥2H	≥9J	≤2T
260210D13	0.20*900	RAL3020	1	3.85	3.87	0.040	0.010	0.200	0.015	0.011	≥2H	≥9J	≤2T
260210D14	0.20*900	RAL3020	1	3.992	4.012	0.040	0.010	0.200	0.015	0.011	≥2H	≥9J	≤2T
260210D15	0.20*900	RAL3020	1	3.954	3.974	0.040	0.010	0.200	0.015	0.011	≥2H	≥9J	≤2T
260210D16	0.20*900	RAL5005	1	3.768	3.788	0.040	0.010	0.200	0.015	0.011	≥2H	≥9J	≤2T
260210D17	0.20*900	RAL5005	1	3.754	3.774	0.040	0.010	0.200	0.015	0.011	≥2H	≥9J	≤2T
260210D18	0.20*900	RAL5005	1	3.958	3.978	0.040	0.010	0.200	0.015	0.011	≥2H	≥9J	≤2T
260210D19	0.20*900	RAL5005	1	3.888	3.908	0.040	0.010	0.200	0.015	0.011	≥2H	≥9J	≤2T
260210D08	0.22*900	RAL3020	1	3.768	3.788	0.040	0.010	0.200	0.015	0.011	≥2H	≥9J	≤2T
260210D09	0.22*900	RAL3020	1	3.8	3.82	0.040	0.010	0.200	0.015	0.011	≥2H	≥9J	≤2T
260210D10	0.22*900	RAL3020	1	3.88	3.9	0.040	0.010	0.200	0.015	0.011	≥2H	≥9J	≤2T
260210D11	0.22*900	RAL3020	1	3.87	3.89	0.040	0.010	0.200	0.015	0.011	≥2H	≥9J	≤2T
260210D20	0.22*900	RAL5005	1	3.876	3.896	0.040	0.010	0.200	0.015	0.011	≥2H	≥9J	≤2T
260210D21	0.22*900	RAL5005	1	3.824	3.844	0.040	0.010	0.200	0.015	0.011	≥2H	≥9J	≤2T
260210D22	0.22*900	RAL5005	1	4.006	4.026	0.040	0.010	0.200	0.015	0.011	≥2H	≥9J	≤2T
260210D23	0.22*900	RAL5005	1	3.938	3.958	0.040	0.010	0.200	0.015	0.011	≥2H	≥9J	≤2T
260210C61	0.25*400*3COIL	RAL6029	1	3.722	3.742	0.040	0.010	0.200	0.015	0.011	≥2H	≥9J	≤2T
260210C62	0.25*400*3COIL	RAL6029	1	3.72	3.74	0.040	0.010	0.200	0.015	0.011	≥2H	≥9J	≤2T
260210C63	0.25*400*3COIL	RAL6029	1	3.776	3.796	0.040	0.010	0.200	0.015	0.011	≥2H	≥9J	≤2T
260210C64	0.25*400*3COIL	RAL6029	1	4.328	4.348	0.040	0.010	0.200	0.015	0.011	≥2H	≥9J	≤2T
260210D01	0.25*400*3COIL	RAL3020	1	4.4	4.42	0.040	0.010	0.200	0.015	0.011	≥2H	≥9J	≤2T

6009

260210D02	0.25*400*3COIL	RAL3020	1	3.736	3.756	0.040	0.010	0.200	0.015	0.011	≥2H	≥9J	≤2T
260210D03	0.25*400*3COIL	RAL3020	1	3.73	3.75	0.040	0.010	0.200	0.015	0.011	≥2H	≥9J	≤2T
260210D04	0.25*400*3COIL	RAL3020	1	3.776	3.796	0.040	0.010	0.200	0.015	0.011	≥2H	≥9J	≤2T
260210D05	0.25*400*3COIL	RAL5005	1	4.234	4.254	0.040	0.010	0.200	0.015	0.011	≥2H	≥9J	≤2T
260210D06	0.25*400*3COIL	RAL5005	1	4.244	4.264	0.040	0.010	0.200	0.015	0.011	≥2H	≥9J	≤2T
260210D07	0.25*400*3COIL	RAL5005	1	4.246	4.266	0.040	0.010	0.200	0.015	0.011	≥2H	≥9J	≤2T
260210C18	0.25*1220	RAL3020	1	3.776	3.796	0.040	0.010	0.200	0.015	0.011	≥2H	≥9J	≤2T
260210C19	0.25*1220	RAL3020	1	3.794	3.814	0.040	0.010	0.200	0.015	0.011	≥2H	≥9J	≤2T
260210C20	0.25*1220	RAL3020	1	3.776	3.796	0.040	0.010	0.200	0.015	0.011	≥2H	≥9J	≤2T
260210C21	0.25*1220	RAL3020	1	3.764	3.784	0.040	0.010	0.200	0.015	0.011	≥2H	≥9J	≤2T
260210C22	0.25*1220	RAL3020	1	3.774	3.794	0.040	0.010	0.200	0.015	0.011	≥2H	≥9J	≤2T
260210C23	0.25*1220	RAL3020	1	3.83	3.85	0.040	0.010	0.200	0.015	0.011	≥2H	≥9J	≤2T
260210C24	0.25*1220	RAL5005	1	3.742	3.762	0.040	0.010	0.200	0.015	0.011	≥2H	≥9J	≤2T
260210C25	0.25*1220	RAL5005	1	3.762	3.782	0.040	0.010	0.200	0.015	0.011	≥2H	≥9J	≤2T
260210C26	0.25*1220	RAL5005	1	3.784	3.804	0.040	0.010	0.200	0.015	0.011	≥2H	≥9J	≤2T
260210C27	0.25*1220	RAL5005	1	3.788	3.808	0.040	0.010	0.200	0.015	0.011	≥2H	≥9J	≤2T
260210C28	0.25*1220	RAL5005	1	3.81	3.83	0.040	0.010	0.200	0.015	0.011	≥2H	≥9J	≤2T
260210C29	0.25*1220	RAL5005	1	3.83	3.85	0.040	0.010	0.200	0.015	0.011	≥2H	≥9J	≤2T
260210C30	0.34*1220	RAL3020	1	4.364	4.384	0.040	0.010	0.200	0.015	0.011	≥2H	≥9J	≤2T
260210C31	0.34*1220	RAL3020	1	4.272	4.292	0.040	0.010	0.200	0.015	0.011	≥2H	≥9J	≤2T
260210C32	0.34*1220	RAL3020	1	4.176	4.196	0.040	0.010	0.200	0.015	0.011	≥2H	≥9J	≤2T
260210C33	0.34*1220	RAL3020	1	4.406	4.426	0.040	0.010	0.200	0.015	0.011	≥2H	≥9J	≤2T
260210C34	0.34*1220	RAL3020	1	4.348	4.368	0.040	0.010	0.200	0.015	0.011	≥2H	≥9J	≤2T
260210C39	0.34*1220	RAL5005	1	4.384	4.404	0.040	0.010	0.200	0.015	0.011	≥2H	≥9J	≤2T
260210C40	0.34*1220	RAL5005	1	4.28	4.3	0.040	0.010	0.200	0.015	0.011	≥2H	≥9J	≤2T
260210C41	0.34*1220	RAL5005	1	4.362	4.382	0.040	0.010	0.200	0.015	0.011	≥2H	≥9J	≤2T
260210C42	0.34*1220	RAL5005	1	4.27	4.29	0.040	0.010	0.200	0.015	0.011	≥2H	≥9J	≤2T
260210C43	0.34*1220	RAL5005	1	4.2	4.22	0.040	0.010	0.200	0.015	0.011	≥2H	≥9J	≤2T
260210C35	0.40*1220	RAL3020	1	3.182	3.202	0.040	0.010	0.200	0.015	0.011	≥2H	≥9J	≤2T
260210C36	0.40*1220	RAL3020	1	3.178	3.198	0.040	0.010	0.200	0.015	0.011	≥2H	≥9J	≤2T
260210C37	0.40*1220	RAL3020	1	3.102	3.122	0.040	0.010	0.200	0.015	0.011	≥2H	≥9J	≤2T
260210C38	0.40*1220	RAL3020	1	4.574	4.594	0.040	0.010	0.200	0.015	0.011	≥2H	≥9J	≤2T
260210C44	0.40*1220	RAL5005	1	4.348	4.368	0.040	0.010	0.200	0.015	0.011	≥2H	≥9J	≤2T

6070

260210C45	0.40*1220	RAL5005	1	4.324	4.344	0.040	0.010	0.200	0.015	0.011	≥2H	≥9J	≤2T
260210C46	0.40*1220	RAL5005	1	4.364	4.384	0.040	0.010	0.200	0.015	0.011	≥2H	≥9J	≤2T
260210C47	0.40*1220	RAL5005	1	4.306	4.326	0.040	0.010	0.200	0.015	0.011	≥2H	≥9J	≤2T
260210C48	0.40*1220	RAL6029	1	4.176	4.196	0.040	0.010	0.200	0.015	0.011	≥2H	≥9J	≤2T
260210C49	0.40*1220	RAL6029	1	3.834	3.854	0.040	0.010	0.200	0.015	0.011	≥2H	≥9J	≤2T
260210C50	0.40*1220	RAL6029	1	3.752	3.772	0.040	0.010	0.200	0.015	0.011	≥2H	≥9J	≤2T
260210C51	0.55*400*3COIL	RAL6029	1	4.292	4.312	0.040	0.010	0.200	0.015	0.011	≥2H	≥9J	≤2T
260210C52	0.55*400*3COIL	RAL6029	1	4.32	4.34	0.040	0.010	0.200	0.015	0.011	≥2H	≥9J	≤2T
260210C53	0.55*400*3COIL	RAL6029	1	4.02	4.04	0.040	0.010	0.200	0.015	0.011	≥2H	≥9J	≤2T
260210C54	0.55*400*3COIL	RAL5005	1	4.278	4.298	0.040	0.010	0.200	0.015	0.011	≥2H	≥9J	≤2T
260210C55	0.55*400*3COIL	RAL5005	1	4.246	4.266	0.040	0.010	0.200	0.015	0.011	≥2H	≥9J	≤2T
260210C56	0.55*400*3COIL	RAL5005	1	4.274	4.294	0.040	0.010	0.200	0.015	0.011	≥2H	≥9J	≤2T
260210C57	0.55*400*3COIL	RAL5005	1	4.258	4.278	0.040	0.010	0.200	0.015	0.011	≥2H	≥9J	≤2T
260210C58	0.55*400*3COIL	RAL3020	1	4.298	4.318	0.040	0.010	0.200	0.015	0.011	≥2H	≥9J	≤2T
260210C59	0.55*400*3COIL	RAL3020	1	4.272	4.292	0.040	0.010	0.200	0.015	0.011	≥2H	≥9J	≤2T
260210C60	0.55*400*3COIL	RAL3020	1	4.038	4.058	0.040	0.010	0.200	0.015	0.011	≥2H	≥9J	≤2T
D1Z126020615205	0.5*400*3COIL	GAL	1	4.355	4.375	0.040	0.010	0.200	0.015	0.011	≥2H	≥9J	≤2T
D1Z126020615204	0.5*400*3COIL	GAL	1	5.245	5.265	0.040	0.010	0.200	0.015	0.011	≥2H	≥9J	≤2T
D1Z126020615202	0.5*400*3COIL	GAL	1	5.245	5.265	0.040	0.010	0.200	0.015	0.011	≥2H	≥9J	≤2T
D1Z126020615201	0.5*400*3COIL	GAL	1	5.135	5.155	0.040	0.010	0.200	0.015	0.011	≥2H	≥9J	≤2T
TOTAL			74	299.846	301.326								

WE HEREBY CERTIFY THAT THE MATERIAL DESCRIBED HEREIN HAS BEEN MANUFACTURED AND TESTED
WITH SATISFATORY RESULT IN ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENT OF THE ABOVE MATERIAL SPECIFICATION.

唐山市丰润区申恒钢铁有限公司
TANGSHAN FENGRUN SHENHENG STEEL CO., LTD
QUALITY INSPECTION DEPARTMENT

MILL: TANGSHAN FENGRUN SHENHENG STEEL CO., LTD

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
NIT 902013442-0

ROLLO DE POLIETILENO

Puerto Gaitán – Meta
311 386 8024
Confisca25@gmail.com

Plastempack®
DE COLOMBIA SAS

6012

EMPAQUE Y EMBALAJE



FICHA TÉCNICA

ROLLO DE POLIETILENO

NEGRO-GRIS

CARACTERISTICAS

- ✓ COLOR: Negro-Gris
- ✓ MATERIAL: Polietileno
- ✓ Calibre : 4-6 mm
- ✓ Dimensiones: Ancho 3 y 4 mtrs
- ✓ Kilos varian según medida.
- ✓ PRESENTACIÓN: Por Kilos - 1 Rollo tiene aprox. 45 kilos

DISPONIBLE

- ✓ Calibre 4 x 3 metros de ancho - Kilo Aprox. 3.55 metro lineal
- ✓ Calibre 6 x 3 metros de ancho - Kilo Aprox. 2.37 metro lineal
- ✓ Calibre 4 x 4 metros de ancho - Kilo Aprox. 2.67 metro lineal
- ✓ Calibre 6 x 4 metros de ancho - Kilo Aprox. 1.77 metro lineal

DESCRIPCIÓN

EL ROLLO DE POLIETILENO o PLASTICO NEGRO-GRIS POR ROLLOS, se utiliza mucho en construcciones como recubrimiento, aislante de humedad, para crear muros temporales de privacidad, para empaques y embalajes, para cubrir muebles en construcciones, etc.

▶ Nota: Cada rollo tiene un peso variable según su medida.

USOS

Para múltiples usos en la construcción, en cimientos, plateas y estanques; como cobertura general de pisos, paredes y techos, impermeabilización de canales de riego , afluentes y desagües.



CALIBRES 4-6 MM

3.-4 MTRS

www.plastempack.com

SEDE PRINCIPAL

PBX: (57-601) 829 5743 - 829 5798
320 214 9004 - 321 983 4472
mercadeo@plastempack.com
Parque Industrial San Jorge Mz. P5 Bodega # 52 Troncal de Occidente Km 19 Vía Bogotá Mosquera Madrid - Colombia.

SEDE BOGOTÁ

PBX: (57-601) 261 3005 - 447 6304
320 344 8406 - 311 453 1985
comercial1@plastempack.com
Carrera 65 # 4D - 34 Zona Industrial Pradera Bogotá D.C - Colombia

plastempack

CERTIFICADO DE CALIDAD: ROLLO POLIETILENO BAJA DENSIDAD NEGRO

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO

DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO : Rollo polietileno baja densidad
DENOMINACIÓN TECNICA :Rollo polietileno baja densidad
UNIDAD DE MEDIDA : Kilos (Kg)
DESCRIPCIÓN GENERAL :Lamina coextruida con peletizado y pigmento
TONALIDAD: Negro
COEXTRUSION: Una capa
ANCHO: de 10" hasta 10 metros
Rendimiento: 0,0235 x espesor mil. De pulgadas +/- 10%



PROPIEDADES DIMENSIONALES - APARIENCIA

	Especificacion
ANCHO:	-1% + 3%
ESPESOR:	+/- 7,5 % CON RESPECTO A LA MEDIA
APARIENCIA	+/- 15% CON RESPECTO A LOS PUNTOS
	PRESENTA RUGOSIDAD

PROPIEDADES MECANICAS

	ESPECIFICACION
RESISTENCIA AL RASGADO	
DIRECCION MAQUINA:	700 gf min
DIRECCION TRANSVERSAL:	800 gf min
PORCENTAJE DE ELONGACION A LA ROTURA	
DIRECCION MAQUINA:	600% min
DIRECCION TRANSVERSAL:	650% min
CARGA A LA ROTURA	
DIRECCION MAQUINA:	16,3 Mpa min
DIRECCION TRANSVERSAL:	16,3 Mpa min

Nota: Datos obtenidos para una película espesor 6 milésimas de pulgada.
El uso de la información sobre productos y aplicaciones para otros casos es responsabilidad del cliente

OTRAS ESPECIFICACIONES

ROTULADO

El rotulado de los rollos de baja densidad llevara escrito en forma clara, en idioma español, la siguiente información:

1. Peso de rollo
2. Medida del rollo
3. Calibre del rollo
4. Operario

6097

CERTIFICACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA

Puerto Gaitán – Meta
311 386 8024
Confisca25@gmail.com

6018

CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25

16 de septiembre de 2026, Puerto Gaitán, Meta.

CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OBRA

En el marco del Contrato No. 1739 de 2026, cuyo objeto corresponde a la interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera, contable y jurídica para la construcción de la sede de la Fiscalía General de la Nación en el municipio de Puerto Gaitán – Meta, se certifica que, como parte de las actividades de seguimiento, control y verificación técnica del proyecto, se realizó inspección en campo de la maquinaria y equipos reportados por el Contratista de Obra, con el fin de constatar su disponibilidad, estado general e idoneidad para la ejecución de las actividades constructivas programadas.

A continuación, se relaciona la maquinaria y/o equipo empelado durante el periodo comprendido entre el 16/02/2026 y el 15/09/2026.

MAQUINARIA Y EQUIPO MENOR	CANTIDAD
Mezcladora	1
Vibrador de concreto	1
Retroexcavadora sobre llantas	1
Vibro compactador	1
Rotomartillo	1
Minicargador	1
Volqueta doble troque	1
Demoledor	1
Rana	1
Herramienta y equipo menor	1

Atentamente,

Fernando villegas

ING. FERNANDO JOSÉ VILLEGAS DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25
NIT 902017391-1

6019

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
NIT 902013442-0

PARCIAL NRO. 1 PMA

Puerto Gaitán – Meta
311 386 8024
Confisca25@gmail.com

6070

INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL COBRO PARCIAL NRO.1
PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CONTRATO DE OBRA NO. 1700 DE 2025

OBJETO:

CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – META

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
R/L ADOLFO VASQUEZ MOSCOSO

MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN
DEPARTAMENTO DEL META
SEPTIEMBRE

SEPTIEMBRE DE 2026

6021

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. GENERALIDADES DEL PROYECTO 3
2.1. DESCRIPCIÓN Y ALANCE DEL PROYECTO 4
2.2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO 4
2.3. Localización 6
3. MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL 7
4. ACTIVIDADES REPORTADAS PRESENTE ACTA PARCIAL NRO.1 8
4.1. PROGRAMA: PLANIFICACIÓN DE INTERVENCIONES Y REQUERIMIENTOS LEGALES – AMBIENTALES 8
4.2. PROGRAMA: RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS 17
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 21

6077

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde al soporte técnico, administrativo y financiero para el cobro de las actividades ejecutadas en el marco del Plan de Manejo Ambiental (PMA) del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – META", ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 16 de febrero y el 15 de septiembre de 2026, objeto de la presente Acta Parcial No. 1.

Durante el periodo reportado se dio cumplimiento a las obligaciones ambientales establecidas contractualmente, desarrollando actividades orientadas a la prevención, mitigación y control de los impactos ambientales asociados a la ejecución de la obra. Estas actividades fueron ejecutadas conforme a los lineamientos definidos en el PMA aprobado, cuyo valor total fue actualizado a OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($84.806.736,00) en virtud de la Modificatoria No. 01, Adición No. 01 y Prórroga No. 01, manteniendo seguimiento permanente a los programas ambientales implementados en el proyecto.

La presente acta parcial contempla únicamente actividades debidamente ejecutadas y verificadas en campo, las cuales cuentan con los respectivos soportes documentales, administrativos y financieros que acreditan su cumplimiento. En particular, el cobro corresponde a los costos asociados al personal encargado de la implementación y seguimiento ambiental del proyecto, soportados mediante los respectivos pagos de seguridad social y parafiscales, así como a las actividades relacionadas con la recolección, transporte y disposición final de residuos de construcción y demolición (RCD), realizadas a través de gestor autorizado y respaldadas mediante los respectivos certificados de disposición final.

.

2. GENERALIDADES DEL PROYECTO

La administración municipal de Puerto Gaitán - Meta, mediante el proceso de licitación pública No. LP-SI-009-2025 con objeto "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META", adjudicó el Contrato de Obra No. 1700 el 11 de diciembre de 2025 a la UNIÓN TEMPORAL CONFISCA25, bajo la supervisión del ing. Christian Julián Fernández Reyes, secretario de infraestructura.

En el marco de la ejecución del proyecto, y en atención a los ajustes técnicos requeridos frente a lo inicialmente proyectado, el 12 de agosto de 2026 fue aprobada y formalizada la Modificatoria No. 01, Adición No. 01 y Prórroga No. 01, mediante la cual se incorporaron los ajustes de mayores y menores cantidades de obra, así como las actividades e ítems complementarios necesarios para garantizar la funcionalidad, seguridad y correcta ejecución del proyecto. En virtud de dicha modificación, el Contrato de Obra No. 1700 de 2025 tuvo una adición por valor de MIL QUINIENTOS NUEVE MILLONES SETECIENTOS

SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($1.509.769.755,63), para un valor total actualizado de CINCO MIL QUINIENTOS DOCE MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS CON NUEVE CENTAVOS M/CTE ($5.512.219.514,09), condiciones sobre las cuales se sustenta el presente Informe de Pago Parcial No. 01, correspondiente a las actividades ejecutadas en el marco del Plan de Contingencia formulado para el proyecto.

2.1. DESCRIPCIÓN Y ALANCE DEL PROYECTO

El proyecto está orientado a la construcción de la sede de la fiscalía general de la nación en el municipio de Puerto Gaitán - Meta, cubriendo la necesidad de una infraestructura idónea para su funcionamiento, el cual consta de:

- Demoliciones
- Movimiento de tierras
- Cimientos, estructuras y elementos menores de concreto
- Muros, pañetes y pinturas
- Pisos, enchapes y urbanismo
- Cielorasos y cubiertas
- Carpintería metálica
- Redes hidrosanitarias y pluviales
- Sistema de aire acondicionado
- Red eléctrica, voz y datos
- Zonas verdes
- Sistema fotovoltaico

2.2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

Cuadro de Trazabilidad

No. PROCESO:	LP-SI-009-2025
No. Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	1700 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2025
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL CONFISCA 25** NIT. 902.013.442-0 R. /L ADOLFO VASQUEZ MOSCOSO C.C 1.023.879.760 DE BOGOTÁ D.C CORREO: consfisca25@gmail.com


VALOR DEL CONTRATO:	**VALOR VIGENCIA 2025:** QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE **($597.596.423,40)** **VALOR VIGENCIA 2026:** TRES MIL CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON SEIS CENTAVOS M/CTE **($3.404.853.335,06)** **VALOR TOTAL:** CUATRO MIL DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE **($4.002.449.758,46)**
PLAZO EJECUCIÓN:	DOCE (12) MESES
INTERVENTORÍA	**CONSORCIO INTERFISCA GAITAN25** FERNANDO JOSÉ VILLEGAS DIAZ REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 1739 DE 2025. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN"
SUPERVISOR:	CHRISTIAN JULIÁN FERNÁNDEZ REYES SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
FECHA DE INICIO:	DIECISÉIS (16) DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	QUINCE (15) DE FEBRERO DE 2027
FECHA ACTA DE MODIFICACIÓN NO. 01, ADICIÓN NO. 01 Y PRÓRROGA NO. 01:	DOCE (12) DE AGOSTO DE 2026
VALOR ADICIÓN No. 1:	MIL QUINIENTOS NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE **($1.509.769.755.63)**

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:	CINCO MIL QUINIENTOS DOCE MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS CON NUEVE CENTAVOS M/CTE **($5.512.219.514.09)**
PRORROGA No. 1	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	QUINCE (15) DE ABRIL DE 2027

2.3. Localización

La obra se localiza en el municipio de Puerto Gaitán Meta, en el predio con coordenadas: 4°18'44.56" N y 72°4'51.96" O y dirección: 1) Calle 10 # 6-60 y 2) Carrea 7 # 10-22 en el barrio Centro.

Ilustración 1. Localización general del Proyecto

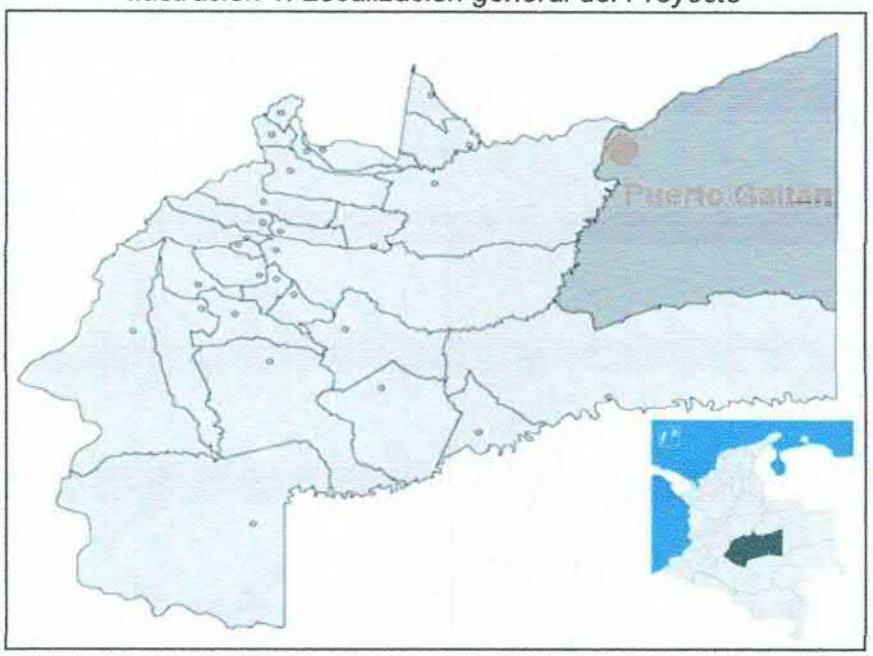

Fuente: Pagina Web, Wikipedia
Ilustración 2. Localización especifica



Fuente: Propia a base de Google Earth

3. MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL

El Plan de Manejo Ambiental – PMA, contendrá las medidas previstas para prevenir, mitigar, controlar y corregir los impactos ambientales negativos generados sobre el entorno, los recursos naturales y las comunidades del área de influencia directa e indirecta del proyecto. Dichas medidas serán plasmadas en programas que a su vez se derivan en proyectos específicos de acuerdos a las acciones que implican las etapas constructivas.

A continuación, la presente tabla relaciona los programas que deberá contener el PMA, con sus respectivos proyectos aplicables al objeto del contrato.

Tabla 1. Cuadro resumen de las actividades de Gestion Ambiental .

Programas	Proyectos
Desarrollo y Aplicación de la Gestión Ambiental	Planificación de intervenciones y demás requerimientos legales ambientales.
Actividades Constructivas	Manejo integral de residuos de construcción y demolición RCD
	Manejo de residuos sólidos convencionales
	Manejo de residuos peligrosos.
	Manejo de materiales de construcción no pétreos
	Manejo de agregados pétreos
	Proyecto de señalización frentes de obras y sitios temporales

Programas	Proyectos
Manejo de la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos	Protección de Fauna
Gestión Hídrica	Manejo de aguas residuales y lluvias -PUEAA
Gestión de contaminación Atmosférica	Control de la contaminación atmosférica, ruido
Manejo de Instalaciones Temporales de Maquinaria y Equipos	Manejo de Maquinaria, equipos y vehículos
	Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos
Gestión Social	Información y divulgación

AVANCE RECURSOS DURANTE EL PERIODO – PMA

Cuadro 2.Avance de recursos del PMA

AVANCE DE RECURSOS EJECUTADOS PMA		
CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – META		
Valor PMA inicial	**$ 82.473.936,00**	
Valor PMA Actualizado Modf.01	**$ 84.806.736,00**	100,0%
Ejecución reporte Mes.1 (febrero)	$ 6.308.000,00	7,44%
Ejecución reporte Mes 2 (marzo)	$ 10.773.880,00	12,70%
Ejecución reporte Mes 3 (abril)	$ 40.366.400,00	47,60%
Ejecución reporte Mes 4 (mayo)	$ 18.797.600,00	22,17%
Ejecución reporte Mes 5 (junio)	$ 1.166.400,00	1,38%
Ejecución reporte Mes 6 (Julio)	$ 1.166.400,00	1,38%
Ejecución reporte Nro.7 (agosto)	$ 1.166.400,00	1,38%
VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL NRO.1	**$ 79.745.080,00**	94,03%

4. ACTIVIDADES REPORTADAS PRESENTE ACTA PARCIAL NRO.1

4.1. PROGRAMA: PLANIFICACIÓN DE INTERVENCIONES Y REQUERIMIENTOS LEGALES – AMBIENTALES

Conformación del grupo de gestión ambiental

Durante el periodo objeto de cobro se ejecutaron las actividades correspondientes al componente administrativo y operativo del Plan de Manejo Ambiental, garantizando la implementación, seguimiento y control de las medidas ambientales requeridas para el desarrollo del proyecto. Dentro de estas actividades se incluye la participación permanente del personal ambiental encargado de la ejecución del PMA, dentro del cual la especialista ambiental es remunerada con recursos del PMA, de acuerdo con la dedicación establecida en el presupuesto de dicho plan, cuyos costos se encuentran debidamente soportados mediante planillas de pago de seguridad social, aportes parafiscales y demás documentos exigidos contractualmente.

NOMBRE	CARGO	DEDICACIÓN	FUENTE DEL RECURSO
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	DIRECTOR DE OBRA	20%	AIU
CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ	RESIDENTE DE OBRA	100%	AIU
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	ESPECIALISTA AMBIENAL	30%	PMA

Reporte de vinculación de personal periodo reportado para la presente Acta Parcial Nro.1

FEBRERO

NOMBRES	IDENTIFICACIÓN	CARGO	No. PLANILLA	AFP	EPS	ARL
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	40.186.168	DIRECTOR DE OBRA / ESP. AMBIENTAL	5168016991	COLPENSIONES	SALUD TOTAL	SURA
CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ	86.062.096	RESIDENTE DE OBRA	5168016991	PORVENIR	SALUD TOTAL	SURA
DENISE ROCIO MARTÍNEZ MOLINA	52.481.418	PROF EN SALUD OCUPACIONAL	5168016991	COLPENSIONES	SANITAS	SURA
DIEGO LEONARDO PÁEZ MONTERO	1.121.946.586	INGENIERO DE APOYO TÉCNICO	5168016991	PORVENIR	SANITAS	SURA
MARIA FERNANDA PULIDO RODRÍGUEZ	1.049.653.548	INGENIERO DE APOYO TÉCNICO	5168016991	PORVENIR	SANITAS	SURA



UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25

NIT 902013442-0

NOMBRES	IDENTIFICACIÓN	CARGO	No. PLANILLA	AFP	EPS	ARL
WILLIAM ALEXANDER BEJARANO MORENO	1.121.829.244	AUX. OPERATIVO INTEGRAL / CONTROLADOR VIAL	5168016991	PORVENIR	SANITAS	SURA
CRISTIAN ALEXANDER MORA GARZÓN	1.006.783.220	INSPECTOR DE OBRA	5168016991	PORVENIR	NUEVA EPS	SURA
CESAR AUGUSTO HERNÁNDEZ CALDERÓN	3.215.459	OFICIAL DE OBRA	5168016991	PORVENIR	SANITAS	SURA
WALFRAN PÉREZ CARIBAN	1.124.991.535	AYUDANTE DE OBRA	5168016991	PORVENIR	MALLAMAS	SURA
MAYCOL SAMUEL HERNÁNDEZ VANEGAS	1.124.818.911	AYUDANTE DE OBRA	5168016991	PORVENIR	CAJACOPI	SURA
DANIEL ANDRÉS AYALA ROJAS	1.124.818.810	AYUDANTE DE OBRA	5168016991	PORVENIR	SALUD TOTAL	SURA

MARZO

NOMBRES	IDENTIFICACIÓN	CARGO	No. PLANILLA	AFP	EPS	ARL
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	40.186.168	DIRECTOR DE OBRA / ESP. AMBIENTAL	5168381746	COLPENSIONES	SALUD TOTAL	SURA
CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ	86.062.096	RESIDENTE DE OBRA	5168381746	PORVENIR	SALUD TOTAL	SURA
DENISE ROCIO MARTÍNEZ MOLINA	52.481.418	PROF EN SALUD OCUPACIONAL	5168381746	COLPENSIONES	SANITAS	SURA
DIEGO LEONARDO PÁEZ MONTERO	1.121.946.586	INGENIERO DE APOYO TÉCNICO	5168381746	PORVENIR	SANITAS	SURA
MARIA FERNANDA PULIDO RODRÍGUEZ	1.049.653.548	INGENIERO DE APOYO TÉCNICO	5168381746	PORVENIR	SANITAS	SURA
WILLIAM ALEXANDER BEJARANO MORENO	1.121.829.244	AUX. OPERATIVO INTEGRAL / CONTROLADOR VIAL	5168381746	PORVENIR	SANITAS	SURA
CRISTIAN ALEXANDER MORA GARZÓN	1.006.783.220	INSPECTOR DE OBRA	5168381746	PORVENIR	NUEVA EPS	SURA
WALFRAN PÉREZ CARIBAN	1.124.991.535	AYUDANTE DE OBRA	5168381746	PORVENIR	MALLAMAS	SURA
MAYCOL SAMUEL HERNÁNDEZ VANEGAS	1.124.818.911	AYUDANTE DE OBRA	5168381746	PORVENIR	PROTEGER	SURA
DANIEL ANDRÉS AYALA ROJAS	1.124.818.810	AYUDANTE DE OBRA	5168381746	PORVENIR	SALUD TOTAL	SURA
CESAR AUGUSTO HERNÁNDEZ CALDERÓN	3.215.459	OFICIAL DE OBRA	5168381746	PORVENIR	SANITAS	SURA

NOMBRES	IDENTIFICACIÓN	CARGO	No. PLANILLA	AFP	EPS	ARL
JABIER DARÍO HERNÁNDEZ CALDERÓN	74.325.151	AYUDANTE DE OBRA	5168381746	PORVENIR	FAMISANAR	SURA
JOSÉ SÁNCHEZ USECHE	7.248.128	AUXILIAR DE PATIO	5168381746	N/A	SALUD TOTAL	SURA
CRISTIAN FERNANDO PARDO VARGAS	1.006.776.906	AYUDANTE DE OBRA	5168381746	PORVENIR	PIJAO SALUD	SURA
WILLIAM TRIGOS MORENO	86.047.574	OFICIAL DE OBRA	5168381746	PORVENIR	CAPITAL SALUD	SURA
CAMILO ANDRÉS RODRÍGUEZ VEGA	1.006.691.448	AYUDANTE DE OBRA	5168381746	PORVENIR	NUEVA EPS	SURA

ABRIL

NOMBRES	IDENTIFICACIÓN	CARGO	No. PLANILLA	AFP	EPS	ARL
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	40.186.168	DIRECTOR DE OBRA / ESP. AMBIENTAL	5168896592	COLPENSIONES	SALUD TOTAL	SURA
CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ	86.062.096	RESIDENTE DE OBRA	5168896592	PORVENIR	SALUD TOTAL	SURA
DENISE ROCIO MARTÍNEZ MOLINA	52.481.418	PROF EN SALUD OCUPACIONAL	5168896592	COLPENSIONES	SANITAS	SURA
DIEGO LEONARDO PÁEZ MONTERO	1.121.946.586	INGENIERO DE APOYO TÉCNICO	5168896592	PORVENIR	SANITAS	SURA
WILLIAM ALEXANDER BEJARANO MORENO	1.121.829.244	CONTROLADOR VIAL	5168896592	PORVENIR	SANITAS	SURA
CRISTIAN ALEXANDER MORA GARZÓN	1.006.783.220	INSPECTOR DE OBRA	5168896592	PORVENIR	NUEVA EPS	SURA
WALFRAN PÉREZ CARIBAN	1.124.991.535	AYUDANTE DE OBRA	5168896592	PORVENIR	MALLAMAS	SURA
MAYCOL SAMUEL HERNÁNDEZ VANEGAS	1.124.818.911	AYUDANTE DE OBRA	5168896592	PORVENIR	PROTEGER	SURA
DANIEL ANDRÉS AYALA ROJAS	1.124.818.810	AYUDANTE DE OBRA	5168896592	PORVENIR	SALUD TOTAL	SURA
CESAR AUGUSTO HERNÁNDEZ CALDERÓN	3.215.459	OFICIAL DE OBRA	5168896592	PORVENIR	SANITAS	SURA
JABIER DARÍO HERNÁNDEZ CALDERÓN	74.325.151	AYUDANTE DE OBRA	5168896592	PORVENIR	FAMISANAR	SURA
JOSÉ SÁNCHEZ USECHE	7.248.128	AUXILIAR DE PATIO	5168896592	N/A	SALUD TOTAL	SURA
CRISTIAN FERNANDO PARDO VARGAS	1.006.776.906	AYUDANTE DE OBRA	5168896592	PORVENIR	PIJAO SALUD	SURA
WILLIAM TRIGOS MORENO	86.047.574	OFICIAL DE OBRA	5168896592	PORVENIR	CAPITAL SALUD	SURA
CAMILO ANDRÉS RODRÍGUEZ VEGA	1.006.691.448	AYUDANTE DE OBRA	5168896592	PORVENIR	NUEVA EPS	SURA
LEIDER ESTEBAN DARAPO GAITAN	1.134.450.031	AYUDANTE DE OBRA	5168896592	PROTECCIÓN	NUEVA EPS	SURA
DANY FABIAN JAIMES CAAMAÑO	1.052.413.449	AYUDANTE DE OBRA	5168896592	PROTECCIÓN	FAMISANAR	SURA

MAYO

NOMBRES	IDENTIFICACIÓN	CARGO	No. PLANILLA	AFP	EPS	ARL
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	40.186.168	DIRECTOR DE OBRA / ESP. AMBIENTAL	5168986796	COLPENSIONES	SALUD TOTAL	SURA
CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ	86.062.096	RESIDENTE DE OBRA	5168986796	PORVENIR	SALUD TOTAL	SURA
DENISE ROCIO MARTÍNEZ MOLINA	52.481.418	PROF EN SALUD OCUPACIONAL	5168986796	COLPENSIONES	SANITAS	SURA
DIEGO LEONARDO PÁEZ MONTERO	1.121.946.586	INGENIERO DE APOYO TÉCNICO	5168986796	PORVENIR	SANITAS	SURA
WILLIAM ALEXANDER BEJARANO MORENO	1.121.829.244	CONTROLADOR VIAL	5168986796	PORVENIR	SANITAS	SURA
CRISTIAN ALEXANDER MORA GARZÓN	1.006.783.220	INSPECTOR DE OBRA	5168986796	PORVENIR	NUEVA EPS	SURA
WALFRAN PÉREZ CARIBAN	1.124.991.535	AYUDANTE DE OBRA	5168986796	PORVENIR	MALLAMAS	SURA
MAYCOL SAMUEL HERNÁNDEZ VANEGAS	1.124.818.911	AYUDANTE DE OBRA	5168986796	PORVENIR	PROTEGER	SURA
DANIEL ANDRÉS AYALA ROJAS	1.124.818.810	AYUDANTE DE OBRA	5168986796	PORVENIR	SALUD TOTAL	SURA
CESAR AUGUSTO HERNÁNDEZ CALDERÓN	3.215.459	OFICIAL DE OBRA	5168986796	PORVENIR	SANITAS	SURA
JABIER DARÍO HERNÁNDEZ CALDERÓN	74.325.151	AYUDANTE DE OBRA	5168986796	PORVENIR	FAMISANAR	SURA
JOSÉ SÁNCHEZ USECHE	7.248.128	AUXILIAR DE PATIO	5168986796	N/A	SALUD TOTAL	SURA
CRISTIAN FERNANDO PARDO VARGAS	1.006.776.906	AYUDANTE DE OBRA	5168986796	PORVENIR	PIJAO SALUD	SURA
WILLIAM TRIGOS MORENO	86.047.574	OFICIAL DE OBRA	5168986796	PORVENIR	CAPITAL SALUD	SURA
CAMILO ANDRÉS RODRÍGUEZ VEGA	1.006.691.448	AYUDANTE DE OBRA	5168986796	PORVENIR	NUEVA EPS	SURA
LEIDER ESTEBAN DARAPO GAITAN	1.134.450.031	AYUDANTE DE OBRA	5168986796	PROTECCIÓN	NUEVA EPS	SURA
DANY FABIAN JAIMES CAAMAÑO	1.052.413.449	AYUDANTE DE OBRA	5168986796	PROTECCIÓN	FAMISANAR	SURA

JUNIO

NOMBRES	IDENTIFICACIÓN	CARGO	No. PLANILLA	AFP	EPS	ARL
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	40.186.168	DIRECTOR DE OBRA / ESP. AMBIENTAL	5169061125	COLPENSIONES	SALUD TOTAL	SURA
CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ	86.062.096	RESIDENTE DE OBRA	5169061125	PORVENIR	SALUD TOTAL	SURA

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25

NIT 902013442-0

NOMBRES	IDENTIFICACIÓN	CARGO	No. PLANILLA	AFP	EPS	ARL
DENISE ROCIO MARTÍNEZ MOLINA	52.481.418	PROF EN SALUD OCUPACIONAL	5169061125	COLPENSIONES	SANITAS	SURA
DIEGO LEONARDO PÁEZ MONTERO	1.121.946.586	INGENIERO DE APOYO TÉCNICO	5169061125	PORVENIR	SANITAS	SURA
WILLIAM ALEXANDER BEJARANO MORENO	1.121.829.244	AUXILIAR OPERATIVO INTEGRAL	5169061125	PORVENIR	SANITAS	SURA
CRISTIAN ALEXANDER MORA GARZÓN	1.006.783.220	INSPECTOR DE OBRA	5169061125	PORVENIR	NUEVA EPS	SURA
WALFRAN PÉREZ CARIBAN	1.124.991.535	CONTROLADOR VIAL	5169061125	PORVENIR	MALLAMAS	SURA
MAYCOL SAMUEL HERNÁNDEZ VANEGAS	1.124.818.911	AYUDANTE DE OBRA	5169061125	PORVENIR	PROTEGER	SURA
CESAR AUGUSTO HERNÁNDEZ CALDERÓN	3.215.459	OFICIAL DE OBRA	5169061125	PORVENIR	SANITAS	SURA
JABIER DARIO HERNANDEZ CALDERON	74.325.151	AYUDANTE DE OBRA	5169061125	PORVENIR	FAMISANAR	SURA
JOSE SANCHEZ USECHE	7.248.128	AUXILIAR DE PATIO	5169061125	N/A	SALUD TOTAL	SURA
CRISTIAN FERNANDO PARDO VARGAS	1.006.776.906	AYUDANTE DE OBRA	5169061125	PORVENIR	PIJAO SALUD	SURA
WILLIAM TRIGOS MORENO	86.047.574	OFICIAL DE OBRA	5169061125	PORVENIR	CAPITAL SALUD	SURA
CAMILO ANDRES RODRIGUEZ VEGA	1.006.691.448	AYUDANTE DE OBRA	5169061125	PORVENIR	NUEVA EPS	SURA
LEIDER ESTEBAN DARAPO GAITAN	1.134.450.031	AYUDANTE DE OBRA	5169061125	PROTECCION	NUEVA EPS	SURA
DANY FABIAN JAIMES CAAMAÑO	1.052.413.449	AYUDANTE DE OBRA	5169061125	PROTECCION	FAMISANAR	SURA
ADOLFO VASQUEZ MOSCOSO	1.023.879.760	REPRESENTANTE LEGAL	5169061125	PORVENIR	FAMISANAR	SURA

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25

NIT 902013442-0

JULIO

NOMBRES	IDENTIFICACIÓN	CARGO	No. PLANILLA	AFP	EPS	ARL
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	40.186.168	DIRECTOR DE OBRA / ESP. AMBIENTAL	1751659971	COLPENSIONES	SALUD TOTAL	SURA
CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ	86.062.096	RESIDENTE DE OBRA	1751659971	PORVENIR	SALUD TOTAL	SURA
DENISE ROCIO MARTÍNEZ MOLINA	52.481.418	PROF EN SALUD OCUPACIONAL	1751659971	COLPENSIONES	SANITAS	SURA
DIEGO LEONARDO PÁEZ MONTERO	1.121.946.586	INGENIERO DE APOYO TÉCNICO	1751659971	PORVENIR	SANITAS	SURA
WILLIAM ALEXANDER BEJARANO MORENO	1.121.829.244	AUXILIAR OPERATIVO INTEGRAL	1751659971	PORVENIR	SANITAS	SURA
CRISTIAN ALEXANDER MORA GARZÓN	1.006.783.220	INSPECTOR DE OBRA	1751659971	PORVENIR	NUEVA EPS	SURA
WALFRAN PÉREZ CARIBAN	1.124.991.535	CONTROLADOR VIAL	1751659971	PORVENIR	MALLAMAS	SURA
MAYCOL SAMUEL HERNÁNDEZ VANEGAS	1.124.818.911	AYUDANTE DE OBRA	1751659971	PORVENIR	PROTEGER	SURA
CESAR AUGUSTO HERNÁNDEZ CALDERÓN	3.215.459	OFICIAL DE OBRA	1751659971	PORVENIR	SANITAS	SURA
JABIER DARIO HERNANDEZ CALDERON	74.325.151	AYUDANTE DE OBRA	1751659971	PORVENIR	FAMISANAR	SURA
JOSE SANCHEZ USECHE	7.248.128	AUXILIAR DE PATIO	1751659971	N/A	SALUD TOTAL	SURA
CRISTIAN FERNANDO PARDO VARGAS	1.006.776.906	AYUDANTE DE OBRA	1751659971	PORVENIR	PIJAO SALUD	SURA
WILLIAM TRIGOS MORENO	86.047.574	OFICIAL DE OBRA	1751659971	PORVENIR	CAPITAL SALUD	SURA
LEIDER ESTEBAN DARAPO GAITAN	1.134.450.031	AYUDANTE DE OBRA	1751659971	PROTECCION	NUEVA EPS	SURA
DANY FABIAN JAIMES CAAMAÑO	1.052.413.449	AYUDANTE DE OBRA	1751659971	PROTECCION	FAMISANAR	SURA
ADOLFO VASQUEZ MOSCOSO	1.023.879.760	REPRESENTANTE LEGAL	1751659971	PORVENIR	FAMISANAR	SURA

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25

NIT 902013442-0

AGOSTO

NOMBRES	IDENTIFICACIÓN	CARGO	No. PLANILLA	AFP	EPS	ARL
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	40.186.168	DIRECTOR DE OBRA / ESP. AMBIENTAL	5169240119	COLPENSIONES	SALUD TOTAL	SURA
CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ	86.062.096	RESIDENTE DE OBRA	5169240119	PORVENIR	SALUD TOTAL	SURA
DENISE ROCIO MARTÍNEZ MOLINA	52.481.418	PROF EN SALUD OCUPACIONAL	5169240119	COLPENSIONES	SANITAS	SURA
DIEGO LEONARDO PÁEZ MONTERO	1.121.946.586	INGENIERO DE APOYO TÉCNICO	5169240119	PORVENIR	SANITAS	SURA
WILLIAM ALEXANDER BEJARANO MORENO	1.121.829.244	AUXILIAR OPERATIVO INTEGRAL	5169240119	PORVENIR	SANITAS	SURA
CRISTIAN ALEXANDER MORA GARZÓN	1.006.783.220	INSPECTOR DE OBRA	5169240119	PORVENIR	NUEVA EPS	SURA
ADOLFO VASQUEZ MOSCOSO	1.023.879.760	REPRESENTANTE LEGAL	5169240119	PORVENIR	FAMISANAR	SURA
JABIER DARIO HERNANDEZ CALDERON	74.325.151	AYUDANTE DE OBRA	5169240119	PORVENIR	FAMISANAR	SURA
JOSE SANCHEZ USECHE	7.248.128	AUXILIAR DE PATIO	5169240119	N/A	SALUD TOTAL	SURA
CRISTIAN FERNANDO PARDO VARGAS	1.006.776.906	AYUDANTE DE OBRA	5169240119	PORVENIR	PIJAO SALUD	SURA
WILLIAM TRIGOS MORENO	86.047.574	OFICIAL DE OBRA	5169240119	PORVENIR	CAPITAL SALUD	SURA
ENMANUEL RAFAEL ESCORCIA SILVA	18.959.208	OFICIAL DE OBRA	5169240119	COLFONDOS	COOSALUD	SURA
JUAN CAMILO GUZMAN PEREZ	1.023.374.553	CONTROLADOR VIAL	5169240119	COLPENSIONES	CAPITAL SALUD	SURA
JORGE VERGARA	1.010.026.192	AYUDANTE DE OBRA	5169240119	PORVENIR	NUEVA EPS	SURA
JULIO ELIAS HERNANDEZ QUINTANA	13.565.981	OFICIAL DE OBRA	5169240119	PORVENIR	NUEVA EPS	SURA
LAURA JULIANA LOPEZ LANDAETA	1.006.822.811	ING. DE APOYO TECNICO	5169240119	PORVENIR	COOSALUD	SURA
EDWIN GEOVANNY RAMIREZ CASTRO	86.060.299	ING. DE APOYO TECNICO	5169240119	PORVENIR	SANITAS	SURA
JIM MARIO FLOREZ RODRIGUEZ	88.249.434	AYUDANTE DE OBRA	5169240119	PORVENIR	SAVIA SALUD	SURA
LIBER AGUSTO ACERO QUESADA	1.121.417.962	AYUDANTE DE OBRA	5169240119	PORVENIR	SALUD TOTAL	SURA

NOMBRES	IDENTIFICACIÓN	CARGO	No. PLANILLA	AFP	EPS	ARL
JHON ALEXANDER ESGUERRA TRIANA	1.070.597.147	AYUDANTE DE OBRA	5169240119	PORVENIR	SANITAS	SURA
CAMILO ANDRES RAMIREZ	1.124.818.451	AYUDANTE DE OBRA	5169240119	PORVENIR	NUEVA EPS	SURA

SEPTIEMBRE

Para el mes de septiembre, en cuanto al personal vinculado, se relaciona el correspondiente al corte del 15 de septiembre de 2026.

NOMBRES	IDENTIFICACIÓN	CARGO	No. PLANILLA	AFP	EPS	ARL
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	40,186,168	DIRECTOR DE OBRA / ESP. AMBIENTAL	5169288812	COLPENSIONES	SALUD TOTAL	SURA
CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ	86,062,096	RESIDENTE DE OBRA	5169288812	PORVENIR	SALUD TOTAL	SURA
DENISE ROCIO MARTÍNEZ MOLINA	52,481,418	PROF EN SALUD OCUPACIONAL	5169288812	COLPENSIONES	SANITAS	SURA
DIEGO LEONARDO PÁEZ MONTERO	1,121,946,586	INGENIERO DE APOYO TÉCNICO	5169288812	PORVENIR	SANITAS	SURA
WILLIAM ALEXANDER BEJARANO MORENO	1,121,829,244	AUXILIAR OPERATIVO INTEGRAL	5169288812	PORVENIR	SANITAS	SURA
CRISTIAN ALEXANDER MORA GARZÓN	1,006,783,220	INSPECTOR DE OBRA	5169288812	PORVENIR	NUEVA EPS	SURA
ADOLFO VASQUEZ MOSCOSO	1,023,879,760	REPRESENTANTE LEGAL	5169288812	PORVENIR	FAMISANAR	SURA
JABIER DARIO HERNANDEZ CALDERON	74,325,151	AYUDANTE DE OBRA	5169288812	PORVENIR	FAMISANAR	SURA
JOSE SANCHEZ USECHE	7,248,128	AUXILIAR DE PATIO	5169288812	N/A	SALUD TOTAL	SURA
CRISTIAN FERNANDO PARDO VARGAS	1,006,776,906	AYUDANTE DE OBRA	5169288812	PORVENIR	PIJAO SALUD	SURA
WILLIAM TRIGOS MORENO	86,047,574	OFICIAL DE OBRA	5169288812	PORVENIR	CAPITAL SALUD	SURA
ENMANUEL RAFAEL ESCORCIA SILVA	18,959,208	OFICIAL DE OBRA	5169288812	COLFONDOS	COOSALUD	SURA

NOMBRES	IDENTIFICACIÓN	CARGO	No. PLANILLA	AFP	EPS	ARL
JUAN CAMILO GUZMAN PEREZ	1,023,374,553	CONTROLADOR VIAL	5169288812	COLPENSIONES	CAPITAL SALUD	SURA
JORGE VERGARA	1,010,026,192	AYUDANTE DE OBRA	5169288812	PORVENIR	NUEVA EPS	SURA
JULIO ELIAS HERNANDEZ QUINTANA	13,565,981	OFICIAL DE OBRA	5169288812	PORVENIR	NUEVA EPS	SURA
LAURA JULIANA LOPEZ LANDAETA	1,006,822,811	ING. DE APOYO TECNICO	5169288812	PORVENIR	COOSALUD	SURA
JIM MARIO FLOREZ RODRIGUEZ	88,249,434	AYUDANTE DE OBRA	5169288812	PORVENIR	SAVIA SALUD	SURA
LIBER AGUSTO ACERO QUESADA	1,121,417,962	AYUDANTE DE OBRA	5169288812	PORVENIR	SALUD TOTAL	SURA
PABLO REYES CHIPIAJE	PPP 5140206	AYUDANTE DE OBRA	5169288812	PORVENIR	NUEVA EPS	SURA
JHON ALEXANDER ESGUERRA TRIANA	1,070,597,147	AYUDANTE DE OBRA	5169288812	PORVENIR	SANITAS	SURA
CAMILO ANDRES RAMIREZ	1,124,818,451	AYUDANTE DE OBRA	5169288812	PORVENIR	NUEVA EPS	SURA
GUSTAVO ANTONIO DEANTONIO GARCIA	97,611,039	OFICIAL DE OBRA	5169288812	PORVENIR	FAMISANAR	SURA

4.2. PROGRAMA: RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS

Disposición Final de RCDs

Durante el período objeto de cobro se desarrollaron las actividades correspondientes al manejo integral de los residuos de construcción y demolición (RCD) generados por las actividades de descapote, excavaciones, demoliciones y demás labores constructivas ejecutadas en el proyecto. En cumplimiento de las disposiciones ambientales vigentes y de las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA), los residuos fueron inicialmente acopiados de manera temporal dentro del frente de obra en zonas previamente definidas para tal fin, garantizando condiciones adecuadas de almacenamiento, control y manejo, evitando la dispersión de materiales hacia las vías públicas, predios vecinos, sistemas de drenaje y demás áreas de influencia del proyecto.

Posteriormente, los materiales fueron cargados y transportados mediante vehículos autorizados hacia un sitio de disposición final debidamente autorizado para la recepción y manejo de este tipo de residuos, dando cumplimiento a lo establecido en la normatividad ambiental aplicable y a los lineamientos de gestión integral de RCD. Estas actividades fueron ejecutadas procurando mantener condiciones adecuadas de orden y aseo en el

frente de obra, minimizando posibles impactos ambientales asociados al manejo de materiales sobrantes y residuos generados durante el proceso constructivo.

La disposición final de los residuos fue realizada a través de la empresa ZODME GUATIQUÍA S.A.S., identificada con NIT 901.313.682-5, ubicada en la ciudad de Villavicencio, Meta, empresa autorizada para la recepción, manejo y disposición de residuos de construcción y demolición. Como soporte de la correcta gestión realizada, se anexa al presente informe el Certificado de Disposición Final No. 1303, expedido el 01 de abril de 2026, documento mediante el cual se acredita la adecuada disposición de los materiales entregados, garantizando el cumplimiento de los requisitos ambientales exigidos para el desarrollo del proyecto.

Registro fotográfico	
	
	

Registro fotográfico	
	
	
	

Registro fotográfico	
	
	
	

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Durante el periodo comprendido entre el 16 de febrero y el 15 de septiembre de 2026, el Contratista ejecutó las actividades contempladas dentro de los diferentes programas y proyectos del Plan de Manejo Ambiental (PMA), dando cumplimiento a las medidas de prevención, manejo y control ambiental requeridas para el desarrollo del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – META", en atención al valor total actualizado de dicho componente conforme a la Modificatoria No. 01, Adición No. 01 y Prórroga No. 01, el cual asciende a OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($84.806.736,00).

- Para la presente Acta Parcial No. 1 se solicita el reconocimiento de recursos por valor de SETENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($75.501.936,00), correspondiente al 89,03% del valor total actualizado del componente PMA. Dicho valor corresponde a actividades efectivamente ejecutadas y soportadas documentalmente, relacionadas con el personal encargado de la implementación del componente ambiental dentro del cual la especialista ambiental es remunerada con recursos del PMA, de acuerdo con la dedicación establecida en el presupuesto de dicho plan, y con las actividades de transporte y disposición final de residuos de construcción y demolición (RCD) mediante gestor autorizado, quedando un saldo por cobrar de NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($9.304.800,00).

- Aunque en la presente acta parcial únicamente se están cobrando los conceptos asociados al personal ambiental y a la disposición final de residuos, durante la ejecución del contrato se han desarrollado las actividades correspondientes a los demás programas ambientales establecidos en el PMA, incluyendo manejo de materiales de excavación, control de emisiones atmosféricas, uso eficiente del recurso hídrico, manejo de maquinaria y equipos, manejo integral de residuos, información y atención a las partes interesadas, señalización ambiental y demás medidas requeridas para la adecuada gestión ambiental del proyecto.


- Las actividades objeto de cobro cuentan con los respectivos soportes administrativos, financieros y ambientales, incluyendo planillas de pago de seguridad social del personal vinculado al componente ambiental, certificados de disposición final de residuos expedidos por gestores autorizados y demás evidencias documentales que respaldan la ejecución reportada en la presente acta parcial.

ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Especialista Ambiental
MP. 25202096145 CND

6 of 1

ANEXO 1 PMA: ACTA PARCIAL NRO.1 PMA

CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA NRO.1, ADICIÓN NRO.1 Y PRORROGA NRO.1							PRESENTE ACTA PARCIAL NRO.1 PMA		SALDO POR COE	
ITEM	PERFIL	TIEMPO EN MESES	CANT.	SALARIO	DEDICACIÓN	VR TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR
	CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE GESTIÓN AMBIENTAL									
1.1	Profesional o Especialista Ambiental	14	1	$ 2.400.000,00	30%	$ 10.080.000,00	7,00	$ 5.040.000,00	7,00	$ 5.040.000,00
					FACTOR PRESTACIONAL	1,62	1,62			
					TOTAL, COSTOS DE PERSONAL	**$ 16.329.600,00**		**$ 8.164.800,00**		**$ 8.164.800,00**
2. COSTOS DIRECTOS										
ITEM	**PROGRAMA**	**ACTIVIDAD**	**UNIDA**	**CANT.**	**VR UNITARIO**	**VR TOTAL**	**CANT**	**VALOR**		
	PROGRAMA 1- PLANIFICACIÓN DE INTERVENCIONES Y REQUERIMIENTOS LEGALES - AMBIENTALES					**$ 840.000,00**		**$ 0,00**		**$ 840.000,00**
2.1	Ajuste y Restructuración del PMA si se requiere acorde a las dinámicas de la obra.	Logística en campo	un	0	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	Capacitaciones Personal de Obra	Logística para el desarrollo de capacitaciones	Global	1	$ 840.000,00	$ 840.000,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 840.000,00
	PROGRAMA 2- EXCAVACIONES, MOVIMIENTO DE TIERRA Y RELLENOS					**$ 554.621,84**		**$ 554.621,84**		**$ 0,00**
2.2	Señalización y cubrimiento de residuos de excavaciones en obra.	Plástico polietileno calibre 6 - AIM 20209009	Rollo	2	$ 277.310,92	$ 554.621,84	2,00	$ 554.621,84	0,00	$ 0,00
	PROGRAMA 3- RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS					**$ 66.782.514,16**		**$ 66.782.514,16**		**$ 0,00**
2.3	Disposición Final de RCDs, Operador autorizado	Disposición residuos de demolición	m3	373,81	$ 115.370,50	$ 43.126.646,61	373,81	$ 43.126.646,61	0,00	$ 0,00
		Disposición residuos de excavación	m3	237,28	$ 86.441,60	$ 20.510.862,85	237,28	$ 20.510.862,85	0,00	$ 0,00
		Disposición residuos de descapote	m3	50,18	$ 62.674,47	$ 3.145.004,70	50,18	$ 3.145.004,70	0,00	$ 0,00
	PROGRAMA 4- MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES					**$ 300.000,00**		**$ 0,00**		**$ 300.000,00**
2.4	Disposición adecuada de los residuos sólidos ordinarios, según los indicadores BID.	Recolección por parte de la Empresa de Servicios Públicos Perla del Manacacias, con código de registro 1039196	Global	0	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	Almacenamiento temporal de Residuos Solidos Convencionales	Adecuación de Puntos ecológicos	un	1	$ 300.000,00	$ 300.000,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 300.000,00



	PROGRAMA 5- MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS					**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
2.5	Punto de almacenamiento de sustancias químicas	Adecuación de Punto de almacenamiento temporal y disposición final de Residuos Peligrosos en obra.	un	0	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	PROGRAMA 6- MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN NO PÉTREOS					**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
2.6	Almacenamiento temporal de materiales de construcción.	Adecuación sitio de Acopio para Materiales de construcción.	un	0	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	PROGRAMA 7-MANEJO DE AGREGADOS PÉTREOS					**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
2.7	Protección de los materiales pétreos y granulares almacenados temporalmente en los frentes de trabajo.	Instalación adecuada para el correcto almacenamiento de materiales pétreos.	un	1	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 0,00
	PROGRAMA 8- MANEJO DE AGUAS RESIDUALES Y LLUVIAS					**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
2.8	Proteger los sumideros presentes en la obra	Mallas Sintéticas para sumideros.	Rollo	0	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	Estrategias de uso eficiente y ahorro de agua, aprovechamiento de aguas lluvias	Tanque de 1000 Lt para recolección de aguas lluvias	un	1	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 0,00
	PROGRAMA 9 - DEMOLICIONES					**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
2.9	Acopio temporal de residuos de demoliciones	Adecuación del sitio autorizado para el acopio temporal	un	0	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.10	**PROGRAMA 10-CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA, RUIDO**					**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
	Actividades de control y seguimiento	Actividades desarrolladas por el personal socio-ambiental				$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	PROGRAMA 11-MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPO					**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
2.11	Actividades de control y seguimiento	Actividades desarrolladas por el personal socio-ambiental				$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.12	**PROGRAMA 12 -CIRCULACIÓN PEATONAL, DESVIACIÓN DE TRAFICO Y SEÑALIZACIÓN INSTALACIONES TEMPORALES**					**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
	Instalación de señalización sitios temporales	Señales Informativas y preventivas dentro de la obra.	un	0	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.13	**PROGRAMA 13 - MANEJO DE FAUNA Y FLORA**					**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**

	Rescate de Fauna de presentarse.	Rescate y traslado de especies faunisticas a la autoridad competente	un	1	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 0,00
2.14	**PROGRAMA 14- INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y DESMONTE DE CAMPAMENTOS**					**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
	Instalación del campamento	Actividades de adecuación	un	0	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.15	**PROGRAMA 15- CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA CON ENFOQUE DE GÉNERO, DE DERECHOS Y DIFERENCIAL**					**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
	Información y Divulgación	Divulgación de convocatorias	un	0	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.16	**PROGRAMA 16- ATENCIÓN A LA COMUNIDAD Y AUTORIDADES**					**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
	Instalación y adecuación de punto para el servicio de atención al usuario	Punto de atención	mes	0	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
COSTO TOTAL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL						**$ 84.806.736,00**	**89,03%**	**$ 75.501.936,00**	**10,97%**	**$ 9.304.800,00**

Elaboro:

ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
Especialista Ambiental
MP. 25202096145 CND

Avalo:

Daira Camacho H

DAIRA CAMACHO HERNANDEZ
M.P. 25238-380898 CND
Ingeniera Ambiental, Especialista.
Asesor Ambiental Interventoría

6045

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
NIT 902013442-0

ANEXO 2: PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL PMA)

Puerto Gaitán – Meta
311 386 8024
Confisca25@gmail.com

6046

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	902013442
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			UNION TEMPORAL CONFISCA 25
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO GAITAN	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	MZ 2 CASA 16 BRR MI RANCHITO	TELÉFONO:	1234567
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	8-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	5168016991	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES febrero AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES marzo AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/03/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	0221901925

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 300.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300.100	$ 0	$ 300.100
230301	230301-PORVENIR	9	$ 1.290.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.290.300	$ 0	$ 1.290.300
SUBTOTALES:										**$ 1.590.400**	**$ 0**	**$ 1.590.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
CCFC55	CCFC55- CAJACOPI EPS S.A.S	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 28.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.100	$ 0	$ 0	$ 28.100
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 32.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 32.700	$ 0	$ 0	$ 32.700
EPSIC5	EPSIC5-MALLAMAS EPSI	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 28.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.100	$ 0	$ 0	$ 28.100
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 84.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 84.500	$ 0	$ 0	$ 84.500
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 224.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 224.700	$ 0	$ 0	$ 224.700
SUBTOTALES:													**$ 398.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 398.100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	11		$ 0	$ 0		$ 0	$ 410.300	$ 410.300	$ 0	$ 0	$ 410.300
SUBTOTALES:									**$ 410.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 410.300**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF34	CCF34-COFREM META	11	$ 398.100	$ 0	$ 398.100
SUBTOTALES:			**$ 398.100**	**$ 0**	**$ 398.100**

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

Nº	DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES: ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1080783220	MORA LARZON CRISTHIAN ALEXANDER	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	17																
2	CC 1049653548	PULIDO RODRIGUEZ MARIA FERNANDA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	01																
3	CC 1121829244	BEJARANO MORENO WILLIAM ALEXANDER	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	16																
4	CC 1121946586	PAEZ MONTERO DIEGO LEONARDO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	01																
5	CC 1124818610	AYALA ROJAS DANIEL ANDRES	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	27																
6	CC 1124818911	HERNANDEZ VANEGAS MAYCOL SAMUEL	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	19																
7	CC 1124891535	PEREZ CARIBAN WALTYANN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	19																
8	CC 3215459	HERNANDEZ CALDERON CESAR AUGUSTO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	27																
9	CC 46186196	PARRADO ROJAS, ASTRID CONSTANZA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	16																
10	CC 52481418	MARTINEZ MOLINA DENSE TODD	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			SI	16																
11	CC 88062596	BAQUERO MUÑOZ CARLOS EDUARDO	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			SI	16																

Nº	SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	PARAFISCALES IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	230301-PORVENIR	14	$ 817.089	$ 130.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 130.800	EPS037-NUEVA EPS	14	$ 817.089	$ 32.700	$ 0	$ 32.700	14-11 - ARL SURA	14	$ 817.089		$ 56.900	14	$ 817.089	CCF34-COFREM META	$ 32.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	230301-PORVENIR	15	$ 875.453	$ 140.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.100	EPS005-SANITAS S.A	15	$ 875.453	$ 35.100	$ 0	$ 35.100	14-11 - ARL SURA	15	$ 875.453		$ 4.600	15	$ 875.453	CCF34-COFREM META	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	230301-PORVENIR	4	$ 233.454	$ 37.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 37.400	EPS002-SALUD TOTAL	4	$ 233.454	$ 9.400	$ 0	$ 9.400	14-11 - ARL SURA	4	$ 233.454		$ 16.300	4	$ 233.454	CCF34-COFREM META	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	230301-PORVENIR	12	$ 700.362	$ 112.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 112.100	CCFC55-CAJACOPI EPS S.A.S	12	$ 700.362	$ 28.100	$ 0	$ 28.100	14-11 - ARL SURA	12	$ 700.362		$ 48.800	12	$ 700.362	CCF34-COFREM META	$ 28.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	230301-PORVENIR	12	$ 700.362	$ 112.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 112.100	EPSIC5-MALLAMAS EPSI	12	$ 700.362	$ 28.100	$ 0	$ 28.100	14-11 - ARL SURA	12	$ 700.362		$ 48.800	12	$ 700.362	CCF34-COFREM META	$ 28.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	230301-PORVENIR	4	$ 233.454	$ 37.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 37.400	EPS005-SANITAS S.A	4	$ 233.454	$ 9.400	$ 0	$ 9.400	14-11 - ARL SURA	4	$ 233.454		$ 16.300	4	$ 233.454	CCF34-COFREM META	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	25-14 COLPENSIONES	15	$ 875.453	$ 140.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.100	EPS002-SALUD TOTAL	15	$ 875.453	$ 35.100	$ 0	$ 35.100	14-11 - ARL SURA	15	$ 875.453		$ 61.000	15	$ 875.453	CCF34-COFREM META	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	25-14 COLPENSIONES	15	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	EPS005-SANITAS S.A	15	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-11 - ARL SURA	15	$ 1.000.000		$ 69.600	15	$ 1.000.000	CCF34-COFREM META	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	230301-PORVENIR	15	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	EPS002-SALUD TOTAL	15	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-11 - ARL SURA	15	$ 1.000.000		$ 69.600	15	$ 1.000.000	CCF34-COFREM META	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 2.796.900

6047

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	902013442
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			UNION TEMPORAL CONFISCA 25
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO GAITAN	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	MZ 2 CASA 10 BRR MI RANCHITO	TELÉFONO:	1234567
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**5168016991**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/03/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		0221901925

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 300.100
8002248088	230301	230301-PORVENIR	9	$ 1.290.300
		SUBTOTAL:	11	**$ 1.590.400**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	5	$ 224.700
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	3	$ 84.500
8370000845	EPSIC5	EPSIC5-MALLAMAS EPSI	1	$ 28.100
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 32.700
9015432116	CCFC55	CCFC55- CAJACOPI EPS S.A.S	1	$ 28.100
		SUBTOTAL:	11	**$ 398.100**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8920001463	CCF34	CCF34-COFREM META	11	$ 398.100
		SUBTOTAL:	11	**$ 398.100**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	11	$ 410.300
		SUBTOTAL:	11	**$ 410.300**

VALOR SIN MORA:	**$ 2.796.900**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 2.796.900**

6048

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	902013442
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			UNION TEMPORAL CONFISCA 25
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO GAITAN	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	MZ 2 CASA 16 BRR MI RANCHITO	TELÉFONO:	1234567
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		5168361746		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril AÑO	2026
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/03/31		NÚMERO AUTORIZACIÓN:			0822673320

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 600.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 600.200	$ 0	$ 600.200
230301	230301-PORVENIR	13	$ 3.187.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.187.400	$ 0	$ 3.187.400
SUBTOTALES:										**$ 3.787.600**	**$ 0**	**$ 3.787.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 51.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 51.400	$ 0	$ 0	$ 51.400
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 35.100
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 360.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 360.400	$ 0	$ 0	$ 360.400
EPSIC6	EPSIC6-PIJAOSALUD EPSI	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 35.100
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 290.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 290.200	$ 0	$ 0	$ 290.200
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
CCFC55	CCFC55- PROTEGER EPS S.A.S	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 35.100
EPSIC5	EPSIC5-MALLAMAS EPSI	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
SUBTOTALES:													**$ 1.017.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.017.600**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	16		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.431.600	$ 1.431.600	$ 0	$ 0	$ 1.431.600
SUBTOTALES:									**$ 1.431.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.431.600**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF34	CCF34-COFREM META	16	$ 1.023.400	$ 0	$ 1.023.400
SUBTOTALES:			**$ 1.023.400**	**$ 0**	**$ 1.023.400**

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES				
																											PENSIÓN							SALUD							ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1006891448	RODRIGUEZ VEGA CAMILO ANDRES	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	16																	230301-PORVENIR	15	$ 875.453	$ 140.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.100	NUEVA EPS CM	15	$ 875.453	$ 35.100	$ 0	$ 35.100	14-11 - ARL SURA	15	$ 875.453		$ 61.000	15	$ 875.453	CCF34-COFREM META	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1006770906	PARDO VARGAS CRISTIAN FERNANDO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	16																	230301-PORVENIR	15	$ 875.453	$ 140.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.100	EPSIC6-PIJAOSALUD EPSI	15	$ 875.453	$ 35.100	$ 0	$ 35.100	14-11 - ARL SURA	15	$ 875.453		$ 61.000	15	$ 875.453	CCF34-COFREM META	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1006782020	MORA GUARZON CRISTIAN ALEXANDER	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1049653548	PULIDO RODRIGUEZ MARIA FERNANDA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI		31																230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.696.814	CCF34-COFREM META	$ 75.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1121829244	DEJARANO MORENO WILLIAM ALEXANDER	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1121946585	PAEZ MONTERO DIEGO LEONARDO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1124818810	AYALA ROJAS DANIEL ANDRES	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1124818911	HERNANDEZ VANEGAS MAYCOL SAMUEL	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	CCFC55-PROTEGER EPS S.A.S	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1124991535	PEREZ CANIBAN WALFRAN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPSIC5-MALLAMAS EPSI	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 3215458	HERNANDEZ CALDERON CESAR AUGUSTO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

6049

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	902013442
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			UNION TEMPORAL CONFISCA 25
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO GAITAN	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	MZ 2 CASA 10 BRR MI RANCHITO	TELÉFONO:	1234567
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	9-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	5168381746	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES marzo AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES abril AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/03/31	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	0622673326

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES					
																										PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
31	CC 46186168	PARRADO ROJAS ASTRID CONSTANZA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	$CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
32	CC 52481418	MARTINEZ MOLINA DENISE ROCIO	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.000.000		$ 139.200	30	$ 2.000.000	$CCF34-COFREM META	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
33	CC 7248128	SANCHEZ URRICHE JOSE	DEPEND	PENS VEJ ACT	$ 2.500.000	FIJO			SI	10																	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS002-SALUD TOTAL	21	$ 1.750.000	$ 70.000	$ 0	$ 70.000	14-11 - ARL SURA	21	$ 1.750.000		$ 121.800	21	$ 1.750.000	$CCF34-COFREM META	$ 70.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
34	CC 74325151	HERNANDEZ CALDERON JAIMER DARIO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	09																230301-PORVENIR	22	$ 1.283.997	$ 205.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 205.500	EPS017-FAMISANAR	22	$ 1.283.997	$ 51.400	$ 0	$ 51.400	14-11 - ARL SURA	22	$ 1.283.997		$ 89.400	22	$ 1.283.997	$CCF34-COFREM META	$ 51.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
35	CC 86047574	TRUJOS MORENO WILLIAM	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	18																230301-PORVENIR	15	$ 875.453	$ 140.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.100	EPS034-CAPITAL SALUD EPSS	15	$ 875.453	$ 35.100	$ 0	$ 35.100	14-11 - ARL SURA	15	$ 875.453		$ 61.000	15	$ 875.453	$CCF34-COFREM META	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
36	CC 86062896	MADUEÑO MUÑOZ CARLOS EDUARDO	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.000.000		$ 139.200	30	$ 2.000.000	$CCF34-COFREM META	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 7.260.200

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

6050

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	902013442
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			UNION TEMPORAL CONFISCA 25
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO GAITAN	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	MZ 2 CASA 10 BRR MI RANCHITO	TELÉFONO:	1234567
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**5168381746**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: marzo	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:		AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/03/31	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			0822673320

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 600.200
8002248088	230301	230301-PORVENIR	13	$ 3.187.400
		SUBTOTAL:	15	**$ 3.787.600**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9015432116	CCFC55	CCFC55- PROTEGER EPS S.A.S	1	$ 70.100
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	1	$ 51.400
8090083622	EPSIC6	EPSIC6-PIJAOSALUD EPSI	1	$ 35.100
9001562642	EPS041	NUEVA EPS CM	1	$ 35.100
8370000845	EPSIC5	EPSIC5-MALLAMAS EPSI	1	$ 70.100
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 70.100
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	5	$ 360.400
9002983729	EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	1	$ 35.100
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	4	$ 290.200
		SUBTOTAL:	16	**$ 1.017.600**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8920001463	CCF34	CCF34-COFREM META	16	$ 1.023.400
		SUBTOTAL:	16	**$ 1.023.400**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	16	$ 1.431.600
		SUBTOTAL:	16	**$ 1.431.600**

VALOR SIN MORA:	**$ 7.260.200**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 7.260.200**

6059

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	902013442
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL:			UNION TEMPORAL CONFISCA 25
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO GAITAN	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	MZ 2 CASA 10 BRR MI RANCHITO	TELÉFONO:	1234567
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	8-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA							
NÚMERO PLANILLA:	51668896592		TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS			
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES abril AÑO 2026		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo AÑO 2026			
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/05/06		NÚMERO AUTORIZACIÓN:	0705351661			

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 600.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 600.200	$ 0	$ 600.200
230301	230301-PORVENIR	12	$ 3.402.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.402.200	$ 0	$ 3.402.200
230201	230201- PROTECCION	2	$ 448.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 448.400	$ 0	$ 448.400
SUBTOTALES:										**$ 4.450.800**	**$ 0**	**$ 4.450.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPSIC6	EPSIC6-PIJAOSALUD EPSI	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
EPSIC5	EPSIC5-MALLAMAS EPSI	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
CCFC55	CCFC55- PROTEGER EPS S.A.S	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 290.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 290.300	$ 0	$ 0	$ 290.300
EPS017	EPS017-FAMISANAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 126.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 126.200	$ 0	$ 0	$ 126.200
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
EPS041	NUEVA EPS CM	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 126.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 126.200	$ 0	$ 0	$ 126.200
EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 320.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.200	$ 0	$ 0	$ 320.200
SUBTOTALES:													**$ 1.213.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.213.400**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-11	14-11 - ARL SURA	17		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.884.800	$ 1.884.800	$ 0	$ 0	$ 1.884.800	
SUBTOTALES:									**$ 1.884.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.884.800**	

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF34	CCF34-COFREM META	17	$ 1.213.400	$ 0	$ 1.213.400
SUBTOTALES:			**$ 1.213.400**	**$ 0**	**$ 1.213.400**

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES									
																										PENSIÓN								SALUD						ARP							CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1056681448	RODRIGUEZ VEGA CAMILO ANDRES	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	NUEVA EPS CM	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		121.900	30	$ 1.750.905	$CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1096770966	PARDO VARGAS CRISTIAN FERNANDO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPSIC6-PIJAOSALUD EPSI	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		121.900	30	$ 1.750.905	$CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1006783220	MORA GARZON CRISTIAN ALEXANDER	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		121.900	30	$ 1.750.905	$CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1052413449	JAIMES CAAMAÑO DANY FABIAN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	07																230201-PROTECCION	24	$ 1.400.724	$ 224.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 224.200	EPS017-FAMISANAR	24	$ 1.400.724	$ 56.100	$ 0	$ 56.100	14-11 - ARL SURA	24	$ 1.400.724		$ 97.500	24	$ 1.400.724	$CCF34-COFREM META	$ 56.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1121829244	BEJARANO MORENO WILLIAM ALEXANDER	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	$CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1121946586	PAEZ MONTERO DIEGO LEONARDO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	$CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1124818610	AYALA ROJAS DANIEL ANDRES	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		121.900	30	$ 1.750.905	$CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1124818611	HERNANDEZ VANEGAS MAYCOL SAMUEL	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	CCFC55-PROTEGER EPS S.A.S	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		121.900	30	$ 1.750.905	$CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1124991535	PEREZ GARBAN WALTHAN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPSIC5-MALLAMAS EPSI	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		121.900	30	$ 1.750.905	$CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 1134450031	DAVILA GAITAN LEIDER ESTEBAN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	07																230201-PROTECCION	24	$ 1.400.724	$ 224.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 224.200	NUEVA EPS CM	24	$ 1.400.724	$ 56.100	$ 0	$ 56.100	14-11 - ARL SURA	24	$ 1.400.724		$ 97.500	24	$ 1.400.724	$CCF34-COFREM META	$ 56.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	902013442
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			UNION TEMPORAL CONFISCA 25
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO GAITAN	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	MZ 2 CASA 10 BRR MI RANCHITO	TELÉFONO:	1234567
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	II-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			5168896592	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/05/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			0705351661

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES					
																										PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
31	CC 3215450	HERNANDEZ CALDERON CESAR AUGUSTO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 289.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 289.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	$30	$ 1.750.905	$CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
32	CC 40186168	PARRADO ROJAS ASTRID CONSTANZA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	$30	$ 1.750.905	$CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
33	CC 52451418	MARTINEZ MOLINA DENISE ROCIO	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.000.000		$ 139.200	$30	$ 2.000.000	$CCF34-COFREM META	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
34	CC 7248128	SANCHEZ USECHE JOSE	DEPEND	PENS VEJ ACT	$ 2.500.000	FIJO			SI																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 100.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.500.000		$ 174.000	$30	$ 2.500.000	$CCF34-COFREM META	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
35	CC 74325151	HERNANDEZ CALDERON JAIDER DARIO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 289.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 289.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	$30	$ 1.750.905	$CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
36	CC 86047574	TRIGOS MORENO WILLIAM	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 289.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 289.200	EPSC34-CAPITAL SALUD EPS S	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	$30	$ 1.750.905	$CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
37	CC 86062996	BAQUERO MUÑOZ CARLOS EDUARDO	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.000.000		$ 139.200	$30	$ 2.000.000	$CCF34-COFREM META	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 8.762.400

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	902013442
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			UNION TEMPORAL CONFISCA 25
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO GAITAN	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	MZ 2 CASA 10 BRR MI RANCHITO	TELÉFONO:	1234567
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**5168896592**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/05/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		0705351661

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	2	$ 448.400
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 600.200
8002248088	230301	230301-PORVENIR	12	$ 3.402.200
		SUBTOTAL:	16	**$ 4.450.800**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9015432116	CCFC55	CCFC55- PROTEGER EPS S.A.S	1	$ 70.100
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	2	$ 126.200
8090083622	EPSIC6	EPSIC6-PIJAOSALUD EPSI	1	$ 70.100
9001562642	EPS041	NUEVA EPS CM	2	$ 126.200
8370000845	EPSIC5	EPSIC5-MALLAMAS EPSI	1	$ 70.100
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 70.100
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	4	$ 290.300
9002983729	EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	1	$ 70.100
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	4	$ 320.200
		SUBTOTAL:	17	**$ 1.213.400**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8920001463	CCF34	CCF34-COFREM META	17	$ 1.213.400
		SUBTOTAL:	17	**$ 1.213.400**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	17	$ 1.884.800
		SUBTOTAL:	17	**$ 1.884.800**

VALOR SIN MORA:	**$ 8.762.400**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 8.762.400**

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

6055

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	902013442
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			UNION TEMPORAL CONFISCA 25
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO GAITAN	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	MZ 2 CASA 10 BRR MI RANCHITO	TELÉFONO:	1234567
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	9-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		5169986796		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	junio AÑO	2026
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/06/04		NÚMERO AUTORIZACIÓN:			0517788875

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	12	$ 3.402.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.402.300	$ 0	$ 3.402.300
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 609.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 609.200	$ 0	$ 609.200
230201	230201- PROTECCION	2	$ 560.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 560.400	$ 0	$ 560.400
SUBTOTALES:										**$ 4.582.900**	**$ 0**	**$ 4.582.900**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 140.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.200	$ 0	$ 0	$ 140.200
EPSIC6	EPSIC6-PIJAOSALUD EPSI	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
CCFC55	CCFC55- PROTEGER EPS S.A.S	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
EPSIC5	EPSIC5-MALLAMAS EPSI	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 290.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 290.300	$ 0	$ 0	$ 290.300
EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
EPS041	NUEVA EPS CM	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 140.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.200	$ 0	$ 0	$ 140.200
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 320.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.200	$ 0	$ 0	$ 320.200
SUBTOTALES:													**$ 1.241.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.241.400**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	17		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.927.800	$ 1.927.800	$ 0	$ 0	$ 1.927.800
SUBTOTALES:									**$ 1.927.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.927.800**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF34	CCF34-COFREM META	17	$ 1.206.100	$ 0	$ 1.206.100
SUBTOTALES:			**$ 1.206.100**	**$ 0**	**$ 1.206.100**

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

| Nº | DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACION | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | NOVEDADES: ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COM | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN ADMIN | DÍAS COT. | IBC | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | SALUD ADMIN | DÍAS COT. | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ARP ADMIN | DÍAS COT. | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | PARAFISCALES DÍAS COT. | IBC | CCF ADMIN | CCF TOTAL APORTE | SENA TOTAL APORTE | ICBF TOTAL APORTE | ESAP TOTAL APORTE | MINEDU TOTAL APORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	902013442
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			UNION TEMPORAL CONFISCA 25
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO GAITAN	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	MZ 2 CASA 10 BRR MI RANCHITO	TELÉFONO:	1234567
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	9-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		5169986796	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES mayo AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/06/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		0517788875

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES					
																												PENSIÓN								SALUD						ARP							CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EL EXTERIOR	EXONERADO REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
11	CC 1134460031	DARAPO GAITAN LEIDER ESTEBAN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	NUEVA EPS CM	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	$30	$ 1.750.905	$CCF34-COFREMETA	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 3015456	HERNANDEZ CALDERON CESAR AUGUSTO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	$30	$ 1.750.905	$CCF34-COFREMETA	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 40186168	PARRADO ROJAS ASTRID CONSTANZA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	$30	$ 1.750.905	$CCF34-COFREMETA	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 52481418	MARTINEZ MOLINA DENISE ROCIO	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO		SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.000.000		$ 139.200	$30	$ 2.000.000	$CCF34-COFREMETA	$ 93.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 72481285	SANCHEZ USECHE JOSE	DEPEND	PENS VEJ ACT	$ 2.500.000	FIJO		SI																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 100.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.500.000		$ 174.000	$30	$ 2.500.000	$CCF34-COFREMETA	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 74325151	HERNANDEZ CALDERON JAIRO DARIO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	$30	$ 1.750.905	$CCF34-COFREMETA	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 86047574	TRIGOS MORENO WILLIAM	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	$30	$ 1.750.905	$CCF34-COFREMETA	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	CC 86062936	BAQUERO MUÑOZ CARLOS EDUARDO	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.000.000		$ 139.200	$30	$ 2.000.000	$CCF34-COFREMETA	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 8.938.200

Planilla Pagada

6057

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	902013442
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			UNION TEMPORAL CONFISCA 25
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO GAITAN	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	MZ 2 CASA 10 BRR MI RANCHITO	TELÉFONO:	1234567
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**5168986796**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/06/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		0517788875

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	2	$ 560.400
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 600.200
8002248088	230301	230301-PORVENIR	12	$ 3.402.300
		SUBTOTAL:	16	**$ 4.562.900**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9015432116	CCFC55	CCFC55- PROTEGER EPS S.A.S	1	$ 70.100
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	2	$ 140.200
8090083622	EPSIC6	EPSIC6-PIJAOSALUD EPSI	1	$ 70.100
9001562642	EPS041	NUEVA EPS CM	2	$ 140.200
8370000845	EPSIC5	EPSIC5-MALLAMAS EPSI	1	$ 70.100
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 70.100
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	4	$ 290.300
9002983729	EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	1	$ 70.100
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	4	$ 320.200
		SUBTOTAL:	17	**$ 1.241.400**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8920001463	CCF34	CCF34-COFREM META	17	$ 1.206.100
		SUBTOTAL:	17	**$ 1.206.100**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	17	$ 1.927.800
		SUBTOTAL:	17	**$ 1.927.800**

VALOR SIN MORA:	**$ 8.938.200**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 8.938.200**

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

6059

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900213442
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			UNION TEMPORAL CONFISCA 25
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO GAITAN	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	MZ 2 CASA 10 BRR MI RANCHITO	TELÉFONO:	1234567
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		51690611 25		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	julio AÑO	2026
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/07/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			0852674426

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	2	$ 233.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 233.500	$ 0	$ 233.500
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 600.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 600.200	$ 0	$ 600.200
230301	230301-PORVENIR	12	$ 2.589.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.589.600	$ 0	$ 2.589.600
SUBTOTALES:										**$ 3.423.300**	**$ 0**	**$ 3.423.300**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 93.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 93.600	$ 0	$ 0	$ 93.600
EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 46.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.800	$ 0	$ 0	$ 46.800
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 250.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 250.100	$ 0	$ 0	$ 250.100
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
EPSIC6	EPSIC6-PIJAOSALUD EPSI	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 11.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.700	$ 0	$ 0	$ 11.700
CCFC55	CCFC55- PROTEGER EPS S.A.S	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 42.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.100	$ 0	$ 0	$ 42.100
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 267.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 267.000	$ 0	$ 0	$ 267.000
EPS017	EPS017-FAMISANAR	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 128.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 128.600	$ 0	$ 0	$ 128.600
EPSIC5	EPSIC5-MALLAMAS EPSI	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 46.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.800	$ 0	$ 0	$ 46.800
SUBTOTALES:													**$ 956.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 956.800**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	17		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.326.300	$ 1.326.300	$ 0	$ 0	$ 1.326.300
SUBTOTALES:									**$ 1.326.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.326.300**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF34	CCF34-COFREM META	17	$ 1.032.200	$ 0	$ 1.032.200
SUBTOTALES:			**$ 1.032.200**	**$ 0**	**$ 1.032.200**

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES				
																										PENSIÓN							SALUD							ARP													
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1006691448	RODRIGUEZ VEGA CAMILO ANDRES	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI		05															230301-PORVENIR	5	$ 291.818	$ 46.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 46.700	EPS041-NUEVA EPS CM	5	$ 291.818	$ 11.700	$ 0	$ 11.700	14-11 - ARL SURA	5	$ 291.818		$ 20.400	5	$ 466.363	CCF34-COFREM META	$ 19.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1006691448	RODRIGUEZ VEGA CAMILO ANDRES	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	16	30															230301-PORVENIR	15	$ 875.453	$ 140.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.100	EPS041-NUEVA EPS CM	15	$ 875.453	$ 35.100	$ 0	$ 35.100	14-11 - ARL SURA	15	$ 875.453		$ 61.000	15	$ 911.930	CCF34-COFREM META	$ 36.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1006770909	PARDO VARGAS CRISTIAN FERNANDO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI		05															230301-PORVENIR	5	$ 291.818	$ 46.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 46.700	EPSIC6-PIJAOSALUD EPSI	5	$ 291.818	$ 11.700	$ 0	$ 11.700	14-11 - ARL SURA	5	$ 291.818		$ 20.400	5	$ 466.363	CCF34-COFREM META	$ 19.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1006783229	MORA GARZON CRISTIAN ALEXANDER	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1023879780	VASQUEZ MOSQUERA ADOLFO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	01																230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1052413449	JAIMES CARMARIO DAMY FABIAN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI		05															230201-PROTECCION	5	$ 291.818	$ 46.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 46.700	EPS017-FAMISANAR	5	$ 291.818	$ 11.700	$ 0	$ 11.700	14-11 - ARL SURA	5	$ 291.818		$ 20.400	5	$ 435.295	CCF34-COFREM META	$ 17.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1121829244	BEJARANO MORENO WILLIAM ALEXANDER	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1121946585	PAEZ MONTERO DIEGO LEONARDO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1124618911	HERNANDEZ VANEGAS MAYCOL SAMUEL	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI		05															230301-PORVENIR	5	$ 291.818	$ 46.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 46.700	CCFC55-PROTEGER EPS S.A.S	5	$ 291.818	$ 11.700	$ 0	$ 11.700	14-11 - ARL SURA	5	$ 291.818		$ 20.400	5	$ 552.022	CCF34-COFREM META	$ 22.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 1124618911	HERNANDEZ VANEGAS MAYCOL SAMUEL	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	18																230301-PORVENIR	13	$ 758.726	$ 121.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 121.400	CCFC55-PROTEGER EPS S.A.S	13	$ 758.726	$ 30.400	$ 0	$ 30.400	14-11 - ARL SURA	13	$ 758.726		$ 52.900	13	$ 758.726	CCF34-COFREM META	$ 30.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	902013442
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			UNION TEMPORAL CONFISCA 25
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO GAITAN	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	MZ 2 CASA 16 BRR MI RANCHITO	TELÉFONO:	1234567
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			5169061125	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	julio	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/07/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			0852674420

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES					
																									PENSIÓN						SALUD						ARP							CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
11	CC 1124991535	PEREZ CARIBAN WALFRAN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI		05														230301-PORVENIR	5	$ 291.818	$ 46.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 46.700	EPSIC5-MALLAMAS EPSI	5	$ 291.818	$ 11.700	$ 0	$ 11.700	14-11 - ARL SURA	5	$ 291.818		$ 20.400	5	$ 552.022	CCF34-COFREM META	$ 22.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 1124991535	PEREZ CARIBAN WALFRAN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI		16														230301-PORVENIR	15	$ 875.453	$ 140.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.100	EPSIC5-MALLAMAS EPSI	15	$ 875.453	$ 35.100	$ 0	$ 35.100	14-11 - ARL SURA	15	$ 875.453		$ 61.000	15	$ 875.453	CCF34-COFREM META	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 1134450031	DAVARO DAITAN LEIDER ESTEBAN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI		05														230201-PROTECCION	5	$ 291.818	$ 46.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 46.700	NUEVA EPS CM	5	$ 291.818	$ 11.700	$ 0	$ 11.700	14-11 - ARL SURA	5	$ 291.818		$ 20.400	5	$ 435.295	CCF34-COFREM META	$ 17.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 1134450031	DAVARO DAITAN LEIDER ESTEBAN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI		16														230201-PROTECCION	15	$ 875.453	$ 140.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.100	NUEVA EPS CM	15	$ 875.453	$ 35.100	$ 0	$ 35.100	14-11 - ARL SURA	15	$ 875.453		$ 61.000	15	$ 875.453	CCF34-COFREM META	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 3215459	HERNANDEZ CALDERON CESAR AUGUSTO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI		05														230301-PORVENIR	5	$ 291.818	$ 46.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 46.700	EPS005-SANITAS S.A	5	$ 291.818	$ 11.700	$ 0	$ 11.700	14-11 - ARL SURA	5	$ 291.818		$ 20.400	5	$ 532.567	CCF34-COFREM META	$ 21.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 3215459	HERNANDEZ CALDERON CESAR AUGUSTO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI		16														230301-PORVENIR	15	$ 875.453	$ 140.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.100	EPS005-SANITAS S.A	15	$ 875.453	$ 35.100	$ 0	$ 35.100	14-11 - ARL SURA	15	$ 875.453		$ 61.000	15	$ 875.453	CCF34-COFREM META	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 40186158	PARRADO ROJAS ANTRID CONSTANZA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 250.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 250.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	CC 52481418	MARTINEZ MOLINA DEMSE YADID	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			SI																25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.000.000		$ 139.200	30	$ 2.000.000	CCF34-COFREM META	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	CC 7248128	SANCHEZ LIBICHE JOSE	DEPEND	PENS VOL ACT	$ 2.500.000	FIJO			SI																		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 100.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.500.000		$ 174.000	30	$ 2.500.000	CCF34-COFREM META	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
20	CC 74325151	HERNANDEZ CALDERON JAMER DARIO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI		05														230301-PORVENIR	5	$ 291.818	$ 46.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 46.700	EPS017-FAMISANAR	5	$ 291.818	$ 11.700	$ 0	$ 11.700	14-11 - ARL SURA	5	$ 291.818		$ 20.400	5	$ 503.386	CCF34-COFREM META	$ 20.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
21	CC 74325151	HERNANDEZ CALDERON JAMER DARIO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI		16														230301-PORVENIR	15	$ 875.453	$ 140.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.100	EPS017-FAMISANAR	15	$ 875.453	$ 35.100	$ 0	$ 35.100	14-11 - ARL SURA	15	$ 875.453		$ 61.000	15	$ 875.453	CCF34-COFREM META	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
22	CC 86047574	TRIGOS MORENO WILIAM	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI		05														230301-PORVENIR	5	$ 291.818	$ 46.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 46.700	EPS034-CAPITAL SALUD EPSS	5	$ 291.818	$ 11.700	$ 0	$ 11.700	14-11 - ARL SURA	5	$ 291.818		$ 20.400	5	$ 486.363	CCF34-COFREM META	$ 19.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
23	CC 86047574	TRIGOS MORENO WILIAM	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI		16														230301-PORVENIR	15	$ 875.453	$ 140.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.100	EPS034-CAPITAL SALUD EPSS	15	$ 875.453	$ 35.100	$ 0	$ 35.100	14-11 - ARL SURA	15	$ 875.453		$ 61.000	15	$ 875.453	CCF34-COFREM META	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
24	CC 86062696	NAVARRO MUÑOZ CARLOS EDUARDO	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.000.000		$ 139.200	30	$ 2.000.000	CCF34-COFREM META	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 6.738.600

6061

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	902013442
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			UNION TEMPORAL CONFISCA 25
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO GAITAN	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	MZ 2 CASA 10 BRR MI RANCHITO	TELÉFONO:	1234567
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**5169061125**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/07/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		0852674420

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	2	$ 233.500
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 600.200
8002248088	230301	230301-PORVENIR	12	$ 2.589.600
		SUBTOTAL:	16	**$ 3.423.300**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9015432116	CCFC55	CCFC55- PROTEGER EPS S.A.S	1	$ 42.100
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	3	$ 128.600
8090083622	EPSIC6	EPSIC6-PIJAOSALUD EPSI	1	$ 11.700
9001562642	EPS041	NUEVA EPS CM	2	$ 93.600
8370000845	EPSIC5	EPSIC5-MALLAMAS EPSI	1	$ 46.800
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 70.100
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	4	$ 267.000
9002983729	EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	1	$ 46.800
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	3	$ 250.100
		SUBTOTAL:	17	**$ 956.800**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8920001463	CCF34	CCF34-COFREM META	17	$ 1.032.200
		SUBTOTAL:	17	**$ 1.032.200**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	17	$ 1.326.300
		SUBTOTAL:	17	**$ 1.326.300**

VALOR SIN MORA:	**$ 6.738.600**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 6.738.600**

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

6663

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	902013442
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			UNION TEMPORAL CONFISCA 25
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO GAITAN	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	MZ 2 CASA 16 BRR MI RANCHITO	TELÉFONO:	1234567
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	8-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		1751659971		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	agosto AÑO	2026
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/08/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			583375

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	2	$ 485.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 485.700	$ 0	$ 485.700
230301	230301-PORVENIR	11	$ 3.122.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.122.000	$ 0	$ 3.122.000
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 600.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 600.200	$ 0	$ 600.200
SUBTOTALES:										**$ 4.207.900**	**$ 0**	**$ 4.207.900**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 290.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 290.300	$ 0	$ 0	$ 290.300
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
EPS017	EPS017-FAMISANAR	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 191.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 191.600	$ 0	$ 0	$ 191.600
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 250.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 250.100	$ 0	$ 0	$ 250.100
EPSIC6	EPSIC6-PIJAOSALUD EPSI	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
CCFC55	CCFC55- PROTEGER EPS S.A.S	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
EPSIC5	EPSIC5-MALLAMAS EPSI	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
SUBTOTALES:													**$ 1.152.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.152.600**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	18		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.658.400	$ 1.658.400	$ 0	$ 0	$ 1.658.400
SUBTOTALES:									**$ 1.658.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.658.400**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF34	CCF34-COFREM META	16	$ 1.170.600	$ 0	$ 1.170.600
SUBTOTALES:			**$ 1.170.600**	**$ 0**	**$ 1.170.600**

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES					
																											PENSIÓN							SALUD						ARP								CCF		SENA		ICBF		ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1096776095	PARDO VARGAS CRISTIAN FERNANDO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	01																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPSIC6-PIJAOSALUD EPSI	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	$30	$ 1.750.905	$CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1006783220	MORA DARZON CRISTIAN ALEXANDER	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	$30	$ 1.750.905	$CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1023879760	VASQUEZ MOSCOSO ANGELO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 9.200	$30	$ 1.750.905	$CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1052413449	JAIMES CAMARGO DANY FABIAN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	01	22																230201-PROTECCION	22	$ 1.283.997	$ 205.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 205.500	EPS017-FAMISANAR	22	$ 1.283.997	$ 51.400	$ 0	$ 51.400	14-11 - ARL SURA	22	$ 1.283.997		$ 89.400	22	$ 1.337.497	$CCF34-COFREM META	$ 53.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1121829244	BEJARANO MORENO WILLIAM ALEXANDER	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	$CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1121946586	PAEZ MONTERO DIEGO LEONARDO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	$CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1124818911	HERNANDEZ VARGAS MAYCOL SAMUEL	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI		31																230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	CCFC55-PROTEGER EPS S.A.S	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	$30	$ 1.855.473	$CCF34-COFREM META	$ 74.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1124991535	PEREZ CARIBAN WALFRAN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI		31																230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPSIC5-MALLAMAS EPSI	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	$30	$ 1.860.337	$CCF34-COFREM META	$ 74.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1134450031	DARAPO GAITAN LEDEN ESTEBAN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI		31																230201-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	NUEVA EPS CM	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	$30	$ 1.860.337	$CCF34-COFREM META	$ 74.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 3215459	HERNANDEZ CALDERON CESAR AUGUSTO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI		31																230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	$30	$ 1.860.337	$CCF34-COFREM META	$ 74.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

6064

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	902013442
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			UNION TEMPORAL CONFISCA 25
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO GAITAN	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	MZ 2 CASA 10 BRR MI RANCHITO	TELÉFONO:	1234567
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	9-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			1751659971	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	agosto	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/08/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			583375

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES					
																											PENSIÓN							SALUD						ARP					CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
11	CC 40188168	PARRADO TOLRIS ASTRID CONSTANZA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	$30	$ 1.750.905	CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 52481418	MARTINEZ MOLINA DENISE ROCIO	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	EPS005-SANITAS S.A	28	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.000.000		$ 139.200	$30	$ 2.000.000	CCF34-COFREM META	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 72481128	SANCHEZ USECHE JOSE	DEPEND	PENS VEJ ACT	$ 2.500.000	FIJO			SI																		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 100.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.500.000		$ 174.000	$30	$ 2.500.000	CCF34-COFREM META	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 74325151	HERNANDEZ CALDERON JABER DARIO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	$30	$ 1.750.905	CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 86047574	TRIGOS MORENO WILLIAM	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI												29-31					230301-PORVENIR	2	$ 116.727	$ 18.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 18.700	EPS034-CAPITAL SALUD EPSS	2	$ 116.727	$ 4.700	$ 0	$ 4.700	14-11 - ARL SURA	2	$ 116.727		$ 8.000	2	$ 77.819	CCF34-COFREM META	$ 3.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 86047574	TRIGOS MORENO WILLIAM	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	28	$ 1.634.178	$ 261.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 261.500	EPS034-CAPITAL SALUD EPSS	28	$ 1.634.178	$ 65.400	$ 0	$ 65.400	14-11 - ARL SURA	28	$ 1.634.178		$ 113.800	$28	$ 1.634.178	CCF34-COFREM META	$ 65.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 86062986	BAQUERO MUÑOZ CARLOS EDUARDO	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.000.000		$ 139.200	$30	$ 2.000.000	CCF34-COFREM META	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 8.189.500

Planilla Pagada

6065

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	902013442
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			UNION TEMPORAL CONFISCA 25
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO GAITAN	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	MZ 2 CASA 10 BRR MI RANCHITO	TELÉFONO:	1234567
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**1751659971**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: julio	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:		AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/08/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		583375	

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	2	$ 485.700
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 600.200
8002248088	230301	230301-PORVENIR	11	$ 3.122.000
		SUBTOTAL:	15	**$ 4.207.900**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9015432116	CCFC55	CCFC55- PROTEGER EPS S.A.S	1	$ 70.100
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	3	$ 191.600
8090083622	EPSIC6	EPSIC6-PIJAOSALUD EPSI	1	$ 70.100
9001562642	EPS041	NUEVA EPS CM	1	$ 70.100
8370000845	EPSIC5	EPSIC5-MALLAMAS EPSI	1	$ 70.100
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 70.100
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	4	$ 290.300
9002983729	EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	1	$ 70.100
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	3	$ 250.100
		SUBTOTAL:	16	**$ 1.152.600**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8920001463	CCF34	CCF34-COFREM META	16	$ 1.170.600
		SUBTOTAL:	16	**$ 1.170.600**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	16	$ 1.658.400
		SUBTOTAL:	16	**$ 1.658.400**

VALOR SIN MORA:	**$ 8.189.500**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 8.189.500**

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

6067

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	902013442
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			UNION TEMPORAL CONFISCA 25
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO GAITAN	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	MZ 2 CASA 10 BRR MI RANCHITO	TELÉFONO:	1234567
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	8-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	5169240119	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/09/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	0802885663

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	17	$ 3.028.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.028.800	$ 0	$ 3.028.800
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 843.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 843.000	$ 0	$ 843.000
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 261.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 261.500	$ 0	$ 261.500
SUBTOTALES:										**$ 4.133.300**	**$ 0**	**$ 4.133.300**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 140.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.200	$ 0	$ 0	$ 140.200
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 9.400
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 168.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 168.300	$ 0	$ 0	$ 168.300
EPSIC6	EPSIC6-PIJAOSALUD EPSI	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 130.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 130.800	$ 0	$ 0	$ 130.800
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 253.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 253.000	$ 0	$ 0	$ 253.000
EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 11.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.700	$ 0	$ 0	$ 11.700
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 91.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 91.100	$ 0	$ 0	$ 91.100
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 259.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 259.500	$ 0	$ 0	$ 259.500
SUBTOTALES:													**$ 1.134.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.134.100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	22		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.515.700	$ 1.515.700	$ 0	$ 0	$ 1.515.700
SUBTOTALES:									**$ 1.515.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.515.700**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF34	CCF34-COFREM META	22	$ 1.135.100	$ 0	$ 1.135.100
SUBTOTALES:			**$ 1.135.100**	**$ 0**	**$ 1.135.100**

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1056776965	PARDO VARGAS CRISTIAN FERNANDO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																
2	CC 1006763320	MORA GARZON CRISTIAN ALEXANDER	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																
3	CC 1006822611	LOPEZ LANDAETA LAURA JULIANA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	20															
4	CC 1010026192	VERGARA JORGE	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	05															
5	CC 1022374553	SUZMAN PEREZ JUAN CAMILO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	05															
6	CC 1023879760	VASQUEZ MOSCOSO ADOLFO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																
7	CC 1070587147	ESGUERRA TRIANA JHON ALEXANDER	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	27															
8	CC 1121417962	AGUERO QUESADA LIBER AGUSTO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	27															
9	CC 1121629244	BEJARANO MORENO WILLIAM ALEXANDER	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																
10	CC 1121945585	PAEZ MONTERO DIEGO LEONARDO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																

LIQUIDACION DETALLADA APORTES — SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200
230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200
230301-PORVENIR	11	$ 641.999	$ 102.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 102.800
230301-PORVENIR	26	$ 1.517.451	$ 242.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 242.800
25-14 COLPENSIONES	26	$ 1.517.451	$ 242.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 242.800
230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200
230301-PORVENIR	4	$ 233.454	$ 37.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 37.400
230301-PORVENIR	4	$ 233.454	$ 37.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 37.400
230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200
230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
EPSIC6-PIJAOSALUD EPSI	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100
EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100
ESSC24-COOSALUD ESS	11	$ 641.999	$ 25.700	$ 0	$ 25.700
EPS037-NUEVA EPS	26	$ 1.517.451	$ 60.700	$ 0	$ 60.700
EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	26	$ 1.517.451	$ 60.700	$ 0	$ 60.700
EPS017-FAMISANAR	28	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100
EPS005-SANITAS S.A	4	$ 233.454	$ 9.400	$ 0	$ 9.400
EPS002-SALUD TOTAL	4	$ 233.454	$ 9.400	$ 0	$ 9.400
EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100
EPS005-SANITAS S.A	28	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100

SEGURIDAD SOCIAL — ARP ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900
14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900
14-11 - ARL SURA	11	$ 641.999		$ 44.700
14-11 - ARL SURA	26	$ 1.517.451		$ 105.700
14-11 - ARL SURA	26	$ 1.517.451		$ 105.700
14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 9.200
14-11 - ARL SURA	4	$ 233.454		$ 16.300
14-11 - ARL SURA	4	$ 233.454		$ 16.300
14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 9.200
14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 9.200

PARAFISCALES — CCF DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
30	1.750.905	CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
30	1.750.905	CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	$ 641.999	CCF34-COFREM META	$ 25.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
26	1.517.451	CCF34-COFREM META	$ 60.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
26	1.517.451	CCF34-COFREM META	$ 60.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
30	1.750.905	CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	$ 233.454	CCF34-COFREM META	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	$ 233.454	CCF34-COFREM META	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
30	1.750.905	CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
30	1.750.905	CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	902013442
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			UNION TEMPORAL CONFISCA 25
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO GAITAN	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	MZ 2 CASA 10 BRR MI RANCHITO	TELÉFONO:	1234567
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	8-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			5169240119	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	septiembre	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/09/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			0802885663

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

Nº	DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	PENSIONADA	NOVEDADES: ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN: ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP: SUBSISTENCIA	FSP: SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS: EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS: EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
1	CC 1124818451	RAMIREZ CAMILO ANDRES	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	28															230301-PORVENIR	3	$ 175.091	$ 28.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 28.100
2	CC 13565681	HERNANDEZ QUINTANA JULIO ELIAS	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	18															230301-PORVENIR	12	$ 758.726	$ 121.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 121.400
3	CC 18958206	ESCORCIA SILVA EMMANUEL RAFAEL	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	03															231001-COLFONDOS	28	$ 1.634.178	$ 261.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 261.500
4	CC 1018516168	PARRADO ROJAS ASTRID CONSTANZA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200
5	CC 52481418	MARTINEZ MOLINA DENISE ROCIO	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			SI																25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000
6	CC 72481128	SANCHEZ USECHE JOSE	DEPEND	PENS VOLUNTARIO	$ 2.500.000	FIJO			SI																	30	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0
7	CC 74325151	HERNANDEZ CALDERON JAIRER DARIO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200
8	CC 86047574	TRIGOS MORENO WILLIAM	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																11-30 230301-PORVENIR	20	$ 1.167.270	$ 186.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 186.800
9	CC 86047574	TRIGOS MORENO WILLIAM	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																230301-PORVENIR	10	$ 583.635	$ 93.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 93.400
10	CC 86050299	RAMIREZ CASTRO EDWIN LEONARDO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	21	30														230301-PORVENIR	10	$ 583.635	$ 93.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 93.400
11	CC 86062896	BAQUERO MUNOZ CARLOS EDUARDO	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000
12	CC 86249434	FLOREZ RODRIGUEZ JIM MARIO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	28															230301-PORVENIR	5	$ 291.818	$ 46.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 46.700
13	PT 5140206	REYES CHIRIJE PABLO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	27															230301-PORVENIR	4	$ 233.454	$ 37.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 37.400

Nº	SEGURIDAD SOCIAL: SALUD: ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP: ADMIN	DIAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT.	PARAFISCALES: IBC	CCF: ADMIN	CCF: TOTAL APORTE	SENA: TOTAL APORTE	ICBF: TOTAL APORTE	ESAP: TOTAL APORTE	MINEDU: TOTAL APORTE
1	EPS037-NUEVA EPS	3	$ 175.091	$ 7.100	$ 0	$ 7.100	14-11 - ARL SURA	3	$ 175.091		$ 12.200	3	$ 175.091	CCF34-COFREM META	$ 7.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	EPS037-NUEVA EPS	12	$ 758.726	$ 30.400	$ 0	$ 30.400	14-11 - ARL SURA	12	$ 758.726		$ 52.900	13	$ 758.726	CCF34-COFREM META	$ 30.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	ESSC24-COOSALUD ESS	28	$ 1.634.178	$ 65.400	$ 0	$ 65.400	14-11 - ARL SURA	28	$ 1.634.178		$ 113.800	28	$ 1.634.178	CCF34-COFREM META	$ 65.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.000.000		$ 139.200	30	$ 2.000.000	CCF34-COFREM META	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 100.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.500.000		$ 174.000	30	$ 2.500.000	CCF34-COFREM META	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	20	$ 1.167.270	$ 46.700	$ 0	$ 46.700	14-11 - ARL SURA	20	$ 1.167.270		$ 0	20	$ 1.167.270	CCF34-COFREM META	$ 46.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	10	$ 583.635	$ 23.400	$ 0	$ 23.400	14-11 - ARL SURA	10	$ 583.635		$ 40.700	10	$ 583.635	CCF34-COFREM META	$ 23.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	EPS005-SANITAS S.A	10	$ 583.635	$ 23.400	$ 0	$ 23.400	14-11 - ARL SURA	10	$ 583.635		$ 3.100	10	$ 607.953	CCF34-COFREM META	$ 24.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.000.000		$ 139.200	30	$ 2.000.000	CCF34-COFREM META	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	5	$ 291.818	$ 11.700	$ 0	$ 11.700	14-11 - ARL SURA	5	$ 291.818		$ 20.400	5	$ 291.818	CCF34-COFREM META	$ 11.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	EPS037-NUEVA EPS CM	4	$ 233.454	$ 9.400	$ 0	$ 9.400	14-11 - ARL SURA	4	$ 233.454		$ 16.300	4	$ 233.454	CCF34-COFREM META	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 7.918.200

Planilla Pagada
SOI

6069

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	902013442
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			UNION TEMPORAL CONFISCA 25
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO GAITAN	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	MZ 2 CASA 10 BRR MI RANCHITO	TELÉFONO:	1234567
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**5169240119**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: agosto	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	septiembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:		AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/09/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			0802885663

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 843.000
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 261.500
8002248088	230301	230301-PORVENIR	17	$ 3.028.800
		SUBTOTAL:	21	**$ 4.133.300**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9002267153	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	2	$ 91.100
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	2	$ 140.200
8090083622	EPSIC6	EPSIC6-PIJAOSALUD EPSI	1	$ 70.100
9001562642	EPS041	NUEVA EPS CM	1	$ 9.400
9006043500	EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	1	$ 11.700
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4	$ 168.300
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	5	$ 253.000
9002983729	EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	2	$ 130.800
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	4	$ 259.500
		SUBTOTAL:	22	**$ 1.134.100**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8920001463	CCF34	CCF34-COFREM META	22	$ 1.135.100
		SUBTOTAL:	22	**$ 1.135.100**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	22	$ 1.515.700
		SUBTOTAL:	22	**$ 1.515.700**

VALOR SIN MORA:	**$ 7.918.200**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 7.918.200**

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

6077

UNION TEMPORAL CONFISCA 25
NIT 901013442-0

NOMINA MENSUAL FEBRERO

Diligencie los siguientes valores de referencia:		Periodo de pago		
Salario mínimo	$ 1.750.905	1/02/2026	AL	28/02/2026
Auxilio de transporte	$ 249.095	Fecha de liquidación		
¿Está exonerado del pago de aportes?	Si	28/02/2026		

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	PERIODO DE PAGO		SALARIO BÁSICO	INCS	DEVENGADO								DEDUCCIONES		NETO PAGADO	FIRMA
			DESDE	HASTA			Días	Salario devengado	Días	INCS devengado	Horas extras	Recargos nocturnos	Trabajo dominical y festivo	Aux. de transporte	Total devengado	Salud	Pensión	
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	40.186.168	DIRECTOR DE OBRA	16/02/2026	28/02/2026	$ 875.453		15	$ 437.726	$ 15	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 62.274	$ 500.000	$ 17.509	$ 17.509	$ 464.982	
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	40.186.168	ESP. AMBIENTAL	16/02/2026	28/02/2026	$ 875.453		15	$ 437.726	$ 15	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 62.274	$ 500.000	$ 17.509	$ 17.509	$ 464.982	
CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ	86.062.096	RESIDENTE DE OBRA	16/02/2026	28/02/2026	$ 2.000.000		15	$ 1.000.000	$ 15	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 124.548	$ 1.124.548	$ 40.000	$ 40.000	$ 1.044.548	
DENISE ROCIO MARTINEZ MOLINA	52.481.418	PROF. SALUD OCUPACIONAL	16/02/2026	28/02/2026	$ 2.000.000		15	$ 1.000.000	$ 15	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 124.548	$ 1.124.548	$ 40.000	$ 40.000	$ 1.044.548	
DIEGO LEONARDO PAEZ MONTERO	1.121.946.586	ING. DE APOYO TECNICO	1/02/2026	28/02/2026	$ 1.750.905		30	$ 1.750.905	$ 30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 1.859.928	
MARIA FERNANDA PULIDO RODRIGUEZ	1.049.653.548	ING. DE APOYO TECNICO	1/02/2026	28/02/2026	$ 1.750.905		30	$ 1.750.905	$ 30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 1.859.928	
WILLIAM ALEXANDER BEJARANO MORENO	1.121.829.244	CONTROLADOR VIAL	16/02/2026	28/02/2026	$ 1.750.905		15	$ 875.453	$ 15	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 124.548	$ 1.000.000	$ 35.018	$ 35.018	$ 929.964	
CRISTIAN ALEXANDER MORA GARZON	1.006.783.220	INSPECTOR DE OBRA	17/02/2026	28/02/2026	$ 1.750.905		14	$ 817.089	$ 14	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 116.244	$ 933.333	$ 32.684	$ 32.684	$ 867.966	
WALFRAN PEREZ CARIBAN	1.124.991.535	AYUDANTE DE OBRA	19/02/2026	28/02/2026	$ 1.750.905		12	$ 700.362	$ 12	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 99.638	$ 800.000	$ 28.014	$ 28.014	$ 743.971	
MAYCOL SAMUEL HERNANDEZ VANEGAS	1.124.818.911	AYUDANTE DE OBRA	19/02/2026	28/02/2026	$ 1.750.905		12	$ 700.362	$ 12	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 99.638	$ 800.000	$ 28.014	$ 28.014	$ 743.971	
DANIEL ANDRES AYALA ROJAS	1.124.818.810	AYUDANTE DE OBRA	27/02/2026	28/02/2026	$ 1.750.905		4	$ 233.454	$ 4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 33.213	$ 266.667	$ 9.338	$ 9.338	$ 247.990	
CESAR AUGUSTO HERNANDEZ CALDERON	3.215.459	OFICIAL DE OBRA	27/02/2026	28/02/2026	$ 1.750.905		4	$ 233.454	$ 4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 33.213	$ 266.667	$ 9.338	$ 9.338	$ 247.990	
TOTALES					$ 19.758.145	$ -	$ 181	$ 9.937.436	$ 181	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.376.326	$ 11.315.762	$ 397.497	$ 397.497	$ 10.520.767	

Redondeado al peso	Neto pagado: $10.520.767	Diez Millones Quinientos Veinte Mil Setecientos Sesenta y Siete Pesos

NOMBRE	CEDULA	DÍAS	TOTAL NOMINA	8,33%	CESANTÍAS	1%	INTERÉS CESANTÍAS	8,33%	PRIMA DE SERVICIO	4,17%	VACACIONES
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	40.186.168	15	$ 500.000	$	41.667	$	208	$	41.667	$	16.239
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	40.186.168	15	$ 500.000	$	41.667	$	208	$	41.667	$	18.239
CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ	86.062.096	15	$ 1.124.548	$	93.712	$	469	$	93.712	$	41.667
DENISE ROCIO MARTINEZ MOLINA	52.481.418	15	$ 1.124.548	$	93.712	$	469	$	93.712	$	41.667
DIEGO LEONARDO PAEZ MONTERO	1.121.946.586	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
MARIA FERNANDA PULIDO RODRIGUEZ	1.049.653.548	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
WILLIAM ALEXANDER BEJARANO MORENO	1.121.829.244	15	$ 1.000.000	$	83.333	$	417	$	83.333	$	36.477
CRISTIAN ALEXANDER MORA GARZON	1.006.783.220	14	$ 933.333	$	77.778	$	363	$	77.778	$	34.045
WALFRAN PEREZ CARIBAN	1.124.991.535	12	$ 800.000	$	66.667	$	267	$	66.667	$	29.182
MAYCOL SAMUEL HERNANDEZ VANEGAS	1.124.818.911	12	$ 800.000	$	66.667	$	267	$	66.667	$	29.182
DANIEL ANDRES AYALA ROJAS	1.124.818.810	4	$ 266.667	$	22.222	$	30	$	22.222	$	9.727
CESAR AUGUSTO HERNANDEZ CALDERON	3.215.459	4	$ 266.667	$	22.222	$	30	$	22.222	$	9.727
TOTAL NOMINA			$ 11.315.762	$	942.980	$	6.059	$	942.980	$	414.080

TOTAL PROVISIONES DE PRESTACIONES SOCIALES	$	2.306.079
TOTAL NOMINA	$	10.520.767
TOTAL NOMINA + PROVISIÓN PRESTACIONES SOCIALES	$	**12.826.846**

REVISADO Y APROBADO POR:

MIGUEL ANGEL GUERRERO
CONTADOR PUBLICO
C.C 1123086252 TP 271654-T

6072

UNION TEMPORAL CONFISCA 25
NIT 901013442-0

NOMINA MENSUAL MARZO

Diligencie los siguientes valores de referencia:		Periodo de pago		
Salario mínimo	$ 1.750.905	1/03/2026	AL	31/03/2026
Auxilio de transporte	$ 249.095	Fecha de liquidación		
¿Está exonerado del pago de aportes?	SI	31/03/2026		

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	PERIODO DE PAGO		SALARIO BÁSICO	INCS	DEVENGADO								DEDUCCIONES		NETO PAGADO	FIRMA
			DESDE	HASTA			Días	Salario devengado	Días	INCS devengado	Horas extras	Recargos nocturnos	Trabajo dominical y festivo	Aux. de transporte	Total devengado	Salud	Pensión	
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	40.186.188	DIRECTOR DE OBRA	1/03/2026	31/03/2026	$ 875.453		30	$ 875.453	$ 30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 124.548	$ 1.000.000	$ 35.018	$ 35.018	$ 929.964	
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	40.186.188	ESP. AMBIENTAL	1/03/2026	31/03/2026	$ 875.453		30	$ 875.453	$ 30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 124.548	$ 1.000.000	$ 35.018	$ 35.018	$ 929.964	
CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ	86.062.098	RESIDENTE DE OBRA	1/03/2026	31/03/2026	$ 2.000.000		30	$ 2.000.000	$ 30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.249.095	$ 80.000	$ 80.000	$ 2.089.095	
DENISE ROCIO MARTINEZ MOLINA	52.481.416	PROF. SALUD OCUPACIONAL	1/03/2026	31/03/2026	$ 2.000.000		30	$ 2.000.000	$ 30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.249.095	$ 80.000	$ 80.000	$ 2.089.095	
DIEGO LEONARDO PAEZ MONTERO	1.121.946.566	ING. DE APOYO TECNICO	1/03/2026	31/03/2026	$ 1.750.905	$ 700.072	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 700.072	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.700.072	$ 70.036	$ 70.036	$ 2.560.000	
MARIA FERNANDA PULIDO RODRIGUEZ	1.049.653.548	ING. DE APOYO TECNICO	1/03/2026	31/03/2026	$ 1.750.905	$ 700.072	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 700.072	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.700.072	$ 70.036	$ 70.036	$ 2.560.000	
WILLIAM ALEXANDER BEJARANO MORENO	1.121.829.244	CONTROLADOR VIAL	1/03/2026	31/03/2026	$ 1.750.905	$ 660.072	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 660.072	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.660.072	$ 70.036	$ 70.036	$ 2.520.000	
CRISTIAN ALEXANDER MORA GARZON	1.006.763.220	AUXILIAR DE INGENERIA	1/03/2026	31/03/2026	$ 1.750.905	$ 700.072	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 700.072	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.700.072	$ 70.036	$ 70.036	$ 2.560.000	
WALFRAN PEREZ CARIBAN	1.124.991.535	AYUDANTE DE OBRA	1/03/2026	31/03/2026	$ 1.750.905	$ 65.000	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 65.000	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.065.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 1.924.928	
MAYCOL SAMUEL HERNANDEZ VANEGAS	1.124.818.911	AYUDANTE DE OBRA	1/03/2026	31/03/2026	$ 1.750.905	$ 325.522	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 325.522	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.325.522	$ 70.036	$ 70.036	$ 2.185.480	
DANIEL ANDRES AYALA ROJAS	1.124.818.810	AYUDANTE DE OBRA	1/03/2026	31/03/2026	$ 1.750.905		30	$ 1.750.905	$ 30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 1.859.928	
CESAR AUGUSTO HERNANDEZ CALDERON	3.215.459	OFICIAL DE OBRA	1/03/2026	31/03/2026	$ 1.750.905	$ 700.362	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 700.362	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.700.362	$ 70.036	$ 70.036	$ 2.560.290	
JABIER DARIO HERNANDEZ CALDERON	74.325.151	AYUDANTE DE OBRA	9/03/2026	31/03/2026	$ 1.750.905		22	$ 1.283.997	$ 22	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 182.670	$ 1.466.667	$ 51.360	$ 51.360	$ 1.363.947	
JOSE SANCHEZ USECHE	7.248.128	AUXILIAR DE PATIO	10/03/2026	31/03/2026	$ 2.500.000	$ 457.143	21	$ 1.750.000	$ 21	$ 320.000	$ -	$ -	$ -	$ 174.367	$ 2.244.367	$ 70.000	$ -	$ 2.174.367	
CRISTIAN FERNANDO PARDO VARGAS	1.006.776.906	AYUDANTE DE OBRA	16/03/2026	31/03/2026	$ 1.750.905		15	$ 875.453	$ 15	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 124.548	$ 1.000.000	$ 35.018	$ 35.018	$ 929.964	
WILLIAM TRIGOS MORENO	86.047.574	OFICIAL DE OBRA	16/03/2026	31/03/2026	$ 1.750.905	$ 700.362	15	$ 875.453	$ 15	$ 350.181	$ -	$ -	$ -	$ 124.548	$ 1.350.181	$ 35.018	$ 35.018	$ 1.280.145	
CAMILO ANDRES RODRIGUEZ VEGA	1.006.691.448	AYUDANTE DE OBRA	18/03/2026	31/03/2026	$ 1.750.905		15	$ 875.453	$ 15	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 124.548	$ 1.000.000	$ 35.018	$ 35.018	$ 929.964	
TOTALES					$ 29.261.765	$ 5.008.677		$ 26.418.500	$ 448	$ 4.521.353	$ -	$ -	$ -	$ 3.470.724	$ 33.410.576	$ 1.016.740	$ 946.740	$ 31.447.096	

Redondeado al peso	Neto pagado: $31.447.096	Treinta y Un Millones Cuatrocientos Cuarenta y Siete Mil Noventa y Seis Pesos

6073

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
NIT 902013442-0

NOMINA MENSUAL MARZO

Diligencie los siguientes valores de referencia:		Periodo de pago		
Salario mínimo	$ 1.750.905	1/03/2026	AL	31/03/2026
Auxilio de transporte	$ 249.095	Fecha de liquidación		
¿Está exonerado del pago de aportes?	SI	31/03/2026		

NOMBRE	CEDULA	DIAS	TOTAL NOMINA	8,33%	CESANTÍAS	1%	INTERÉS CESANTÍAS	8,33%	PRIMA DE SERVICIO	4,17%	VACACIONES
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	40.186.168	30	$ 1.000.000	$	83.333	$	833	$	83.333	$	36.477
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	40.186.168	30	$ 1.000.000	$	83.333	$	833	$	83.333	$	36.477
CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ	86.062.096	30	$ 2.249.095	$	187.425	$	1.874	$	187.425	$	83.333
DENISE ROCIO MARTINEZ MOLINA	52.481.418	30	$ 2.249.095	$	187.425	$	1.874	$	187.425	$	83.333
DIEGO LEONARDO PAEZ MONTERO	1.121.946.586	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
MARIA FERNANDA PULIDO RODRIGUEZ	1.049.653.548	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
WILLIAM ALEXANDER BEJARANO MORENO	1.121.829.244	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
CRISTIAN ALEXANDER MORA GARZON	1.006.783.220	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
WALFRAN PEREZ CARIBAN	1.124.991.535	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
MAYCOL SAMUEL HERNANDEZ VANEGAS	1.124.818.911	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
DANIEL ANDRES AYALA ROJAS	1.124.818.810	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
CESAR AUGUSTO HERNANDEZ CALDERON	3.215.459	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
JABIER DARIO HERNANDEZ CALDERON	74.325.151	22	$ 1.466.667	$	122.222	$	896	$	122.222	$	53.500
JOSE SANCHEZ USECHE	7.248.128	21	$ 1.924.387	$	160.364	$	1.123	$	160.364	$	72.917
CRISTIAN FERNANDO PARDO VARGAS	1.006.776.906	15	$ 1.000.000	$	83.333	$	417	$	83.333	$	36.477
WILLIAM TRIGOS MORENO	86.047.574	15	$ 1.000.000	$	83.333	$	417	$	83.333	$	36.477
CAMILO ANDRES RODRIGUEZ VEGA	1.006.691.448	15	$ 1.000.000	$	83.333	$	417	$	83.333	$	36.477
TOTAL NOMINA			**$ 28.889.223**	**$**	**2.407.435**	**$**	**22.017**	**$**	**2.407.435**	**$**	**1.059.104**

TOTAL PROVISIONES DE PRESTACIONES SOCIALES	$	5.695.992
TOTAL NOMINA	$	31.447.096
TOTAL NOMINA + PROVISIÓN PRESTACIONES SOCIALES	$	**37.343.088**

REVISADO Y APROBADO POR:

MIGUEL ANGEL GUERRERO
CONTADOR PÚBLICO
C.C 1123086252 TP 271654-T

6074

UNION TEMPORAL CONFISCA 25
NIT 902013442-0

NOMINA MENSUAL ABRIL

Diligencie los siguientes valores de referencia:		Periodo de pago		
Salario mínimo	$ 1.750.905	1/04/2026	AL	30/04/2026
Auxilio de transporte	$ 249.095	Fecha de liquidación		
¿Está exonerado del pago de aportes?	Si	30/04/2026		

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	PERIODO DE PAGO		SALARIO BÁSICO	INCS	DEVENGADO									DEDUCCIONES		NETO PAGADO	FIRMA
			DESDE	HASTA			Días	Salario devengado	Días	INCS devengado	Horas extras	Recargos nocturnos	Trabajo dominical y festivo	Aux. de transporte	Total devengado	Salud	Pensión		
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	40.186.168	DIRECTOR DE OBRA	1/04/2026	30/04/2026	$ 875.453		30	$ 875.453	$ 30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 124.548	$ 1.000.000	$ 35.018	$ 35.018	$ 929.964	
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	40.186.168	ESP. AMBIENTAL	1/04/2026	30/04/2026	$ 875.453		30	$ 875.453	$ 30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 124.548	$ 1.000.000	$ 35.018	$ 35.018	$ 929.964	
CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ	86.062.096	RESIDENTE DE OBRA	1/04/2026	30/04/2026	$ 2.000.000		30	$ 2.000.000	$ 30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.249.095	$ 80.000	$ 80.000	$ 2.089.095	
DENISE ROCIO MARTINEZ MOLINA	52.481.418	PROF. SALUD OCUPACIONAL	1/04/2026	30/04/2026	$ 2.000.000		30	$ 2.000.000	$ 30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.249.095	$ 80.000	$ 80.000	$ 2.089.095	
DIEGO LEONARDO PAEZ MONTERO	1.121.946.586	ING. DE APOYO TECNICO	1/04/2026	30/04/2026	$ 1.750.905	$ 700.072	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 700.072	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.700.072	$ 70.036	$ 70.036	$ 2.560.000	
WILLIAM ALEXANDER BEJARANO MORENO	1.121.829.244	CONTROLADOR VIAL	1/04/2026	30/04/2026	$ 1.750.905	$ 540.072	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 540.072	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.540.072	$ 70.036	$ 70.036	$ 2.400.000	
CRISTIAN ALEXANDER MORA GARZON	1.006.783.220	AUXILIAR DE INGENERIA	1/04/2026	30/04/2026	$ 1.750.905	$ 700.072	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 700.072	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.700.072	$ 70.036	$ 70.036	$ 2.560.000	
WALFRAN PEREZ CARIBAN	1.124.991.535	AYUDANTE DE OBRA	1/04/2026	30/04/2026	$ 1.750.905	$ 40.000	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 40.000	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.040.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 1.899.928	
MAYCOL SAMUEL HERNANDEZ VANEGAS	1.124.818.911	AYUDANTE DE OBRA	1/04/2026	30/04/2026	$ 1.750.905	$ -	30	$ 1.750.905	$ 30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 1.859.928	
DANIEL ANDRES AYALA ROJAS	1.124.818.810	AYUDANTE DE OBRA	1/04/2026	30/04/2026	$ 1.750.905	$ 50.000	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 50.000	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.050.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 1.909.928	
CESAR AUGUSTO HERNANDEZ CALDERON	3.215.459	OFICIAL DE OBRA	1/04/2026	30/04/2026	$ 1.750.905	$ 700.362	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 700.362	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.700.362	$ 70.036	$ 70.036	$ 2.560.290	
JABIER DARIO HERNANDEZ CALDERON	74.325.151	AYUDANTE DE OBRA	1/04/2026	30/04/2026	$ 1.750.905	$ 120.000	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 120.000	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.120.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 1.979.928	
JOSE SANCHEZ USECHE	7.248.128	AUXILIAR DE PATIO	1/04/2026	30/04/2026	$ 2.500.000	$ 960.000	30	$ 2.500.000	$ 30	$ 960.000	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 3.709.095	$ 100.000	$ -	$ 3.609.095	
CRISTIAN FERNANDO PARDO VARGAS	1.006.776.906	AYUDANTE DE OBRA	1/04/2026	30/04/2026	$ 1.750.905	$ 90.000	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 90.000	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.090.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 1.949.928	
WILLIAM TRIGOS MORENO	86.047.574	OFICIAL DE OBRA	1/04/2026	30/04/2026	$ 1.750.905	$ 700.362	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 700.362	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.700.362	$ 70.036	$ 70.036	$ 2.560.290	
CAMILO ANDRES RODRIGUEZ VEGA	1.006.691.448	AYUDANTE DE OBRA	1/04/2026	30/04/2026	$ 1.750.905	$ 10.000	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 10.000	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.010.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 1.869.928	
LEIDER ESTEBAN DARAPO GAITAN	1.134.450.031	AYUDANTE DE OBRA	7/04/2026	30/04/2026	$ 1.750.905	$ 90.000	24	$ 1.400.724	$ 24	$ 72.000	$ -	$ -	$ -	$ 199.276	$ 1.672.000	$ 56.029	$ 56.029	$ 1.559.942	
DANY FABIAN JAIMES CAAMAÑO	1.052.413.449	AYUDANTE DE OBRA	7/04/2026	30/04/2026	$ 1.750.905	$ 80.000	24	$ 1.400.724	$ 24	$ 64.000	$ -	$ -	$ -	$ 199.276	$ 1.664.000	$ 56.029	$ 56.029	$ 1.551.942	
TOTALES					$ 31.012.670	$ 4.780.940		$ 30.312.308		$ 4.746.940	$ -	$ -	$ -	$ 4.134.977	$ 39.194.225	$ 1.212.492	$ 1.112.492	$ 36.869.240	

Redondeado al peso	Neto pagado: $36.869.240	Treinta y Seis Millones Ochocientos Sesenta y Nueve Mil Doscientos Cuarenta Pesos

6075

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
NIT 902013442-0

NOMINA MENSUAL ABRIL

Diligencie los siguientes valores de referencia:		Periodo de pago		
Salario mínimo	$ 1.750.905	1/04/2026	AL	30/04/2026
Auxilio de transporte	$ 249.095	Fecha de liquidación		
¿Está exonerado del pago de aportes?	Si	30/04/2026		

NOMBRE	CEDULA	DÍAS	TOTAL NOMINA	8,33%	CESANTÍAS	1%	INTERÉS CESANTÍAS	8,33%	PRIMA DE SERVICIO	4,17%	VACACIONES
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	40.186.168	30	$ 1.000.000	$	83.333	$	833	$	83.333	$	36.477
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	40.186.168	30	$ 1.000.000	$	83.333	$	833	$	83.333	$	36.477
CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ	86.062.096	30	$ 2.249.095	$	187.425	$	1.874	$	187.425	$	83.333
DENISE ROCIO MARTINEZ MOLINA	52.481.418	30	$ 2.249.095	$	187.425	$	1.874	$	187.425	$	83.333
DIEGO LEONARDO PAEZ MONTERO	1.121.946.586	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
WILLIAM ALEXANDER BEJARANO MORENO	1.121.829.244	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
CRISTIAN ALEXANDER MORA GARZON	1.006.783.220	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
WALFRAN PEREZ CARIBAN	1.124.991.535	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
MAYCOL SAMUEL HERNANDEZ VANEGAS	1.124.818.911	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
DANIEL ANDRES AYALA ROJAS	1.124.818.810	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
CESAR AUGUSTO HERNANDEZ CALDERON	3.215.459	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
JABIER DARIO HERNANDEZ CALDERON	74.325.151	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
JOSE SANCHEZ USECHE	7.248.128	30	$ 2.749.095	$	229.091	$	2.291	$	229.091	$	104.167
CRISTIAN FERNANDO PARDO VARGAS	1.006.776.906	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
WILLIAM TRIGOS MORENO	86.047.574	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
CAMILO ANDRES RODRIGUEZ VEGA	1.006.691.448	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
LEIDER ESTEBAN DARAPO GAITAN	1.134.450.031	24	$ 1.600.000	$	133.333	$	1.067	$	133.333	$	58.364
DANY FABIAN JAIMES CAAMAÑO	1.052.413.449	24	$ 1.600.000	$	133.333	$	1.067	$	133.333	$	58.364
TOTAL NOMINA			**$ 34.447.265**	**$**	**2.870.607**	**$**	**28.173**	**$**	**2.870.607**	**$**	**1.263.013**

TOTAL PROVISIONES DE PRESTACIONES SOCIALES	$	7.032.400
TOTAL NOMINA	$	36.869.240
TOTAL NOMINA + PROVISIÓN PRESTACIONES SOCIALES	**$**	**43.901.640**

REVISADO Y APROBADO POR:

MIGUEL ANGEL GUERRERO
CONTADOR PÚBLICO
C.C 1123086252 TP 271654-T

6076

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
NIT 902013442-0

NOMINA MENSUAL MAYO

Diligencia los siguientes valores de referencia:		Periodo de pago		
Salario mínimo	$ 1.750.905	1/05/2026	AL	31/05/2026
Auxilio de transporte	$ 249.095	Fecha de liquidación		
¿Está exonerado del pago de aportes?	SI	31/05/2026		

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	PERIODO DE PAGO		SALARIO BÁSICO	INCS	DEVENGADO									DEDUCCIONES		NETO PAGADO	FIRMA
			DESDE	HASTA			Días	Salario devengado	Días	INCS devengado	Horas extras	Recargos nocturnos	Trabajo dominical y festivo	Aux. de transporte	Total devengado	Salud	Pensión		
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	40.186.168	DIRECTOR DE OBRA	1/05/2026	31/05/2026	$ 875.453		30	$ 875.453	$ 30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 124.548	$ 1.000.000	$ 35.018	$ 35.018	$ 929.964	
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	40.186.168	ESP. AMBIENTAL	1/05/2026	31/05/2026	$ 875.453		30	$ 875.453	$ 30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 124.548	$ 1.000.000	$ 35.018	$ 35.018	$ 929.964	
CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ	86.062.096	RESIDENTE DE OBRA	1/05/2026	31/05/2026	$ 2.000.000		30	$ 2.000.000	$ 30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.249.095	$ 80.000	$ 80.000	$ 2.089.095	
DENISE ROCIO MARTINEZ MOLINA	52.481.418	PROF. SALUD OCUPACIONAL	1/05/2026	31/05/2026	$ 2.000.000		30	$ 2.000.000	$ 30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.249.095	$ 80.000	$ 80.000	$ 2.089.095	
DIEGO LEONARDO PAEZ MONTERO	1.121.946.586	ING. DE APOYO TECNICO	1/05/2026	31/05/2026	$ 1.750.905	$ 700.072	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 700.072	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.700.072	$ 70.036	$ 70.036	$ 2.560.000	
WILLIAM ALEXANDER BEJARANO MORENO	1.121.829.244	CONTROLADOR VIAL	1/05/2026	31/05/2026	$ 1.750.905	$ 540.072	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 540.072	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.540.072	$ 70.036	$ 70.036	$ 2.400.000	
CRISTIAN ALEXANDER MORA GARZON	1.006.783.220	AUXILIAR DE INGENIERIA	1/05/2026	31/05/2026	$ 1.750.905	$ 700.072	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 700.072	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.700.072	$ 70.036	$ 70.036	$ 2.560.000	
WALFRAN PEREZ CARIBAN	1.124.991.535	AYUDANTE DE OBRA	1/05/2026	31/05/2026	$ 1.750.905	$ 34.000	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 34.000	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.034.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 1.893.928	
MAYCOL SAMUEL HERNANDEZ VANEGAS	1.124.818.911	AYUDANTE DE OBRA	1/05/2026	31/05/2026	$ 1.750.905		30	$ 1.750.905	$ 30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 1.859.928	
DANIEL ANDRES AYALA ROJAS	1.124.818.810	AYUDANTE DE OBRA	1/05/2026	31/05/2026	$ 1.750.905		30	$ 1.750.905	$ 30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 1.859.928	
CESAR AUGUSTO HERNANDEZ CALDERON	3.215.469	OFICIAL DE OBRA	1/05/2026	31/05/2026	$ 1.750.906	$ 700.072	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 700.072	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.700.072	$ 70.036	$ 70.036	$ 2.560.000	
JABIER DARIO HERNANDEZ CALDERON	74.325.151	AYUDANTE DE OBRA	1/05/2026	31/05/2026	$ 1.750.905	$ 434.000	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 434.000	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.434.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 2.293.928	
JOSE SANCHEZ USECHE	7.248.128	AUXILIAR DE PATIO	1/05/2026	31/05/2026	$ 2.500.000	$ 720.000	30	$ 2.500.000	$ 30	$ 720.000	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 3.469.095	$ 100.000	$ -	$ 3.369.095	
CRISTIAN FERNANDO PARDO VARGAS	1.006.776.906	AYUDANTE DE OBRA	1/05/2026	31/05/2026	$ 1.750.905		30	$ 1.750.905	$ 30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 1.859.928	
WILLIAM TRIGOS MORENO	86.047.574	OFICIAL DE OBRA	1/05/2026	31/05/2026	$ 1.750.905	$ 600.000	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 600.000	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.600.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 2.459.928	
CAMILO ANDRES RODRIGUEZ VEGA	1.006.691.448	AYUDANTE DE OBRA	1/05/2026	31/05/2026	$ 1.750.905		30	$ 1.750.905	$ 30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 1.859.928	
LEIDER ESTEBAN DARAPO GAITAN	1.134.450.031	AYUDANTE DE OBRA	1/05/2026	31/05/2026	$ 1.750.905	$ 34.000	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 34.000	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.034.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 1.893.928	
DANY FABIAN JAIMES CAAMAÑO	1.052.413.449	AYUDANTE DE OBRA	1/05/2026	31/05/2026	$ 1.750.905		30	$ 1.750.905	$ 30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 1.859.928	
TOTALES					$ 31.012.670	$ 4.462.288		$ 31.012.670		$ 4.462.288	$ -	$ -	$ -	$ 4.234.615	$ 39.799.573	$ 1.249.507	$ 1.146.567	$ 37.328.559	

Redondeado al peso	Neto pagado: $37.328.559	Treinta y Siete Millones Trescientos Veintiocho Mil Quinientos Cincuenta y Nueve Pesos

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
NIT 902013448-0

NOMINA MENSUAL MAYO

Diligencie los siguientes valores de referencia:		Periodo de pago		
Salario mínimo	$ 1.750.905	1/05/2026	AL	31/05/2026
Auxilio de transporte	$ 249.095	Fecha de liquidación		
¿Está exonerado del pago de aportes?	Si	31/05/2026		

NOMBRE	CEDULA	DIAS	TOTAL NOMINA	8,33%	CESANTÍAS	1%	INTERÉS CESANTÍAS	8,33%	PRIMA DE SERVICIO	4,17%	VACACIONES
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	40.186.188	30	$ 1.000.000	$	83.333	$	833	$	83.333	$	36.477
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	40.186.188	30	$ 1.000.000	$	83.333	$	833	$	83.333	$	36.477
CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ	86.062.096	30	$ 2.249.095	$	187.425	$	1.874	$	187.425	$	83.333
DENISE ROCIO MARTINEZ MOLINA	52.481.418	30	$ 2.249.095	$	187.425	$	1.874	$	187.425	$	83.333
DIEGO LEONARDO PAEZ MONTERO	1.121.946.586	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
WILLIAM ALEXANDER BEJARANO MORENO	1.121.629.244	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
CRISTIAN ALEXANDER MORA GARZON	1.006.783.220	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
WALFRAN PEREZ CARIBAN	1.124.991.535	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
MAYCOL SAMUEL HERNANDEZ VANEGAS	1.124.818.911	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
DANIEL ANDRES AYALA ROJAS	1.124.818.810	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
CESAR AUGUSTO HERNANDEZ CALDERON	3.215.459	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
JABIER DARIO HERNANDEZ CALDERON	74.325.151	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
JOSE SANCHEZ USECHE	7.248.128	30	$ 2.749.095	$	229.091	$	2.291	$	229.091	$	104.167
CRISTIAN FERNANDO PARDO VARGAS	1.006.776.906	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
WILLIAM TRIGOS MORENO	86.047.574	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
CAMILO ANDRES RODRIGUEZ VEGA	1.006.691.448	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
LEIDER ESTEBAN DARAPO GAITAN	1.134.450.031	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
DANY FABIAN JAIMES CAAMAÑO	1.052.413.449	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
TOTAL NOMINA			**$ 35.247.285**	**$**	**2.937.274**	**$**	**29.373**	**$**	**2.937.274**	**$**	**1.292.195**

TOTAL PROVISIONES DE PRESTACIONES SOCIALES	$	7.196.115
TOTAL NOMINA	$	37.328.559
TOTAL NOMINA + PROVISIÓN PRESTACIONES SOCIALES	**$**	**44.524.674**

REVISADO Y APROBADO POR:

MIGUEL ANGEL GUERRERO
CONTADOR PÚBLICO
C.C 1.123.086.252 TP 271654-T

6078

UNION TEMPORAL CONFISCA 25
NIT 9020134420

NOMINA MENSUAL JUNIO

Diligencie los siguientes valores de referencia:		Periodo de pago		
Salario mínimo	$ 1.750.905	1/06/2026	AL	30/06/2026
Auxilio de transporte	$ 249.095	Fecha de liquidación		
¿Está exonerado del pago de aportes?	SI	30/06/2026		

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	PERIODO DE PAGO		SALARIO BÁSICO	INCS	DEVENGADO									DEDUCCIONES		NETO PAGADO	FIRMA
			DESDE	HASTA			Días	Salario devengado	Días	INCS devengado	Horas extras	Recargos nocturnos	Trabajo dominical y festivo	Aux. de transporte	Total devengado	Salud	Pensión		
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	40.186.168	DIRECTOR DE OBRA	1/06/2026	30/06/2026	$ 875.453		30	$ 875.453	$ 30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 124.548	$ 1.000.000	$ 35.018	$ 35.018	$ 929.964	
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	40.186.168	ESP. AMBIENTAL	1/06/2026	30/06/2026	$ 875.453		30	$ 875.453	$ 30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 124.548	$ 1.000.000	$ 35.018	$ 35.018	$ 929.964	
CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ	80.062.096	RESIDENTE DE OBRA	1/06/2026	30/06/2026	$ 2.000.000		30	$ 2.000.000	$ 30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.249.095	$ 80.000	$ 80.000	$ 2.089.095	
DENISE ROCIO MARTINEZ MOLINA	52.491.416	PROF. SALUD OCUPACIONAL	1/06/2026	30/06/2026	$ 2.000.000		30	$ 2.000.000	$ 30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.249.095	$ 80.000	$ 80.000	$ 2.089.095	
DIEGO LEONARDO PAEZ MONTERO	1.121.946.566	ING. DE APOYO TECNICO	1/06/2026	30/06/2026	$ 1.750.905	$ 700.072	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 700.072	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.700.072	$ 70.036	$ 70.036	$ 2.560.000	
WILLIAM ALEXANDER BEJARANO MORENO	1.121.829.244	AUXILIAR OPERATIVO INTEGRAL	1/06/2026	30/06/2026	$ 1.750.905	$ 540.072	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 540.072	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.540.072	$ 70.036	$ 70.036	$ 2.400.000	
CRISTIAN ALEXANDER MORA GARZON	1.006.763.220	AUXILIAR DE INGENERIA	1/06/2026	30/06/2026	$ 1.750.905	$ 700.072	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 700.072	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.700.072	$ 70.036	$ 70.036	$ 2.560.000	
ADOLFO VASQUEZ MOSCOSO	1.023.879.760	REPRESENTANTE LEGAL	1/06/2026	30/06/2026	$ 1.750.905	$ -	30	$ 1.750.905	$ 30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 1.859.928	
WALFRAN PEREZ CARIBAN	1.124.991.535	CONTROLADOR VIAL	1/06/2026	5/06/2026	$ 1.750.905	$ -	5	$ 291.818	$ 5	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 41.516	$ 333.333	$ 11.673	$ 11.673	$ 309.988	
WALFRAN PEREZ CARIBAN	1.124.991.535	CONTROLADOR VIAL	16/06/2026	30/06/2026	$ 1.750.905	$ 20.000	15	$ 875.453	$ 15	$ 10.000	$ -	$ -	$ -	$ 124.548	$ 1.010.000	$ 35.018	$ 35.018	$ 939.964	
MAYCOL SAMUEL HERNANDEZ VANEGAS	1.124.818.911	AYUDANTE DE OBRA	1/06/2026	5/06/2026	$ 1.750.905		5	$ 291.818	$ 5	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 41.516	$ 333.333	$ 11.673	$ 11.673	$ 309.988	
MAYCOL SAMUEL HERNANDEZ VANEGAS	1.124.818.911	AYUDANTE DE OBRA	16/06/2026	30/06/2026	$ 1.750.905		13	$ 758.726	$ 13	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 107.941	$ 866.667	$ 30.349	$ 30.349	$ 805.969	
CESAR AUGUSTO HERNANDEZ CALDERON	3.215.459	OFICIAL DE OBRA	1/06/2026	5/06/2026	$ 1.750.905	$ 700.072	5	$ 291.818	$ 5	$ 116.679	$ -	$ -	$ -	$ 41.516	$ 450.012	$ 11.673	$ 11.673	$ 426.667	
CESAR AUGUSTO HERNANDEZ CALDERON	3.215.459	OFICIAL DE OBRA	16/06/2026	30/06/2026	$ 1.750.905	$ 700.072	15	$ 875.453	$ 15	$ 350.036	$ -	$ -	$ -	$ 124.548	$ 1.350.036	$ 35.018	$ 35.018	$ 1.280.000	
JABIER DARIO HERNANDEZ CALDERON	74.325.151	AYUDANTE DE OBRA	1/06/2026	5/06/2026	$ 1.750.905	$ -	5	$ 291.818	$ 5	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 41.516	$ 333.333	$ 11.673	$ 11.673	$ 309.988	
JABIER DARIO HERNANDEZ CALDERON	74.325.151	AYUDANTE DE OBRA	16/06/2026	30/06/2026	$ 1.750.905	$ 220.000	15	$ 875.453	$ 15	$ 110.000	$ -	$ -	$ -	$ 124.548	$ 1.110.000	$ 35.018	$ 35.018	$ 1.039.964	
JOSE SANCHEZ USECHE	7.248.128	AUXILIAR DE PATIO	1/06/2026	30/06/2026	$ 2.500.000	$ 800.000	30	$ 2.500.000	$ 30	$ 800.000	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 3.649.095	$ 100.000	$ -	$ 3.449.095	
CRISTIAN FERNANDO PARDO VARGAS	1.006.776.906	AYUDANTE DE OBRA	1/06/2026	5/06/2026	$ 1.750.905		5	$ 291.818	$ 5	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 41.516	$ 333.333	$ 11.673	$ 11.673	$ 309.988	
WILLIAM TRIGOS MORENO	86.047.574	OFICIAL DE OBRA	1/06/2026	5/06/2026	$ 1.750.905	$ 700.072	5	$ 291.818	$ 5	$ 116.679	$ -	$ -	$ -	$ 41.516	$ 450.012	$ 11.673	$ 11.673	$ 426.667	
WILLIAM TRIGOS MORENO	86.047.574	OFICIAL DE OBRA	16/06/2026	30/06/2026	$ 1.750.905	$ 700.072	15	$ 875.453	$ 15	$ 350.036	$ -	$ -	$ -	$ 124.548	$ 1.350.036	$ 35.018	$ 35.018	$ 1.280.000	
CAMILO ANDRES RODRIGUEZ VEGA	1.006.691.448	AYUDANTE DE OBRA	1/06/2026	5/06/2026	$ 1.750.905		5	$ 291.818	$ 5	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 41.516	$ 333.333	$ 11.673	$ 11.673	$ 309.988	
CAMILO ANDRES RODRIGUEZ VEGA	1.006.691.448	AYUDANTE DE OBRA	16/06/2026	30/06/2026	$ 1.750.905		15	$ 875.453	$ 15	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 124.548	$ 1.000.000	$ 35.018	$ 35.018	$ 929.964	
LEIDER ESTEBAN DARAPO GAITAN	1.134.450.031	AYUDANTE DE OBRA	1/06/2026	5/06/2026	$ 1.750.905	$ -	5	$ 291.818	$ 5	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 41.516	$ 333.333	$ 11.673	$ 11.673	$ 309.988	
LEIDER ESTEBAN DARAPO GAITAN	1.134.450.031	AYUDANTE DE OBRA	16/06/2026	30/06/2026	$ 1.750.905	$ -	15	$ 875.453	$ 15	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 124.548	$ 1.000.000	$ 35.018	$ 35.018	$ 929.964	
DANY FABIAN JAIMES CAAMAÑO	1.052.413.449	AYUDANTE DE OBRA	1/06/2026	5/06/2026	$ 1.750.905		5	$ 291.818	$ 5	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 41.516	$ 333.333	$ 11.673	$ 11.673	$ 309.988	
TOTALES					$ 43.369.005	$ 5.780.504		$ 23.692.323		$ 3.703.645	$ -	$ -	$ -	$ 3.221.629	$ 30.907.597	$ 955.693	$ 955.693	$ 29.096.211	

6079

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
NIT 902013442-0

NOMINA MENSUAL JUNIO

Diligencie los siguientes valores de referencia:		Periodo de pago		
Salario mínimo	$ 1.750.905	1/06/2026	AL	30/06/2026
Auxilio de transporte	$ 249.095	Fecha de liquidación		
¿Está exonerado del pago de aportes?	SI	30/06/2026		

Redondeado al peso	Neto pagado: $29.096.211	Veintinueve Millones Noventa y Seis Mil Doscientos Once Pesos

NOMBRE	CEDULA	DÍAS	TOTAL NOMINA	8,33%	CESANTÍAS	1%	INTERÉS CESANTÍAS	8,33%	PRIMA DE SERVICIO	4,17%	VACACIONES
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	40.186.168	30	$ 1.000.000	$	83.333	$	833	$	83.333	$	36.477
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	40.186.168	30	$ 1.000.000	$	83.333	$	833	$	83.333	$	36.477
CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ	86.062.096	30	$ 2.249.095	$	187.425	$	1.874	$	187.425	$	83.333
DENISE ROCIO MARTINEZ MOLINA	52.481.418	30	$ 2.249.095	$	187.425	$	1.874	$	187.425	$	83.333
DIEGO LEONARDO PAEZ MONTERO	1.121.946.586	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
WILLIAM ALEXANDER BEJARANO MORENO	1.121.829.244	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
CRISTIAN ALEXANDER MORA GARZON	1.006.783.220	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
ADOLFO VASQUEZ MOSCOSO	1.023.879.760	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
WALFRAN PEREZ CARIBAN	1.124.991.535	5	$ 333.333	$	27.778	$	46	$	27.778	$	12.159
WALFRAN PEREZ CARIBAN	1.124.991.535	15	$ 1.000.000	$	83.333	$	417	$	83.333	$	36.477
MAYCOL SAMUEL HERNANDEZ VANEGAS	1.124.818.911	5	$ 333.333	$	27.778	$	46	$	27.778	$	12.159
MAYCOL SAMUEL HERNANDEZ VANEGAS	1.124.818.911	13	$ 866.667	$	72.222	$	313	$	72.222	$	31.614
CESAR AUGUSTO HERNANDEZ CALDERON	3.215.459	5	$ 333.333	$	27.778	$	46	$	27.778	$	12.159
CESAR AUGUSTO HERNANDEZ CALDERON	3.215.459	15	$ 1.000.000	$	83.333	$	417	$	83.333	$	36.477
JABIER DARIO HERNANDEZ CALDERON	74.325.151	5	$ 333.333	$	27.778	$	46	$	27.778	$	12.159
JABIER DARIO HERNANDEZ CALDERON	74.325.151	15	$ 1.000.000	$	83.333	$	417	$	83.333	$	36.477
JOSE SANCHEZ USECHE	7.248.128	30	$ 2.749.095	$	229.091	$	2.291	$	229.091	$	104.167
CRISTIAN FERNANDO PARDO VARGAS	1.006.776.906	5	$ 333.333	$	27.778	$	46	$	27.778	$	12.159
WILLIAM TRIGOS MORENO	86.047.574	5	$ 333.333	$	27.778	$	46	$	27.778	$	12.159
WILLIAM TRIGOS MORENO	86.047.574	15	$ 1.000.000	$	83.333	$	417	$	83.333	$	36.477
CAMILO ANDRES RODRIGUEZ VEGA	1.006.691.448	5	$ 333.333	$	27.778	$	46	$	27.778	$	12.159
CAMILO ANDRES RODRIGUEZ VEGA	1.006.691.448	15	$ 1.000.000	$	83.333	$	417	$	83.333	$	36.477
LEIDER ESTEBAN DARAPO GAITAN	1.134.450.031	5	$ 333.333	$	27.778	$	46	$	27.778	$	12.159
LEIDER ESTEBAN DARAPO GAITAN	1.134.450.031	15	$ 1.000.000	$	83.333	$	417	$	83.333	$	36.477
DANY FABIAN JAIMES CAMMAÑO	1.052.413.449	5	$ 333.333	$	27.778	$	46	$	27.778	$	12.159
TOTAL NOMINA			$ 27.113.952	$	2.259.496	$	17.602	$	2.259.496	$	995.513

TOTAL PROVISIONES DE PRESTACIONES SOCIALES	$	5.532.108
TOTAL NOMINA	$	29.096.211
TOTAL NOMINA + PROVISIÓN PRESTACIONES SOCIALES	$	34.628.319

REVISADO Y APROBADO POR:

MIGUEL ANGEL GUERRERO
CONTADOR PÚBLICO
C.C 1.123.086.252 TP 271654-T

6080

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
NIT 901013442-0

NOMINA MENSUAL JULIO

Diligencie los siguientes valores de referencia:		Periodo de pago		
Salario mínimo	$ 1.750.905	1/07/2026	AL	31/07/2026
Auxilio de transporte	$ 249.095	Fecha de liquidación		
¿Está exonerado del pago de aportes?	SI	31/07/2026		

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	PERIODO DE PAGO		SALARIO BÁSICO	INCS	DEVENGADO								DEDUCCIONES		NETO PAGADO	FIRMA
			DESDE	HASTA			Dias	Salario devengado	Dias	INCS devengado	Horas extras	Recargos nocturnos	Trabajo dominical y festivo	Aux. de transporte	Total devengado	Salud	Pensión	
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	40.186.168	DIRECTOR DE OBRA	1/07/2026	31/07/2026	$ 875.453		30	$ 875.453	$ 30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 124.548	$ 1.000.000	$ 35.018	$ 35.018	$ 929.964	
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	40.186.168	ESP. AMBIENTAL	1/07/2026	31/07/2026	$ 875.453		30	$ 875.453	$ 30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 124.548	$ 1.000.000	$ 35.018	$ 35.018	$ 929.964	
CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ	86.062.096	RESIDENTE DE OBRA	1/07/2026	31/07/2026	$ 2.000.000		30	$ 2.000.000	$ 30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.249.095	$ 80.000	$ 80.000	$ 2.089.095	
DENISE ROCIO MARTINEZ MOLINA	52.481.418	PROF. SALUD OCUPACIONAL	1/07/2026	31/07/2026	$ 2.000.000		30	$ 2.000.000	$ 30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.249.095	$ 80.000	$ 80.000	$ 2.089.095	
DIEGO LEONARDO PAEZ MONTERO	1.121.946.586	ING. DE APOYO TECNICO	1/07/2026	31/07/2026	$ 1.750.905	$ 700.072	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 700.072	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.700.072	$ 70.036	$ 70.036	$ 2.560.000	
WILLIAM ALEXANDER BEJARANO MORENO	1.121.829.244	AUXILIAR OPERATIVO INTEGRAL	1/07/2026	31/07/2026	$ 1.750.905	$ 540.072	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 540.072	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.540.072	$ 70.036	$ 70.036	$ 2.400.000	
CRISTIAN ALEXANDER MORA GARZON	1.006.783.220	AUXILIAR DE INGENERIA	1/07/2026	31/07/2026	$ 1.750.905	$ 700.072	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 700.072	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.700.072	$ 70.036	$ 70.036	$ 2.560.000	
ADOLFO VASQUEZ MOSCOSO	1.023.879.760	REPRESENTANTE LEGAL	1/07/2026	31/07/2026	$ 1.750.905	$ 700.072	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 700.072	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.700.072	$ 70.036	$ 70.036	$ 2.560.000	
WALFRAN PEREZ CARIBAN	1.124.991.535	CONTROLADOR VIAL	1/07/2026	31/07/2026	$ 1.750.905	$ 520.000	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 520.000	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.520.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 2.379.928	
MAYCOL SAMUEL HERNANDEZ VANEGAS	1.124.818.911	AYUDANTE DE OBRA	1/07/2026	31/07/2026	$ 1.750.905	$ 520.000	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 520.000	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.520.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 2.379.928	
CESAR AUGUSTO HERNANDEZ CALDERON	3.215.459	OFICIAL DE OBRA	1/07/2026	31/07/2026	$ 1.750.905	$ 700.072	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 700.072	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.700.072	$ 70.036	$ 70.036	$ 2.560.000	
JABIER DARIO HERNANDEZ CALDERON	74.325.151	AYUDANTE DE OBRA	1/07/2026	31/07/2026	$ 1.750.905	$ 350.000	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 350.000	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.350.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 2.209.928	
JOSE SANCHEZ USECHE	7.248.128	AUXILIAR DE PATIO	1/07/2026	31/07/2026	$ 2.600.000	$ 960.000	30	$ 2.600.000	$ 30	$ 960.000	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 3.709.095	$ 100.000	$ -	$ 3.609.095	
CRISTIAN FERNANDO PARDO VARGAS	1.006.776.906	AYUDANTE DE OBRA	1/07/2026	31/07/2026	$ 1.750.905	$ 140.000	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 140.000	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.140.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 1.999.928	
WILLIAM TRIGOS MORENO	86.047.574	OFICIAL DE OBRA	1/07/2026	31/07/2026	$ 1.750.905	$ 700.072	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 700.072	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.700.072	$ 70.036	$ 70.036	$ 2.560.000	
LEIDER ESTEBAN DARAPO GAITAN	1.134.459.031	AYUDANTE DE OBRA	1/07/2026	31/07/2026	$ 1.750.905	$ 180.000	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 180.000	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.180.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 2.039.928	
DANY FABIAN JAIMES CAAMAÑO	1.052.413.449	AYUDANTE DE OBRA	1/07/2026	22/07/2026	$ 1.750.905		22	$ 1.283.997	$ 22	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 182.670	$ 1.466.667	$ 51.360	$ 51.360	$ 1.363.947	
TOTALES					$ 29.261.765	$ 6.710.432		$ 28.794.857		$ 6.710.432	$ -	$ -	$ -	$ 3.919.095	$ 39.424.384	$ 1.151.794	$ 1.051.794	$ 37.220.795	

6089

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
NIT 902013448-0

NOMINA MENSUAL JULIO

Diligencie los siguientes valores de referencia:		Periodo de pago		
Salario mínimo	$ 1.750.905	1/07/2026	Al	31/07/2026
Auxilio de transporte	$ 249.095	Fecha de liquidación		
¿Está exonerado del pago de aportes?	Si	31/07/2026		

Redondeado al peso	Neto pagado: $37.220.795	Treinta y Siete Millones Doscientos Veinte Mil Setecientos Noventa y Cinco Pesos

NOMBRE	CEDULA	DÍAS	TOTAL NOMINA	8,33%	CESANTÍAS	1%	INTERÉS CESANTÍAS	8,33%	PRIMA DE SERVICIO	4,17%	VACACIONES
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	40.186.168	30	$ 1.000.000	$	83.333	$	833	$	83.333	$	36.477
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	40.186.168	30	$ 1.000.000	$	83.333	$	833	$	83.333	$	36.477
CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ	86.062.096	30	$ 2.249.095	$	187.425	$	1.874	$	187.425	$	83.333
DENISE ROCIO MARTINEZ MOLINA	52.481.418	30	$ 2.249.095	$	187.425	$	1.874	$	187.425	$	83.333
DIEGO LEONARDO PAEZ MONTERO	1.121.946.586	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
WILLIAM ALEXANDER BEJARANO MORENO	1.121.829.244	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
CRISTIAN ALEXANDER MORA GARZON	1.006.783.220	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
ADOLFO VASQUEZ MOSCOSO	1.023.879.760	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
WALFRAN PEREZ CARIBAN	1.124.991.535	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
MAYCOL SAMUEL HERNANDEZ VANEGAS	1.124.818.911	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
CESAR AUGUSTO HERNANDEZ CALDERON	3.215.459	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
JABIER DARIO HERNANDEZ CALDERON	74.325.151	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
JOSE SANCHEZ USECHE	7.248.128	30	$ 2.749.095	$	229.091	$	2.291	$	229.091	$	104.167
CRISTIAN FERNANDO PARDO VARGAS	1.006.776.906	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
WILLIAM TRIGOS MORENO	86.047.574	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
LEIDER ESTEBAN DARAPO GAITAN	1.134.450.031	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
DANY FABIAN JAIMES CAAMAÑO	1.052.413.449	22	$ 1.466.667	$	122.222	$	896	$	122.222	$	53.500
TOTAL NOMINA			$ 32.713.962	$	2.726.163	$	26.936	$	2.726.163	$	1.199.786

TOTAL PROVISIONES DE PRESTACIONES SOCIALES	$	6.679.047
TOTAL NOMINA	$	37.220.795
TOTAL NOMINA + PROVISIÓN PRESTACIONES SOCIALES	$	43.899.842

REVISADO Y APROBADO POR:

MIGUEL ANGEL GUERRERO
CONTADOR PÚBLICO
C.C 1.123.066.252 TP 271654-T

6082

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
NIT 901013442-0

NOMINA MENSUAL AGOSTO

Diligencie los siguientes valores de referencia:		Periodo de pago		
Salario mínimo	$ 1.750.905	1/08/2026	AL	31/08/2026
Auxilio de transporte	$ 249.095	Fecha de liquidación		
¿Está exonerado del pago de aportes?	SI	31/08/2026		

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	PERIODO DE PAGO		SALARIO BÁSICO	INCS	DEVENGADO									DEDUCCIONES		NETO PAGADO	FIRMA
			DESDE	HASTA			Días	Salario devengado	Días	INCS devengado	Horas extras	Recargos nocturnos	Trabajo dominical y festivo	Aux. de transporte	Total devengado	Salud	Pensión		
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	40.186.168	DIRECTOR DE OBRA	1/08/2026	31/08/2026	$ 875.453		30	$ 875.453	$ 30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 124.548	$ 1.000.000	$ 35.018	$ 35.018	$ 929.964	
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	40.186.168	ESP. AMBIENTAL	1/08/2026	31/08/2026	$ 875.453		30	$ 875.453	$ 30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 124.548	$ 1.000.000	$ 35.018	$ 35.018	$ 929.964	
CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ	86.062.066	RESIDENTE DE OBRA	1/08/2026	31/08/2026	$ 2.000.000		30	$ 2.000.000	$ 30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.249.095	$ 60.000	$ 60.000	$ 2.089.095	
DENISE ROCIO MARTINEZ MOLINA	52.481.418	PROF. SALUD OCUPACIONAL	1/08/2026	31/08/2026	$ 2.000.000		30	$ 2.000.000	$ 30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.249.095	$ 60.000	$ 60.000	$ 2.089.095	
DIEGO LEONARDO PAEZ MONTERO	1.121.946.566	ING. DE APOYO TECNICO	1/08/2026	31/08/2026	$ 1.750.905	$ 700.072	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 700.072	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.700.072	$ 70.036	$ 70.036	$ 2.560.000	
WILLIAM ALEXANDER BEJARANO MORENO	1.121.829.244	AUXILIAR OPERATIVO INTEGRAL	1/08/2026	31/08/2026	$ 1.750.905	$ 540.072	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 540.072	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.540.072	$ 70.036	$ 70.036	$ 2.400.000	
CRISTIAN ALEXANDER MORA GARZON	1.006.783.220	AUXILIAR DE INGENERIA	1/08/2026	31/08/2026	$ 1.750.905	$ 700.072	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 700.072	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.700.072	$ 70.036	$ 70.036	$ 2.560.000	
ADOLFO VASQUEZ MOSCOSO	1.023.879.760	REPRESENTANTE LEGAL	1/08/2026	31/08/2026	$ 1.750.905	$ 700.072	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 700.072	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.700.072	$ 70.036	$ 70.036	$ 2.560.000	
JABIER DARIO HERNANDEZ CALDERON	74.325.151	AYUDANTE DE OBRA	1/08/2026	31/08/2026	$ 1.750.905	$ 80.000	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 80.000	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.080.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 1.939.928	
JOSE SANCHEZ USECHE	7.248.128	AUXILIAR DE PATIO	1/08/2026	31/08/2026	$ 2.500.000	$ 1.000.000	30	$ 2.500.000	$ 30	$ 1.000.000	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 3.749.095	$ 100.000	$ -	$ 3.649.095	
CRISTIAN FERNANDO PARDO VARGAS	1.006.776.906	AYUDANTE DE OBRA	1/08/2026	31/08/2026	$ 1.750.905	$ 50.000	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 50.000	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.050.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 1.909.928	
WILLIAM TRIGOS MORENO	86.047.574	OFICIAL DE OBRA	1/08/2026	31/08/2026	$ 1.750.905	$ 700.072	30	$ 1.750.905	$ 30	$ 700.072	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.700.072	$ 70.036	$ 70.036	$ 2.560.000	
ENMANUEL RAFAEL ESCORCIA SILVA	18.959.209	OFICIAL DE OBRA	3/08/2026	31/08/2026	$ 1.750.905	$ 700.072	28	$ 1.634.178	$ 28	$ 653.401	$ -	$ -	$ -	$ 232.469	$ 2.520.067	$ 65.367	$ 65.367	$ 2.389.333	
JUAN CAMILO GUZMAN PEREZ	1.023.374.553	CONTROLADOR VIAL	5/08/2026	31/08/2026	$ 1.750.905	$ 100.000	26	$ 1.517.451	$ 26	$ 86.667	$ -	$ -	$ -	$ 215.882	$ 1.820.000	$ 60.698	$ 60.698	$ 1.698.604	
JORGE VERGARA	1.010.026.192	AYUDANTE DE OBRA	5/08/2026	31/08/2026	$ 1.750.905	$ 100.000	26	$ 1.517.451	$ 26	$ 86.667	$ -	$ -	$ -	$ 215.882	$ 1.820.000	$ 60.698	$ 60.698	$ 1.698.604	
JULIO ELIAS HERNANDEZ QUINTANA	13.565.981	OFICIAL DE OBRA	18/08/2026	31/08/2026	$ 1.750.905	$ 700.072	13	$ 768.726	$ 13	$ 303.365	$ -	$ -	$ -	$ 107.941	$ 1.170.031	$ 30.349	$ 30.349	$ 1.109.333	
LAURA JULIANA LOPEZ LANDAETA	1.006.822.611	ING. DE APOYO TECNICO	20/08/2026	31/08/2026	$ 1.750.905	$ 700.072	11	$ 641.999	$ 11	$ 256.693	$ -	$ -	$ -	$ 91.335	$ 990.026	$ 25.680	$ 25.680	$ 938.667	
EDWIN GEOVANNY RAMIREZ CASTRO	80.060.299	ING. DE APOYO TECNICO	21/08/2026	31/08/2026	$ 1.750.905	$ 700.072	10	$ 583.635	$ 10	$ 233.357	$ -	$ -	$ -	$ 83.032	$ 900.024	$ 23.345	$ 23.345	$ 853.333	
JIM MARIO FLOREZ RODRIGUEZ	88.249.434	AYUDANTE DE OBRA	26/08/2026	31/08/2026	$ 1.750.905	$ 500.000	5	$ 291.818	$ 5	$ 83.333	$ -	$ -	$ -	$ 41.516	$ 416.667	$ 11.673	$ 11.673	$ 393.321	
LIBER AGUSTO ACERO QUESADA	1.121.417.962	AYUDANTE DE OBRA	27/08/2026	31/08/2026	$ 1.750.905		4	$ 233.454	$ 4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 33.213	$ 266.667	$ 9.338	$ 9.338	$ 247.990	
PABLO REYES CHIPIAJE	PPP 5140206	AYUDANTE DE OBRA	27/08/2026	31/08/2026	$ 1.750.905		4	$ 233.454	$ 4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 33.213	$ 266.667	$ 9.333	$ 9.338	$ 247.990	
JHON ALEXANDER ESGUERRA TRIANA	1.070.697.147	AYUDANTE DE OBRA	27/08/2026	31/08/2026	$ 1.750.905		4	$ 233.454	$ 4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 33.213	$ 266.667	$ 9.338	$ 9.338	$ 247.990	
CAMILO ANDRES RAMIREZ	1.124.818.451	AYUDANTE DE OBRA	28/08/2026	31/08/2026	$ 1.750.905		3	$ 175.091	$ 3	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 24.910	$ 200.000	$ 7.004	$ 7.004	$ 185.993	
TOTALES					$ 39.767.195	$ 7.970.648		$ 28.327.949		$ 6.173.842	$ -	$ -	$ -	$ 3.852.669	$ 39.354.460	$ 1.133.118	$ 1.033.118	$ 36.188.225	

6083

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
NIT 902013432-0

NOMINA MENSUAL AGOSTO

Diligencie los siguientes valores de referencia:		Periodo de pago		
Salario mínimo	$ 1.750.905	1/08/2026	Al	31/08/2026
Auxilio de transporte	$ 249.095	Fecha de liquidación		
¿Está exonerado del pago de aportes?	SI	31/08/2026		

Redondeado al peso	Neto pagado: $36.188.225	Treinta y Seis Millones Ciento Ochenta y Ocho Mil Doscientos Veinticinco Pesos

NOMBRE	CEDULA	DÍAS	TOTAL NOMINA	8,33%	CESANTÍAS	1%	INTERÉS CESANTÍAS	8,33%	PRIMA DE SERVICIO	4,17%	VACACIONES
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	40.186.168	30	$ 1.000.000	$	83.333	$	833	$	83.333	$	36.477
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	40.186.168	30	$ 1.000.000	$	83.333	$	833	$	83.333	$	36.477
CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ	86.062.096	30	$ 2.249.095	$	187.425	$	1.874	$	187.425	$	83.333
DENISE ROCIO MARTINEZ MOLINA	52.481.418	30	$ 2.249.095	$	187.425	$	1.874	$	187.425	$	83.333
DIEGO LEONARDO PAEZ MONTERO	1.121.946.586	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
WILLIAM ALEXANDER BEJARANO MORENO	1.121.829.244	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
CRISTIAN ALEXANDER MORA GARZON	1.006.783.220	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
ADOLFO VASQUEZ MOSCOSO	1.023.879.760	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
JABIER DARIO HERNANDEZ CALDERON	74.325.151	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
JOSE SANCHEZ USECHE	7.248.128	30	$ 2.749.095	$	229.091	$	2.291	$	229.091	$	104.167
CRISTIAN FERNANDO PARDO VARGAS	1.006.776.906	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
WILLIAM TRIGOS MORENO	86.047.574	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
ENMANUEL RAFAEL ESCORCIA SILVA	18.959.208	28	$ 1.866.667	$	155.556	$	1.452	$	155.556	$	68.091
JUAN CAMILO GUZMAN PEREZ	1.023.374.553	26	$ 1.733.333	$	144.444	$	1.252	$	144.444	$	63.227
JORGE VERGARA	1.010.026.192	26	$ 1.733.333	$	144.444	$	1.252	$	144.444	$	63.227
JULIO ELIAS HERNANDEZ QUINTANA	13.565.981	13	$ 866.667	$	72.222	$	313	$	72.222	$	31.614
LAURA JULIANA LOPEZ LANDAETA	1.006.822.811	11	$ 733.333	$	61.111	$	224	$	61.111	$	26.750
EDWIN GEOVANNY RAMIREZ CASTRO	86.060.299	10	$ 666.667	$	55.556	$	185	$	55.556	$	24.318
JIM MARIO FLOREZ RODRIGUEZ	86.249.434	5	$ 333.333	$	27.778	$	46	$	27.778	$	12.159
LIBER AGUSTO ACERO QUESADA	1.121.417.962	4	$ 266.667	$	22.222	$	30	$	22.222	$	9.727
PABLO REYES CHIPIAJE	PPP 5140206	4	$ 266.667	$	22.222	$	30	$	22.222	$	9.727
JHON ALEXANDER ESGUERRA TRIANA	1.070.597.147	4	$ 266.667	$	22.222	$	30	$	22.222	$	9.727
CAMILO ANDRES RAMIREZ	1.124.818.451	3	$ 200.000	$	16.667	$	17	$	16.667	$	7.295
TOTAL NOMINA			$ 32.169.618	$	2.681.718	$	24.202	$	2.681.718	$	1.180.331

TOTAL PROVISIONES DE PRESTACIONES SOCIALES	$	6.567.970
TOTAL NOMINA	$	36.188.225
TOTAL NOMINA + PROVISIÓN PRESTACIONES SOCIALES	$	42.756.195

REVISADO Y APROBADO POR:

MIGUEL ANGEL GUERRERO
CONTADOR PÚBLICO
C.C 1.123.086.252 TP 271654-T

6084

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
NIT 902013442-0

ANEXO 3: CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN DE SOBRANTES DE DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN

Puerto Gaitán – Meta
311 386 8024
Confisca25@gmail.com

6085

ZODME GUATIQUIA S.A.S

NIT. 901313682-5

NIT: 901.313.682-5

CERTIFICADO

CERTIFICA [Nº 1303]

Que la empresa UNION TEMPORAL CONFISCA 25, con NIT 902013442-0, hizo disposición final de Residuos de Construcción y Demolición, RCD (**DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION**), producto de la actividad de excavación, construccion, demolición, reparaciones o mejoras locativas de obras civiles o de otras actividades conexas complementarias o análogas que se generaron de **DISPOSICION PROVENIENTE DE CONSTRUCCION DE LA SEDE DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION EN PUERTO GAITAN - CONTRATO N. 1700 DE 2025** , y que se relacionan a continuación:

TIPO DE MATERIAL	VOLUMEN
DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION	**661.27** m^3

Esta disposición se hizo en la ZODME GUATIQUIA, ubicada en la ciudad de Villavicencio, Departamento del Meta margen izquierda del río Guatiquía, sector vanguardia y que se encuentra debidamente autorizada por la Corporación para el Desarrollo Sostenible del área de Manejo Especial La Macarena "CORMACARENA", según los permisos otorgados,mediante los oficios, No. PM GA 3.17.6217 Y PM GA 3.18.4664, PS-GJ.1.2.6.19.2837

La presente se expide en Villavicencio a los 1 días del mes 4 del año 2,026.

MAURICIO VELASQUEZ ZAPATA
Representante Legal

Vereda Vanguardia Sector la Playa
ZODME GUATIQUIA Cel.: 350 370 83 54
Villavicencio - Meta
zodmeguatiquia@gmail.com

6086

ZODME GUATIQUIA S.A.S.

NIT 901.313.682-5

Villavicencio, 09 de Enero de 2026

Señores
A QUIEN INTERESE

Asunto: Propuesta económica para la disposición final de residuos de construcción y demolición. (RCD).

Cordial Saludo:

En respuesta a su amable invitación para presentar una cotización de nuestros servicios, hemos elaborado la presente propuesta técnica y económica, para el transporte y disposición de material de excavación y demolición.

Agradecemos la atención prestada, nuestro equipo de trabajo estará atento a resolver de manera oportuna cualquier inquietud que pueda surgir a partir del presente documento.

Cordialmente,

Mauricio Velásquez Zapata
Representante Legal

Mauricio Velásquez Zapata
Representante Legal

Vereda Vanguardia, sector La Playa, Villavicencio – Meta
zodmeguatiquia@gmail.com
CEL 3503708354 – 3046027258

6087

ZODME GUATIQUIA S.A.S.

NIT 901.313.682-5

Quienes Somos

Somos una Empresa Llanera de servicios, especializada en el manejo de residuos sólidos provenientes de las actividades de excavación, construcción, demolición, reparaciones o mejoras locativas de obras civiles o de otras actividades conexas, conforme a lo establecido en la resolución No. 0472 del 28 de Febrero de 2017, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible. Contamos con la experiencia, la logística y los equipos quenos permiten ser competitivos para las tareas que requiere el sector.

Oferta Económica

De acuerdo a diálogos establecidos con esta prestigiosa firma, y atendiendo a que ustedes requieren la implementación de una ZODME, (Zona de Disposición de Material de Excavación), nuestra empresa cuenta con toda la normatividad legal vigente para su funcionamiento; por tanto nos permitimos presentarles a consideración, la siguiente propuesta comercial:

Ubicación:

La Zona de Manejo de Escombros y Material de Excavación "ZODME", identificada como ZODME GUATIQUIA, se encuentra ubicada en la salida al municipio de Restrepo, desde el Municipio de Villavicencio, dentro del Proyecto minero "Mina Guatiquía" vereda Vanguardia, sector la Playa, a 1700 metros de la vía principal.

Permisos ambientales:

Que conforme a lo establecido en la Resolución número **0472 del 28 de febrero del 2017** del ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, nuestra Compañía cuenta con los permisos ambientales; expedientes No PM GA 3.17.6217 y PM GA 3.18.4664, ambos emitidos por la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena "CORMACARENA".

Vinculación contractual

Para efectos de la suscripción de contrato y poder dar inicio a la prestación del servicio, es necesario enviar a nuestra cuenta de correo, zodmeguatiquia@gmail.com los siguientes documentos:

- Cámara de Comercio
- Rut actualizado de la empresa
- Soporte pagos de seguridad social de quien opere el vehículo
- Fotocopia de la licencia de conducción de quien opere el vehículo
- Fotocopia de Cédula de Ciudadanía de quien opere el vehículo
- Fotocopia del SOAT del vehículo que hará el transporte
- Fotocopia Tarjeta de propiedad del vehículo
- Fotocopia del certificado de emisión de gases si aplica

De igual manera atendiendo a las directrices del Ministerio de Trabajo, comprometido con las políticas de

ZODME GUATIQUIA S.A.S.

NIT 901.313.682-5

protección de los trabajadores, según lo establecido en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), nos permitimos solicitar que el personal de su empresa que ingrese a las instalaciones de la ZODME, deberá portar los siguientes elementos de protección personal:

- Casco
- Guantes
- Gafas con Protección UV
- Botas de seguridad
- Camisa Manga Larga

Finalmente, es necesario que los escombros no se encuentren mezclados con residuos ordinarios y/o peligrosos.

Costo del servicio:

DESCRIPICIÓN (RCD)	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO
DEMOLICIÓN (ESCOMBROS)	METRO CUBICO	$115.370,50
EXCAVACION	METRO CUBICO	$86.441,60
VEGETAL	METRO CUBICO	$62.674,47

Nota: El valor unitario se modificará al iniciar cada año basado en el IPC (índice de precios al consumidor)

Forma de Pago:

Se hará corte de cuentas el 30 de cada mes a partir de la primera disposición de material, para pago a 15 días después la emisión de la factura electrónica. (aplica para clientes con negociación a crédito)

Los pagos se realizarán a nombre de ZODME GUATIQUIA S.A.S NIT 901.313682-5 girados a la cuenta corriente número 351174594 BANCO DE BOGOTÁ

Acordamos mantener nuestra propuesta abierta para su aceptación, contamos con toda la disponibilidad.

Cordialmente,

Mauricio Velásquez Zapata
Representante Legal

Mauricio Velásquez Zapata
Representante Legal

ANEXO 4 PMA: FACTURA PLÁSTICO POLIETILENO CALIBRE 6 - AIM 20209009

6090

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FERRETERIA MA GOMEZ

MANUEL ALEJANDRO QUIRIFE MARQUEZ
NIT: 86.087.873-1
Responsable de IVA
Calle 35 #16-59 Este Avenida Catama, Barrio El Milagro
666 4661 - 310 2612581
ferreteriagomezma@gmail.com
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4752
Tarifa ICA: 3X1000
No somos autoretenedores

FERRETERÍA GOMEZ M.A.

MA - 9023

Fecha Factura: 12/05/2026
Fecha Vencimiento: 12/05/2026
Forma de Pago: Contado
Pedido No : 0
Fecha de Generacion: 12/05/2026 11:36:26
Fecha de Validacion : 12/05/2026 11:36:26

Nombre: UNION TEMPORAL CONFISCA 25
Razon Social: UNION TEMPORAL CONFISCA 25
Nit: 902013442-0
Direccion: MZ 2 CASA 10 BRR MI RANCHITO
Ciudad: VILLAVICENCIO
Telefono: 3113868024 **Celular:**

Vendedor: JOSE
Resolucion DIAN No. 18764108882152 / 2026-04-24 vence 2026-10-24 de: MA 8972 - 10000 vigencia en meses

CUFE: c680eb80dc2b8c252088e797f344c009fa8f157ba40eb7fbcf1678a6bce00503a8b38c8dec681a11e12c356190ba30e0

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	%Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	2541789	PLASTICO NEGRO	ROLLO	2.00	277,310.92	0.00	0.00	554,621.84	105,378.15	19	660,000.00

Total Items: 1 **Son:** SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

MEDIOS DE PAGO:

EFECTIVO : 646,134

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	554,621	105,378

OBS

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

VALOR RECIBIDO 646,134
CAMBIO 0

Subtotal:	554,622
Descuentos:	0
Subtotal Factura:	**554,622**
Iva:	105,378
Impoconsumo:	0
Icn:	0
Valor de Factura :	**660,000**
Rte-Fuente:	13,866
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total a Pagar:	**646,134**

Consignar en la cuenta bancaria BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS N.° 05711906179 o BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE N.° 198213563

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO). LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIETE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.
EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5). SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

AGIL aplicativo de gestion de información en línea

ESTE COMPROBANTE HA SIDO EMITIDO POR AGIL SOFTWARE PROPIO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE EB SOFTWARE BIC SAS NIT: 900.046.534-4.

6091

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
NIT 902013442-0

PARCIAL NRO.1 PMT

Puerto Gaitán – Meta
311 386 8024
Confisca25@gmail.com

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
NIT 902013442-0

INFORME DE PLAN DE MANEJO DE TRANSITO PARA COBRO PARCIAL NRO.1
PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE SEPTIEMBRE de 2026

CONTRATO DE OBRA NO. 1700 DE 2025

OBJETO:

CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – META

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
R/L ADOLFO VASQUEZ MOSCOSO

MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN
DEPARTAMENTO DEL META
SEPTIEMBRE DE 2026

Puerto Gaitán – Meta
311 386 8024
Confisca25@gmail.com

TABLA DE CONTENIDO

Pág.

1. INTRODUCCIÓN 3
1.1 ALCANCE 3
1.2 MARCO DE REFERENCIA LEGAL 4
1.1.1. Normas generales 4
1.1.2. Normas reglamentarias 4
2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 6
3. CATEGORÍA DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO 7
4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PRESENTE PERIODO 8
4.1 Implementación de señalización vial 11
4.2 Manejo peatonal 11
4.3 Control de tráfico y acceso de maquinaria 12
4.4 Cargue y descargue de materiales y/o RCD´s 13
4.5 Desvíos de tránsito 13
4.6 INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN del PMT 14
4.7 Gestión institucional del PMT 14
4.8 AVANCE RECURSOS DURANTE EL PERIODO – Plan de Manejo de Transito - PMT 16
5. CONCLUSIONES 17

LISTADO DE ILUSTRACIONES

Pág.

Ilustración 1. Localización general del Proyecto 6
Ilustración 2. Zonas a intervenir con la obra 6
Ilustración 3. Metodología Elaboración del PMT 7
Ilustración 4 Localización de la intervención 14
Ilustración 5 Localización de la intervención 14

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde al soporte técnico, administrativo y financiero para el cobro de las actividades ejecutadas en el marco del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) del proyecto "Construcción de la Sede de la Fiscalía General de la Nación en el Municipio de Puerto Gaitán – Meta", durante el período comprendido entre el 16 de febrero y el 15 de septiembre de 2026.

El documento tiene como finalidad evidenciar las acciones implementadas para garantizar la seguridad vial, la movilidad peatonal y vehicular, así como el adecuado control de las condiciones de tránsito en el área de influencia del proyecto, de conformidad con las disposiciones establecidas en el PMT aprobado por la autoridad competente y en cumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas por el contratista.

Así mismo, se presentan los soportes que respaldan la ejecución de los recursos objeto de cobro, incluyendo la vinculación y permanencia del personal encargado del control y apoyo a la movilidad, los respectivos aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, registros operativos y evidencias documentales que demuestran el cumplimiento de las actividades desarrolladas durante el período reportado.

La información contenida en el presente informe constituye el soporte para el reconocimiento económico de las actividades ejecutadas en desarrollo del componente PMT, las cuales contribuyeron a mantener condiciones adecuadas de seguridad, señalización y organización del tránsito en el entorno de la obra, minimizando los riesgos para peatones, trabajadores y usuarios de las vías aledañas.

1.1 ALCANCE

El presente Plan de Manejo de Tránsito (PMT) se desarrolla para el área de influencia directa de las obras del proyecto, contemplando la implementación de medidas y dispositivos para la canalización y regulación del tránsito vehicular y peatonal. Dichas medidas estarán orientadas a garantizar la seguridad de los usuarios de la vía, del personal de obra y de los equipos durante la ejecución de las actividades constructivas.

Asimismo, el plan establece las estrategias operativas, señalización temporal, desvíos y controles necesarios para mantener la movilidad en condiciones adecuadas, procurando minimizar las interferencias y afectaciones sobre el flujo normal de tránsito en las vías aledañas al proyecto, conforme a la normatividad vigente y a los lineamientos técnicos aplicables.

1.2 MARCO DE REFERENCIA LEGAL

1.1.1. Normas generales

Resolución 1885 de 2015 "Por la cual se adopta el manual de señalización vial-Dispositivos uniformes para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia" en el capítulo 4 del referido manual, respecto a la señalización y medidas de seguridad para obras en la vía, establece:

"Señalización y medidas de seguridad para obras en la vía"

"(…) Las distintas características de cada obra, y la variedad de condiciones que se pueden presentar, impiden establecer una secuencia rígida y única de dispositivos y normas. En todo caso la realización de obras que afecten la normal circulación del tránsito, deberá ser concordante y cumplir como mínimo con las especificaciones técnicas contenidas en este capítulo y ofrecer la protección a conductores de los diferentes modos de transporte, pasajeros, peatones, personal de obra, equipos y vehículos. Así mismo, la instalación de la señalización de calles y carreteras afectadas por obras civiles deberá diseñarse e instalarse de acuerdo con los lineamientos contenidos en el Plan de Manejo de Tránsito (PMT), debidamente aprobados por la autoridad competente.

1.1.2. Normas reglamentarias

CÓDIGO NACIONAL DE TRÁNSITO TERRESTRE LEY 769 DE 2002.

Dado que el proyecto contempla intervención de vías urbanas, se debe tener en cuenta lo establecido en el CÓDIGO NACIONAL DE TRÁNSITO TERRESTRE LEY 769 DE 2002, TITULO III, CAPITULO VIII **Trabajos eventuales en vía pública:**

Artículo 101. Normas para realizar trabajos en vía pública. Siempre que deban efectuarse trabajos que alteren la circulación en las vías públicas, el interesado en tal labor obtendrá en forma previa la autorización correspondiente de la autoridad competente y señalizará el sitio de labor mediante la colocación de señales preventivas, reglamentarias e informativas que han de iluminarse en horas nocturnas. Los proyectos de edificación que causen modificaciones al sistema de tránsito o se constituyan en un polo importante generados de viajes tales como parques de diversiones, centros comerciales, estadios, centros culturales y otros, deberán tener la aprobación del organismo de tránsito de la jurisdicción.

Toda persona de derecho público o privado interesada en realizar alguna intervención en la vía pública pondrá en conocimiento de la autoridad de tránsito local la licencia que se le conceda para tal propósito, el lugar de la intervención y su duración estimada con una antelación no inferior a ocho (8) días, para que ésta le autorice y tome las medidas oportunas para mitigar el impacto que en la circulación pueda producir la intervención, pudiendo, si así lo amerita la índole de la

labor, restringir o suspender el tránsito por la vía, disponiendo su traslado a trayectos alternos, y señalizándola de acuerdo con las restricciones que determine la autoridad competente. Una vez terminada la intervención, es responsabilidad de la persona de derecho público o privado, el retiro de todos los dispositivos de control de tránsito utilizados, so pena de ser multado por la autoridad de tránsito competente. En los eventos previstos en los incisos anteriores el interesado deberá presentar junto con su solicitud un plan de señalización y desvíos, que debe ser aprobado por la autoridad competente.

Parágrafo. El Ministerio de Transporte determinará, los elementos y los dispositivos de señalización necesarios en las obras de construcción. Conc.: 102, 109 y ss.

Artículo 102. Manejo de escombros. Todo material de trabajo y escombros en la vía pública será manejado por el responsable de la labor, debidamente aislado, tomando las medidas para impedir que se disemine por cualquier forma, o que limite la circulación de vehículos o peatones, de acuerdo con las normas ambientales vigentes y será debidamente señalizado.

Parágrafo. Será sancionado por la Secretaría de Tránsito que corresponda con multa equivalente a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes, el particular u organismo estatal que no cumpla con el debido manejo de escombros y desechos de construcción, así como estará obligado a efectuar las reparaciones por daños infringidos a los bienes de uso público. Conc.: 101.

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

La obra se localiza en el Municipio de Puerto Gaitán Meta, con dirección: Calle 10 # 6-60 y Carrera 7 # 10-22 en el barrio Centro.

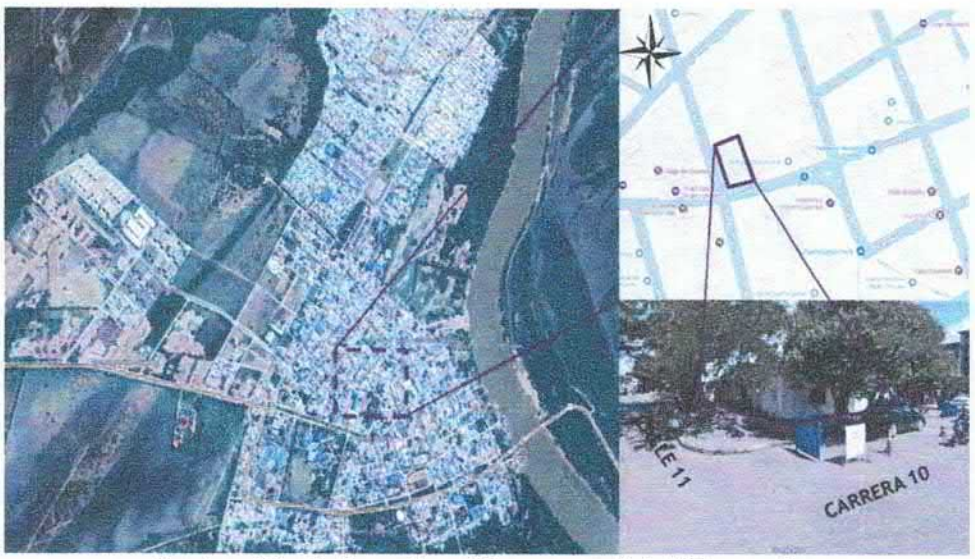


Ilustración 1. Localización general del Proyecto.

Las vías a intervenir con circulación de maquinaria, dentro del proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META" son la Calle 11 y la Carrera 10.



Ilustración 2. Zonas a intervenir con la obra
Fuente: Propia con Google Earth

3. CATEGORÍA DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO

El proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META", se enmarca dentro de una intervención **CATEGORÍA I** de acuerdo a lo dispuesto en el Manual de señalización del INVÍAS.

Este tipo de obras corresponde a aquellas en que los espacios de circulación son muy poco afectados por las intervenciones y no hay afectación sobre zonas aledañas. Hay poca o nula intervención en los espacios de circulación peatonal. El impacto de la obra sobre el tránsito de vehículos puede ser mitigado por la misma infraestructura a intervenir sin esperar que los flujos sean desviados.

A continuación, se presentan los lineamientos para la elaboración del PMT, según el Manual de señalización vial Capitulo 4. Para el caso en particular se ha definido que el tipo de PMT a implementar es el tipo I

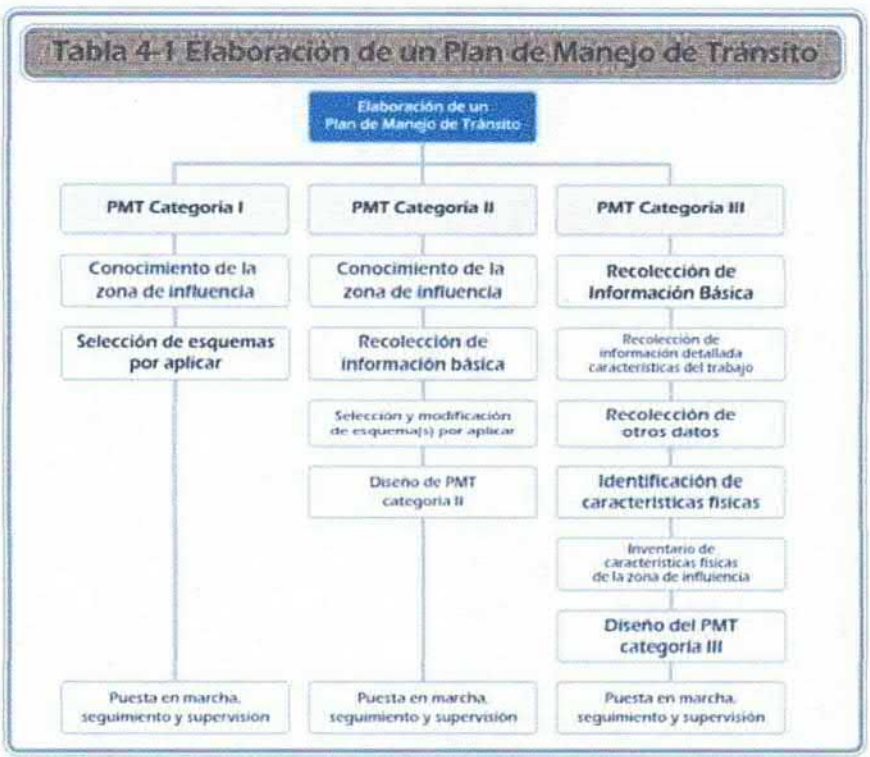


Ilustración 3. Metodología Elaboración del PMT
Fuente: Manual de señalización vial 2015

Para esta categoría normalmente la zona de influencia de los trabajos será igual al espacio de los trabajos. Con base en los esquemas se puede definir el costo de las señales, auxiliares de tránsito, movilización y similares. Esta categoría de trabajos se resume con valor global fijo y requiere de una inspección cada día para confirmar la presencia de todos los elementos contemplados en el PMT.

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PRESENTE PERIODO

Para la presente Acta Parcial No. 1, correspondiente al período comprendido entre el **16 de febrero y el 15 de septiembre de 2026**, se presenta para cobro la ejecución de las actividades asociadas al Plan de Manejo de Tránsito (PMT), específicamente las relacionadas con la implementación, seguimiento y mantenimiento de las medidas de control y seguridad vial requeridas durante el desarrollo del proyecto.

El cobro corresponde principalmente a la permanencia y disponibilidad del personal destinado al control del tránsito y apoyo a la movilidad en el área de influencia directa de la obra, garantizando el adecuado manejo de peatones, el control de accesos al frente de trabajo, la orientación a los usuarios de la vía y la correcta implementación de las medidas establecidas en el PMT aprobado por la autoridad competente.

Para efectos del reconocimiento económico, se anexan los soportes correspondientes a la vinculación del personal asignado, planillas de pago al Sistema de Seguridad Social Integral, aportes parafiscales, registros de asistencia, soportes administrativos y registros fotográficos que evidencian la ejecución de las actividades durante el período reportado.

Así mismo, durante el período de ejecución se mantuvo la señalización preventiva e informativa instalada en el frente de obra, se garantizó la adecuada delimitación del área de trabajo y se dio cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Plan de Manejo de Tránsito aprobado para el proyecto, contribuyendo a la seguridad de peatones, trabajadores y usuarios de las vías aledañas.

Febrero

NOMBRES	CEDULA	CARGO	DEDICACIÓN
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	40.186.168	DIRECTOR DE OBRA	20%
		ESPECIALISTA AMBIENTAL	30%
CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ	86.062.096	RESIDENTE DE OBRA	100%
DENISE ROCIÓ MARTÍNEZ MOLINA	52.481.418	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL	100%
WILLIAM ALEXANDER BEJARANO MORENO	1.121.829.244	CONTROLADOR VIAL	100%
CRISTIAN ALEXANDER MORA GARZÓN	1.006.783.220	INSPECTOR DE OBRA	100%

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
NIT 902013442-0

Marzo

NOMBRES	CEDULA	CARGO	DEDICACIÓN
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	40.186.168	DIRECTOR DE OBRA	20%
		ESPECIALISTA AMBIENTAL	30%
CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ	86.062.096	RESIDENTE DE OBRA	100%
DENISE ROCIÓ MARTÍNEZ MOLINA	52.481.418	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL	100%
WILLIAM ALEXANDER BEJARANO MORENO	1.121.829.244	CONTROLADOR VIAL	100%
CRISTIAN ALEXANDER MORA GARZÓN	1.006.783.220	INSPECTOR DE OBRA	100%

Abril

NOMBRES	CEDULA	CARGO	DEDICACIÓN
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	40.186.168	DIRECTOR DE OBRA	20%
		ESPECIALISTA AMBIENTAL	30%
CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ	86.062.096	RESIDENTE DE OBRA	100%
DENISE ROCIÓ MARTÍNEZ MOLINA	52.481.418	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL	100%
WILLIAM ALEXANDER BEJARANO MORENO	1.121.829.244	CONTROLADOR VIAL	100%
CRISTIAN ALEXANDER MORA GARZÓN	1.006.783.220	INSPECTOR DE OBRA	100%

Mayo

NOMBRES	CEDULA	CARGO	DEDICACIÓN
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	40.186.168	DIRECTOR DE OBRA	20%
		ESPECIALISTA AMBIENTAL	30%
CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ	86.062.096	RESIDENTE DE OBRA	100%
DENISE ROCIÓ MARTÍNEZ MOLINA	52.481.418	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL	100%
WILLIAM ALEXANDER BEJARANO MORENO	1.121.829.244	CONTROLADOR VIAL	100%
CRISTIAN ALEXANDER MORA GARZÓN	1.006.783.220	INSPECTOR DE OBRA	100%

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
NIT 902013442-0

Junio

NOMBRES	CEDULA	CARGO	DEDICACIÓN
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	40.186.168	DIRECTOR DE OBRA	20%
		ESPECIALISTA AMBIENTAL	30%
CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ	86.062.096	RESIDENTE DE OBRA	100%
DENISE ROCIÓ MARTÍNEZ MOLINA	52.481.418	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL	100%
WALFRAN PÉREZ CARIBAN	1.124.991.535	CONTROLADOR VIAL	100%
CRISTIAN ALEXANDER MORA GARZÓN	1.006.783.220	INSPECTOR DE OBRA	100%

Julio

NOMBRES	CEDULA	CARGO	DEDICACIÓN
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	40.186.168	DIRECTOR DE OBRA	20%
		ESPECIALISTA AMBIENTAL	30%
CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ	86.062.096	RESIDENTE DE OBRA	100%
DENISE ROCIÓ MARTÍNEZ MOLINA	52.481.418	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL	100%
WALFRAN PÉREZ CARIBAN	1.124.991.535	CONTROLADOR VIAL	100%
CRISTIAN ALEXANDER MORA GARZÓN	1.006.783.220	INSPECTOR DE OBRA	100%

Agosto

NOMBRES	CEDULA	CARGO	DEDICACIÓN
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	40.186.168	DIRECTOR DE OBRA	20%
		ESPECIALISTA AMBIENTAL	30%
CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ	86.062.096	RESIDENTE DE OBRA	100%
DENISE ROCIÓ MARTÍNEZ MOLINA	52.481.418	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL	100%
JUAN CAMILO GUZMAN PEREZ	1.023.374.553	CONTROLADOR VIAL	100%
CRISTIAN ALEXANDER MORA GARZÓN	1.006.783.220	INSPECTOR DE OBRA	100%

4.1 IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VIAL

En el transcurso del periodo abarcado entre el **16 de febrero y el 15 de septiembre de 2026**, se mantuvo de forma ininterrumpida la aplicación del esquema de señalización vial dispuesto en el Plan de Manejo de Tránsito (PMT), asegurando su constante visibilidad, óptima conservación y correcta operatividad dentro del área de impacto del proyecto.

Los dispositivos de señalización preventiva e informativa continuaron emplazados a lo largo del corredor vehicular y las zonas peatonales colindantes al frente de trabajo, de manera puntual sobre la carrera 10 y la calle 11, en estricto apego a lo dictaminado en el PMT avalado. De igual forma, se ejecutaron labores continuas de inspección, reubicación y acondicionamiento cuando las condiciones del entorno lo demandaron, garantizando su plena efectividad y la conformidad con las regulaciones viales vigentes.

Registro fotográfico





4.2 MANEJO PEATONAL

A lo largo de las inspecciones desarrolladas durante el periodo, se constató de forma sistemática la invasión no autorizada de la franja habilitada como corredor peatonal provisional, a causa del parqueo de vehículos particulares en dicho sector. Esta eventualidad ha provocado el trasteo y desalineación de los dispositivos de señalización y cerramiento dispuestos por el ejecutor, interrumpiendo en forma parcial la fluidez del paso peatonal contemplado en el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) y reduciendo los niveles de protección para los transeúntes del área.

A modo de acción correctiva, el contratista adelantó la restitución y reordenamiento de los elementos de canalización peatonal; no obstante, la afectación se mantiene en razón a que se trata de un factor derivado de la conducta de terceros, totalmente ajeno a la dinámica propia de los trabajos de construcción.

Por lo anterior, resulta indispensable gestionar el apoyo institucional de la Secretaría de Tránsito Municipal, con el propósito de aplicar esquemas de fiscalización y regulación del estacionamiento en la zona, asegurando así la estabilidad del sendero peatonal y el estricto acatamiento de los lineamientos definidos en el PMT aprobado.

Registro fotográfico






4.3 CONTROL DE TRÁFICO Y ACCESO DE MAQUINARIA

Durante el desarrollo del proyecto se implementó un control adecuado del tráfico y del acceso de maquinaria a la obra, mediante señalización, rutas definidas de circulación y personal encargado de dirigir el tránsito en los puntos críticos. Estas medidas se ejecutaron dando cumplimiento a la totalidad de la normatividad vigente en materia de seguridad vial y manejo de tránsito en obras de construcción, garantizando así la seguridad de trabajadores, peatones y la comunidad del área de influencia.

4.4 CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES Y/O RCD´S

Las actividades de cargue y descargue de materiales y de residuos de construcción y demolición (RCD's) se realizaron de manera controlada, utilizando equipos y maquinaria adecuados, contando con personal capacitado para su manejo seguro. Se dispusieron zonas específicas y debidamente señalizadas para estas labores, evitando la generación de material particulado, derrames o afectaciones a las áreas circundantes. Dichas actividades se llevaron a cabo dando cumplimiento a la totalidad de la normatividad ambiental y de seguridad vigente aplicable al manejo, cargue, descargue y disposición de materiales y RCD's, garantizando así la protección del entorno y la salud de los trabajadores y la comunidad del área de influencia.

4.5 DESVÍOS DE TRÁNSITO

Durante este periodo se solicito la autorización para el cierre temporal a un (1) carril de la carrera 10, barrio El Triunfo. Esto debido a que necesito el ingreso de maquinaria y vehículos para el suministro y descargue de material de obra. Por las restricciones de tamaño del predio y las condiciones de acceso, dichos equipos se ubicaron sobre el costado izquierdo de la vía en el sentido del flujo vehicular, lo que hizo necesario el cierre parcial de un carril.

Para garantizar la seguridad vial y la adecuada movilidad durante la jornada, se adoptaron las siguientes medidas:

- Se dispuso de dos (2) controladores de tráfico durante todo el tiempo que duro el cierre a un carril, quienes regularon el paso vehicular.

- Se mantuvo toda la señalización requerida conforme al Plan de Manejo de Tráfico (PMT) aprobado para la obra, incluyendo señalización preventiva, reglamentaria e informativa.



Ilustración 4 Localización de la intervención

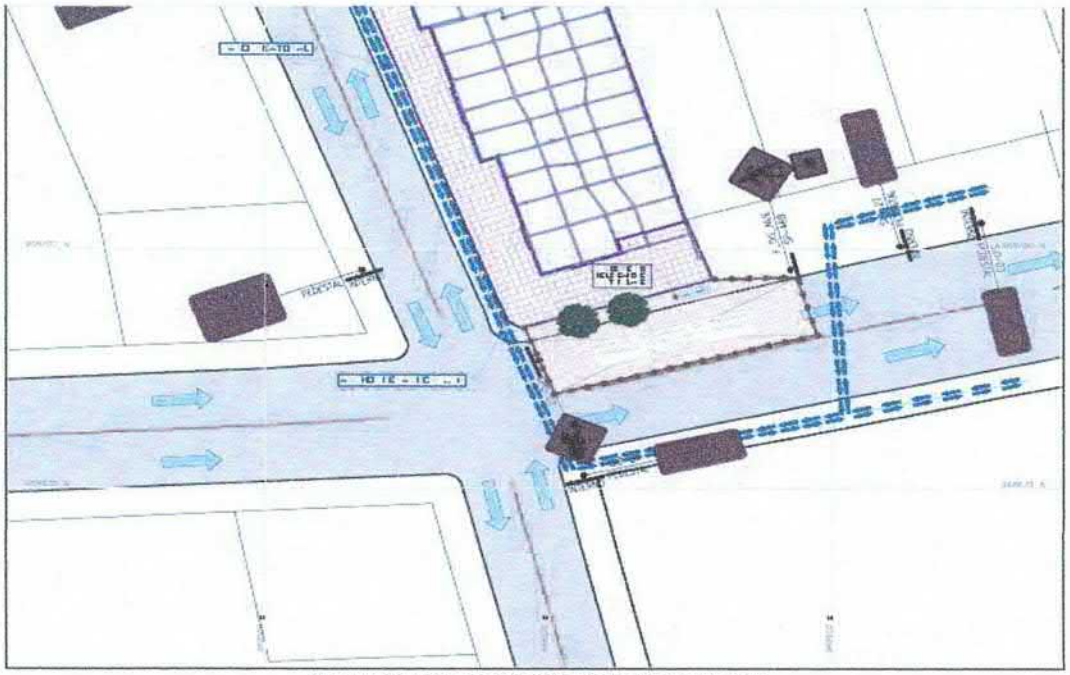


Ilustración 5 Localización de la intervención

4.6 INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL PMT

Durante el presente periodo el contratista presentó ante la interventoría y la supervisión del contrato los informes mensuales de ejecución del PMT correspondientes a cada mes, en el cual se detallan las actividades desarrolladas, las medidas implementadas y las condiciones de manejo de tránsito durante dicho periodo.

Esta gestión permite evidenciar el cumplimiento de las obligaciones contractuales asociadas al PMT, así como mantener informadas a las instancias de control sobre el desarrollo y comportamiento de las medidas adoptadas en obra.

4.7 GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL PMT

En el marco del desarrollo del proyecto, el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) fue objeto de revisión y trámite ante la autoridad competente, obteniendo aprobación mediante Resolución Administrativa No. 0145 del 26 de febrero de 2026, expedida por la Alcaldía del municipio de Puerto Gaitán – Meta, "*por medio de la cual se autoriza la implementación de un Plan de Manejo de Tránsito (PMT) para el proyecto construcción de la sede de la Fiscalía General de la Nación*".

La citada resolución establece la autorización para la implementación del PMT, en concordancia con las condiciones operativas del proyecto.

Dicho acto administrativo fue debidamente notificado al contratista el 02 de marzo, quien ha dado cumplimiento a las disposiciones técnicas, operativas y de señalización allí contenidas durante el periodo evaluado.

Así mismo, se ha mantenido la articulación con la supervisión del contrato y la interventoría, garantizando el seguimiento a la correcta implementación de las medidas definidas en el PMT, en concordancia con lo aprobado por la autoridad competente.


Registro fotográfico









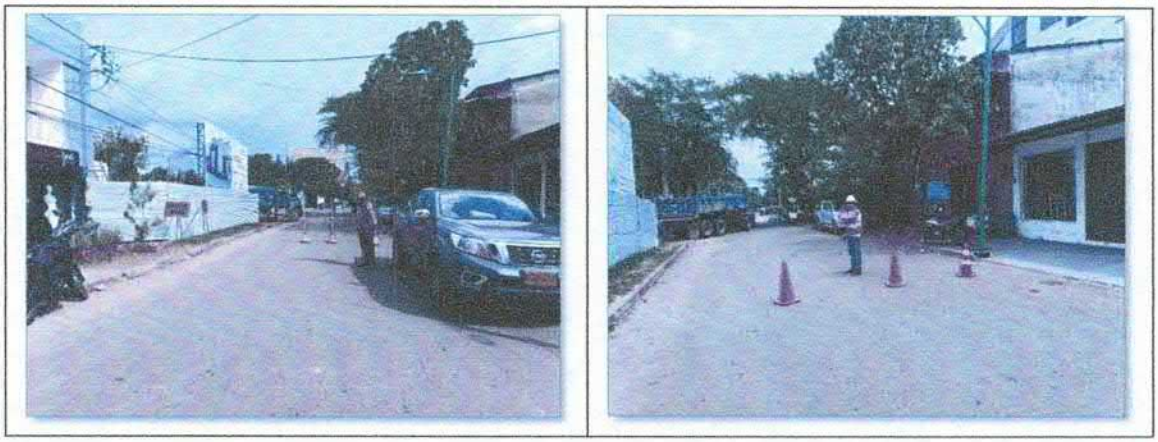

4.8 AVANCE RECURSOS DURANTE EL PERIODO – PLAN DE MANEJO DE TRANSITO -PMT

En atención al valor total actualizado de este componente conforme a la Modificatoria No. 01, Adición No. 01 y Prórroga No. 01 (TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL VEINTE PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE ($31.478.020,20), se registró una ejecución acumulada del **76,456%**, equivalente a VEINTICUATRO MILLONES SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS UN PESOS CON SETENTA CENTAVOS M/CTE ($24.066.901,70), reflejando un avance adecuado en el cumplimiento de las medidas de manejo de tránsito establecidas para el proyecto, en el marco de las condiciones actualizadas del contrato.

AVANCE DE RECURSOS EJECUTADOS PMT		
CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – META		
Valor PMT	**$ 31.478.020,00**	100,00%
Ejecución Acumulado	**$ 24.066.901,70**	76,46%
Valor Presente Acta Parcial Nro.1	**$19.855.262,70**	63,08%
Saldo Pro cobrar	**$ 11.622.757,50**	36,92%

Cuadro 1.Avance recursos durante el periodo del PMT

5. CONCLUSIONES

- Durante el período comprendido entre el 16 de febrero y el 15 de septiembre de 2026, se ejecutaron las actividades contempladas en el Plan de Manejo de Tránsito (PMT), garantizando la implementación de las medidas de seguridad vial, control peatonal y señalización requeridas para el adecuado desarrollo del proyecto.

- Se mantuvo la disponibilidad del personal encargado del control del tránsito y apoyo a la movilidad, verificándose el cumplimiento de sus funciones mediante registros de campo, controles operativos y evidencias fotográficas que hacen parte integral de los soportes del presente cobro.

- Para el reconocimiento económico presentado en esta Acta Parcial No. 1, se anexan los respectivos soportes de vinculación laboral, aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, aportes parafiscales y demás documentos administrativos exigidos contractualmente para el personal asociado a la ejecución del PMT.

- Durante el período reportado se dio cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Plan de Manejo de Tránsito aprobado por la autoridad competente, manteniendo las condiciones de seguridad y movilidad requeridas en el área de influencia del proyecto.

- En la presente Acta Parcial No. 1 se presenta para cobro un valor de **DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS CON SETENTA CENTAVOS ($19.855.262,70),** equivalente al **76,46%** del presupuesto global aprobado para este rubro, ratificando la sostenibilidad de las medidas de manejo de tránsito requeridas para el desarrollo del proyecto.

R.T LEGAL ADOLFO VASQUEZ MOSCOSO
INGENIERO CIVIL, ESPECIALISTA
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
C.C 1.023.879.760

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
NIT 902013442-0

ANEXO 1: ACTA PARCIAL NRO.1 PMT

Puerto Gaitán – Meta
311 386 8024
Confisca25@gmail.com

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25

CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META

PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO "PMT"

1	CONDICIONES CONTRACTUALES						CANTIDADES ACTUALIZADAS A MODIFICATORIA NRO.1 ADICION NRO.01 Y PRORROGA NRO.0		PRESENTE ACTA PARCIAL		VALOR POR COBRAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	FACTOR PRESTACIONAL (162%)	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	**CONTROLADORES VIALES**					**$ 22,691,728.80**		**$ 28,364,661.00**		**$ 19,855,262.70**		**$ 8,509,398.30**
1.1	CONTROLADOR (1)	MES	8.0	$ 1,750,905.00	$ 2,836,466.10	$ 22,691,728.80	10	$ 28,364,661.00	7	$ 19,855,262.70	3	$ 8,509,398.30
2	**DISPOSITIVOS DE CONTROL Y SEÑALIZACION**					**$ 3,113,359.20**		**$ 3,113,359.20**		**$ 0.00**		**$ 3,113,359.20**
2.1	CINTA DE SEÑALIZACIÓN - AIM 20701002	M	110	$ 1,609.58	-	$ 177,054.20	110	$ 177,054.20	0	$ 0.00	110	$ 177,054.20
2.2	DELINEADOR DE OBSTACULOS 20 X 90 CM HU=1.40 M - AIM 22806002	UN	3	$ 246,979.00	-	$ 740,937.00	3	$ 740,937.00	0	$ 0.00	3	$ 740,937.00
2.3	SEÑAL PREVENTIVA (SP) CUADRADO DE 60 X 60 CM CON PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4"- AIM 22801001	UN	8	$ 274,421.00	-	$ 2,195,368.00	8	$ 2,195,368.00	0	$ 0.00	8	$ 2,195,368.00
TOTAL						**$ 25,805,088.00**		**$ 31,478,020.20**		**$ 19,855,262.70**		**$ 11,622,757.50**

R./ LEGAL ADOLFO VASQUEZ MOSCOSO
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA
UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
C.C 1.023.879.760

6110

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
NIT 902013442-0

ANEXO 2: PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

Puerto Gaitán – Meta
311 386 8024
Confisca25@gmail.com

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
NIT 902013442-0

FEBRERO

Puerto Gaitán – Meta
311 386 8024
Confisca25@gmail.com

6173

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	902013442
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			UNION TEMPORAL CONFISCA 25
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO GAITAN	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	MZ 2 CASA 10 BRR MI RANCHITO	TELÉFONO:	1234567
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**5168016991**		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	marzo	AÑO 2026
DIAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/03/03		NÚMERO AUTORIZACIÓN:			0221901925

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 300.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300.100	$ 0	$ 300.100
230301	230301-PORVENIR	9	$ 1.290.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.290.300	$ 0	$ 1.290.300
SUBTOTALES:										**$ 1.590.400**	**$ 0**	**$ 1.590.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
CCFC55	CCFC55- CAJACOPI EPS S.A.S	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 28.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.100	$ 0	$ 0	$ 28.100
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 32.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 32.700	$ 0	$ 0	$ 32.700
EPSIC5	EPSIC5-MALLAMAS EPSI	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 28.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.100	$ 0	$ 0	$ 28.100
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 84.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 84.500	$ 0	$ 0	$ 84.500
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 224.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 224.700	$ 0	$ 0	$ 224.700
SUBTOTALES:													**$ 398.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 398.100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	11		$ 0	$ 0		$ 0	$ 410.300	$ 410.300	$ 0	$ 0	$ 410.300
SUBTOTALES:									**$ 410.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 410.300**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF34	CCF34-COFREM META	11	$ 398.100	$ 0	$ 398.100
SUBTOTALES:			**$ 398.100**	**$ 0**	**$ 398.100**

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

6114

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	902013442
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			UNION TEMPORAL CONFISCA 25
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO GAITAN	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	MZ 2 CASA 10 BRR MI RANCHITO	TELÉFONO:	1234567
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**5168016991**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/03/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		0221901925

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 300.100
8002248088	230301	230301-PORVENIR	9	$ 1.290.300
		SUBTOTAL:	11	**$ 1.590.400**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	5	$ 224.700
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	3	$ 84.500
8370000845	EPSIC5	EPSIC5-MALLAMAS EPSI	1	$ 28.100
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 32.700
9015432116	CCFC55	CCFC55- CAJACOPI EPS S.A.S	1	$ 28.100
		SUBTOTAL:	11	**$ 398.100**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8920001463	CCF34	CCF34-COFREM META	11	$ 398.100
		SUBTOTAL:	11	**$ 398.100**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	11	$ 410.300
		SUBTOTAL:	11	**$ 410.300**

VALOR SIN MORA:	**$ 2.796.900**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 2.796.900**

6715

UNIÓN TEMPORAL CONFISCA 25
NIT 902013442-0

NOMINA MENSUAL FEBRERO

Diligencie los siguientes valores de referencia:		Periodo de pago		
Salario mínimo	$ 1.750.905	1/02/2026	AL	28/02/2026
Auxilio de transporte	$ 249.095	Fecha de liquidación		
¿Está exonerado del pago de aportes?	Si	28/02/2026		

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	PERIODO DE PAGO		SALARIO BÁSICO	INCS	DEVENGADO								DEDUCCIONES		NETO PAGADO	FIRMA
			DESDE	HASTA			Días	Salario devengado	Días	INCS devengado	Horas extras	Recargos nocturnos	Trabajo dominical y festivo	Aux. de transporte	Total devengado	Salud	Pensión	
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	40.186.168	DIRECTOR DE OBRA	16/02/2026	28/02/2026	$ 875.453		15	$ 437.726	$ 15	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 62.274	$ 500.000	$ 17.509	$ 17.509	$ 464.982	
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	40.186.168	ESP. AMBIENTAL	16/02/2026	28/02/2026	$ 875.453		15	$ 437.726	$ 15	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 62.274	$ 500.000	$ 17.509	$ 17.509	$ 464.982	
CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ	86.062.096	RESIDENTE DE OBRA	16/02/2026	28/02/2026	$ 2.000.000		15	$ 1.000.000	$ 15	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 124.548	$ 1.124.548	$ 40.000	$ 40.000	$ 1.044.548	
DENISE ROCIO MARTINEZ MOLINA	52.481.418	PROF. SALUD OCUPACIONAL	16/02/2026	28/02/2026	$ 2.000.000		15	$ 1.000.000	$ 15	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 124.548	$ 1.124.548	$ 40.000	$ 40.000	$ 1.044.548	
DIEGO LEONARDO PAEZ MONTERO	1.121.946.586	ING. DE APOYO TECNICO	1/02/2026	28/02/2026	$ 1.750.905		30	$ 1.750.905	$ 30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 1.859.928	
MARIA FERNANDA PULIDO RODRIGUEZ	1.049.653.548	ING. DE APOYO TECNICO	1/02/2026	28/02/2026	$ 1.750.905		30	$ 1.750.905	$ 30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 1.859.928	
WILLIAM ALEXANDER BEJARANO MORENO	1.121.829.244	CONTROLADOR VIAL	16/02/2026	28/02/2026	$ 1.750.905		15	$ 875.453	$ 15	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 124.548	$ 1.000.000	$ 35.018	$ 35.018	$ 929.964	
CRISTIAN ALEXANDER MORA GARZON	1.006.783.220	INSPECTOR DE OBRA	17/02/2026	28/02/2026	$ 1.750.905		14	$ 817.089	$ 14	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 116.244	$ 933.333	$ 32.684	$ 32.684	$ 867.966	
WALFRAN PEREZ CARIBAN	1.124.991.535	AYUDANTE DE OBRA	19/02/2026	28/02/2026	$ 1.750.905		12	$ 700.362	$ 12	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 99.638	$ 800.000	$ 28.014	$ 28.014	$ 743.971	
MAYCOL SAMUEL HERNANDEZ VANEGAS	1.124.818.911	AYUDANTE DE OBRA	19/02/2026	28/02/2026	$ 1.750.905		12	$ 700.362	$ 12	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 99.638	$ 800.000	$ 28.014	$ 28.014	$ 743.971	
DANIEL ANDRES AYALA ROJAS	1.124.818.810	AYUDANTE DE OBRA	27/02/2026	28/02/2026	$ 1.750.905		4	$ 233.454	$ 4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 33.213	$ 266.667	$ 9.338	$ 9.338	$ 247.990	
CESAR AUGUSTO HERNANDEZ CALDERON	3.215.459	OFICIAL DE OBRA	27/02/2026	28/02/2026	$ 1.750.905		4	$ 233.454	$ 4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 33.213	$ 266.667	$ 9.338	$ 9.338	$ 247.990	
TOTALES					$ 19.788.145	$ -	$ 181	$ 9.937.436	$ 181	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.378.326	$ 11.315.762	$ 397.497	$ 397.497	$ 10.520.767	

Redondeado al peso	Neto pagado: $10.520.767	Diez Millones Quinientos Veinte Mil Setecientos Sesenta y Siete Pesos

NOMBRE	CEDULA	DÍAS	TOTAL NOMINA	8,33%	CESANTÍAS	1%	INTERÉS CESANTÍAS	8,33%	PRIMA DE SERVICIO	4,17%	VACACIONES
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	40.186.168	15	$ 500.000	$	41.667	$	208	$	41.667	$	18.239
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	40.186.168	15	$ 500.000	$	41.667	$	208	$	41.667	$	18.239
CARLOS EDUARDO BAQUERO MUÑOZ	86.062.096	15	$ 1.124.548	$	93.712	$	469	$	93.712	$	41.667
DENISE ROCIO MARTINEZ MOLINA	52.481.418	15	$ 1.124.548	$	93.712	$	469	$	93.712	$	41.667
DIEGO LEONARDO PAEZ MONTERO	1.121.946.586	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
MARIA FERNANDA PULIDO RODRIGUEZ	1.049.653.548	30	$ 2.000.000	$	166.667	$	1.667	$	166.667	$	72.954
WILLIAM ALEXANDER BEJARANO MORENO	1.121.829.244	15	$ 1.000.000	$	83.333	$	417	$	83.333	$	36.477
CRISTIAN ALEXANDER MORA GARZON	1.006.783.220	14	$ 933.333	$	77.778	$	363	$	77.778	$	34.045
WALFRAN PEREZ CARIBAN	1.124.991.535	12	$ 800.000	$	66.667	$	267	$	66.667	$	29.182
MAYCOL SAMUEL HERNANDEZ VANEGAS	1.124.818.911	12	$ 800.000	$	66.667	$	267	$	66.667	$	29.182
DANIEL ANDRES AYALA ROJAS	1.124.818.810	4	$ 266.667	$	22.222	$	30	$	22.222	$	9.727
CESAR AUGUSTO HERNANDEZ CALDERON	3.215.459	4	$ 266.667	$	22.222	$	30	$	22.222	$	9.727
TOTAL NOMINA			$ 11.316.762	$	942.960	$	6.069	$	942.960	$	414.060

TOTAL PROVISIONES DE PRESTACIONES SOCIALES	$	2.306.079
TOTAL NOMINA	$	10.520.767
TOTAL NOMINA + PROVISIÓN PRESTACIONES SOCIALES	$	**12.826.846**

REVISADO Y APROBADO POR:

MIGUEL ANGEL GUERRERO
CONTADOR PÚBLICO
C.C 1123086252 TP 271654-T

6116

MARZO

Puerto Gaitán – Meta
311 386 8024
Confisca25@gmail.com

6117

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA							
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900313442	NÚMERO PLANILLA:			5168381746	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			UNION TEMPORAL CONFISCA 25	PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril	AÑO 2026
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO GAITAN	DEPARTAMENTO:	META	DÍAS DE MORA:			0				
DIRECCIÓN:	MZ 2 CASA 10 BRR MI RANCHITO	TELÉFONO:	1234567	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/03/31	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			0822673320
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES								
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.								
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO										
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI								

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 600.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 600.200	$ 0	$ 600.200
230301	230301-PORVENIR	13	$ 3.187.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.187.400	$ 0	$ 3.187.400
SUBTOTALES:										**$ 3.787.600**	**$ 0**	**$ 3.787.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACION	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR AJUSTES	COTIZACIÓN	VALOR AJUSTES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 51.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 51.400	$ 0	$ 0	$ 51.400
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 35.100
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 360.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 360.400	$ 0	$ 0	$ 360.400
EPSIC6	EPSIC6-PIJAOSALUD EPSI	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 35.100
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 280.200
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
CCFC55	CCFC55- PROTEGER EPS S.A.S	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 35.100
EPSIC5	EPSIC5-MALLAMAS EPSI	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
SUBTOTALES:													**$ 1.017.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.017.600**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	16		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.431.600	$ 1.431.600	$ 0	$ 0	$ 1.431.600
SUBTOTALES:									**$ 1.431.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.431.600**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF34	CCF34-COFREM META	16	$ 1.023.400	$ 0	$ 1.023.400
SUBTOTALES:			**$ 1.023.400**	**$ 0**	**$ 1.023.400**

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN			FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	SALUD							ARP					CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO		TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR AJUSTES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1006691448	RODRIGUEZ VEGA CAMILO ANDRES	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	16															230301-PORVENIR	15	$ 875.453	$ 140.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.100	EPS037-NUEVA EPS CM	15	$ 875.453	$ 35.100	$ 0	$ 35.100	14-11 - ARL SURA	15	$ 875.453		$ 61.000	15	$ 875.453	CCF34-COFREM META	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1006779000	PARDO VARGAS CRISTIAN FERNANDO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	16															230301-PORVENIR	15	$ 875.453	$ 140.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.100	EPSIC6-PIJAOSALUD EPSI	15	$ 875.453	$ 35.100	$ 0	$ 35.100	14-11 - ARL SURA	15	$ 875.453		$ 61.000	15	$ 875.453	CCF34-COFREM META	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1006783220	MORA BARZON CRISTIAN ALEXANDER	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1049633548	PULIDO RODRIGUEZ MARIA FERNANDA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	31															230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.896.814	CCF34-COFREM META	$ 75.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1121829244	BUITRAGO MORENO WILLIAM ALEXANDER	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1121946586	PAEZ MONTERO DIEGO LEONARDO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1124618810	AYALA ROJAS DANIEL ANDRES	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1124818911	HERNANDEZ VANEGAS MAYCOL SAMUEL	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	CCFC55-PROTEGER EPS S.A.S	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1124891535	PEREZ CARBAN WALFRAN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPSIC5-MALLAMAS EPSI	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 3215459	HERNANDEZ CALDERON CESAR AUGUSTO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
