GOBERNACIÓN
DEL TOLIMA

FRENTE DE TRABAJO

IBAGUÉ

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

ABRIL DEL 2026

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

ABRIL 2026

OBJETO
CONTRATO NO.3034 DE 2026

"CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA".

FRENTE DE TRABAJO IBAGUÉ

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

ABRIL DEL 2026

INTEGRANTES

SUPERVISOR DE CAMPO	ING. DIANA GALLEGO
RETROEXCAVADORA #40	JULIO GIRALDO/NELSON TAQUEMICHE
MOTONIVELADORA #40	JAIME ALBERTO ORTIZ
VOLQUETA #15	MAURICIO PATIÑO
VOLQUETA #09	OSCAR LOPEZ
VOLQUETA #01	JAVIER GUERRERO/HENRY ROCHA

FRENTE DE TRABAJO IBAGUÉ

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

ABRIL DEL 2026

VIA INTERVENIDA

1. **GUAYABOS-CATAIMA**
2. **TAPIAS-EL SALÓN**
3. **LOS MANGOS**
4. **GUAICO-MACHIN**

FRENTE DE TRABAJO IBAGUÉ

UNIÓN TEMPORAL MARV 7


GOBERNACIÓN DEL TOLIMA


INFORME


ABRIL DEL 2026

MAQUINARIA EN OPERACIÓN



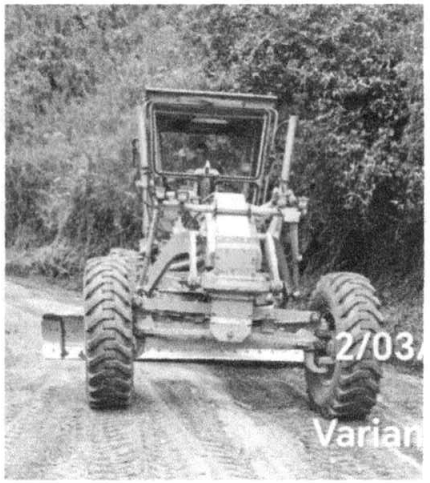

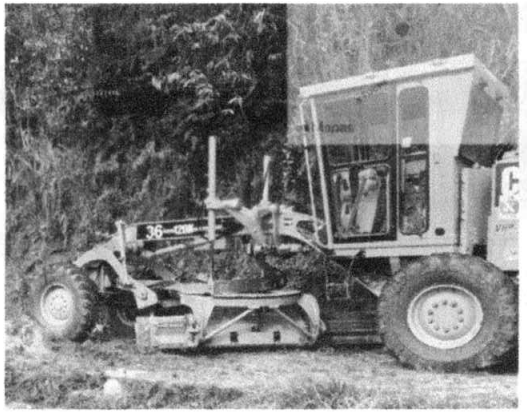

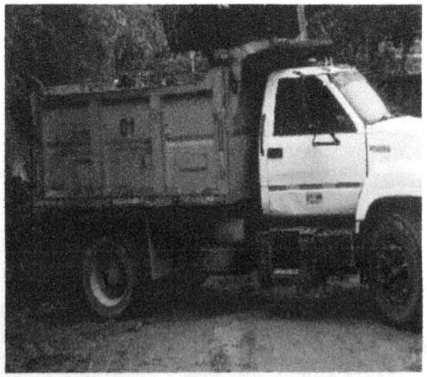



FRENTE DE TRABAJO IBAGUÉ

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

ABRIL DEL 2026

TOTAL, ACTIVIDADES REALIZADAS EN IBAGUÉ MEJORAMIENTO DE VÍA

FECHA	ABSCISA		VOLQUETA No.	VOL. VIAJE	No. VIAJES	VOLUMEN
	DE	A				
15/04/2026	K0+000	K0+600	9	7	5	35
16/04/2026	K0+600	K1+200	9	7	4	28
17/04/2026	K1+200	K1+800	9	7	4	28
23/04/2026	K1+800	K2+400	9	7	5	35
24/04/2026	K2+400	K3+000	9	7	5	35
TOTAL, MEJORAMIENTO DE LA VIA						**161**

FRENTE DE TRABAJO IBAGUÉ

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

ABRIL DEL 2026

TOTAL, ACTIVIDADES REALIZADAS EN IBAGUÉ CONFORMACIÓN DE LA VÍA

FECHA	ABSCISA		LONGITUD	ANCHO	AREA
	DE	A			
15/04/2026	K0+000	K0+666	666	5	3.330
16/04/2026	K0+666	K1+332	666	5	3.330
18/04/2026	K1+332	K2+000	668	5	3.340
23/04/2026	K2+000	K3+000	1.000	5	5.000
24/04/2026	K3+000	K4+000	1.000	5	5.000
27/04/2026	K4+000	K5+000	1.000	5	5.000
28/04/2026	K5+000	K6+000	1.000	5	5.000
30/04/2026	K6+000	K7+000	1.000	5	5.000
TOTAL, CONFORMACION DE LA VIA					**35.000**

FRENTE DE TRABAJO IBAGUÉ

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

ABRIL DEL 2026

TOTAL, ACTIVIDADES REALIZADAS EN IBAGUÉ CONFORMACIÓN DE CUNETAS

FECHA	ABSCISA		LONGITUD	N° CARRILES	LONGITUD TOTAL
	DE	A			
15/04/2026	K0+000	K0+666	666	1	666
16/04/2026	K0+666	K1+332	666	1	666
18/04/2026	K1+332	K2+000	668	1	668
23/04/2026	K2+000	K3+000	1.000	1	1.000
24/04/2026	K3+000	K4+000	1.000	1	1.000
27/04/2026	K4+000	K5+000	1.000	1	1.000
28/04/2026	K5+000	K6+000	1.000	1	1.000
30/04/2026	K6+000	K7+000	1.000	1	1.000
TOTAL CUNETA					**7.000**

FRENTE DE TRABAJO IBAGUÉ

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

ABRIL DEL 2026

TOTAL, ACTIVIDADES REALIZADAS

TOTAL, MEJORAMIENTO DE VÍA CON MATERIAL DE LA ZONA	KILOMETROS INTERVENIDOS (KM)
IBAGUÉ: GUAYABOS-CATAIMA	2,0
IBAGUÉ: TAPIAS-EL SALÓN	2,0
IBAGUÉ: LOS MANGOS	3,0
IBAGUÉ: IBAGUÉ-MACHIN	3,0
TOTAL, MEJORAMIENTO	**10,0 KM**

FRENTE DE TRABAJO IBAGUÉ

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 7

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FRENTE DE TRABAJO IBAGUÉ

ABRIL 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACION DEL TOLIMA

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

MUNICIPIO DE IBAGUÉ

PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2026

INFORME MENSUAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 3
3. LOCALIZACIÓN 4
4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 5
5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES 5
   5.1 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN 5
6. PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO 6
   6.1 PERSONAL UTILIZADO 6
   6.2 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA 6
7. REGISTRO FOTOGRÁFICO 8

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como objetivo dar a conocer los aspectos relevantes de la gestión de la maquinaria pesada y volquetas de la Gobernación del Tolima y la maquinaria de la unión nacional de gestión de riesgo de desastres, en la realización y atención de emergencias viales, puntos críticos y mantenimiento de la red vial del Municipio de Ibagué – Tolima.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto a realizar consta del mantenimiento de puntos críticos de la red vial en la zona del Municipio de Ibagué, con el kit de la maquinaria de la Gobernación del Tolima.

Se realizará el mantenimiento al tramo a intervenir y así proveer una superficie de rodamiento adecuada, con el fin de facilitar el diario vivir a la comunidad.


Esta es una obra que representa un gran aporte para la comunidad en los diferentes sectores, adicionalmente, en este caso no sólo se benefician los que actualmente residen cerca, sino que se favorece la capacidad para todos los propietarios de los municipios, teniendo en cuenta que es una zona de desarrollo agrícola y de crecimiento turístico.

3. LOCALIZACIÓN

El proyecto principalmente se encuentra ubicado en el país de Colombia oficialmente República de Colombia, es un país soberano situado en la región noroccidental de América del Sur que se encuentra constituido en un estado unitario, social y democrático de derecho cuya forma de gobierno es presidencialista. Es una república que está organizada políticamente en 32 departamentos descentralizados y el Distrito capital de Bogotá, sede del gobierno nacional.

En Colombia, exactamente en el departamento del Tolima que es uno de los treinta y dos departamentos que, junto con Bogotá, Distrito Capital, forman la República de Colombia. Su capital es Ibagué. Está ubicado en el centro-oeste del país, en la región andina, limitando al norte con Caldas, al este con Cundinamarca, al sur con Huila y Cauca, y al oeste con Valle del Cauca, Quindío y Risaralda. El río Magdalena atraviesa Tolima de sur a norte.

Ibagué municipio colombiano ubicado en el centro-occidente de Colombia, sobre la cordillera central de los Andes entre el Cañón del Combeima y el Valle del Magdalena, en cercanías del Nevado del Tolima. Es la capital del departamento del Tolima y se encuentra a una altitud de 1285msnm.

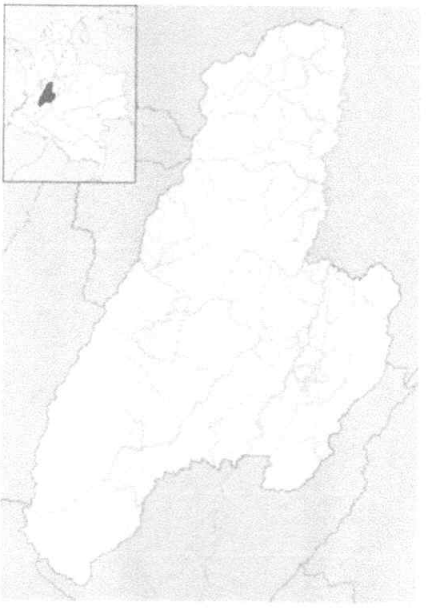

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

MANTEMINIENTO VIAL
Conformación de la red vía.

5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES

Durante el periodo comprendido se atendieron puntos críticos específicamente en diferentes veredas del municipio, donde se han presentado erosión de derrumbes y perdida de banca por la presencia de lluvias sobre la zona.

También se realizó la actividad de mantenimiento, destinados primordialmente a la recuperación de la banca, limpieza de alcantarillas, conformación y limpieza mecánica de la vía y reconstrucción de cunetas; estas actividades se realizaron con el apoyo del kit de maquinaria por parte de la Gobernación (3 volquetas, 2 motoniveladoras y 1 retroexcavadora), así dando solución y la rehabilitación del corredor vial en este importante corredor turístico.

Cabe mencionar que todas las actividades mencionadas anteriormente son de suma importancia para restablecer el tránsito vehicular, beneficio que se brinda tanto a la comunidad y el poder transportar sus productos.

Para finalizar, en el periodo transcurrido del mes se conformaron 7,0 km en las veredas Guayabos-Cataima, Tapias-El Salón, Los Mangos y 3,0 km de mejoramiento de vía en Ibagué-Machin con material de la zona; el estado del tiempo y las condiciones climáticas no fueron favorables y se registraron precipitaciones de 12 horas en el mes.

5.1 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

De conformidad con las actividades realizadas se conformaron 7,0 km y 3,0 km de mejoramiento con material de la zona pertenecientes al municipio de Ibagué:

FECHA	MUNICIPIO	KILOMETROS INTERVENIDOS (KM)
DEL 15/04/2026 AL 18/04/2026	IBAGUÉ: GUAYABOS-CATAIMA	2,0
DEL 23/04/2026 AL 24/04/2026	IBAGUÉ: TAPIAS-EL SALÓN	2,0
DEL 27/04/2026 AL 30/04/2026	IBAGUÉ: LOS MANGOS	3,0
DEL 15/04/2026 AL 24/04/2026	IBAGUÉ: IBAGUÉ-MACHIN	3,0
TOTAL, KILOMETROS INTERVENIDOS		10,0 KM

6. PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO

6.1 PERSONAL UTILIZADO

CARGO	PROFESION	NOMBRE
SUPERVISOR	INGENIERO CIVIL	DIANA GALLEGO
OPERARIO DE RETROEXCAVADORA	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	JULIO GIRALDO
OPERARIO DE RETROEXCAVADORA	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	NELSON TAQUEMICHE
OPERARIO DE MOTONIVELADORA	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	JAIME ALBERTO ORTIZ
OPERARIO DE MOTONIVELADORA	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	NOLBERTO ORTEGON
CONDUCTOR DE VOLQUETA	CONDUCTOR DE MAQUINARIA PESADA	OSCAR LOPEZ
CONDUCTOR DE VOLQUETA	CONDUCTOR DE MAQUINARIA PESADA	MAURICIO PATIÑO
CONDUCTOR DE VOLQUETA	CONDUCTOR DE MAQUINARIA PESADA	HENRY ROCHA
CONDUCTOR DE VOLQUETA	CONDUCTOR DE MAQUINARIA PESADA	JAVIER GUERRERO

6.2 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

Para realizar las labores durante este periodo se empleó el kit de maquinaria pesada como:


UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

MAQUINARIA	NUMERO	CANTIDAD
RETROEXCAVADORA	40	1
VOLQUETA	1, 09, 15	3
MOTONIVELADORA	36, 40	2

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO

7.1 ACTIVIDADES EN IBAGUÉ: MACHIN-LOS MANGOS

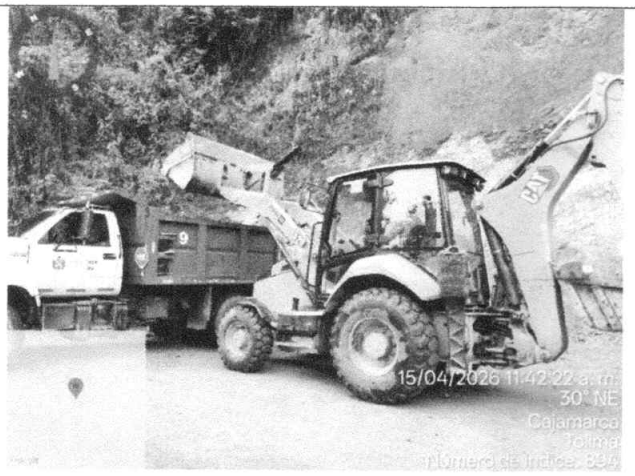





MACHIN-LOS MANGOS



MACHIN-LOS MANGOS


UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

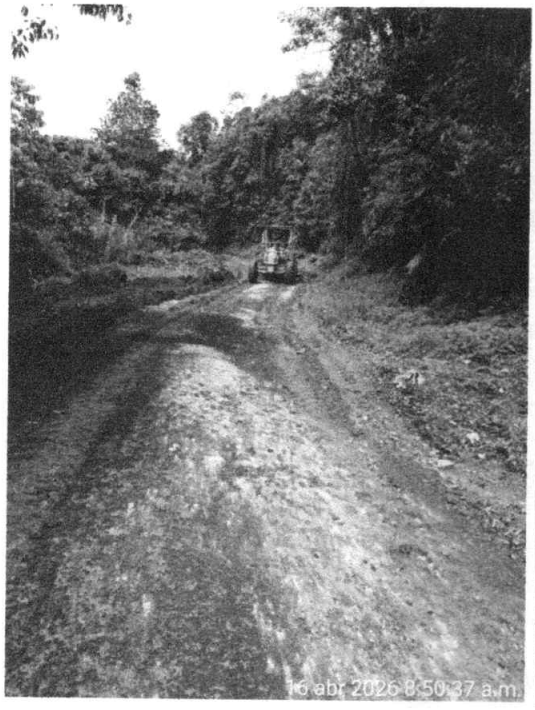

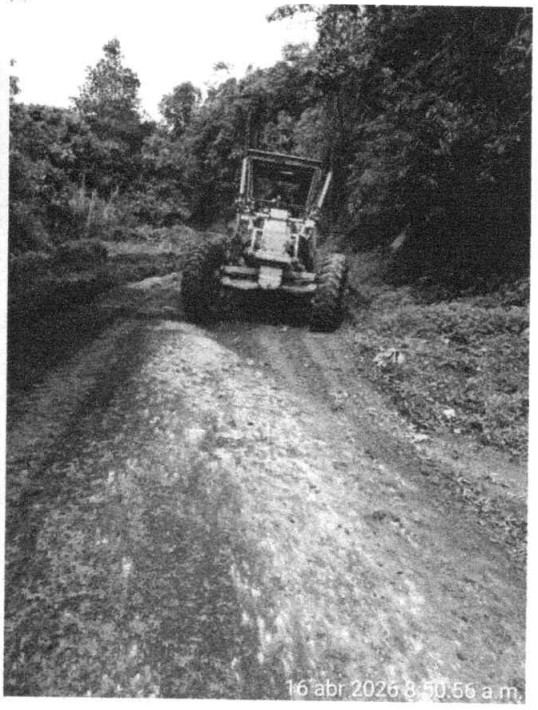


MACHIN-LOS MANGOS



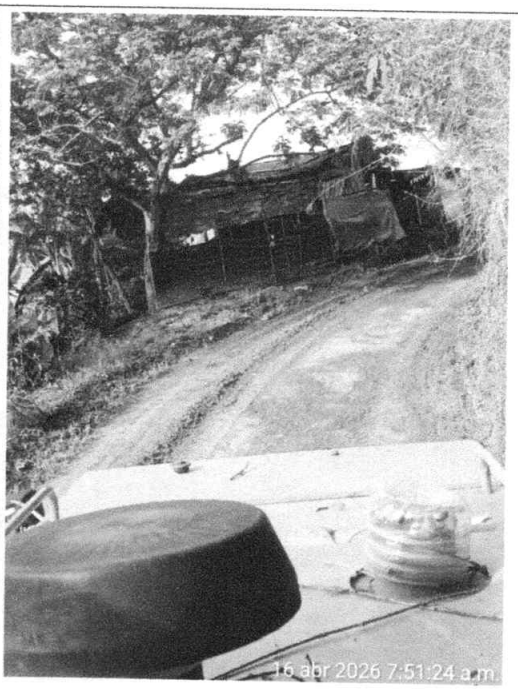

MACHIN-LOS MANGOS


UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACION DEL TOLIMA

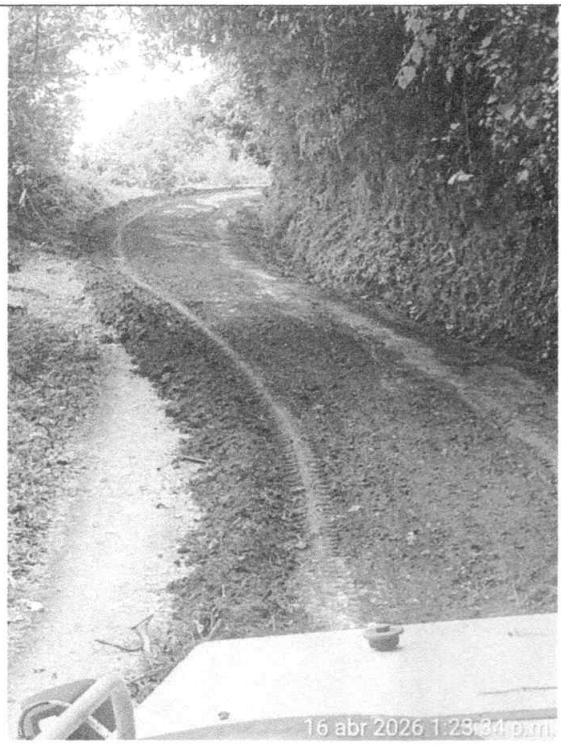




MACHIN-LOS MANGOS




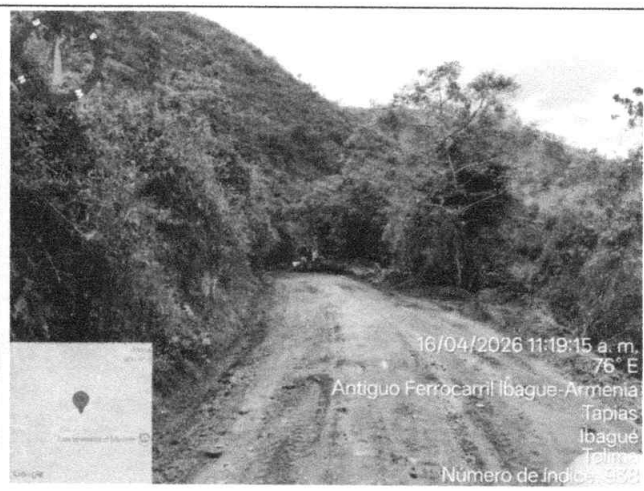

MACHIN-LOS MANGOS

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

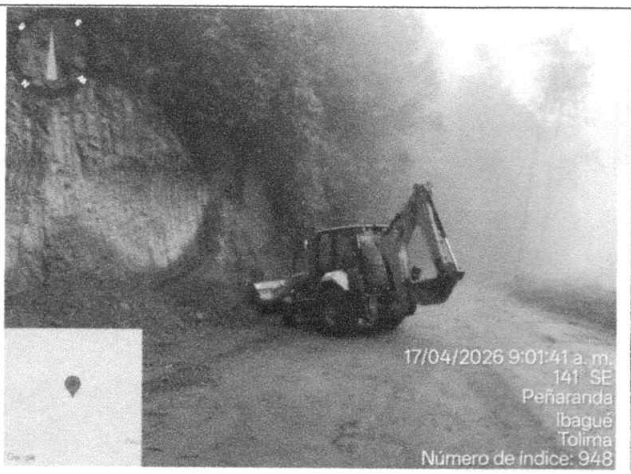

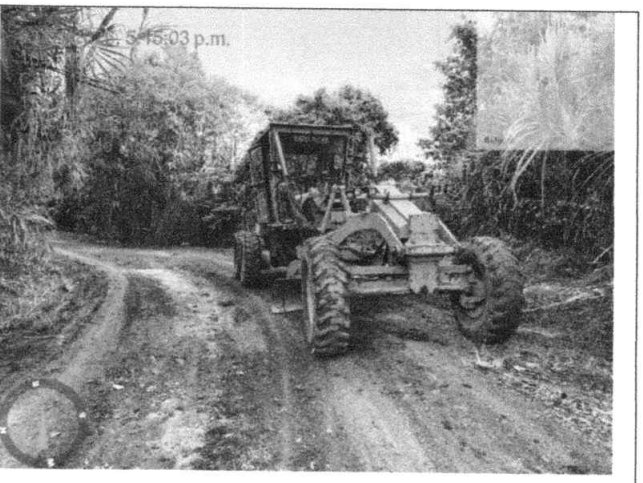


MACHIN-LOS MANGOS





MACHIN-LOS MANGOS

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

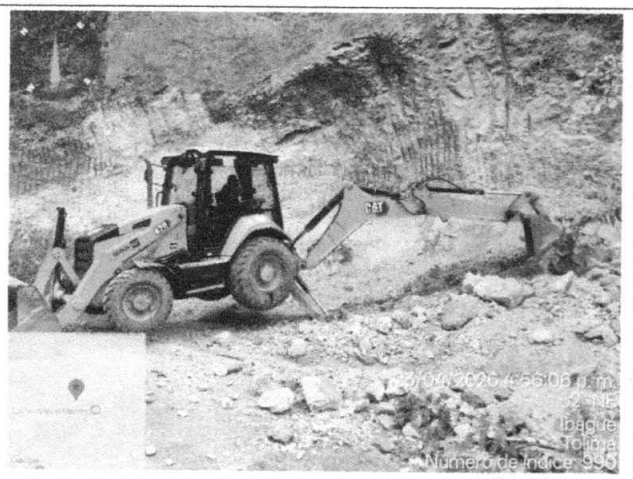



MACHIN-LOS MANGOS





MACHIN-LOS MANGOS


UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACION DEL TOLIMA





MACHIN-LOS MANGOS



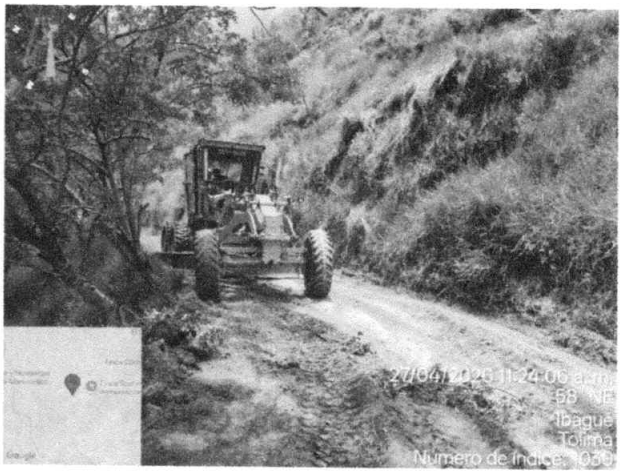


MACHIN-LOS MANGOS

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA






MACHIN-LOS MANGOS

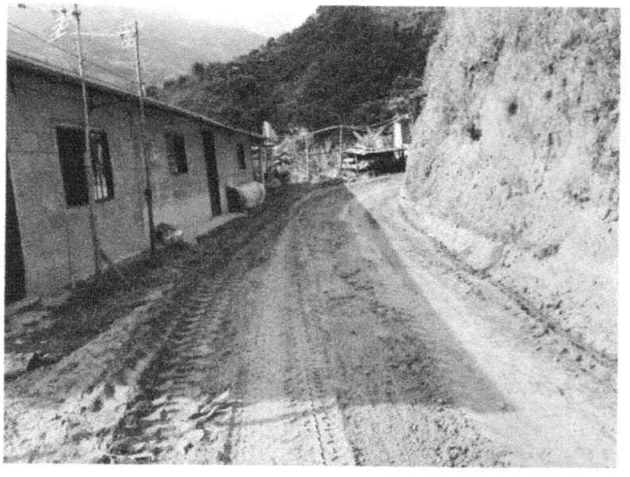



MACHIN-LOS MANGOS

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

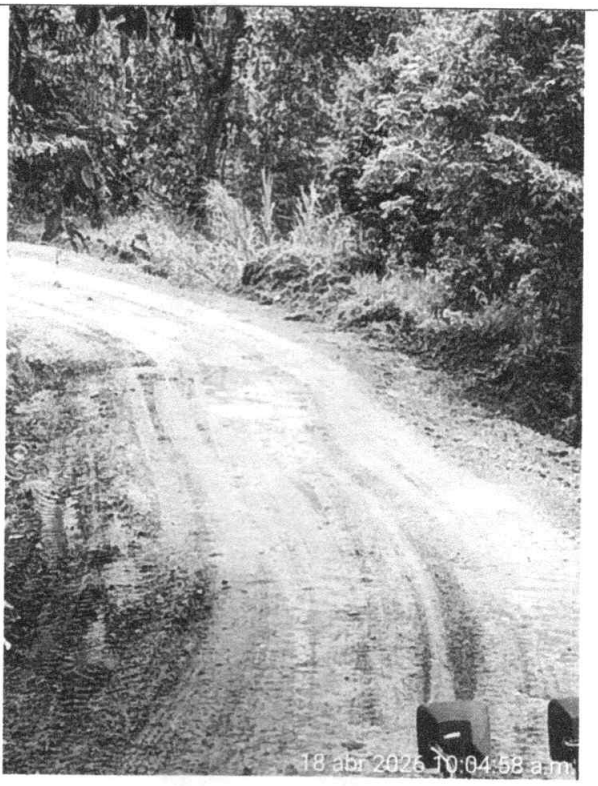

MACHIN-LOS MANGOS

Diana Gallego

DIANA MARCELA GALLEGO CAMPOS

SUPERVISORA DE CAMPO

VERSION 1	GOB-M-009	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO. 3034 DE 2026 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA INFORME DIARIO-TURNO	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CARRETERA: IBAGUÉ-MACHIN — **MUNICIPIO: IBAGUÉ**

MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA — **UNIDAD: M3** — **161**

FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	VOLQUETA No.	VOL. VIAJE	No. VIAJES	VOLUMEN	OBSERVACIONES
15/04/2026	K0+000	K0+600	9	7	5	35	Se laboro Normalmente.
16/04/2026	K0+600	K1+200	9	7	4	28	Se laboro Normalmente.
17/04/2026	K1+200	K1+800	9	7	4	28	Se laboro Normalmente.
23/04/2026	K1+800	K2+400	9	7	5	35	Se laboro Normalmente.
24/04/2026	K2+400	K3+000	9	7	5	35	Se laboro Normalmente.
TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA						**161**	
TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA						**161**	

Vo.Bo. Supervisora contrato 3034 DE 2026

Firma: Diana Gallego

Nombre: Diana M. Gallego G.

c.c. 38.210.237

Vo.Bo. Coordinador contrato 3034 DE 2026

Firma:

Nombre: Jeison Giovanni Alvis L

c.c. 1.110.512.907

VERSION 1	GOB-M-009	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO. 3034 DE 2026 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA INFORME DIARIO-TURNO	GOBERNACION DEL TOLIMA

CARRETERA: GUAYABOS-CATAIMA-LOS MANGOS — **MUNICIPIO: IBAGUÉ**

CONFORMACION DE LA VIA SIN COMPACTAR					UNIDAD: M2	35.000
FECHA	ABSCISA		LONGITUD	ANCHO	AREA	OBSERVACIONES
	DE	A				
15/04/2026	K0+000	K0+666	666	5	3.330	Se laboro Normalmente.
16/04/2026	K0+666	K1+332	666	5	3.330	Se laboro Normalmente.
18/04/2026	K1+332	K2+000	668	5	3.340	Se laboro Normalmente.
23/04/2026	K2+000	K3+000	1.000	5	5.000	Se laboro Normalmente.
24/04/2026	K3+000	K4+000	1.000	5	5.000	Se laboro Normalmente.
27/04/2026	K4+000	K5+000	1.000	5	5.000	Se laboro Normalmente.
28/04/2026	K5+000	K6+000	1.000	5	5.000	Se laboro Normalmente.
30/04/2026	K6+000	K7+000	1.000	5	5.000	Se laboro Normalmente.
TOTAL CONFORMACION DE LA VIA					35.000	
TOTAL CONFORMACION DE LA VIA SIN COMPACTAR					35.000	

Vo.Bo. Supervisora contrato 3034 DE 2026

Firma:
Nombre: Diana M. Gallego C.
c.c. 38.210.237

Vo.Bo. Coordinador contrato 3034 DE 2026

Firma:
Nombre: Jeison Giovanni Alvis L
c.c. 1.110.512.907

VERSION 1	GOB-M-009	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO. 3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA	
	INFORME DIARIO-TURNO	

CARRETERA: SAN SIMÓN-TAPIAS — **MUNICIPIO: IBAGUÉ**

CONFORMACION DE CUNETAS — **UNIDAD: ML** — **7.000**

FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	LONGITUD	N° CARRILES	LONGITUD TOTAL	OBSERVACIONES
15/04/2026	K0+000	K0+666	666	1	666	Se laboro Normalmente.
16/04/2026	K0+666	K1+332	666	1	666	Se laboro Normalmente.
18/04/2026	K1+332	K2+000	668	1	668	Se laboro Normalmente.
23/04/2026	K2+000	K3+000	1.000	1	1.000	Se laboro Normalmente.
24/04/2026	K3+000	K4+000	1.000	1	1.000	Se laboro Normalmente.
27/04/2026	K4+000	K5+000	1.000	1	1.000	Se laboro Normalmente.
28/04/2026	K5+000	K6+000	1.000	1	1.000	Se laboro Normalmente.
30/04/2026	K6+000	K7+000	1.000	1	1.000	Se laboro Normalmente.
TOTAL CUNETA					**7.000**	
TOTAL CONFORMACION DE CUNETAS					**7.000**	

Vo.Bo. Supervisora contrato 3034 DE 2026

Firma: Diana Gallego

Nombre: Diana M. Gallego C.

c.c. 38.210.237

Vo.Bo. Coordinador contrato 3034 DE 2026

Firma:

Nombre: Jeison Giovanni Alvis L

c.c. 1.110.512.907

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 7

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

ACTAS DE COMUNIDAD

FRENTE DE TRABAJO IBAGUÉ

ABRIL 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOB-M-007
CONTRATO 3034 DE 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

ACTA DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO

CONTRATO No. : 3034 DE ABRIL DE 2026

OBJETO: ***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA.***

MUNICIPIO: IBAGUE
VEREDA: CAÑAMO Ruta Baja Mirador - TABIAS

A los día(s) 15 del mes de ABRIL de 20 26, se reunieron el Sr (a) Jeison Gaviria Alvarez como Inspector vial, en representación de **MARV 7** Y el señor (a) Juan Jose Espinosa - en representación de la(s) Comunidad(es) beneficiada(s), con el objeto de informar a los beneficiarios los mantenimientos viales a ejecutar con los aportes asignados por parte de La Gobernación del Tolima.

En constancia de lo anterior se firma por quienes en ella intervinieron:

Juan Jose Espinosa Gutierrez

Representante de la(s) Comunidad(es).
C.C.No. 1110587377

Inspector Contrato 3034 de 2026
MARV 7
C.C.No. 1110512407

Nombre de la vía Mirador - TABIAS

Fecha: _____

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOB-M-007C
CONTRATO 3034 DE 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

AUTORIZACIÓN PARA RESGUARDO DE LA MAQUINARIA

Yo, Juan José Espinosa, con Cédula de Ciudadanía N° 1110587377. Por medio del presente documento, y en calidad de Administrador., del predio El descanso de la vereda Catarma - Tapias, del municipio Ibagué autorizo al Ingeniero (a) Jeison G. Alvis Lozano quien en representación del contrato 3034 de Abril de 2026 la (UNIÓN TEMPORAL MARV 7), cuyo objeto es "CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA". Para estacionar y resguardar la maquinaria del mantenimiento de las vías como son:

Volqueta 01 09.,
Retroexcavadora 40,
Motoniveladora 36 - 40,
Cargador _____,
Vibrocompactador _____,
Excavadora _____,

Con el compromiso de velar por el buen estado y la seguridad de los mismos durante la permanencia en el predio y no permitir el acceso o manipulación de la maquinaria a personal ajeno y/o sin autorización únicamente del Ingeniero Supervisor.

Esta autorización se expide para la Ejecución del contrato 3034 de 2026 y así mismo declaro la posesión del predio para emitir la presente autorización.

Juan José espinosa Carbonell

Firma Administrador o Propietario
C.C. No. 1110 587 377

Pdte. Junta de acción Comunal (testigo)
C.C. No.

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 7

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

PREOPERACIONALES EQUIPO

FRENTE DE TRABAJO IBAGUÉ

ABRIL 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

1635

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

PERIODO: 17 DE ABRIL 2026			
CONTRATO	3034 DE 2026	PLACA: OTI 689	MARCA: CHEVROLET KODIAK
EQUIPO No.	1	MODELO: 2009	FRENTE DE TRABAJO: IBAGUÉ
INSPECCIONADO POR:	ING. DIANA GALLEGO		LOCALIZACION: MACHIN-LOS MANGOS
Licencia de conduccion:			Póliza de Responsabilidad Civil:
Licencia de transito No.	C2	Última Revisión Tecnicomecanica:	

	HORA INICIO OPERACIÓN									7:00							
										205578							
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		OBSERVACIONES	
ÍTEM	ELEMENTOS A CONTROLAR	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M		
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín										X						
	Kit de contingencia según listado adjunto										X						
	Caja de Herramienta										X						
	Tacos										X						
	Gato										X						
	Linterna recargable										X						
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina										X						
ESTADO GENERAL	Estado del motor									X							
	Estado del Tanque de combustible									X							
	Nivel del aceite									X							
	Soportes motor									X							
	Estado del exhosto									X							
	Estado del switche de encendido									X							
LUCES	De Trabajo delanteras									X							
	De trabajo traseras									X							
	Direccionales Delanteras Y Traseras									X							
	Stop Traseros									X							
CABINA	Espejo Retrovisor									X							
	Espejos laterales									X							
	Alarma (o pito) de Retroceso									X							
	Pito Normal									X							
	Frenos de Servicio									X							
	Freno de emergencia									X							
	Dirección/suspensión(Terminales).									X							
	Cinturones de Seguridad									X							
	Estado de la puertas									X							
	Vidrio frontal en buen estado.									X							
	Limpia brisas									X							
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco									X							
	Estado de los asientos									X							
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).									X							
	Velocímetro									X							
	Batería y cables									X							
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos									X							
	Repuesto									X							
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas									X							
	Estado de correas									X							
	Caja de cambios en buen estado.									X							
	Radiador									X							
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)									X							
	Mangueras									X							
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)									X							
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco									X							
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco									X							
	tornillos de seguridad para el cierre del volco									X							
	Estado de empaques del volco									X							
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN									5:00							
	KILOMETRAJE FINAL									205685							

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	Firma Verificación Inspector:	Diana Gallego
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma: Javier Guerrero	El Equipo esta apto para Trabajar:	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

PERIODO: 20 DE ABRIL AL 25 DE ABRIL 2026				
CONTRATO	3034 DE 2026	**PLACA: OTI 689**	**MARCA:** CHEVROLET KODIAK	
EQUIPO No.	1	**MODELO: 2009**	**FRENTE DE TRABAJO: IBAGUÉ**	
INSPECCIONADO POR:	ING. DIANA GALLEGO		**LOCALIZACION: MACHIN-LOS MANGOS**	
Licencia de conduccion:			**Póliza de Responsabilidad Civil:**	
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**		

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		7:00			
		205685		205792		205899		206006		206113		206220			
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM	
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	**OBSERVACIONES**
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín		X		X		X		X		X		X			
	Kit de contingencia según listado adjunto		X		X		X		X		X		X			
	Caja de Herramienta		X		X		X		X		X		X			
	Tacos		X		X		X		X		X		X			
	Gato		X		X		X		X		X		X			
	Linterna recargable		X		X		X		X		X		X			
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina		X		X		X		X		X		X			
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X		X		X				
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X		X		X				
	Nivel del aceite	X		X		X		X		X		X				
	Soportes motor	X		X		X		X		X		X				
	Estado del exhosto	X		X		X		X		X		X				
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X		X		X				
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X		X				
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X		X				
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X		X		X				
	Stop Traseros	X		X		X		X		X		X				
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X		X		X				
	Espejos laterales	X		X		X		X		X		X				
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X		X		X				
	Pito Normal	X		X		X		X		X		X				
	Frenos de Servicio	X		X		X		X		X		X				
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X		X				
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X		X				
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X		X				
	Estado de la puertas	X		X		X		X		X		X				
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X		X				
	Limpia brisas	X		X		X		X		X		X				
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X		X		X				
	Estado de los asientos	X		X		X		X		X		X				
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X		X		X				
	Velocímetro	X		X		X		X		X		X				
	Batería y cables	X		X		X		X		X		X				
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X		X				
	Repuesto	X		X		X		X		X		X				
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X				
	Estado de correas	X		X		X		X		X		X				
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X		X				
	Radiador	X		X		X		X		X		X				
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X		X				
	Mangueras	X		X		X		X		X		X				
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X		X		X				
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X		X		X				
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X		X		X				
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X		X		X				
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X		X		X				
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		5:00				
	KILOMETRAJE FINAL	205792		205899		206006		206113		206220		206327				

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	**Firma Verificación Inspector:**	Diana Gallego
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma: Javier Guerrero	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

PERIODO: 28 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2026

CONTRATO	3034 DE 2026	**PLACA: OTI 689**	**MARCA:** CHEVROLET KODIAK
EQUIPO No.	1	**MODELO: 2009**	**FRENTE DE TRABAJO: IBAGUÉ**
INSPECCIONADO POR:	ING. DIANA GALLEGO		**LOCALIZACION: MACHIN-LOS MANGOS**
Licencia de conduccion:			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN			7:00		7:00		7:00								
				206327		206434		206541								
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		OBSERVACIONES
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín				X		X		X							
	Kit de contingencia según listado adjunto				X		X		X							
	Caja de Herramienta				X		X		X							
	Tacos				X		X		X							
	Gato				X		X		X							
	Linterna recargable				X		X		X							
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina				X		X		X							
ESTADO GENERAL	Estado del motor			X		X		X								
	Estado del Tanque de combustible			X		X		X								
	Nivel del aceite			X		X		X								
	Soportes motor			X		X		X								
	Estado del exhosto			X		X		X								
	Estado del switche de encendido			X		X		X								
LUCES	De Trabajo delanteras			X		X		X								
	De trabajo traseras			X		X		X								
	Direccionales Delanteras Y Traseras			X		X		X								
	Stop Traseros			X		X		X								
CABINA	Espejo Retrovisor			X		X		X								
	Espejos laterales			X		X		X								
	Alarma (o pito) de Retroceso			X		X		X								
	Pito Normal			X		X		X								
	Frenos de Servicio			X		X		X								
	Freno de emergencia			X		X		X								
	Dirección/suspensión(Terminales).			X		X		X								
	Cinturones de Seguridad			X		X		X								
	Estado de la puertas			X		X		X								
	Vidrio frontal en buen estado.			X		X		X								
	Limpia brisas			X		X		X								
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco			X		X		X								
	Estado de los asientos			X		X		X								
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).			X		X		X								
	Velocímetro			X		X		X								
	Batería y cables			X		X		X								
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos			X		X		X								
	Repuesto			X		X		X								
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas			X		X		X								
	Estado de correas			X		X		X								
	Caja de cambios en buen estado.			X		X		X								
	Radiador			X		X		X								
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)			X		X		X								
	Mangueras			X		X		X								
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)			X		X		X								
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco			X		X		X								
	condiciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco			X		X		X								
	tornillos de seguridad para el cierre del volco			X		X		X								
	Estado de empaques del volco			X		X		X								
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN			5:00		5:00		5:00								
	KILOMETRAJE FINAL			206434		206541		206648								

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	**Firma Verificación Inspector:**	Diana Gallego
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma: Javier Guevara	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

PERIODO: 15 DE ABRIL AL 17 DE ABRIL 2026

CONTRATO	3034 DE 2026	**PLACA: OTI 686**	**MARCA:** KODIAK
EQUIPO No.	9	**MODELO: 2009**	**FRENTE DE TRABAJO: IBAGUÉ**
INSPECCIONADO POR:	ING. DIANA GALLEGO		**LOCALIZACION: GUAICO-MACHIN**
Licencia de conduccion:			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN					7:00		7:00		7:00						
	KILOMETRAJE INICIAL					168000		168067		168082						
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		OBSERVACIONES
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín					X		X		X						
	Kit de contingencia según listado adjunto					X		X		X						
	Caja de Herramienta					X		X		X						
	Tacos					X		X		X						
	Gato					X		X		X						
	Linterna recargable					X		X		X						
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina					X		X		X						
ESTADO GENERAL	Estado del motor					X		X		X						
	Estado del Tanque de combustible					X		X		X						
	Nivel del aceite					X		X		X						
	Soportes motor					X		X		X						
	Estado del exhosto					X		X		X						
	Estado del switche de encendido					X		X		X						
LUCES	De Trabajo delanteras					X		X		X						
	De trabajo traseras					X		X		X						
	Direccionales Delanteras Y Traseras					X		X		X						
	Stop Traseros					X		X		X						
CABINA	Espejo Retrovisor					X		X		X						
	Espejos laterales					X		X		X						
	Alarma (o pito) de Retroceso					X		X		X						
	Pito Normal					X		X		X						
	Frenos de Servicio					X		X		X						
	Freno de emergencia					X		X		X						
	Dirección/suspensión(Terminales).					X		X		X						
	Cinturones de Seguridad					X		X		X						
	Estado de la puertas					X		X		X						
	Vidrio frontal en buen estado.					X		X		X						
	Limpia brisas					X		X		X						
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco					X		X		X						
	Estado de los asientos					X		X		X						
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).					X		X		X						
	Velocímetro					X		X		X						
	Batería y cables					X		X		X						
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos					X		X		X						
	Repuesto					X		X		X						
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas					X		X		X						
	Estado de correas					X		X		X						
	Caja de cambios en buen estado.					X		X		X						
	Radiador					X		X		X						
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)					X		X		X						
	Mangueras					X		X		X						
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)					X		X		X						
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco					X		X		X						
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco					X		X		X						
	tornillos de seguridad para el cierre del volco					X		X		X						
	Estado de empaques del volco					X		X		X						
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN					5:00		5:00		5:00						
	KILOMETRAJE FINAL					168067		168082		168116						

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARL.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

PERIODO: 23 DE ABRIL AL 24 DE ABRIL 2026

CONTRATO	3034 DE 2026	**PLACA: OTI 686**	**MARCA:** KODIAK
EQUIPO No.	9	**MODELO: 2009**	**FRENTE DE TRABAJO: IBAGUÉ**
INSPECCIONADO POR:	ING. DIANA GALLEGO		**LOCALIZACION: GUAICO-MACHIN**
Licencia de conduccion:			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN							7:00		7:00						
	KILOMETRAJE INICIAL							168251		168317						
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		OBSERVACIONES
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín							X		X						
	Kit de contingencia según listado adjunto							X		X						
	Caja de Herramienta							X		X						
	Tacos							X		X						
	Gato							X		X						
	Linterna recargable							X		X						
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina							X		X						
ESTADO GENERAL	Estado del motor							X		X						
	Estado del Tanque de combustible							X		X						
	Nivel del aceite							X		X						
	Soportes motor							X		X						
	Estado del exhosto							X		X						
	Estado del switche de encendido							X		X						
LUCES	De Trabajo delanteras							X		X						
	De trabajo traseras							X		X						
	Direccionales Delanteras Y Traseras							X		X						
	Stop Traseros							X		X						
CABINA	Espejo Retrovisor							X		X						
	Espejos laterales							X		X						
	Alarma (o pito) de Retroceso							X		X						
	Pito Normal							X		X						
	Frenos de Servicio							X		X						
	Freno de emergencia							X		X						
	Dirección/suspensión(Terminales).							X		X						
	Cinturones de Seguridad							X		X						
	Estado de la puertas							X		X						
	Vidrio frontal en buen estado.							X		X						
	Limpia brisas							X		X						
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco							X		X						
	Estado de los asientos							X		X						
	Indicadores (Hidráulico - voltimetro-Refrigerante, aire).							X		X						
	Velocímetro							X		X						
	Batería y cables							X		X						
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos							X		X						
	Repuesto							X		X						
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas							X		X						
	Estado de correas							X		X						
	Caja de cambios en buen estado.							X		X						
	Radiador							X		X						
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)							X		X						
	Mangueras							X		X						
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)							X		X						
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco							X		X						
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco							X		X						
	tornillos de seguridad para el cierre del volco							X		X						
	Estado de empaques del volco							X		X						
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN							5:00		5:00						
	KILOMETRAJE FINAL							168317		168383						

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:** Diana Gallego
	Afiliación ARP		
Operador	Firma: Lopez	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS

PERIODO: 27 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2026

CONTRATO	3034 DE 2026	**PLACA: OTI 686**	**MARCA:** KODIAK
EQUIPO No.	9	**MODELO: 2009**	**FRENTE DE TRABAJO: IBAGUÉ**
INSPECCIONADO POR:	ING. DIANA GALLEGO		**LOCALIZACION: GUAICO-MACHIN**
Licencia de conduccion:			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00		7:00								
	KILOMETRAJE INICIAL	168383		168449		168515		168581								
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		OBSERVACIONES
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X		X								
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X								
	Caja de Herramienta	X		X		X		X								
	Tacos	X		X		X		X								
	Gato	X		X		X		X								
	Linterna recargable	X		X		X		X								
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X								
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X								
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X								
	Nivel del aceite	X		X		X		X								
	Soportes motor	X		X		X		X								
	Estado del exhosto	X		X		X		X								
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X								
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X								
	De trabajo traseras	X		X		X		X								
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X								
	Stop Traseros	X		X		X		X								
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X								
	Espejos laterales	X		X		X		X								
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X								
	Pito Normal	X		X		X		X								
	Frenos de Servicio	X		X		X		X								
	Freno de emergencia	X		X		X		X								
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X								
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X								
	Estado de la puertas	X		X		X		X								
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X								
	Limpia brisas	X		X		X		X								
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X								
	Estado de los asientos	X		X		X		X								
	Indicadores (Hidráulico - voltimetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X								
	Velocímetro	X		X		X		X								
	Batería y cables	X		X		X		X								
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X								
	Repuesto	X		X		X		X								
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X								
	Estado de correas	X		X		X		X								
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X								
	Radiador	X		X		X		X								
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X								
	Mangueras	X		X		X		X								
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X								
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X								
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X								
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X								
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X								
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00		5:00								
	KILOMETRAJE FINAL	168449		168515		168581		168647								

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:** Diana Gallego
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

PERIODO: 15 DE ABRIL AL 17 DE ABRIL 2026			
CONTRATO	3034 DE 2026	PLACA: OTI 691	MARCA: KODIAK
EQUIPO No.	15	MODELO: 2009	FRENTE DE TRABAJO: IBAGUÉ
INSPECCIONADO POR:	ING. DIANA GALLEGO		LOCALIZACION: GUAICO-MACHIN
Licencia de conduccion:			Póliza de Responsabilidad Civil:
Licencia de transito No.	C2	Última Revisión Tecnicomecanica:	

	HORA INICIO OPERACIÓN					7:00		7:00		7:00						
	KILOMETRAJE INICIAL					161668		161692		161716						
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		OBSERVACIONES
ÍTEM	ELEMENTOS A CONTROLAR	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín					X		X		X						
	Kit de contingencia según listado adjunto					X		X		X						
	Caja de Herramienta					X		X		X						
	Tacos					X		X		X						
	Gato					X		X		X						
	Linterna recargable					X		X		X						
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina					X		X		X						
ESTADO GENERAL	Estado del motor					X		X		X						
	Estado del Tanque de combustible					X		X		X						
	Nivel del aceite					X		X		X						
	Soportes motor					X		X		X						
	Estado del exhosto					X		X		X						
	Estado del switche de encendido					X		X		X						
LUCES	De Trabajo delanteras					X		X		X						
	De trabajo traseras					X		X		X						
	Direccionales Delanteras Y Traseras					X		X		X						
	Stop Traseros					X		X		X						
CABINA	Espejo Retrovisor					X		X		X						
	Espejos laterales					X		X		X						
	Alarma (o pito) de Retroceso					X		X		X						
	Pito Normal					X		X		X						
	Frenos de Servicio					X		X		X						
	Freno de emergencia					X		X		X						
	Dirección/suspensión(Terminales).					X		X		X						
	Cinturones de Seguridad					X		X		X						
	Estado de la puertas					X		X		X						
	Vidrio frontal en buen estado.					X		X		X						
	Limpia brisas					X		X		X						
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco					X		X		X						
	Estado de los asientos					X		X		X						
	Indicadores (Hidráulico - voltimetro-Refrigerante, aire).					X		X		X						
	Velocímetro					X		X		X						
	Batería y cables					X		X		X						
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos					X		X		X						
	Repuesto					X		X		X						
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas					X		X		X						
	Estado de correas					X		X		X						
	Caja de cambios en buen estado.					X		X		X						
	Radiador					X		X		X						
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)					X		X		X						
	Mangueras					X		X		X						
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)					X		X		X						
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco					X		X		X						
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco					X		X		X						
	tornillos de seguridad para el cierre del volco					X		X		X						
	Estado de empaques del volco					X		X		X						
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN					5:00		5:00		5:00						
	KILOMETRAJE FINAL					161692		161716		161723						

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	Firma Verificación Inspector:	Diana Gallego
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	El Equipo esta apto para Trabajar:	SI ( ) NO ( )
			FIRMA COORDINADOR

1647

VERSION 1 | GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 3034 DE 2026 **MODELO:** **MOTO # 40** **MARCA:** CAT

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO **LOCALIZACION:** GUAYABOS-CATAIMA **FRENTE DE TRABAJO:** IBAGUÉ

PERIODO: 15 DE ABRIL AL 18 DE ABRIL 2026 **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL					6858		6859		6866		6866			
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2					X		X		X		X			
	* De trabajo delanteras	2					X		X		X		X			
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2					X		X		X		X			
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2					X		X		X		X			
	* De stop y señal trasera	2					X		X		X		X			
	* De trabajo traseras	2					X		X		X		X			
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1					X		X		X		X			
	* Cinturón de seguridad	1					X		X		X		X			
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1					X		X		X		X			
	Asiento (dispositivo de giro)	1					X		X		X		X			
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos					X		X		X		X			
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1					X		X		X		X			
	Alarma de retroceso	1					X		X		X		X			
	Escaleras y apoyos de acceso	2					X		X		X		X			
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1					X		X		X		X			
	Palancas de mando	2					X		X		X		X			
	Pedales	Todos					X		X		X		X			
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo					X		X		X		X			
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos					X		X		X		X			
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos					X		X		X		X			
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2					X		X		X		X			
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1					X		X		X		X			
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas					X		X		X		X			
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas					X		X		X		X			
	* Freno de emergencia en buen estado	1					X		X		X		X			
	Estado general (desgarrador/balde)	2					X		X		X		X			
	Mandos de levante del brazo	2					X		X		X		X			
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos					X		X		X		X			
	Compartimiento del motor aseado	Completo					X		X		X		X			
	Sistema de Dirección	1					X		X		X		X			
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas						X		X		X		X			
	* Huellas en buen estado	4					X		X		X		X			
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL						6859		6866		6866		6869			
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1 | GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 7 — FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 3034 DE 2026 | **MODELO:** | **RETRO # 40** | **MARCA:** CAT

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO | **LOCALIZACION:** GUAICO-MACHIN | **FRENTE DE TRABAJO:** IBAGUÉ

PERIODO: 15 DE ABRIL AL 17 DE ABRIL 2026 | **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL					3820		3826		3835					
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2					X		X		X					
	* De trabajo delanteras	2					X		X		X					
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2					X		X		X					
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2					X		X		X					
	* De stop y señal trasera	2					X		X		X					
	* De trabajo traseras	2					X		X		X					
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1					X		X		X					
	* Cinturón de seguridad	1					X		X		X					
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1					X		X		X					
	Asiento (dispositivo de giro)	1					X		X		X					
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos					X		X		X					
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1					X		X		X					
	Alarma de retroceso	1					X		X		X					
	Escaleras y apoyos de acceso	2					X		X		X					
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1					X		X		X					
	Palancas de mando	2					X		X		X					
	Pedales	Todos					X		X		X					
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo					X		X		X					
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos					X		X		X					
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos					X		X		X					
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2					X		X		X					
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1					X		X		X					
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas					X		X		X					
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas					X		X		X					
	* Freno de emergencia en buen estado	1					X		X		X					
	Estado general (desgarrador/balde)	2					X		X		X					
	Mandos de levante del brazo	2					X		X		X					
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos					X		X		X					
	Compartimiento del motor aseado	Completo					X		X		X					
	Sistema de Dirección	1					X		X		X					
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas						X		X		X					
	* Huellas en buen estado	4					X		X		X					
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL						3826		3835		3839					
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1 | GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 3034 DE 2026 | **MODELO:** | **RETRO # 40** | **MARCA:** CAT

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO | **LOCALIZACION:** GUAICO-MACHIN | **FRENTE DE TRABAJO:** IBAGUÉ

PERIODO: 23 DE ABRIL AL 24 DE ABRIL 2026 | **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL							3839		3841					
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2					X		X		X					
	* De trabajo delanteras	2							X		X					
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2							X		X					
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2							X		X					
	* De stop y señal trasera	2							X		X					
	* De trabajo traseras	2							X		X					
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1							X		X					
	* Cinturón de seguridad	1							X		X					
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1							X		X					
	Asiento (dispositivo de giro)	1							X		X					
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos							X		X					
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1							X		X					
	Alarma de retroceso	1							X		X					
	Escaleras y apoyos de acceso	2							X		X					
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1							X		X					
	Palancas de mando	2							X		X					
	Pedales	Todos							X		X					
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo							X		X					
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos							X		X					
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos							X		X					
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2							X		X					
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1							X		X					
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas							X		X					
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas							X		X					
	* Freno de emergencia en buen estado	1							X		X					
	Estado general (desgarrador/balde)	2							X		X					
	Mandos de levante del brazo	2							X		X					
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos							X		X					
	Compartimiento del motor aseado	Completo							X		X					
	Sistema de Dirección	1							X		X					
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas								X		X					
	* Huellas en buen estado	4							X		X					
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL								3841		3850					
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1

GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 3034 DE 2026 **MODELO:** **MOTO # 36** **MARCA:** CAT

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO **LOCALIZACION:** TAPIAS-EL SALÓN **FRENTE DE TRABAJO:** IBAGUÉ

PERIODO: 23 DE ABRIL AL 24 DE ABRIL 2026 **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL							4837		4841					
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2							X		X					
	* De trabajo delanteras	2							X		X					
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2							X		X					
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2							X		X					
	* De stop y señal trasera	2							X		X					
	* De trabajo traseras	2							X		X					
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1							X		X					
	* Cinturón de seguridad	1							X		X					
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1							X		X					
	Asiento (dispositivo de giro)	1							X		X					
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos							X		X					
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1							X		X					
	Alarma de retroceso	1							X		X					
	Escaleras y apoyos de acceso	2							X		X					
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1							X		X					
	Palancas de mando	2							X		X					
	Pedales	Todos							X		X					
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo							X		X					
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos							X		X					
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos							X		X					
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2							X		X					
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1							X		X					
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas							X		X					
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas							X		X					
	* Freno de emergencia en buen estado	1							X		X					
	Estado general (desgarrador/balde)	2							X		X					
	Mandos de levante del brazo	2							X		X					
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos							X		X					
	Compartimiento del motor aseado	Completo							X		X					
	Sistema de Dirección	1							X		X					
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas								X		X					
	* Huellas en buen estado	4							X		X					
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL								4841		4844					
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1 | GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 3034 DE 2026 | **MODELO:** | **MOTO # 36** | **MARCA:** CAT

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO | **LOCALIZACION:** LOS MANGOS | **FRENTE DE TRABAJO:** IBAGUÉ

PERIODO: 27 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2026 | **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	4844		4848		4851		4851							
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X							
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X							
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X							
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X							
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X							
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X							
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X							
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X							
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X							
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X							
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X							
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X							
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X							
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X							
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X							
	Palancas de mando	2	X		X		X		X							
	Pedales	Todos	X		X		X		X							
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X							
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X							
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X		X							
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X							
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X		X							
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X							
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X							
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X							
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X		X							
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X		X							
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X							
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X							
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X							
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X							
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X							
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		4848		4851		4851		4855							
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:		Diario.		Diario.		Diario.		Diario.							
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 7

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

FRENTE DE TRABAJO IBAGUÉ

ABRIL 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

FRENTE IBAGUE								
#.ORDEN	DIA	HORA	RECIBO	GLS	TOTAL	ESTACION SERVICIO	OBSERVACIONES	FRENTE
58	14-abr-26	15:54:24	130168	**89,029**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Trasporto V#9	FRENTE IBAGUE
59	14-abr-26	15:56:56	130169	**160,109**	$ 1.778.971,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Trasporto V#9	FRENTE IBAGUE
60	14-abr-26	16:12:10	130175	**40,000**	$ 444.800,00	ESTACION DISTRACOM	Oscar Lopez V#9	FRENTE IBAGUE
61	15-abr-26	8:44:55	130206	**40,000**	$ 444.440,00	ESTACION DISTRACOM	Mauricio Patiño V#15	FRENTE IBAGUE
69	17-abr-26	13:07:02	130358	**50,724**	$ 563.594,00	ESTACION DISTRACOM	Javier guerrero V#1	FRENTE IBAGUE
70	20-abr-26	13:53:17	130501	**25,612**	$ 284.575,00	ESTACION DISTRACOM	Oscar Lopez V#9	FRENTE IBAGUE
84	20-abr-26	14:54:10	130517	**21,686**	$ 240.953,00	ESTACION DISTRACOM	Henry Rocha V#1	FRENTE IBAGUE
88	22-abr-26	13:49:46	130628	**14,001**	$ 155.565,00	ESTACION DISTRACOM	Henry Rocha V#1	FRENTE IBAGUE
101	25-abr-26	10:59:32	130827	**8,011**	$ 89.010,00	ESTACION DISTRACOM	Henry Rocha V#1	FRENTE IBAGUE
102	28-abr-26	8:08:49	131007	**34,278**	$ 402.252,00	ESTACION DISTRACOM	Henry Rocha V#1	FRENTE IBAGUE
108	30-abr-26	14:01:06	131190	**32,607**	$ 382.643,00	ESTACION DISTRACOM	Henry Rocha V#1	FRENTE IBAGUE
118	30-abr-26	13:17:12	131178	**29,469**	$ 345.966,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Trasporto V#1	FRENTE IBAGUE

TOTAL MES	545,526
REMANENTE CONTRATO ANTERIOR	60,000
TOTAL ACPM	605,526

CONSUMO MES	545,526
REMANENTE PARA MAYO	60,000

VERSION 1	GOB-M-014	GOBERNACION DEL TOLIMA
	CONTRATO NO.3034 DE 2026	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA	

INFORME SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIARIO EN TURNO

TURNO: DIURNO DEL 14 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

MUNICIPIO: IBAGUÉ VEREDA : IBAGUÉ-MACHIN, LOS MANGOS COORDINADOR: JEISON GIOVANNI ALVIS LOZANO

VIA: IBAGUÉ-MACHIN, LOS MANGOS

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE DEL OPERADOR	LUNES		MARTES (14)		MIERCOLES (15)		JUEVES (16)		VIERNES (17)		SABADO (18)		DOMINGO (19)		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	RETROEXCAVADORA	40	JULIO GIRALDO					25				20						45,000
2	MOTONIVELADORA	40	JAIME ORTIZ					40										40,000
3	VOLQUETA	9	OSCAR LOPEZ			40												40,000
4	VOLQUETA	15	MAURICIO PATIÑO					40										40,000
5	VOLQUETA	1	JAVIER GUERRERO									50,724						50,724

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (20)		MARTES (21)		MIERCOLES (22)		JUEVES (23)		VIERNES (24)		SABADO (25)		DOMINGO (26)		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	RETROEXCAVADORA	40	NELSON TAQUEMICHE									25						25,000
2	MOTONIVELADORA	36	NOLBERTO ORTEGON															0,000
3	VOLQUETA	9	OSCAR LOPEZ	25,612						23,607								49,219
4	VOLQUETA	1	HENRY ROCHA	21,686				14,001				30		8,011				73,698
																		0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (27)		MARTES (28)		MIERCOLES (29)		JUEVES (30)		VIERNES		SABADO		DOMINGO		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	RETROEXCAVADORA	40	JULIO GIRALDO															0,000
2	MOTONIVELADORA	36	NOLBERTO ORTEGON	40		20												60,000
3	VOLQUETA	1	HENRY ROCHA			34,278				32,607								66,885
4	VOLQUETA	9	OSCAR LOPEZ	25				30										55,000

545,526

OBSERVACIONES: Vienen 60,000 gls del contrato anterior. Remanente 60,000 gls para el mes de mayo.

VoBo SUPERVISOR (A): Diana Ortega

VoBo COORDINADOR:

FRENTE DE TRABAJO IBAGUÉ					
MES ABRIL 2026					
Maquina	N° Interno	Consumo Mensual ACPM (GL)	Kilometraje/ Horometro Inicial	Kilometraje/Horometro Final	Promedio Consumo (Hr/Km x GL)
RETROEXCAVADORA	40	70,000	3820	3850	2,31
MOTONIVELADORA	40	40,000	6858	6869	3,57
VOLQUETA	1	191,307	205578	206851	0,15
VOLQUETA	9	144,219	168000	168582	0,25
VOLQUETA	15	40,000	161668	161723	0,73
MOTONIVELADORA	36	60,000	4837	4855	3,47
		545,526			

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOB-M-012A
CONTRATO 3034 DE 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Ibagué
FECHA : 14/04/2026

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 4210 del 11 de Noviembre del 2025 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Coordinador del contrato 3034 del 09 de Abril de 2026 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Ibagué la cantidad de 289,138 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 14 de abril del 2026.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 4210 de 2025
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Coordinador Contrato 3034 de 2026.
MARV 7

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 4210 de 2025
Gobernación del Tolima

ING. Stephanie Lara Hernández
Apoyo Supervisor del contrato 3034
de 2026. MARV 7

ING. Diana Marcela Gallego Campos
Apoyo Supervisor del contrato 3034
de 2026. MARV 7

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 130168
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
Exentos De Reteica Art 86 A
cdo 015 De 2021
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2026/04/14
Vencimiento:	2026/05/14
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 154985
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	IBAGUE
Control:	Ibague
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora Ini:	15:54:24
Hora Fin:	16:11:13
Combustible:	DIESEL
Volumen:	89.0290
Precio:	$11120
Total:	$990000
Panel:	MFC500
Lad/Man/Pos:	1/1/3
Dispositivo:	RBHAND283-04
Empleado:	BRYAN ALEXANDER M
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:
Ibague VH9

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 130169
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
Exentos De Reteica Art 86 A
cdo 015 De 2021
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2026/04/14
Vencimiento:	2026/05/14
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 154985
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	IBAGUE
Control:	Ibague
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora Ini:	15:56:56
Hora Fin:	16:12:24
Combustible:	DIESEL
Volumen:	160.1090
Precio:	$11111
Total:	$1778971
Panel:	MFA976
Lad/Man/Pos:	2/1/8
Dispositivo:	RBHAND283-04
Empleado:	BRYAN ALEXANDER M
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:
Ibague VH9

distracom

*COPIA(2)
Remision de Venta
No. REFK 130175
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
Exentos De Reteica Art 86 A
cdo 015 De 2021
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2026/04/14
Vencimiento:	2026/05/14
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 154985
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	OTI686
Kilometros:	167998
Hora Ini:	16:12:10
Hora Fin:	16:20:35
Combustible:	DIESEL
Volumen:	40.0000
Precio:	$11120
Total:	$444800
Panel:	MFC500
Lad/Man/Pos:	1/1/3
Dispositivo:	RBHAND283-03
Empleado:	BRYAN ALEXANDER M
Emp. Apoyo:	DEVIA BUSTOS LEONE
Validado:	ID Electronico

Entrego:
oscar lopez

Recibi:
1005780503

IBAGUE

Nombre:
9

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOB-M-012A
CONTRATO 3034 DE 2026

GOBERNACION DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Ibagué
FECHA : 15/04/2026

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 4210 del 11 de Noviembre del 2025 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Coordinador del contrato 3034 del 09 de Abril de 2026 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Ibagué la cantidad de 40,000 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 15 de abril del 2026.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 4210 de 2025
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Coordinador Contrato 3034 de 2026.
MARV 7

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 4210 de 2025
Gobernación del Tolima

ING. Stephanie Lara Hernández
Apoyo Supervisor del contrato 3034
de 2026. MARV 7

ING. Diana Marcela Gallego Campos
Apoyo Supervisor del contrato 3034
de 2026. MARV 7

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 130206
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
Exentos De Reteica Art 86 A
cdo 015 De 2021
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2026/04/15
Vencimiento:	2026/05/15
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 154985
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	QTI691
Kilometros:	161668
Cedula:	1005690434
Hora Ini:	08:44:55
Hora Fin:	08:51:36
Combustible:	DIESEL
Volumen	40.0000
Precio:	$11111
Total:	$444440
Panel:	MFA976
Lad/Man/Pos:	1/1/7
Dispositivo:	RBHAND283-04
Empleado:	LUISA FERNANDA GA
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Ibague
Volqueta #15

Nombre:

1005690434

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOB-M-012A
CONTRATO 3034 DE 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Ibagué
FECHA : 17/04/2026

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 4210 del 11 de Noviembre del 2025 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Coordinador del contrato 3034 del 09 de Abril de 2026 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Ibagué la cantidad de 50,724 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 17 de abril del 2026.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 4210 de 2025
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Coordinador Contrato 3034 de 2026.
MARV 7

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 4210 de 2025
Gobernación del Tolima

ING. Stephanie Lara Hernández
Apoyo Supervisor del contrato 3034
de 2026. MARV 7

ING. Diana Marcela Gallego Campos
Apoyo Supervisor del contrato 3034
de 2026. MARV 7

1005

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta
No. REFK 130358
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
Exentos De Reteica Art 86 A
cdo 015 De 2021
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2026/04/17
Vencimiento:	2026/05/17
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 154985
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	OTI689
Kilometros:	2055781
Hora Ini:	13:07:02
Hora Fin:	13:19:23
Combustible:	DIESEL
Volumen:	50.7240
Precio:	$11111
Total:	$563594
Panel:	MFA976
Lad/Man/Pos:	1/1/7
Dispositivo:	RBHAND283-01
Empleado:	DEVIA BUSTOS LEON
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

Jaider Guerrero
1105.614.947
Volqueta # 1

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOB-M-012A
CONTRATO 3034 DE 2026

GOBERNACION DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Ibagué
FECHA : 20/04/2026

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 4210 del 11 de Noviembre del 2025 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Coordinador del contrato 3034 del 09 de Abril de 2026 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Ibagué la cantidad de 47,298 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 20 de abril del 2026.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 4210 de 2025
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Coordinador Contrato 3034 de 2026.
MARV 7

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 4210 de 2025
Gobernación del Tolima

ING. Stephanie Lara Hernández
Apoyo Supervisor del contrato 3034
de 2026. MARV 7

ING. Diana Marcela Gallego Campos
Apoyo Supervisor del contrato 3034
de 2026. MARV 7

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 130517
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
Exentos De Reteica Art 86 A
cdo 015 De 2021
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2026/04/20
Vencimiento:	2026/05/20
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 154985
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	OTI689
Kilometros:	205813
Cedula:	800113672
Hora Ini:	14:54:10
Hora Fin:	14:59:07
Combustible:	DIESEL
Volumen:	21.6860
Precio:	$11111
Total:	$240953
Panel:	MFA976
Lad/Man/Pos:	1/1/7
Dispositivo:	RBHAND283-04
Empleado:	DEVIA BUSTOS LEON
Validado:	ID Electronico

Entrego:
Harry Reed.
Recibi:
OTI 689 #01
IBAGUE.
Nombre:

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 130501
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
Exentos De Reteica Art 86 A
cdo 015 De 2021
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2026/04/20
Vencimiento:	2026/05/20
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 154985
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	OTI686
Kilometros:	168173
Cedula:	800113672
Hora Ini:	13:53:17
Hora Fin:	13:59:22
Combustible:	DIESEL
Volumen:	25.6120
Precio:	$11111
Total:	$284575
Panel:	MFA976
Lad/Man/Pos:	1/1/7
Dispositivo:	RBHAND283-02
Empleado:	DEVIA BUSTOS LEON
Emp. Apoyo:	BRYAN ALEXANDER MO
Validado:	ID Electronico

Entrego:
OSCAR LOPEZ
Recibi:
1005780503
Ibagué

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOB-M-012A
CONTRATO 3034 DE 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Ibagué
FECHA : 22/04/2026

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 4210 del 11 de Noviembre del 2025 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Coordinador del contrato 3034 del 09 de Abril de 2026 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Ibagué la cantidad de 14,001 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 22 de abril del 2026.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 4210 de 2025
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Coordinador Contrato 3034 de 2026.
MARV 7

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 4210 de 2025
Gobernación del Tolima

ING. Stephanie Lara Hernández
Apoyo Supervisor del contrato 3034
de 2026. MARV 7

ING. Diana Marcela Gallego Campos
Apoyo Supervisor del contrato 3034
de 2026. MARV 7

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 130628
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
Exentos De Reteica Art 86 A
cdo 015 De 2021
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2026/04/22
Vencimiento:	2026/05/22
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 154985
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	OTI689
Kilometros:	206054
Cedula:	800113672
Hora Ini:	13:49:46
Hora Fin:	13:54:16
Combustible:	DIESEL
Volumen:	14.0010
Precio:	$11111
Total:	$155565
Panel:	MFA976
Lad/Man/Pos:	1/1/7
Dispositivo:	RBHAND283-04
Empleado:	BRYAN ALEXANDER M
Emp. Apoyo:	FRANCY YOMARA RODR
Validado:	ID Electronico

Entrego:
Hary Rosta.
Recibi:
OTI 689 #01

Nombre:

1660

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOB-M-012A
CONTRATO 3034 DE 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Ibagué
FECHA : 25/04/2026

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 4210 del 11 de Noviembre del 2025 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Coordinador del contrato 3034 del 09 de Abril de 2026 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Ibagué la cantidad de 8,011galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 25 de abril del 2026.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 4210 de 2025
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Coordinador Contrato 3034 de 2026.
MARV 7

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 4210 de 2025
Gobernación del Tolima

ING. Stephanie Lara Hernández
Apoyo Supervisor del contrato 3034
de 2026. MARV 7

ING. Diana Marcela Gallego Campos
Apoyo Supervisor del contrato 3034
de 2026. MARV 7

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 130827
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
Exentos De Reteica Art 86 A
cdo 015 De 2021
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2026/04/25
Vencimiento:	2026/05/25
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 154985
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	OTI689
Kilometros:	206247
Hora Ini:	10:59:32
Hora Fin:	11:02:41
Combustible:	DIESEL
Volumen:	8.0110
Precio:	$11111
Total:	$89010
Panel:	MFA976
Lad/Man/Pos:	1/1/7
Dispositivo:	RBHAND283-02
Empleado:	DEVIA BUSTOS LEON
Validado:	ID Electronico

Entrego: IBAGUE

Recibi:

Henry Pol

Nombre:

689 OTI H07

1662

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOB-M-012A
CONTRATO 3034 DE 2026

GOBERNACION DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Ibagué
FECHA : 28/04/2026

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 4210 del 11 de Noviembre del 2025 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Coordinador del contrato 3034 del 09 de Abril de 2026 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Ibagué la cantidad de 34,278 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 28 de abril del 2026.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 4210 de 2025
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Coordinador Contrato 3034 de 2026.
MARV 7

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 4210 de 2025
Gobernación del Tolima

ING. Stephanie Lara Hernández
Apoyo Supervisor del contrato 3034
de 2026. MARV 7

ING. Diana Marcela Gallego Campos
Apoyo Supervisor del contrato 3034
de 2026. MARV 7

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta

No. REFK 131007

Distribucion y Transporte de C

NIT: 811.009.788-8

distracomeltriunfo

@distracom.com.co

Cod. Act. 4731

Somos Grandes Contribuyentes

Segun Res. No 000200

de 27 DIC 2024

Exentos De Reteica Art 86 A

cdo 015 De 2021

DISTRACOM EL TRIUNFO

CRA 1 #18 A 01

Ibague

TEL:3137434826

Fecha remision:	2026/04/28
Vencimiento:	2026/05/28
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 154985
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	OTI689
Kilometros:	206474
Cedula:	800113672
Hora Ini:	08:08:49
Hora Fin:	08:16:41
Combustible:	DIESEL
Volumen:	34.2780
Precio:	$11735
Total:	$402252
Panel:	MFA976
Lad/Man/Pos:	1/1/7
Dispositivo:	RBHAND283-02
Empleado:	FRANCY YOMARA ROD
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

OTI689 #61

IBAGUE

Nombre:

1664

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOB-M-012A
CONTRATO 3034 DE 2026

GOBERNACION DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Ibagué
FECHA : 30/04/2026

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 4210 del 11 de Noviembre del 2025 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Coordinador del contrato 3034 del 09 de Abril de 2026 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Ibagué la cantidad de 62,076 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 30 de abril del 2026.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 4210 de 2025
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Coordinador Contrato 3034 de 2026.
MARV 7

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 4210 de 2025
Gobernación del Tolima

ING. Stephanie Lara Hernández
Apoyo Supervisor del contrato 3034
de 2026. MARV 7

ING. Diana Marcela Gallego Campos
Apoyo Supervisor del contrato 3034
de 2026. MARV 7

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 131190
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
Agentes Retenedores de IVA A
rt. 437-2 E.T.NExentos De Re
teica Art 86 Acdo 015 De 20
21
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision: 2026/04/30
Vencimiento: 2026/05/30
Naturaleza: Credito

Cliente: GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 154985
Nit: 800113672
Direccion: CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: OTI689
Kilometros: 206851

Hora Ini: 14:01:06
Hora Fin: 14:05:55

Combustible: DIESEL
Volumen: 32.6070
Precio: $11735
Total: $382643

Panel: MFA976
Lad/Man/Pos: 1/1/7
Dispositivo: RBHAND283-01
Empleado: LUISA FERNANDA GA

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:
OTI 689 #01

Rocha

Nombre:

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 131178
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
Agentes Retenedores de IVA A
rt. 437-2 E.T.NExentos De Re
teica Art 86 Acdo 015 De 20
21
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision: 2026/04/30
Vencimiento: 2026/05/30
Naturaleza: Credito

Cliente: GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 154985
Nit: 800113672
Direccion: CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: FRENTE
Kilometros: 0
Cedula: 800113672

Hora Ini: 13:17:12
Hora Fin: 13:24:05

Combustible: DIESEL
Volumen: 29.4690
Precio: $11740
Total: $345966

Panel: MFC500
Lad/Man/Pos: 1/1/3
Dispositivo: RBHAND283-02
Empleado: DEVIA BUSTOS LEON

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:
