GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

FRENTE DE TRABAJO

ROVIRA

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

ABRIL DEL 2026

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

ABRIL 2026

OBJETO
CONTRATO NO.3034 DE 2026

"CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA".

FRENTE DE TRABAJO ROVIRA

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

ABRIL DEL 2026

INTEGRANTES

SUPERVISOR DE CAMPO
RETROEXCAVADORA #36
VOLQUETA #48

ING. STEPHANIE LARA
ALMILKAR SMITH
YIMMY RODRIGUEZ

FRENTE DE TRABAJO

ROVIRA

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

ABRIL DEL 2026

VIA INTERVENIDA

ROVIRA – RIOMANSO

FRENTE DE TRABAJO

ROVIRA

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

ABRIL DEL 2026

MAQUINARIA EN OPERACIÓN



FRENTE DE TRABAJO

ROVIRA

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

ABRIL DEL 2026

TOTAL ACTIVIDADES DE MATERIAL REALIZADAS EN ROVIRA

FECHA	MUNICIPIO	VOLUMEN DE MATERIAL (M3)
15/04/2026 al 30/04/2026	Rovira - Riomanso	350
TOTAL VOLUMEN INTERVENIDO		350 M3

FRENTE DE TRABAJO

ROVIRA

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

ABRIL DEL 2026

TOTAL ACTIVIDADES DE CONFORMACION REALIZADAS EN ROVIRA

FECHA	MUNICIPIO	CONFORMACION INTERVENIDA (M2)
15/04/2026 al 30/04/2026	Rovira - Riomanso	15000
TOTAL CONFORMACION INTERVENIDA		**15000 M2**

FRENTE DE TRABAJO

ROVIRA

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

ABRIL DEL 2026

TOTAL ACTIVIDADES DE CUNETA REALIZADAS EN ROVIRA

FECHA	MUNICIPIO	LONGITUD INTERVENIDO (ML)
15/04/2026 al 30/04/2026	Rovira - Riomanso	3000
TOTAL LONGITUD INTERVENIDOS		**3000 ML**

FRENTE DE TRABAJO

ROVIRA

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

ABRIL DEL 2026

TOTAL ACTIVIDADES REALIZADAS EN ROVIRA

TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA, COMPACTADO AL TRAFICO	KM
ROVIRA - RIOMANSO	3
TOTAL MEJORAMIENTO	**3 KM**

FRENTE DE TRABAJO

ROVIRA

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 7

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FRENTE DE TRABAJO ROVIRA

ABRIL 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	**CONTRATO NO.3034 DE 2026**	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

MUNICIPIO DE ROVIRA

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 22 DE ABRIL DEL 2026 AL 30 DE ABRIL DEL 2026

INFORME MENSUAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 3
3. LOCALIZACIÓN 4
4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 5
5. VIAS DEL MUNICIPIO 5
   5.1 SECTOR 1: 5
6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES 5
   6.1 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN 6
7. PERSONA, MAQUINARIA Y EQUIPO 6
   7.1 PERSONAL UTILIZADO 6
   7.2 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA 6
8. REGISTRO FOTOGRÁFICO 7
   8.1 ACTIVIDADES DE ROVIRA 7

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como objetivo dar a conocer los aspectos relevantes de la gestión de la maquinaria pesada y volquetas de la Gobernación del Tolima y la maquinaria de la unión nacional de gestión de riesgo de desastres, en la realización y atención de emergencias viales, puntos críticos y mantenimiento de la red vial del Municipio de Rovira – Tolima.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto a realizar consta del mantenimiento de puntos críticos de la red vial en la zona del Municipio de Rovira, con el kit de la maquinaria de la Gobernación del Tolima.

Se realizará el mantenimiento al tramo a intervenir y así proveer una superficie de rodamiento adecuada, con el fin de facilitar el diario vivir a la comunidad.


Esta es una obra que representa un gran aporte para la comunidad en los diferentes sectores, adicionalmente, en este caso no sólo se benefician los que actualmente residen cerca, sino que se favorece la capacidad para todos los propietarios de los municipios, teniendo en cuenta que es una zona de desarrollo agrícola y de crecimiento turístico.

3. LOCALIZACIÓN

El proyecto principalmente se encuentra ubicado en el país de Colombia oficialmente República de Colombia, es un país soberano situado en la región noroccidental de América del Sur que se encuentra constituido en un estado unitario, social y democrático de derecho cuya forma de gobierno es presidencialista. Es una república que está organizada políticamente en 32 departamentos descentralizados y el Distrito capital de Bogotá, sede del gobierno nacional.

En Colombia, exactamente en el departamento del Tolima que es uno de los treinta y dos departamentos que, junto con Bogotá, Distrito Capital, forman la República de Colombia. Su capital es Ibagué. Está ubicado en el centro-oeste del país, en la región andina, limitando al norte con Caldas, al este con Cundinamarca, al sur con Huila y Cauca, y al oeste con Valle del Cauca, Quindío y Risaralda. El río Magdalena atraviesa Tolima de sur a norte.

Rovira es un municipio, ubicado en el departamento del Tolima, sobre la margen del río Luisa entre los ríos Cuello y Cucuana. entre otras fuentes hídricas que lo hacen llamar (encanto de manantiales) por su gran diversidad de fuentes hídricas. Rovira limita Por el Norte con los municipios de Ibagué y Cajamarca, por el Oriente con los municipios de San Luis y Valle de San Juan, por el occidente con el municipio de Roncesvalles y por el Sur con los municipios de San Antonio y Ortega.

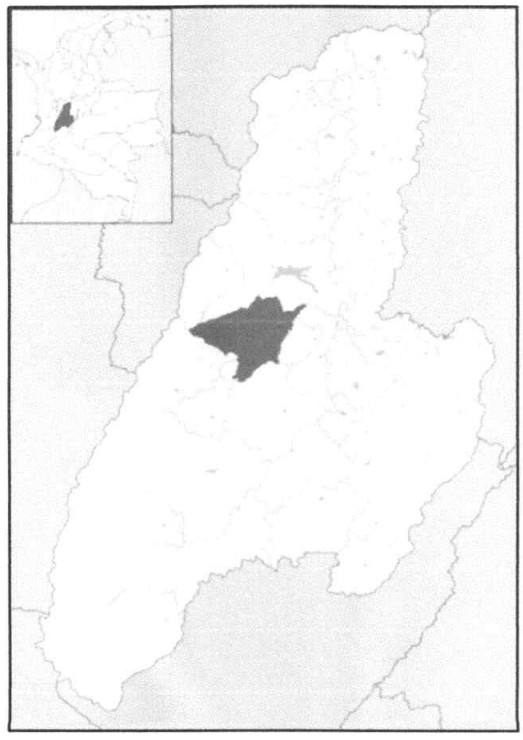

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

MANTEMINIENTO VIAL
Conformación de la red vía.
Atención de emergencias por deslizamientos

5. VIAS DEL MUNICIPIO

5.1 SECTOR 1:

El sector 1, es la zona de pastales, vía ubicada en la vía Rovira - Riomanso:

N°	DESCRIPCIÓN - VEREDA	KILOMETROS
1	Rovira - Riomanso	38

6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES

Durante el periodo comprendido se realizaron las actividades de mantenimiento, destinados primordialmente a la recuperación y conformación de la vía, limpieza mecánica y reconstrucción de cunetas, extensión de material de afirmado para la recuperación de la banca y remoción de derrumbes.

Se dio inicio a las actividades de mantenimiento con la maquinaria de la Gobernación (retroexcavadora y una volqueta), para realizar la adecuación a la carpeta de rodadura en diferentes puntos críticos en la vía Rovira - Riomanso.

Se realizo mejoramiento y conformación de la vía, limpieza mecánica y reconstrucción de cunetas, cargue y descargue de material de afirmado para la recuperación de la banca en el sector.

Para finalizar, en el periodo transcurrido del mes se conformó 3 km de vía y el estado del tiempo y las condiciones climáticas no fueron favorables y se registraron lluvias equivalentes a un total de 18 horas en el mes.

6.1 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

De conformidad con las actividades realizadas con el kit de maquinaria, Se han conformado 3 km sobre las vías correspondientes al municipio:

FECHA	MUNICIPIO	KILOMETROS INTERVENIDOS (KM)
DEL 15/04/2026 al 30/04/2026	Rovira - Riomanso	3
TOTAL KILOMETROS INTERVENIDOS		3 KM

7. PERSONA, MAQUINARIA Y EQUIPO

7.1 PERSONAL UTILIZADO

CARGO	PROFESION	NOMBRE
SUPERVISOR	INGENIERO CIVIL	STEPHANIE LARA
OPERARIO DE RETROEXCAVADORA	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	ALMILKAR SMITH
CONDUCTOR DE VOLQUETA	CONDUCTOR DE MAQUINARIA PESADA	YIMMY RODRIGUEZ

7.2 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

Para realizar las labores durante este periodo se empleó el kit de maquinaria pesada como:

MAQUINARIA	NUMERO	CANTIDAD
RETROEXCAVADORA	36	1
VOLQUETA	48	1

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

8.1 ACTIVIDADES DE ROVIRA



ROVIRA - RIOMANSO



ROVIRA - RIOMANSO

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



ROVIRA - RIOMANSO




ROVIRA - RIOMANSO

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



ROVIRA - RIOMANSO

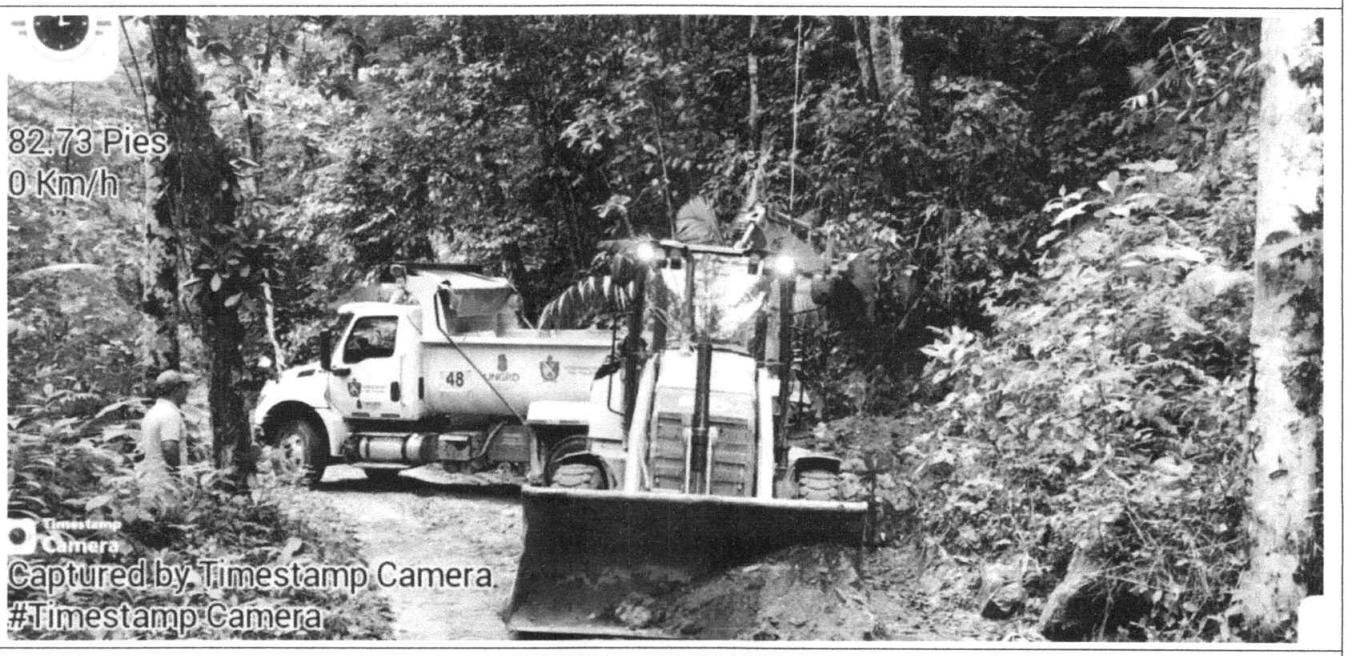

ROVIRA - RIOMANSO

SUPERVISOR DE CAMPO

VERSION 1	GOB-M-009	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO. 3034 DE 2026 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA INFORME DIARIO-TURNO	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CARRETERA: ROVIRA - RIOMANSO					MUNICIPIO: ROVIRA		
MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA, COMPACTADO AL TRAFICO					UNIDAD: M3		350
FECHA	ABSCISA		VOLQUETA No.	VOL. VIAJE	No. VIAJES	VOLUMEN	OBSERVACIONES
	DE	A					
15/04/2026	K0+000	K0+200	46	7	3	21	Se laboro Normalmente.
16/04/2026	K0+200	K0+400	46	7	4	28	Se laboro Normalmente.
17/04/2026	K0+400	K0+600	46	7	3	21	Se laboro Normalmente.
18/04/2026	K0+600	K0+800	46	7	3	21	Se laboro Normalmente.
19/04/2026	K0+800	K1+000	46	7	3	21	Se laboro Normalmente.
20/04/2026	K1+000	K1+200	46	7	2	14	Se laboro Normalmente.
21/04/2026	K1+200	K1+400	46	7	2	14	Se laboro Normalmente.
22/04/2026	K1+400	K1+600	46	7	3	21	Se laboro Normalmente.
23/04/2026	K1+600	K1+800	46	7	3	21	Se laboro Normalmente.
24/04/2026	K1+800	K2+000	46	7	6	42	Se laboro Normalmente.
25/04/2026	K2+000	K2+200	46	7	5	35	Se laboro Normalmente.
27/04/2026	K2+200	K2+400	46	7	5	35	Se laboro Normalmente.
28/04/2026	K2+400	K2+600	46	7	3	21	Se laboro Normalmente.
29/04/2026	K2+600	K2+800	46	7	3	21	Se laboro Normalmente.
30/04/2026	K2+800	K3+000	46	7	2	14	Se laboro Normalmente.
TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA						350	
TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA, COMPACTADO AL TRAFICO						350	

Vo.Bo. Supervisora contrato 3034 DE 2026

Firma:
Nombre: Stephanie Lara H
c.c. 1.110.534.065

Vo.Bo. Coordinador contrato 3034 DE 2026

Firma:
Nombre: Jeison Giovanni Alvis L
c.c. 1.110.512.907

VERSION 1	GOB-M-009	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	**CONTRATO NO. 3034 DE 2026** CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA **INFORME DIARIO-TURNO**	GOBERNACION DEL TOLIMA

CARRETERA: ROVIRA - RIOMANSO | **MUNICIPIO: ROVIRA**

CONFORMACION DE LA VIA SIN COMPACTAR	UNIDAD: M2	15.000

FECHA	ABSCISA		LONGITUD	ANCHO	AREA	OBSERVACIONES
	DE	A				
15/04/2026	K0+000	K0+200	200	5	1.000	Se laboro Normalmente.
16/04/2026	K0+200	K0+400	200	5	1.000	Se laboro Normalmente.
17/04/2026	K0+400	K0+600	200	5	1.000	Se laboro Normalmente.
18/04/2026	K0+600	K0+800	200	5	1.000	Se laboro Normalmente.
19/04/2026	K0+800	K1+000	200	5	1.000	Se laboro Normalmente.
20/04/2026	K1+000	K1+200	200	5	1.000	Se laboro Normalmente.
21/04/2026	K1+200	K1+400	200	5	1.000	Se laboro Normalmente.
22/04/2026	K1+400	K1+600	200	5	1.000	Se laboro Normalmente.
23/04/2026	K1+600	K1+800	200	5	1.000	Se laboro Normalmente.
24/04/2026	K1+800	K2+000	200	5	1.000	Se laboro Normalmente.
25/04/2026	K2+000	K2+200	200	5	1.000	Se laboro Normalmente.
27/04/2026	K2+200	K2+400	200	5	1.000	Se laboro Normalmente.
28/04/2026	K2+400	K2+600	200	5	1.000	Se laboro Normalmente.
29/04/2026	K2+600	K2+800	200	5	1.000	Se laboro Normalmente.
30/04/2026	K2+800	K3+000	200	5	1.000	Se laboro Normalmente.
TOTAL CONFORMACION DE LA VIA					**15.000**	
TOTAL CONFORMACION DE LA VIA SIN COMPACTAR					**15.000**	

Vo.Bo. Supervisora contrato 3034 DE 2026

Firma: _____

Nombre: Stephanie Lara H

c.c. 1.110.534.065

Vo.Bo. Coordinador contrato 3034 DE 2026

Firma: _____

Nombre: Jeison Giovanni Alvis L

c.c. 1.110.512.907

VERSION 1	GOB-M-009	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO. 3034 DE 2026 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA INFORME DIARIO-TURNO	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CARRETERA: ROVIRA - RIOMANSO — **MUNICIPIO: ROVIRA**

CONFORMACION DE CUNETAS — **UNIDAD: ML** — **2.000**

FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	LONGITUD	N° CARRILES	LONGITUD TOTAL	OBSERVACIONES
15/04/2026	K0+000	K0+200	200	1	200	Se laboro Normalmente.
16/04/2026	K0+200	K0+400	200	1	200	Se laboro Normalmente.
17/04/2026	K0+400	K0+600	200	1	200	Se laboro Normalmente.
18/04/2026	K0+600	K0+800	200	1	200	Se laboro Normalmente.
19/04/2026	K0+800	K1+000	200	1	200	Se laboro Normalmente.
20/04/2026	K1+000	K1+200	200	1	200	Se laboro Normalmente.
21/04/2026	K1+200	K1+400	200	1	200	Se laboro Normalmente.
22/04/2026	K1+400	K1+600	200	1	200	Se laboro Normalmente.
23/04/2026	K1+600	K1+800	200	1	200	Se laboro Normalmente.
24/04/2026	K1+800	K2+000	200	1	200	Se laboro Normalmente.
25/04/2026	K2+000	K2+200	200	1	200	Se laboro Normalmente.
27/04/2026	K2+200	K2+400	200	1	200	Se laboro Normalmente.
28/04/2026	K2+400	K2+600	200	1	200	Se laboro Normalmente.
29/04/2026	K2+600	K2+800	200	1	200	Se laboro Normalmente.
30/04/2026	K2+800	K3+000	200	1	200	Se laboro Normalmente.
TOTAL CONFORMACION DE CUNETAS					**2.000**	
TOTAL CONFORMACION DE CUNETAS					**2.000**	

Vo.Bo. Supervisora contrato 3034 DE 2026

Firma:
Nombre: Stephanie Lara H
c.c. 1.110.534.065

Vo.Bo. Coordinador contrato 3034 DE 2026

Firma:
Nombre: Jeison Giovanni Alvis L
c.c. 1.110.512.907

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 7

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

ACTAS DE COMUNIDAD

FRENTE DE TRABAJO ROVIRA

ABRIL 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOB-M-007
CONTRATO 3034 DE 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

ACTA DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO

CONTRATO No. : 3034 DE ABRIL DE 2026

OBJETO: ***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA.***

MUNICIPIO: Rovira.
VEREDA: Reventon.

A los día(s) 15 del mes de Abril de 20 26, se reunieron el Sr (a) Jason G. Abril Lozano como Inspector vial, en representación de **MARV 7** Y el señor (a) Jairo Justinico. en representación de la(s) Comunidad(es) beneficiada(s), con el objeto de informar a los beneficiarios los mantenimientos viales a ejecutar con los aportes asignados por parte de La Gobernación del Tolima.

En constancia de lo anterior se firma por quienes en ella intervinieron:

Representante de la(s) Comunidad(es).
C.C.No. 14.013.020

Inspector Contrato 3034 de 2026
MARV 7 1110512907.
C.C.No.

Nombre de la vía Rovira - Reventon

Fecha: 15/04/26

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 7

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

PREOPERACIONALES EQUIPO

FRENTE DE TRABAJO ROVIRA

ABRIL 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

PERIODO: 27 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2026

CONTRATO	3034 DE 2026	**PLACA: PXS 694**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	48	**MODELO: 2024**	**FRENTE DE TRABAJO: ROVIRA -RIOMANSO**
INSPECCIONADO POR:	ING. STEPHANIE LARA		**LOCALIZACION: ROVIRA**
Licencia de conduccion:			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00		7:00								
	KILOMETRAJE INICIAL	5078		5098		5118		5138								
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		OBSERVACIONES
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X		X								
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X								
	Caja de Herramienta	X		X		X		X								
	Tacos	X		X		X		X								
	Gato	X		X		X		X								
	Linterna recargable	X		X		X		X								
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X								
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X								
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X								
	Nivel del aceite	X		X		X		X								
	Soportes motor	X		X		X		X								
	Estado del exhosto	X		X		X		X								
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X								
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X								
	De trabajo traseras	X		X		X		X								
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X								
	Stop Traseros	X		X		X		X								
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X								
	Espejos laterales	X		X		X		X								
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X								
	Pito Normal	X		X		X		X								
	Frenos de Servicio	X		X		X		X								
	Freno de emergencia	X		X		X		X								
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X								
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X								
	Estado de la puertas	X		X		X		X								
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X								
	Limpia brisas	X		X		X		X								
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X								
	Estado de los asientos	X		X		X		X								
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X								
	Velocímetro	X		X		X		X								
	Batería y cables	X		X		X		X								
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X								
	Repuesto	X		X		X		X								
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X								
	Estado de correas	X		X		X		X								
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X								
	Radiador	X		X		X		X								
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X								
	Mangueras	X		X		X		X								
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X								
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X								
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X								
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X								
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X								
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00		5:00								
	KILOMETRAJE FINAL	5098		5118		5138		5157								

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:**
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1 | GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 3034 DE 2026 | **MODELO:** RETRO 36 | **MARCA:** CATERPILLAR

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA | **LOCALIZACION:** ROVIRA - RIOMANSO | **FRENTE DE TRABAJO:** ROVIRA

PERIODO: 22 DE ABRIL AL 25 DE ABRIL 2026 | **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL					4405		4411		4417		4422			
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2					X		X		X		X			
	* De trabajo delanteras	2					X		X		X		X			
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2					X		X		X		X			
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2					X		X		X		X			
	* De stop y señal trasera	2					X		X		X		X			
	* De trabajo traseras	2					X		X		X		X			
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1					X		X		X		X			
	* Cinturón de seguridad	1					X		X		X		X			
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1					X		X		X		X			
	Asiento (dispositivo de giro)	1					X		X		X		X			
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos					X		X		X		X			
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1					X		X		X		X			
	Alarma de retroceso	1					X		X		X		X			
	Escaleras y apoyos de acceso	2					X		X		X		X			
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1					X		X		X		X			
	Palancas de mando	2					X		X		X		X			
	Pedales	Todos					X		X		X		X			
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo					X		X		X		X			
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos					X		X		X		X			
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos					X		X		X		X			
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2					X		X		X		X			
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1					X		X		X		X			
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas					X		X		X		X			
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas					X		X		X		X			
	* Freno de emergencia en buen estado	1					X		X		X		X			
	Estado general (desgarrador/balde)	2					X		X		X		X			
	Mandos de levante del brazo	2					X		X		X		X			
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos					X		X		X		X			
	Compartimiento del motor aseado	Completo					X		X		X		X			
	Sistema de Dirección	1					X		X		X		X			
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas						X		X		X		X			
	* Huellas en buen estado	4					X		X		X		X			
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL						4411		4417		4422		4428			
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:						Amilkar P		Amilkar P		Amilkar P		Amilkar P			
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1 | GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 3034 DE 2026 | MODELO: RETRO 36 | MARCA: CATERPILLAR

INSPECCIONADO POR: ING. STEPHANIE LARA | LOCALIZACION: ROVIRA - RIOMANSO | FRENTE DE TRABAJO: ROVIRA

PERIODO: 27 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2026 | FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	4428		4434		4440		4445							
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X							
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X							
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X							
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X							
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X							
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X							
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X							
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X							
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X							
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X							
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X							
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X							
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X							
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X							
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X							
	Palancas de mando	2	X		X		X		X							
	Pedales	Todos	X		X		X		X							
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X							
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X							
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X		X							
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X							
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X		X							
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X							
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X							
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X							
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X		X							
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X		X							
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X							
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X							
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X							
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X							
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X							
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		4434		4440		4445		4451							
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:		Amilkar P		Amilkar P		Amilkar P		Amilkar P							
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 7

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

FRENTE DE TRABAJO ROVIRA

ABRIL 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

FRENTE ROVIRA2 KIT								
#.ORDEN	DIA	HORA	RECIBO	GLS	TOTAL	ESTACION SERVICIO	OBSERVACIONES	FRENTE
74	20-abr-26	14:04:48	130506	**121,387**	$ 1.348.731,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Trasporto V#9	FRENTE ROVIRA 2 KIT

TOTAL MES	121,387
TOTAL ACPM	121,387

CONSUMO MES	61,387
REMANENTE PARA MAYO	60,000

VERSION 1	GOB-M-014	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO. 3034 DE 2026 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIARIO EN TURNO

TURNO: DIURNO **DEL** 22 DE ABRIL **AL** 30 DE ABRIL 2026

MUNICIPIO: ROVIRA **VEREDA :** ROVIRA - RIOMANSO **COORDINADOR:** JEISON ALVIS

VIA: ROVIRA - RIOMANSO

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE DEL OPERADOR	LUNES(13)		MARTES (14)		MIERCOLES (15)		JUEVES(16)		VIERNES(17)		SABADO(18)		DOMINGO (19)		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	RETROEXCAVADORA	36	AMILKAR SMITH															0,000
2	VOLQUETA	48	YIMMYU RODRIGUEZ															0,000
3																		0,000
4																		0,000
5																		0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (20)		MARTES (21)		MIERCOLES (22)		JUEVES (23)		VIERNES (24)		SABADO (25)		DOMINGO (26)		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	RETROEXCAVADORA	36	AMILKAR SMITH															0,000
2	VOLQUETA	48	YIMMYU RODRIGUEZ															0,000
3																		0,000
4																		0,000
5																		0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES(27)		MARTES(28)		MIERCOLES(29)		JUEVES(30)		VIERNES( )		SABADO( )		DOMINGO ( )		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	RETROEXCAVADORA	36	AMILKAR SMITH	30	Amilkar													30,000
2	VOLQUETA	48	YIMMYU RODRIGUEZ	31,387														31,387
3																		0,000
4																		0,000
5																		0,000

61,387

OBSERVACIONES: Se trasladan 60 gl para el mes de mayo.

VoBo SUPERVISOR (A): _____

VoBo COORDINADOR: _____

FRENTE DE TRABAJO ROVIRA					
MES ABRIL 2026					
Maquina	N° Interno	Consumo Mensual ACPM (GL)	Kilometraje/Horometro Inicial	Kilometraje/Horometro Final	Promedio Consumo (Hr/Km x GL)
RETROEXCAVADORA	36	30,000	4405	4451	0,65
VOLQUETA	48	31,387	5078	5157	0,40
		61,387			

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOB-M-012A
CONTRATO 3034 DE 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Rovira (2 kit)
FECHA : 20/04/2026

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 4210 del 11 de Noviembre del 2025 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Coordinador del contrato 3034 del 09 de Abril de 2026 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Rovira (2 kit) la cantidad de 121,387 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 20 de abril del 2026.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 4210 de 2025
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Coordinador Contrato 3034 de 2026.
MARV 7

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 4210 de 2025
Gobernación del Tolima

ING. Stephanie Lara Hernández
Apoyo Supervisor del contrato 3034
de 2026. MARV 7

ING. Diana Marcela Gallego Campos
Apoyo Supervisor del contrato 3034
de 2026. MARV 7

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 130506
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
Exentos De Reteica Art 86 A
cdo 015 De 2021
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision: 2026/04/20
Vencimiento: 2026/05/20
Naturaleza: Credito

Cliente: GOBERNACION DEL TOL
Contrato: OC 154985
Nit: 800113672
Direccion: CR 3 CL 11 ED GO
Telefono: 2611616
Placa: RONSES
Kilometros: 0
Cedula: 800113672

Hora Ini: 14:04:48
Hora Fin: 14:15:03

Combustible: DIESEL
Volumen: 121.3870
Precio: $11111
Total: $1348731

Panel: MFA976
Lad/Man/Pos: 2/1/8
Dispositivo: RBHAND283-02
Empleado: DEVIA BUSTOS LEON
Emp. Apoyo: BRYAN ALEXANDER MO

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:
