GOBERNACIÓN
DEL TOLIMA

FRENTE DE TRABAJO

NATAGAIMA

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

MAYO DEL 2026

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

MAYO DEL 2026

OBJETO
CONTRATO NO.3034 DE 2026

"CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA".

FRENTE DE TRABAJO NATAGAIMA

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

MAYO DEL 2026

INTEGRANTES

SUPERVISOR DE CAMPO	ING. DIANA GALLEGO
RETROEXCAVADORA NUEVA #11	ARTURO GOMEZ
VOLQUETA #37	JULIO CESAR BARRAGAN

FRENTE DE TRABAJO NATAGAIMA

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

MAYO DEL 2026

VIA INTERVENIDA

NATAGAIMA: EL PALMAR-SAN MIGUEL

FRENTE DE TRABAJO NATAGAIMA

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

MAYO DEL 2026

MAQUINARIA EN OPERACIÓN





FRENTE DE TRABAJO NATAGAIMA

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

MAYO DEL 2026

TOTAL, ACTIVIDADES REALIZADAS NATAGAIMA: EL PALMAR-SAN MIGUEL MEJORAMIENTO DE VÍA CON MATERIAL DE LA ZONA

FECHA	ABSCISA		VOLQUETA No.	VOL. VIAJE	No. VIAJES	VOLUMEN
	DE	A				
05/05/2026	K0+000	K0+192	37	7	4	28
06/05/2026	K0+192	K0+384	37	7	4	28
07/05/2026	K0+384	K0+576	37	7	4	28
08/05/2026	K0+576	K0+768	37	7	4	28
11/05/2026	K0+768	K0+960	37	7	4	28
12/05/2026	K0+960	K1+152	37	7	4	28
13/05/2026	K1+152	K1+344	37	7	4	28
14/05/2026	K1+344	K1+536	37	7	4	28
15/05/2026	K1+536	K1+728	37	7	4	28
20/05/2026	K1+728	K1+920	37	7	4	28
21/05/2026	K1+920	K2+112	37	7	4	28
25/05/2026	K2+112	K2+304	37	7	4	28
26/05/2026	K2+304	K2+500	37	7	4	28
TOTAL, MEJORAMIENTO DE LA VIA						364

FRENTE DE TRABAJO NATAGAIMA

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

MAYO DEL 2026

TOTAL, ACTIVIDADES REALIZADAS

MUNICIPIO	KILOMETROS (KM)
NATAGAIMA: EL PALMAR-SAN MIGUEL	2,5
TOTAL, MEJORAMIENTO DE LA VÍA	**2,5 KM**

FRENTE DE TRABAJO NATAGAIMA

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 7

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FRENTE DE TRABAJO NATAGAIMA

MAYO 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACION DEL TOLIMA

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

MUNICIPIO DE NATAGAIMA

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 05 DE MAYO AL 26 DE MAYO DEL 2026

INFORME MENSUAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 3
3. LOCALIZACIÓN 4
4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 5
5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES 5
   5.1 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN 5
6. PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO 6
   6.1 PERSONAL UTILIZADO 6
   6.2 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA 6
7. REGISTRO FOTOGRÁFICO 7
   7.1 NATAGAIMA: EL PALMAR-SAN MIGUEL 7

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como objetivo dar a conocer los aspectos relevantes de la gestión de la maquinaria pesada y volquetas de la Gobernación del Tolima y la maquinaria de la unión nacional de gestión de riesgo de desastres, en la realización y atención de emergencias viales, puntos críticos y mantenimiento de la red vial del Municipio de Natagaima – Tolima.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto a realizar consta del mantenimiento de puntos críticos de la red vial en la zona del Municipio de Natagaima, con el kit de la maquinaria de la Gobernación del Tolima.

Se realizará el mantenimiento al tramo a intervenir y así proveer una superficie de rodamiento adecuada, con el fin de facilitar el diario vivir a la comunidad.


Esta es una obra que representa un gran aporte para la comunidad en los diferentes sectores, adicionalmente, en este caso no sólo se benefician los que actualmente residen cerca, sino que se favorece la capacidad para todos los propietarios de los municipios, teniendo en cuenta que es una zona de desarrollo agrícola y de crecimiento turístico.

3. LOCALIZACIÓN

El proyecto principalmente se encuentra ubicado en el país de Colombia oficialmente República de Colombia, es un país soberano situado en la región noroccidental de América del Sur que se encuentra constituido en un estado unitario, social y democrático de derecho cuya forma de gobierno es presidencialista. Es una república que está organizada políticamente en 32 departamentos descentralizados y el Distrito capital de Bogotá, sede del gobierno nacional.

En Colombia, exactamente en el departamento del Tolima que es uno de los treinta y dos departamentos que, junto con Bogotá, Distrito Capital, forman la República de Colombia. Su capital es Ibagué. Está ubicado en el centro-oeste del país, en la región andina, limitando al norte con Caldas, al este con Cundinamarca, al sur con Huila y Cauca, y al oeste con Valle del Cauca, Quindío y Risaralda. El río Magdalena atraviesa Tolima de sur a norte.

Natagaima es un municipio de Colombia al sur del departamento del Tolima, se encuentra a 121 kms de Ibagué, la capital del departamento. Su economía se basa principalmente en la agricultura, la ganadería y las actividades de servicio social y personal. Cuenta con un clima tropical cálido de montaña, se encuentra a una altitud de 326 msnm y la temperatura promedio es de 30°C y en verano de 46°C.

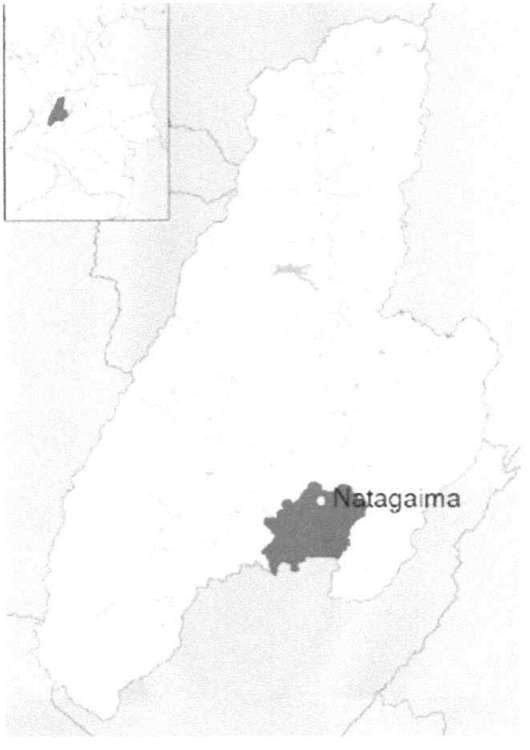

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

MANTEMINIENTO VIAL
Conformación de la red vía.

5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES

Durante el periodo comprendido se atendieron puntos críticos específicamente en las veredas del municipio; también se realizó la actividad de mantenimiento, destinados primordialmente a la conformación, limpieza mecánica y de alcantarillas en la vía, extensión de material de la zona; estas actividades se realizaron con el apoyo de maquinaria por parte de la Alcaldía del municipio y por parte de la Gobernación del departamento (una retroexcavadora y una volqueta).

Cabe mencionar que todas las actividades mencionadas anteriormente son se suma importancia para restablecer el tránsito vehicular, beneficio que se brinda tanto a la comunidad y el poder transportar sus productos.

Para finalizar, en el periodo transcurrido del mes se conformaron 2,5 km correspondientes a las veredas de El Palmar y San Miguel correspondientes al municipio; el estado del tiempo y las condiciones climáticas no fueron favorables y se registraron un total de 10 horas de lluvia en la zona.

5.1 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

De conformidad con las actividades realizadas se conformaron 2,5 km sobre las vías correspondientes al municipio de Natagaima:

FECHA	MUNICIPIO	KILOMETROS INTERVENIDOS (KM)
Del 05/05/2026 al 26/05/2026	NATAGAIMA: EL PALMAR-SAN MIGUEL	2,5
TOTAL, KILOMETROS INTERVENIDOS		2,5 KM

6. PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO

6.1 PERSONAL UTILIZADO

CARGO	PROFESION	NOMBRE
SUPERVISOR	INGENIERO CIVIL	DIANA GALLEGO
OPERARIO DE RETROEXCAVADORA	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	ARTURO GOMEZ
CONDUCTOR DE VOLQUETA	CONDUCTOR DE MAQUINARIA PESADA	JULIO CESAR BARRAGAN

6.2 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

Para realizar las labores durante este periodo se empleó el kit de maquinaria pesada como:

MAQUINARIA	NUMERO	CANTIDAD
RETROEXCAVADORA	NUEVA #11	1
VOLQUETA	37	1

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO

7.1 NATAGAIMA: EL PALMAR-SAN MIGUEL





EL PALMAR-SAN MIGUEL






EL PALMAR-SAN MIGUEL

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



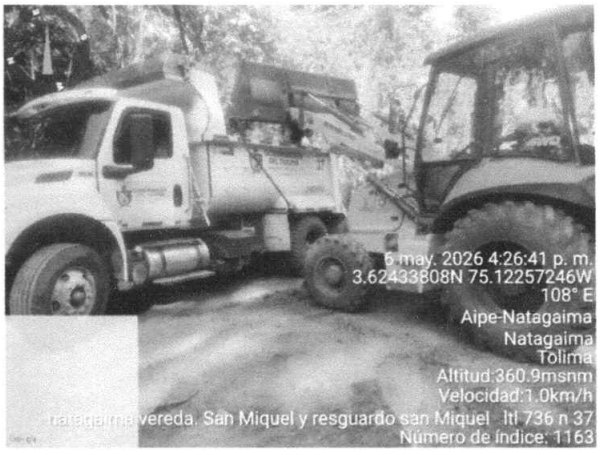


EL PALMAR-SAN MIGUEL






EL PALMAR-SAN MIGUEL

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

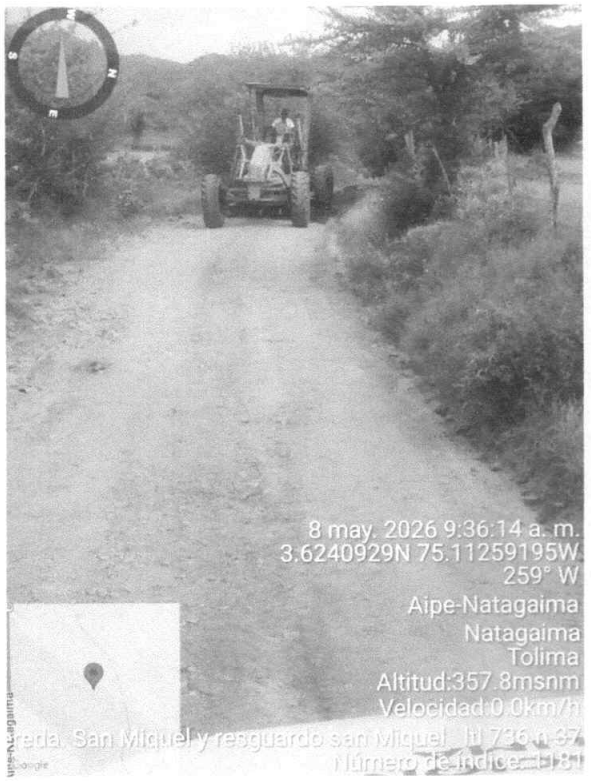

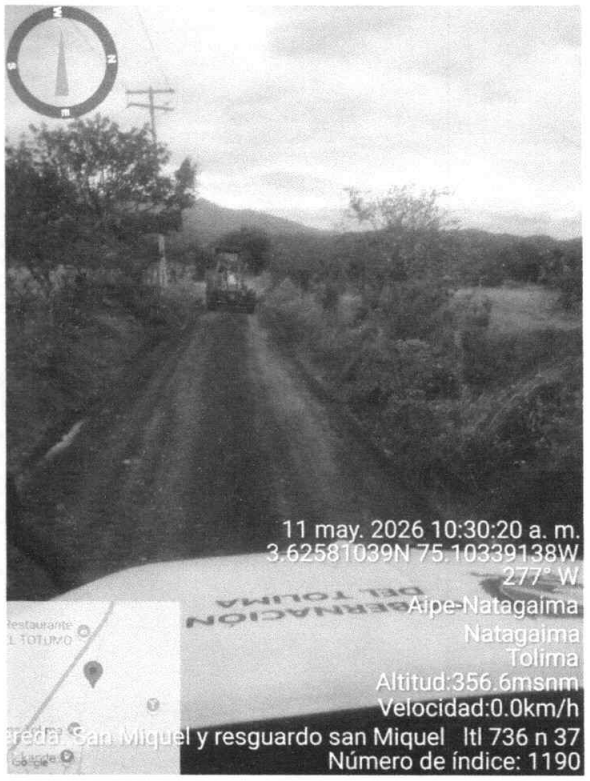

EL PALMAR-SAN MIGUEL





EL PALMAR-SAN MIGUEL

UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA





EL PALMAR-SAN MIGUEL





EL PALMAR-SAN MIGUEL

Diana Gallego

DIANA MARCELA GALLEGO CAMPOS

SUPERVISORA DE CAMPO

3180

VERSION 1	GOB-M-009	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO. 3034 DE 2026 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE INFORME DIARIO-TURNO	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CARRETERA: EL PALMAR-SAN MIGUEL — **MUNICIPIO: NATAGAIMA**

MEJORAMIENTO DE LA VIA CON MATERIAL DE LA ZONA — **UNIDAD: M3** — **364**

FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	VOLQUETA No.	VOL. VIAJE	No. VIAJES	VOLUMEN	OBSERVACIONES
05/05/2026	K0+000	K0+192	37	7	4	28	Se laboro Normalmente.
06/05/2026	K0+192	K0+384	37	7	4	28	Se laboro Normalmente.
07/05/2026	K0+384	K0+576	37	7	4	28	Se laboro Normalmente.
08/05/2026	K0+576	K0+768	37	7	4	28	Se laboro Normalmente.
11/05/2026	K0+768	K0+960	37	7	4	28	Se laboro Normalmente.
12/05/2026	K0+960	K1+152	37	7	4	28	Se laboro Normalmente.
13/05/2026	K1+152	K1+344	37	7	4	28	Se laboro Normalmente.
14/05/2026	K1+344	K1+536	37	7	4	28	Se laboro Normalmente.
15/05/2026	K1+536	K1+728	37	7	4	28	Se laboro Normalmente.
20/05/2026	K1+728	K1+920	37	7	4	28	Se laboro Normalmente.
21/05/2026	K1+920	K2+112	37	7	4	28	Se laboro Normalmente.
25/05/2026	K2+112	K2+304	37	7	4	28	Se laboro Normalmente.
26/05/2026	K2+304	K2+500	37	7	4	28	Se laboro Normalmente.
TOTAL MEJORAMIENTO DE LA VIA						**364**	
ZONA						**364**	

Vo.Bo. Supervisora contrato 3034 DE 2026
Firma:
Nombre: Diana M. Gallego C.
c.c. 38.210.237

Vo.Bo. Coordinador contrato 3034 DE 2026
Firma:
Nombre: Jeison Giovanni Alvis L
c.c. 1.110.512.907

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 7

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

ACTAS DE COMUNIDAD

FRENTE DE TRABAJO NATAGAIMA

MAYO 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 7

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

PREOPERACIONALES EQUIPO

FRENTE DE TRABAJO NATAGAIMA

MAYO 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

3281

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

PERIODO: 05 DE MAYO AL 08 DE MAYO 2026

CONTRATO	3034 DE 2026	PLACA: LTL 736	MARCA: INTERNATIONAL
EQUIPO No.	37	MODELO: 2024	FRENTE DE TRABAJO: NATAGAIMA
INSPECCIONADO POR:	ING. DIANA GALLEGO		LOCALIZACION: EL PALMAR-SAN MIGUEL
Licencia de conduccion:			Póliza de Responsabilidad Civil:
Licencia de transito No.	C2	Última Revisión Tecnicomecanica:	

	HORA INICIO OPERACIÓN			7:00		7:00		7:00		7:00						
				50373		50476		50508		50542						
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		OBSERVACIONES
ÍTEM	ELEMENTOS A CONTROLAR	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín				X		X		X		X					
	Kit de contingencia según listado adjunto				X		X		X		X					
	Caja de Herramienta				X		X		X		X					
	Tacos				X		X		X		X					
	Gato				X		X		X		X					
	Linterna recargable				X		X		X		X					
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina				X		X		X		X					
ESTADO GENERAL	Estado del motor			X		X		X		X						
	Estado del Tanque de combustible			X		X		X		X						
	Nivel del aceite			X		X		X		X						
	Soportes motor			X		X		X		X						
	Estado del exhosto			X		X		X		X						
	Estado del switche de encendido			X		X		X		X						
LUCES	De Trabajo delanteras			X		X		X		X						
	De trabajo traseras			X		X		X		X						
	Direccionales Delanteras Y Traseras			X		X		X		X						
	Stop Traseros			X		X		X		X						
CABINA	Espejo Retrovisor			X		X		X		X						
	Espejos laterales			X		X		X		X						
	Alarma (o pito) de Retroceso			X		X		X		X						
	Pito Normal			X		X		X		X						
	Frenos de Servicio			X		X		X		X						
	Freno de emergencia			X		X		X		X						
	Dirección/suspensión(Terminales).			X		X		X		X						
	Cinturones de Seguridad			X		X		X		X						
	Estado de la puertas			X		X		X		X						
	Vidrio frontal en buen estado.			X		X		X		X						
	Limpia brisas			X		X		X		X						
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco			X		X		X		X						
	Estado de los asientos			X		X		X		X						
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).			X		X		X		X						
	Velocímetro			X		X		X		X						
	Batería y cables			X		X		X		X						
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos			X		X		X		X						
	Repuesto			X		X		X		X						
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas			X		X		X		X						
	Estado de correas			X		X		X		X						
	Caja de cambios en buen estado.			X		X		X		X						
	Radiador			X		X		X		X						
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)			X		X		X		X						
	Mangueras			X		X		X		X						
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)			X		X		X		X						
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco			X		X		X		X						
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco			X		X		X		X						
	tornillos de seguridad para el cierre del volco			X		X		X		X						
	Estado de empaques del volco			X		X		X		X						
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN			5:00		5:00		5:00		5:00						
	KILOMETRAJE FINAL			50476		50508		50542		50576						

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	Firma Verificación Inspector:	Diana Gallego
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	El Equipo esta apto para Trabajar:	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	

PERIODO: 11 DE MAYO AL 15 DE MAYO 2026

CONTRATO	3034 DE 2026	**PLACA: LTL 736**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	37	**MODELO: 2024**	**FRENTE DE TRABAJO: NATAGAIMA**
INSPECCIONADO POR:	ING. DIANA GALLEGO		**LOCALIZACION: EL PALMAR-SAN MIGUEL**
Licencia de conduccion:			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00		7:00		7:00						
		50576		50638		50718		50734		50862						
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		OBSERVACIONES
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín		X		X		X		X		X					
	Kit de contingencia según listado adjunto		X		X		X		X		X					
	Caja de Herramienta		X		X		X		X		X					
	Tacos		X		X		X		X		X					
	Gato		X		X		X		X		X					
	Linterna recargable		X		X		X		X		X					
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina		X		X		X		X		X					
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X		X						
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X		X						
	Nivel del aceite	X		X		X		X		X						
	Soportes motor	X		X		X		X		X						
	Estado del exhosto	X		X		X		X		X						
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X		X						
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X						
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X						
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X		X						
	Stop Traseros	X		X		X		X		X						
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X		X						
	Espejos laterales	X		X		X		X		X						
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X		X						
	Pito Normal	X		X		X		X		X						
	Frenos de Servicio	X		X		X		X		X						
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X						
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X						
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X						
	Estado de la puertas	X		X		X		X		X						
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X						
	Limpia brisas	X		X		X		X		X						
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X		X						
	Estado de los asientos	X		X		X		X		X						
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X		X						
	Velocímetro	X		X		X		X		X						
	Batería y cables	X		X		X		X		X						
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X						
	Repuesto	X		X		X		X		X						
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X						
	Estado de correas	X		X		X		X		X						
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X						
	Radiador	X		X		X		X		X						
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X						
	Mangueras	X		X		X		X		X						
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X		X						
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X		X						
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X		X						
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X		X						
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X		X						
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00		5:00		5:00						
	KILOMETRAJE FINAL	50638		50718		50734		50862		50875						

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	**Firma Verificación Inspector:**	Diana Gallego
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI (X) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

3283

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACION DEL TOLIMA

PERIODO: 20 DE MAYO AL 21 DE MAYO 2026

CONTRATO	3034 DE 2026	**PLACA: LTL 736**	**MARCA:** INTERNATIONAL
EQUIPO No.	37	**MODELO: 2024**	**FRENTE DE TRABAJO: NATAGAIMA**
INSPECCIONADO POR:	ING. DIANA GALLEGO		**LOCALIZACION: EL PALMAR-SAN MIGUEL**
Licencia de conduccion:			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN					7:00		7:00								
						51031		51230								
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		OBSERVACIONES
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín						X		X							
	Kit de contingencia según listado adjunto						X		X							
	Caja de Herramienta						X		X							
	Tacos						X		X							
	Gato						X		X							
	Linterna recargable						X		X							
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina						X		X							
ESTADO GENERAL	Estado del motor					X		X								
	Estado del Tanque de combustible					X		X								
	Nivel del aceite					X		X								
	Soportes motor					X		X								
	Estado del exhosto					X		X								
	Estado del switche de encendido					X		X								
LUCES	De Trabajo delanteras					X		X								
	De trabajo traseras					X		X								
	Direccionales Delanteras Y Traseras					X		X								
	Stop Traseros					X		X								
CABINA	Espejo Retrovisor					X		X								
	Espejos laterales					X		X								
	Alarma (o pito) de Retroceso					X		X								
	Pito Normal					X		X								
	Frenos de Servicio					X		X								
	Freno de emergencia					X		X								
	Dirección/suspensión(Terminales).					X		X								
	Cinturones de Seguridad					X		X								
	Estado de la puertas					X		X								
	Vidrio frontal en buen estado.					X		X								
	Limpia brisas					X		X								
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco					X		X								
	Estado de los asientos					X		X								
	Indicadores (Hidráulico - voltimetro-Refrigerante, aire).					X		X								
	Velocímetro					X		X								
	Batería y cables					X		X								
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos					X		X								
	Repuesto					X		X								
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas					X		X								
	Estado de correas					X		X								
	Caja de cambios en buen estado.					X		X								
	Radiador					X		X								
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)					X		X								
	Mangueras					X		X								
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)					X		X								
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco					X		X								
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco					X		X								
	tornillos de seguridad para el cierre del volco					X		X								
	Estado de empaques del volco					X		X								
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN					5:00		5:00								
	KILOMETRAJE FINAL					51230		51312								

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	**Firma Verificación Inspector:**	Diana Gallego
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI (X) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

3284

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

PERIODO: 25 DE MAYO AL 26 DE MAYO 2026

CONTRATO	3034 DE 2026	PLACA: LTL 736	MARCA: INTERNATIONAL
EQUIPO No.	37	MODELO: 2024	FRENTE DE TRABAJO: NATAGAIMA
INSPECCIONADO POR:	ING. DIANA GALLEGO		LOCALIZACION: EL PALMAR-SAN MIGUEL
Licencia de conduccion:			Póliza de Responsabilidad Civil:
Licencia de transito No.	C2	Última Revisión Tecnicomecanica:	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00													
		51312		51394													
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		OBSERVACIONES	
ÍTEM	ELEMENTOS A CONTROLAR	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M		
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín		X		X												
	Kit de contingencia según listado adjunto		X		X												
	Caja de Herramienta		X		X												
	Tacos		X		X												
	Gato		X		X												
	Linterna recargable		X		X												
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina		X		X												
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X													
	Estado del Tanque de combustible	X		X													
	Nivel del aceite	X		X													
	Soportes motor	X		X													
	Estado del exhosto	X		X													
	Estado del switche de encendido	X		X													
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X													
	De trabajo traseras	X		X													
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X													
	Stop Traseros	X		X													
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X													
	Espejos laterales	X		X													
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X													
	Pito Normal	X		X													
	Frenos de Servicio	X		X													
	Freno de emergencia	X		X													
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X													
	Cinturones de Seguridad	X		X													
	Estado de la puertas	X		X													
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X													
	Limpia brisas	X		X													
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X													
	Estado de los asientos	X		X													
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X													
	Velocímetro	X		X													
	Batería y cables	X		X													
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X													
	Repuesto	X		X													
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X													
	Estado de correas	X		X													
	Caja de cambios en buen estado.	X		X													
	Radiador	X		X													
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X													
	Mangueras	X		X													
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X													
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X													
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X													
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X													
	Estado de empaques del volco	X		X													
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00													
	KILOMETRAJE FINAL	51394		51442													

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS:		Firma Verificación Inspector: Diana Gallego
	Afiliación ARP:		
Operador	Firma:	El Equipo esta apto para Trabajar:	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1 | GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 3034 DE 2026 | MODELO: RETRO NUEVA #11 | MARCA: NEW HOLLAND

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO | LOCALIZACION: EL PALMAR-SAN MIGUEL | FRENTE DE TRABAJO: NATAGAIMA

PERIODO: 05 DE MAYO AL 08 DE MAYO 2026 | FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL		408		414		419		425					
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2			X		X		X		X					
	* De trabajo delanteras	2			X		X		X		X					
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2			X		X		X		X					
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2			X		X		X		X					
	* De stop y señal trasera	2			X		X		X		X					
	* De trabajo traseras	2			X		X		X		X					
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1			X		X		X		X					
	* Cinturón de seguridad	1			X		X		X		X					
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1			X		X		X		X					
	Asiento (dispositivo de giro)	1			X		X		X		X					
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos			X		X		X		X					
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1			X		X		X		X					
	Alarma de retroceso	1			X		X		X		X					
	Escaleras y apoyos de acceso	2			X		X		X		X					
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1			X		X		X		X					
	Palancas de mando	2			X		X		X		X					
	Pedales	Todos			X		X		X		X					
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo			X		X		X		X					
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos			X		X		X		X					
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos			X		X		X		X					
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2			X		X		X		X					
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1			X		X		X		X					
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas			X		X		X		X					
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas			X		X		X		X					
	* Freno de emergencia en buen estado	1			X		X		X		X					
	Estado general (desgarrador/balde)	2			X		X		X		X					
	Mandos de levante del brazo	2			X		X		X		X					
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos			X		X		X		X					
	Compartimiento del motor aseado	Completo			X		X		X		X					
	Sistema de Dirección	1			X		X		X		X					
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas				X		X		X		X					
	* Huellas en buen estado	4			X		X		X		X					
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL				414		419		425		431					
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1 | GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 3034 DE 2026 **MODELO:** **RETRO NUEVA #11** **MARCA:** **NEW HOLLAND**

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO **LOCALIZACION:** **EL PALMAR-SAN MIGUEL** **FRENTE DE TRABAJO:** **NATAGAIMA**

PERIODO: 11 DE MAYO AL 15 DE MAYO 2026 **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	431		437		442		448		454					
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X		X					
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X					
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X		X					
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X		X					
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X					
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X					
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X					
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X					
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X					
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X					
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X					
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X					
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X					
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X					
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X					
	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X					
	Pedales	Todos	X		X		X		X		X					
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X					
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X		X					
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X		X		X					
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X		X					
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X		X		X					
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X		X					
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X					
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X					
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X		X		X					
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X		X		X					
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X					
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X		X					
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X					
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X		X					
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X		X					
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		437		442		448		454		459					
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1 | GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 3034 DE 2026 **MODELO:** **RETRO NUEVA #11** **MARCA:** **NEW HOLLAND**

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO **LOCALIZACION:** **EL PALMAR-SAN MIGUEL** **FRENTE DE TRABAJO:** **NATAGAIMA**

PERIODO: 20 DE MAYO AL 21 DE MAYO 2026 **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL					459		465							
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2					X		X							
	* De trabajo delanteras	2					X		X							
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2					X		X							
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2					X		X							
	* De stop y señal trasera	2					X		X							
	* De trabajo traseras	2					X		X							
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1					X		X							
	* Cinturón de seguridad	1					X		X							
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1					X		X							
	Asiento (dispositivo de giro)	1					X		X							
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos					X		X							
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1					X		X							
	Alarma de retroceso	1					X		X							
	Escaleras y apoyos de acceso	2					X		X							
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1					X		X							
	Palancas de mando	2					X		X							
	Pedales	Todos					X		X							
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo					X		X							
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos					X		X							
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos					X		X							
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2					X		X							
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1					X		X							
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas					X		X							
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas					X		X							
	* Freno de emergencia en buen estado	1					X		X							
	Estado general (desgarrador/balde)	2					X		X							
	Mandos de levante del brazo	2					X		X							
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos					X		X							
	Compartimiento del motor aseado	Completo					X		X							
	Sistema de Dirección	1					X		X							
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas						X		X							
	* Huellas en buen estado	4					X		X							
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL						465		471							
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C

VERSION	1
PAGINA	1 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)		5/05/2026	6/05/2026	7/05/2026	8/05/2026		
	HOROMETRO		408	414	419	425		
Cada 10 horas o diariamente	Freno de servicio - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Frreno de estacionamiento - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Fusibles y bombillas - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Funcionalidad de mandos y luces - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Tension de correa del ventilador / alternador - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Correa de compresor de aire acondicionado - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Nivel de aceite del motor - Revisar / Nivelar		✓	✓	✓	✓		
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar		✓	✓	✓	✓		
	Nivel de liquido refrigerante - Revisar / Nivelar		✓	✓	✓	✓		
	Nivel de aceite hidraulico (tanque hidraulico) - Revisar / Nivelar		✓	✓	✓	✓		
	Nivel de combustible - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Indicador de obstrucción - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Filtro de aire - Limpiar (De ser necesario)		✓	✓	✓	✓		
	Puntos de engrase - Lubricar		✓	✓	✓	✓		
	Drenaje filtro de combustible (filtro separador de agua) - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Filtro de aire de motor - Revisar (Cambiar)		✓	✓	✓	✓		
	Cartucho de seguridad - Revisar (Cambiar		✓	✓	✓	✓		
	Presion de neumaticos - Revisar / Nivelar		✓	✓	✓	✓		
	Condensador sistema de refrigeración - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓		
	Filtro de polen - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓		
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar		✓	✓	✓	✓		
	Nivel de electrolito de bateria - Revisar / Nivelar		✓	✓	✓	✓		
	Soporte del eje trasero - Revisar / Ajustar		✓	✓	✓	✓		
	Dientes del balde - Revisar (Cambiar)		✓	✓	✓	✓		
	Holgura del balde - Revisar (Ajustar)		✓	✓	✓	✓		

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C

VERSION	1
PAGINA	2 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)		5/05/2026	6/05/2026	7/05/2026	8/05/2026		
	HOROMETRO		408	414	419	425		
Cada 10 horas o diariamente	Liquido limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar)		✓	✓	✓	✓		
	Pedales - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓		
	Sistema de frenos - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓		
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓		
	Condensador de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓		
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)		✓	✓	✓	✓		
	Cinturon de seguridad - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Espejos - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Alarma de reversa - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Vidrio de ventanas - Limpiar		✓	✓	✓	✓		
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Cableado electrico - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Limpiaparabrisas - Revisar		✓	✓	✓	✓		
	Nivel de gas refrigerante de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)		✓	✓	✓	✓		

OBSERVACIONES:

FIRMA DE OPERADOR
Nombre: ARTURO GOMEZ

FIRMA SUPERVISOR
Nombre: DIANA MARCELA GALLEGO CAMPOS

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT GOBERNACIÓN DEL TOLIMA RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	VERSION 1 PAGINA 1 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	11/05/2026	12/05/2026	13/05/2026	14/05/2026	15/05/2026		
	HOROMETRO	431	437	442	448	454		
Cada 10 horas o diariamente	Freno de servicio - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Frreno de estacionamiento - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Fusibles y bombillas - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Funcionalidad de mandos y luces - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Tension de correa del ventilador / alternador - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Correa de compresor de aire acondicionado - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Nivel de aceite del motor - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Nivel de liquido refrigerante - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Nivel de aceite hidraulico (tanque hidraulico) - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Nivel de combustible - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Indicador de obstrucción - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Filtro de aire - Limpiar (De ser necesario)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Puntos de engrase - Lubricar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Drenaje filtro de combustible (filtro separador de agua) - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Filtro de aire de motor - Revisar (Cambiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Cartucho de seguridad - Revisar (Cambiar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Presion de neumaticos - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Condensador sistema de refrigeración - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Filtro de polen - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Nivel de electrolito de bateria - Revisar / Nivelar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Soporte del eje trasero - Revisar / Ajustar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Dientes del balde - Revisar (Cambiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Holgura del balde - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓	✓	✓		

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO

RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C

VERSION	1
PAGINA	2 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)	11/05/2026	12/05/2026	13/05/2026	14/05/2026	15/05/2026		
	HOROMETRO	431	437	442	448	454		
Cada 10 horas o diariamente	Liquido limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Pedales - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Sistema de frenos - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Condensador de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Cinturon de seguridad - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Espejos - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Alarma de reversa - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Vidrio de ventanas - Limpiar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Cableado electrico - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Limpiaparabrisas - Revisar	✓	✓	✓	✓	✓		
	Nivel de gas refrigerante de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)	✓	✓	✓	✓	✓		

OBSERVACIONES:

FIRMA DE OPERADOR
Nombre: ARTURO GOMEZ

FIRMA SUPERVISOR
Nombre: DIANA MARCELA GALLEGO CAMPOS

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C

VERSION	1
PAGINA	1 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)			20/05/2026	21/05/2026			
	HOROMETRO			459	465			
Cada 10 horas o diariamente	Freno de servicio - Revisar			✓	✓			
	Frreno de estacionamiento - Revisar			✓	✓			
	Fusibles y bombillas - Revisar			✓	✓			
	Funcionalidad de mandos y luces - Revisar			✓	✓			
	Tension de correa del ventilador / alternador - Revisar			✓	✓			
	Correa de compresor de aire acondicionado - Revisar			✓	✓			
	Nivel de aceite del motor - Revisar / Nivelar			✓	✓			
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar			✓	✓			
	Nivel de liquido refrigerante - Revisar / Nivelar			✓	✓			
	Nivel de aceite hidraulico (tanque hidraulico) - Revisar / Nivelar			✓	✓			
	Nivel de combustible - Revisar			✓	✓			
	Indicador de obstrucción - Revisar			✓	✓			
	Filtro de aire - Limpiar (De ser necesario)			✓	✓			
	Puntos de engrase - Lubricar			✓	✓			
	Drenaje filtro de combustible (filtro separador de agua) - Revisar			✓	✓			
	Filtro de aire de motor - Revisar (Cambiar)			✓	✓			
	Cartucho de seguridad - Revisar (Cambiar			✓	✓			
	Presion de neumaticos - Revisar / Nivelar			✓	✓			
	Condensador sistema de refrigeración - Revisar (Limpiar)			✓	✓			
	Filtro de polen - Revisar (Limpiar)			✓	✓			
	Nivel de aceite de la transmisión - Revisar / Nivelar			✓	✓			
	Nivel de electrolito de bateria - Revisar / Nivelar			✓	✓			
	Soporte del eje trasero - Revisar / Ajustar			✓	✓			
	Dientes del balde - Revisar (Cambiar)			✓	✓			
	Holgura del balde - Revisar (Ajustar)			✓	✓			

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO

RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C

VERSION	1
PAGINA	2 DE 2

	RUTINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS NEW HOLLAND B80C	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FECHA (DIA/MES/AÑO)			20/05/2026	21/05/2026			
	HOROMETRO			459	465			
Cada 10 horas o diariamente	Liquido limpiaparabrisas - Revisar (Ajustar)			✓	✓			
	Pedales - Revisar (Limpiar)			✓	✓			
	Sistema de frenos - Revisar			✓	✓			
	Filtro de aire de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)			✓	✓			
	Aletas del motor - Revisar (Limpiar)			✓	✓			
	Condensador de aire acondicionado - Revisar (Limpiar)			✓	✓			
	Aletas del radiador - Revisar (Limpiar)			✓	✓			
	Cinturon de seguridad - Revisar			✓	✓			
	Espejos - Revisar			✓	✓			
	Alarma de reversa - Revisar			✓	✓			
	Vidrio de ventanas - Limpiar			✓	✓			
	Monitor, indicadores y testigos - Revisar			✓	✓			
	Cableado electrico - Revisar			✓	✓			
	Limpiaparabrisas - Revisar			✓	✓			
	Nivel de gas refrigerante de aire acondicionado - Revisar (Ajustar)			✓	✓			

OBSERVACIONES:

FIRMA DE OPERADOR
Nombre: ARTURO GOMEZ

FIRMA SUPERVISOR
Nombre: DIANA MARCELA GALLEGO CAMPOS

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 7

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

FRENTE DE TRABAJO NATAGAIMA

MAYO 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT

FRENTE NATAGAIMA								
#.ORDEN	DIA	HORA	RECIBO	GLS	TOTAL	ESTACION SERVICIO	OBSERVACIONES	FRENTE
27	9-may-26	13:34:12	131706	**59,268**	$ 708.845,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Trasporto V#43	FRENTE NATAGAIMA
28	9-may-26	13:47:41	131708	**52,454**	$ 627.350,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Trasporto V#43	FRENTE NATAGAIMA
29	9-may-26	13:48:29	131709	**132,713**	$ 1.587.247,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Trasporto V#43	FRENTE NATAGAIMA
90	19-may-26	14:25:40	132315	**188,599**	$ 2.255.644,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Trasporto V#37	FRENTE NATAGAIMA
91	19-may-26	14:26:44	132314	**123,004**	$ 1.471.128,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Trasporto V#37	FRENTE NATAGAIMA
102	20-may-26	5:19:12	132354	**27,000**	$ 322.920,00	ESTACION DISTRACOM	Julio Barragan V#37	FRENTE NATAGAIMA

TOTAL MES	583,038
REMANENTE MES ANTERIOR (ABRIL)	0,000
TOTAL ACPM	583,038

CONSUMO MES	323,038
REMANENTE PARA JUNIO	260,000

VERSION 1	GOB-M-014	
UNIÓN TEMPORAL MARV 7	CONTRATO NO.3034 DE 2026 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA	GOBERNACION DEL TOLIMA

INFORME SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIARIO EN TURNO

TURNO: DIURNO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

MUNICIPIO: NATAGAIMA VEREDA : EL PALMAR-SAN MIGUEL COORDINADOR: JEISON GIOVANNI ALVIS LOZANO

VIA: EL PALMAR-SAN MIGUEL

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE DEL OPERADOR	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES (1)		SABADO (2)		DOMINGO (3)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	RETROEXCAVADORA	11	ARTURO GOMEZ																	0,000
2	VOLQUETA	37	JULIO BARRAGAN																	0,000
																				0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (4)		MARTES (5)		MIERCOLES (6)		JUEVES (7)		VIERNES (8)		SABADO (9)		DOMINGO (10)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	RETROEXCAVADORA	11	ARTURO GOMEZ			30	Arturo					30	Arturo							60,000
2	VOLQUETA	37	JULIO BARRAGAN			30	Julio B			25	Julio B									55,000
																				0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (11)		MARTES (12)		MIERCOLES (13)		JUEVES (14)		VIERNES (15)		SABADO (16)		DOMINGO (17)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	RETROEXCAVADORA	11	ARTURO GOMEZ	30	Arturo					30	Arturo									60,000
2	VOLQUETA	37	JULIO BARRAGAN	30	Julio B					30	Julio B									60,000
																				0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (18)		MARTES (19)		MIERCOLES (20)		JUEVES (21)		VIERNES (22)		SABADO (23)		DOMINGO (24)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	RETROEXCAVADORA	11	ARTURO GOMEZ					30	Arturo											30,000
2	VOLQUETA	37	JULIO BARRAGAN					27,000	Julio B											27,000
																				0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (25)		MARTES (26)		MIERCOLES (27)		JUEVES (28)		VIERNES (29)		SABADO (30)		DOMINGO (31)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO			
1	RETROEXCAVADORA	11	ARTURO GOMEZ																	0,000
2	VOLQUETA	37	JULIO BARRAGAN	31,038	Julio B															31,038
																				0,000

323,038

OBSERVACIONES: Remanente 260,000 gls para el mes de junio.

VoBo SUPERVISOR (A): Diana Bolaños

VoBo COORDINADOR: Jeison Alvis

FRENTE DE TRABAJO NATAGAIMA					
MES MAYO 2026					
Maquina	N° Interno	Consumo Mensual ACPM (GL)	Kilometraje/ Horometro Inicial	Kilometraje/Horometro Final	Promedio Consumo (Hr/Km x GL)
RETROEXCAVADORA	11	150,000	408	471	2,38
VOLQUETA	37	173,038	50373	51441	0,16
		323,038			

3297

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOB-M-012A
CONTRATO 3034 DE 2026

GOBERNACION DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Natagaima
FECHA : 09/05/2026

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 4210 del 11 de Noviembre del 2025 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Coordinador del contrato 3034 del 09 de Abril de 2026 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Natagaima la cantidad de 244,435 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 09 de mayo del 2026.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 4210 de 2025
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Coordinador Contrato 3034 de 2026.
MARV 7

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 4210 de 2025
Gobernación del Tolima

ING. Stephanie Lara Hernández
Apoyo Supervisor del contrato 3034
de 2026. MARV 7

ING. Diana Marcela Gallego Campos
Apoyo Supervisor del contrato 3034
de 2026. MARV 7

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 131709
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
Agentes Retenedores de IVA A
rt. 437-2 E.T.NExentos De Re
teica Art 86 Acdo 015 De 20
21
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2026/05/09
Vencimiento:	2026/06/08
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 154985
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	NATAGAIM
Kilometros:	0
Hora Ini:	13:48:29
Hora Fin:	14:00:55
Combustible:	DIESEL
Volumen:	132.7130
Precio:	$11960
Total:	$1587247
Panel:	MFA976
Lad/Man/Pos:	2/1/8
Dispositivo:	RBHAND283-01
Empleado:	MICHAEL ESTEBAN C
Emp. Apoyo:	LUISA FERNANDA GAR
Validado:	ID Electronico

Entrego:
NATAGAIM
Recibi:
VH43
Nombre:

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 131708
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
Agentes Retenedores de IVA A
rt. 437-2 E.T.NExentos De Re
teica Art 86 Acdo 015 De 20
21
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2026/05/09
Vencimiento:	2026/06/08
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 154985
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	NATAGAIM
Kilometros:	0
Hora Ini:	13:47:41
Hora Fin:	14:00:02
Combustible:	DIESEL
Volumen:	52.4540
Precio:	$11960
Total:	$627350
Panel:	MFC500
Lad/Man/Pos:	1/1/3
Dispositivo:	RBHAND283-01
Empleado:	MICHAEL ESTEBAN C
Emp. Apoyo:	LUISA FERNANDA GAR
Validado:	ID Electronico

Entrego:
NATAGAIM
Recibi:
VH43
Nombre:

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 131706
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
Agentes Retenedores de IVA A
rt. 437-2 E.T.NExentos De Re
teica Art 86 Acdo 015 De 20
21
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2026/05/09
Vencimiento:	2026/06/08
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 154985
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	NATAGAIM
Kilometros:	0
Hora Ini:	13:34:12
Hora Fin:	13:43:40
Combustible:	DIESEL
Volumen:	59.2680
Precio:	$11960
Total:	$708845
Panel:	MFC500
Lad/Man/Pos:	1/1/3
Dispositivo:	RBHAND283-04
Empleado:	DEVIA BUSTOS LEON
Validado:	ID Electronico

Entrego:
NATAGAIM
Recibi:
VH43
Nombre:

3299

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOB-M-012A
CONTRATO 3034 DE 2026

GOBERNACION DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Natagaima
FECHA : 19/05/2026

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 4210 del 11 de Noviembre del 2025 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Coordinador del contrato 3034 del 09 de Abril de 2026 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Natagaima la cantidad de 311,603 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 19 de mayo del 2026.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 4210 de 2025
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Coordinador Contrato 3034 de 2026.
MARV 7

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 4210 de 2025
Gobernación del Tolima

ING. Stephanie Lara Hernández
Apoyo Supervisor del contrato 3034
de 2026. MARV 7

ING. Diana Marcela Gallego Campos
Apoyo Supervisor del contrato 3034
de 2026. MARV 7

5300

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 132315
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
Agentes Retenedores de IVA A
rt. 437-2 E.T.NExentos De Re
teica Art 86 Acdo 015 De 20
21
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2026/05/19
Vencimiento:	2026/06/18
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 154985
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	NATAGAIM
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora Ini:	14:25:40
Hora Fin:	14:40:56
Combustible:	DIESEL
Volumen:	188.5990
Precio:	$11960
Total:	$2255644
Panel:	MFA976
Lad/Man/Pos:	1/1/7
Dispositivo:	RBHAND283-02
Empleado:	FRANCY YOMARA ROD
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nataigaima vda #37

Nombre:

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 132314
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
Agentes Retenedores de IVA A
rt. 437-2 E.T.NExentos De Re
teica Art 86 Acdo 015 De 20
21
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2026/05/19
Vencimiento:	2026/06/18
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 154985
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	NATAGAIM
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora Ini:	14:26:44
Hora Fin:	14:39:00
Combustible:	DIESEL
Volumen:	123.0040
Precio:	$11960
Total:	$1471128
Panel:	MFA976
Lad/Man/Pos:	2/1/8
Dispositivo:	RBHAND283-02
Empleado:	FRANCY YOMARA ROD
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nataigaima vda #37

Nombre:

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 7

GOB-M-012A
CONTRATO 3034 DE 2026

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Natagaima
FECHA : 20/05/2026

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 4210 del 11 de Noviembre del 2025 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Coordinador del contrato 3034 del 09 de Abril de 2026 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Natagaima la cantidad de 27,000 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 20 de mayo del 2026.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 4210 de 2025
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Coordinador Contrato 3034 de 2026.
MARV 7

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 4210 de 2025
Gobernación del Tolima

ING. Stephanie Lara Hernández
Apoyo Supervisor del contrato 3034
de 2026. MARV 7

ING. Diana Marcela Gallego Campos
Apoyo Supervisor del contrato 3034
de 2026. MARV 7

3302

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 132354
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
Agentes Retenedores de IVA A
rt. 437-2 E.T.NExentos De Re
teica Art 86 Acdo 015 De 20
21
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2026/05/20
Vencimiento:	2026/06/19
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 154985
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	LTL736
Kilometros:	51034
Cedula:	93389423
Hora Ini:	05:19:12
Hora Fin:	05:21:46
Combustible:	DIESEL
Volumen:	27.0000
Precio:	$11960
Total:	$322920
Panel:	MFA976
Lad/Man/Pos:	2/1/8
Dispositivo:	IMP-ADMIN
Empleado:	MICHAEL ESTEBAN C
Validado:	ID Electronico

Entrego:
Julio Cesar Rivera
Recibi:
VK37 NATAGAIMA
Nombre:

OBSERVACIONES
NATAGAIMA
