CORANTIOQUIA

CORANTIOQUIA - Subdirección de Participación y Cultura ambiental Medellín
INFORME TÉCNICO
SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN Y
Fecha: 10-ago-2026 03:07 PM Pág: 6
Anexos: 1 PÁGINA
Archivar en:
Radicado por: Natalia Katherine Zapata Lopez

140-IT2608-7710
Favor citar este número al responder

# "IMPLEMENTAR EL PROGRAMA TERRITORIAL DE INNOVA CIÓN Y APROPIACIÓNSOCIAL DEL CONOCIMIENTO, BASADOS EN INICIATIVAS AMBIENTALES ORIENTADAS HACIA LA AGRICULTURA Y GANADERÍA REGENERATIVA EN LAJURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"

## SEGUIMIENTO A INICIATIVA POR PARTE DE CORANTIOQUIA

**Presentado a**

CORANTIOQUIA

**Preparado por**

**Subdirección de Participación y Cultura Ambiental**

Medellín, 2026-07-31

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos n nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

icontec ISO 9001 SA-CER341300 icontec ISO 14001 SA-CER440982 IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

## Objetivo

Realizar el seguimiento en campo al avance de la implementación de la iniciativa “Sistema productivo de arándanos”, ubicada en el municipio de Entrerríos, en la vereda El Progreso, con el fin de verificar el estado de implementación del piloto, el cumplimiento de las actividades programadas, el funcionamiento de los componentes implementados y el uso adecuado de los recursos entregados a los beneficiarios con el fin de evaluar los avances alcanzados y fortalecer la ejecución de la iniciativa.

## Desarrollo de la visita

Durante la visita de seguimiento a la iniciativa Sistema productivo de arándanos, ubicada en el Municipio de Entrerríos, en la vereda El Progreso, se realizó un recorrido por el predio en compañía del beneficiario, señor Jairo Perez, quien presentó los avances alcanzados en la implementación del proyecto y explicó las actividades ejecutadas con los recursos asignados.

En primera instancia, se verificó la implementación del sistema de captación de aguas lluvias, evidenciándose la instalación de un canal plástico sobre la cubierta de la vivienda para la recolección del agua, la cual se conduce mediante tubería hacia un tanque de almacenamiento con capacidad de 2.000 litros. De acuerdo con lo informado por el beneficiario, esta infraestructura permitirá abastecer el sistema de riego destinado al cultivo de arándanos, favoreciendo el uso eficiente del recurso hídrico.




**Fotografía 1.** Instalación de canal recolector de agua lluvia.

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co



icontec ISO 9001 SA-CER341300
icontec ISO 14001 SA-CER440982
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM




**Fotografía 2.** Tanque de almacenamiento de agua lluvia, capacidad de 2000 L.

Posteriormente, se inspeccionó el invernadero construido como parte de la iniciativa, evidenciándose una adecuada ejecución de la estructura, con una orientación favorable para el desarrollo del cultivo y una cubierta conformada por plástico y malla de protección, diseñada para disminuir el ingreso de aves y otros agentes que puedan afectar el cultivo

.




**Fotografía 3.** Invernadero para cultivo de arándano.

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co



icontec ISO 9001 SA-CER341300 icontec ISO 14001 SA-CER440982 IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

En el interior del invernadero se verificó que el terreno se encuentra completamente preparado para el establecimiento del cultivo, observándose los surcos conformados y acondicionados con cascarilla como material de cobertura, listos para la siembra de las plántulas de arándano.



**Fotografía 4.** Adecuación del suelo para posterior siembra.

Asimismo, el beneficiario informó que el cultivo contará con un sistema de riego localizado por goteo, el cual será instalado con dos líneas de goteo por surco para garantizar una distribución uniforme del agua. Durante la visita se evidenció que la adquisición e instalación de las mangueras y demás componentes del sistema de riego aún se encuentran pendientes.

Finalmente, se verificó la disponibilidad del material vegetal para el establecimiento del cultivo, observándose plántulas de arándano con diferentes estados de desarrollo, las cuales serán sembradas una vez finalice la instalación del sistema de riego.

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co



icontec ISO 9001 SA-CER341300 icontec ISO 14001 SA-CER440982 IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM




**Fotografía 5**. Plántulas de arándano listas para labor de siembra

En términos generales, la iniciativa presenta un avance importante, encontrándose pendientes la instalación de la red de riego y el establecimiento definitivo del cultivo.

**Verificación de avance y actividades pendientes.**

- Se verificó la instalación del sistema de captación y conducción de aguas lluvias hacia un tanque de almacenamiento con capacidad de 2000 L destinado al abastecimiento del sistema de riego del cultivo.
- Se evidenció la construcción del invernadero con cubierta de plástico y malla de protección para evitar el ingreso de aves.
- Se evidenció la preparación del terreno mediante la conformación de surcos e incorporación de cascarilla, encontrándose listo para la siembra de las plantas de arándano
- Se identificó como actividad pendiente la adquisición e instalación del sistema de riego por goteo, así como la siembra de plantas, lo cual se espera sea completada en el mes de agosto.

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co




icontec ISO 9001 SA-CER341300 icontec ISO 14001 SA-CER440982 IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

## Conclusión

La visita de verificación permitió evidenciar un avance satisfactorio en la implementación de la iniciativa, observándose la ejecución de la mayor parte de las actividades programadas y una adecuada preparación de la infraestructura para el establecimiento del cultivo.

## Recomendaciones

- Se recomienda la instalación de filtros en el sistema de riego para evitar la obstrucción de los emisores por partículas o sedimentos, garantizando una distribución uniforme del agua.
- Realizar labores periódicas de limpieza y mantenimiento del sistema de captación de aguas lluvias, incluyendo canales y tanque de almacenamiento para prevenir la acumulación de sedimentos y asegurar la calidad del agua para riego.
- Proteger las tuberías y accesorios del sistema de riego, evitando su exposición directa a impactos, radiación solar o tránsito de personas o animales, con el propósito de prolongar su vida útil y evitar fugas por daño de estas.




HENRY CARDONA AGUIRRE
Profesional Especializado.

Anexos: Uno (listado de asistencia, 1 página)

Copia: hcardona, practicante_partici2



Elaboró: Yenith Adriana Mora Jimenez

Revisó: Henry Cardona Aguirre 


Fecha de elaboración: 2026-07-31

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co



icontec ISO 9001 SA-CER341300 icontec ISO 14001 SA-CER440982 IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

## **Anexo 1.** Listado de asistencia

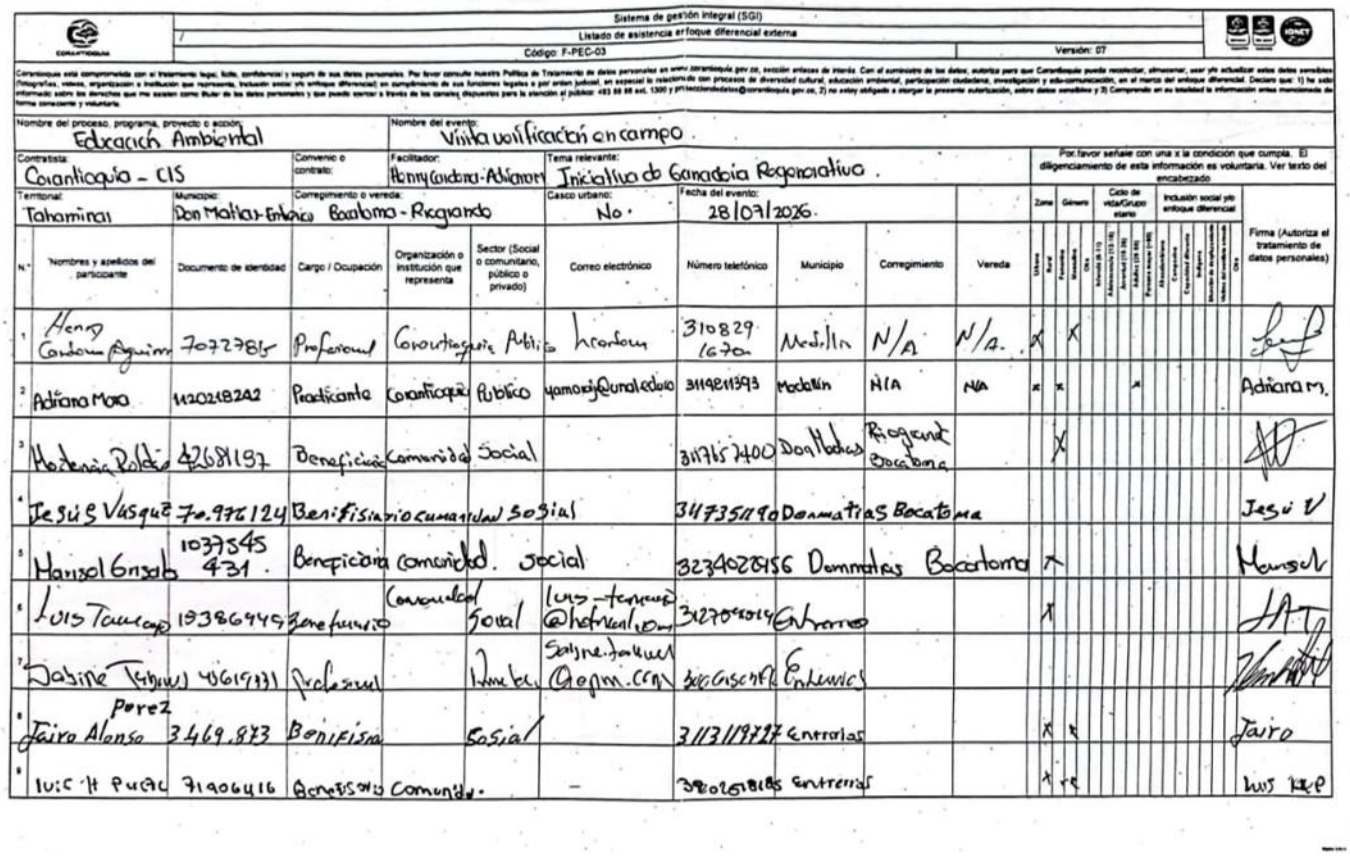

Sistema de gestión integral (SGI)

Listado de asistencia enfoque diferencial externo

Código: F-PEC-03 Versión: 07

Nombre del proceso, programa, proyecto o acción: Educación Ambiental

Nombre del evento: Visita verificación en campo.

Contratista: Corantioquia - CIS

Convenio o contrato:

Facilitador: Henry Cardona - Adriana M.

Tema relevante: Iniciativa de Ganadería Regenerativo.

Por favor señale con una x la condición que cumpla. El diligenciamiento de esta información es voluntaria. Ver texto del encabezado

Territorial: Tahamiral

Municipio: Don Matías - Entrerríos

Corregimiento o vereda: Bocatoma - Riogrande

Casco urbano: No.

Fecha del evento: 28/07/2026.

| N.° | Nombres y apellidos del participante | Documento de identidad | Cargo / Ocupación | Organización o institución que representa | Sector (Social o comunitario, público o privado) | Correo electrónico | Número telefónico | Municipio | Corregimiento | Vereda | Zona: Urbana | Zona: Rural | Género: Femenino | Género: Masculino | Género: Otro | Ciclo de vida/Grupo etario: Infancia (6-11) | Ciclo de vida/Grupo etario: Adolescencia (12-18) | Ciclo de vida/Grupo etario: Juventud (19-28) | Ciclo de vida/Grupo etario: Adultez (29-59) | Ciclo de vida/Grupo etario: Persona mayor (+60) | Inclusión social y/o enfoque diferencial: Comunidades étnicas | Inclusión social y/o enfoque diferencial: Capacidad diferente | Inclusión social y/o enfoque diferencial: Indígena | Inclusión social y/o enfoque diferencial: Situación de vulnerabilidad | Inclusión social y/o enfoque diferencial: Habitante del sector rural | Otro | Firma (Autoriza el tratamiento de datos personales) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henry Cardona Aguirre | 70727815 | Profesional | Corantioquia | Público | hcardona | 310829 1670 | Medellín | N/A | N/A. | X | | X | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Adriana Mora | 1120218242 | Practicante | Corantioquia | Público | yamorajfuralcolo | 3114811393 | Medellín | N/A | N/A | X | | X | | | | | | X | | | | | | | | Adriana M. |
| 3 | Hortensia Roldán | 42681197 | Beneficiaria | Comunidad | Social | | 3117157400 | Don Matías | Riogrande Bocatoma | | | | X | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Jesús Vasquez | 70.976124 | Beneficiario | Comunidad | Social | | 3147351190 | Donmatías | Bocatoma | | | | | | | | | | | | | | | | | | Jesús V |
| 5 | Hansol Grisales | 1037545 431. | Beneficiaria | Comunidad. | Social | | 3234028156 | Donmatías | Bocatoma | | | X | | | | | | | | | | | | | | | Hansol |
| 6 | Luis Tamayo | 19386945 | Beneficiario | Comunidad | Social | luis-tamayo@hotmail.com | 3127[illegible] | Entrerríos | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Sabine [illegible] | 4061[illegible] | Profesional | | Privado | Sabine.[illegible] | [illegible] | Entrerríos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Jairo Alonso Perez | 3469.873 | Beneficiario | | Social | | 3113119727 | Entrerríos | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | Jairo |
| 9 | Luis H Pugal | 71906416 | Beneficiario | Comunidad. | | - | 3[illegible] | Entrerríos | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | Luis H P |

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co



icontec ISO 9001 SA-CER341300 icontec ISO 14001 SA-CER440982 IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
