BOGOTÁ GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Objeto de la reunion: Revisión del estado de la suspensión de los contratos

Fecha: 08 de octubre de 2026

Hora de inicio: 10:00 AM

Hora de finalización: 11:00 AM

Modalidad: X Presencial ___ Virtual ___ Telefónica ___ Mixta

Lugar: Frente de obra sector Naranjos

Dependencia:

Nombre del Responsable: Edison Ricardo Ducuara Diaz

TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Persona a Cargo)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO: ASESOR	CARGO: DIRECTIVO	CARGO: PROFESIONAL	CARGO: TECNICO / TECNOLOGO	CARGO: AUXILIAR	TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA	TIPO DE VINCULACIÓN: PROVISIONAL	TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMB	TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA	CORREO ELECTRÓNICO - TELEFONO DE CONTACTO	FIRMA
CC	1090403332	Edison Ricardo Ducuara	Interventoria	Consorcio Suba TH003			X							rubenricar@gmail.com	
CC	52.115080	Sandra Cuestas	Sandra	Consorcio Suba Vial VR			X							Consorciosubavialvr 1009@gmail.com	
CC	7.161.761	Nestor Acosta	FDLS	Interventor			X							3118267669	
CC	79.244.137	Juan Sasmanta	FDLS	Intraest.			X							X 3143312649	

CONSENTIMIENTO: [illegible]

[illegible]

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:


Se convoca la presente reunión con el fin de revisar el estado en que se encuentran las razones o motivos que dieran origen a la suspensión No.1 de los contratos 1007 y 033, encontrando lo siguiente:

1) Durante la suspensión un funcionario de la EAAB cambió a obra y con él se pudo validar la localización de las redes de acueducto, permitiendo que la información fuese validada en sitio.

2) La localización definida permitirá que las excavaciones se continúen ejecutando sin que represente el riesgo contante de ruptura de tuberías de acueducto.

3) Dadas las condiciones mencionadas, se considera que se superaron los motivos que dieron origen a la suspensión No.1 de los contratos, permitiendo con ello que los mismos se reanuden a partir del 09 de octubre de 2015.

En conclusión, se acuerda reiniciar el contrato a partir del día de mañana y el contratista se compromete a retomar actividades y finalizar dentro del plazo restante la intervención en la calzada.

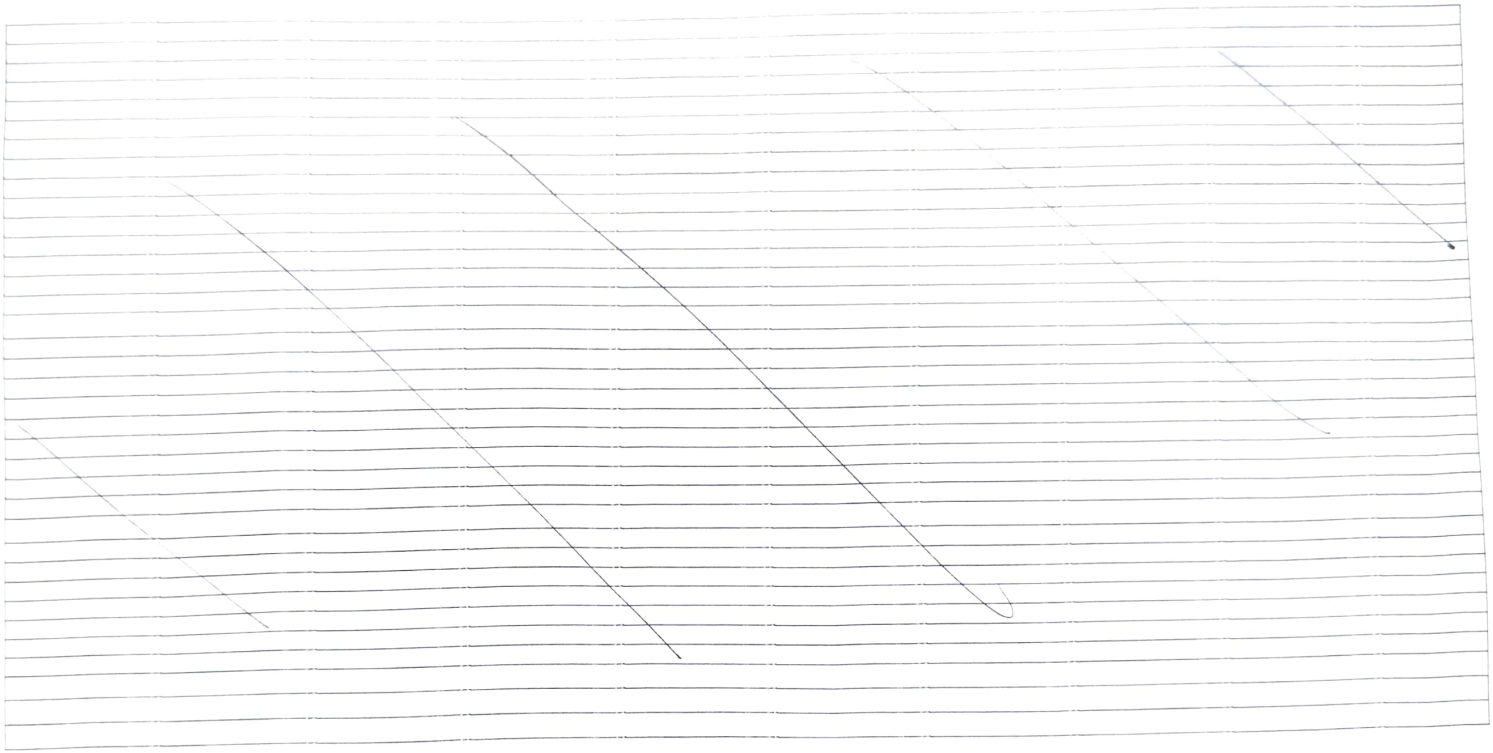

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Revisar de los contratos	Obra - Interventoría	09-10-2026

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen familiaridad.
NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los temas tratados y los compromisos de la reunión.
