MUNICIPIO DE TAURAMENA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

INFORME DE VISITA DE INSPECCIÓN							Solicitante	Municipio de Tauramena
							Fecha (dd/mm/aaaa)	27 de agosto de 2025
Hora de la visita	08:00 AM	Duración (min)	60	Estado del tiempo	Soleado	Localización		INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA EMPRESARIAL DEL LLANO, SEDE CHAPARRAL

PARTICIPANTES DE LA VISITA

Nombre	Cargo	En representación de:	Observación:
Laura Cristina Carvajal Mora	Personal de Contratado SI	Alcaldía, Secretaria de Infraestructura	
David Fonseca	Personal de Contratado SI	Alcaldía, Secretaria de Infraestructura	

OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA VISITA - ANTECEDENTES	CONDICIONES Y LIMITACIONES DE LA VISITA
Identificar el estado actual de las instalaciones fisicas, con el propósito de evaluar las condiciones existentes, para realizar el diagnostico detallado de las instituciones educativas del municipio de Tauramena.	Sin complicación en la visita.
DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL - ESTADO	**ACTIVIDADES REALIZADAS**
Durante la inspección visual realizada en la Institución Educativa Técnica Empresarial del Llano, Sede Chaparral, se identificaron los siguientes elementos: Durante la inspección, se constató un deterioro progresivo en las aulas, evidenciado por grietas en muros y losas, desprendimiento de revestimientos, fisuras en elementos estructurales y signos de afectaciones en cubiertas. Este deterioro se atribuye principalmente a la antigüedad de las edificaciones y a la falta de intervenciones estructurales de fondo, lo que ha permitido el avance del deterioro con el paso del tiempo. Se identificó que algunas zonas presentan un riesgo significativo de colapso, especialmente en los bloques más antiguos, lo que representa una amenaza para la seguridad de la comunidad educativa. Además, se observó humedad en muros y cubiertas, corrosión en elementos metálicos y desgaste en la infraestructura sanitaria y eléctrica.	Inspección visual a todas las áreas del nstitución Educativa Técnica Empresarial del Llano, Sede Chaparral

COMENTARIOS Y/O OBSERVACIONES

Se recomienda la adecuación de los baños para personas con discapacidad, la sede no cuenta con parque infantil

REGISTRO FOTOGRÁFICO

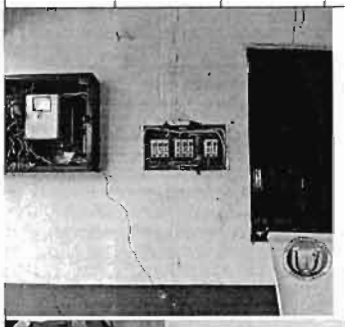


INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA EMPRESARIAL DEL LLANO, SEDE CHAPARRAL, ubicado a 6 km del casco urbano de tauramena

MUNICIPIO DE TAURAMENA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

INFORME DE VISITA DE INSPECCIÓN					Solicitante		Municipio de Tauramena
					Fecha (dd/mm/aaaa)		27 de agosto de 2025
Hora de la visita	08:00 AM	Duración (min)	60	Estado del tiempo	Soleado	Localización	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA EMPRESARIAL DEL LLANO, SEDE CHAPARRAL

		Estado actual de redes eleectricas, muros
		Estado actual de cimientos, muros

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

La infraestructura de la institución educativa, con más de 56 años de antigüedad, no cumple con los requisitos mínimos de diseño y construcción establecidos en la Norma Sismo Resistente NSR-10, la cual regula los criterios para la seguridad estructural en edificaciones

la Norma Técnica Colombiana NTC 4595 define los lineamientos para el planeamiento y diseño físico-espacial de las instalaciones escolares con el fin de optimizar las condiciones del servicio educativo; no obstante, esta sede no se ajusta a dichos parámetros, ya que las intervenciones que se han realizado no suplen por completo las necesidades

INSPECCIÓN A CARGO	REVISÓ
Laura Cristina Carvajal Mora	**Ing. Lino Rodriguez Ochoa**
Prof. Apoyo Sec. Infraestructura	Sec. Infraestructura
